

 AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	INFORME SEMANAL	VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
		FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."			

DATOS GENERALES				
Semana No.	26	Plazo total (días)	210	
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	175	
Del	4/02/2025	% de tiempo transcurrido	83,33%	
Al	10/02/2025	Interventoría	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 128.078.300,92	Valor ejecutado	\$ 27.960.000,00	-\$ 100.118.300,92
Porcentaje programado	1,48%	Porcentaje ejecutado	0,32%	-1,15%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 5.913.958.708,92	Valor ejecutado	\$ 575.298.119,60	-\$ 5.338.660.589,32
Porcentaje programado	68,13%	Porcentaje ejecutado	6,63%	-61,50%

DATOS DEL COTRATO				
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO ALFA		Contratista:	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
Contrato No:	23001138 H4 DE 2024		Contrato No:	23001299 H3 DE 2024
Valor Inicial:	\$ 8.706.192.504,00		Valor inicial:	\$ 684.322.873,00
Valor Actualizado al modificadorio :	NA		Valor actualizado al modificadorio :	NA
Valor actualizado 2:	NA		Valor actualizado 2:	NA
Plazo inicial:	Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		Plazo inicial:	Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.
Plazo actualizado:	NA		Plazo actualizado :	NA
Fecha de iniciación:	13/08/2024		Fecha de iniciación :	13/08/2024
Fecha de vencimiento:	16/12/2024		Fecha de vencimiento :	16/12/2024
Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1	Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1:	Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1	17/03/2025		Fecha de Terminación Según Prórroga No.1:	17/03/2025
Suspensión No.:	NA		Suspensión No.:	NA
Periodo de Suspensión No.:	NA		Periodo de Suspensión No.:	NA
Levantamiento de la suspensión No.:	NA		Levantamiento de la Suspensión No.:	NA
Nueva fecha de terminación	17/03/2025		Nueva fecha de terminación :	17/03/2025
Valor total actual del contrato	\$ 8.706.192.504,00		Valor total actual del contrato :	\$ 684.322.873,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
ACTIVIDADES LADO AIRE	ACTIVIDADES LADO TIERRA
* Acopio de material tolerable * Se localiza y se Replantea puntos de Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K2+140 al K2+090, del Eje No. 3 al Eje No. 2 desde el K2+140 al K2+090 y del Eje No. 2 al Eje No. 1 desde el K2+140 al K2+130 en el Costado Nor Este. * Se realiza la Excavación de Material No Clasificado de Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K2+140 al K2+090, del Eje No. 3 al Eje No. 2 desde el K2+140 al K2+090 y del Eje No. 2 al Eje No. 1 desde el K2+140 al K2+130 en el Costado Nor Este. * Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K2+140 al K2+090, del Eje No. 3 al Eje No. 2 desde el K2+140 al K2+090 y del Eje No. 2 al Eje No. 1 desde el K2+140 al K2+130 en el Costado Nor Este	N.A.


ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Mediante el comunicado T-003-2024-125-OFC de fecha 5 de febrero 2025 se remitió a la AEROCIVIL el Informe semanal No. 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del contrato de interventoría No. 23001299 H3 DE 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-126-OFC de fecha 10 de febrero 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta al comunicado C-ALFA-074-2024, C-ALFA-085-2025 y C-ALFA 093-2025 – Aval solicitud de adición al valor del contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental mediante el comunicado T-003-2024-080-OFC de fecha 1 de noviembre de 2024.



ACTIVIDADES SISTEMA SST
* Inducción a nuevo personal (operadores de maquinaria) * Entrega y reposición de dotación y EPP. * Preoperacionales de maquinaria y vehículos. * Verificación de uso adecuado de EPP. * Inspección en campo de áreas que requieren señalizaciones preventivas. * Organización de bodega.

AVANCE CANTIDADES



CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024					Semana No. 26	
"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."					(4 Febr - 10 Febr)	
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD		CANTIDAD	Porcentaje Ejecutado
2.4	ZONA 2 - NORESTE		67,95%			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	39.248,54	2,38%	300,00	\$ 2.460.000,00	0,76%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	612.428,51	32,84%		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	16.540,00	12,31%	300,00	\$ 25.500.000,00	1,81%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	8.360,00	27,99%		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	41.800,00	5,31%		\$ -	
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 27.960.000,00	

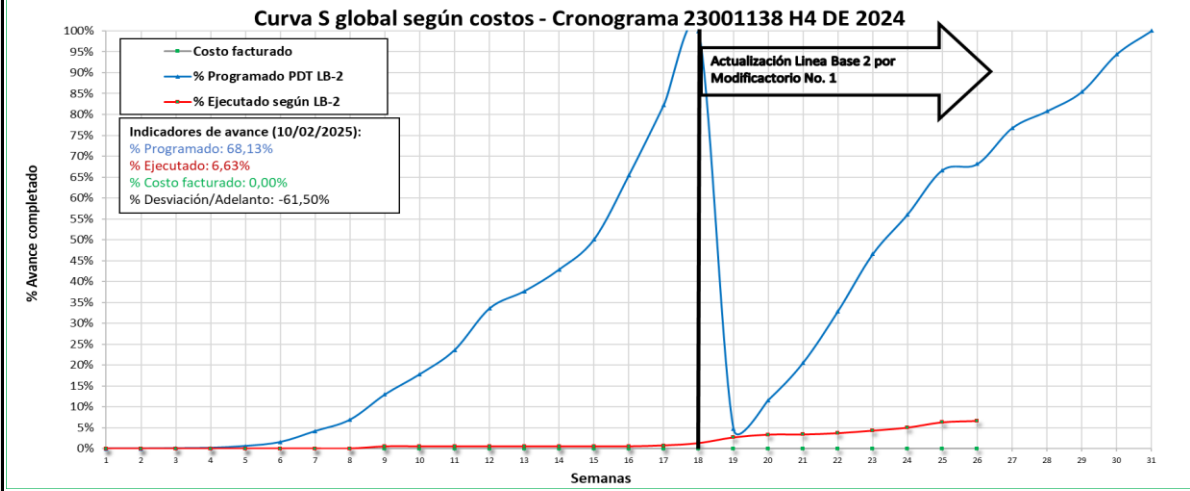

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO	PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO
	\$ 128.078.300,92			\$ 5.913.958.708,92	
Porcentaje	1,48%	Porcentaje	68,13%	Porcentaje	6,63%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO	PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO
	\$ 0,00	\$ -		\$ 0,00	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%

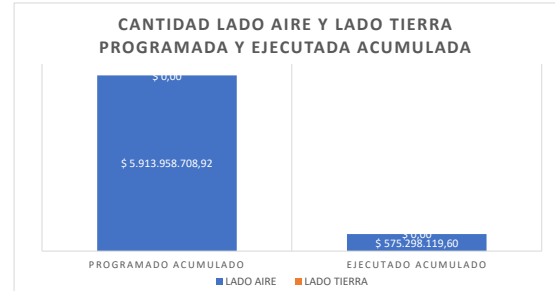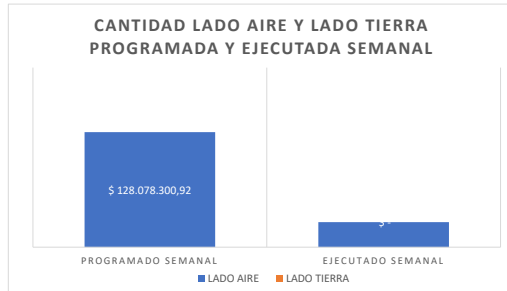

PERSONAL EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS	
TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1	Motoniveladora	1
	Residente de Obra	1	Excavadora de Orugas	1
	Especialista Ambiental	1	Vibrocompactadores	2
	Especialista en Pavimentos	1	Bulldozer	1
	Especialista en Hidráulica	1	Carrotanque	1
	Gerente de Proyectos PMP	1	Retrocargador (Pajarita)	1
	Inspectora SISOMA	1	Luminarias	3
	Topógrafo	1	Camioneta Doble Cabina	1
	Cadeneros	1		
	Operadores de Maquinaria	5		
MANO DE OBRA	Mecánico	1		
	Ayudante	13		
	Conductor Volqueta	6		

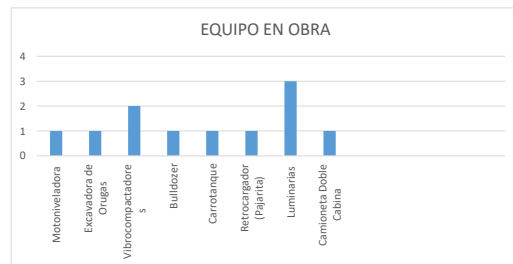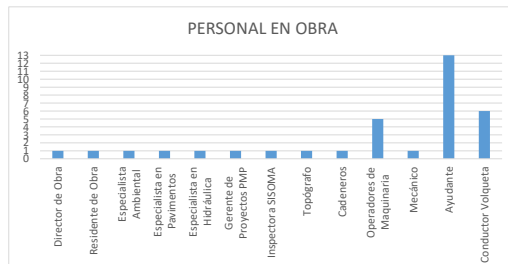

REGISTRO FOTOGRÁFICO

martes, 4 de febrero de 2025, 9:42:31 p.m.
 1° 23' 57" N, 77° 17' 23" W
 96° E
 Aeropuerto Antonio Nariño
 Chachagui
 Altitud:1787.5meter
 Velocidad:0.8km/h
 INGEOCIM S.A.S
 Costado NE
 Del eje 4 al eje 3
 K1+480 hacia mayores



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

martes, 4 de febrero de 2025, 10:43:00 p.m.
 1° 23' 58" N, 77° 17' 22" W
 282° W
 Aeropuerto Antonio Nariño
 Chachagui
 Altitud:1807.4meter
 Velocidad:0.0km/h
 INGEOCIM S.A.S
 Costado NE
 Del eje 4 al eje 3
 K1+480 hacia mayores



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

martes, 4 de febrero de 2025, 11:11:44 p.m.
 1° 23' 53" N, 77° 17' 19" W
 80° E
 Colombia
 Altitud:1814.0meter
 Velocidad:0.0km/h
 INGEOCIM S.A.S
 Costado NE
 Del eje 4 al eje 3
 K1+480 hacia mayores



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

martes, 4 de febrero de 2025, 11:52:52 p.m.
 1° 23' 48" N, 77° 17' 23" W
 239° SW
 Aeropuerto Antonio Nariño
 Chachagui
 Altitud:1814.2meter
 Velocidad:2.0km/h
 INGEOCIM S.A.S
 Costado NE
 Del eje 4 al eje 3
 K1+480 hacia mayores



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

viernes, 7 de febrero de 2025, 8:41:57 p.m.
 1° 24' 17" N, 77° 17' 18" W
 52° NE
 Aeropuerto Antonio Nariño
 Chachagui
 Altitud:1776.0meter
 Velocidad:2.7km/h
 INGEOCIM S.A.S
 Costado NE
 Del eje 3 al eje 4
 K2+140 hacia menores



ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

viernes, 7 de febrero de 2025, 8:43:25 p.m.
 1° 24' 18" N, 77° 17' 18" W
 198° S
 Aeropuerto Antonio Nariño
 Chachagui
 Altitud:1776.2meter
 Velocidad:3.4km/h
 INGEOCIM S.A.S
 Costado NE
 Del eje 3 al eje 4
 K2+140 hacia menores



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

viernes, 7 de febrero de 2025, 11:31:57 p.m.
 1° 24' 8" N, 77° 17' 11" W
 147° SE
 Carretera Panamericana
 Altitud:1799.4meter
 Velocidad:0.0km/h
 INGEOCIM S.A.S
 Costado NE
 Del eje 2 al eje 3
 K2+140 hacia menores



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

sábado, 8 de febrero de 2025, 1:55:06 a.m.
 1° 24' 18" N, 77° 17' 17" W
 220° SW
 Aeropuerto Antonio Nariño
 Chachagui
 Altitud:1799.2meter
 Velocidad:5.2km/h
 INGEOCIM S.A.S
 Costado NE
 Del eje 3 al eje 4
 K2+140 hacia menores



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




sábado, 8 de febrero de 2025, 8:44:35 p.m.
1° 24' 17" N, 77° 17' 19" W
77° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1772.4meter
Velocidad:0.2km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 2 al eje 3
K2+125 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




sábado, 8 de febrero de 2025, 8:45:27 p.m.
1° 24' 17" N, 77° 17' 19" W
36° NE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1770.5meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 2 al eje 3
K2+125 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

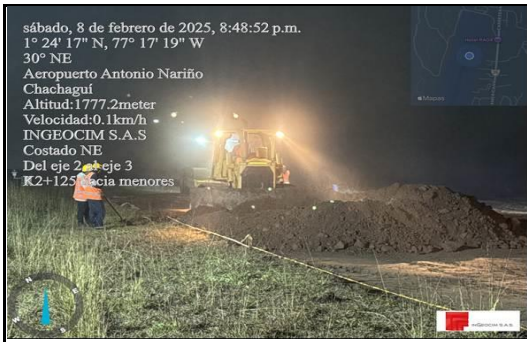

sábado, 8 de febrero de 2025, 8:48:52 p.m.
1° 24' 17" N, 77° 17' 19" W
30° NE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1777.2meter
Velocidad:0.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 2 al eje 3
K2+125 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

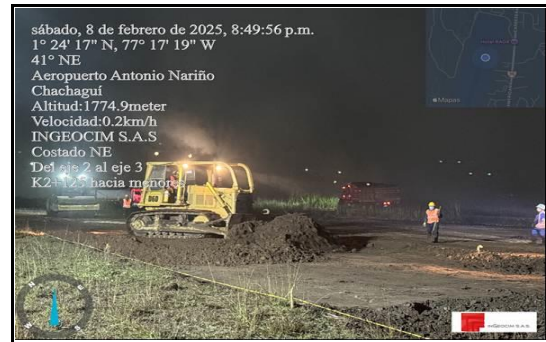


sábado, 8 de febrero de 2025, 8:49:56 p.m.
1° 24' 17" N, 77° 17' 19" W
41° NE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1774.9meter
Velocidad:0.2km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 2 al eje 3
K2+125 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



sábado, 8 de febrero de 2025, 9:41:24 p.m.
1° 24' 17" N, 77° 17' 19" W
81° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1785.4meter
Velocidad:0.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 2 al eje 3
K2+125 hacia menores

ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

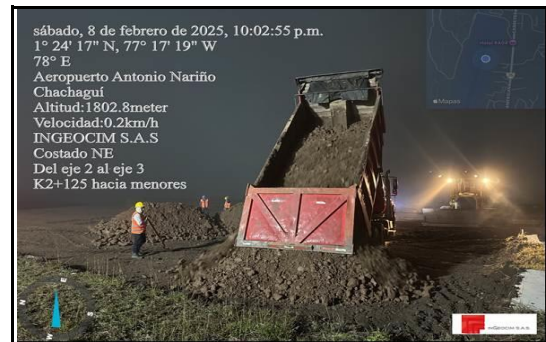

sábado, 8 de febrero de 2025, 10:02:55 p.m.
1° 24' 17" N, 77° 17' 19" W
78° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1802.8meter
Velocidad:0.2km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 2 al eje 3
K2+125 hacia menores


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

sábado, 8 de febrero de 2025, 10:19:08 p.m.
1° 24' 18" N, 77° 17' 19" W
56° NE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1785.6meter
Velocidad:0.5km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al eje 2
K2+140 hacia menores



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

sábado, 8 de febrero de 2025, 10:49:14 p.m.
1° 24' 17" N, 77° 17' 18" W
291° W
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1777.6meter
Velocidad:0.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 2 al eje 3
K2+125 hacia menores



ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 4, actualizando la línea base 2 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 1 correspondiente a la Prórroga No. 1 el día 16 de diciembre de 2024, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2024, tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025. 	
	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
