



	INFORME SEMANAL	VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
		FECHA	20/11/2023	
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				
DATOS GENERALES				
Semana No.	27	Plazo total (días)	210	
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	182	
Del	11/02/2025	% de tiempo transcurrido	86,67%	
Al	17/02/2025	Interventoría	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 747.291.222,08	Valor ejecutado	\$ 87.883.800,00	-\$ 659.407.422,08
Porcentaje programado	8,61%	Porcentaje ejecutado	1,01%	-7,60%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 6.661.249.931,00	Valor ejecutado	\$ 668.111.561,36	-\$ 5.993.138.369,64
Porcentaje programado	76,74%	Porcentaje ejecutado	7,70%	-69,04%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL - PLAN DE CONTINGENCIA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 0,00	Valor ejecutado	\$ 87.883.800,00	\$ 87.883.800,00
Porcentaje programado	0,00%	Porcentaje ejecutado	1,01%	1,01%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA - PLAN DE CONTINGENCIA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 1.019.812.860,00	Valor ejecutado	\$ 661.606.460,30	-\$ 358.206.399,70
Porcentaje programado	11,75%	Porcentaje ejecutado	7,62%	-4,13%
DATOS DEL CONTRATO				
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista: CONSORCIO ALFA		Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.		
Contrato No.: 23001138 H4 DE 2024		Contrato No.: 23001299 H3 DE 2024		
Valor inicial: \$ 8.706.192.504,00		Valor inicial: \$ 684.322.873,00		
Valor Actualizado al modificatorio: NA		Valor actualizado al modificatorio: NA		
Valor actualizado 2: NA		Valor actualizado 2: NA		
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		
Plazo actualizado: NA		Plazo actualizado: NA		
Fecha de iniciación: 13/08/2024		Fecha de iniciación: 13/08/2024		
Fecha de vencimiento: 16/12/2024		Fecha de vencimiento: 16/12/2024		
Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1 Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1 Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1 17/03/2025		Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1 17/03/2025		
Suspensión No.: NA		Suspensión No.: NA		
Periodo de Suspensión No.: NA		Periodo de Suspensión No.: NA		
Levantamiento de la suspensión No.: NA		Levantamiento de la Suspensión No.: NA		
Nueva fecha de terminación 17/03/2025		Nueva fecha de terminación: 17/03/2025		
Valor total actual del contrato \$ 8.706.192.504,00		Valor total actual del contrato: \$ 684.322.873,00		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA				
ACTIVIDADES LADO AIRE		ACTIVIDADES LADO TIERRA		
* Acopio de material tolerable * Se localiza y se Replantea puntos de Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K2+140 al K2+050, del Eje No. 3 al Eje No. 2 desde el K2+140 al K2+050 y del Eje No. 2 al Eje No. 1 desde el K2+140 al K1+987 en el Costado Nor Este y del Eje No. 1 al Eje No. 2 del K1+210 al K1+300 en el Costado Nor Oeste. * Se realiza la Excavación de Material No Clasificado de Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K2+140 al K2+050, del Eje No. 3 al Eje No. 2 desde el K2+140 al K2+050 y del Eje No. 2 al Eje No. 1 desde el K2+140 al K1+987 en el Costado Nor Este y del Eje No. 1 al Eje No. 2 del K1+210 al K1+300 en el Costado Nor Oeste. * Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K2+140 al K2+050, del Eje No. 3 al Eje No. 2 desde el K2+140 al K2+050 y del Eje No. 2 al Eje No. 1 desde el K2+140 al K1+987 en el Costado Nor Este y del Eje No. 1 al Eje No. 2 del K1+210 al K1+300 en el Costado Nor Oeste.		N.A.		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Mediante el comunicado T-003-2024-127-OFC de fecha 12 de febrero 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Remisión del Informe semanal No. 26 del contrato de interventoría No. 23001299 H3 DE 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-128-OFC de fecha 12 de febrero 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Suspensión inmediata de disposición de RCD en las instalaciones del Aeropuerto Antonio Nariño - Requerimiento disposición final de RCD en sitio autorizado y ajuste del balance de obra del Contrato de Obra No. 23001138 H4 de 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-129-OFC de fecha 12 de febrero 2025 se remitió a la AEROCIVIL Respuesta al comunicado C-ALFA-098-2024 – Remisión del Programa detallado de trabajo – PDT del Plan de contingencia aprobado del contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-130-OFC de fecha 12 de febrero 2025 se remitió a la AEROCIVIL el Informe Mensual No. 6 correspondiente al mes de enero de 2025. Mediante el comunicado T-003-2024-131-OFC de fecha 13 de febrero 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Solicitud de Información sobre rendimientos y costos de disposición de material producto de excavación en Cantera ROSAPAMBA del Contrato de Obra No. 23001138 H4 de 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-132-OFC de fecha 14 de febrero 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Reiteración de la afectación económica al contrato de interventoría de la referencia.				
ACTIVIDADES AMBIENTALES				
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental mediante el comunicado T-003-2024-080-OFC de fecha 1 de noviembre de 2024.				
ACTIVIDADES SISTEMA SST				
* Inducción a nuevo personal (operadores de maquinaria) * Entrega y reposición de dotación y EPP. * Preoperacionales de maquinaria y vehículos. * Verificación de uso adecuado de EPP. * Inspección en campo de áreas que requieren señalizaciones preventivas. * Organización de bodega.				

AVANCE CANTIDADES						
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				Semana No. 27 (11 Febr - 17 Febr)		
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado
2.4	ZONA 1 - NORESTE	67,95%	\$ 5.898.037.908			
2.4.1	Inicio Zona 2	0,00%	\$ -			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	2,38%	\$ 321.838.028,00	669,00	\$ 5.485.800,00	1,70%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	32,84%	\$ 1.286.099.880,00		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	12,31%	\$ 1.405.900.000,00	669,00	\$ 56.865.000,00	4,04%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	27,99%	\$ 2.424.400.000,00		\$ -	
2.4.6	REGIO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00%	\$ -		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	5,31%	\$ 459.800.000,00		\$ -	
2.4	ZONA 2 - NOROESTE	31,02%	\$ 2.692.315.092			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	2,38%	\$ 148.020.332,00	315,00	\$ 2.583.000,00	1,75%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	32,84%	\$ 606.276.575,00		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	12,31%	\$ 675.108.250,00	270,00	\$ 22.950.000,00	3,40%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	27,99%	\$ 1.061.576.935,00		\$ -	
2.4.6	REGIO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00%	\$ -		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	5,31%	\$ 201.333.000,00		\$ -	
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO			\$ 8.680.422.500,00		\$ 87.883.800,00	

AVANCE FINANCIERO

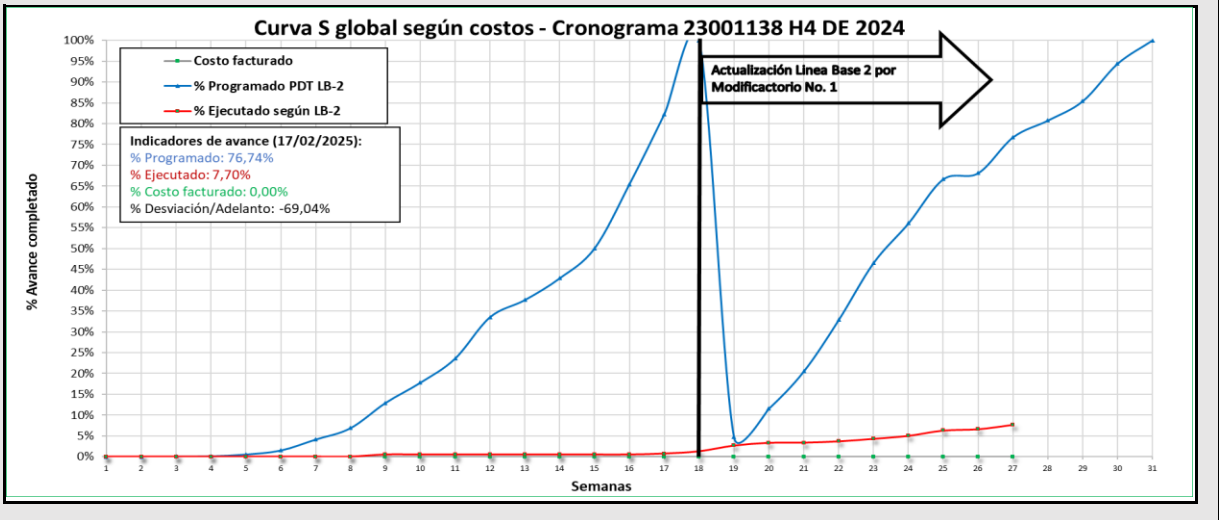

AVANCE FINANCIERO - PLAN DE CONTINGENCIA

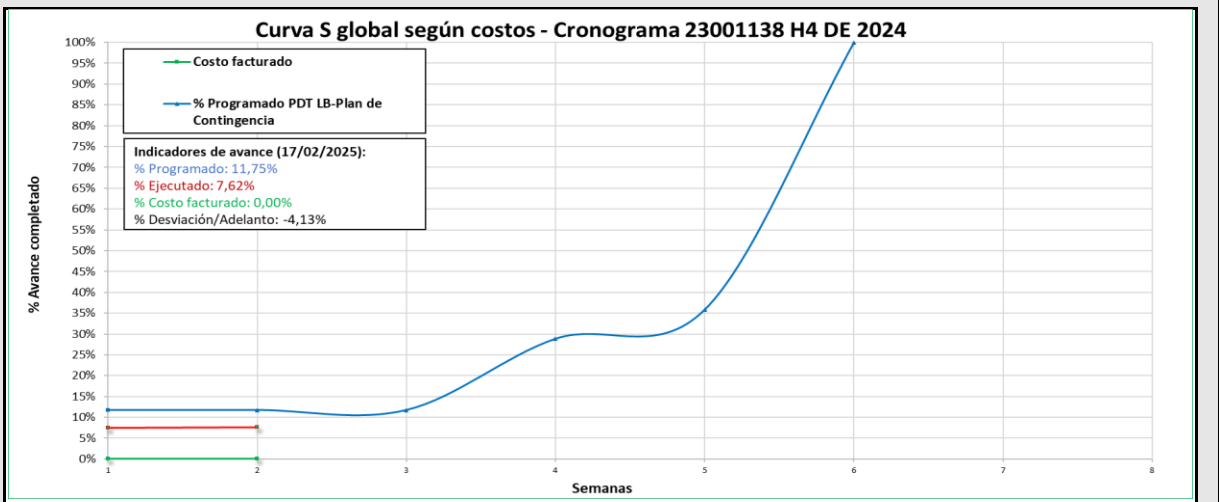



CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO		EJECUTADO	PROGRAMADO		EJECUTADO
Valor	\$ 747.291.222,08	Valor	\$ 87.883.800,00	Valor	\$ 6.661.249.931,00
Porcentaje	8,61%	Porcentaje	1,01%	Porcentaje	76,74%
				Valor	\$ 668.111.561,36
				Porcentaje	7,70%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE - PLAN DE CONTINGENCIA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO		EJECUTADO	PROGRAMADO		EJECUTADO
Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 87.883.800,00	Valor	\$ 1.019.812.860,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	1,01%	Porcentaje	11,75%
				Valor	\$ 661.606.460,30
				Porcentaje	7,62%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO		EJECUTADO	PROGRAMADO		EJECUTADO
Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%
				Valor	\$ 0,00
				Porcentaje	0,00%



PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS
------------------	--------------------------------


TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Residente de Obra	1
	Especialista Ambiental	1
	Especialista en Pavimentos	1
	Especialista en Hidráulica	1
	Gerente de Proyectos PMP	1
	Inspectora SISOMA	1
	Topógrafo	1
	Cadeneros	1
MANO DE OBRA	Operadores de Maquinaria	10
	Mecánico	1
	Ayudante	13
	Conductor Volqueta	11

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	2
Excavadora de Orugas	3
Vibrocompactadores	3
Bulldozer	2
Carrotanque	1
Retrocargador (Pajarita)	1
Luminarias	7
Camioneta Doble Cabina	1
Compresor	1

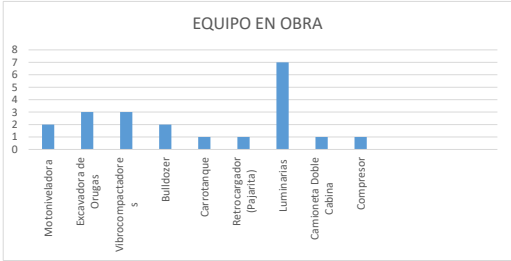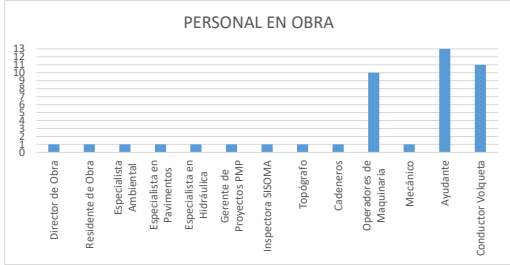

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FRENTE No. 1 - FRANJA NORESTE

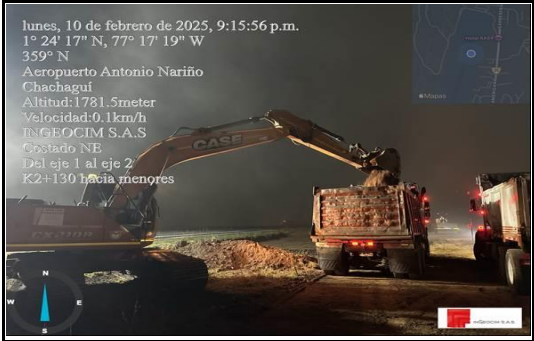

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

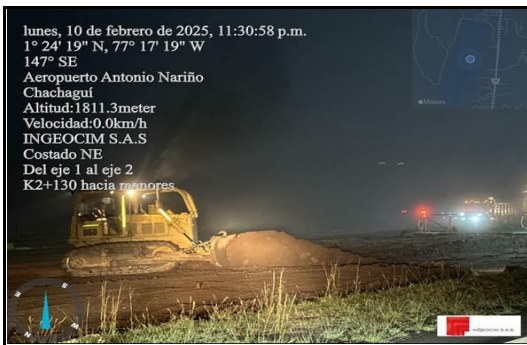


lunes, 10 de febrero de 2025, 11:30:58 p.m.
1° 24' 19" N, 77° 17' 19" W
147° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1811.3meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al eje 2
K2+130 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

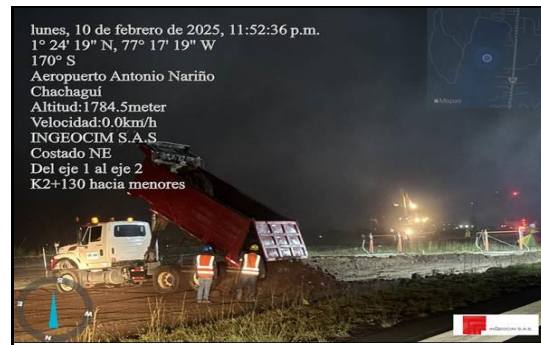


lunes, 10 de febrero de 2025, 11:52:36 p.m.
1° 24' 19" N, 77° 17' 19" W
170° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1784.5meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al eje 2
K2+130 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

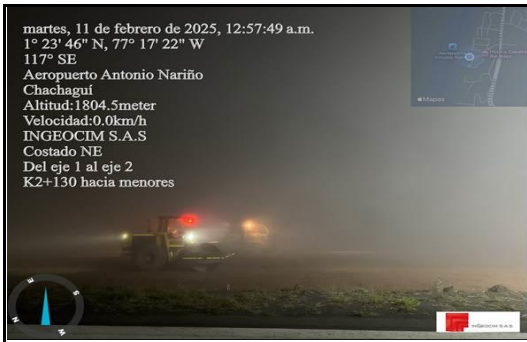


martes, 11 de febrero de 2025, 12:57:49 a.m.
1° 23' 46" N, 77° 17' 22" W
117° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1804.5meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al eje 2
K2+130 hacia menores

ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

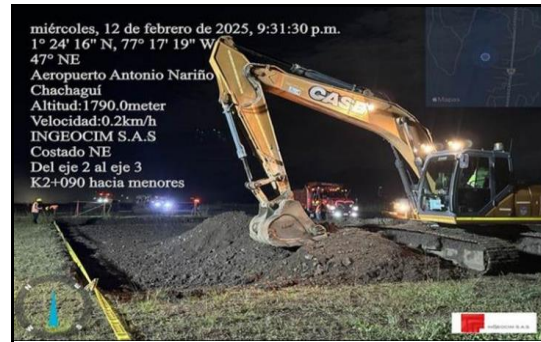


miércoles, 12 de febrero de 2025, 9:31:30 p.m.
1° 24' 16" N, 77° 17' 19" W
47° NE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1790.0meter
Velocidad: 0.2km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 2 al eje 3
K2+090 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

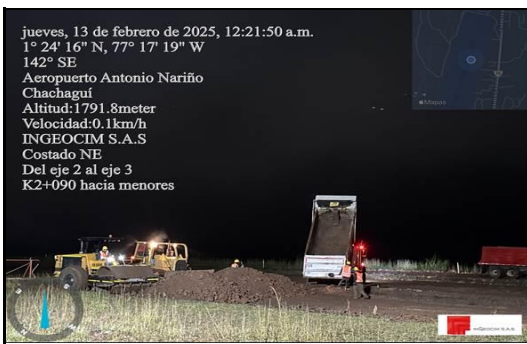


jueves, 13 de febrero de 2025, 12:21:50 a.m.
1° 24' 16" N, 77° 17' 19" W
142° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1791.8meter
Velocidad: 0.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 2 al eje 3
K2+090 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

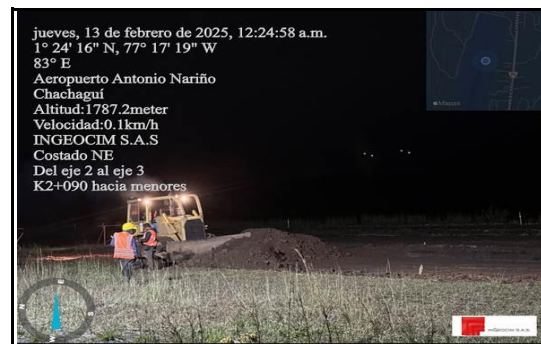


jueves, 13 de febrero de 2025, 12:24:58 a.m.
1° 24' 16" N, 77° 17' 19" W
83° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1787.2meter
Velocidad: 0.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 2 al eje 3
K2+090 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

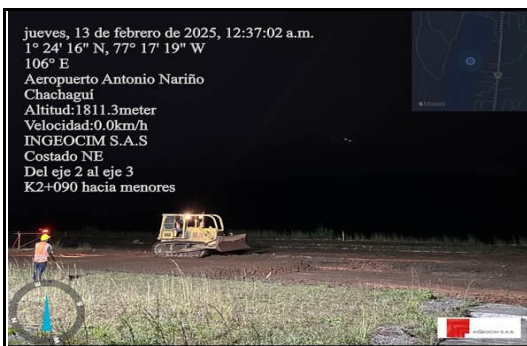

jueves, 13 de febrero de 2025, 12:37:02 a.m.
1° 24' 16" N, 77° 17' 19" W
106° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1811.3meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 2 al eje 3
K2+090 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

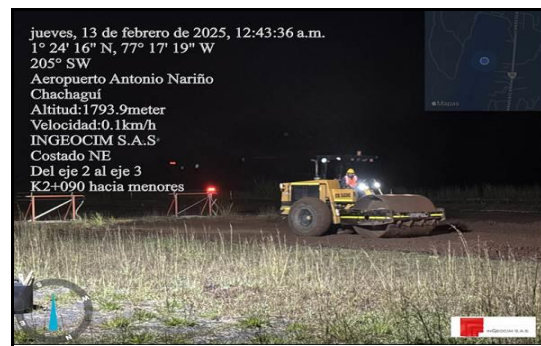

jueves, 13 de febrero de 2025, 12:43:36 a.m.
1° 24' 16" N, 77° 17' 19" W
205° SW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1793.9meter
Velocidad: 0.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 2 al eje 3
K2+090 hacia menores

ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



viernes, 14 de febrero de 2025, 11:16:33 a.m.
1° 23' 41" N, 77° 17' 29" W
92° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1727.0meter
Velocidad: 1.4km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al eje 2
K2+070 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



viernes, 14 de febrero de 2025, 8:29:25 p.m.
1° 24' 16" N, 77° 17' 19" W
144° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1800.3meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al eje 2
K2+070 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



viernes, 14 de febrero de 2025, 8:38:25 p.m.
1° 24' 16" N, 77° 17' 19" W
59° NE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1776.7meter
Velocidad: 0.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al eje 2
K2+070 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




sábado, 15 de febrero de 2025, 12:34:48 a.m.
1° 24' 15" N, 77° 17' 19" W
102° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1789.5meter
Velocidad: 0.3km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al eje 2
K2+070 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

FRENTE No. 2 - FRANJA NOROESTE

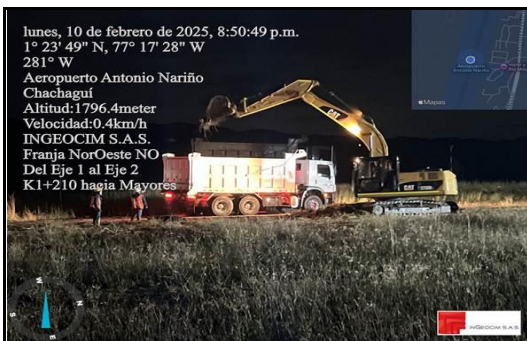

lunes, 10 de febrero de 2025, 8:50:49 p.m.
1° 23' 49" N, 77° 17' 28" W
281° W
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1796.4meter
Velocidad: 0.4km/h
INGEOCIM S.A.S
Franja NorOeste NO
Del Eje 1 al Eje 2
K1+210 hacia Mayores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

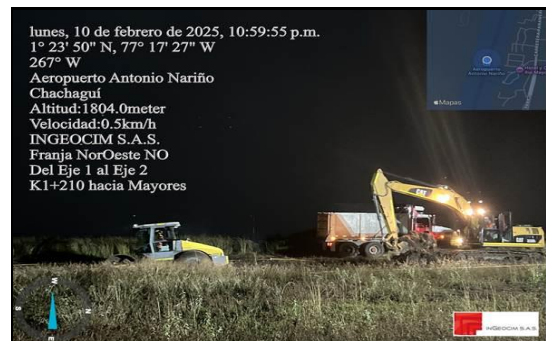


lunes, 10 de febrero de 2025, 10:59:55 p.m.
1° 23' 50" N, 77° 17' 27" W
267° W
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1804.0meter
Velocidad: 0.5km/h
INGEOCIM S.A.S
Franja NorOeste NO
Del Eje 1 al Eje 2
K1+210 hacia Mayores


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

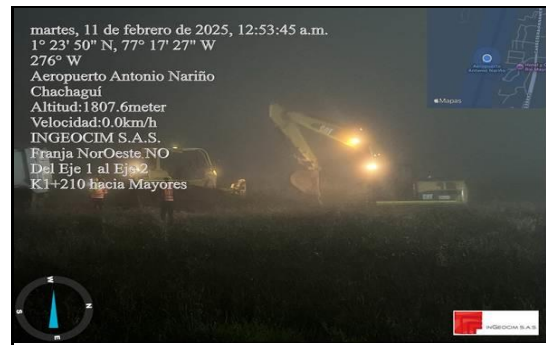


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

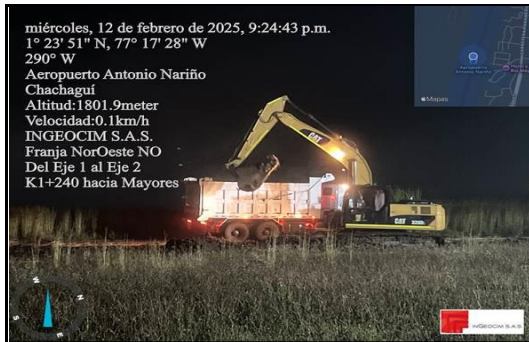

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

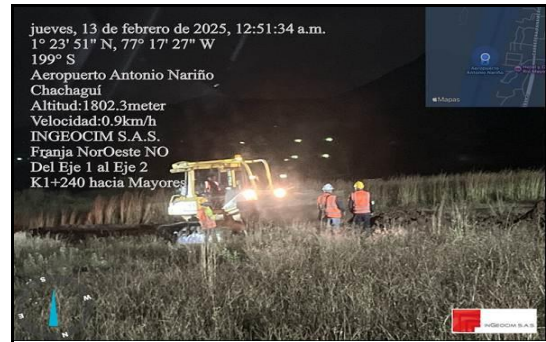


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

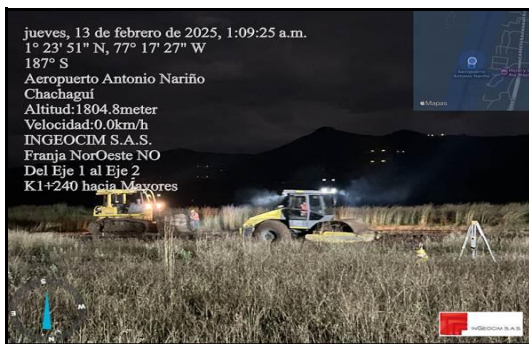

ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

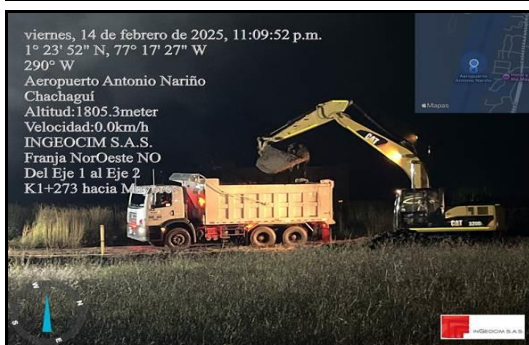

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

sábado, 15 de febrero de 2025, 9:10:36 p.m.
1° 23' 45" N, 77° 17' 23" W
283° W
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1804.7meter
Velocidad:0.1km/h
INGEOCIM S.A.S.
Franja NorOeste NO
Del Eje 1 al Eje 2
K1+282 hacia Mayores



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

sábado, 15 de febrero de 2025, 10:33:40 p.m.
1° 23' 53" N, 77° 17' 27" W
175° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1800.0meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Franja NorOeste NO
Del Eje 1 al Eje 2
K1+282 hacia Mayores

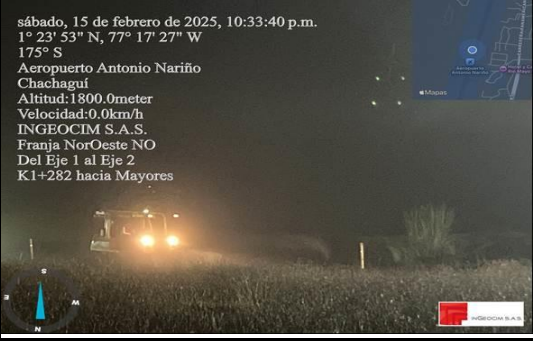

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 4, actualizando la línea base 2 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 1 correspondiente a la Prórroga No. 1 el día 16 de diciembre de 2024, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2024, tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025. De igual manera se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo PDT del plan de contingencia, aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-129-OFC de fecha 12 de febrero de 2025, remitido a la AEROCIVIL.	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
