

	INFORME SEMANAL		VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
			FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				

DATOS GENERALES					
Semana No.		29	Plazo total (días)		210
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)		196	
Del		25/02/2025	% de tiempo transcurrido		93,33%
Al		3/03/2025	Interventoría		GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 403.834.513,80	Valor ejecutado	\$ 185.158.100,00	-\$ 218.676.413,80
Porcentaje programado	4,65%	Porcentaje ejecutado	2,13%	-2,52%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 7.415.074.356,76	Valor ejecutado	\$ 965.014.745,80	-\$ 6.450.059.610,96
Porcentaje programado	85,42%	Porcentaje ejecutado	11,12%	-74,31%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL - PLAN DE CONTINGENCIA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 1.487.432.880,00	Valor ejecutado	\$ 185.158.100,00	-\$ 1.302.274.780,00
Porcentaje programado	17,14%	Porcentaje ejecutado	2,13%	-15,00%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA - PLAN DE CONTINGENCIA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 2.507.245.740,00	Valor ejecutado	\$ 953.554.841,32	-\$ 1.553.690.898,68
Porcentaje programado	28,88%	Porcentaje ejecutado	10,99%	-17,90%

DATOS DEL CONTRATO				
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista: CONSORCIO ALFA			Contratista : GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	
Contrato No: 23001138 H4 DE 2024			Contrato No : 23001299 H3 DE 2024	
Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00			Valor inicial : \$ 684.322.873,00	
Valor Actualizado al modificadorio : NA			Valor actualizado al modificadorio : NA	
Valor actualizado 2: NA			Valor actualizado 2 : NA	
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.			Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.	
Plazo actualizado: NA			Plazo actualizado : NA	
Fecha de iniciación: 13/08/2024			Fecha de iniciación : 13/08/2024	
Fecha de vencimiento: 16/12/2024			Fecha de vencimiento : 16/12/2024	
Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1 Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.			Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1 : Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.	
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1 17/03/2025			Fecha de Terminación Según Prórroga No.1 : 17/03/2025	
Suspensión No. NA			Suspensión No. : NA	
Periodo de Suspensión No. NA			Periodo de Suspensión No. : NA	
Levantamiento de la suspensión No. NA			Levantamiento de la Suspensión No. : NA	
Nueva fecha de terminación 17/03/2025			Nueva fecha de terminación : 17/03/2025	
Valor total actual del contrato \$ 8.706.192.504,00			Valor total actual del contrato : \$ 684.322.873,00	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
ACTIVIDADES LADO AIRE	ACTIVIDADES LADO TIERRA
* Acopio de material tolerable * Se localiza y se Replantea puntos de Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+890 al K1+780, del Eje No. 3 al Eje No. 2 desde el K1+973 al K1+780 y del Eje No. 2 al Eje No. 1 desde el K1+940 al K1+780 en el Costado Nor Este y del Eje No. 1 al Eje No. 2 del K1+360 al K1+530 en el Costado Nor Oeste. * Se realiza la Excavación de Material No Clasificado de Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+890 al K1+780, del Eje No. 3 al Eje No. 2 desde el K1+973 al K1+780 y del Eje No. 2 al Eje No. 1 desde el K1+940 al K1+780 en el Costado Nor Este y del Eje No. 1 al Eje No. 2 del K1+360 al K1+530 en el Costado Nor Oeste. * Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+890 al K1+780, del Eje No. 3 al Eje No. 2 desde el K1+973 al K1+780 y del Eje No. 2 al Eje No. 1 desde el K1+940 al K1+780 en el Costado Nor Este y del Eje No. 1 al Eje No. 2 del K1+360 al K1+530 en el Costado Nor Oeste.	N.A.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Mediante el comunicado T-003-2024-141-OFC de fecha 22 de febrero 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA el Requerimiento solicitud de adición y prórroga del contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-142-OFC de fecha 26 de febrero 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Respuesta al comunicado C-ALFA-105-2025 - C-ALFA-113-2025 – Observaciones a la solicitud de Prórroga del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024. . Mediante el comunicado T-003-2024-143-OFC de fecha 26 de febrero 2025 se remitió a la AEROCIVIL el Alcance oficio T-003-2024-139-OFC Correo electrónico del 25 de febrero de 2025 - Grupo de Gestión Ambiental y Control de Fauna de la AEROCIVIL. Mediante el comunicado T-003-2024-144-OFC de fecha 27 de febrero 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Recomendación suspensión contrato de contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y C de interventoría No. 23001299 H3 de 2024.



ACTIVIDADES AMBIENTALES
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental mediante el comunicado T-003-2024-080-OFC de fecha 1 de noviembre de 2024.

ACTIVIDADES SISTEMA SST
* Capacitación de riesgo químico - manejos de sustancias químicas. * Charla SST: reinducción en riesgo eléctrico. * Inducción a nuevo personal. * entrega de Epp y reposición y entrega periódica de los mismos. * verificación de extintores. * instalaciones de señalización preventiva costado noroeste. * verificación de Epp



AVANCE CANTIDADES						
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				Semana No. 29 (18 Febr - 24 Febr)		
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado
2.4	ZONA 1 - NORESTE	67,95%	\$ 5.898.037.908			
2.4.1	Inicio Zona 2	0,00%	\$ -			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	2,38%	\$ 321.838.028,00	1.620,50	\$ 13.288.100,00	4,13%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	32,84%	\$ 1.286.099.880,00		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	12,31%	\$ 1.405.900.000,00	1.389,00	\$ 118.065.000,00	8,40%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	27,99%	\$ 2.424.400.000,00		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00%	\$ -		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	5,31%	\$ 459.800.000,00		\$ -	
2.4	ZONA 2 - NOROESTE	31,02%	\$ 2.692.315.092			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	2,38%	\$ 148.020.332,00	1.275,00	\$ 10.455.000,00	7,06%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	32,84%	\$ 606.276.575,00		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	12,31%	\$ 675.108.250,00	510,00	\$ 43.350.000,00	6,42%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	27,99%	\$ 1.061.576.935,00		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00%	\$ -		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	5,31%	\$ 201.333.000,00		\$ -	
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO			\$ 8.680.422.500,00		\$ 185.158.100,00	
AVANCE FINANCIERO						

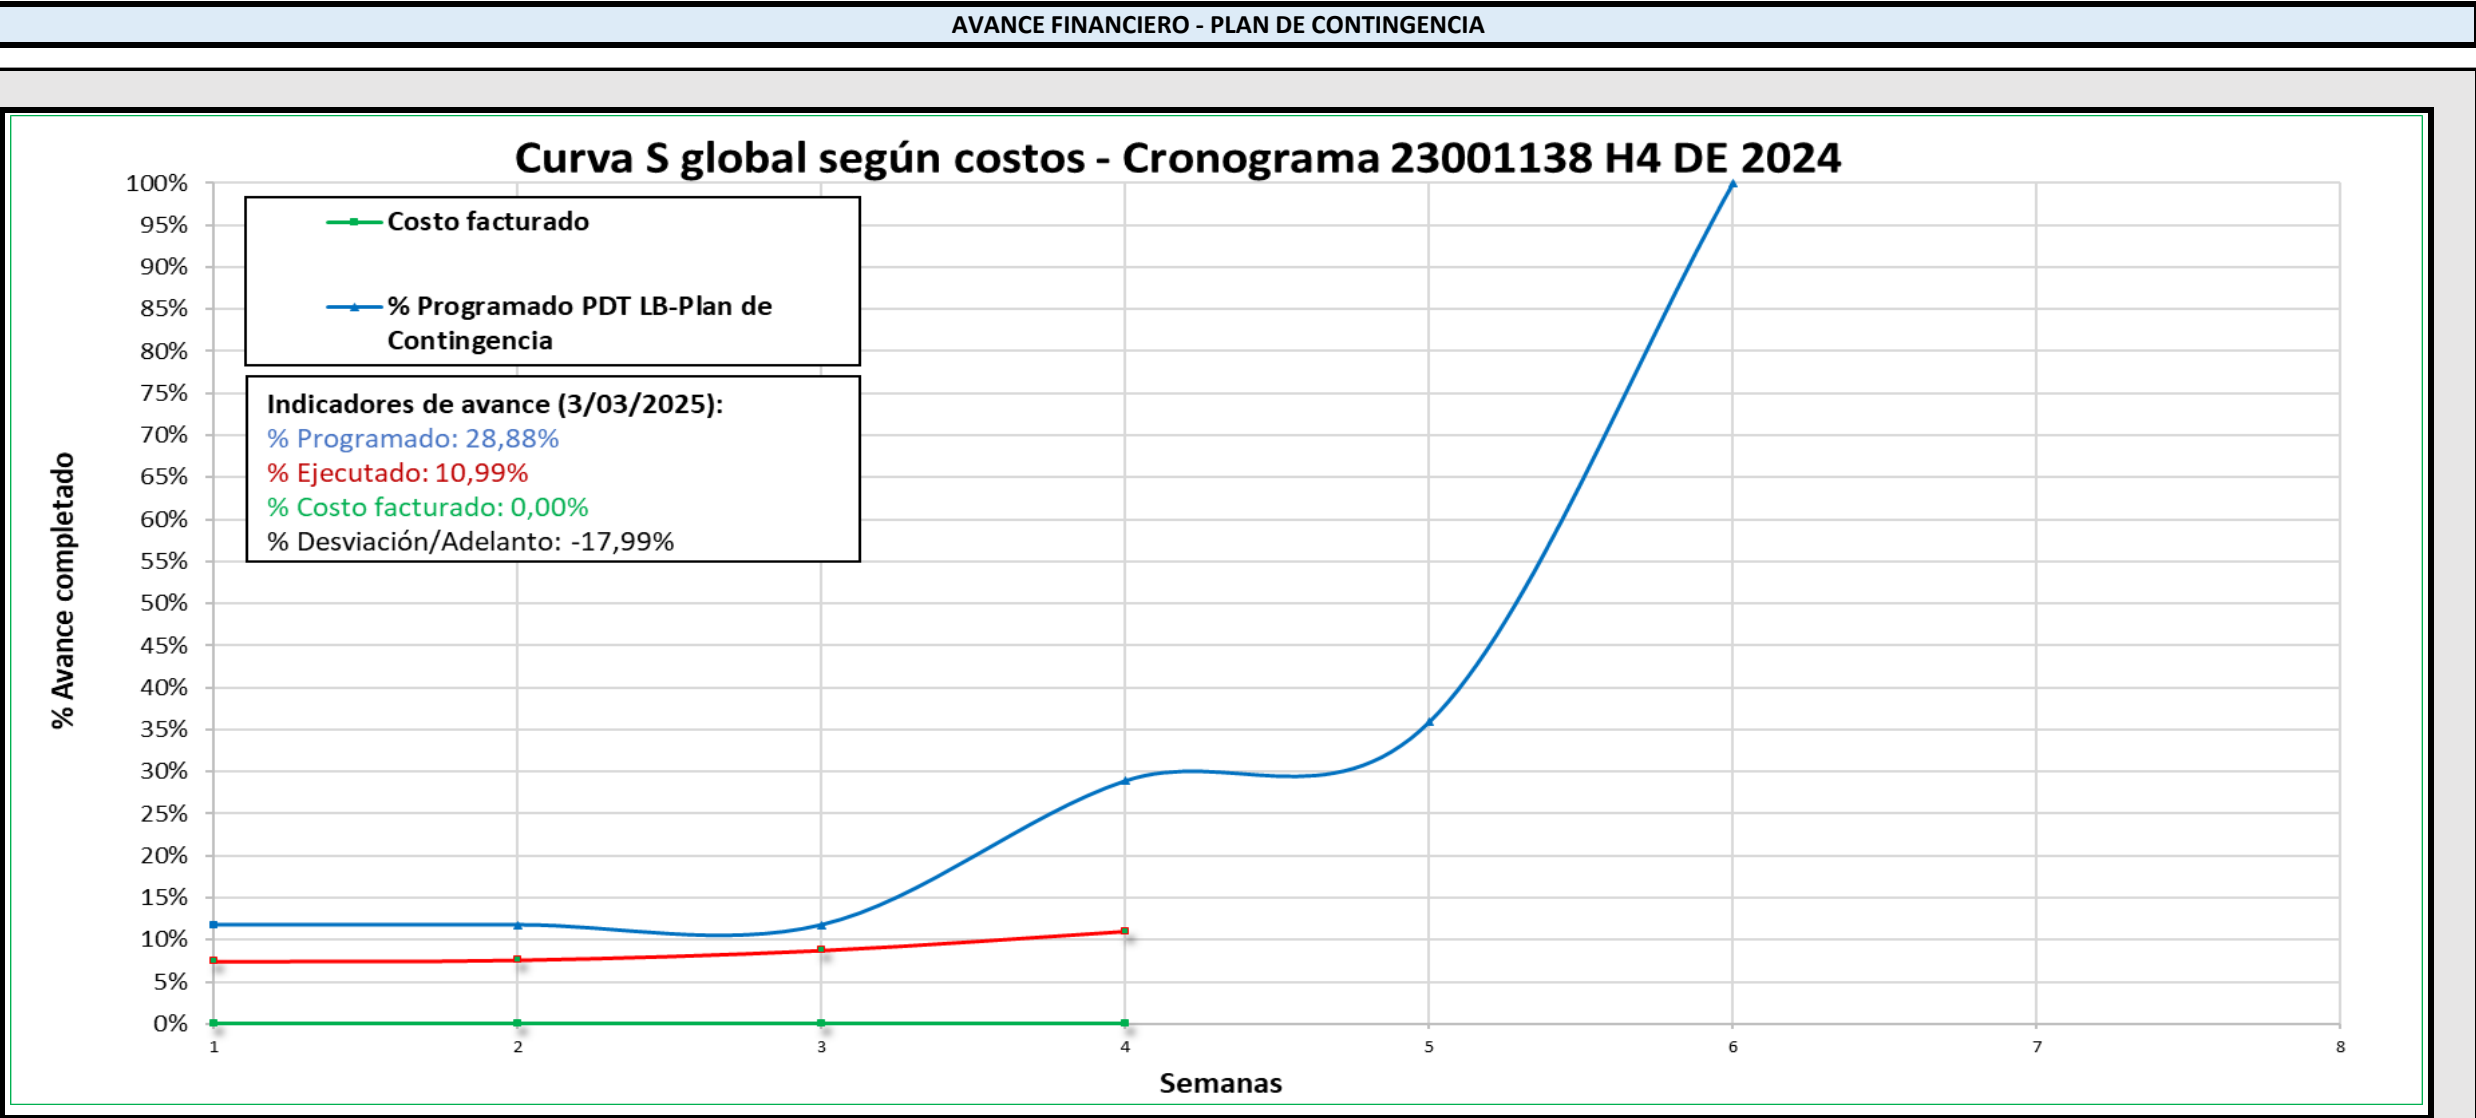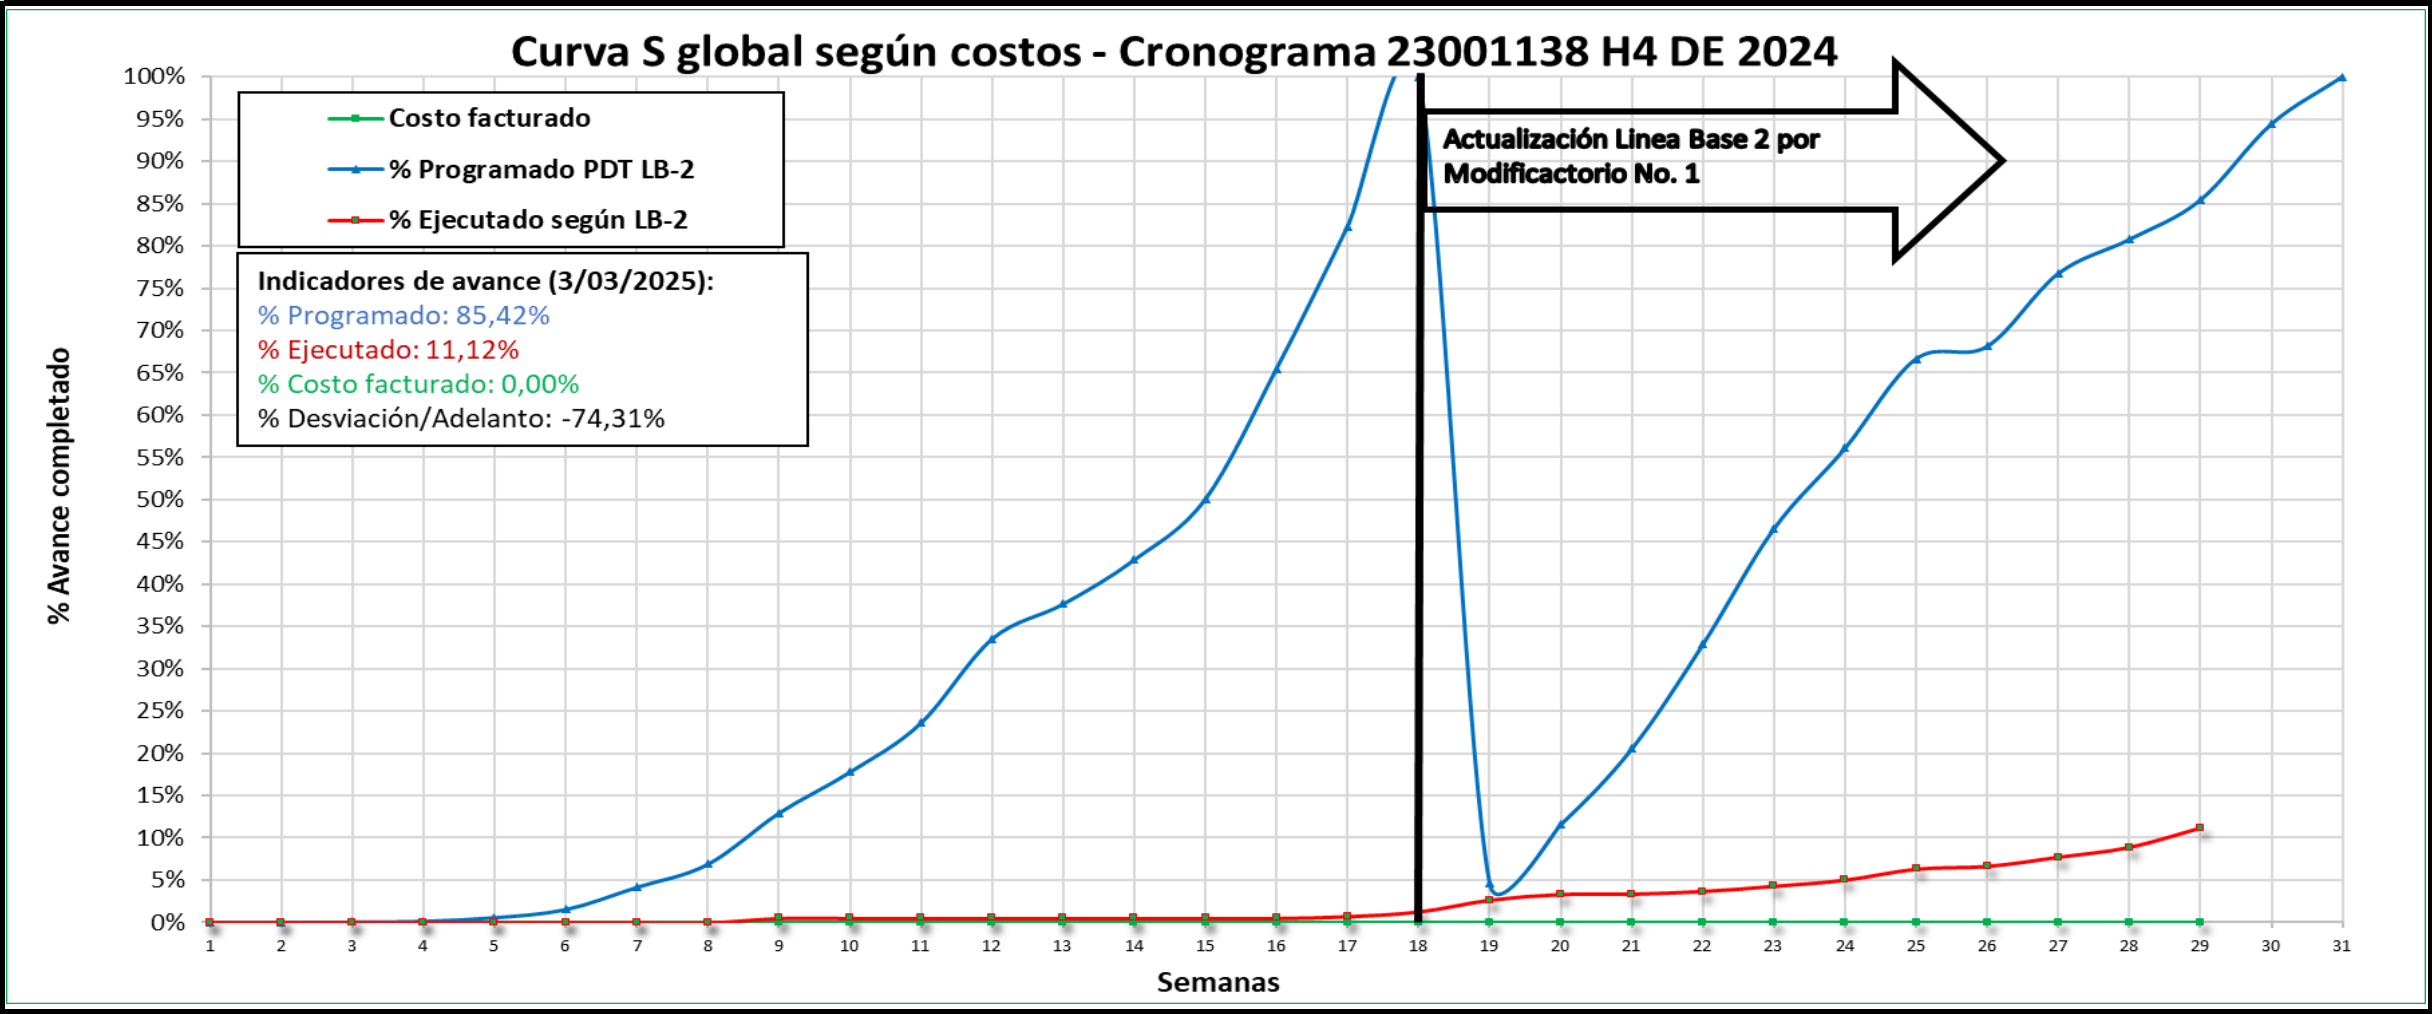

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO		EJECUTADO	PROGRAMADO		EJECUTADO
Valor	\$ 403.834.513,80	Valor	\$ 185.158.100,00	Valor	\$ 7.415.074.356,76
Porcentaje	4,65%	Porcentaje	2,13%	Porcentaje	85,42%
				Valor	\$ 965.014.745,80
				Porcentaje	11,12%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE - PLAN DE CONTINGENCIA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO		EJECUTADO	PROGRAMADO		EJECUTADO
Valor	\$ 1.487.432.880,00	Valor	\$ 185.158.100,00	Valor	\$ 2.507.245.740,00
Porcentaje	17,14%	Porcentaje	2,13%	Porcentaje	28,88%
				Valor	\$ 953.554.841,32
				Porcentaje	10,99%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO		EJECUTADO	PROGRAMADO		EJECUTADO
Valor		Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%
				Valor	\$ 0,00
				Porcentaje	0,00%

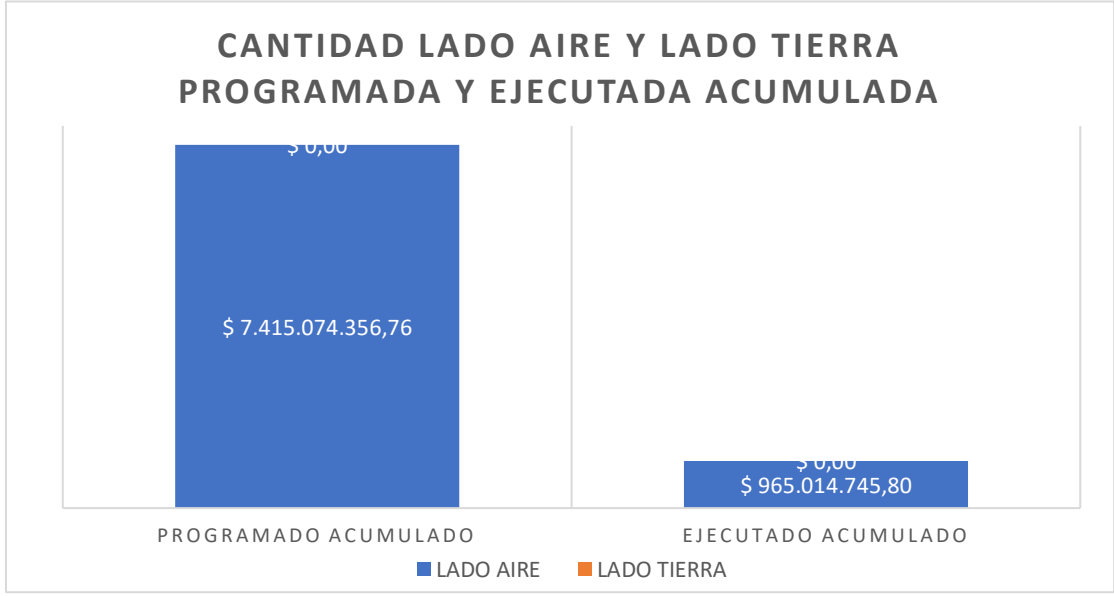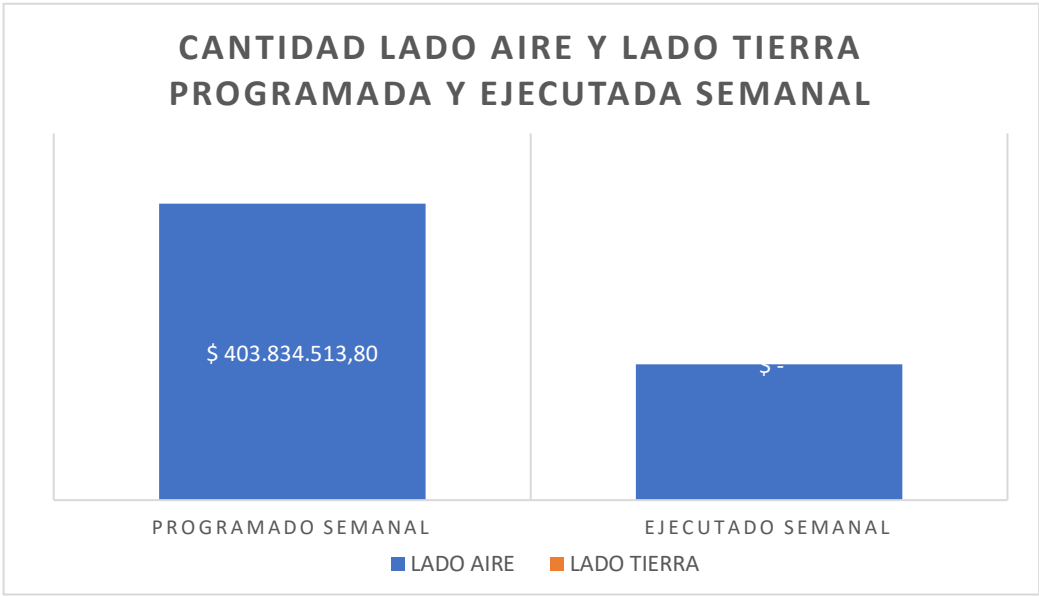

PERSONAL EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS	
TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1	Motoniveladora	2
	Residente de Obra	1	Excavadora de Orugas	3
	Especialista Ambiental	1	Vibrocompactadores	3
	Especialista en Pavimentos	1	Bulldozer	2
	Especialista en Hidráulica	1	Carrotanque	1
	Gerente de Proyectos PMP	1	Retrocargador (Pajarita)	1
	Inspectora SISOMA	1	Luminarias	7
	Topógrafo	1	Camioneta Doble Cabina	1
MANO DE OBRA	Cadeneros	1	Compresor	1
	Operadores de Maquinaria	12		
	Mecánico	1		
	Ayudante	15		
	Conductor Volqueta	13		

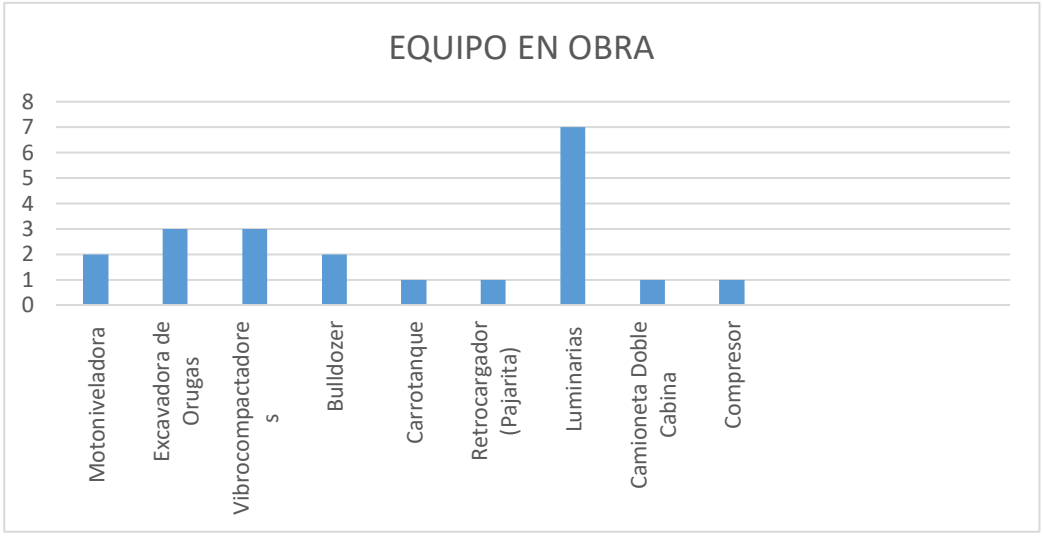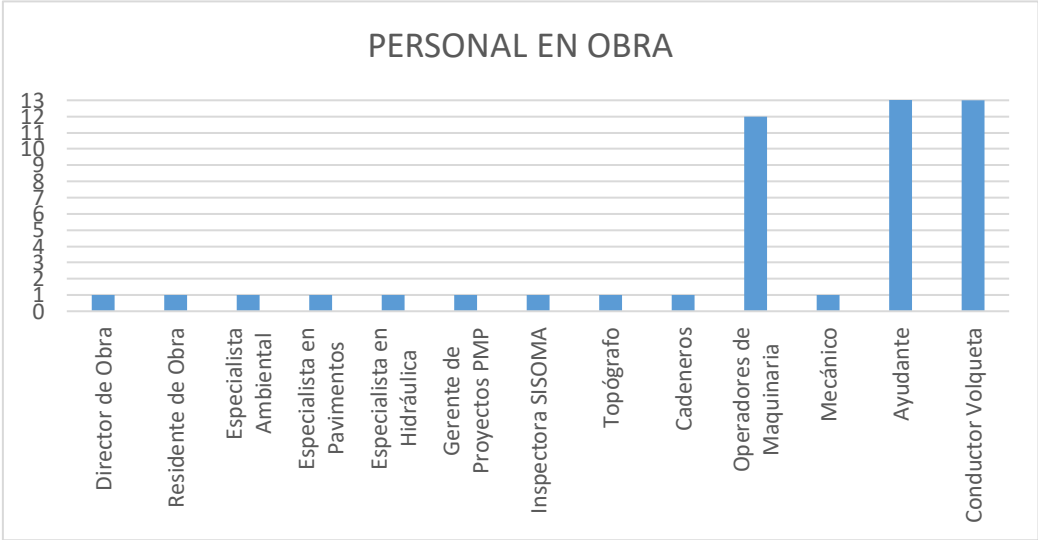

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FRENTÉ No. 1 - FRANJA NORESTE	
lunes, 24 febrero 2025 07:26p. m. 1°24'11"N 77°17'20"W 138° SE Chachagüí Altitud:1805.1m Velocidad:0.0km/h INGEOCIM S.A.S COSTADO NS EJE 1 Y 2 K1 + 900 ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	lunes, 24 febrero 2025 08:39p. m. 1°24'11"N 77°17'20"W 272° W Chachagüí Altitud:1804.6m Velocidad:0.0km/h INGEOCIM S.A.S COSTADO NS EJE 2 Y 3 K1 + 900 ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

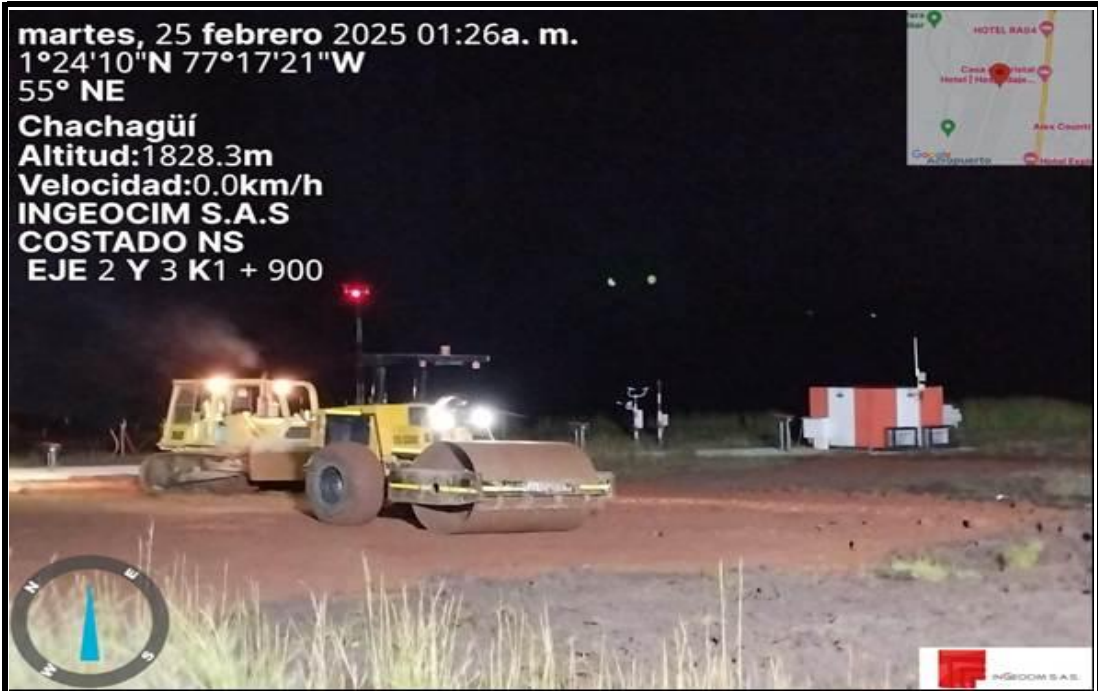

ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

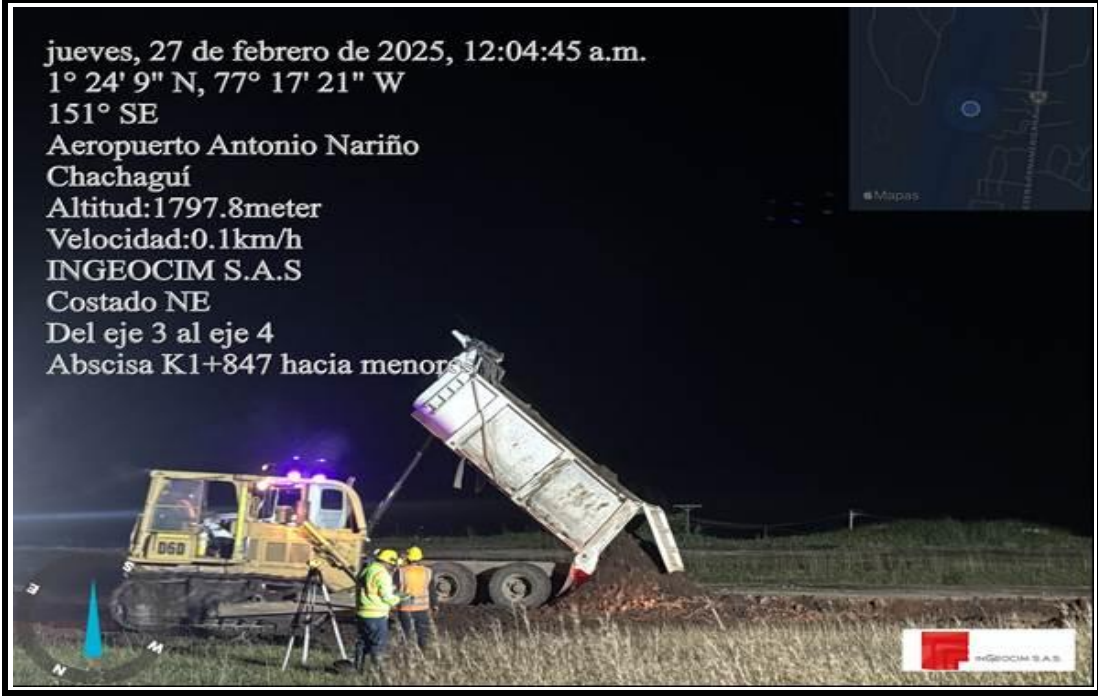

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

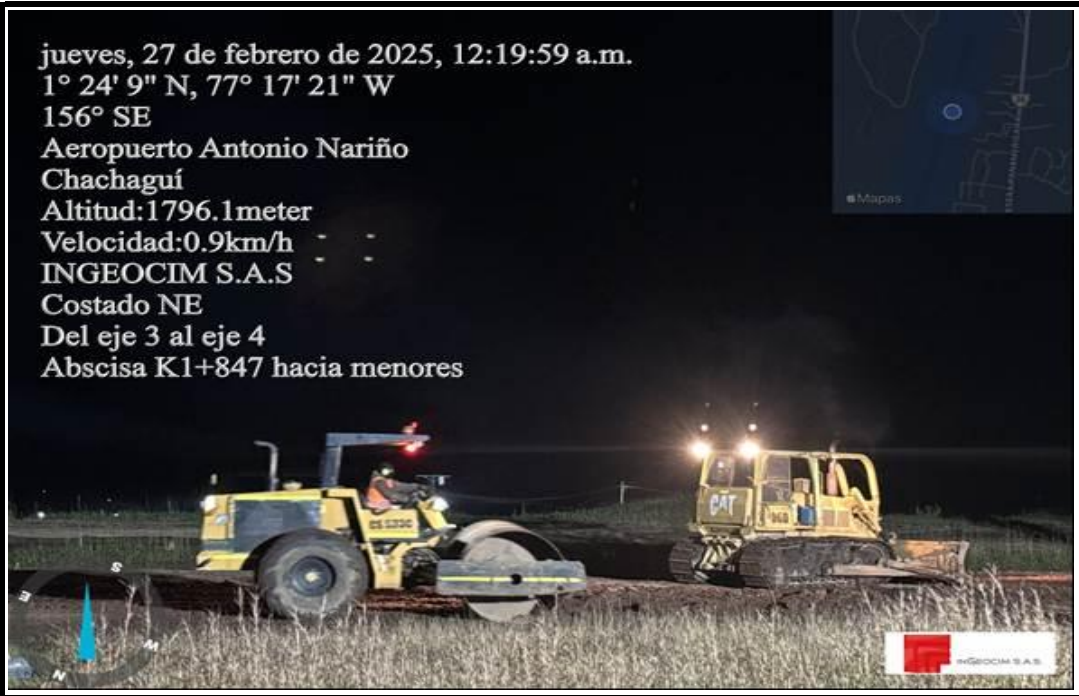


ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

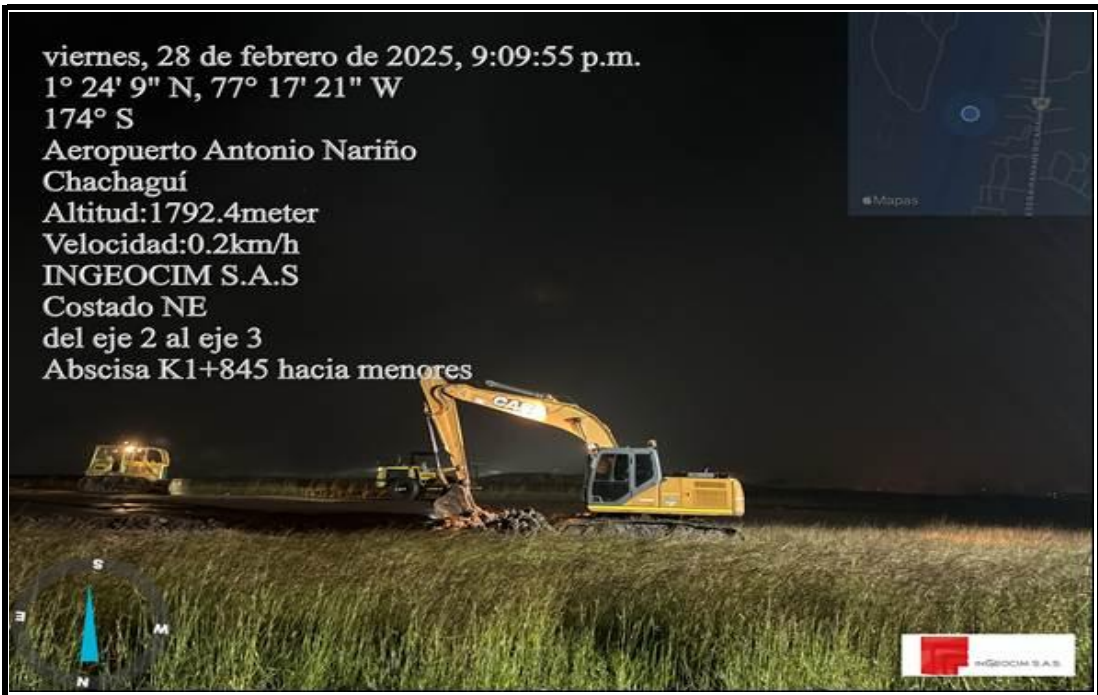

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

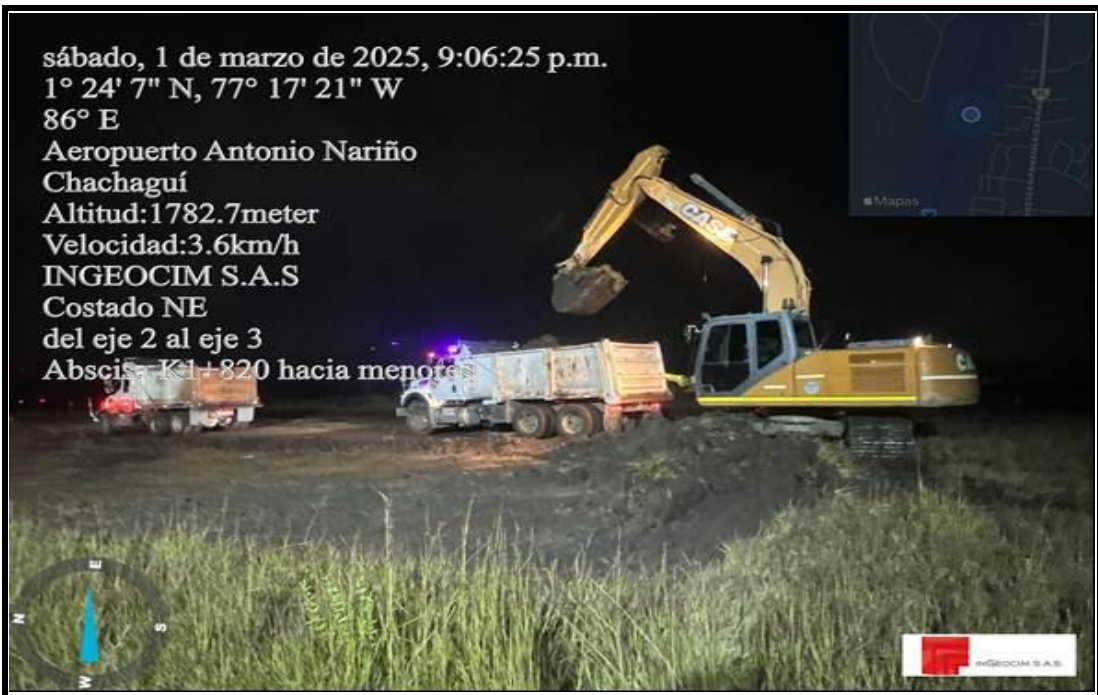

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

FRENTE No. 2 - FRANJA NOROESTE

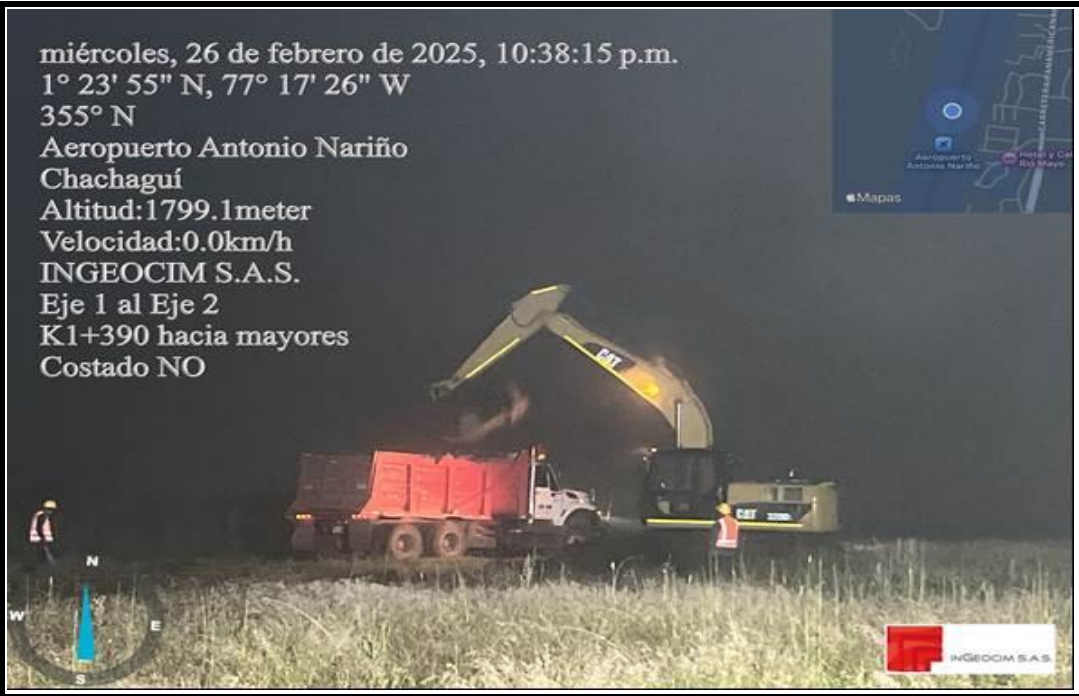

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

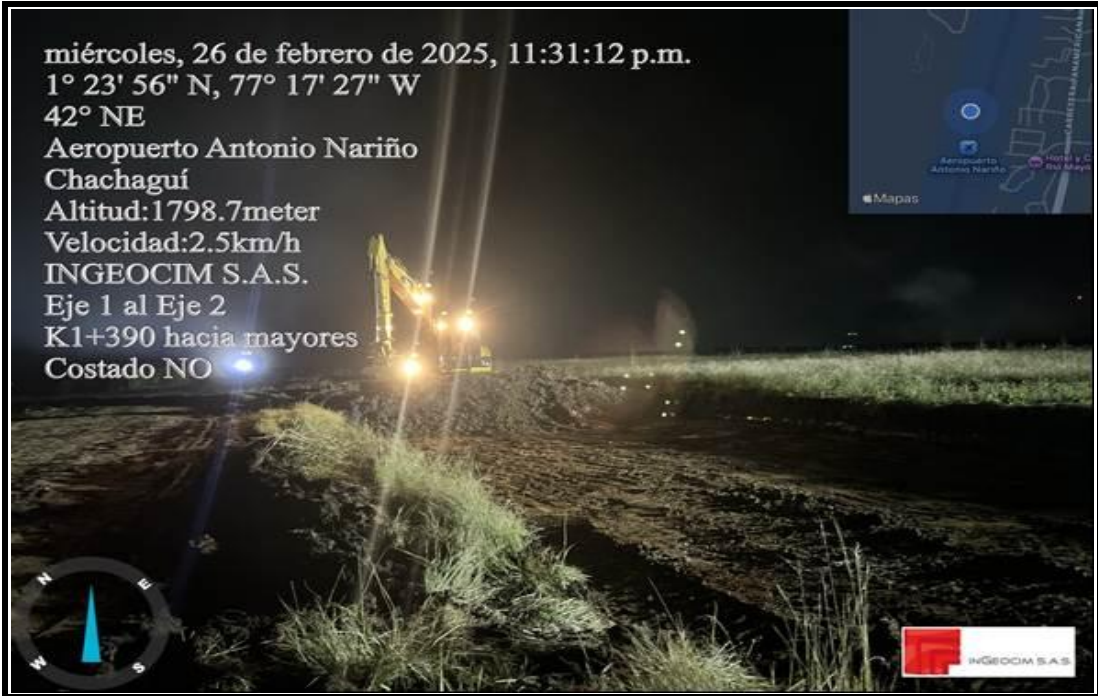


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

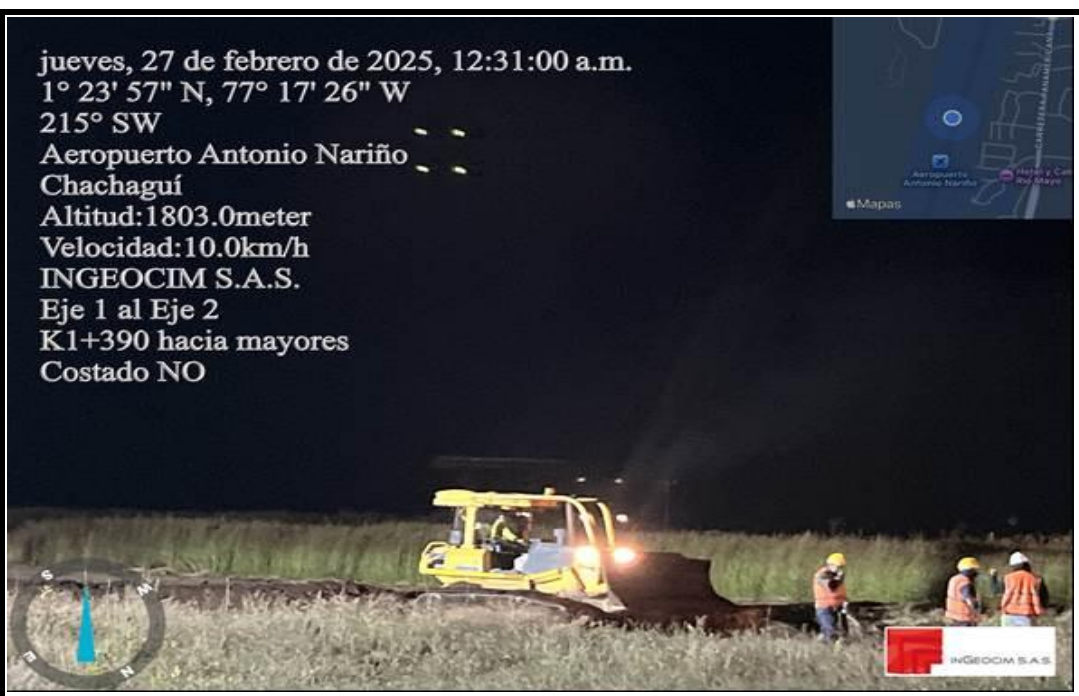

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

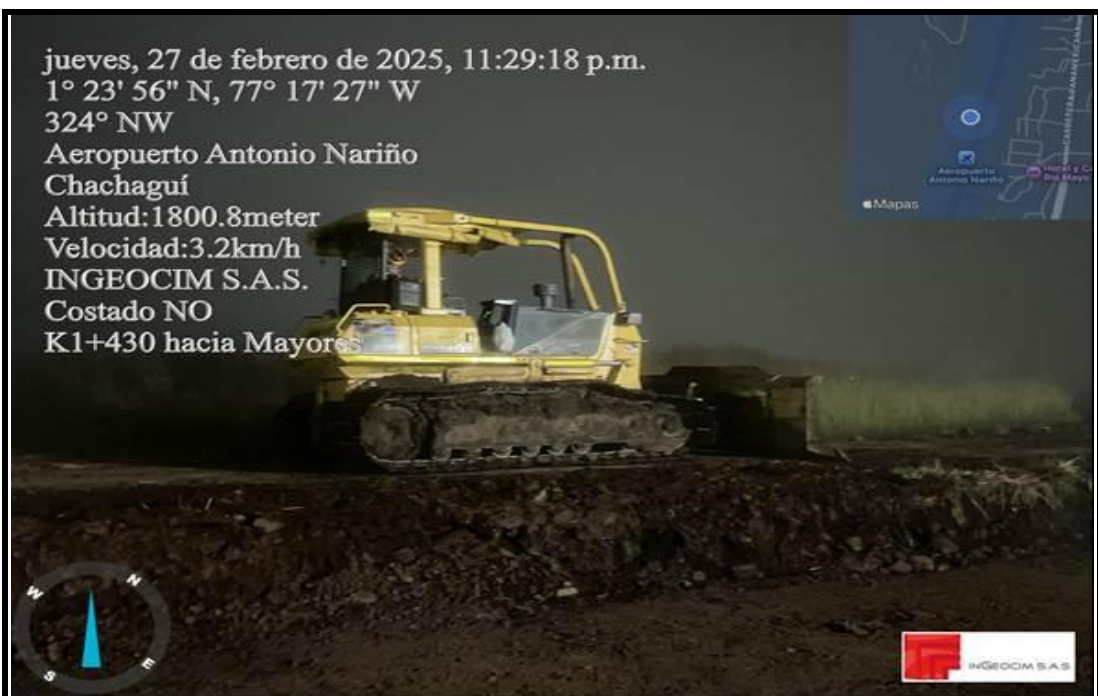

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




viernes, 28 de febrero de 2025, 11:49:17 a.m.
1° 23' 41" N, 77° 17' 20" W
48° NE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1785.6meter
Velocidad: 1.5km/h
INGEOCIM S.A.S.

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




viernes, 28 de febrero de 2025, 11:51:55 a.m.
1° 23' 41" N, 77° 17' 20" W
48° NE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1784.9meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

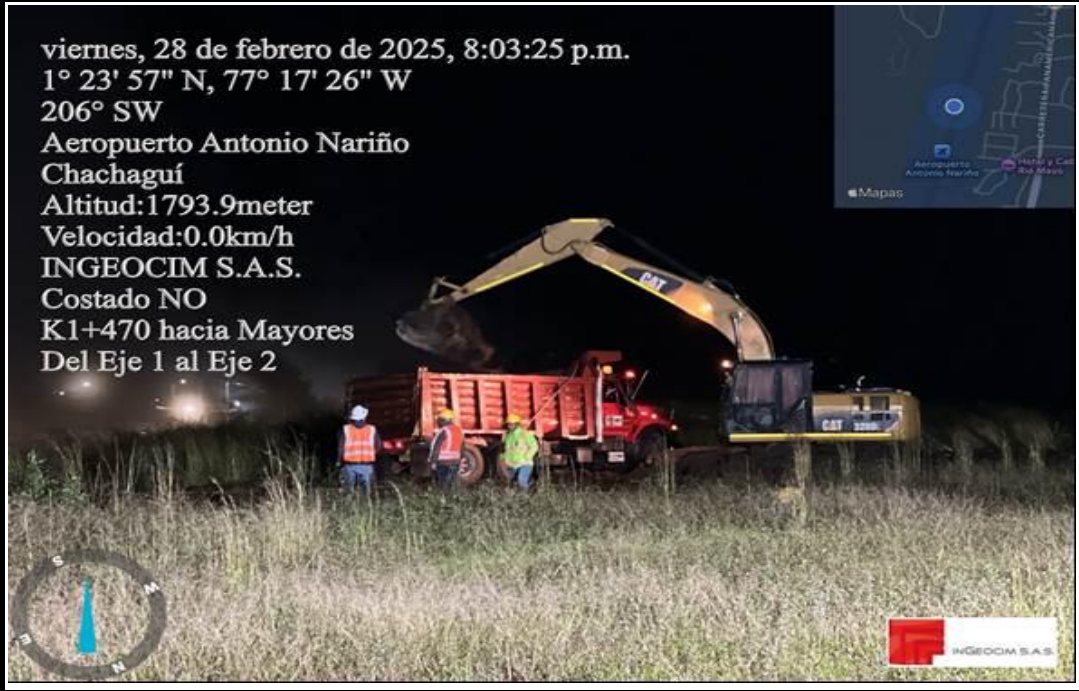

viernes, 28 de febrero de 2025, 8:03:25 p.m.
1° 23' 57" N, 77° 17' 26" W
206° SW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1793.9meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NO
K1+470 hacia Mayores
Del Eje 1 al Eje 2

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.

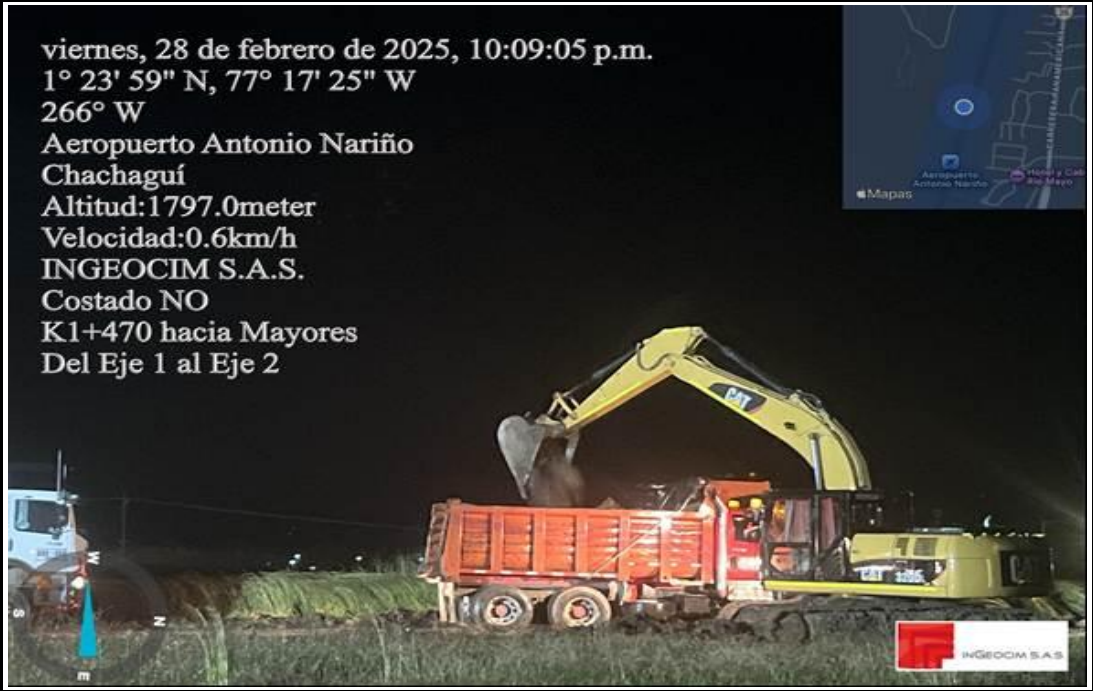

viernes, 28 de febrero de 2025, 10:09:05 p.m.
1° 23' 59" N, 77° 17' 25" W
266° W
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1797.0meter
Velocidad: 0.6km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NO
K1+470 hacia Mayores
Del Eje 1 al Eje 2

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



sábado, 1 de marzo de 2025, 8:41:39 p.m.
1° 23' 59" N, 77° 17' 26" W
353° N
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1797.9meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NO
K1+485 hacia mayores
Del Eje 1 al Eje 2

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.



sábado, 1 de marzo de 2025, 8:42:01 p.m.
1° 23' 59" N, 77° 17' 26" W
352° N
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1799.0meter
Velocidad: 0.1km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NO
K1+485 hacia mayores
Del Eje 1 al Eje 2

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.



sábado, 1 de marzo de 2025, 8:44:15 p.m.
1° 23' 59" N, 77° 17' 26" W
343° N
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1802.5meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NO
K1+485 hacia mayores
Del Eje 1 al Eje 2

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.




sábado, 1 de marzo de 2025, 8:47:01 p.m.
1° 23' 59" N, 77° 17' 26" W
350° N
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1799.1meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NO
K1+485 hacia mayores
Del Eje 1 al Eje 2

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

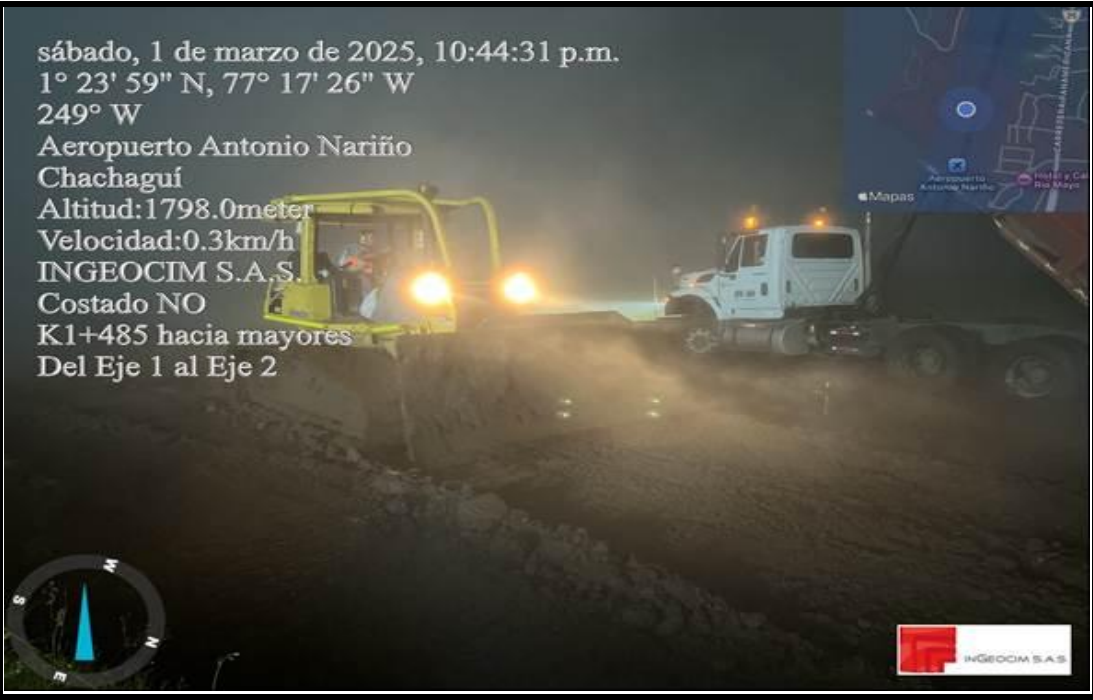

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 4, actualizando la línea base 2 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 1 correspondiente a la Prórroga No. 1 el día 16 de diciembre de 2024, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2024, tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025. De igual manera se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo PDT del plan de contingencia, aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-129-OFC de fecha 12 de febrero de 2025, remitido a la AEROCIVIL.	
	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
