

	INFORME SEMANAL	VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
		FECHA	20/11/2023	
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				
DATOS GENERALES				
Semana No.	30	Plazo total (días)	220	
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	210	
Del	4/03/2025	% de tiempo transcurrido	95,45%	
Al	17/03/2025	Interventoría	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 780.746.726,68	Valor ejecutado	\$ 46.105.500,00	-\$ 734.641.226,68
Porcentaje programado	8,99%	Porcentaje ejecutado	0,53%	-8,46%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 8.195.821.083,44	Valor ejecutado	\$ 1.005.996.046,72	-\$ 7.189.825.036,72
Porcentaje programado	94,42%	Porcentaje ejecutado	11,59%	-82,83%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL - PLAN DE CONTINGENCIA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 606.276.575,00	Valor ejecutado	\$ 46.105.500,00	-\$ 560.171.075,00
Porcentaje programado	6,98%	Porcentaje ejecutado	0,53%	-6,45%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA - PLAN DE CONTINGENCIA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 3.113.522.315,00	Valor ejecutado	\$ 992.305.148,78	-\$ 2.121.217.166,22
Porcentaje programado	35,87%	Porcentaje ejecutado	11,43%	-24,44%
DATOS DEL CONTRATO				
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista: CONSORCIO ALFA		Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.		
Contrato No: 23001138 H4 DE 2024		Contrato No: 23001299 H3 DE 2024		
Valor inicial: \$ 8.706.192.504,00		Valor inicial: \$ 684.322.873,00		
Valor Actualizado al modificatorio: NA		Valor actualizado al modificatorio: NA		
Valor actualizado 2: NA		Valor actualizado 2: NA		
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		
Plazo actualizado: NA		Plazo actualizado: NA		
Fecha de iniciación: 13/08/2024		Fecha de iniciación: 13/08/2024		
Fecha de vencimiento: 16/12/2024		Fecha de vencimiento: 16/12/2024		
Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1: 17/03/2025		Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1: 17/03/2025		
Suspensión No. 1: 4/03/2025		Suspensión No. 1: 4/03/2025		
Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025		Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025		
Levantamiento de la suspensión No. 1: 11/03/2025		Levantamiento de la suspensión No. 1: 11/03/2025		
Nueva fecha de terminación: 24/03/2025		Nueva fecha de terminación: 24/03/2025		
Valor total actual del contrato: \$ 8.706.192.504,00		Valor total actual del contrato: \$ 684.322.873,00		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA				
ACTIVIDADES LADO AIRE		ACTIVIDADES LADO TIERRA		
* Acopio de material tolerable * Se localiza y se Replantea puntos de Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+780 al K1+690, en el Costado Nor Este y del Eje No. 1 al Eje No. 2 del K1+530 al K1+595 en el Costado Nor Oeste. * Se realiza la Excavación de Material No Clasificado de Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+780 al K1+690, en el Costado Nor Este y del Eje No. 1 al Eje No. 2 del K1+530 al K1+595 en el Costado Nor Oeste. * Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+780 al K1+690, en el Costado Nor Este y del Eje No. 1 al Eje No. 2 del K1+530 al K1+595 en el Costado Nor Oeste.		N.A.		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Mediante el comunicado T-003-2024-145-OFC de fecha 4 de marzo 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Respuesta al comunicado C-ALFA-108-2025 – Requerimiento accidente laboral ocurrido el sábado 15 de febrero de 2025 del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.				
Mediante el comunicado T-003-2024-146-OFC de fecha 4 de marzo 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Respuesta al comunicado C-ALFA-113-2024 – Observaciones al concepto técnico sobre el mejoramiento de subrasante en franjas de seguridad del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.				
Mediante el comunicado T-003-2024-147-OFC de fecha 7 de marzo 2025 se remitió a la AEROCIVIL Remisión de hoja de vida de reemplazo del cargo de Topógrafo del contrato de interventoría No. 23001299 H3 de 2024.				
Mediante el comunicado T-003-2024-148-OFC de fecha 12 de marzo 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Reiteración del comunicado T-003-2024-133-OFC - Solicitud Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo.				
Mediante el comunicado T-003-2024-149-OFC de fecha 12 de marzo 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Solicitud Actualización de Pólizas - Contrato de obra No. 23001138 H4 DE 2024.				
Mediante el comunicado T-003-2024-150-OFC de fecha 12 de marzo 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta al comunicado C-ALFA-129-2025 – Aval solicitud de adición y prórroga al valor del contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024.				
Mediante el comunicado T-003-2024-151-OFC de fecha 12 de marzo 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Solicitud de Adición No. 1 y Prórroga No. 2 para el contrato de interventoría No. 23001299 H3 de 2024.				
Mediante el comunicado T-003-2024-152-OFC de fecha 12 de marzo 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta al comunicado C-ALFA-129-2025 – Aval solicitud de adición y prórroga al valor del contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024.				
Mediante el comunicado T-003-2024-153-OFC de fecha 14 de marzo 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Solicitud de Adición No. 1 y Prórroga No. 2 para el contrato de interventoría No. 23001299 H3 de 2024.				
Mediante el comunicado T-003-2024-154-OFC de fecha 15 de marzo 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA el Apremio No. 1 – Incumplimiento en las actividades de obra programadas en la jornada nocturna del día 13 de marzo de 2025 para la Construcción de las franjas de Seguridad del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.				
Mediante el comunicado T-003-2024-155-OFC de fecha 15 de marzo 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA el Respuesta al Comunicado C-ALFA-134 – 2025 Respuesta al oficio T-003-2024-148 OFC - Reiteración del comunicado T-003-2024-133-OFC - Solicitud Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo.				
Mediante el comunicado T-003-2024-156-OFC de fecha 14 de marzo 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Remisión de la actualización de las pólizas del Contrato de Interventoría No. 23001299 H3 DE 2024.				
Mediante el comunicado T-003-2024-157-OFC de fecha 18 de marzo 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Solicitud de estrategias para mitigar escasez de combustible en el departamento de Nariño – Contrato de obra No. 23001138 H4 DE 2024.				


ACTIVIDADES AMBIENTALES
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental mediante el comunicado T-003-2024-080-OFC de fecha 1 de noviembre de 2024.


ACTIVIDADES SISTEMA SST
* induccion a nuevo personal * Entrega inicial de epp y reposicion de los mismos. * Charla de seguridad: Postura corporal y desplazamientos * Preoperacionales vehiculos y maquinaria * Verificacion de uso de epp en campo

AVANCE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				Semana No. 30 (4 Mar - 18 Mar)		
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado
2.4	ZONA 1 - NORESTE	67,95%	\$ 5.898.037.908			
2.4.1	Inicio Zona 2	0,00%	\$ -			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	2,38%	\$ 321.838.028,00	315,00	\$ 2.583.000,00	0,80%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	32,84%	\$ 1.286.099.880,00		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	12,31%	\$ 1.405.900.000,00	270,00	\$ 22.950.000,00	1,63%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	27,99%	\$ 2.424.400.000,00		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00%	\$ -		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	5,31%	\$ 459.800.000,00		\$ -	
2.4	ZONA 2 - NOROESTE	31,02%	\$ 2.692.315.092			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	2,38%	\$ 148.020.332,00	487,50	\$ 3.997.500,00	2,70%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	32,84%	\$ 606.276.575,00		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	12,31%	\$ 675.108.250,00	195,00	\$ 16.575.000,00	2,46%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	27,99%	\$ 1.061.576.935,00		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00%	\$ -		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	5,31%	\$ 201.333.000,00		\$ -	
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO			\$ 8.680.422.500,00		\$ 46.105.500,00	

AVANCE FINANCIERO

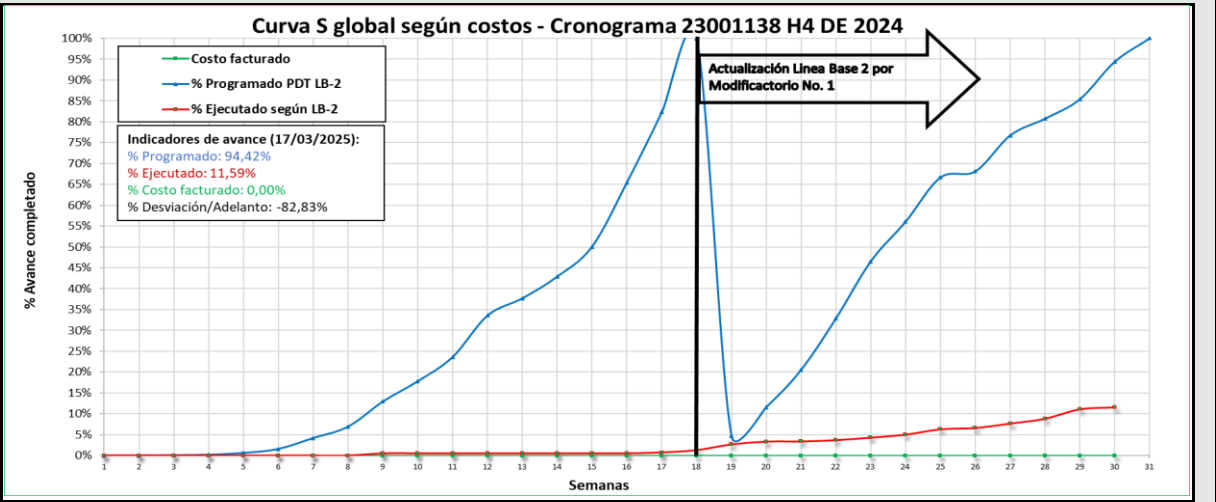


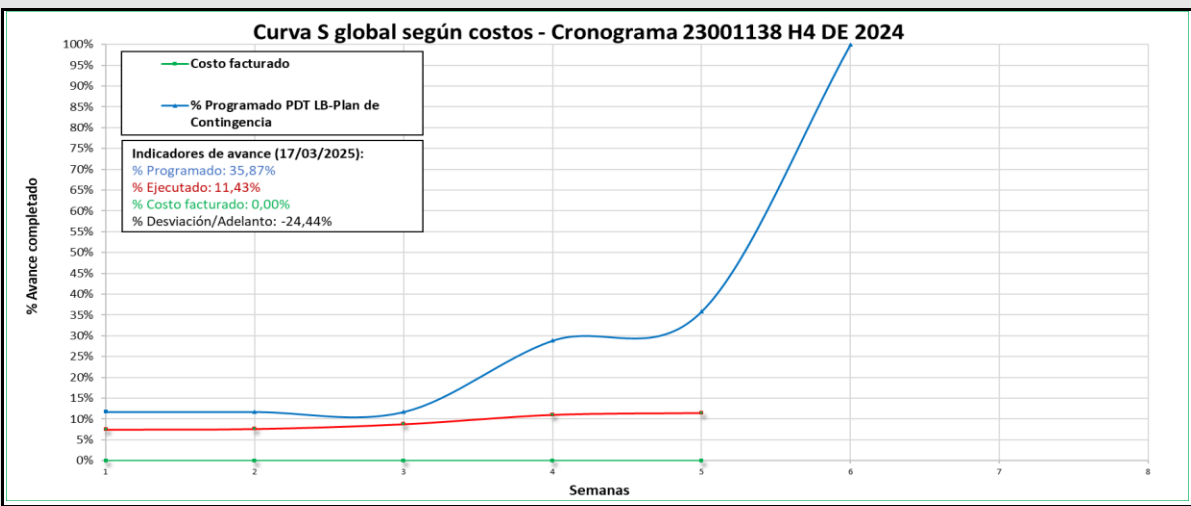



CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	\$ 780.746.726,68	EJECUTADO	Valor	\$ 46.105.500,00
	Porcentaje	8,99%		Porcentaje	0,53%
PROGRAMADO	Valor	\$ 8.195.821.083,44	EJECUTADO	Valor	\$ 1.005.996.046,72
	Porcentaje	94,42%		Porcentaje	11,59%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE - PLAN DE CONTINGENCIA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	\$ 606.276.575,00	EJECUTADO	Valor	\$ 46.105.500,00
	Porcentaje	6,98%		Porcentaje	0,53%
PROGRAMADO	Valor	\$ 3.113.522.315,00	EJECUTADO	Valor	\$ 992.305.148,78
	Porcentaje	35,87%		Porcentaje	11,43%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	\$ 0,00	EJECUTADO	Valor	\$ 0,00
	Porcentaje	0,00%		Porcentaje	0,00%
PROGRAMADO	Valor	\$ 0,00	EJECUTADO	Valor	\$ 0,00
	Porcentaje	0,00%		Porcentaje	0,00%

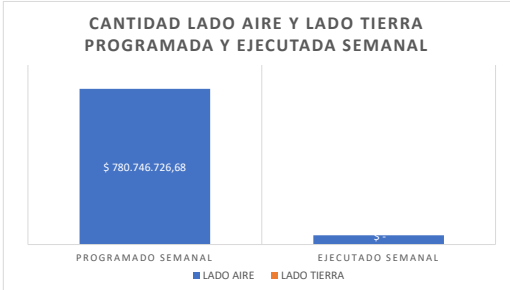

PERSONAL EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS	
TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1	Motoniveladora	2
	Residente de Obra	1	Excavadora de Orugas	3
	Especialista Ambiental	1	Vibrocompactadores	3
	Especialista en Pavimentos	1	Bulldozer	2
	Especialista en Hidráulica	1	Carrotanque	1
	Gerente de Proyectos PMP	1	Retrocargador (Pajarita)	1
	Inspectora SISOMA	1	Luminarias	7
	Topógrafo	1	Camioneta Doble Cabina	1
MANO DE OBRA	Cadeneros	2	Compresor	1
	Operadores de Maquinaria	13		
	Mecánico	1		
	Ayudante	22		
	Conductor Volqueta	13		

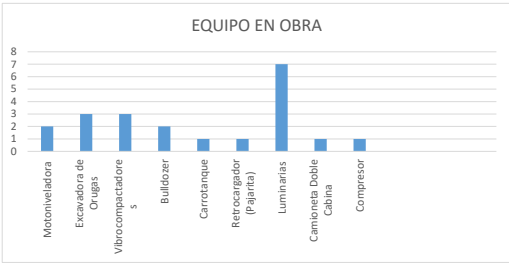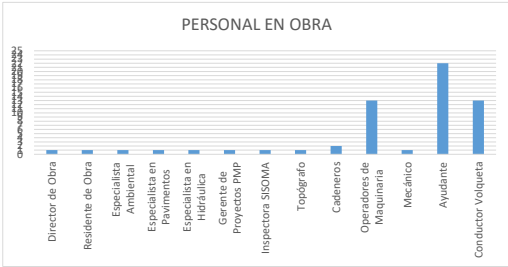

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE No. 1 - FRANJA NORESTE



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

FRENTE No. 2 - FRANJA NOROESTE



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

FRENTE No. 3 - FRANJA NORESTE



ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y CÉREO



ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y CÉREO



ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y CÉREO



ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y CÉREO

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 4, actualizando la línea base 2 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 1 correspondiente a la Prórroga No. 1 el día 16 de diciembre de 2024, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2024, tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025. De igual manera se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo PDT del plan de contingencia, aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-129-OFC de fecha 12 de febrero de 2025, remitido a la AEROCIVIL.	
	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
