


 AERONAUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	INFORME SEMANAL	VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
		FECHA	20/11/2023	
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				
DATOS GENERALES				
Semana No. _____	32	Plazo total (días)	340	
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)	224	
Del _____	25/03/2025	% de tiempo transcurrido	65,88%	
Al _____	31/03/2025	Interventoría	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 0,00	Valor ejecutado	\$ 87.453.700,00	\$ 87.453.700,00
Porcentaje programado	0,00%	Porcentaje ejecutado	0,78%	0,78%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 3.110.260.486,81	Valor ejecutado	\$ 1.575.983.204,56	-\$ 1.534.277.282,25
Porcentaje programado	27,67%	Porcentaje ejecutado	14,02%	-13,65%
DATOS DEL CONTRATO				
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
<u>Contratista:</u> CONSORCIO ALFA		<u>Contratista:</u> GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.		
<u>Contrato No:</u> 23001138 H4 DE 2024		<u>Contrato No:</u> 23001299 H3 DE 2024		
<u>Valor Inicial:</u> \$ 8.706.192.504,00		<u>Valor inicial:</u> \$ 684.322.873,00		
<u>Valor Actualizado al modificatorio:</u> \$ 2.536.379.355,00		<u>Valor actualizado al modificatorio:</u> \$ 347.289.600,00		
<u>Valor actualizado 2:</u> \$ 11.242.571.859,00		<u>Valor actualizado 2:</u> \$ 1.031.612.473,00		
<u>Plazo inicial:</u> Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		<u>Plazo inicial:</u> Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		
<u>Plazo actualizado:</u> 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025		<u>Plazo actualizado:</u> 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025		
<u>Fecha de iniciación:</u> 13/08/2024		<u>Fecha de iniciación:</u> 13/08/2024		
<u>Fecha de vencimiento inicial:</u> 16/12/2024		<u>Fecha de vencimiento:</u> 16/12/2024		
<u>Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1:</u> Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		<u>Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1:</u> Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		
<u>Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1:</u> 17/03/2025		<u>Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1:</u> 17/03/2025		
<u>Suspensión No. 1:</u> 4/03/2025		<u>Suspensión No. 1:</u> 4/03/2025		
<u>Periodo de Suspensión No. 1:</u> 4/03/2025 al 10/03/2025		<u>Periodo de Suspensión No. 1:</u> 4/03/2025 al 10/03/2025		
<u>Levantamiento de la suspensión No. 1:</u> 11/03/2025		<u>Levantamiento de la Suspensión No. 1:</u> 11/03/2025		
<u>Modificatorio No. 2 Prórroga No. 2:</u> Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.		<u>Modificatorio No. 2 Prórroga No. 2:</u> Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.		
<u>Nueva fecha de terminación:</u> 24/07/2025		<u>Nueva fecha de terminación:</u> 24/07/2025		
<u>Valor total actual del contrato:</u> \$ 11.242.571.859,00		<u>Valor total actual del contrato:</u> \$ 1.031.612.473,00		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA				
ACTIVIDADES LADO AIRE		ACTIVIDADES LADO TIERRA		
* Acopio de material tolerable * Se localiza y se Replantea puntos de Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+690 al K1+617, del Eje No. 2 al Eje No. 3 de franja desde el K1+708 al K1+620 en el Costado Nor Este y del Eje No. 1 al Eje No. 2 del K1+660 al K1+792 en el Costado Nor Oeste. * Se realiza la Excavación de Material No Clasificado de Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+690 al K1+617, del Eje No. 2 al Eje No. 3 de franja desde el K1+708 al K1+620 en el Costado Nor Este y del Eje No. 1 al Eje No. 2 del K1+660 al K1+792 en el Costado Nor Oeste. * Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+690 al K1+617, del Eje No. 2 al Eje No. 3 de franja desde el K1+708 al K1+620 en el Costado Nor Este y del Eje No. 1 al Eje No. 2 del K1+660 al K1+792 en el Costado Nor Oeste.		N.A.		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Mediante el comunicado T-003-2024-165-OFC de fecha 26 de marzo 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Remisión de la actualización de las pólizas del Contrato de Interventoría No. 23001299 H3 DE 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-166-OFC de fecha 26 de marzo 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA el Solicitud Actualización de Pólizas - Contrato de obra No. 23001138 H4 DE 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-167-OFC de fecha 20 de marzo 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Solicitud de Información sobre el estado actual del contrato del Ing. John Jairo Arboleda, Director de Obra del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.				
ACTIVIDADES AMBIENTALES				
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental mediante el comunicado T-003-2024-080-OFC de fecha 1 de noviembre de 2024.				
ACTIVIDADES SISTEMA SST				
* Inducción a personal nuevo (conductor de volqueta) * Preoperacionales maquinaria y vehículos. * Reposiciones de EPP. * Verificación de uso de EPP. * Revisión en campo de puntos críticos y correcciones de iluminación en campo				

CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024				Semana No. 32 (25 Mar - 31 Mar)		
"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."						
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado
2.2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD Y AS BUILT).	1,91%	\$ 214.432.500		\$ -	
2.4	ZONA 1 - NORESTE	46,08%	\$ 5.404.884.343			
2.4.1	Inicio Zona 2	0,00%	\$ -			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	3,30%	\$ 370.846.886	563,50	\$ 4.620.700,00	1,25%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	3,20%	\$ 360.217.940		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	17,67%	\$ 1.986.138.637	483,00	\$ 41.055.000,00	2,07%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	20,10%	\$ 2.259.210.200		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00%	\$ 0		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	3,81%	\$ 428.470.680		\$ -	
2.4	ZONA 2 - NOROESTE	22,82%	\$ 2.565.797.547,00			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	1,54%	\$ 172.951.284	990,00	\$ 8.118.000,00	4,69%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	1,75%	\$ 196.482.513		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	8,30%	\$ 933.453.850	396,00	\$ 33.660.000,00	3,61%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	9,44%	\$ 1.061.576.900		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00%	\$ 0		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	1,79%	\$ 201.333.000		\$ -	
2.4	ZONA 3 - COSTADO SURESTE	21,95%	\$ 2.468.045.815,00			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	0,68%	\$ 76.802.758		\$ -	0,00%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	0,87%	\$ 98.241.257		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	9,18%	\$ 1.031.803.100		\$ -	0,00%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	9,43%	\$ 1.060.138.500		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00%			\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	1,79%	\$ 201.060.200		\$ -	
2.11	ITEMS NO PREVISTOS	4,95%	\$ 556.134.062			
2.11.1	NP-01 REALCE CAJA ELECTRICA (H≤ 0,70m)	0,25%	\$ 28.512.630		\$ -	0,00%
2.11.2	NP-02 EXCAVACION MANUAL	0,10%	\$ 11.608.596		\$ -	0,00%
2.11.3	NP-03 DEMOLICION DE CONCRETO	0,16%	\$ 17.968.896		\$ -	0,00%
2.11.4	NP-04 CONFORMACIÓN DE FRANJAS CON MATERIAL DEL SITIO	4,43%	\$ 498.043.940		\$ -	
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO			\$ 11.209.294.267,00		\$ 87.453.700,00	
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO			\$ 33.277.592,00			1,01%
TOTAL			\$ 11.242.571.859,00			

AVANCE FINANCIERO

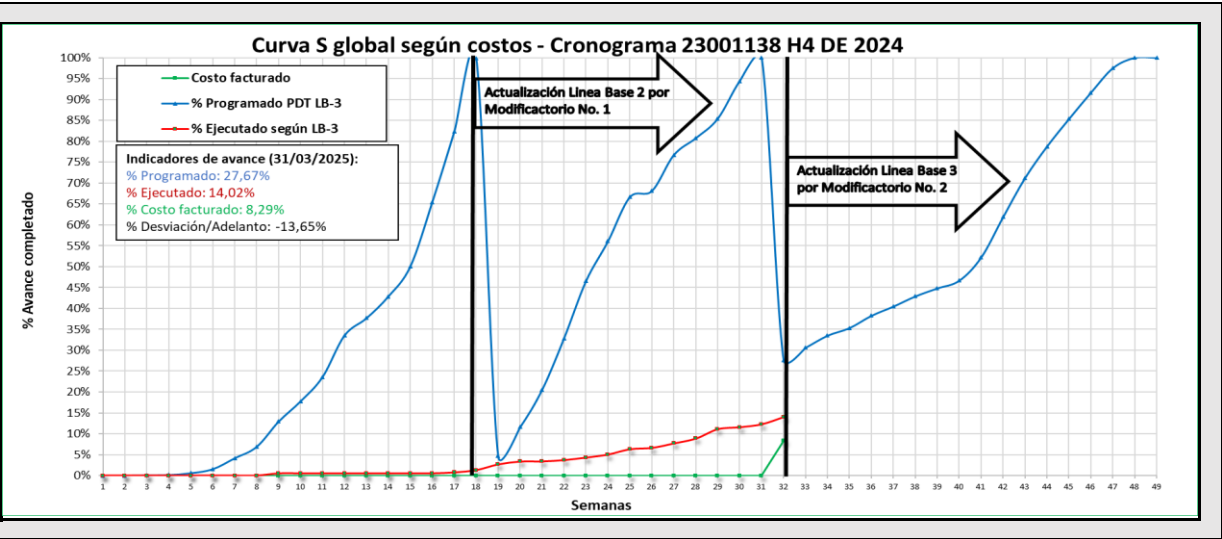

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	
Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 3.110.260.486,81	Valor	\$ 1.575.983.204,56
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	27,67%	Porcentaje	14,02%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	
Valor	\$ -	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%





PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Residente de Obra	1
	Especialista Ambiental	1
	Especialista en Pavimentos	1
	Especialista en Hidráulica	1
	Gerente de Proyectos PMP	1
	Inspectora SISOMA	1
	Topógrafo	1
	Cadeneros	2
	Operadores de Maquinaria	13
MANO DE OBRA	Mecánico	1
	Ayudante	22
	Conductor Volqueta	13

MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	2
Excavadora de Orugas	3
Vibrocompactadores	3
Bulldozer	2
Carro tanque	1
Retrocargador (Pajarita)	1
Luminarias	7
Camioneta Doble Cabina	1
Compresor	1

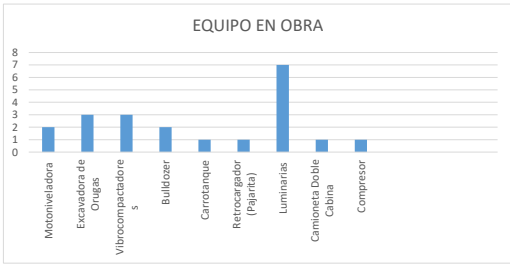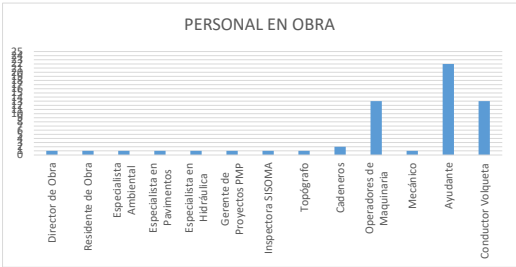

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE No. 1 - FRANJA NORESTE



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



25 mar 2025 11:27:07 p. m.
Chachagüí
Nariño

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



25 mar 2025 10:58:21 p. m.
Chachagüí
Nariño

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



25 mar 2025 11:33:34 p. m.
Chachagüí
Nariño

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



miércoles, 26 marzo 2025 07:33p. m.
1°24'5"N 77°17'21"W
201° S
Chachagüí
Altitud:1822.6m
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
COSTADO NE
EJE 2 Y 3 K1+ 110 HACIA MENORES

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



miércoles, 26 marzo 2025 08:31p. m.
1°24'4"N 77°17'22"W
174° S
Chachagüí
Altitud:1827.4m
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
COSTADO NE
EJE 2 Y 3 K1+ 110 HACIA MENORES

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



miércoles, 26 marzo 2025 10:14p. m.
1°24'4"N 77°17'22"W
28° NE
Chachagüí
Altitud:1823.4m
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
COSTADO NE
EJE 2 Y 3 K1+ 110 HACIA MENORES

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



miércoles, 26 marzo 2025 11:39p. m.
1°24'3"N 77°17'22"W
42° NE
Chachagüí
Altitud:1826.9m
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
COSTADO NE
EJE 2 Y 3 K1+ 110 HACIA MENORES

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



miércoles, 26 marzo 2025 11:41p. m.
1°24'5"N 77°17'22"W
144° SE
Chachagüí
Altitud:1827.1m
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
COSTADO NE
EJE 2 Y 3 K1+ 110 HACIA MENORES

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

FRENTE No. 2 - FRANJA NOROESTE



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 5, actualizando la línea base 3 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 2 correspondiente a la Prórroga No. 2 el día 21 de marzo de 2025, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2024, cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025. Este seguimiento se realizó con el Programa Detallado de Trabajo PDT, aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-152-OFc radicado 2025190010031929 de fecha 14 de marzo de 2025, remitido a la AEROCIVIL.	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
