




 AERONAUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	INFORME SEMANAL	VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
		FECHA	20/11/2023	
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				
DATOS GENERALES				
Semana No. 33 Plazo total (días) 340				
PERIODO Tiempo transcurrido desde inicio (días) 231				
Del 1/04/2025 % de tiempo transcurrido 67,94%				
Al 7/04/2025 Interventoría GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.				
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL				
PROGRAMADO EJECUTADO BALANCE				
Valor programado \$ 330.576.245,59 Valor ejecutado \$ 52.271.500,00 - \$ 278.304.745,59				
Porcentaje programado 2,94% Porcentaje ejecutado 0,46% -2,48%				
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA				
PROGRAMADO EJECUTADO BALANCE				
Valor programado \$ 3.440.836.732,40 Valor ejecutado \$ 1.575.983.204,56 - \$ 1.864.853.527,84				
Porcentaje programado 30,61% Porcentaje ejecutado 14,02% -16,59%				
DATOS DEL CONTRATO				
CONTRATO DE OBRA				
Contratista: CONSORCIO ALFA				
Contrato No: 23001138 H4 DE 2024				
Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00				
Valor Actualizado al modificatorio: \$ 2.536.379.355,00				
Valor actualizado 2: \$ 11.242.571.859,00				
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.				
Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025				
Fecha de iniciación: 13/08/2024				
Fecha de vencimiento inicial: 16/12/2024				
Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.				
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1: 17/03/2025				
Suspensión No. 1: 4/03/2025				
Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025				
Levantamiento de la suspensión No. 1: 11/03/2025				
Modificadorio No. 2 Prórroga No. 2: Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.				
Nueva fecha de terminación: 24/07/2025				
Valor total actual del contrato: \$ 11.242.571.859,00				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.				
Contrato No: 23001299 H3 DE 2024				
Valor inicial: \$ 684.322.873,00				
Valor actualizado al modificatorio: \$ 347.289.600,00				
Valor actualizado 2: \$ 1.031.612.473,00				
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.				
Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025				
Fecha de iniciación: 13/08/2024				
Fecha de vencimiento: 16/12/2024				
Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.				
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1: 17/03/2025				
Suspensión No. 1: 4/03/2025				
Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025				
Levantamiento de la Suspensión No. 1: 11/03/2025				
Modificadorio No. 2 Prórroga No. 2: Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.				
Nueva fecha de terminación: 24/07/2025				
Valor total actual del contrato: \$ 1.031.612.473,00				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA				
ACTIVIDADES LADO AIRE				
* Acopio de material tolerable				
* Se localiza y se Replantea puntos de Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+617 al K1+522, en el Costado Nor Este y del Eje No. 1 al Eje No. 2 del K1+792 al K1+872 en el Costado Nor Oeste.				
* Se realiza la Excavación de Material No Clasificado de Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+617 al K1+522, en el Costado Nor Este y del Eje No. 1 al Eje No. 2 del K1+792 al K1+872 en el Costado Nor Oeste.				
* Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+617 al K1+522, en el Costado Nor Este y del Eje No. 1 al Eje No. 2 del K1+792 al K1+872 en el Costado Nor Oeste.				
ACTIVIDADES LADO TIERRA				
N.A.				
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Mediante el comunicado T-003-2024-168-OFC de fecha 2 de abril 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Remisión del Informe semanal No. 32 del contrato de interventoría No. 23001299 H3 DE 2024.				
Mediante el comunicado T-003-2024-169-OFC de fecha 2 de abril 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Alerta por insuficiencia de material tolerable para el mejoramiento de las franjas de seguridad del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.				
Mediante el comunicado T-003-2024-170-OFC de fecha 2 de abril 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA Respuesta al comunicado C-ALFA-140-2025 – Observaciones al diseño de la fórmula de trabajo de la base estabilizada con cemento del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2024.				
ACTIVIDADES AMBIENTALES				
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental mediante el comunicado T-003-2024-080-OFC de fecha 1 de noviembre de 2024.				
ACTIVIDADES SISTEMA SST				
* Preoperacionales de maquinaria y vehículos.				
* Señalizaciones preventivas de cajillas eléctricas costado norte y sur.				
* Señalizaciones preventivas de huecos en costado nor-oeste.				
* Se continua con avanza de señalización sobre franja de excavación y carretable costado nor-oeste.				
* Verificación de uso de epp.				

AVANCE CANTIDADES						
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				Semana No. 33 (1 Abr - 7 Abr)		
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado
2.2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD Y AS BUILT).	1,91%	\$ 214.432.500		\$ -	
2.4	ZONA 1 - NORESTE	40,88%	\$ 5.404.884.343			
2.4.1	Inicio Zona 2	0,00%	\$ -			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	3,30%	\$ 370.846.886	332,50	\$ 2.726.500,00	0,74%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	3,20%	\$ 360.217.940		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 228.	17,67%	\$ 1.986.138.637	285,00	\$ 24.225.000,00	1,22%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	20,10%	\$ 2.259.210.200		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00%	\$ 0		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	3,81%	\$ 428.470.680		\$ -	
2.4	ZONA 2 - NOROESTE	22,82%	\$ 2.565.797.547,00			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	1,54%	\$ 172.951.284	600,00	\$ 4.920.000,00	2,84%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	1,75%	\$ 196.482.513		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 228.	8,30%	\$ 933.453.850	240,00	\$ 20.400.000,00	2,19%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	9,44%	\$ 1.061.576.900		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00%	\$ 0		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	1,79%	\$ 201.333.000		\$ -	
2.6	ZONA 3 - COSTADO SURESTE	21,95%	\$ 2.468.045.815,00			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	0,68%	\$ 76.802.758		\$ -	0,00%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	0,87%	\$ 98.241.257		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 228.	9,18%	\$ 1.031.803.100		\$ -	0,00%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	9,43%	\$ 1.060.138.500		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00%			\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	1,79%	\$ 201.060.200		\$ -	
2.11	ITEMS NO PREVISTOS	4,95%	\$ 556.134.862			
2.11.1	NP-01 REALCE CAJA ELECTRICA (H± 0.70m)	0,25%	\$ 28.512.630		\$ -	0,00%
2.11.2	NP-02 EXCAVACION MANUAL	0,10%	\$ 11.608.596		\$ -	0,00%
2.11.3	NP-03 DEMOLICION DE CONCRETO	0,16%	\$ 17.968.896		\$ -	0,00%
2.11.4	NP-04 CONFORMACIÓN DE FRANJAS CON MATERIAL DEL SITIO	4,43%	\$ 498.043.940		\$ -	
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 52.271.500,00	
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO						0,46%
TOTAL					\$ 11.242.571.859,00	

AVANCE FINANCIERO

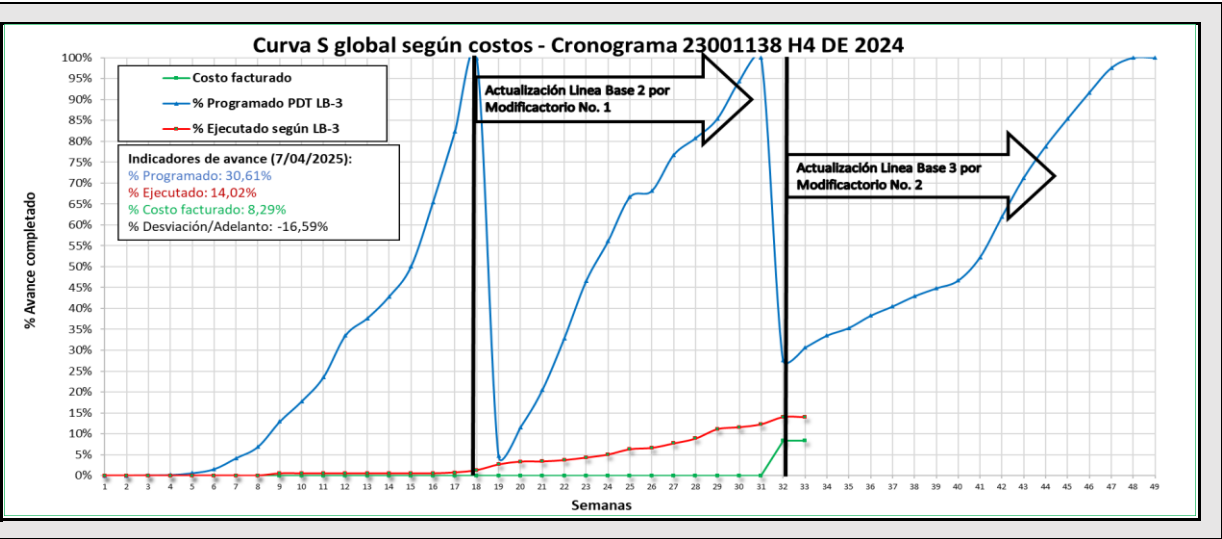



CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	
Valor \$ 330.576.245,59	Valor \$ 52.271.500,00		Valor \$ 3.440.836.732,40	Valor \$ 1.575.983.204,56	
Porcentaje 2,94%	Porcentaje 0,46%		Porcentaje 30,61%	Porcentaje 14,02%	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	
Valor \$ -	Valor \$ -		Valor \$ 0,00	Valor \$ 0,00	
Porcentaje 0,00%	Porcentaje 0,00%		Porcentaje 0,00%	Porcentaje 0,00%	

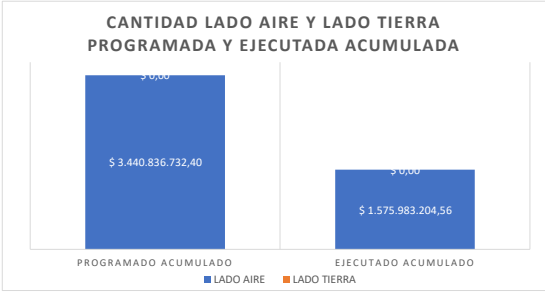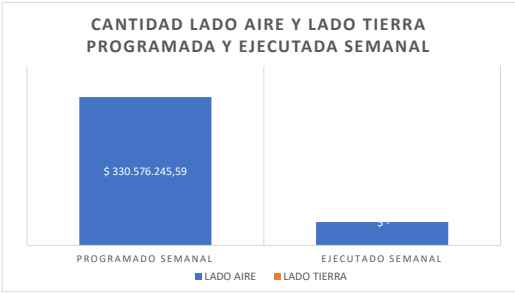

PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Residente de Obra	1
	Especialista Ambiental	1
	Especialista en Pavimentos	1
	Especialista en Hidráulica	1
	Gerente de Proyectos PMP	1
	Inspectora SISOMA	1
	Topógrafo	1
	Cadeneros	2
	Operadores de Maquinaria	13
MANO DE OBRA	Mecánico	1
	Ayudante	22
	Conductor Volqueta	13

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	2
Excavadora de Orugas	3
Vibrocompactadores	3
Bulldozer	2
Carrotanque	1
Retrocargador (Pajarita)	1
Luminarias	7
Camioneta Doble Cabina	1
Compresor	1

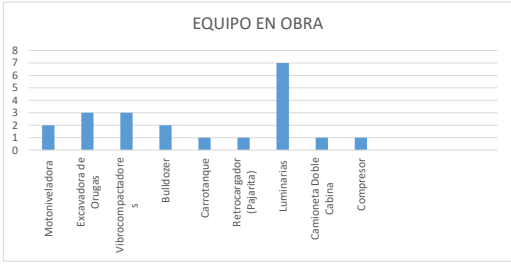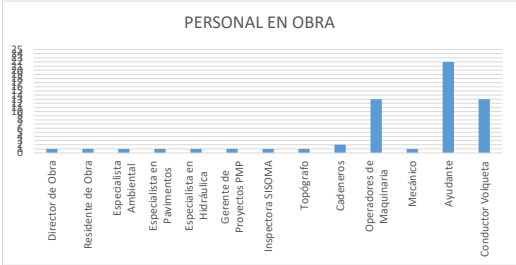

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE No. 1 - FRANJA NORESTE



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



jueves, 3 de abril de 2025, 8:58:20 p.m.
1° 23' 54" N, 77° 17' 24" W
238° SW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1791.7meter
Velocidad: 0.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Francia NE
Fallo
Eje del 4 al Eje 5
K1+358 hacia Menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

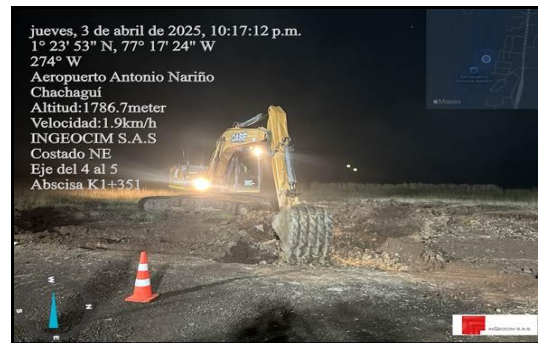

jueves, 3 de abril de 2025, 10:17:12 p.m.
1° 23' 53" N, 77° 17' 24" W
274° W
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1786.7meter
Velocidad: 1.9km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Eje del 4 al 5
Abscisa K1+351

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



jueves, 3 de abril de 2025, 10:26:58 p.m.
1° 23' 53" N, 77° 17' 24" W
294° NW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1792.1meter
Velocidad: 0.2km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Eje del 4 al 5
Abscisa K1+351

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



viernes, 4 de abril de 2025, 8:20:35 p.m.
1° 23' 41" N, 77° 17' 24" W
275° SW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1775.2meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



sábado, 5 de abril de 2025, 10:26:29 p.m.
1° 23' 58" N, 77° 17' 24" W
141° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1793.3meter
Velocidad: 0.9km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 3 al 4
Abscisa K1+485 hacia mayores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



sábado, 5 de abril de 2025, 10:45:08 p.m.
1° 23' 57" N, 77° 17' 24" W
124° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1792.7meter
Velocidad: 0.2km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 3 al 4
Abscisa K1+485 hacia mayores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



sábado, 5 de abril de 2025, 11:04:26 p.m.
1° 23' 59" N, 77° 17' 24" W
183° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1788.8meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 3 al 4
Abscisa K1+485 hacia mayores


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



sábado, 5 de abril de 2025, 11:10:22 p.m.
1° 23' 41" N, 77° 17' 21" W
206° SW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1787.0meter
Velocidad: 0.2km/h
INGEOCIM S.A.S

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

FRENTE No. 2 - FRANJA NOROESTE

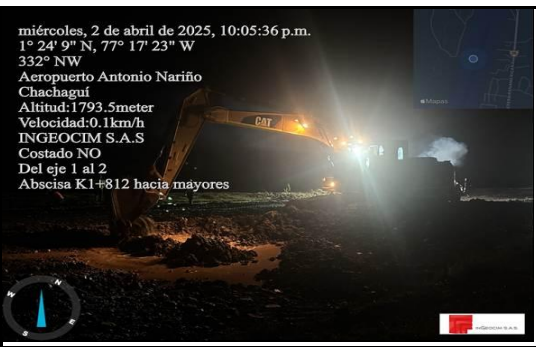


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

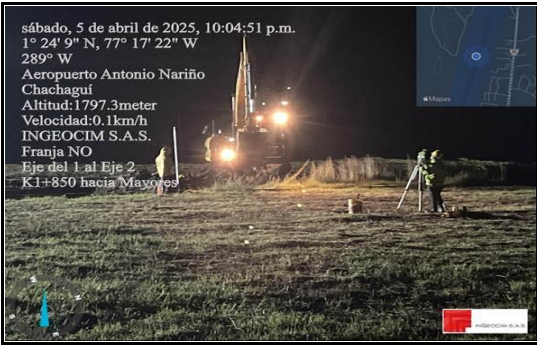

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 5, actualizando la línea base 3 de acuerdo con la suscripción del Modificatorio No. 2 correspondiente a la Prórroga No. 2 el día 21 de marzo de 2025, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2024, cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025. Este seguimiento se realizó con el Programa Detallado de Trabajo PDT, aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-152-Ofc radicado 2025190010031929 de fecha 14 de marzo de 2025, remitido a la AEROCIVIL.	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
