




	INFORME SEMANAL		VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.
			FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				
DATOS GENERALES					
Semana No. 34 Plazo total (días) 340					
PERIODO Tiempo transcurrido desde inicio (días) 238					
Del. 8/04/2025 % de tiempo transcurrido 70,00%					
Al. 14/04/2025 Interventoría GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.					
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL					
PROGRAMADO EJEUTADO BALANCE					
Valor programado \$ 325.244.553,35 Valor ejecutado \$ 101.528.000,00 -\$ 232.716.553,35					
Porcentaje programado 2,89% Porcentaje ejecutado 0,90% -1,99%					
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA					
PROGRAMADO EJEUTADO BALANCE					
Valor programado \$ 3.766.081.285,75 Valor ejecutado \$ 1.623.122.915,02 -\$ 2.142.958.370,73					
Porcentaje programado 33,50% Porcentaje ejecutado 14,44% -19,06%					
DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista: CONSORCIO ALFA			Contratista: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.		
Contrato No: 23001138 H4 DE 2024			Contrato No: 23001299 H3 DE 2024		
Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00			Valor inicial: \$ 684.322.873,00		
Valor Actualizado al modificatorio: \$ 2.536.379.355,00			Valor actualizado al modificatorio: \$ 347.289.600,00		
Valor actualizado 2: \$ 11.242.571.859,00			Valor actualizado 2: \$ 1.031.612.473,00		
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.			Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		
Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025			Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025		
Fecha de iniciación: 13/08/2024			Fecha de iniciación: 13/08/2024		
Fecha de vencimiento inicial: 16/12/2024			Fecha de vencimiento: 16/12/2024		
Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1 Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.			Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1 Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1 17/03/2025			Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1 17/03/2025		
Suspensión No. 1: 4/03/2025			Suspensión No. 1: 4/03/2025		
Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025			Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025		
Levantamiento de la suspensión No. 1: 11/03/2025			Levantamiento de la Suspensión No. 1: 11/03/2025		
Modificatorio No. 2 Prórroga No. 2 Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.			Modificatorio No. 2 Prórroga No. 2 Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.		
Nueva fecha de terminación 24/07/2025			Nueva fecha de terminación: 24/07/2025		
Valor total actual del contrato \$ 11.242.571.859,00			Valor total actual del contrato: \$ 1.031.612.473,00		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
ACTIVIDADES LADO AIRE			ACTIVIDADES LADO TIERRA		
* Acopio de material tolerable			N.A.		
* Se localiza y se Replantea puntos de Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+250 al K1+330, de Eje No. 2 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+250 al K1+330 y de Eje No. 1 al Eje No. 2 de Franja desde el K1+250 al K1+330 en el Costado Nor Este.					
* Se realiza la Excavación de Material No Clasificado de Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+250 al K1+330, de Eje No. 2 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+250 al K1+330 y de Eje No. 1 al Eje No. 2 de Franja desde el K1+250 al K1+330 en el Costado Nor Este.					
* Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el Eje No. 4 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+250 al K1+330, de Eje No. 2 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+250 al K1+330 y de Eje No. 1 al Eje No. 2 de Franja desde el K1+250 al K1+330 en el Costado Nor Este.					
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
Mediante el comunicado T-003-2024-171-OFC de fecha 7 de abril 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Respuesta al comunicado C-ALFA-149-2025 – Traslado de oficio CAP2024-211-2025 y atención a la solicitud de reevaluación prioritaria.					
Mediante el comunicado T-003-2024-172-OFC de fecha 10 de abril 2025 se remitió a la AEROCIVIL Remisión de hoja de vida de reemplazo del cargo de Director de Obra del contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024.					
Mediante el comunicado T-003-2024-173-OFC de fecha 11 de abril 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Remisión de la actualización de las pólizas del Contrato de Interventoría No. 23001299 H3 DE 2024.					
ACTIVIDADES AMBIENTALES					
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental mediante el comunicado T-003-2024-080-OFC de fecha 1 de noviembre de 2024.					
ACTIVIDADES SISTEMA SST					
* Preoperacionales de maquinaria y vehículos.					
* Señalizaciones preventivas de cajillas eléctricas costado norte y sur.					
* Señalizaciones preventivas de huecos en costado nor-oeste.					
* Se continua con avance de señalización sobre franja de excavación y carretable costado nor-oeste.					
* Verificación de uso de epp.					

AVANCE CANTIDADES								
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."					Semana No. 34 (8 Abr - 14 Abr)			
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado	
2.2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD Y AS BUILD)	1,91%	\$ 11.000,00	\$ 214.432.500		\$ -		
2.4	ZONA 1 - NORESTE	48,08%		\$ 5.484.884.343				
2.4.1	Inicio Zona 2	0,00%		\$ -				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	3,30%	\$ 8.200,00	\$ 370.846.886	1.290,00	\$ 10.578.000,00	2,88%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	3,20%	\$ 2.100,00	\$ 360.217.940		\$ -	0,00%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 228.	17,67%	\$ 85.000,00	\$ 1.986.138.637	1.070,00	\$ 90.950.000,00	4,78%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	20,10%	\$ 290.000,00	\$ 2.259.210.200		\$ -		
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	3,81%	\$ 11.000,00	\$ 428.470.680		\$ -		
2.4	ZONA 2 - NOBOESTE	22,82%		\$ 2.565.797.547,00				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	1,54%	\$ 8.200,00	\$ 172.951.284		\$ -	0,00%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	1,75%	\$ 2.100,00	\$ 196.482.513		\$ -	0,00%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 228.	8,30%	\$ 85.000,00	\$ 933.453.850		\$ -	0,00%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	9,44%	\$ 290.000,00	\$ 1.061.576.900		\$ -		
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.333.000		\$ -		
2.6	ZONA 3 - COSTADO SURESTE	21,95%		\$ 2.468.045.815,00				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	0,68%	\$ 8.200,00	\$ 76.802.758		\$ -	0,00%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	0,87%	\$ 2.100,00	\$ 98.241.257		\$ -	0,00%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 228.	9,18%	\$ 85.000,00	\$ 1.031.803.100		\$ -	0,00%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	9,43%	\$ 290.000,00	\$ 1.060.138.500		\$ -		
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00%	\$ 2.800,00			\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.060.200		\$ -		
2.11	ITEMS NO PREVISTOS	4,95%		\$ 556.134.062				
2.11.1	NP-01 REALCE CAJA ELÉCTRICA (H= 0,70m)	0,25%	\$ 8.200,00	\$ 28.512.630		\$ -	0,00%	
2.11.2	NP-02 EXCAVACION MANUAL	0,10%	\$ 2.100,00	\$ 11.608.596		\$ -	0,00%	
2.11.3	NP-03 DEMOLICION DE CONCRETO	0,16%	\$ 85.000,00	\$ 17.968.896		\$ -	0,00%	
2.11.4	NP-04 CONFORMACIÓN DE FRANJAS CON MATERIAL DEL SITIO	4,43%	\$ 290.000,00	\$ 498.043.940		\$ -		
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO				\$ 11.209.294.267,00		\$ 101.528.000,00		
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO				\$ 33.277.592,00			0,90%	
TOTAL				\$ 11.242.571.859,00				

AVANCE FINANCIERO

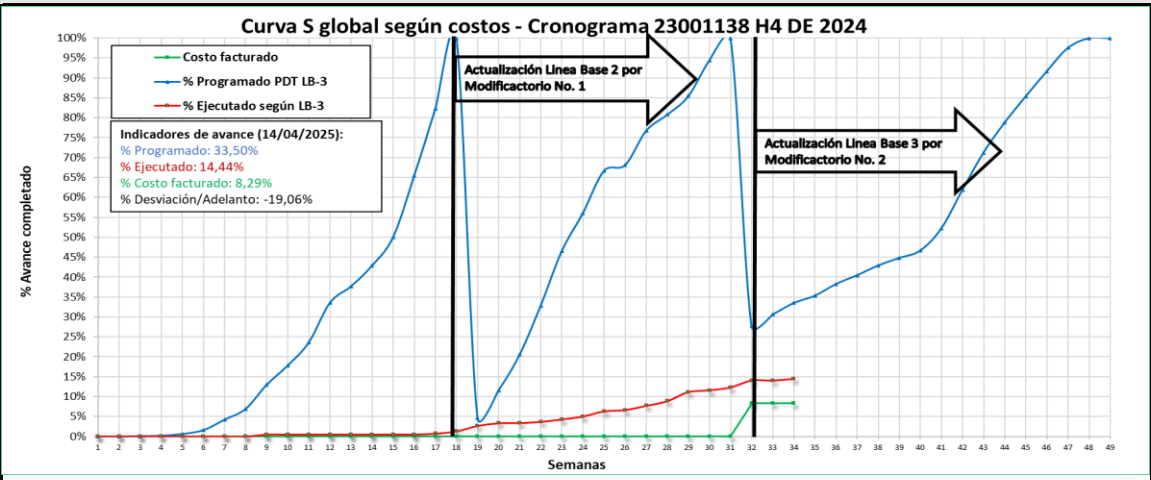



CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	
Valor \$ 325.244.553,35	Valor \$ 101.528.000,00		Valor \$ 3.766.081.285,75	Valor \$ 1.623.122.915,02	
Porcentaje 2,89%	Porcentaje 0,90%		Porcentaje 33,50%	Porcentaje 14,44%	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	
Valor \$	Valor \$		Valor \$ 0,00	Valor \$ 0,00	
Porcentaje 0,00%	Porcentaje 0,00%		Porcentaje 0,00%	Porcentaje 0,00%	

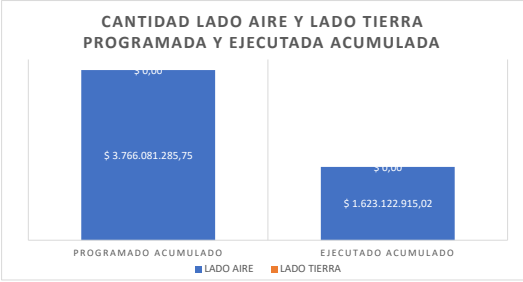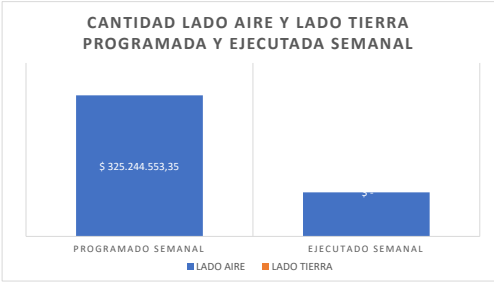

PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Residente de Obra	1
	Especialista Ambiental	1
	Especialista en Pavimentos	1
	Especialista en Hidráulica	1
	Gerente de Proyectos PMP	1
	Inspectora SISOMA	1
	Topógrafo	1
	Cadeneros	2
	Operadores de Maquinaria	13
MANO DE OBRA	Mecánico	1
	Ayudante	22
	Conductor Volqueta	13

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	2
Excavadora de Orugas	3
Vibrocompactadores	3
Bulldozer	2
Carro tanque	1
Retrocargador (Pajarita)	1
Luminarias	7
Camioneta Doble Cabina	1
Compresor	1

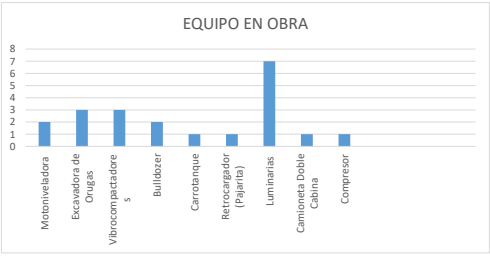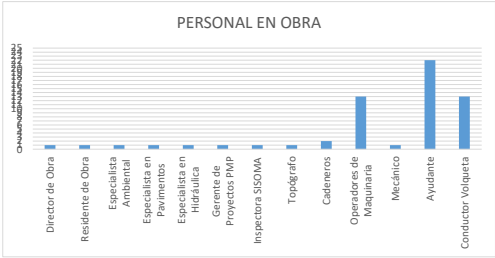

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE No. 1 - FRANJA NORESTE



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

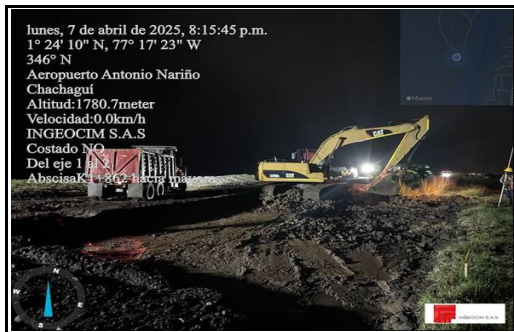


lunes, 7 de abril de 2025, 8:15:45 p.m.
1° 24' 10" N, 77° 17' 23" W
346° N
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1780.7meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NO
Del eje 1 al 2
Abscisa K1+302 hacia mayores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

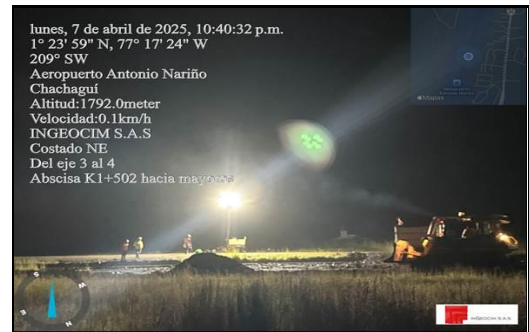

lunes, 7 de abril de 2025, 10:40:32 p.m.
1° 23' 59" N, 77° 17' 24" W
209° SW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1792.0meter
Velocidad:0.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 3 al 4
Abscisa K1+502 hacia mayores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

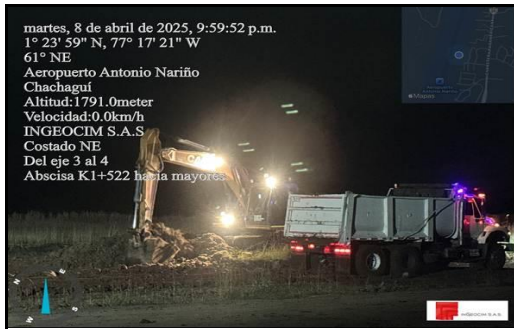

martes, 8 de abril de 2025, 9:59:52 p.m.
1° 23' 59" N, 77° 17' 21" W
61° NE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1791.0meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 3 al 4
Abscisa K1+522 hacia mayores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



martes, 8 de abril de 2025, 10:01:00 p.m.
1° 23' 59" N, 77° 17' 22" W
184° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1790.2meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 3 al 4
Abscisa K1+522 hacia mayores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



miércoles, 9 de abril de 2025, 9:39:14 p.m.
1° 24' 0" N, 77° 17' 22" W
348° N
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1795.9meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Franja NE
Eje del 3 al Eje 4
K1+557 hacia Mayores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



miércoles, 9 de abril de 2025, 11:23:29 p.m.
1° 24' 0" N, 77° 17' 22" W
311° NW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1800.1meter
Velocidad:2.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Franja NE
Eje del 3 al Eje 4
K1+557 hacia Mayores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




jueves, 10 de abril de 2025, 2:46:15 a.m.
1° 23' 59" N, 77° 17' 23" W
120° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1794.5meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Recorrido de Obra

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



jueves, 10 de abril de 2025, 10:28:04 p.m.
1° 23' 50" N, 77° 17' 24" W
300° NW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud:1789.7meter
Velocidad:0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del 3 al 2
Abscisa K1+250 hacia mayores


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

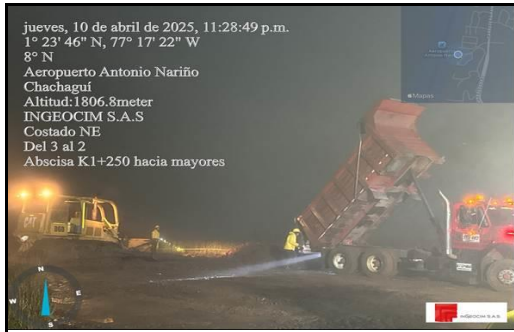

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

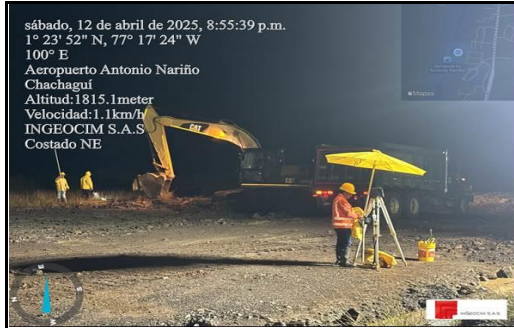


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

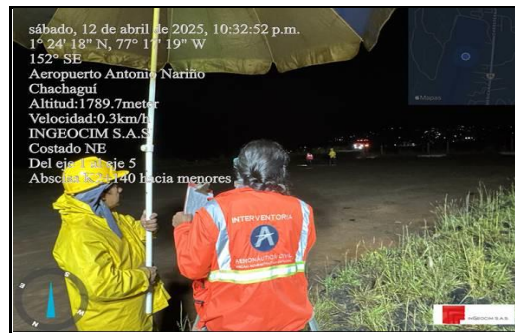

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

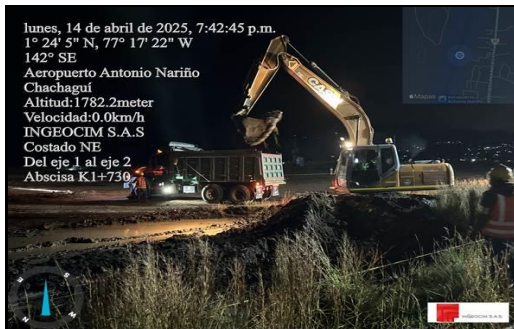

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

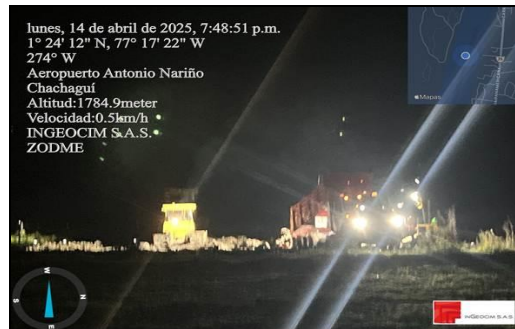

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 5, actualizando la línea base 3 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 2 correspondiente a la Prórroga No. 2 el día 21 de marzo de 2025, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2024, cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025. Este seguimiento se realizó con el Programa Detallado de Trabajo PDT, aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-152-OFc radicado 2025190010031929 de fecha 14 de marzo de 2025, remitido a la AEROCIVIL.	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
