

	INFORME SEMANAL		VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
			FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				

DATOS GENERALES					
Semana No.	40	Plazo total (días)	340		
PERIODO	Tiempo transcurrido desde inicio (días)		280		
Del	20/05/2025	% de tiempo transcurrido	82,35%		
Al	26/05/2025	Interventoría	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.		

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 208.904.394,68	Valor ejecutado	\$ 108.294.845,00	-\$ 100.609.549,68
Porcentaje programado	1,86%	Porcentaje ejecutado	0,96%	-0,89%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA				
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 5.246.878.038,36	Valor ejecutado	\$ 3.967.719.935,31	-\$ 1.279.158.103,05
Porcentaje programado	46,67%	Porcentaje ejecutado	35,29%	-11,38%

DATOS DEL CONTRATO				
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
<u>Contratista:</u> CONSORCIO ALFA			<u>Contratista:</u> GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	
<u>Contrato No:</u> 23001138 H4 DE 2024			<u>Contrato No:</u> 23001299 H3 DE 2024	
<u>Valor Inicial:</u> \$ 8.706.192.504,00			<u>Valor inicial:</u> \$ 684.322.873,00	
<u>Valor Actualizado al modificadorio:</u> \$ 2.536.379.355,00			<u>Valor actualizado al modificadorio:</u> \$ 347.289.600,00	
<u>Valor actualizado 2:</u> \$ 11.242.571.859,00			<u>Valor actualizado 2:</u> \$ 1.031.612.473,00	
<u>Plazo inicial:</u> Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.			<u>Plazo inicial:</u> Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.	
<u>Plazo actualizado:</u> 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025			<u>Plazo actualizado:</u> 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025	
<u>Fecha de iniciación:</u> 13/08/2024			<u>Fecha de iniciación:</u> 13/08/2024	
<u>Fecha de vencimiento inicial:</u> 16/12/2024			<u>Fecha de vencimiento:</u> 16/12/2024	
<u>Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1:</u> Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.			<u>Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1:</u> Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.	
<u>Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1:</u> 17/03/2025			<u>Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1:</u> 17/03/2025	
<u>Suspensión No. 1:</u> 4/03/2025			<u>Suspensión No. 1:</u> 4/03/2025	
<u>Periodo de Suspensión No. 1:</u> 4/03/2025 al 10/03/2025			<u>Periodo de Suspensión No. 1:</u> 4/03/2025 al 10/03/2025	
<u>Levantamiento de la suspensión No. 1:</u> 11/03/2025			<u>Levantamiento de la Suspensión No. 1:</u> 11/03/2025	
<u>Modificadorio No. 2 Prórroga No. 2:</u> Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.			<u>Modificadorio No. 2 Prórroga No. 2:</u> Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.	
<u>Nueva fecha de terminación:</u> 24/07/2025			<u>Nueva fecha de terminación:</u> 24/07/2025	
<u>Valor total actual del contrato:</u> \$ 11.242.571.859,00			<u>Valor total actual del contrato:</u> \$ 1.031.612.473,00	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
ACTIVIDADES LADO AIRE	ACTIVIDADES LADO TIERRA
* Acopio de material tolerable * Se localiza y se Replantea puntos del Eje No. 2 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+440 al K1+730 de Franja del Costado Nor Oeste. * Se realiza la Excavación de Material No Clasificado del Eje No. 2 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+440 al K1+730 de Franja del Costado Nor Oeste. * Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el Eje No. 2 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+440 al K1+730 de Franja del Costado Nor Oeste. * Se realizó la nivelación y cereo de la capa de Material Tolerable en un área de aproximadamente 6.250 m2.	N.A.


ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Mediante el comunicado T-003-2024-184-OFC de fecha 20 de mayo 2025 se remitió a la AEROCIVIL el Traslado Comunicado C-ALFA-179-2025 cuyo asunto corresponde a "Reiteración de afectación rendimiento en obra por condiciones climáticas". Mediante el comunicado T-003-2024-185-OFC de fecha 23 de mayo 2025 se remitió a la AEROCIVIL el Acta de recibo parcial de Interventoría No. 4.

ACTIVIDADES AMBIENTALES
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental Adaptado a la resolución 530 de 2000 versión 4, mediante el comunicado T-003-2024-181-OFC de fecha 12 de mayo de 2025.



ACTIVIDADES SISTEMA SST
* Inspección de botiquín de emergencias y extintores en obra. * Inducción a nuevo personal. * Capacitación por parte de la ARL sobre HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y PREVENCION DE ENFERMEDADES - RIESGO CARDIOVASCULAR * Preoperacionales de maquinaria y vehículos. * Señalizaciones preventivas de cajas eléctricas ubicadas sobre carretable costado noreste y noroeste. * Verificación de uso de EPP

AVANCE CANTIDADES								
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."						Semana No. 40 (20 May - 26 May)		
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado
2.2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD Y AS BUILT).	142.955,00	1,91%	\$ 1.500,00	\$ 214.432.500	0,00	\$ -	0,00%
2.4	ZONA 1 - NORESTE		40,08%		\$ 5.404.884.343			
2.4.1	Inicio Zona 2		0,00%		\$ -			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	33.539,67	3,30%	\$ 8.200,00	\$ 370.846.886		\$ -	0,00%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	70.433,30	3,20%	\$ 2.100,00	\$ 360.217.940		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	23.371,13	17,67%	\$ 85.000,00	\$ 1.986.138.637		\$ -	0,00%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	7.790,38	20,10%	\$ 290.000,00	\$ 2.259.210.200		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	38.951,88	3,81%	\$ 11.000,00	\$ 428.470.680		\$ -	
2.4	ZONA 2 - NOROESTE		22,82%		\$ 2.565.797.547,00			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	15.600,72	1,54%	\$ 8.200,00	\$ 172.951.284	2.465,00	\$ 20.213.000,00	15,80%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	32.761,51	1,75%	\$ 2.100,00	\$ 196.482.513	6.729,45	\$ 14.131.845,00	20,54%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	5.490,91	8,30%	\$ 85.000,00	\$ 933.453.850	870,00	\$ 73.950.000,00	15,84%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.660,61	9,44%	\$ 290.000,00	\$ 1.061.576.900		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.303,00	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.333.000		\$ -	
2.6	ZONA 3 - COSTADO SURESTE		21,95%		\$ 2.468.045.015,00			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	3.882,73	0,68%	\$ 8.200,00	\$ 76.802.758		\$ -	0,00%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	8.153,73	0,87%	\$ 2.100,00	\$ 98.241.257		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	6.655,40	9,18%	\$ 85.000,00	\$ 1.031.803.100		\$ -	0,00%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.655,65	9,43%	\$ 290.000,00	\$ 1.060.138.500		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.278,20	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.060.200		\$ -	
2.11	ITEMS NO PREVISTOS		4,95%		\$ 556.134.062			
2.11.1	NP-01 REALCE CAJA ELECTRICA (H<=0,70m)	45,00	0,25%	\$ 492.361,72	\$ 28.512.630		\$ -	0,00%
2.11.2	NP-02 EXCAVACION MANUAL	324,00	0,10%	\$ 27.991,41	\$ 11.608.596		\$ -	0,00%
2.11.3	NP-03 DEMOLICION DE CONCRETO	256,00	0,16%	\$ 54.836,72	\$ 17.968.896		\$ -	0,00%
2.11.4	NP-04 CONFORMACION DE FRANJAS CON MATERIAL DEL SITIO	71.353,00	4,43%	\$ 5.453,13	\$ 498.043.940		\$ -	
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 11.209.294.267,00		\$ 108.294.845,00	
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO					\$ 33.277.592,00			0,96%
TOTAL					\$ 11.242.571.859,00			

AVANCE FINANCIERO

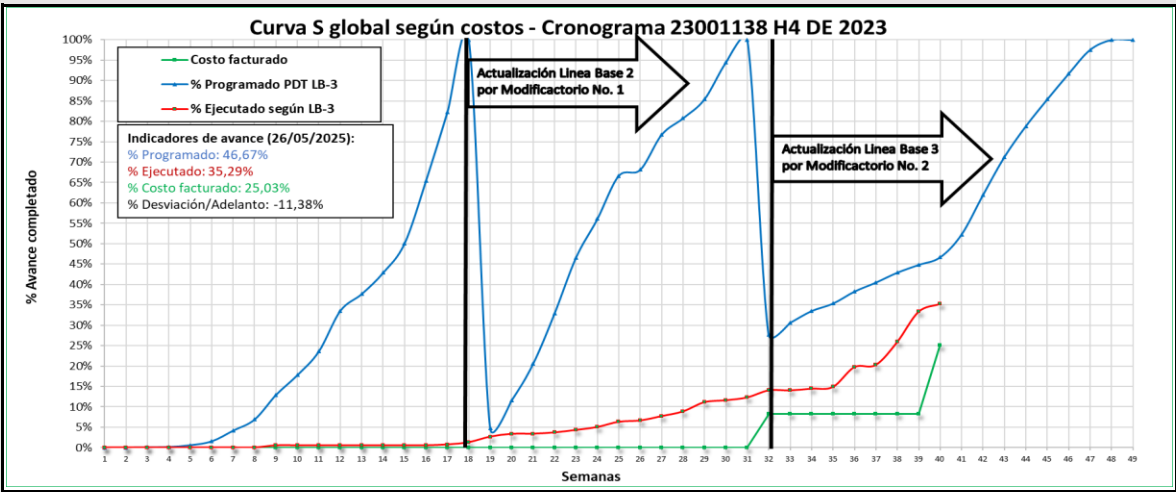



CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	\$ 208.904.394,68	EJECUTADO	Valor	\$ 108.294.845,00
	Porcentaje	1,86%		Porcentaje	0,96%
PROGRAMADO	Valor	\$ 5.246.878.038,36	EJECUTADO	Valor	\$ 3.967.719.935,31
	Porcentaje	46,67%		Porcentaje	35,29%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	\$ -	EJECUTADO	Valor	\$ 0,00
	Porcentaje	0,00%		Porcentaje	0,00%
PROGRAMADO	Valor	\$ 0,00	EJECUTADO	Valor	\$ 0,00
	Porcentaje	0,00%		Porcentaje	0,00%

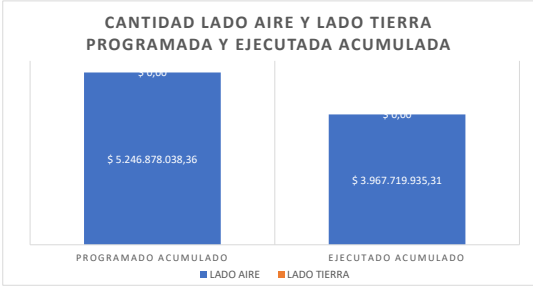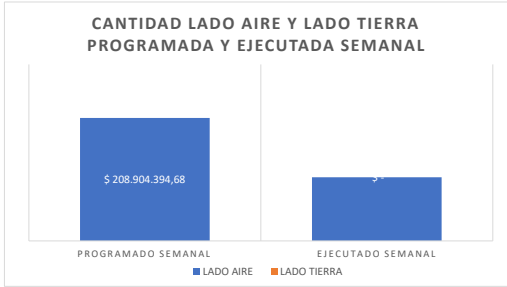

PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Residente de Obra	1
	Especialista Ambiental	1
	Especialista en Pavimentos	1
	Especialista en Hidráulica	1
	Gerente de Proyectos PMP	1
	Inspectora SISOMA	1
	Topógrafo	1
MANO DE OBRA	Cadeneros	2
	Operadores de Maquinaria	13
	Mecánico	1
	Ayudante	22
	Conductor Volqueta	13

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	2
Excavadora de Orugas	3
Vibrocompactadores	3
Bulldozer	2
Carrozanque	1
Retrocargador (Pajarita)	1
Luminarias	7
Camioneta Doble Cabina	1
Compresor	1

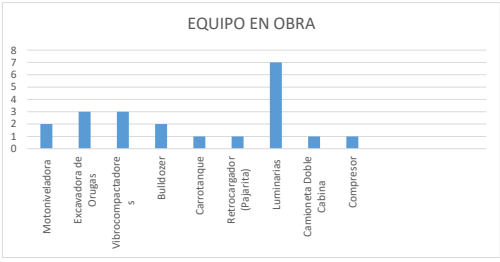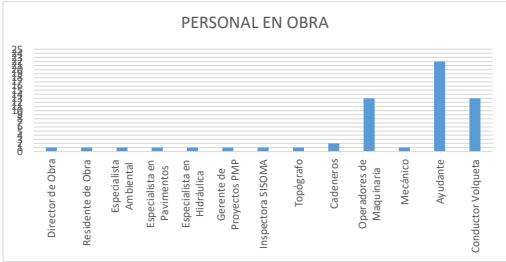


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FRENTE No. 1 - FRANJA NORESTE




ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV-220 PARA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

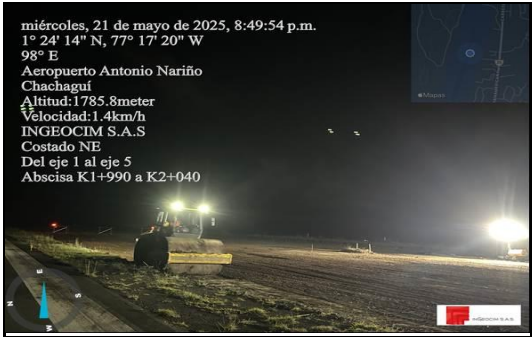


ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV-220 PARA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

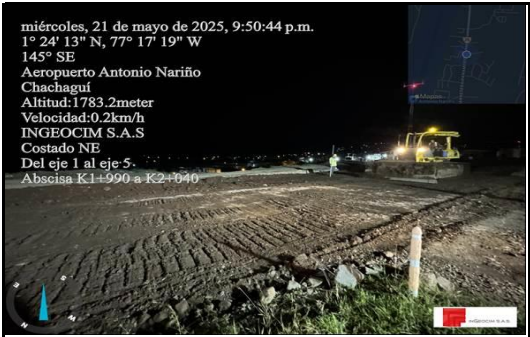


ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV-220 PARA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

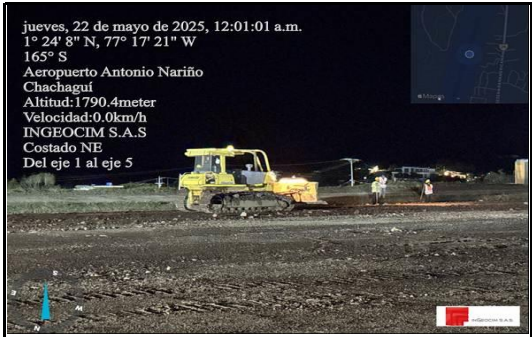

ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV-220 PARA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

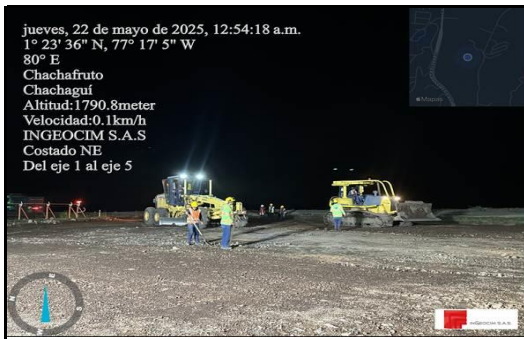

ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV-220 PARA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

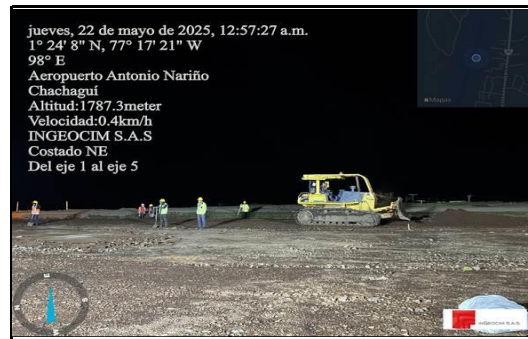

ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV-220 PARA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



TOMA DE DENSIDADES IN-SITU DE LA CAPA DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV-220 - ENSAYOS DE CONTROL Y CALIDAD POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



TOMA DE DENSIDADES IN-SITU DE LA CAPA DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV-220 - ENSAYOS DE CONTROL Y CALIDAD POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



TOMA DE DENSIDADES IN-SITU DE LA CAPA DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV-220 - ENSAYOS DE CONTROL Y CALIDAD POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



TOMA DE DENSIDADES IN-SITU DE LA CAPA DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV-220 - ENSAYOS DE CONTROL Y CALIDAD POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV-220 PARA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.




ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV-220 PARA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

FRENTE No. 2 - FRANJA NOROESTE




lunes, 19 de mayo de 2025, 10:17:12 p.m.
 1° 23' 56" N, 77° 17' 26" W
 273° W
 Aeropuerto Antonio Nariño
 Chachagüí
 Altitud: 1801.3meter
 Velocidad: 0.0km/h
 INGEOCIM S.A.S.
 Costado NO
 K1+440 hacia Mayores
 Del Eje 2 al Eje 3

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

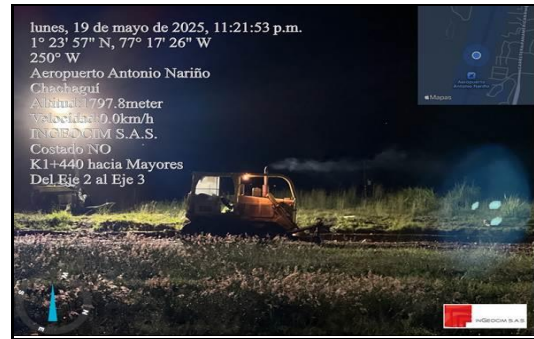


lunes, 19 de mayo de 2025, 11:21:53 p.m.
 1° 23' 57" N, 77° 17' 26" W
 250° W
 Aeropuerto Antonio Nariño
 Chachagüí
 Altitud: 1797.8meter
 Velocidad: 0.0km/h
 INGEOCIM S.A.S.
 Costado NO
 K1+440 hacia Mayores
 Del Eje 2 al Eje 3

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

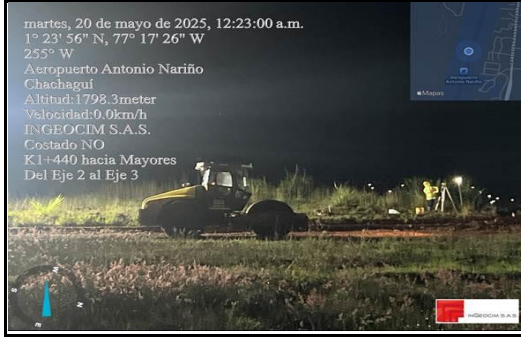

martes, 20 de mayo de 2025, 12:23:00 a.m.
 1° 23' 56" N, 77° 17' 26" W
 255° W
 Aeropuerto Antonio Nariño
 Chachagüí
 Altitud: 1798.3meter
 Velocidad: 0.0km/h
 INGEOCIM S.A.S.
 Costado NO
 K1+440 hacia Mayores
 Del Eje 2 al Eje 3

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

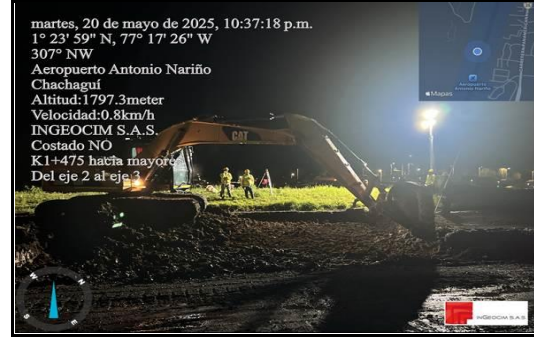

martes, 20 de mayo de 2025, 10:37:18 p.m.
 1° 23' 59" N, 77° 17' 26" W
 307° NW
 Aeropuerto Antonio Nariño
 Chachagüí
 Altitud: 1797.3meter
 Velocidad: 0.8km/h
 INGEOCIM S.A.S.
 Costado NO
 K1+475 hacia Mayores
 Del eje 2 al eje 3

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




martes, 20 de mayo de 2025, 11:39:17 p.m.
 1° 24' 2" N, 77° 17' 32" W
 248° W
 Colombia
 Altitud: 1780.8meter
 INGEOCIM S.A.S.
 Costado NO
 K1+475 hacia Mayores
 Del eje 2 al eje 3

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



miércoles, 21 de mayo de 2025, 8:36:31 p.m.
 1° 23' 59" N, 77° 17' 25" W
 274° W
 Aeropuerto Antonio Nariño
 Chachagüí
 Altitud: 1795.6meter
 Velocidad: 0.0km/h
 INGEOCIM S.A.S.
 Costado NO
 K1+505 hacia Mayores
 Del eje 2 al eje 3

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

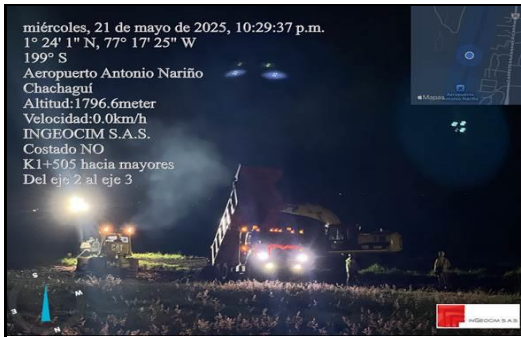


miércoles, 21 de mayo de 2025, 10:29:37 p.m.
 1° 24' 1" N, 77° 17' 25" W
 199° S
 Aeropuerto Antonio Nariño
 Chachagüí
 Altitud: 1796.6meter
 Velocidad: 0.0km/h
 INGEOCIM S.A.S.
 Costado NO
 K1+505 hacia Mayores
 Del eje 2 al eje 3

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




miércoles, 21 de mayo de 2025, 10:31:15 p.m.
 1° 24' 1" N, 77° 17' 25" W
 239° SW
 Aeropuerto Antonio Nariño
 Chachagüí
 Altitud: 1795.9meter
 Velocidad: 0.0km/h
 INGEOCIM S.A.S.
 Costado NO
 K1+505 hacia Mayores
 Del eje 2 al eje 3

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

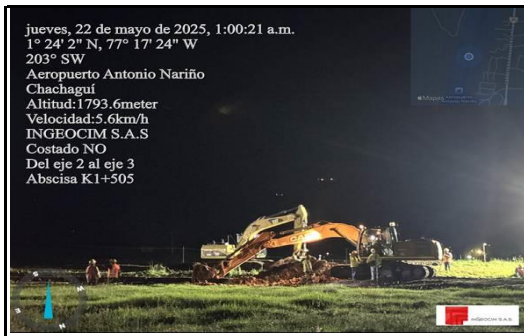


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

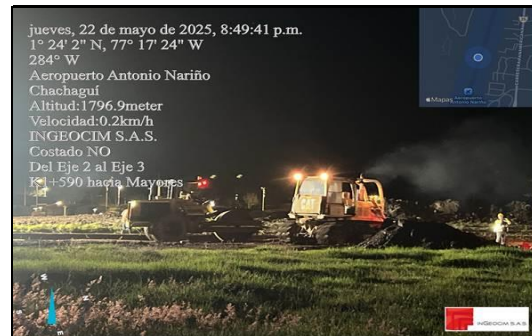

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

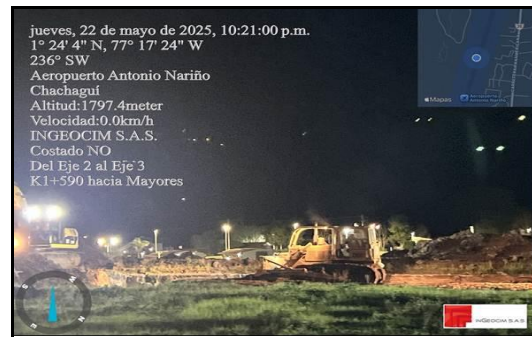


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

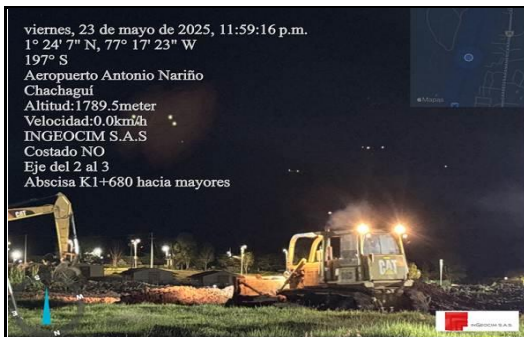


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

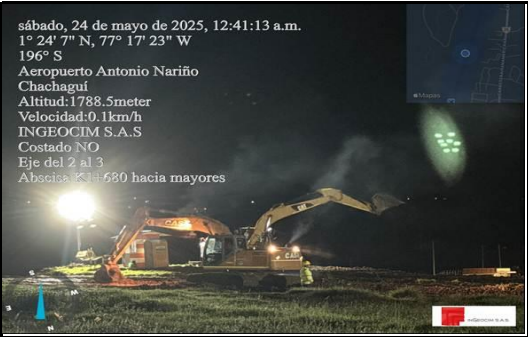

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

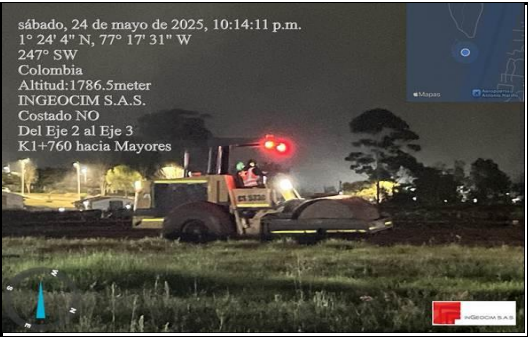

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 5, actualizando la línea base 3 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 2 correspondiente a la Prórroga No. 2 el día 21 de marzo de 2025, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2024, cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025. Este seguimiento se realizó con el Programa Detallado de Trabajo PDT, aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-152-OFIC radicado 2025190010031929 de fecha 14 de marzo de 2025, remitido a la AEROCIVIL.	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
