



	INFORME SEMANAL		VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.
			FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				
DATOS GENERALES					
Semana No. 41		Plazo total (días) 340			
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días) 287			
Del 27/05/2025		% de tiempo transcurrido 84,41%			
Al 2/06/2025		Interventoría		GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado \$ 626.752.324,41		Valor ejecutado \$ 437.422.481,00		-\$ 189.329.843,41	
Porcentaje programado 5,57%		Porcentaje ejecutado 3,89%		-1,68%	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado \$ 5.873.630.362,77		Valor ejecutado \$ 4.433.783.985,64		-\$ 1.439.846.377,13	
Porcentaje programado 52,24%		Porcentaje ejecutado 39,44%		-12,81%	
DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista: CONSORCIO ALFA			Contratista: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.		
Contrato No: 23001138 H4 DE 2024			Contrato No: 23001299 H3 DE 2024		
Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00			Valor inicial: \$ 684.322.873,00		
Valor Actualizado al modificatorio: \$ 2.536.379.355,00			Valor actualizado al modificatorio: \$ 347.289.600,00		
Valor actualizado 2: \$ 11.242.571.859,00			Valor actualizado 2: \$ 1.031.612.473,00		
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.			Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		
Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025			Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025		
Fecha de iniciación: 13/08/2024			Fecha de iniciación: 13/08/2024		
Fecha de vencimiento inicial: 16/12/2024			Fecha de vencimiento: 16/12/2024		
Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.			Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1: 17/03/2025			Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1: 17/03/2025		
Suspensión No. 1: 4/03/2025			Suspensión No. 1: 4/03/2025		
Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025			Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025		
Levantamiento de la suspensión No. 1: 11/03/2025			Levantamiento de la suspensión No. 1: 11/03/2025		
Modificadorio No. 2 Prórroga No. 2: Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.			Modificadorio No. 2 Prórroga No. 2: Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.		
Nueva fecha de terminación: 24/07/2025			Nueva fecha de terminación: 24/07/2025		
Valor total actual del contrato: \$ 11.242.571.859,00			Valor total actual del contrato: \$ 1.031.612.473,00		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
ACTIVIDADES LADO AIRE			ACTIVIDADES LADO TIERRA		
* Acopio de material tolerable * Se localiza y se Replantea puntos del Eje No. 2 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+730 al K2+140 de Franja del Costado Nor Oeste. * Se realiza la Excavación de Material No Clasificado del Eje No. 2 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+730 al K2+140 de Franja del Costado Nor Oeste. * Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el Eje No. 2 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+730 al K2+140 de Franja del Costado Nor Oeste. * Se realizó la nivelación y cereo de la capa de Material Tolerable en un área de aproximadamente 7.500 m2. * Se inician las actividades de Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Base Granular estabilizada con cemento			N.A.		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
Mediante el comunicado T-003-2024-186-OFC de fecha 26 de mayo 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Reiteración de los compromisos adquiridos en el comité de seguimiento No. 30 del contrato de obra No. 23001138 H4 de 2023.					
Mediante el comunicado T-003-2024-187-OFC de fecha 3 de junio 2025 se remitió a la AEROCIVIL Respuesta al comunicado C-ALFA-182-2025 – Remisión de la fórmula de trabajo aprobada para la instalación de la base estabilizada con cemento para el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2023.					
ACTIVIDADES AMBIENTALES					
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental Adaptado a la resolución 530 de 2000 versión 4, mediante el comunicado T-003-2024-181-OFC de fecha 12 de mayo de 2025.					
ACTIVIDADES SISTEMA SST					
* Actividades de reposición de EPP y verificación de uso correcto de los mismos. * Charla de seguridad sobre el consumo de sustancias psicoactivas. * Realización de pausas activas y reflejos. * Preoperacionales de maquinaria y vehículos. * Se continua con las actividades de señalizaciones preventivas de cajas eléctricas e instalación de tubos reflectivos en los costados de carretables.					

AVANCE CANTIDADES									
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."						Semana No. 41 (27 May - 2 Jun)			
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado	
2.2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD Y AS BUILT).	142.955,00	1,91%	\$ 1.500,00	\$ 214.432.500	0,00	\$ -	0,00%	
2.4	ZONA 1 - NOROESTE		48,08%		\$ 5.404.884.343				
2.4.1	Inicio Zona 2		0,00%		\$ -				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	33.539,67	3,30%	\$ 8.200,00	\$ 370.846.886		\$ -	0,00%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	70.433,30	3,20%	\$ 2.100,00	\$ 360.217.940		\$ -	0,00%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 22B.	23.371,13	17,67%	\$ 85.000,00	\$ 1.986.138.637		\$ -	0,00%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	7.790,38	20,10%	\$ 290.000,00	\$ 2.259.210.200	410,00	\$ 118.900.000,00	5,26%	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	38.951,88	3,81%	\$ 11.000,00	\$ 428.470.680		\$ -		
2.4	ZONA 2 - NOROESTE		22,82%		\$ 2.565.797.547,00				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	15.600,72	1,54%	\$ 8.200,00	\$ 172.951.284	5.157,00	\$ 42.287.400,00	33,06%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	32.761,51	1,75%	\$ 2.100,00	\$ 196.482.513	14.078,61	\$ 29.565.081,00	42,97%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 22B.	5.490,91	8,30%	\$ 85.000,00	\$ 933.453.850	2.902,00	\$ 246.670.000,00	52,85%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.660,61	9,44%	\$ 290.000,00	\$ 1.061.576.900		\$ -		
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.303,00	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.333.000		\$ -		
2.6	ZONA 3 - COSTADO SURESTE		21,95%		\$ 2.468.045.815,00				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	3.882,73	0,68%	\$ 8.200,00	\$ 76.802.758		\$ -	0,00%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	8.153,73	0,87%	\$ 2.100,00	\$ 98.241.257		\$ -	0,00%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 22B.	6.655,40	9,18%	\$ 85.000,00	\$ 1.031.803.100		\$ -	0,00%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.655,65	9,43%	\$ 290.000,00	\$ 1.060.138.500		\$ -		
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.278,20	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.060.200		\$ -		
2.11	ITEMS NO PREVISTOS		4,95%		\$ 556.134.062				
2.11.1	NP-01 REALCE CAJA ELÉCTRICA (H< 0,70m)	45,00	0,25%	\$ 492.361,72	\$ 28.512.630		\$ -	0,00%	
2.11.2	NP-02 EXCAVACION MANUAL	324,00	0,10%	\$ 27.991,41	\$ 11.608.596		\$ -	0,00%	
2.11.3	NP-03 DEMOLICION DE CONCRETO	256,00	0,16%	\$ 54.836,72	\$ 17.968.896		\$ -	0,00%	
2.11.4	NP-04 CONFORMACIÓN DE FRANJAS CON MATERIAL DEL SITIO	71.353,00	4,43%	\$ 5.453,13	\$ 498.043.940		\$ -		
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO							\$ 437.422.481,00		
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO							\$ 33.277.592,00	3,89%	
TOTAL							\$ 14.242.571.859,00		

AVANCE FINANCIERO

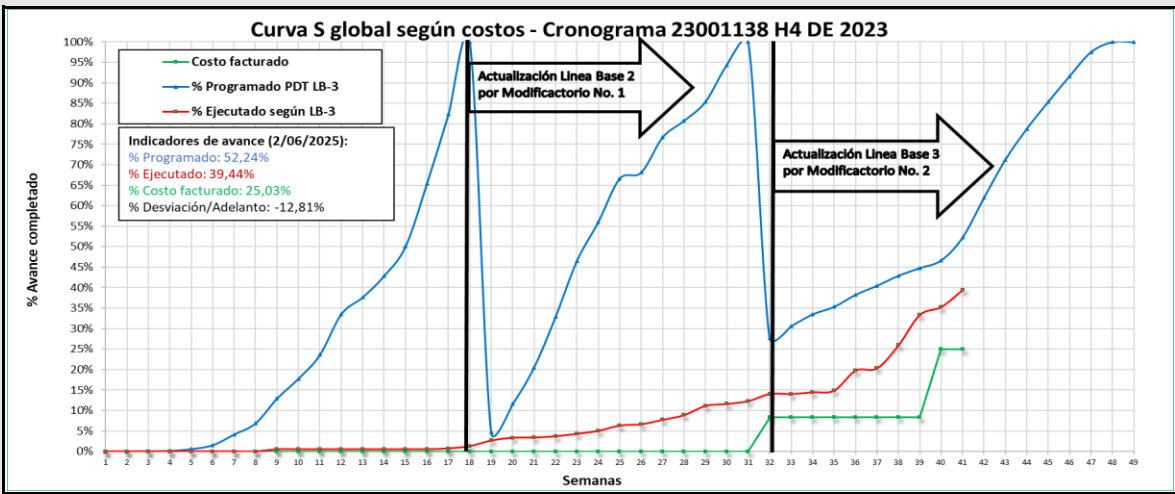



CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	
Valor \$ 626.752.324,41	Valor \$ 437.422.481,00		Valor \$ 5.873.630.362,77	Valor \$ 4.433.783.985,64	
Porcentaje 5,57%	Porcentaje 3,89%		Porcentaje 52,24%	Porcentaje 39,44%	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	
Valor \$ -	Valor \$ -		Valor \$ 0,00	Valor \$ 0,00	
Porcentaje 0,00%	Porcentaje 0,00%		Porcentaje 0,00%	Porcentaje 0,00%	

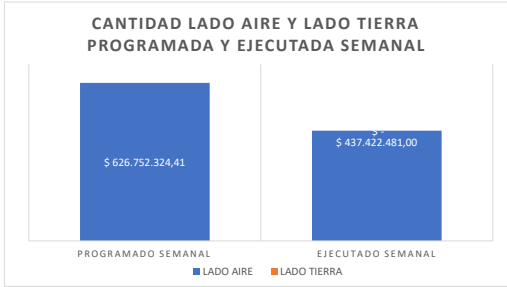

PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Residente de Obra	1
	Especialista Ambiental	1
	Especialista en Pavimentos	1
	Especialista en Hidráulica	1
	Gerente de Proyectos PMP	1
	Inspectora SISOMA	1
	Topógrafo	1
MANO DE OBRA	Cadeneros	2
	Operadores de Maquinaria	13
	Mecánico	1
	Ayudante	22
	Conductor Volqueta	13

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	2
Excavadora de Orugas	3
Vibrocompactadores	3
Bulldozer	2
Carrozanque	1
Retrocargador (Pajarita)	1
Luminarias	7
Camioneta Doble Cabina	1
Compresor	1

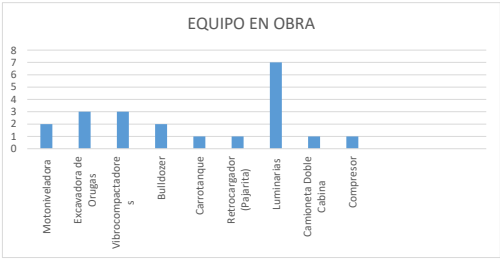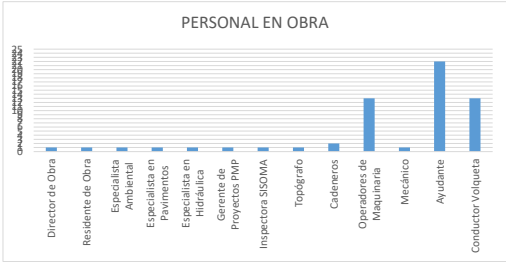

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FRENTE No. 1 - FRANJA NORESTE



TOMA DE MUESTRAS IN-SITU DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV-220 PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EN OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



TOMA DE MUESTRAS IN-SITU DE BASE GRANULAR PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EN OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

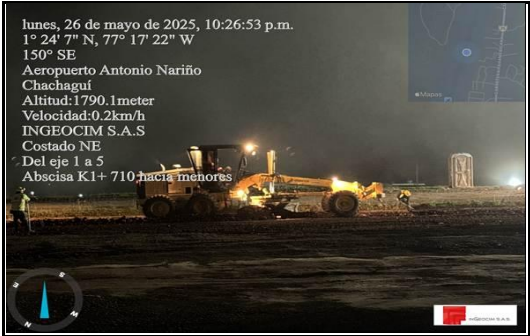

ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV-220 PARA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.




ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV-220 PARA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV-220 PARA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV-220 PARA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

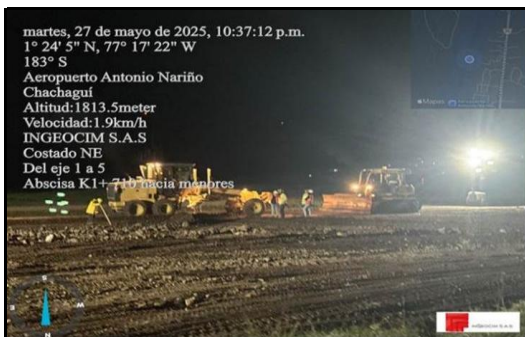


ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV-220 PARA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.




ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV-220 PARA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

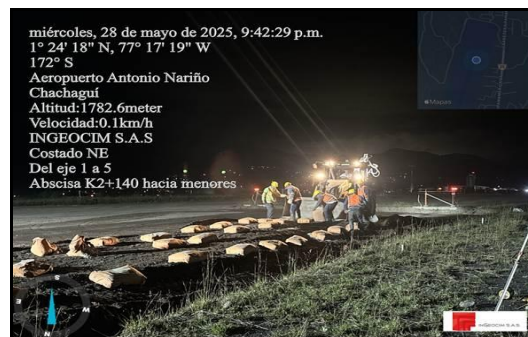

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

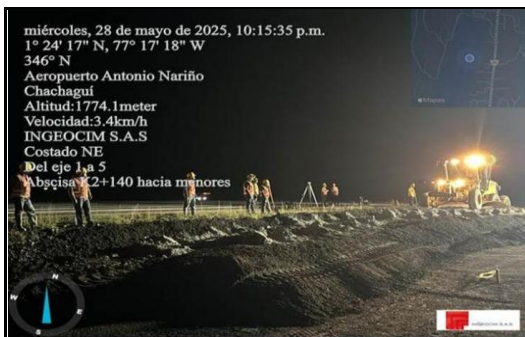


ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

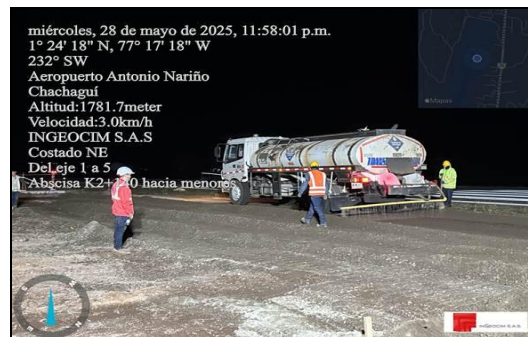


ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

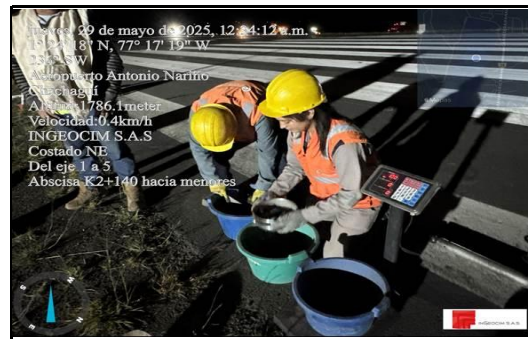

ACTIVIDADES DE TOMA DE BRIQUETAS PARA ENSAYOS DE LA BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

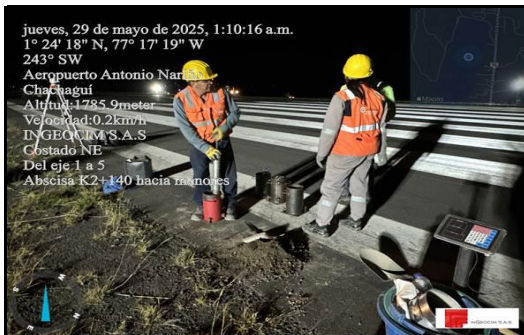

ACTIVIDADES DE TOMA DE BRIQUETAS PARA ENSAYOS DE LA BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

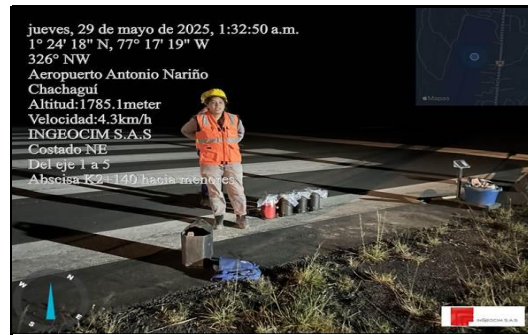


ACTIVIDADES DE TOMA DE BRIQUETAS PARA ENSAYOS DE LA BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

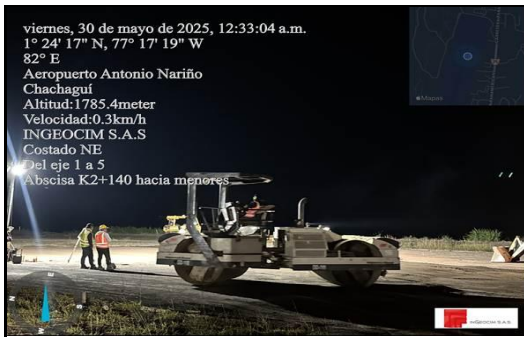

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

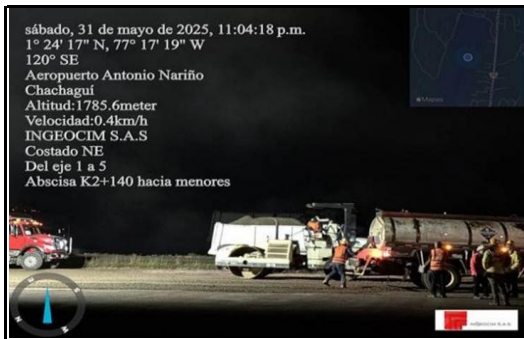

sábado, 31 de mayo de 2025, 11:04:18 p.m.
1° 24' 17" N, 77° 17' 19" W
120° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1785.6meter
Velocidad: 0.4km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 a 5
Abscisa K2+140 hacia menores


ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

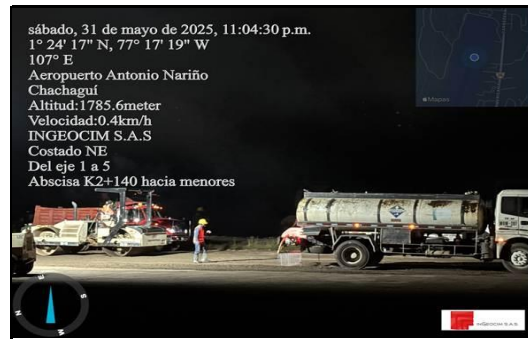

sábado, 31 de mayo de 2025, 11:04:30 p.m.
1° 24' 17" N, 77° 17' 19" W
107° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1785.6meter
Velocidad: 0.4km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 a 5
Abscisa K2+140 hacia menores

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

FRENTE No. 2 - FRANJA NOROESTE

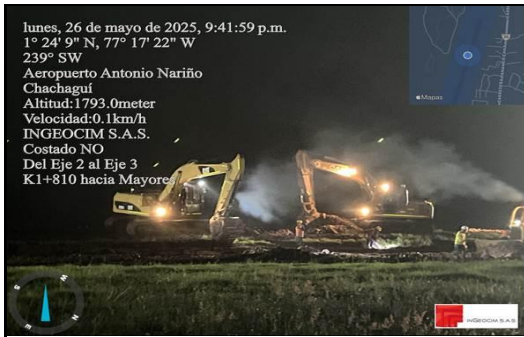


lunes, 26 de mayo de 2025, 9:41:59 p.m.
1° 24' 9" N, 77° 17' 22" W
239° SW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1793.0meter
Velocidad: 0.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NO
Del Eje 2 al Eje 3
K1+810 hacia Mayores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



lunes, 26 de mayo de 2025, 9:42:21 p.m.
1° 24' 9" N, 77° 17' 22" W
294° NW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1794.4meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NO
Del Eje 2 al Eje 3
K1+810 hacia Mayores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

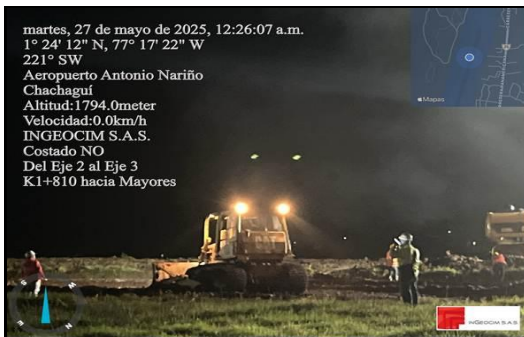

martes, 27 de mayo de 2025, 12:26:07 a.m.
1° 24' 12" N, 77° 17' 22" W
221° SW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1794.0meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NO
Del Eje 2 al Eje 3
K1+810 hacia Mayores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



martes, 27 de mayo de 2025, 12:26:17 a.m.
1° 24' 12" N, 77° 17' 22" W
230° SW
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1789.7meter
Velocidad: 0.2km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NO
Del Eje 2 al Eje 3
K1+810 hacia Mayores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




martes, 27 de mayo de 2025, 9:42:01 p.m.
1° 24' 19" N, 77° 17' 22" W
172° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1785.6meter
Velocidad: 2.3km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NO
Del Eje 2 al Eje 3
K2+140 hacia Menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




martes, 27 de mayo de 2025, 9:43:01 p.m.
1° 24' 19" N, 77° 17' 22" W
154° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1775.8meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NO
Del Eje 2 al Eje 3
K2+140 hacia Menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

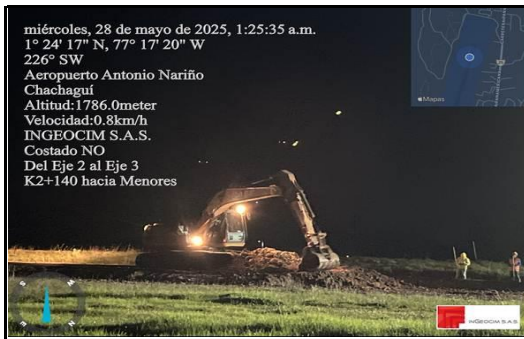

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

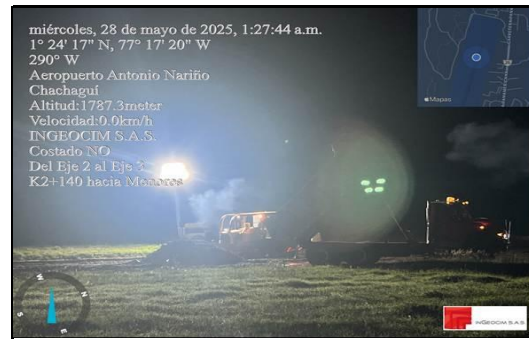


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

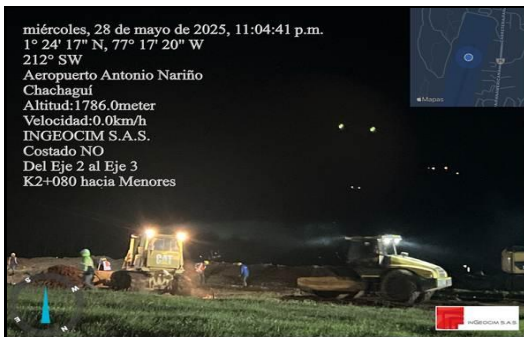


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

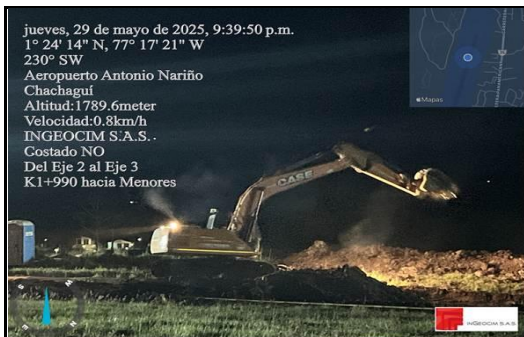


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

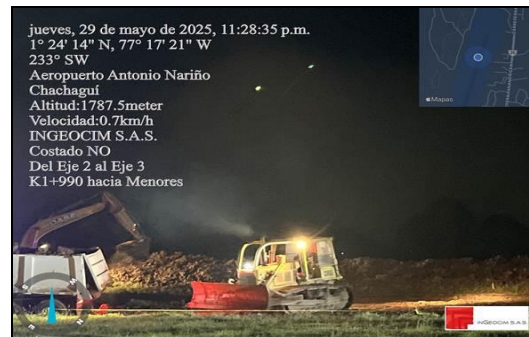

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

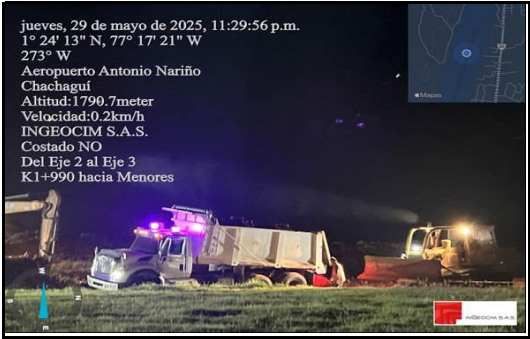


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

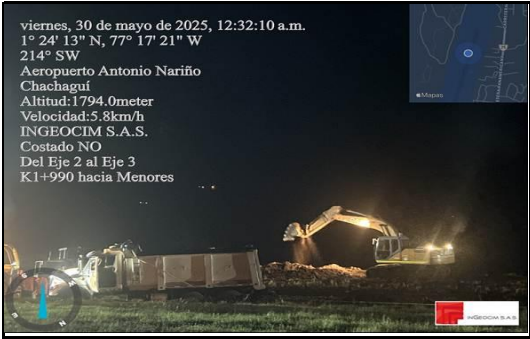

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

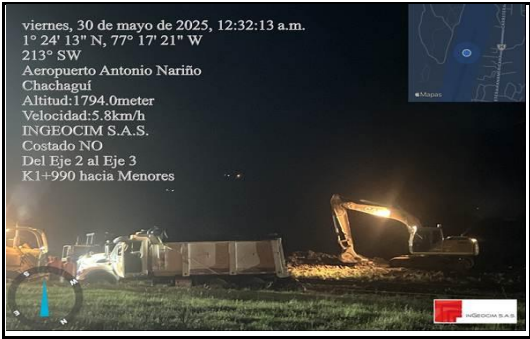

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

FRENTE No. 3 - FRANJA SURESTE

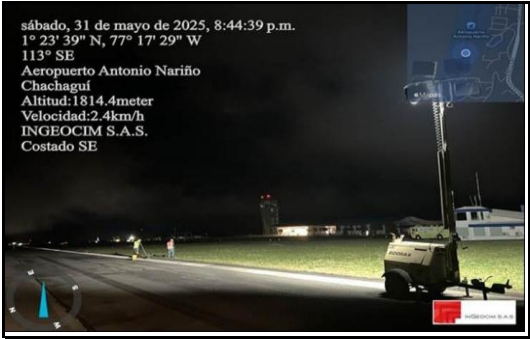

ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.



ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 5, actualizando la línea base 3 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 2 correspondiente a la Prórroga No. 2 el día 21 de marzo de 2025, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2024, cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025. Este seguimiento se realizó con el Programa Detallado de Trabajo PDT, aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-152-OFI radicado 2025190010031929 de fecha 14 de marzo de 2025, remitido a la AEROCIVIL.	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
