



	INFORME SEMANAL		VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
			FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				
DATOS GENERALES					
Semana No. 42		Plazo total (días) 340			
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días) 294			
Del 3/06/2025		% de tiempo transcurrido 86,47%			
Al 9/06/2025		Interventoría		GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado \$ 1.087.738.095,36		Valor ejecutado \$ 193.024.935,94		-\$ 894.713.159,42	
Porcentaje programado 9,68%		Porcentaje ejecutado 1,72%		-7,96%	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado \$ 6.961.368.458,13		Valor ejecutado \$ 4.675.412.742,13		-\$ 2.285.955.716,00	
Porcentaje programado 61,92%		Porcentaje ejecutado 41,59%		-20,33%	
DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista: CONSORCIO ALFA			Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.		
Contrato No: 23001138 H4 DE 2023			Contrato No: 23001299 H3 DE 2023		
Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00			Valor inicial: \$ 684.322.873,00		
Valor Actualizado al modificatorio: \$ 2.536.379.355,00			Valor actualizado al modificatorio: \$ 347.289.600,00		
Valor actualizado 2: \$ 11.242.571.859,00			Valor actualizado 2: \$ 1.031.612.473,00		
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.			Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		
Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025			Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025		
Fecha de iniciación: 13/08/2024			Fecha de iniciación: 13/08/2024		
Fecha de vencimiento inicial: 16/12/2024			Fecha de vencimiento: 16/12/2024		
Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.			Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1: 17/03/2025			Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1: 17/03/2025		
Suspensión No. 1: 4/03/2025			Suspensión No. 1: 4/03/2025		
Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025			Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025		
Levantamiento de la suspensión No. 1: 11/03/2025			Levantamiento de la suspensión No. 1: 11/03/2025		
Modificadorio No. 2 Prórroga No. 2: Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.			Modificadorio No. 2 Prórroga No. 2: Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.		
Nueva fecha de terminación: 24/07/2025			Nueva fecha de terminación: 24/07/2025		
Valor total actual del contrato: \$ 11.242.571.859,00			Valor total actual del contrato: \$ 1.031.612.473,00		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
ACTIVIDADES LADO AIRE			ACTIVIDADES LADO TIERRA		
* Acopio de material tolerable * Se localiza y se Replantea puntos del Eje No. 1 al Eje No. 2 de Franja desde el K0+970 al K0+903 de Franja del Costado Sur Este. * Se realiza la Excavación de Material No Clasificado del Eje No. 1 al Eje No. 2 de Franja desde el K0+970 al K0+903 de Franja del Costado Sur Este. * Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el Eje No. 1 al Eje No. 2 de Franja desde el K0+970 al K0+903 de Franja del Costado Sur Este. * Se continúa con las actividades de Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Base Granular estabilizada con cemento desde el Eje No. 1 al Eje No. 5 de Franja desde el K2+140 al K2+030 de Franja del Costado Nor Este.			N.A.		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
Mediante el comunicado T-003-2024-188-OFC de fecha 4 de junio 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Remisión del Informe semanal No. 41 del contrato de interventoría No. 23001299 H3 DE 2023. Mediante el comunicado T-003-2024-189-OFC de fecha 4 de junio 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA el Apremio No. 1 – Bajo Rendimiento en la ejecución de las actividades de obra del Contrato de Obra No. 23001138 H4 DE 2023. Mediante el comunicado T-003-2024-190-OFC de fecha 6 de junio 2025 se remitió a la AEROCIVIL el Informe semanal No. 37, 38, 39 y 40 del contrato de interventoría No. 23001299 H3 DE 2023. Mediante el comunicado T-003-2024-191-OFC de fecha 6 de junio 2025 se remitió a la AEROCIVIL el Informe Mensual No. 10 correspondiente al mes de mayo de 2025.					
ACTIVIDADES AMBIENTALES					
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental Adaptado a la resolución 530 de 2000 versión 4, mediante el comunicado T-003-2024-181-OFC de fecha 12 de mayo de 2025.					
ACTIVIDADES SISTEMA SST					
* Preoperacionales de maquinaria y vehículos. * Charla de seguridad sobre exposición al ruido. * Reposición de EPP. * Verificación de señalizaciones preventivas sobre área de intervención (franjas de seguridad). * Control de asistencia de personal de obra.					

AVANCE CANTIDADES								
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."						Semana No. 42 (3 Jun - 9 Jun)		
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado
2.2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD Y AS BUILT).	142.955,00	1,91%	\$ 1.500,00	\$ 214.432.500	0,00	\$ -	0,00%
2.4	ZONA 1 - NOROCCIDENTE		48,08%		\$ 5.404.084.343			
2.4.1	Inicio Zona 2		0,00%		\$ -			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	33.539,67	3,30%	\$ 8.200,00	\$ 370.846.886		\$ -	0,00%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	70.433,30	3,20%	\$ 2.100,00	\$ 360.217.940		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	23.371,13	17,67%	\$ 85.000,00	\$ 1.986.138.637		\$ -	0,00%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	7.790,38	20,10%	\$ 290.000,00	\$ 2.259.210.200	574,00	\$ 166.460.000,00	7,37%
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	38.951,88	3,81%	\$ 11.000,00	\$ 428.470.680		\$ -	
2.4	ZONA 2 - NOROCCIDENTE		22,82%		\$ 2.565.797.547,00			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	15.600,72	1,54%	\$ 8.200,00	\$ 172.951.284		\$ -	0,00%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	32.781,51	1,75%	\$ 2.100,00	\$ 196.482.513		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	5.490,91	8,30%	\$ 85.000,00	\$ 933.453.850		\$ -	0,00%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.660,61	9,44%	\$ 290.000,00	\$ 1.061.576.900		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.303,00	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.333.000		\$ -	
2.6	ZONA 3 - COSTADO SURESTE		21,93%		\$ 2.468.045.815,00			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	3.882,73	0,68%	\$ 8.200,00	\$ 76.802.758	502,50	\$ 4.120.500,00	12,94%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	8.153,73	0,87%	\$ 2.100,00	\$ 98.241.257	1.371,83	\$ 2.880.832,50	16,82%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	6.655,40	9,18%	\$ 85.000,00	\$ 1.031.803.100	201,00	\$ 17.085.000,00	3,02%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.655,65	9,43%	\$ 290.000,00	\$ 1.060.138.500		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.278,20	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.060.200		\$ -	
2.11	ITEMS NO PREVISTOS		4,95%		\$ 556.134.062			
2.11.1	NP-01 REALCE CAJA ELECTRICA (H= 0,70m)	45,00	0,25%	\$ 492.361,72	\$ 28.512.630	5,00	\$ 2.461.808,59	11,11%
2.11.2	NP-02 EXCAVACION MANUAL	324,00	0,10%	\$ 27.991,41	\$ 11.608.596	0,60	\$ 16.794,84	0,19%
2.11.3	NP-03 DEMOLICION DE CONCRETO	256,00	0,16%	\$ 54.836,72	\$ 17.968.896		\$ -	0,00%
2.11.4	NP-04 CONFORMACIÓN DE FRANJAS CON MATERIAL DEL SITIO	71.353,00	4,43%	\$ 5.453,13	\$ 498.043.940		\$ -	
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 11.209.294.267,00		\$ 193.024.935,94	
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO					\$ 33.277.592,00			1,72%
TOTAL					\$ 11.242.571.859,00			

AVANCE FINANCIERO

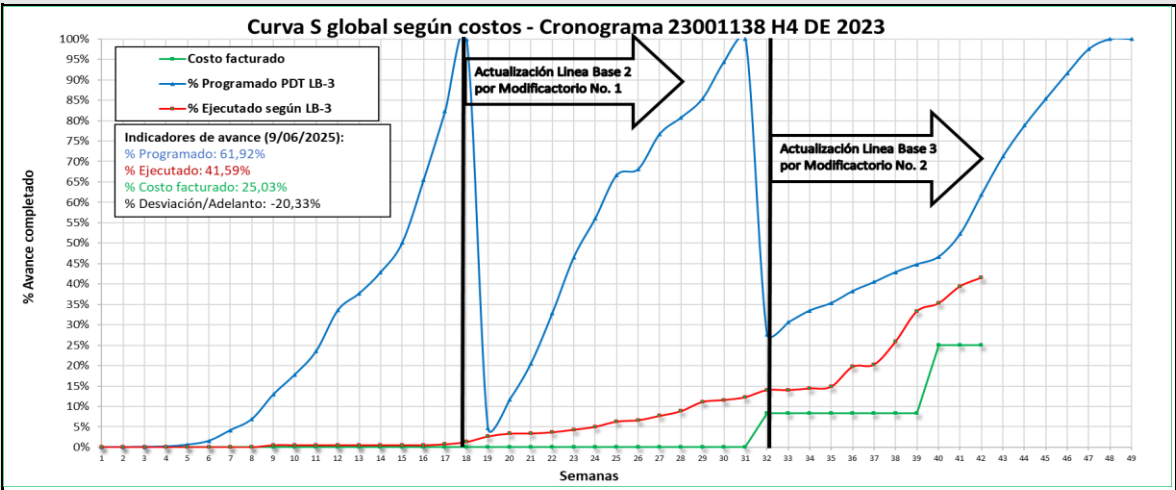

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	\$ 1.087.738.095,36	EJECUTADO	Valor	\$ 193.024.935,94
	Porcentaje	9,68%		Porcentaje	1,72%
PROGRAMADO	Valor	\$ 6.961.368.458,13	EJECUTADO	Valor	\$ 4.675.412.742,13
	Porcentaje	61,92%		Porcentaje	41,59%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	\$ -	EJECUTADO	Valor	\$ 0,00
	Porcentaje	0,00%		Porcentaje	0,00%
PROGRAMADO	Valor	\$ 0,00	EJECUTADO	Valor	\$ 0,00
	Porcentaje	0,00%		Porcentaje	0,00%


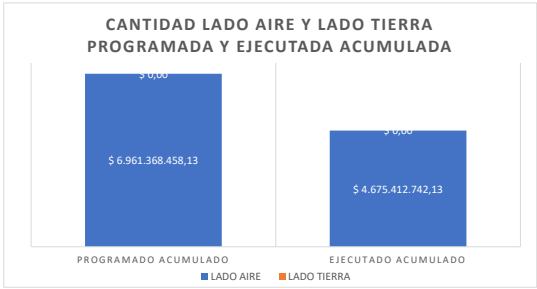


PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Residente de Obra	1
	Especialista Ambiental	1
	Especialista en Pavimentos	1
	Especialista en Hidráulica	1
	Gerente de Proyectos PMP	1
	Inspectora SISOMA	1
	Topógrafo	1
MANO DE OBRA	Cadeneros	2
	Operadores de Maquinaria	13
	Mecánico	1
	Ayudante	22
	Conductor Volqueta	13

MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	2
Excavadora de Orugas	3
Vibrocompactadores	3
Bulldozer	2
Carrozanque	1
Retrocargador (Pajarita)	1
Luminarias	7
Camioneta Doble Cabina	1
Compresor	1

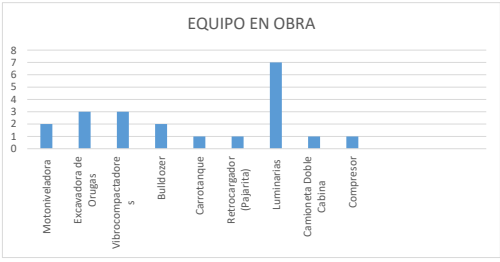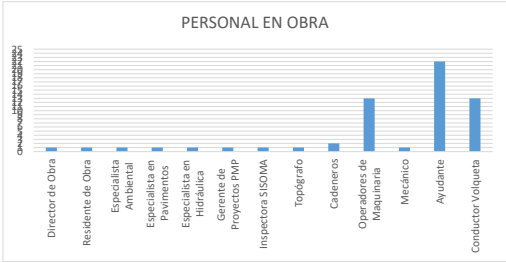

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE No. 1 - FRANJA NORESTE



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE REALCE CAJA ELECTRICA 1.00x0,60m (Hs 0.70m) - INCLUYE REHUSO DE TAPA.



ACTIVIDADES DE REALCE CAJA ELECTRICA 1.00x0,60m (Hs 0.70m) - INCLUYE REHUSO DE TAPA.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE REALCE CAJA ELECTRICA 1.00x0,60m (Hs 0.70m) - INCLUYE REHUSO DE TAPA.




ACTIVIDADES DE REALCE CAJA ELECTRICA 1.00x0,60m (Hs 0.70m) - INCLUYE REHUSO DE TAPA.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

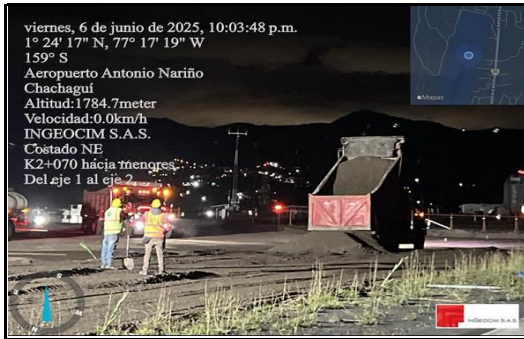


viernes, 6 de junio de 2025, 10:03:48 p.m.
1° 24' 17" N, 77° 17' 19" W
159° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1784.7meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K2+070 hacia menores
Del eje 1 al eje 2

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

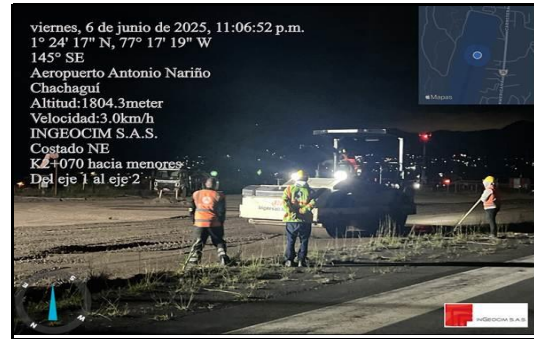


viernes, 6 de junio de 2025, 11:06:52 p.m.
1° 24' 17" N, 77° 17' 19" W
145° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1804.3meter
Velocidad: 3.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K2+070 hacia menores
Del eje 1 al eje 2

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

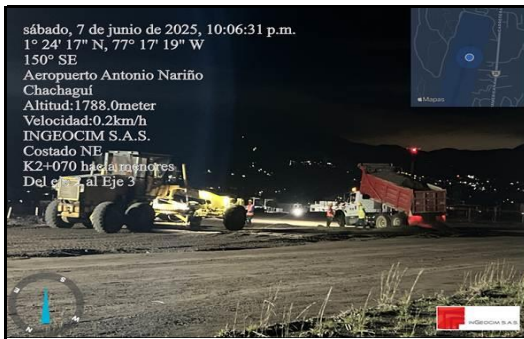


sábado, 7 de junio de 2025, 10:06:31 p.m.
1° 24' 17" N, 77° 17' 19" W
150° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1788.0meter
Velocidad: 0.2km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K2+070 hacia menores
Del eje 1 al Eje 3

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

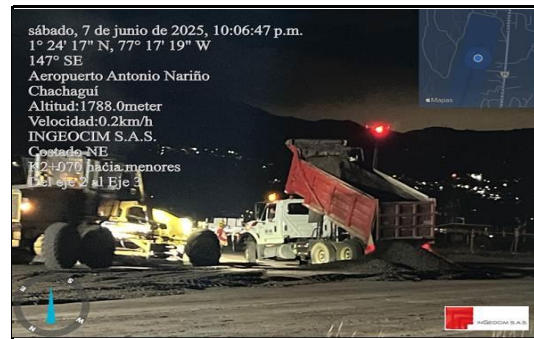


sábado, 7 de junio de 2025, 10:06:47 p.m.
1° 24' 17" N, 77° 17' 19" W
147° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1788.0meter
Velocidad: 0.2km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K2+070 hacia menores
Del eje 2 al Eje 3

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

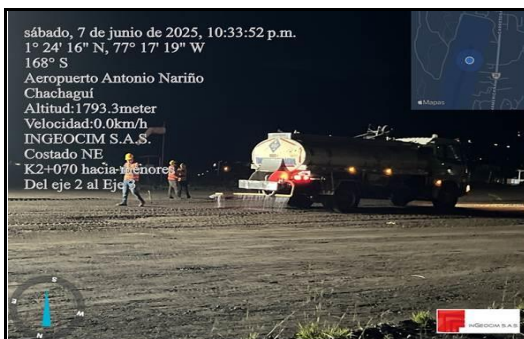


sábado, 7 de junio de 2025, 10:33:52 p.m.
1° 24' 16" N, 77° 17' 19" W
168° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1793.3meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K2+070 hacia menores
Del eje 2 al Eje 3

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

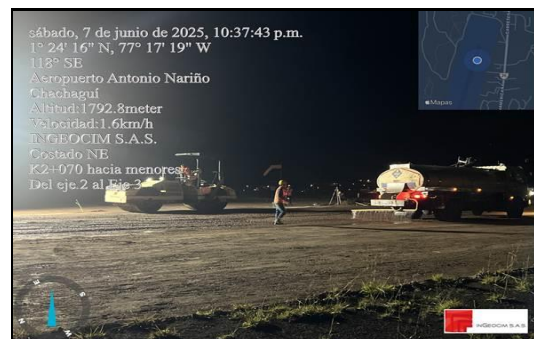


sábado, 7 de junio de 2025, 10:37:43 p.m.
1° 24' 16" N, 77° 17' 19" W
118° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1792.8meter
Velocidad: 1.6km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K2+070 hacia menores
Del eje 2 al Eje 3

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

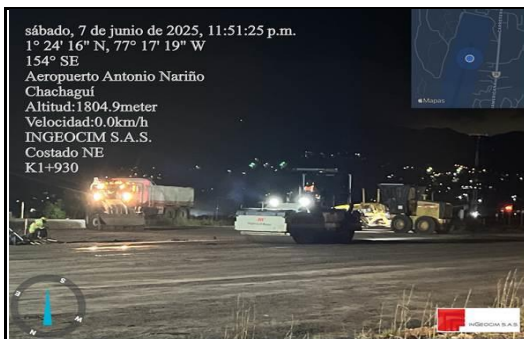

sábado, 7 de junio de 2025, 11:51:25 p.m.
1° 24' 16" N, 77° 17' 19" W
154° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1804.9meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+930

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

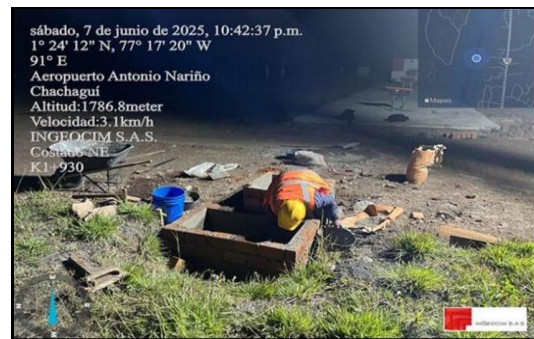


sábado, 7 de junio de 2025, 10:42:37 p.m.
1° 24' 12" N, 77° 17' 20" W
91° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1786.8meter
Velocidad: 3.1km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+930

ACTIVIDADES DE REALCE CAJA ELECTRICA 1.00x0,60m (H± 0.70m) - INCLUYE REHUSO DE TAPA.



sábado, 7 de junio de 2025, 10:43:04 p.m.
1° 24' 12" N, 77° 17' 20" W
116° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1786.0meter
Velocidad: 0.3km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+930


ACTIVIDADES DE REALCE CAJA ELECTRICA 1.00x0,60m (Hs 0.70m) - INCLUYE REHUO DE TAPA.

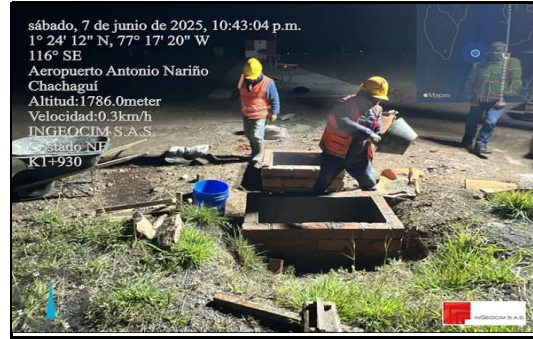

sábado, 7 de junio de 2025, 10:43:04 p.m.
1° 24' 12" N, 77° 17' 20" W
116° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1786.0meter
Velocidad: 0.3km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+930


ACTIVIDADES DE REALCE CAJA ELECTRICA 1.00x0,60m (Hs 0.70m) - INCLUYE REHUO DE TAPA.

FRENTE No. 3 - FRANJA SURESTE

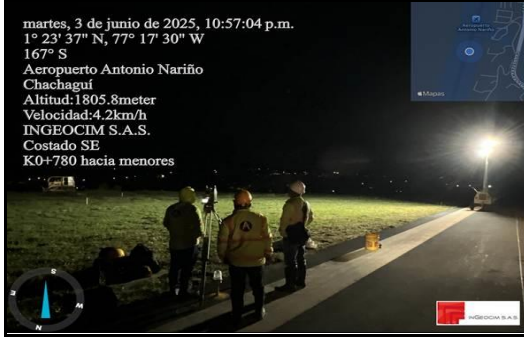

martes, 3 de junio de 2025, 10:57:04 p.m.
1° 23' 37" N, 77° 17' 30" W
167° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1805.8meter
Velocidad: 4.2km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado SE
K0+780 hacia menores

ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA INICIO DE ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

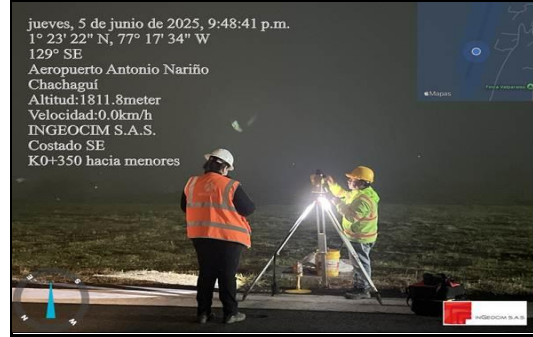

jueves, 5 de junio de 2025, 9:48:41 p.m.
1° 23' 22" N, 77° 17' 34" W
129° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1811.8meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado SE
K0+350 hacia menores

ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA INICIO DE ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



jueves, 5 de junio de 2025, 11:39:36 p.m.
1° 23' 22" N, 77° 17' 34" W
168° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1815.5meter
Velocidad: 0.6km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado SE
K0+350 hacia menores

ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA INICIO DE ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



viernes, 6 de junio de 2025, 9:29:11 p.m.
1° 23' 45" N, 77° 17' 22" W
95° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1792.2meter
INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al 2
Abscisa K0+970 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



viernes, 6 de junio de 2025, 11:17:40 p.m.
1° 23' 45" N, 77° 17' 22" W
97° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1808.3meter
INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al 2
Abscisa K0+970 hacia menores

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



sábado, 7 de junio de 2025, 12:08:34 a.m.
1° 23' 41" N, 77° 17' 28" W
95° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1806.8meter
Velocidad: 0.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al 2
Abscisa K0+970 hacia menores


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

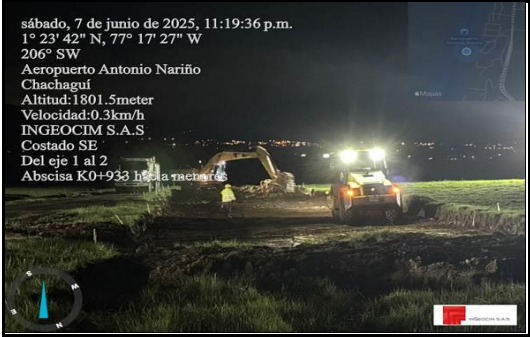

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 5, actualizando la línea base 3 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 2 correspondiente a la Prórroga No. 2 el día 21 de marzo de 2025, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2024, cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025. Este seguimiento se realizó con el Programa Detallado de Trabajo PDT, aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-152-Ofc radicado 2025190010031929 de fecha 14 de marzo de 2025, remitido a la AEROCIVIL.	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
