



	INFORME SEMANAL		VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
			FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2023 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				
DATOS GENERALES					
Semana No. 45		Plazo total (días) 340			
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días) 315			
Del 24/06/2025		% de tiempo transcurrido 92,65%			
Al 30/06/2025		Interventoría		GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado \$ 740.102.717,77		Valor ejecutado \$ 269.153.673,00		-\$ 470.949.044,77	
Porcentaje programado 6,58%		Porcentaje ejecutado 2,39%		-4,19%	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado \$ 9.599.012.591,17		Valor ejecutado \$ 5.959.472.215,08		-\$ 3.639.540.376,09	
Porcentaje programado 85,38%		Porcentaje ejecutado 53,01%		-32,37%	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL - PLAN DE CONTINGENCIA					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado \$ 1.345.458.449,53		Valor ejecutado \$ 269.153.673,00		-\$ 1.076.304.776,53	
Porcentaje programado 19,93%		Porcentaje ejecutado 3,99%		-15,95%	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA - PLAN DE CONTINGENCIA					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado \$ 1.751.421.225,06		Valor ejecutado \$ 1.347.686.530,71		-\$ 403.734.694,35	
Porcentaje programado 25,95%		Porcentaje ejecutado 19,97%		-5,98%	
DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista: CONSORCIO ALFA			Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.		
Contrato No: 23001138 H4 DE 2023			Contrato No: 23001299 H3 DE 2023		
Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00			Valor inicial: \$ 684.322.873,00		
Valor Actualizado al modificadorio: \$ 2.536.379.355,00			Valor actualizado al modificadorio: \$ 347.289.600,00		
Valor actualizado 2: \$ 11.242.571.859,00			Valor actualizado 2: \$ 1.031.612.473,00		
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.			Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		
Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025			Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025		
Fecha de iniciación: 13/08/2024			Fecha de iniciación: 13/08/2024		
Fecha de vencimiento inicial: 16/12/2024			Fecha de vencimiento: 16/12/2024		
Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.			Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1: 17/03/2025			Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1: 17/03/2025		
Suspensión No. 1: 4/03/2025			Suspensión No. 1: 4/03/2025		
Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025			Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025		
Levantamiento de la suspensión No. 1: 11/03/2025			Levantamiento de la suspensión No. 1: 11/03/2025		
Modificadorio No. 2 Prórroga No. 2: Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.			Modificadorio No. 2 Prórroga No. 2: Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.		
Nueva fecha de terminación: 24/07/2025			Nueva fecha de terminación: 24/07/2025		
Valor total actual del contrato: \$ 11.242.571.859,00			Valor total actual del contrato: \$ 1.031.612.473,00		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
ACTIVIDADES LADO AIRE			ACTIVIDADES LADO TIERRA		
* Acopio de material tolerable * Se localiza y se Replantea puntos del Eje No. 1 al Eje No. 2 de Franja desde el K0+590 al K0+360 de Franja del Costado Sur Este. * Se realiza la Excavación de Material No Clasificado del Eje No. 1 al Eje No. 2 de Franja desde el K0+590 al K0+360 de Franja del Costado Sur Este. * Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el Eje No. 1 al Eje No. 2 de Franja desde el K0+590 al K0+360 de Franja del Costado Sur Este. * Se continúa con las actividades de Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Base Granular estabilizada con cemento desde el Eje No. 1 al Eje No. 5 de Franja desde el K1+890 al K1+830 de Franja del Costado Nor Este.			N.A.		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
Mediante el comunicado T-003-2024-194-OFC de fecha 17 de junio 2025 se remitió a la AEROCIVIL el Informe de incidente presentado en la jornada laboral del 16 de junio de 2025.” Mediante el comunicado T-003-2024-195-OFC de fecha 24 de junio 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta al comunicado C-ALFA-194-2024 - Aval solicitud de prórroga al plazo de ejecución del contrato de obra 23001138 H4 de 2023. Mediante el comunicado T-003-2024-196-OFC de fecha 24 de junio 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Solicitud de Prórroga No. 3 para el contrato de interventoría No. 23001299 H3 de 2023. Mediante el comunicado T-003-2024-197-OFC de fecha 24 de junio 2025 se remitió a la AEROCIVIL el Traslado Comunicado C-ALFA-196-2025 cuyo asunto corresponde a “Solicitud de entrega luz PAPI para corrección.”.					
ACTIVIDADES AMBIENTALES					
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental Adaptado a la resolución 530 de 2000 versión 4, mediante el comunicado T-003-2024-181-OFC de fecha 12 de mayo de 2025.					
ACTIVIDADES SISTEMA SST					
* Reposición y verificación de uso de EPP. * Diligenciamiento y revisión de preoperacionales de maquinaria y vehículos. * Organización de bodega. * Inspección de seguridad: inspección de extintores (oficina, bodega, maquinaria) * Actividad de señalización preventiva con conos de seguridad sobre cajillas eléctricas, tanto en franja noreste y sureste.					

AVANCE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024						Semana No. 45 (24 Jun - 30 Jun)		
"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."								
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado
2.2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD Y AS BUILT).	142.955,00	1,91%	\$ 1.500,00	\$ 214.432.500	0,00	\$ -	0,00%
2.4	ZONA 1 - NOROESTE		48,08%		\$ 5.484.884.343			
2.4.1	Inicio Zona 2		0,00%		\$ -			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	33.539,67	3,30%	\$ 8.200,00	\$ 370.846.886	\$ -	\$ -	0,00%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	70.433,30	3,20%	\$ 2.100,00	\$ 360.217.940	\$ -	\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 22b.	23.371,13	17,67%	\$ 85.000,00	\$ 1.986.138.637	\$ -	\$ -	0,00%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	7.790,38	20,10%	\$ 290.000,00	\$ 2.259.210.200	738,00	\$ 214.020.000,00	9,47%
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0	\$ -	\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	38.951,88	3,81%	\$ 11.000,00	\$ 428.470.680	\$ -	\$ -	
2.4	ZONA 2 - NOROESTE		22,82%		\$ 2.565.797.547,00			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	15.600,72	1,54%	\$ 8.200,00	\$ 172.951.284	\$ -	\$ -	0,00%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	32.761,51	1,75%	\$ 2.100,00	\$ 196.482.513	\$ -	\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 22b.	5.490,91	8,30%	\$ 85.000,00	\$ 933.453.850	\$ -	\$ -	0,00%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.660,61	9,44%	\$ 290.000,00	\$ 1.061.576.900	\$ -	\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0	\$ -	\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.303,00	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.333.000	\$ -	\$ -	
2.6	ZONA 3 - COSTADO SURESTE		21,95%		\$ 2.468.045.815,00			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	3.882,73	0,68%	\$ 8.200,00	\$ 76.802.758	975,00	\$ 7.995.000,00	25,11%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	8.153,73	0,87%	\$ 2.100,00	\$ 96.241.257	2.661,75	\$ 5.589.675,00	32,64%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 22b.	6.655,40	9,18%	\$ 85.000,00	\$ 1.031.803.100	390,00	\$ 33.150.000,00	5,86%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.655,65	9,43%	\$ 290.000,00	\$ 1.060.138.500	\$ -	\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00		\$ -	\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.278,20	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.060.200	\$ -	\$ -	
2.11	ITEMS NO PREVISTOS		4,95%		\$ 556.134.062			
2.11.1	NP-01 REALCE CAJA ELÉCTRICA (H=0,70m)	45,00	0,25%	\$ 492.361,72	\$ 28.512.630	3,00	\$ 1.477.085,16	6,67%
2.11.2	NP-02 EXCAVACIÓN MANUAL	324,00	0,10%	\$ 27.991,41	\$ 11.608.596	0,36	\$ 10.076,91	0,11%
2.11.3	NP-03 DEMOLICIÓN DE CONCRETO	256,00	0,16%	\$ 54.836,72	\$ 17.968.896		\$ -	0,00%
2.11.4	NP-04 CONFORMACIÓN DE FRANJAS CON MATERIAL DEL SITIO	71.353,00	4,43%	\$ 5.453,13	\$ 498.043.940	1.267,50	\$ 6.911.835,94	
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 11.269.294.267,00		\$ 269.153.673,00	
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO					\$ 33.277.592,00			2,39%
TOTAL					\$ 11.242.571.859,00			

AVANCE FINANCIERO

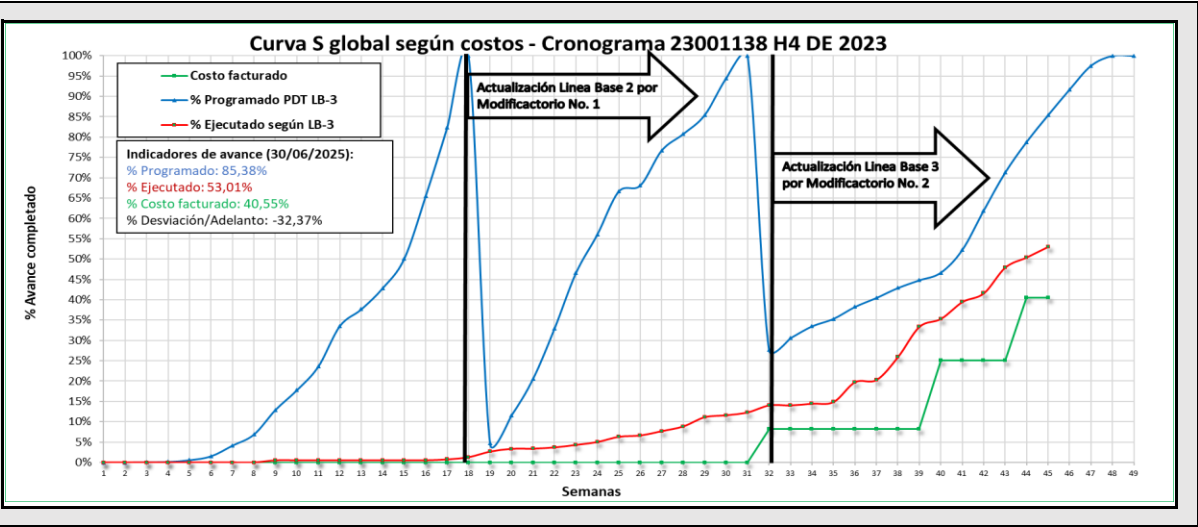


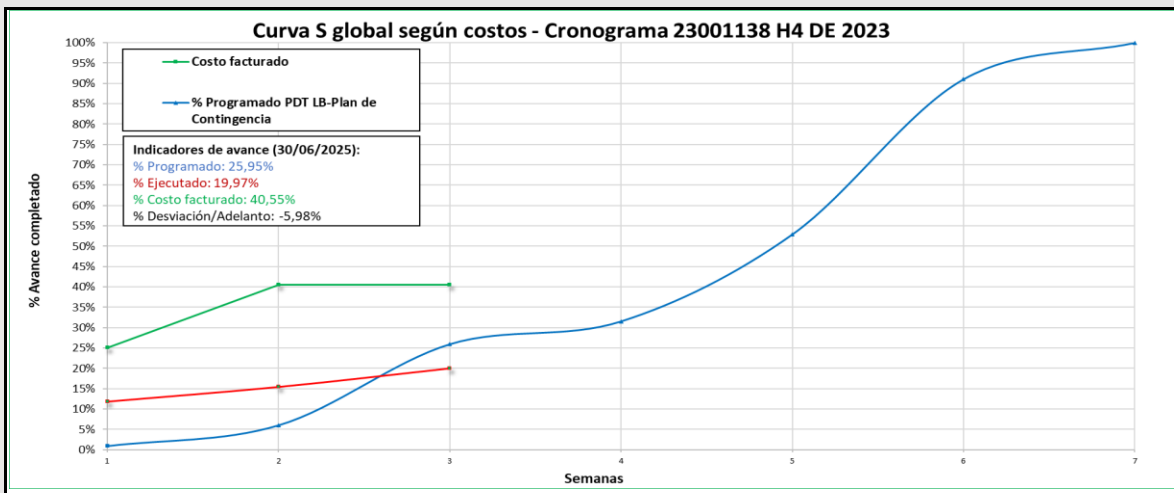



CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO	PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO
	\$ 740.102.717,77	\$ 269.153.673,00		\$ 9.599.012.591,17	\$ 5.959.472.215,08
Porcentaje	6,58%	2,39%	Porcentaje	85,38%	53,01%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE - PLAN DE CONTINGENCIA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO	PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO
	\$ 1.345.458.449,53	\$ 269.153.673,00		\$ 1.751.421.225,06	\$ 1.347.686.530,71
Porcentaje	19,93%	3,99%	Porcentaje	25,95%	19,97%

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO	PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO
	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	0,00%	Porcentaje	0,00%	0,00%

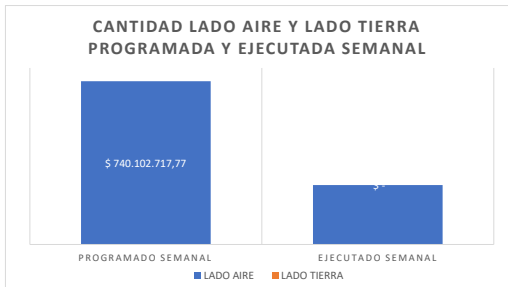

PERSONAL EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS	
TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1	Motoniveladora	2
	Residente de Obra	1	Excavadora de Orugas	3
	Especialista Ambiental	1	Vibrocompactadores	3
	Especialista en Pavimentos	1	Bulldozer	2
	Especialista en Hidráulica	1	Carrotanque	1
	Gerente de Proyectos PMP	1	Retrocargador (Pajarita)	1
	Inspectora SiSOMA	1	Luminarias	7
	Topógrafo	1	Camioneta Doble Cabina	1
MANO DE OBRA	Cadeneros	2	Compresor	1
	Operadores de Maquinaria	13		
	Mecánico	1		
	Ayudante	22		
	Conductor Volqueta	13		

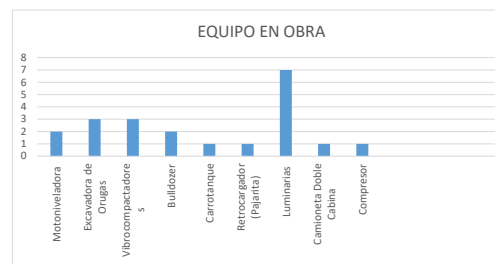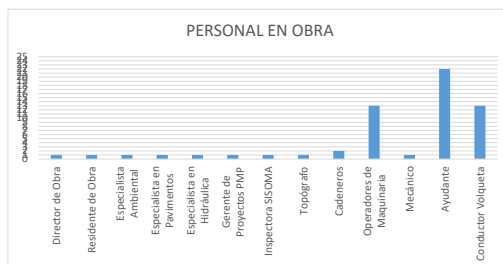

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FRENTE No. 1 - FRANJA NORESTE




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

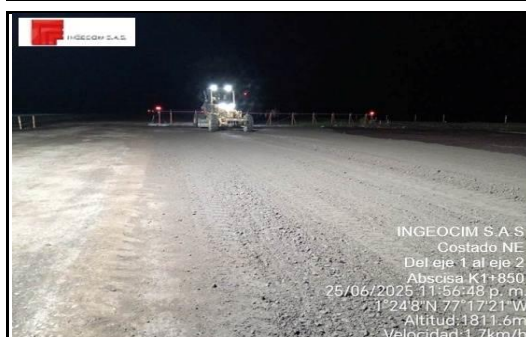

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

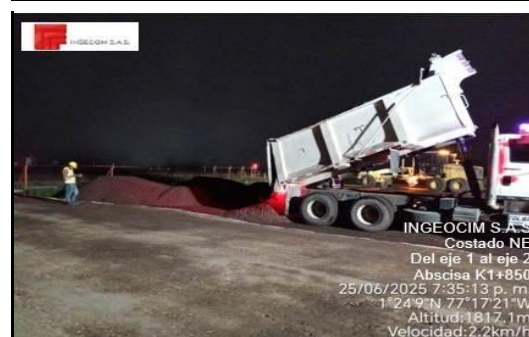

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

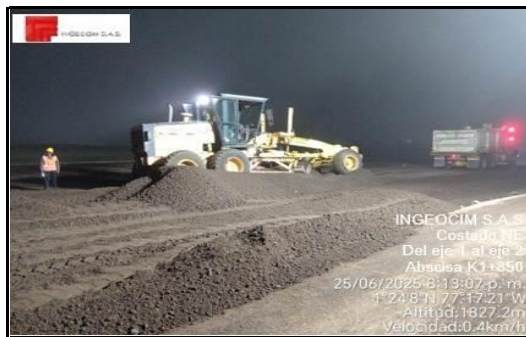

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y/O CEREO DE CAPA DE MATERIAL TOLERBALE TIPO INV 220



ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y/O CEREO DE CAPA DE MATERIAL TOLERBALE TIPO INV 220

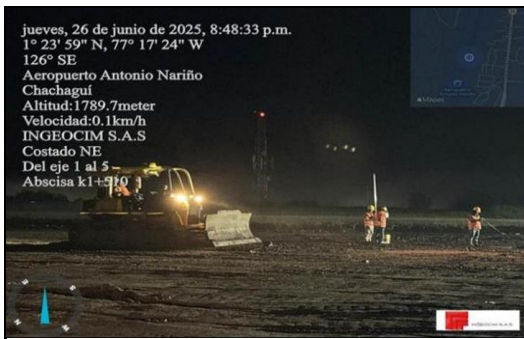

ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y/O CEREO DE CAPA DE MATERIAL TOLERBALE TIPO INV 220



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y/O CEREO DE CAPA DE MATERIAL TOLERBALE TIPO INV 220




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




jueves, 26 de junio de 2025, 8:56:24 p.m.
1° 24' 8" N, 77° 17' 21" W
55° NE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1786.6meter
Velocidad: 4.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al 5
Abscisa k1+850 hacia menores

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

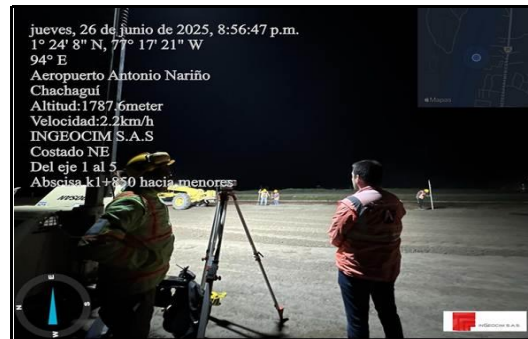


jueves, 26 de junio de 2025, 8:56:47 p.m.
1° 24' 8" N, 77° 17' 21" W
94° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1787.6meter
Velocidad: 2.2km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al 5
Abscisa k1+850 hacia menores

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

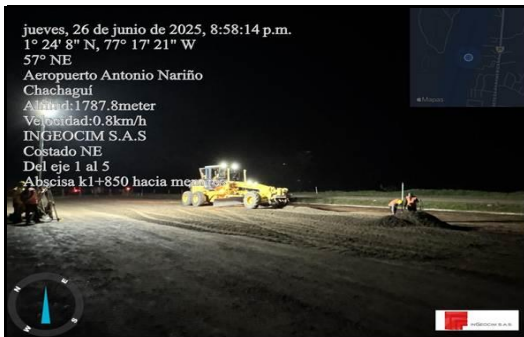

jueves, 26 de junio de 2025, 8:58:14 p.m.
1° 24' 8" N, 77° 17' 21" W
57° NE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1787.8meter
Velocidad: 0.8km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al 5
Abscisa k1+850 hacia menores

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

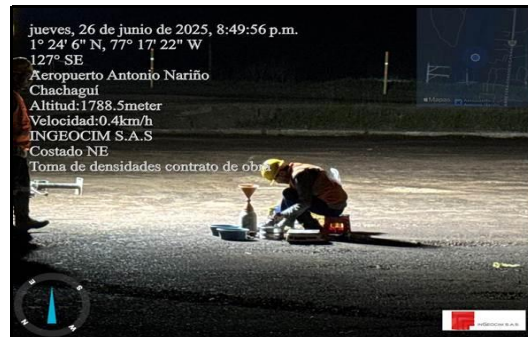

jueves, 26 de junio de 2025, 8:49:56 p.m.
1° 24' 6" N, 77° 17' 22" W
127° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1788.5meter
Velocidad: 0.4km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Toma de densidades contrato de obra

TOMA DE DENSIDADES AL MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220 PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES POR PARTE DEL CONSORCIO ALFA.



INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al eje 2
Abscisa K1+780
27/06/2025 7:47:29 p. m.
1°24'9"N 77°17'20"W
Altitud: 1811.2m
Velocidad: 1.9km/h

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al eje 2
Abscisa K1+780
27/06/2025 7:49:05 p. m.
1°24'8"N 77°17'20"W
Altitud: 1813.3m
Velocidad: 0.2km/h

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al eje 2
Abscisa K1+780
27/06/2025 8:08:04 p. m.
1°24'9"N 77°17'20"W
Altitud: 1818.3m
Velocidad: 0.1km/h

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



sábado, 28 junio 2025 12:14a. m.
1°23'57"N 77°17'24"W
91° E
Altitud: 1836.5m
Velocidad: 0.7km/h
K1+480 HACIA MENORES
EJE 2-3

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al eje 2
Abscisa K1+760
28/06/2025 10:14:50 p. m.
1.40179N 77.2893766666667W
Chachagüí
Nariño

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al eje 2
Abscisa K1+760
28/06/2025 10:31:26 p. m.
1°24'6"N 77°17'21"W
Altitud:1823.9m
Velocidad:0.4km/h

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al eje 2
Abscisa K1+360
24/06/2025 10:07:09 p. m.
1.3982333333333334N 77.29015333333334W

ACTIVIDADES DE REALCE CAJA ELECTRICA 1.00x0,60m (Hs 0.70m) - INCLUYE REHUSO DE TAPA.



INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al eje 2
Abscisa K1+360
25/06/2025 10:54:34 p. m.
1.398415N 77.29026833333334W
Chachagüí
Nariño

ACTIVIDADES DE REALCE CAJA ELECTRICA 1.00x0,60m (Hs 0.70m) - INCLUYE REHUSO DE TAPA.

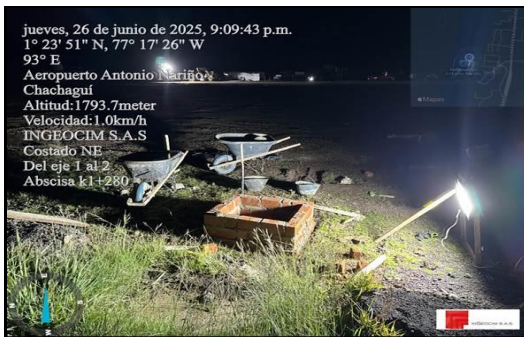

jueves, 26 de junio de 2025, 9:09:43 p.m.
1° 23' 51" N, 77° 17' 26" W
93° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud:1793.7meter
Velocidad:1.0km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al 2
Abscisa k1+280

ACTIVIDADES DE REALCE CAJA ELECTRICA 1.00x0,60m (Hs 0.70m) - INCLUYE REHUSO DE TAPA.



jueves, 26 de junio de 2025, 9:09:31 p.m.
1° 23' 51" N, 77° 17' 26" W
58° NE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud:1779.9meter
INGEOCIM S.A.S
Costado NE
Del eje 1 al 2
Abscisa k1+280

ACTIVIDADES DE REALCE CAJA ELECTRICA 1.00x0,60m (Hs 0.70m) - INCLUYE REHUSO DE TAPA.

FRENTE No. 3 - FRANJA SURESTE



INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 2
Abscisa K0+355
24 jun 2025 7:23:12 p. m.
Pasto - El Tablon
Chachagüí
Nariño

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 2
Abscisa K0+355
24 jun 2025 8:58:49 p. m.
Chachagüí
Nariño

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 2
Abscisa K0+355
25/06/2025 11:28:03 p. m.
1.389095N 77.29231499999999W
Via Sin Nombre
El Tambo
Nariño

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 2
Abscisa K0+355
26/06/2025 12:10:35 a. m.
1.3889749999999998N 77.29236833333333W
Pasto - El Tablon
Chachagüí
Nariño

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 2
Abscisa K0+355
26/06/2025 1:00:00 a. m.
1.3892566666666668N 77.29231466666666W
Pasto - El Tablon
Chachagüí
Nariño

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 2
Abscisa K0+355
26/06/2025 1:23:15 a. m.
1.3897616666666668N 77.29250333333333W
Pasto - El Tablon
Chachagüí
Nariño

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



jueves, 26 de junio de 2025, 8:43:44 p.m.
1° 23' 20" N, 77° 17' 34" W
117° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud:1810.3meter
Velocidad:0.6km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al 2
Abscisa k0+320

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



jueves, 26 de junio de 2025, 8:44:06 p.m.
1° 23' 20" N, 77° 17' 34" W
114° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud:1810.3meter
Velocidad:0.6km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al 2
Abscisa k0+320

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



jueves, 26 de junio de 2025, 8:42:47 p.m.
1° 23' 20" N, 77° 17' 34" W
113° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud:1809.1meter
Velocidad:0.1km/h
INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al 2
Abscisa k0+320

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 2
Abscisa K0+290
27/06/2025 10:44:16 p. m.
1.4040266666666668N 77.28962499999999W
Chachagüí
Nariño

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



INGECON S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 2
Abscisa K0+290
27/06/2025 10:05:07 p. m.
1.40403N 77.28962833333334W/
Aeropuerto
Antonio Narino
Chachagüil
Nariño

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



INGECON S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 2
Abscisa K0+290
27/06/2025 11:30:25 p. m.
1.404045N 77.28968833333333W

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 5, actualizando la línea base 3 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 2 correspondiente a la Prórroga No. 2 el día 21 de marzo de 2025, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2024, cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025. Este seguimiento se realizó con el Programa Detallado de Trabajo PDT, aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-152-OFC radicado 2025190010031929 de fecha 14 de marzo de 2025, remitido a la AEROCIVIL. De igual manera se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo PDT del plan de contingencia, aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-193-OFC Radicado 2025190010080062 de fecha 12 de junio de 2025, remitido a la AEROCIVIL. 	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
