



	INFORME SEMANAL		VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.
			FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2023 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				
DATOS GENERALES					
Semana No. 47		Plazo total (días)		340	
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días)		329	
Del 8/07/2025		% de tiempo transcurrido		96,76%	
Al 14/07/2025		Interventoría		GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado \$ 660.209.470,86		Valor ejecutado \$ 270.245.502,66		-\$ 389.963.968,20	
Porcentaje programado 5,87%		Porcentaje ejecutado 2,40%		-3,47%	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado \$ 10.966.721.046,00		Valor ejecutado \$ 6.691.237.689,08		-\$ 4.275.483.356,92	
Porcentaje programado 97,55%		Porcentaje ejecutado 59,52%		-38,03%	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL - PLAN DE CONTINGENCIA					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado \$ 1.442.992.417,77		Valor ejecutado \$ 270.245.502,66		-\$ 1.172.746.915,11	
Porcentaje programado 21,38%		Porcentaje ejecutado 4,00%		-17,38%	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA - PLAN DE CONTINGENCIA					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado \$ 3.573.158.534,77		Valor ejecutado \$ 1.915.024.973,43		-\$ 1.658.133.561,34	
Porcentaje programado 52,94%		Porcentaje ejecutado 28,37%		-24,57%	
DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista: CONSORCIO ALFA			Contratista: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.		
Contrato No: 23001138 H4 DE 2023			Contrato No: 23001299 H3 DE 2023		
Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00			Valor inicial: \$ 684.322.873,00		
Valor Actualizado al modificadorio: \$ 2.536.379.355,00			Valor actualizado al modificadorio: \$ 347.289.600,00		
Valor actualizado 2: \$ 11.242.571.859,00			Valor actualizado 2: \$ 1.031.612.473,00		
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.			Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		
Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025			Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025		
Fecha de iniciación: 13/08/2024			Fecha de iniciación: 13/08/2024		
Fecha de vencimiento inicial: 16/12/2024			Fecha de vencimiento: 16/12/2024		
Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.			Modificadorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1: 17/03/2025			Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1: 17/03/2025		
Suspensión No. 1: 4/03/2025			Suspensión No. 1: 4/03/2025		
Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025			Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025		
Levantamiento de la suspensión No. 1: 11/03/2025			Levantamiento de la Suspensión No. 1: 11/03/2025		
Modificadorio No. 2 Prórroga No. 2: Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.			Modificadorio No. 2 Prórroga No. 2: Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.		
Nueva fecha de terminación: 24/07/2025			Nueva fecha de terminación: 24/07/2025		
Valor total actual del contrato: \$ 11.242.571.859,00			Valor total actual del contrato: \$ 1.031.612.473,00		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
ACTIVIDADES LADO AIRE			ACTIVIDADES LADO TIERRA		
* Acopio de material tolerable * Se localiza y se Replantea puntos del Eje No. 2 al Eje No. 3 de Franja desde el K0+137 al K0+400 de Franja del Costado Sur Este. * Se realiza la Excavación de Material No Clasificado del Eje No. 2 al Eje No. 3 de Franja desde el K0+137 al K0+400 de Franja del Costado Sur Este. * Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el Eje No. 2 al Eje No. 3 de Franja desde el K0+137 al K0+400 de Franja del Costado Sur Este. * Se continúa con las actividades de Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Base Granular estabilizada con cemento desde el Eje No. 1 al Eje No. 5 de Franja desde el K1+620 al K1+550 de Franja del Costado Nor Este.			N.A.		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
Mediante el comunicado T-003-2024-200-OFC de fecha 8 de julio 2025 se remitió a la AEROCIVIL el Traslado de oficio C-ALFA-202-2025 – Respuesta al Apremio No. 1 y remisión de hojas de vida de reemplazo del cargo de Residente de obra y del Ingeniero Ambiental del contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-201-OFC de fecha 8 de julio 2025 se remitió a la AEROCIVIL el Respuesta al comunicado radicado 2025262000029761 Id: 2270142 – Cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría No. 23001299 H3 de 2023. Mediante el comunicado T-003-2024-202-OFC de fecha 8 de julio 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta al radicado 2025262000029760 Id: 2270141 – Aval solicitud de prórroga al plazo de ejecución del contrato de obra 23001138 H4 de 2023. Mediante el comunicado T-003-2024-203-OFC de fecha 9 de julio 2025 se remitió a la AEROCIVIL el Informe Mensual No. 11 correspondiente al mes de junio de 2025.					
ACTIVIDADES AMBIENTALES					
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental Adaptado a la resolución 530 de 2000 versión 4, mediante el comunicado T-003-2024-181-OFC de fecha 12 de mayo de 2025.					
ACTIVIDADES SISTEMA SST					
* Inducción de personal nuevo (operador de maquinaria, cadenero e ingeniero ambiental). * Realización de exámenes de ingreso - personal APTO. * Charla de seguridad: Uso de protección respiratoria. * Verificación de uso de EPP. * Diligenciamiento y revisión de preoperacionales de maquinaria y vehículos. * Verificación de uso de EPP. * Se continua con las actividades de señalización preventivas con conos de seguridad sobre cajillas eléctricas, tanto en franja noreste y sureste.					

AVANCE CANTIDADES


CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024						Semana No. 47 (8 Jul - 14 Jul)		
"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."								
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado
2.2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD Y AS BUI 3).	142.955,00	1,91%	\$ 1.500,00	\$ 214.432.500	0,00	\$ -	0,00%
2.4	ZONA 1 - NORESTE		48,00%		\$ 5.404.884.343			
2.4.1	Inicio Zona 2		0,00%		\$ -			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	33.539,67	3,30%	\$ 8.200,00	\$ 370.846.886		\$ -	0,00%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	70.433,30	3,20%	\$ 2.100,00	\$ 360.217.940		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 228.	23.371,13	17,67%	\$ 85.000,00	\$ 1.986.138.637		\$ -	0,00%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	7.790,38	20,10%	\$ 290.000,00	\$ 2.259.210.200	574,00	\$ 166.460.000,00	7,37%
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	38.951,88	3,81%	\$ 11.000,00	\$ 428.470.680		\$ -	
2.4	ZONA 2 - NOROESTE		22,82%		\$ 2.565.797.547,00			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	15.600,72	1,54%	\$ 8.200,00	\$ 172.951.284		\$ -	0,00%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	32.761,51	1,75%	\$ 2.100,00	\$ 196.482.513		\$ -	0,00%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 228.	5.490,91	8,30%	\$ 85.000,00	\$ 933.453.850		\$ -	0,00%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.660,61	9,44%	\$ 290.000,00	\$ 1.061.576.900		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.303,00	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.333.000		\$ -	
2.6	ZONA 3 - COSTADO SURESTE		21,95%		\$ 2.468.045.815,00			
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	3.882,73	0,68%	\$ 8.200,00	\$ 76.802.758	1.722,50	\$ 14.124.500,00	44,36%
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	8.153,73	0,87%	\$ 2.100,00	\$ 98.241.257	4.702,43	\$ 9.875.092,50	57,67%
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 228.	6.655,40	9,18%	\$ 85.000,00	\$ 1.031.803.100	795,00	\$ 67.575.000,00	11,95%
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.655,65	9,43%	\$ 290.000,00	\$ 1.060.138.500		\$ -	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00			\$ -	
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.278,20	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.060.200		\$ -	
2.11	ITEMS NO PREVISTOS		4,95%		\$ 556.134.062			
2.11.1	NP-01 REALCE CAJA ELECTRICA (H= 0,70m)	45,00	0,25%	\$ 492.363,72	\$ 28.512.630		\$ -	0,00%
2.11.2	NP-02 EXCAVACION MANUAL	324,00	0,10%	\$ 27.991,41	\$ 11.608.596		\$ -	0,00%
2.11.3	NP-03 DEMOLICION DE CONCRETO	256,00	0,16%	\$ 54.836,72	\$ 17.968.896		\$ -	0,00%
2.11.4	NP-04 CONFORMACIÓN DE FRANJAS CON MATERIAL DEL SITIO	71.353,00	4,43%	\$ 5.453,13	\$ 498.043.940	2.239,25	\$ 12.210.910,16	
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 11.209.294.267,00		\$ 270.245.502,66	
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO					\$ 33.277.592,00			2,40%
TOTAL					\$ 11.242.571.859,00			

AVANCE FINANCIERO

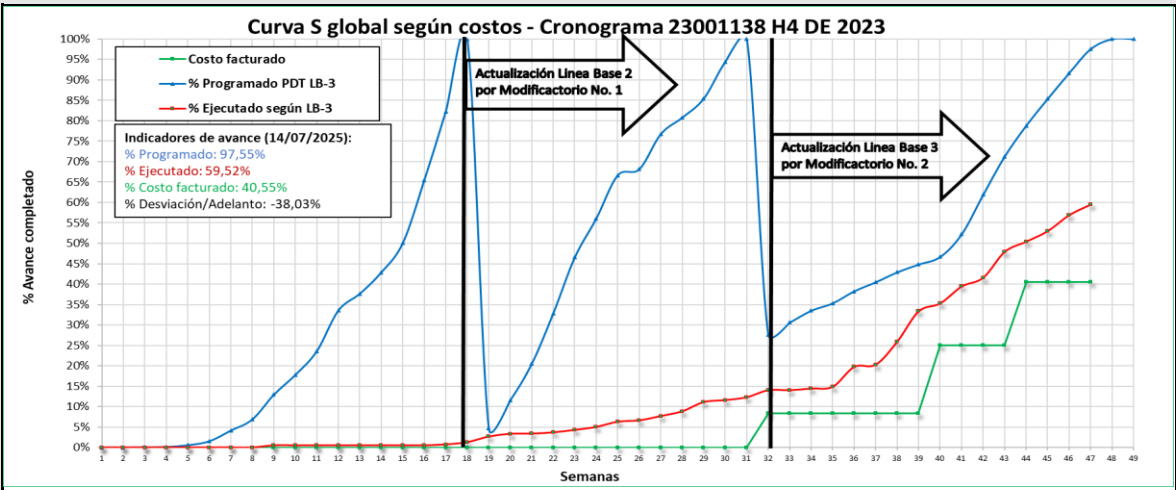


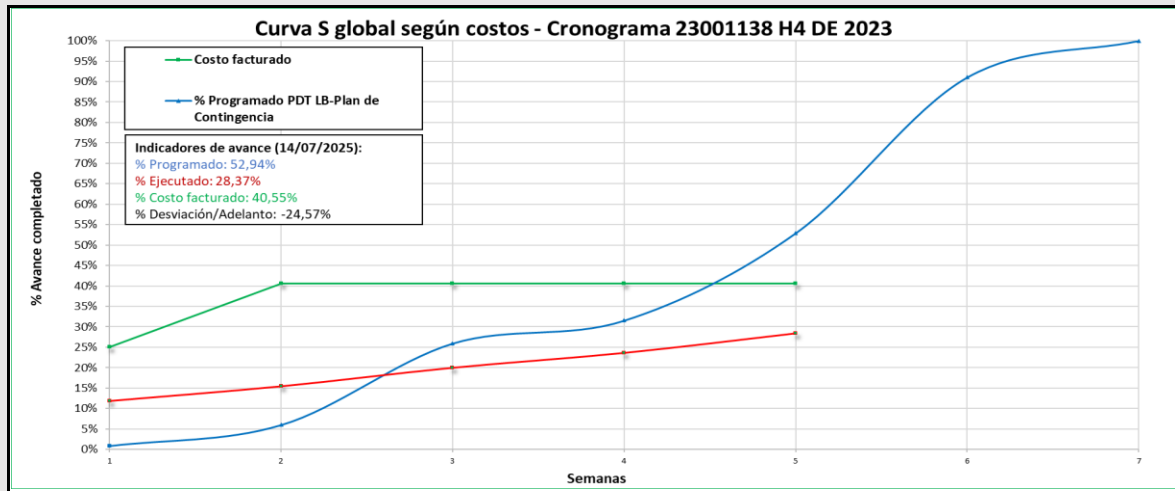

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO	PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO
	\$ 660.209.470,86	\$ 270.245.502,66		\$ 10.966.721.046,00	\$ 6.691.237.689,08
Porcentaje	5,87%	2,40%	Porcentaje	97,55%	59,52%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE - PLAN DE CONTINGENCIA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO	PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO
	\$ 1.442.992.417,77	\$ 270.245.502,66		\$ 3.573.158.534,77	\$ 1.915.024.973,43
Porcentaje	21,38%	4,00%	Porcentaje	52,94%	28,37%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO	PROGRAMADO	Valor	EJECUTADO
	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	0,00%	Porcentaje	0,00%	0,00%

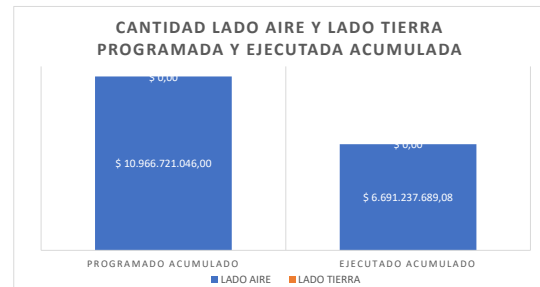

PERSONAL EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS	
TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1	Motoniveladora	2
	Residente de Obra	1	Excavadora de Orugas	3
	Especialista Ambiental	1	Vibrocompactadores	3
	Especialista en Pavimentos	1	Bulldozer	2
	Especialista en Hidráulica	1	Carrozanque	1
	Gerente de Proyectos PMP	1	Retrocargador (Pajarita)	1
	Inspectora SiSOMA	1	Luminarias	7
	Topógrafo	1	Camioneta Doble Cabina	1
MANO DE OBRA	Cadeneros	2	Compresor	1
	Operadores de Maquinaria	13		
	Mecánico	1		
	Ayudante	22		
	Conductor Volqueta	13		

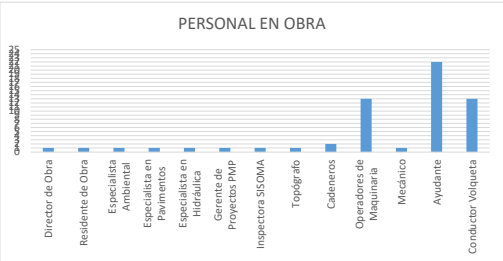

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE No. 1 - FRANJA NORESTE



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



miércoles, 9 de julio de 2025, 12:27:38 a.m.
1° 24' 6" N, 77° 17' 22" W
160° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1793.0meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
COSTADO NE
K1+770 hacia menores
Del Eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



miércoles, 9 de julio de 2025, 12:27:52 a.m.
1° 24' 6" N, 77° 17' 22" W
163° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1793.0meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
COSTADO NE
K1+770 hacia menores
Del Eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




miércoles, 9 de julio de 2025, 12:28:05 a.m.
1° 24' 6" N, 77° 17' 22" W
144° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1793.0meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
COSTADO NE
K1+770 hacia menores
Del Eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




miércoles, 9 de julio de 2025, 9:07:26 p.m.
1° 24' 1" N, 77° 17' 23" W
139° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1797.7meter
Velocidad: 2.8km/h
INGEOCIM S.A.S.
COSTADO NE
K1+590 hacia menores
Del Eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

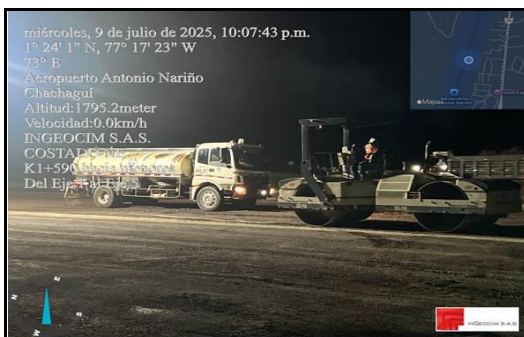

miércoles, 9 de julio de 2025, 10:07:43 p.m.
1° 24' 1" N, 77° 17' 23" W
73° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1795.2meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
COSTADO NE
K1+590 hacia menores
Del Eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

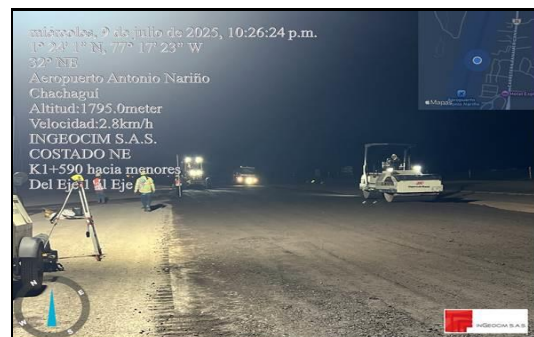

miércoles, 9 de julio de 2025, 10:26:24 p.m.
1° 24' 1" N, 77° 17' 23" W
32° NE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1795.0meter
Velocidad: 2.8km/h
INGEOCIM S.A.S.
COSTADO NE
K1+590 hacia menores
Del Eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



viernes, 11 de julio de 2025, 8:24:13 p.m.
1° 24' 7" N, 77° 17' 21" W
162° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1797.1meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+770 hacia menores
Del Eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



viernes, 11 de julio de 2025, 8:28:04 p.m.
1° 24' 7" N, 77° 17' 21" W
166° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1793.0meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+770 hacia menores
Del Eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



viernes, 11 de julio de 2025, 10:09:06 p.m.
1° 24' 6" N, 77° 17' 22" W
143° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1794.3meter
Velocidad: 1.3km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+770 hacia menores
Del Eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



viernes, 11 de julio de 2025, 11:39:43 p.m.
1° 24' 5" N, 77° 17' 21" W
175° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1794.3meter
Velocidad: 0.3km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+770 hacia menores
Del Eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



sábado, 12 de julio de 2025, 7:01:05 p.m.
1° 24' 3" N, 77° 17' 22" W
170° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1795.6meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+690 hacia menores
Del 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




sábado, 12 de julio de 2025, 7:07:44 p.m.
1° 23' 56" N, 77° 17' 25" W
168° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1798.7meter
Velocidad: 0.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+690 hacia menores
Del 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



sábado, 12 de julio de 2025, 7:12:26 p.m.
1° 23' 55" N, 77° 17' 25" W
76° E
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1795.4meter
Velocidad: 2.6km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+690 hacia menores
Del 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

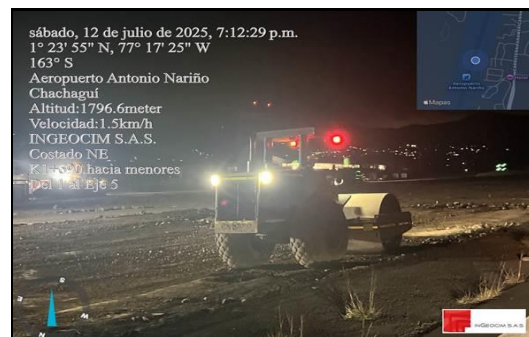


sábado, 12 de julio de 2025, 7:12:29 p.m.
1° 23' 55" N, 77° 17' 25" W
163° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1796.6meter
Velocidad: 1.5km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+690 hacia menores
Del 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



lunes, 7 de julio de 2025, 8:36:27 p.m.
1° 23' 51" N, 77° 17' 26" W
35° NE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1799.5meter
Velocidad: 2.3km/h
INGEOCIM S.A.S.
COSTADO NE
K1+280

ACTIVIDADES DE REALCE CAJA ELECTRICA 1.00x0,60m (H± 0.70m) - INCLUYE REHUSO DE TAPA.

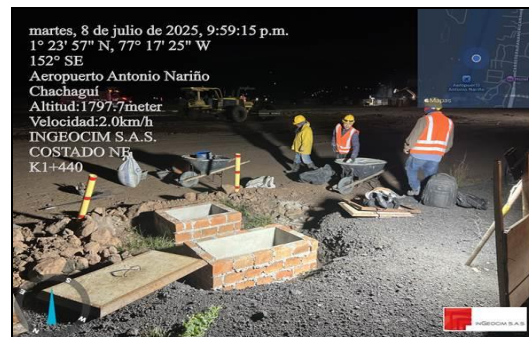

martes, 8 de julio de 2025, 9:59:15 p.m.
1° 23' 57" N, 77° 17' 25" W
152° SE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagui
Altitud: 1797.7meter
Velocidad: 2.0km/h
INGEOCIM S.A.S.
COSTADO NE
K1+440


ACTIVIDADES DE REALCE CAJA ELECTRICA 1.00x0,60m (H± 0.70m) - INCLUYE REHUSO DE TAPA.




ACTIVIDADES DE REALCE CAJA ELECTRICA 1.00x0,60m (Hs 0.70m) - INCLUYE REHUSO DE TAPA.



ACTIVIDADES DE REALCE CAJA ELECTRICA 1.00x0,60m (Hs 0.70m) - INCLUYE REHUSO DE TAPA.

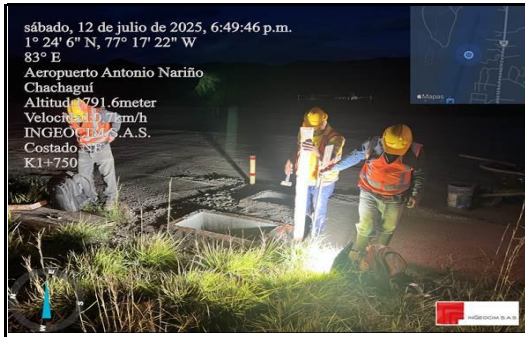

ACTIVIDADES DE REALCE CAJA ELECTRICA 1.00x0,60m (Hs 0.70m) - INCLUYE REHUSO DE TAPA.

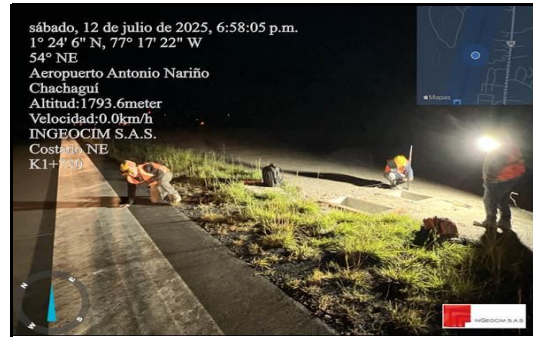


ACTIVIDADES DE REALCE CAJA ELECTRICA 1.00x0,60m (Hs 0.70m) - INCLUYE REHUSO DE TAPA.

FRENTE No. 3 - FRANJA SURESTE



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

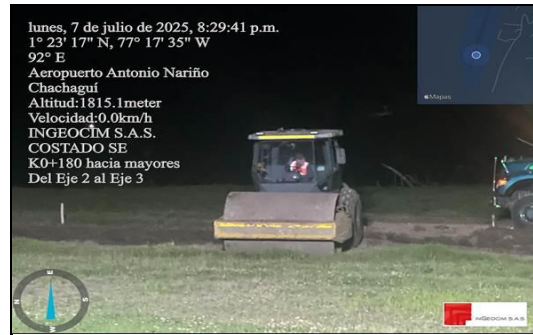


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

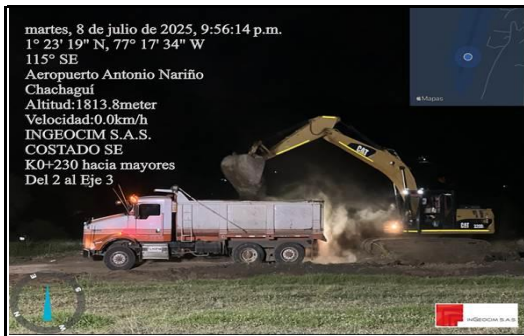

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

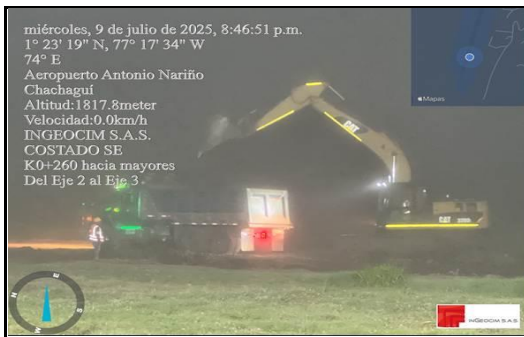

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 5, actualizando la línea base 3 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 2 correspondiente a la Prórroga No. 2 el día 21 de marzo de 2025, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2024 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2024, cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025. Este seguimiento se realizó con el Programa Detallado de Trabajo PDT, aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-152-OFC radicado 2025190010031929 de fecha 14 de marzo de 2025, remitido a la AEROCIVIL. De igual manera se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo PDT del plan de contingencia, aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-193-OFC Radicado 2025190010080062 de fecha 12 de junio de 2025, remitido a la AEROCIVIL. 	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
