



	INFORME SEMANAL		VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.
			FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2023 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				
DATOS GENERALES					
Semana No. 49		Plazo total (días) 400			
PERIODO		Tiempo transcurrido desde inicio (días) 343			
Del. 22/07/2025		% de tiempo transcurrido 85,75%			
Al. 28/07/2025		Interventoría		GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado	\$ 0,00	Valor ejecutado	\$ 606.240.726,80	\$ 606.240.726,80	
Porcentaje programado	0,00%	Porcentaje ejecutado	5,39%	5,39%	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA					
PROGRAMADO		EJECUTADO		BALANCE	
Valor programado	\$ 8.205.561.854,99	Valor ejecutado	\$ 8.065.637.524,00	-\$ 139.924.330,99	
Porcentaje programado	72,99%	Porcentaje ejecutado	71,74%	-1,24%	
DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
<u>Contratista:</u> CONSORCIO ALFA			<u>Contratista:</u> GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.		
<u>Contrato No.:</u> 23001138 H4 DE 2023			<u>Contrato No.:</u> 23001299 H3 DE 2023		
<u>Valor Inicial:</u> \$ 8.706.192.504,00			<u>Valor Inicial:</u> \$ 684.322.873,00		
<u>Valor Actualizado al modificatorio 1:</u> \$ 2.536.379.355,00			<u>Valor actualizado al modificatorio:</u> \$ 347.289.600,00		
<u>Valor actualizado 2:</u> \$ 11.242.571.859,00			<u>Valor actualizado 2:</u> \$ 1.031.612.473,00		
<u>Plazo inicial:</u> Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.			<u>Plazo inicial:</u> Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		
<u>Plazo actualizado:</u> 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025			<u>Plazo actualizado:</u> 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025		
<u>Fecha de iniciación:</u> 13/08/2024			<u>Fecha de iniciación:</u> 13/08/2024		
<u>Fecha de vencimiento inicial:</u> 16/12/2024			<u>Fecha de vencimiento:</u> 16/12/2024		
<u>Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1:</u> Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.			<u>Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1:</u> Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		
<u>Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1:</u> 17/03/2025			<u>Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1:</u> 17/03/2025		
<u>Suspensión No. 1:</u> 4/03/2025			<u>Suspensión No. 1:</u> 4/03/2025		
<u>Periodo de Suspensión No. 1:</u> 4/03/2025 al 10/03/2025			<u>Periodo de Suspensión No. 1:</u> 4/03/2025 al 10/03/2025		
<u>Levantamiento de la suspensión No. 1:</u> 11/03/2025			<u>Levantamiento de la Suspensión No. 1:</u> 11/03/2025		
<u>Modificatorio No. 2 Prórroga No. 2:</u> Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.			<u>Modificatorio No. 2 Prórroga No. 2:</u> Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.		
<u>Modificatorio No. 3 Prórroga No. 3:</u> Dos (2) meses, es decir, hasta el 24 de septiembre de 2025.			<u>Modificatorio No. 3 Prórroga No. 3:</u> Dos (2) meses, es decir, hasta el 24 de septiembre de 2025.		
<u>Nueva fecha de terminación:</u> 24/09/2025			<u>Nueva fecha de terminación:</u> 24/09/2025		
<u>Valor total actual del contrato:</u> \$ 11.242.571.859,00			<u>Valor total actual del contrato:</u> \$ 1.031.612.473,00		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
ACTIVIDADES LADO AIRE			ACTIVIDADES LADO TIERRA		
* Acopio de material tolerable * Se localiza y se Replantea puntos del Eje No. 2 al Eje No. 3 de Franja desde el K0+680 al K0+970 de Franja del Costado Sur Eeste. * Se realiza la Excavación de Material No Clasificado del Eje No. 2 al Eje No. 3 de Franja desde el K0+680 al K0+970 de Franja del Costado Sur Eeste. * Se realiza el Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Material Tolerable Tipo INV 220 de franja desde el Eje No. 2 al Eje No. 3 de Franja desde el K0+680 al K0+970 de Franja del Costado Sur Eeste. * Se continúa con las actividades de Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Base Granular estabilizada con cemento desde el Eje No. 1 al Eje No. 5 de Franja desde el K1+480 al K1+300 de Franja del Costado Nor Eeste.			N.A.		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
Mediante el comunicado T-003-2024-206-OFC de fecha 23 de julio 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Advertencia sobre riesgo por vencimiento del plazo contractual y reiteración de recomendación de prórroga del contrato de obra No. 23001138 H4 de 2023. Mediante el comunicado T-003-2024-207-OFC de fecha 25 de julio 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Remisión de la actualización de las pólizas del Contrato de Interventoría No. 23001299 H3 DE 2024. Mediante el comunicado T-003-2024-208-OFC de fecha 25 de julio 2025 se remitió al CONSORCIO ALFA la Solicitud Actualización de Pólizas - Contrato de obra No. 23001138 H4 DE 2023.					
ACTIVIDADES AMBIENTALES					
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental Adaptado a la resolución 530 de 2000 versión 4, mediante el comunicado T-003-2024-181-OFC de fecha 12 de mayo de 2025.					
ACTIVIDADES SISTEMA SST					
* Se realizan charlas de seguridad: 1. La falta de concentración en los trabajos y la seguridad. 2. Herramientas Manuales. * Se realizan inspecciones de seguridad: inspección de extintores. * Reunión COPASST. * Diligenciamiento y revisión de preoperacionales de maquinaria y vehículos. * Verificación de uso de y reposición de los mismos EPP. * Programación de exámenes ocupacionales de retiro * Se continua con las actividades de señalización preventivas con conos de seguridad sobre cajillas eléctricas, tanto en franja noreste y sureste.					

AVANCE CANTIDADES									
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."						Semana No. 49 (22 Jul - 28 Jul)			
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Eje cutado	
2.2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD Y AS BUILT).	142.955,00	1,91%	\$ 1.500,00	\$ 214.432.500	0,00	\$ -	0,00%	
2.4	ZONA 1 - NOROESTE		48,88%		\$ 5.404.884.343				
2.4.1	Inicio Zona 2		0,00%		\$ -				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	33.539,67	3,30%	\$ 8.200,00	\$ 370.846.886		\$ -	0,00%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	70.433,30	3,20%	\$ 2.100,00	\$ 360.217.940		\$ -	0,00%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	23.371,13	17,67%	\$ 85.000,00	\$ 1.986.138.637		\$ -	0,00%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	7.790,38	20,10%	\$ 290.000,00	\$ 2.259.210.200	1.476,00	\$ 428.040.000,00	18,95%	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	38.951,88	3,81%	\$ 11.000,00	\$ 428.470.680	5.740,00	\$ 63.140.000,00	14,74%	
2.4	ZONA 2 - NOROESTE		22,82%		\$ 2.565.797.547,00				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	15.600,72	1,54%	\$ 8.200,00	\$ 172.951.284		\$ -	0,00%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	32.761,51	1,75%	\$ 2.100,00	\$ 196.482.513		\$ -	0,00%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	5.490,91	8,30%	\$ 85.000,00	\$ 933.453.850		\$ -	0,00%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.660,61	9,44%	\$ 290.000,00	\$ 1.061.576.900		\$ -		
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.303,00	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.333.000		\$ -		
2.6	ZONA 3 - COSTADO SURESTE		21,95%		\$ 2.468.045.815,00				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	3.882,73	0,68%	\$ 8.200,00	\$ 76.802.758	1.885,00	\$ 15.457.000,00	48,55%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	8.153,73	0,87%	\$ 2.100,00	\$ 98.241.257	5.146,05	\$ 10.806.705,00	63,11%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.	6.655,40	9,18%	\$ 85.000,00	\$ 1.031.803.100	870,00	\$ 73.950.000,00	13,07%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.655,65	9,43%	\$ 290.000,00	\$ 1.060.138.500		\$ -		
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.278,20	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.060.200		\$ -		
2.11	ITEMS NO PREVISTOS		4,95%		\$ 556.134.062				
2.11.1	NP-01 REALCE CAJA ELÉCTRICA (H= 0,70m)	45,00	0,25%	\$ 492.361,72	\$ 28.512.630	3,00	\$ 1.477.085,16	6,67%	
2.11.2	NP-02 EXCAVACION MANUAL	324,00	0,10%	\$ 27.991,41	\$ 11.608.596	0,25	\$ 7.053,83	0,08%	
2.11.3	NP-03 DEMOLICION DE CONCRETO	256,00	0,16%	\$ 54.836,72	\$ 17.968.896		\$ -	0,00%	
2.11.4	NP-04 CONFORMACION DE FRANJAS CON MATERIAL DEL SITIO	71.353,00	4,43%	\$ 5.453,13	\$ 498.043.940	2.450,50	\$ 13.362.882,81		
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 11.209.294.267,00		\$ 606.240.726,80		
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO					\$ 33.277.592,00			5,39%	
TOTAL					\$ 11.242.571.859,00				



AVANCE FINANCIERO

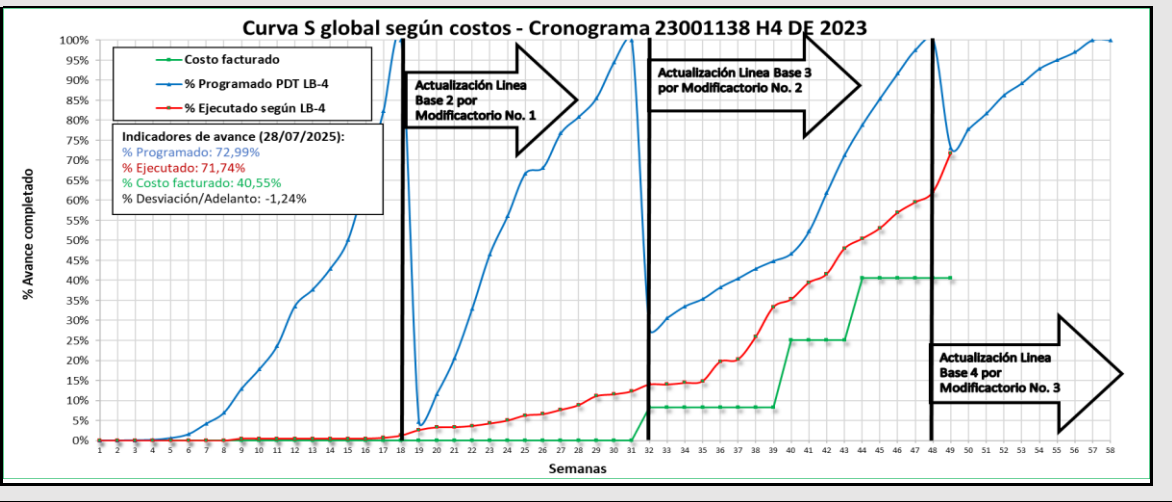

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	
Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 8.205.561.854,99	Valor	\$ 8.065.637.524,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	72,99%	Porcentaje	71,74%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	
Valor	\$ -	Valor	\$ 0,00	Valor	\$ 0,00
Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%	Porcentaje	0,00%

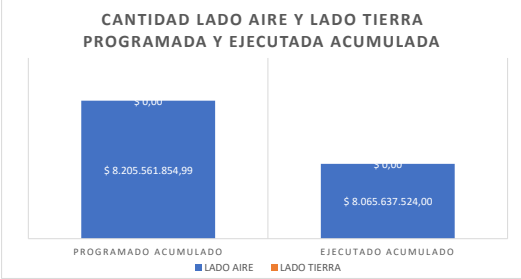

PERSONAL EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS	
TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD	MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1	Motoniveladora	2
	Residente de Obra	1	Excavadora de Orugas	3
	Especialista Ambiental	1	Vibrocompactadores	3
	Especialista en Pavimentos	1	Bulldozer	2
	Especialista en Hidráulica	1	Carro tanque	1
	Gerente de Proyectos PMP	1	Retrocargador (Pajarita)	1
	Inspectora SISOMA	1	Luminarias	7
	Topógrafo	1	Camioneta Doble Cabina	1
MANO DE OBRA	Cadeneros	2	Compresor	1
	Operadores de Maquinaria	13		
	Mecánico	1		
	Ayudante	22		
	Conductor Volqueta	13		

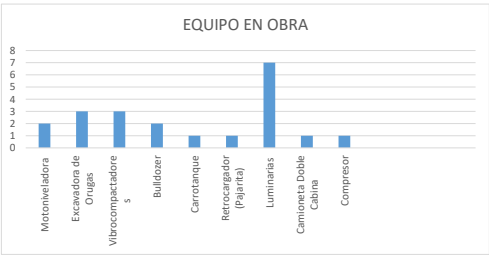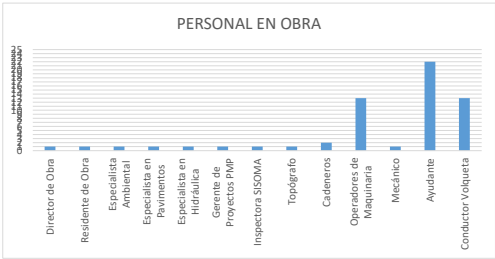

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE No. 1 - FRANJA NORESTE



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

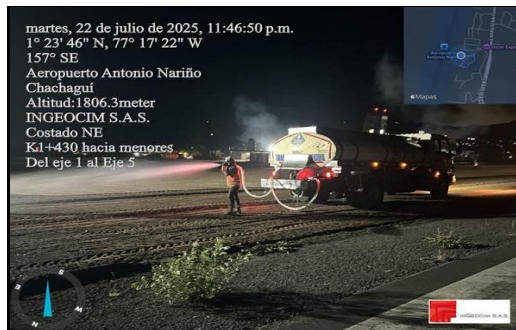

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

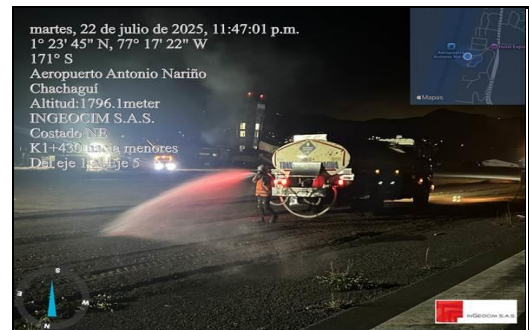


ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

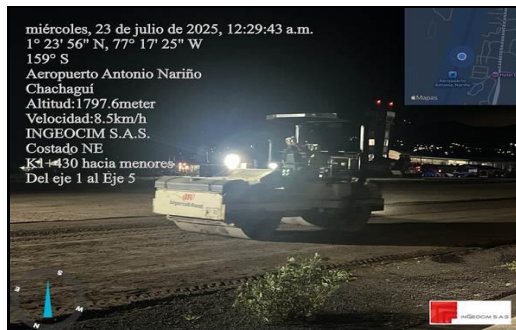

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

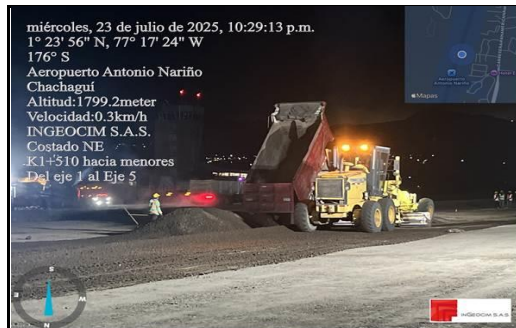

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

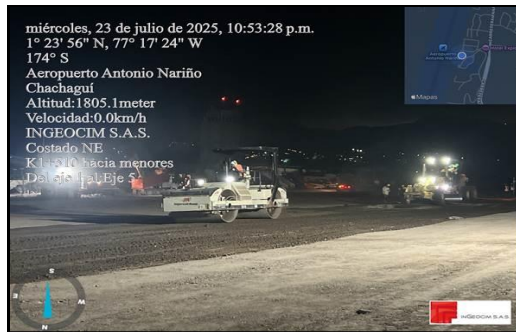

miércoles, 23 de julio de 2025, 10:53:28 p.m.
1° 23' 56" N, 77° 17' 24" W
174° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1805.1 meter
Velocidad: 0.0 km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+570 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

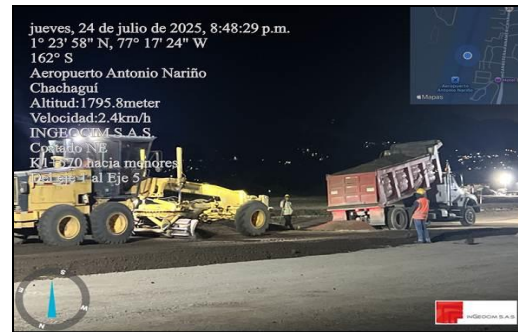

jueves, 24 de julio de 2025, 8:48:29 p.m.
1° 23' 58" N, 77° 17' 24" W
162° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1795.8 meter
Velocidad: 2.4 km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+570 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




jueves, 24 de julio de 2025, 9:08:39 p.m.
1° 23' 58" N, 77° 17' 23" W
165° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1791.1 meter
Velocidad: 0.0 km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+570 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



jueves, 24 de julio de 2025, 9:52:34 p.m.
1° 23' 57" N, 77° 17' 23" W
179° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1796.9 meter
Velocidad: 0.6 km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+570 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

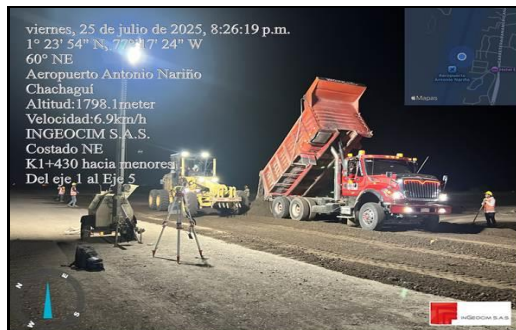

viernes, 25 de julio de 2025, 8:26:19 p.m.
1° 23' 54" N, 77° 17' 24" W
60° NE
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1798.1 meter
Velocidad: 6.9 km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+430 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



viernes, 25 de julio de 2025, 8:31:42 p.m.
1° 23' 55" N, 77° 17' 24" W
166° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1803.2 meter
Velocidad: 0.9 km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+430 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



viernes, 25 de julio de 2025, 8:40:48 p.m.
1° 23' 55" N, 77° 17' 24" W
159° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1793.9 meter
Velocidad: 0.0 km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+430 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



viernes, 25 de julio de 2025, 10:29:06 p.m.
1° 23' 56" N, 77° 17' 25" W
161° S
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
Altitud: 1815.5 meter
Velocidad: 0.0 km/h
INGEOCIM S.A.S.
Costado NE
K1+430 hacia menores
Del eje 1 al Eje 5


ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.

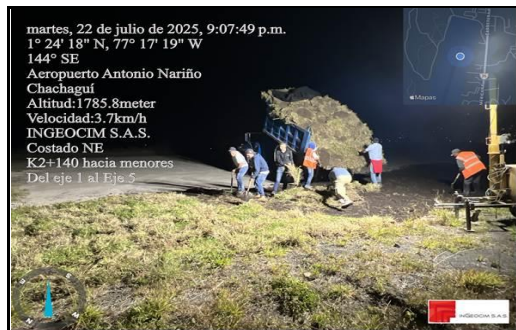


ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.



ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.

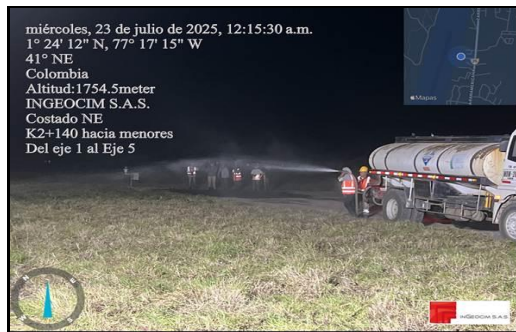


ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.

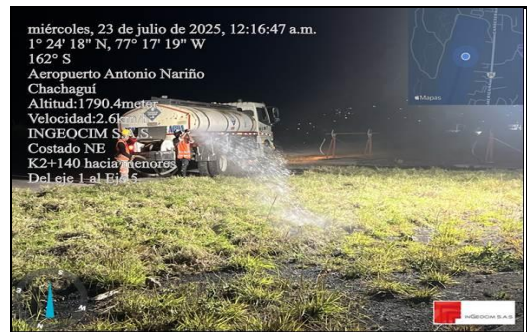

ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.



ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.

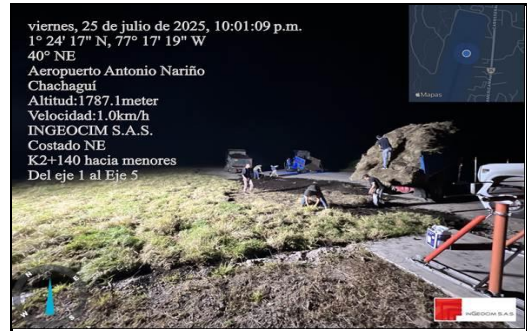

ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.


FRENTE No. 3 - FRANJA SURESTE



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

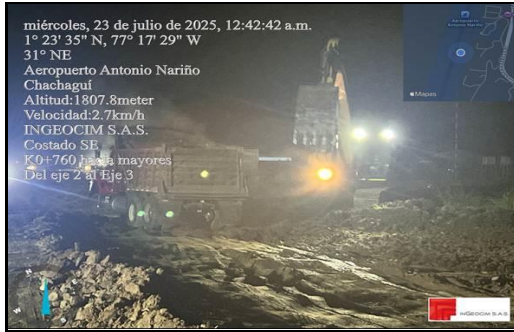


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.




ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

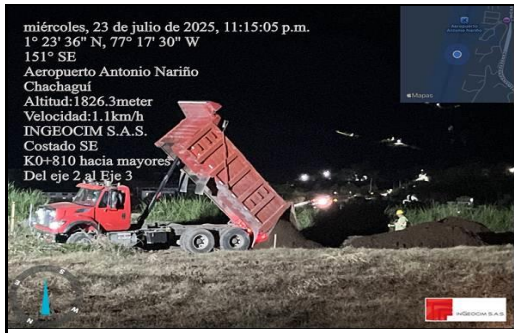


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

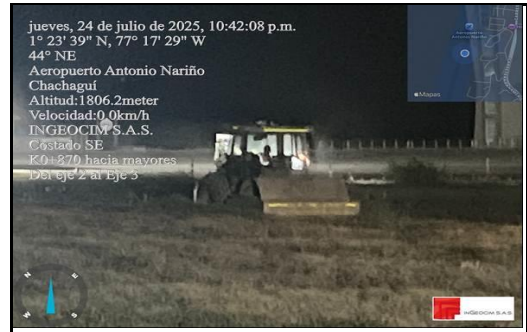


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

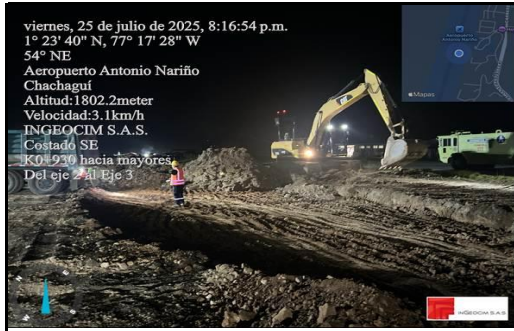


ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.



ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

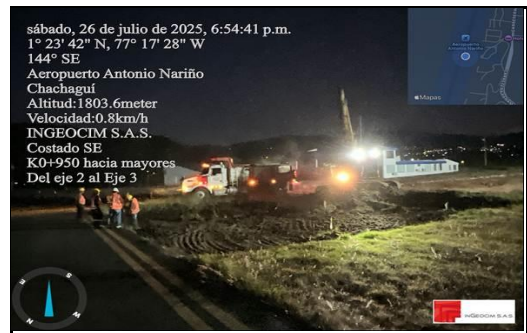

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO, Y SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 6, actualizando la línea base 4 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 3 correspondiente a la Prórroga No. 3 el día 23 de julio de 2025, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2023 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2023, dos (3) meses, es decir, hasta el 24 de septiembre de 2025. Este seguimiento se realizó con el Programa Detallado de Trabajo PDT, aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-202-OFC radicado 2025190010089559 de fecha 8 de julio de 2025, remitido a la AEROCIVIL.	ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
