


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                 |                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INFORME SEMANAL                                                                                                                                                 |                                             | VERSIÓN                                                                                         | 01                                   | INTERVENTORÍA:<br>GEOTECNIA Y CIMENTOS<br>INGEOCIM S.A.S. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                             | FECHA                                                                                           | 20/11/2023                           |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2023<br>"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)." |                                             |                                                                                                 |                                      |                                                           |
| DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                 |                                      |                                                           |
| Semana No. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | Plazo total (días) 400                      |                                                                                                 |                                      |                                                           |
| PERIODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 | Tiempo transcurrido desde inicio (días) 364 |                                                                                                 |                                      |                                                           |
| Del 12/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 | % de tiempo transcurrido 91,00%             |                                                                                                 |                                      |                                                           |
| Al 18/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | Interventoría                               |                                                                                                 | GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S. |                                                           |
| CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                 |                                      |                                                           |
| PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 | EJECUTADO                                   |                                                                                                 | BALANCE                              |                                                           |
| Valor programado \$ 517.475.463,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 | Valor ejecutado \$ 368.934.313,08           |                                                                                                 | -\$ 148.541.150,17                   |                                                           |
| Porcentaje programado 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Porcentaje ejecutado 3,28%                  |                                                                                                 | -1,32%                               |                                                           |
| CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                 |                                      |                                                           |
| PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 | EJECUTADO                                   |                                                                                                 | BALANCE                              |                                                           |
| Valor programado \$ 9.698.798.237,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 | Valor ejecutado \$ 9.103.761.159,06         |                                                                                                 | -\$ 595.037.078,58                   |                                                           |
| Porcentaje programado 86,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | Porcentaje ejecutado 80,98%                 |                                                                                                 | -5,29%                               |                                                           |
| DATOS DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                 |                                      |                                                           |
| CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                             | CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                                       |                                      |                                                           |
| Contratista: CONSORCIO ALFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                             | Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.                                               |                                      |                                                           |
| Contrato No: 23001138 H4 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                             | Contrato No: 23001299 H3 DE 2023                                                                |                                      |                                                           |
| Valor Inicial: \$ 8.706.192.504,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                             | Valor inicial: \$ 684.322.873,00                                                                |                                      |                                                           |
| Valor Actualizado al modificatorio: \$ 2.536.379.355,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                             | Valor actualizado al modificatorio: \$ 347.289.600,00                                           |                                      |                                                           |
| Valor actualizado 2: \$ 11.242.571.859,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                             | Valor actualizado 2: \$ 1.031.612.473,00                                                        |                                      |                                                           |
| Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                             | Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.                          |                                      |                                                           |
| Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                             | Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025                                |                                      |                                                           |
| Fecha de iniciación: 13/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                             | Fecha de iniciación: 13/08/2024                                                                 |                                      |                                                           |
| Fecha de vencimiento inicial: 16/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                             | Fecha de vencimiento: 16/12/2024                                                                |                                      |                                                           |
| Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                             | Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.     |                                      |                                                           |
| Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1: 17/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                             | Fecha de Terminación Según Prórroga No.1: 17/03/2025                                            |                                      |                                                           |
| Suspensión No. 1: 4/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                             | Suspensión No. 1: 4/03/2025                                                                     |                                      |                                                           |
| Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                             | Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025                                            |                                      |                                                           |
| Levantamiento de la suspensión No. 1: 11/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                             | Levantamiento de la Suspensión No.1: 11/03/2025                                                 |                                      |                                                           |
| Modificatorio No. 2 Prórroga No. 2: Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                             | Modificatorio No. 2 Prórroga No. 2: Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.   |                                      |                                                           |
| Modificatorio No. 3 Prórroga No. 3: Dos (2) meses, es decir, hasta el 24 de septiembre de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                             | Modificatorio No. 3 Prórroga No. 3: Dos (2) meses, es decir, hasta el 24 de septiembre de 2025. |                                      |                                                           |
| Nueva fecha de terminación: 24/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                             | Nueva fecha de terminación: 24/09/2025                                                          |                                      |                                                           |
| Valor total actual del contrato \$ 11.242.571.859,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                             | Valor total actual del contrato: \$ 1.031.612.473,00                                            |                                      |                                                           |
| ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                 |                                      |                                                           |
| ACTIVIDADES LADO AIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                             | ACTIVIDADES LADO TIERRA                                                                         |                                      |                                                           |
| * Acopio de material tolerable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                             | N.A.                                                                                            |                                      |                                                           |
| * Acopio de material de Base granular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                 |                                      |                                                           |
| * Se iniciaron las actividades de Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Base Granular estabilizada con cemento desde el Eje No. 1 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+500 al K1+800 de Franja del Costado Nor Oeste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                 |                                      |                                                           |
| * Se continúa con las actividades de Recubrimiento con empradización. Incluye suministro, transporte e instalación desde el Eje No. 1 al Eje No. 5 de Franja desde el K2+140 al K1+940 de Franja del Costado Nor Este.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                 |                                      |                                                           |
| ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                 |                                      |                                                           |
| Mediante el comunicado T-003-2024-214-OFC de fecha 12 de agosto 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta radicado 2024361030048088 Id: 1547172 – Retiro de escombros del contrato de obra No. 23001138 H4 de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                 |                                      |                                                           |
| ACTIVIDADES AMBIENTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                 |                                      |                                                           |
| Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental Adaptado a la resolución 530 de 2000 versión 4, mediante el comunicado T-003-2024-181-OFC de fecha 12 de mayo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                 |                                      |                                                           |
| ACTIVIDADES SISTEMA SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                 |                                      |                                                           |
| * Se realizan charlas de seguridad:<br>1. La falta de concentración en los trabajos y la seguridad.<br>2. Herramientas Manuales.<br><br>* Se realizan inspecciones de seguridad: inspección de extintores.<br>* Reunión COPASST.<br>* Diligenciamiento y revisión de preoperacionales de maquinaria y vehículos.<br>* Verificación de uso de y reposición de los mismos EPP.<br>* Programación de exámenes ocupacionales de retiro<br>* Se continua con las actividades de señalización preventivas con conos de seguridad sobre cajillas eléctricas, tanto en franja noreste y sureste. |                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                 |                                      |                                                           |


| AVANCE CANTIDADES                                                                                                    |                                                                                                           |            |          |                |                     |                                    |                      |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024                                                                              |                                                                                                           |            |          |                |                     | Semana No. 52<br>(12 Ago - 18 Ago) |                      |                      |  |
| "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)." |                                                                                                           |            |          |                |                     |                                    |                      |                      |  |
| ITEM DE PAGO                                                                                                         | DESCRIPCIÓN                                                                                               | UND.       | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL         | CANTIDAD                           | VALOR TOTAL          | Porcentaje Ejecutado |  |
| 2.2                                                                                                                  | LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD Y AS BUILT).              | 142.955,00 | 1,91%    | \$ 1.500,00    | \$ 214.432.500      | 0,00                               | \$ -                 | 0,00%                |  |
| 2.4                                                                                                                  | ZONA 1 - NOROESTE                                                                                         |            | 48,08%   |                | \$ 5.404.084.343    |                                    |                      |                      |  |
| 2.4.1                                                                                                                | Inicio Zona 2                                                                                             |            | 0,00%    |                | \$ -                |                                    |                      |                      |  |
| 2.4.2                                                                                                                | EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO. | 33.539,67  | 3,30%    | \$ 8.200,00    | \$ 370.846.886      |                                    | \$ -                 | 0,00%                |  |
| 2.4.3                                                                                                                | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN                                                   | 70.433,30  | 3,20%    | \$ 2.100,00    | \$ 360.217.940      |                                    | \$ -                 | 0,00%                |  |
| 2.4.4                                                                                                                | SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.                      | 23.371,13  | 17,67%   | \$ 85.000,00   | \$ 1.986.138.637    |                                    | \$ -                 | 0,00%                |  |
| 2.4.5                                                                                                                | SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.               | 7.790,38   | 20,10%   | \$ 290.000,00  | \$ 2.259.210.200    |                                    | \$ -                 | 0,00%                |  |
| 2.4.6                                                                                                                | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.                                 | 0,00       | 0,00%    | \$ 2.800,00    | \$ 0                |                                    | \$ -                 |                      |  |
| 2.4.7                                                                                                                | RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN                             | 38.951,88  | 3,81%    | \$ 11.000,00   | \$ 428.470.680      |                                    | \$ -                 | 0,00%                |  |
| 2.4                                                                                                                  | ZONA 2 - NOROESTE                                                                                         |            | 22,82%   |                | \$ 2.565.797.547,00 |                                    |                      |                      |  |
| 2.4.2                                                                                                                | EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO. | 15.600,72  | 1,54%    | \$ 8.200,00    | \$ 172.951.284      |                                    | \$ -                 | 0,00%                |  |
| 2.4.3                                                                                                                | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN                                                   | 32.761,51  | 1,75%    | \$ 2.100,00    | \$ 196.482.513      |                                    | \$ -                 | 0,00%                |  |
| 2.4.4                                                                                                                | SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.                      | 5.490,91   | 8,30%    | \$ 85.000,00   | \$ 933.453.850      |                                    | \$ -                 | 0,00%                |  |
| 2.4.5                                                                                                                | SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.               | 3.660,61   | 9,44%    | \$ 290.000,00  | \$ 1.061.576.900    | 1.260,00                           | \$ 365.400.000,00    | 34,42%               |  |
| 2.4.6                                                                                                                | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.                                 | 0,00       | 0,00%    | \$ 2.800,00    | \$ 0                |                                    | \$ -                 |                      |  |
| 2.4.7                                                                                                                | RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN                             | 18.303,00  | 1,79%    | \$ 11.000,00   | \$ 201.333.000      |                                    | \$ -                 |                      |  |
| 2.6                                                                                                                  | ZONA 3 - COSTADO SURESTE                                                                                  |            | 21,95%   |                | \$ 2.468.045.815,00 |                                    |                      |                      |  |
| 2.4.2                                                                                                                | EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO. | 3.882,73   | 0,68%    | \$ 8.200,00    | \$ 76.802.758       |                                    | \$ -                 | 0,00%                |  |
| 2.4.3                                                                                                                | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN                                                   | 8.153,73   | 0,87%    | \$ 2.100,00    | \$ 98.241.257       |                                    | \$ -                 | 0,00%                |  |
| 2.4.4                                                                                                                | SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 220.                      | 6.655,40   | 9,18%    | \$ 85.000,00   | \$ 1.031.803.100    |                                    | \$ -                 | 0,00%                |  |
| 2.4.5                                                                                                                | SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.               | 3.655,65   | 9,43%    | \$ 290.000,00  | \$ 1.060.138.500    |                                    | \$ -                 |                      |  |
| 2.4.6                                                                                                                | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.                                 | 0,00       | 0,00%    | \$ 2.800,00    |                     |                                    | \$ -                 |                      |  |
| 2.4.7                                                                                                                | RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN                             | 18.278,20  | 1,79%    | \$ 11.000,00   | \$ 201.060.200      |                                    | \$ -                 |                      |  |
| 2.11                                                                                                                 | ITEMS NO PREVISTOS                                                                                        |            | 4,95%    |                | \$ 536.134.062      |                                    |                      |                      |  |
| 2.11.1                                                                                                               | NP-01 REALCE CAJA ELÉCTRICA (H≤ 0.70m)                                                                    | 45,00      | 0,25%    | \$ 492.361,72  | \$ 28.512.630       | 7,00                               | \$ 3.446.532,03      | 15,56%               |  |
| 2.11.2                                                                                                               | NP-02 EXCAVACION MANUAL                                                                                   | 324,00     | 0,10%    | \$ 27.991,41   | \$ 11.608.596       | 3,14                               | \$ 87.781,05         | 0,97%                |  |
| 2.11.3                                                                                                               | NP-03 DEMOLICION DE CONCRETO                                                                              | 256,00     | 0,16%    | \$ 54.836,72   | \$ 17.968.896       |                                    | \$ -                 | 0,00%                |  |
| 2.11.4                                                                                                               | NP-04 CONFORMACIÓN DE FRANJAS CON MATERIAL DEL SITIO                                                      | 71.353,00  | 4,43%    | \$ 5.453,13    | \$ 498.043.940      |                                    | \$ -                 |                      |  |
| SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO                                                                                         |                                                                                                           |            |          |                |                     |                                    | \$ 368.934.313,08    |                      |  |
| IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO                                                                                 |                                                                                                           |            |          |                |                     |                                    | \$ 33.277.592,00     | 3,28%                |  |
| TOTAL                                                                                                                |                                                                                                           |            |          |                |                     |                                    | \$ 11.242.571.859,00 |                      |  |

AVANCE FINANCIERO

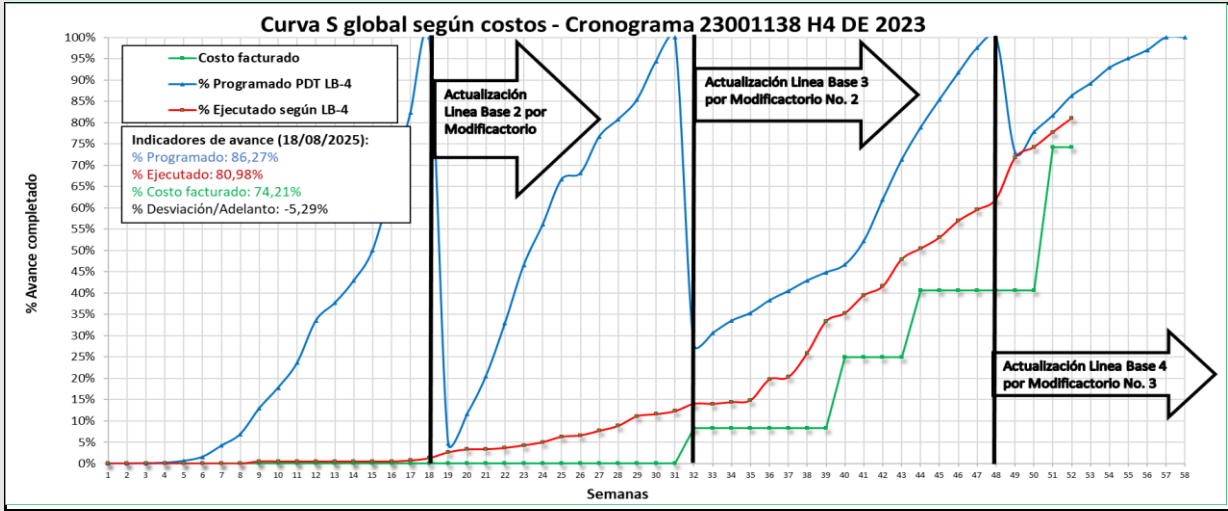

| CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE |                         |  |                           |                           |  |
|--------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| SEMANAL                              |                         |  | ACUMULADO                 |                           |  |
| PROGRAMADO                           | EJECUTADO               |  | PROGRAMADO                | EJECUTADO                 |  |
| Valor \$ 517.475.463,25              | Valor \$ 368.934.313,08 |  | Valor \$ 9.698.798.237,64 | Valor \$ 9.103.761.159,06 |  |
| Porcentaje 4,60%                     | Porcentaje 3,28%        |  | Porcentaje 86,27%         | Porcentaje 80,98%         |  |



| CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA |            |           |           |      |            |
|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|------------|
| SEMANAL                                |            |           | ACUMULADO |      |            |
| PROGRAMADO                             | Valor      | EJECUTADO | Valor     | \$   | PROGRAMADO |
|                                        | Porcentaje |           |           |      |            |
|                                        | 0,00%      |           | 0,00%     | 0,00 |            |
|                                        |            |           | 0,00%     | 0,00 |            |

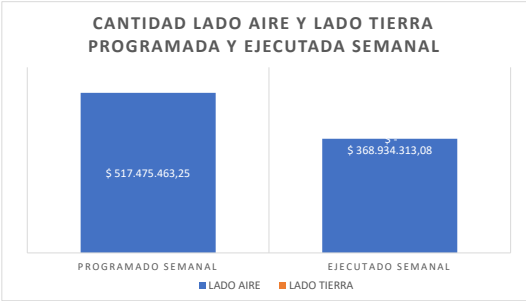

| PERSONAL EN OBRA | MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS |
|------------------|--------------------------------|
|------------------|--------------------------------|

| TIPO DE PERSONAL | CARGO                      | CANTIDAD |
|------------------|----------------------------|----------|
| PERSONAL TÉCNICO | Director de Obra           | 1        |
|                  | Residente de Obra          | 1        |
|                  | Especialista Ambiental     | 1        |
|                  | Especialista en Pavimentos | 1        |
|                  | Especialista en Hidráulica | 1        |
|                  | Gerente de Proyectos PMP   | 1        |
|                  | Inspectora SISOMA          | 1        |
|                  | Topógrafo                  | 1        |
|                  | Cadeneros                  | 2        |
| MANO DE OBRA     | Operadores de Maquinaria   | 13       |
|                  | Mecánico                   | 1        |
|                  | Ayudante                   | 22       |
|                  | Conductor Volqueta         | 13       |

| MAQUINARIA O EQUIPO      | CANTIDAD |
|--------------------------|----------|
| Motoniveladora           | 2        |
| Excavadora de Orugas     | 3        |
| Vibrocompactadores       | 3        |
| Bulldozer                | 2        |
| Carrozanque              | 1        |
| Retrocargador (Pajarita) | 1        |
| Luminarias               | 7        |
| Camioneta Doble Cabina   | 1        |
| Compresor                | 1        |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |

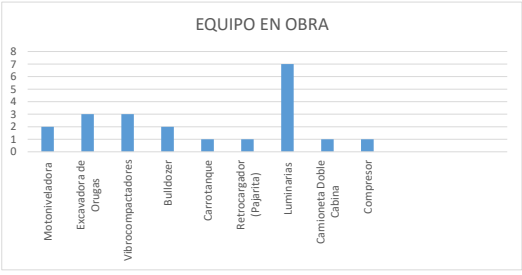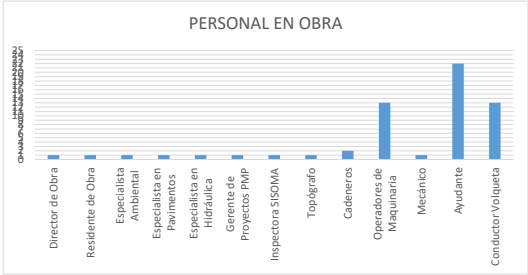

| REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|----------------------|
|----------------------|

| FRENTE No. 1 - FRANJA NORESTE |
|-------------------------------|
|-------------------------------|



ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.




ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.


**FRONTE No. 2 - FRANJA NOROESTE**



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

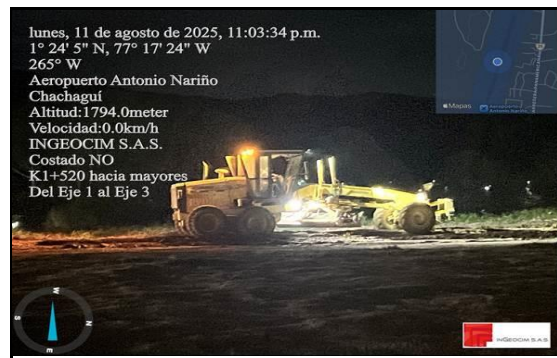


ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

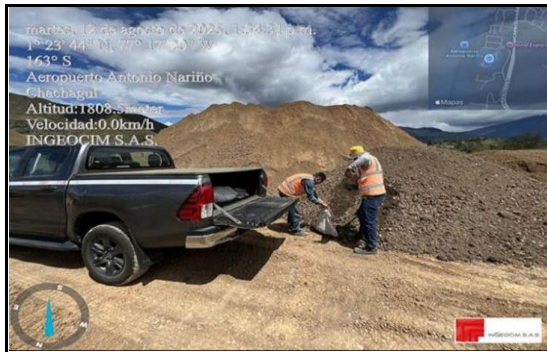


ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

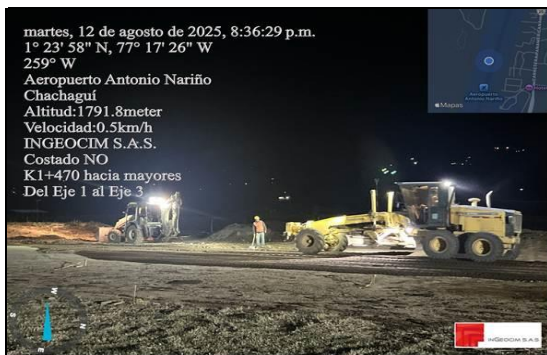


ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

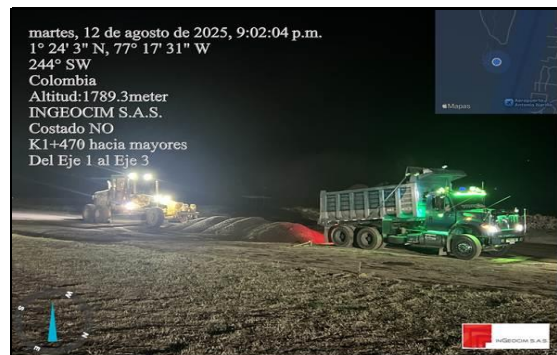

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

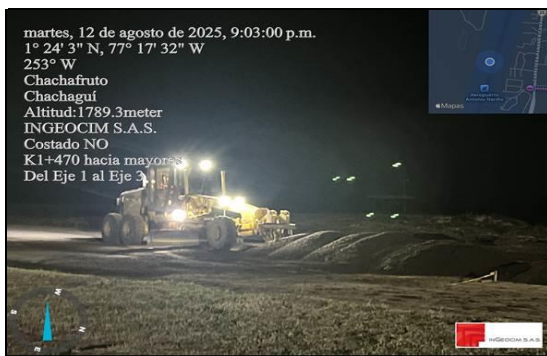

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

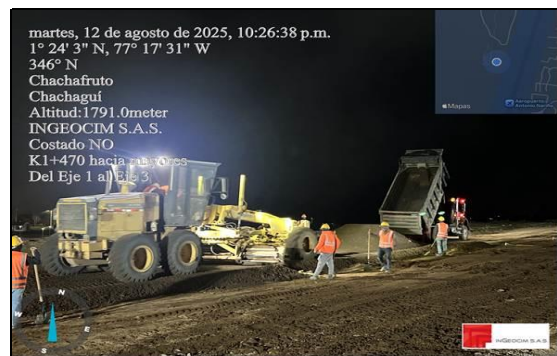


ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

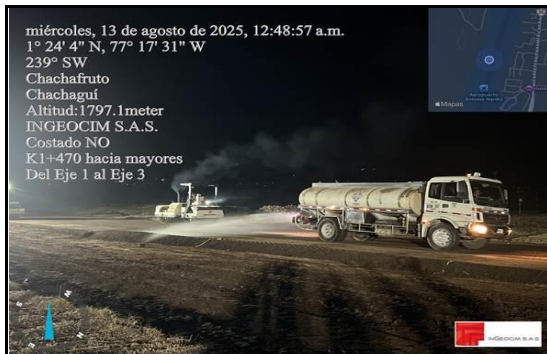


ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.




ACTIVIDADES DE TOMA DE DENSIDADES (IN-STU) POR PARTE DE INTERVENTORÍA, PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES USADOS EN OBRA.

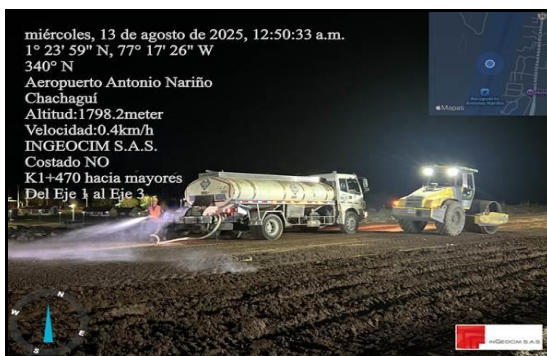


ACTIVIDADES DE TOMA DE DENSIDADES (IN-STU) POR PARTE DE INTERVENTORÍA, PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES USADOS EN OBRA.

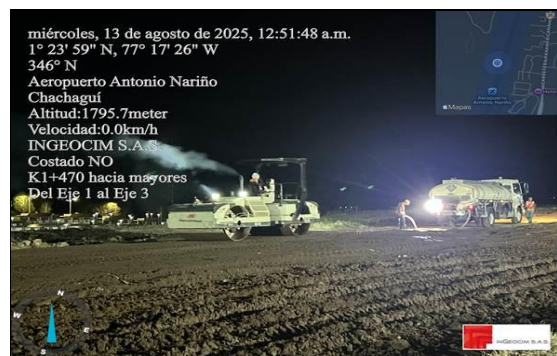


ACTIVIDADES DE TOMA DE DENSIDADES (IN-STU) POR PARTE DE INTERVENTORÍA, PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES USADOS EN OBRA.

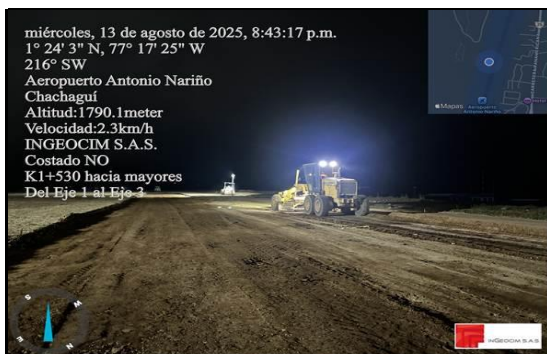

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

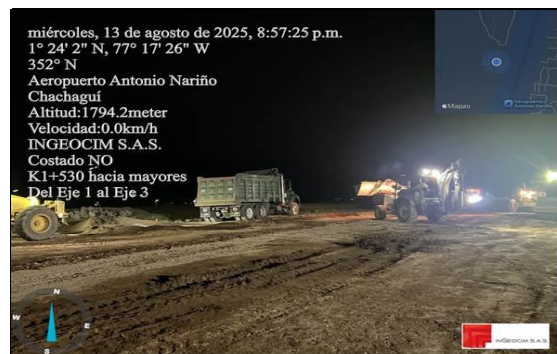

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

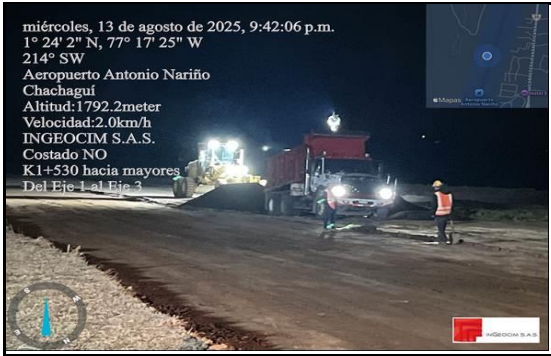


ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

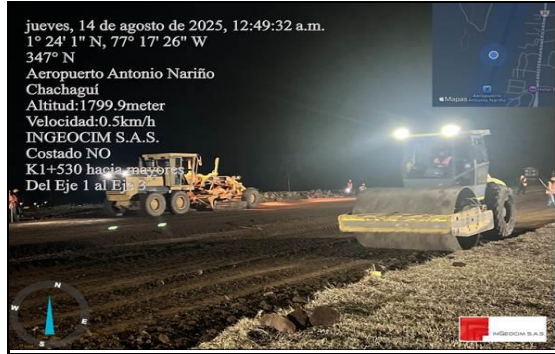

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FIRMA                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p>Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 6, actualizando la línea base 4 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 3 correspondiente a la Prórroga No. 3 el día 23 de julio de 2025, en donde se prórrroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2023 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2023, dos (2) meses, es decir, hasta el 24 de septiembre de 2025.</p> <p>Este seguimiento se realizó con el Programa Detallado de Trabajo PDT, aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-202-OFIC radicado 2025190010089559 de fecha 8 de julio de 2025, remitido a la AEROCIVIL.</p> | <p>ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS<br/>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> |
