


 AERONAUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	INFORME SEMANAL	VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.
		FECHA	20/11/2023	
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2023 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				
DATOS GENERALES				
Semana No. 55Plazo total (días) 400				
PERIODOTiempo transcurrido desde inicio (días) 385				
Del 2/09/2025% de tiempo transcurrido 96.25%				
Al 8/09/2025Interventoría GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.				
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL				
PROGRAMADO EJEUTADO BALANCE				
Valor programado \$ 242,744,294.54 Valor ejecutado \$ 18,040,000.00 -\$ 224,704,294.54				
Porcentaje programado 2.16% Porcentaje ejecutado 0.16% -2.00%				
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA				
PROGRAMADO EJEUTADO BALANCE				
Valor programado \$ 10,682,374,678.83 Valor ejecutado \$ 9,543,116,717.64 -\$ 1,139,257,961.19				
Porcentaje programado 95.02% Porcentaje ejecutado 84.88% -10.13%				
DATOS DEL CONTRATO				
CONTRATO DE OBRA				
Contratista: CONSORCIO ALFA				
Contrato No: 23001138 H4 DE 2023				
Valor Inicial: \$ 8,706,192,504.00				
Valor Actualizado al modificatorio 1: \$ 2,536,379,355.00				
Valor actualizado 2: \$ 11,242,571,859.00				
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.				
Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025				
Fecha de iniciación: 13/08/2024				
Fecha de vencimiento inicial: 16/12/2024				
Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.				
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1: 17/03/2025				
Suspensión No. 1: 4/03/2025				
Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025				
Levantamiento de la suspensión No. 1: 11/03/2025				
Modificatorio No. 2 Prórroga No. 2: Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.				
Modificatorio No. 3 Prórroga No. 3: Dos (2) meses, es decir, hasta el 24 de septiembre de 2025.				
Nueva fecha de terminación: 24/09/2025				
Valor total actual del contrato \$ 11,242,571,859.00				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
Contratista: GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.				
Contrato No: 23001299 H3 DE 2023				
Valor inicial: \$ 684,322,873.00				
Valor actualizado al modificatorio 1: \$ 347,289,600.00				
Valor actualizado 2: \$ 1,031,612,473.00				
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.				
Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025				
Fecha de iniciación: 13/08/2024				
Fecha de vencimiento: 16/12/2024				
Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.				
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1: 17/03/2025				
Suspensión No. 1: 4/03/2025				
Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025				
Levantamiento de la Suspensión No. 1: 11/03/2025				
Modificatorio No. 2 Prórroga No. 2: Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.				
Modificatorio No. 3 Prórroga No. 3: Dos (2) meses, es decir, hasta el 24 de septiembre de 2025.				
Nueva fecha de terminación: 24/09/2025				
Valor total actual del contrato: \$ 1,031,612,473.00				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA				
ACTIVIDADES LADO AIRE				
* Acopio de material tolerable				
* Acopio de material de Base granular.				
* Se continúan las actividades de Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Base Granular estabilizada con cemento desde el Eje No. 1 al Eje No. 3 de Franja desde el K1+950 al K2+140 de Franja del Costado Nor Oeste.				
* Se continúa con las actividades de Recubrimiento con empradización. Incluye suministro, transporte e instalación desde el Eje No. 1 al Eje No. 5 de Franja desde el K1+720 al K1+680 de Franja del Costado Nor Este.				
ACTIVIDADES LADO TIERRA				
N.A.				
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Mediante el comunicado T-003-2024-219-OFC de fecha 3 de septiembre 2025 se remitió a la AEROCIVIL la Respuesta al comunicado 2025361030033964 Id: 2315777 – Remisión reporte ICA vigencia 2024 del Aeropuerto Antonio Nariño.				
ACTIVIDADES AMBIENTALES				
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental Adaptado a la resolución 530 de 2000 versión 4, mediante el comunicado T-003-2024-181-OFC de fecha 12 de mayo de 2025.				
ACTIVIDADES SISTEMA SST				
* Se realizan charlas de seguridad:				
1. La falta de concentración en los trabajos y la seguridad.				
2. Herramientas Manuales.				
* Se realizan inspecciones de seguridad: inspección de extintores.				
* Reunión COPASST.				
* Diligenciamiento y revisión de preoperacionales de maquinaria y vehículos.				
* Verificación de uso de y reposición de los mismos EPP.				
* Programación de exámenes ocupacionales de retiro				
* Se continua con las actividades de señalización preventivas con conos de seguridad sobre cajillas eléctricas, tanto en franja noreste y sureste.				

CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024						Semana No. 55 (2 Sep - 8 Sep)			
"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."									
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado	
2.2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD Y AS BUILT).	142.955,00	1,91%	\$ 1.500,00	\$ 214.432.500	0,00	\$ -	0,00%	
2.4	ZONA 1 - NORESTE		48,08%		\$ 5.404.884.343				
2.4.1	Inicio Zona 2		0,00%		\$ -				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	33.539,67	3,30%	\$ 8.200,00	\$ 370.846.886		\$ -	0,00%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	70.433,30	3,20%	\$ 2.100,00	\$ 360.217.940		\$ -	0,00%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 226.	23.371,13	17,67%	\$ 85.000,00	\$ 1.986.138.637		\$ -	0,00%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	7.790,38	20,10%	\$ 290.000,00	\$ 2.259.210.200		\$ -	0,00%	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	38.951,88	3,81%	\$ 11.000,00	\$ 428.470.680	1.640,00	\$ 18.040.000,00	4,21%	
2.4	ZONA 2 - NOROESTE		22,82%		\$ 2.565.797.547,00				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	15.600,72	1,54%	\$ 8.200,00	\$ 172.951.284		\$ -	0,00%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	32.761,51	1,75%	\$ 2.100,00	\$ 196.482.513		\$ -	0,00%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 226.	5.490,91	8,30%	\$ 85.000,00	\$ 933.453.850		\$ -	0,00%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.660,61	9,44%	\$ 290.000,00	\$ 1.061.576.900		\$ -	0,00%	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.303,00	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.333.000		\$ -		
2.6	ZONA 3 - COSTADO SURESTE		21,95%		\$ 2.468.045.815,00				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	3.882,73	0,68%	\$ 8.200,00	\$ 76.802.758		\$ -	0,00%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	8.153,73	0,87%	\$ 2.100,00	\$ 98.241.257		\$ -	0,00%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 226.	6.655,40	9,18%	\$ 85.000,00	\$ 1.031.803.100		\$ -	0,00%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.655,65	9,43%	\$ 290.000,00	\$ 1.060.138.500		\$ -		
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.278,20	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.060.200		\$ -		
2.11	ITEMS NO PREVISTOS		4,95%		\$ 556.134.062				
2.11.1	NP-01 REALCE CAJA ELÉCTRICA (H≤ 0.70m)	45,00	0,25%	\$ 492.361,72	\$ 28.512.630		\$ -	0,00%	
2.11.2	NP-02 EXCAVACION MANUAL	324,00	0,10%	\$ 27.991,41	\$ 11.608.596	0,00	\$ -	0,00%	
2.11.3	NP-03 DEMOLICION DE CONCRETO	256,00	0,16%	\$ 54.836,72	\$ 17.968.896		\$ -	0,00%	
2.11.4	NP-04 CONFORMACIÓN DE FRANJAS CON MATERIAL DEL SITIO	71.353,00	4,43%	\$ 5.453,13	\$ 498.043.940		\$ -		
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO							\$ 11.209.294.267,00		
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO							\$ 33.277.592,00	0,16%	
TOTAL							\$ 11.242.571.859,00		

AVANCE FINANCIERO

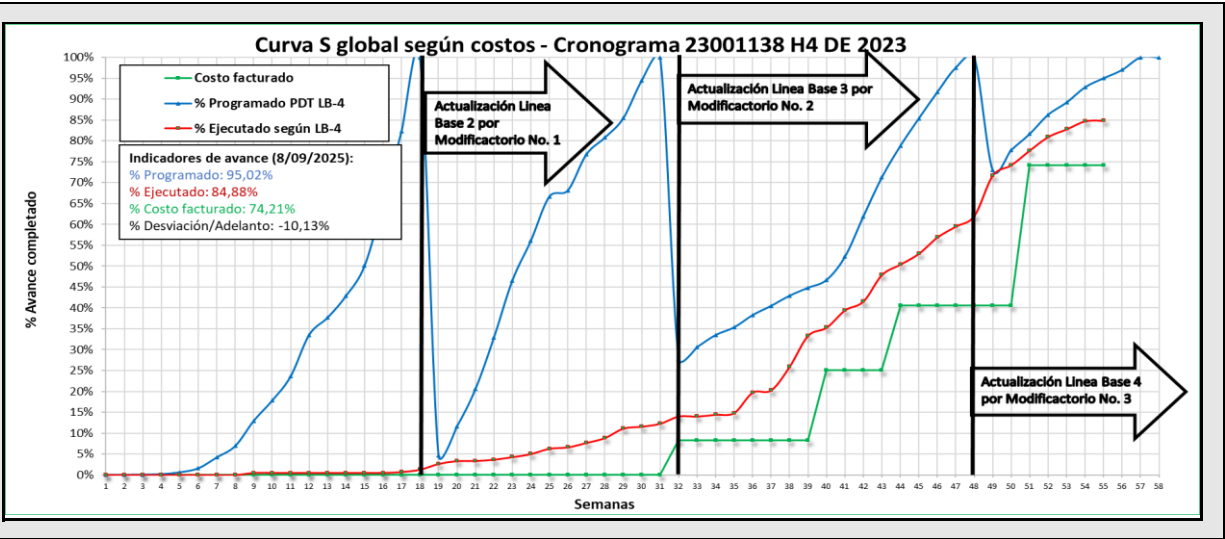

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	
Valor \$ 242,744,294.54	Valor \$ 18,040,000.00		Valor \$ 10,682,374,678.83	Valor \$ 9,543,116,717.64	
Porcentaje 2.16%	Porcentaje 0.16%		Porcentaje 95.02%	Porcentaje 84.88%	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	
Valor \$ -	Valor \$ -		Valor \$ 0.00	Valor \$ 0.00	
Porcentaje 0.00%	Porcentaje 0.00%		Porcentaje 0.00%	Porcentaje 0.00%	





PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Residente de Obra	1
	Especialista Ambiental	1
	Especialista en Pavimentos	1
	Especialista en Hidráulica	1
	Gerente de Proyectos PMP	1
	Inspectora SISOMA	1
	Topógrafo	1
	Cadeneros	2
MANO DE OBRA	Operadores de Maquinaria	13
	Mecánico	1
	Ayudante	22
	Conductor Volqueta	13

MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	2
Excavadora de Orugas	3
Vibrocompactadores	3
Bulldozer	2
Carro tanque	1
Retrocargador (Pajarita)	1
Luminarias	7
Camioneta Doble Cabina	1
Compresor	1

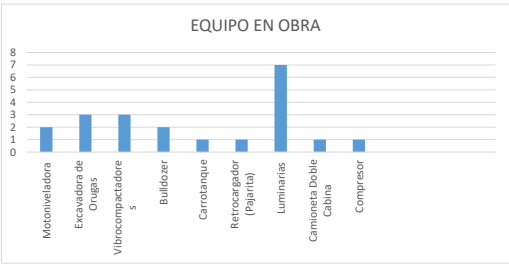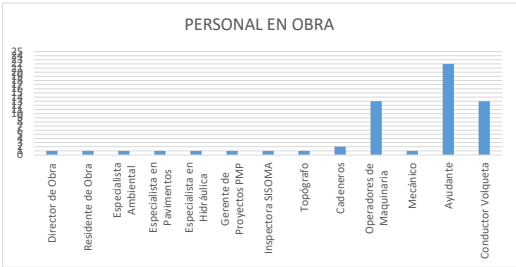

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FRENTE No. 1 - FRANJA NORESTE




ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.



ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.

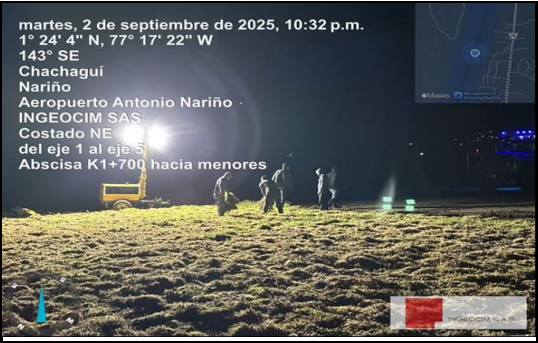

ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.

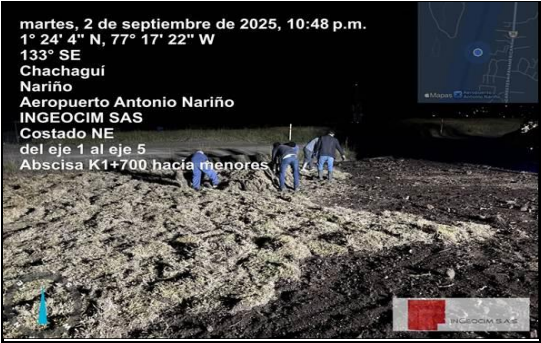

ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.

FRENTE No. 2 - FRANJA NOROESTE



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



RECORRIDO DE OBRA INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA.



RECORRIDO DE OBRA INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

OBSERVACIONES

Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 6, actualizando la línea base 4 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 3 correspondiente a la Prórroga No. 3 el día 23 de julio de 2025, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2023 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2023, dos (2) meses, es decir, hasta el 24 de septiembre de 2025.

Este seguimiento se realizó con el Programa Detallado de Trabajo PDT, aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-202-OFC radicado 2025190010089559 de fecha 8 de julio de 2025, remitido a la AEROCIVIL.

FIRMA

ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
