




	INFORME SEMANAL		VERSIÓN	01	INTERVENTORÍA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.
			FECHA	20/11/2023	
	CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2023 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."				
DATOS GENERALES					
Semana No. 57 Plazo total (días) 400					
PERIODO Del. 16/09/2025 % de tiempo transcurrido 99.50%					
Al. 22/09/2025 Interventoría GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.					
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL					
PROGRAMADO			EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 337,211,021.26		Valor ejecutado	\$ 185,600,000.00	-\$ 151,611,021.26
Porcentaje programado	3.00%		Porcentaje ejecutado	1.65%	-1.35%
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA					
PROGRAMADO			EJECUTADO		BALANCE
Valor programado	\$ 11,242,571,859.00		Valor ejecutado	\$ 10,314,214,351.76	-\$ 928,357,507.24
Porcentaje programado	100.00%		Porcentaje ejecutado	91.74%	-8.26%
DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista: CONSORCIO ALFA			Contratista: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.		
Contrato No: 23001138 H4 DE 2023			Contrato No: 23001299 H3 DE 2023		
Valor inicial: \$ 8,706,192,504.00			Valor inicial: \$ 684,322,873.00		
Valor Actualizado al modificatorio: \$ 2,536,379,355.00			Valor actualizado al modificatorio: \$ 347,289,600.00		
Valor actualizado 2: \$ 11,242,571,859.00			Valor actualizado 2: \$ 1,031,612,473.00		
Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.			Plazo inicial: Siete (7) Meses sin exceder el 16 de diciembre de 2024.		
Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025			Plazo actualizado: 11 meses, es decir, hasta el 24 de julio 2025		
Fecha de iniciación: 13/08/2024			Fecha de iniciación: 13/08/2024		
Fecha de vencimiento inicial: 16/12/2024			Fecha de vencimiento: 16/12/2024		
Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.			Modificatorio No. 1 Prórroga No. 1: Tres (3) meses, es decir, hasta el 17 de marzo de 2025.		
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1: 17/03/2025			Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1: 17/03/2025		
Suspensión No. 1: 4/03/2025			Suspensión No. 1: 4/03/2025		
Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025			Periodo de Suspensión No. 1: 4/03/2025 al 10/03/2025		
Levantamiento de la suspensión No. 1: 11/03/2025			Levantamiento de la suspensión No. 1: 11/03/2025		
Modificatorio No. 2 Prórroga No. 2: Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.			Modificatorio No. 2 Prórroga No. 2: Cuatro (4) meses, es decir, hasta el 24 de julio de 2025.		
Modificatorio No. 3 Prórroga No. 3: Dos (2) meses, es decir, hasta el 24 de septiembre de 2025.			Modificatorio No. 3 Prórroga No. 3: Dos (2) meses, es decir, hasta el 24 de septiembre de 2025.		
Nueva fecha de terminación: 24/09/2025			Nueva fecha de terminación: 24/09/2025		
Valor total actual del contrato: \$ 11,242,571,859.00			Valor total actual del contrato: \$ 1,031,612,473.00		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
ACTIVIDADES LADO AIRE			ACTIVIDADES LADO TIERRA		
* Acopio de material tolerable			N.A.		
* Acopio de material de Base granular.					
* Se iniciaron las actividades de Suministro, Transporte, extendido y Compactación de Base Granular estabilizada con cemento desde el Eje No. 1 al Eje No. 3 de Franja desde el K0+600 al K0+760 de Franja del Costado Sur Este.					
* Se continúa con las actividades de Recubrimiento con empedrado. Incluye suministro, transporte e instalación desde el Eje No. 1 al Eje No. 5 de Franja desde el K1+680 al K1+600 de Franja del Costado Nor Este.					
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
Mediante el comunicado T-003-2024-226-OFC de fecha 16 de septiembre 2025 se remitió a la AEROCIVIL el Acta de recibo parcial de Interventoría No. 7.					
ACTIVIDADES AMBIENTALES					
Por parte de la interventoría se dio APROBACIÓN del Plan de Manejo Ambiental Adaptado a la resolución 530 de 2000 versión 4, mediante el comunicado T-003-2024-181-OFC de fecha 12 de mayo de 2025.					
ACTIVIDADES SISTEMA SST					
* Se realizan charlas de seguridad: 1. La falta de concentración en los trabajos y la seguridad. 2. Herramientas Manuales.					
* Se realizan inspecciones de seguridad: inspección de extintores.					
* Reunión COPASST.					
* Diligenciamiento y revisión de preoperacionales de maquinaria y vehículos.					
* Verificación de uso de y reposición de los mismos EPP.					
* Programación de exámenes ocupacionales de retiro					
* Se continua con las actividades de señalización preventivas con conos de seguridad sobre cajillas eléctricas, tanto en franja noreste y sureste.					

AVANCE CANTIDADES									
CONTRATO DE OBRA No 23001138 H4 DE 2024 "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)."						Semana No. 57 (16 Sep - 22 Sep)			
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Porcentaje Ejecutado	
2.2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE ENTREGA DE PLANOS RECORD Y AS BUILT).	142.955,00	1,91%	\$ 1.500,00	\$ 214.432.500	0,00	\$ -	0,00%	
2.4	ZONA 1 - NORESTE		48,08%		\$ 5.484.884.343				
2.4.1	Inicio Zona 2		0,00%	\$ -					
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	33.539,67	3,30%	\$ 8.200,00	\$ 370.846.886		\$ -	0,00%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	70.433,30	3,20%	\$ 2.100,00	\$ 360.217.940		\$ -	0,00%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 228.	23.371,13	17,67%	\$ 85.000,00	\$ 1.986.138.637		\$ -	0,00%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	7.790,38	20,10%	\$ 290.000,00	\$ 2.259.210.200		\$ -	0,00%	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	38.951,88	3,81%	\$ 11.000,00	\$ 428.470.680		\$ -	0,00%	
2.4	ZONA 2 - NOROESTE		22,82%		\$ 2.565.797.547,00				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	15.600,72	1,54%	\$ 8.200,00	\$ 172.951.284		\$ -	0,00%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	32.761,51	1,75%	\$ 2.100,00	\$ 196.482.513		\$ -	0,00%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 228.	5.490,91	8,30%	\$ 85.000,00	\$ 933.453.850		\$ -	0,00%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.660,61	9,44%	\$ 290.000,00	\$ 1.061.576.900		\$ -	0,00%	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.303,00	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.333.000		\$ -		
2.6	ZONA 3 - COSTADO SURESTE		21,95%		\$ 2.468.045.815,00				
2.4.2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	3.882,73	0,68%	\$ 8.200,00	\$ 76.802.758		\$ -	0,00%	
2.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN	8.153,73	0,87%	\$ 2.100,00	\$ 98.241.257		\$ -	0,00%	
2.4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TOLERABLE TIPO INV 228.	6.655,40	9,18%	\$ 85.000,00	\$ 1.031.803.100		\$ -	0,00%	
2.4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.	3.655,05	9,43%	\$ 290.000,00	\$ 1.060.138.500	640,00	\$ 185.600.000,00	17,51%	
2.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA NORMA FAA P-602, INCLUYE TRANSPORTE.	0,00	0,00%	\$ 2.800,00	\$ 0		\$ -		
2.4.7	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	18.278,20	1,79%	\$ 11.000,00	\$ 201.060.200		\$ -		
2.11	ITEMS NO PREVISTOS		4,95%		\$ 556.134.062				
2.11.1	NP-01 REALCE CAJA ELÉCTRICA (H=0,70m)	45,00	0,25%	\$ 492.961,72	\$ 28.512.630		\$ -	0,00%	
2.11.2	NP-02 EXCAVACIÓN MANUAL	324,00	0,10%	\$ 27.991,41	\$ 11.608.596		\$ -	0,00%	
2.11.3	NP-03 DEMOLICIÓN DE CONCRETO	256,00	0,16%	\$ 54.836,72	\$ 17.968.896		\$ -	0,00%	
2.11.4	NP-04 CONFORMACIÓN DE FRANJAS CON MATERIAL DEL SITIO	71.353,00	4,43%	\$ 5.453,13	\$ 498.043.940		\$ -		
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO					\$ 11.209.294.267,00		\$ 185.600.000,00		
IVA SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO					\$ 33.277.592,00			1,65%	
TOTAL					\$ 11.242.571.859,00				

AVANCE FINANCIERO

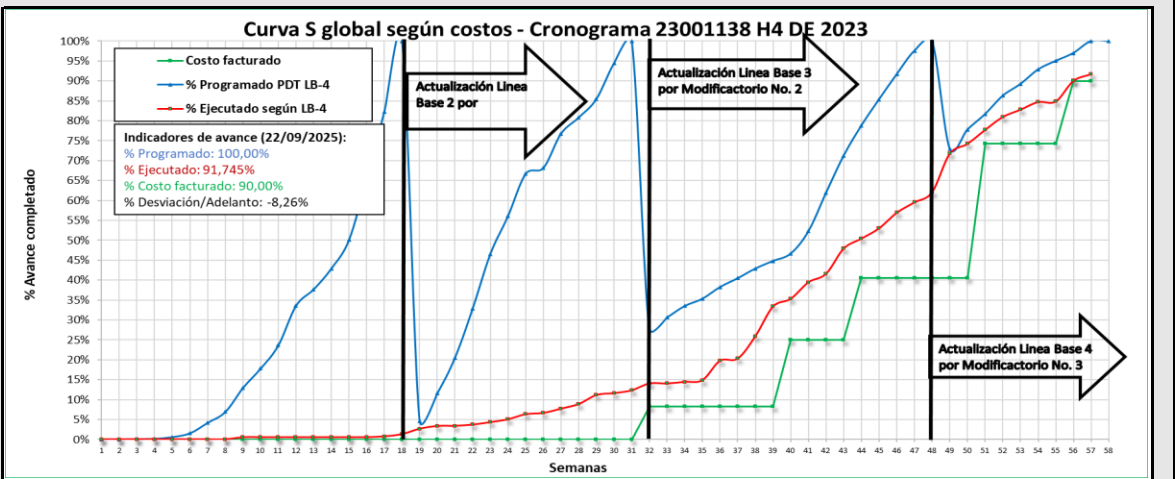



CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO AIRE					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	
Valor \$ 337.211.021,26	Valor \$ 185.600.000,00		Valor \$ 11.242.571.859,00	Valor \$ 10.314.214.351,76	
Porcentaje 3,00%	Porcentaje 1,65%		Porcentaje 100,00%	Porcentaje 91,74%	
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN LADO TIERRA					
SEMANAL			ACUMULADO		
PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	
Valor \$ -	Valor \$ -		Valor \$ 0,00	Valor \$ 0,00	
Porcentaje 0,00%	Porcentaje 0,00%		Porcentaje 0,00%	Porcentaje 0,00%	

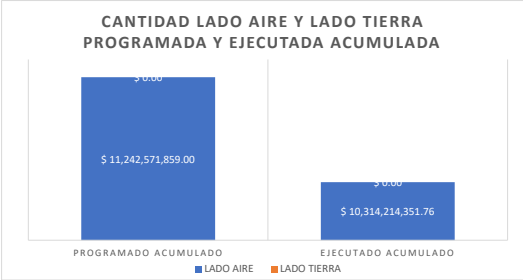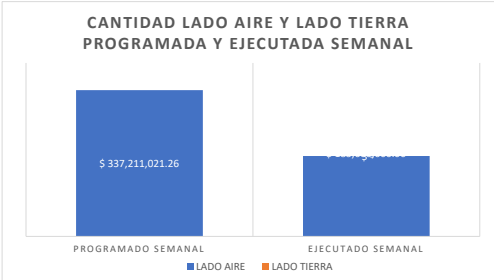

PERSONAL EN OBRA

TIPO DE PERSONAL	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL TÉCNICO	Director de Obra	1
	Residente de Obra	1
	Especialista Ambiental	1
	Especialista en Pavimentos	1
	Especialista en Hidráulica	1
	Gerente de Proyectos PMP	1
	Inspectora SISOMA	1
	Topógrafo	1
	Cadeneros	2
	Operadores de Maquinaria	13
MANO DE OBRA	Mecánico	1
	Ayudante	22
	Conductor Volqueta	13

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD
Motoniveladora	2
Excavadora de Orugas	3
Vibrocompactadores	3
Bulldozer	2
Carrotanque	1
Retrocargador (Pajarita)	1
Luminarias	7
Camioneta Doble Cabina	1
Compresor	1

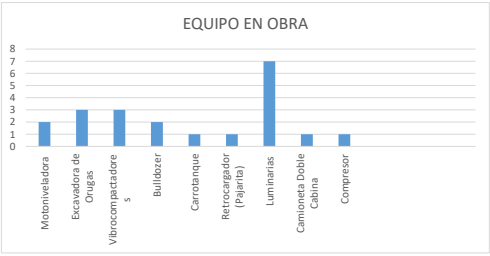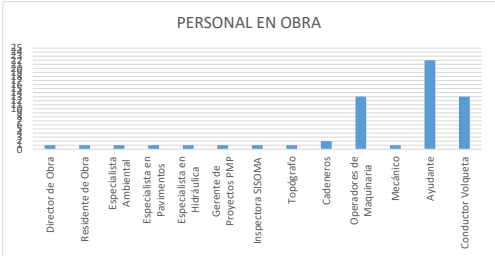

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTA No. 1 - FRANJA SURESTE



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



INSTALACIÓN DE LA BALIZA DE LA LUZ PAPI EN LA CABECERA NORTE



INSTALACIÓN DE LA BALIZA DE LA LUZ PAPI EN LA CABECERA NORTE




16/09/2025 at 10:25:51 PM
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
INGEOCIM S.A.S
Costado NO

ENSAYOS DE DENSIDADES "IN-SITU" PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES USADOS EN OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.



16/09/2025 at 11:06:29 PM
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 3

ENSAYOS DE DENSIDADES "IN-SITU" PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES USADOS EN OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

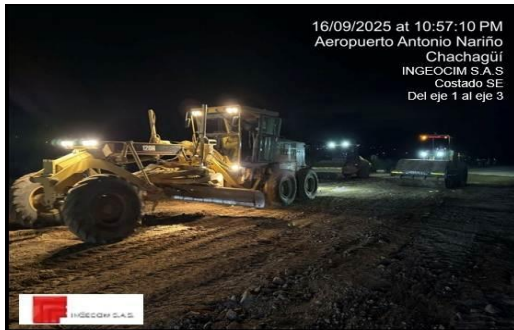

16/09/2025 at 10:57:10 PM
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 3

RECORRIDO DE OBRA INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA.



16/09/2025 at 10:57:06 PM
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 3

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



16/09/2025 at 10:56:15 PM
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 3

RECORRIDO DE OBRA INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA.



16/09/2025 at 10:55:47 PM
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 3

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



16/09/2025 at 10:55:41 PM
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 3

RECORRIDO DE OBRA INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA.



17/09/2025 at 10:08:36 PM
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 3

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



17/09/2025 at 6:21:02 PM
Aeropuerto Antonio Nariño
Chachagüí
INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 3

RECORRIDO DE OBRA INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA.



INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 3
17/09/2025 11:44:57 p. m.
1°23'33"N 77°17'30"W
Altitud:1839.9msnm
Velocidad:0.5km/h

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.



INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 3
17/09/2025 11:45:02 p. m.
1°23'33"N 77°17'30"W
Altitud:1839.5msnm
Velocidad:0.1km/h

RECORRIDO DE OBRA INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA.



INGEOCIM S.A.S
Costado SE
Del eje 1 al eje 3
19/09/2025 11:37:21 p. m.
1°23'27"N 77°17'31"W
Altitud:1842.3msnm
Velocidad:0.0km/h

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO.

OBSERVACIONES	FIRMA
Al corte del presente informe semanal, se realiza el seguimiento con el Programa Detallado de Trabajo versión 6, actualizando la línea base 4 de acuerdo con la suscripción del Modificadorio No. 3 correspondiente a la Prórroga No. 3 el día 23 de julio de 2025, en donde se prórroga el contrato de obra No. 23001138 H4 de 2023 y el contrato de Interventoría No. 23001299 H3 de 2023, dos (2) meses, es decir, hasta el 24 de septiembre de 2025. Este seguimiento se realizó con el Programa Detallado de Trabajo PDT, aprobado por parte de la interventoría, mediante el comunicado T-003-2024-202-OFC radicado 2025190010089559 de fecha 8 de julio de 2025, remitido a la AEROCIVIL.	 ING. CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA
