

469-2025-004

Cubara, 11 de diciembre de 2025

Supervisión:
ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA
subgerencia@hospitalcubara.gov.co

Asunto: Aprobación de informes para parcial No 01.

Referencia: Informe periodo mensual No. 01, para el contrato al Contrato de Obra No. 361-2025, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ".

Cordial saludo,


Me permito comunicar la aprobación del Informe de Periodo Mensual No. 01, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2025 y el 15 de noviembre de 2025, presentado en el marco del Contrato de Obra No. 361-2025, cuyo objeto es la "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ".

Dicho informe fue presentado por el contratista responsable del contrato de obra y revisado por la interventoría del **Contrato de Consultoría No. 469-2025**, cuyo objeto es la *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002-2025, CUYO OBJETO ES LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ"*. La documentación cumple con los requisitos estipulados contractualmente.

En virtud de lo anterior, se adjunta el informe aprobado para su radicación ante esa supervisión.

Agradecemos su atención y la celeridad en la gestión de este requerimiento.

Atentamente,


FRASCING SAS
NIT: 901.629.231-4
R/L FANNY KATHERIN BARRERA CORREA



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

INFORME DE INTERVENTORIA No 01 PARA PARCIAL DE CONTRATO DE OBRA



CONTRATO DE CONSULTARÍA NO. 469-2025

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL MARCO DE LA
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002-2025, CUYO OBJETO ES LA
ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E.
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**

CUBARÁ - BOYACÁ 2025



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

INFORME No 01 PARCIAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO DEL INFORME: 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025



CONTRATO DE OBRA N°. No. 361-2025

CONTRATISTA: CONSTRUINDUCIVIL SAS

NIT No. 901.375.684-5

R/L: XIOMARA MANRIQUE

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

CONTRATO DE CONSULTARÍA No. 469-2025

CONTRATISTA: FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT No. 901.629.231-4

R/L: FANNY KATHERIN BARRERA CORREA

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002-2025, CUYO OBJETO ES LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ.

SUPERVISOR: MARLENY APONTE TORRES

SUBGERENTE DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ.

CUBARÁ - BOYACÁ 2025



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	9
1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	10
1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	10
2. ALCANCE DEL PROYECTO.....	11
2.1. Localización del contrato de obra No. 361-2025.....	11
2.2. Alcance general de la obra	12
3. ACTOS ADMINISTRATIVOS.....	20
4. GARANTÍAS DEL CONTRATO.....	20
4.1. Pólizas de legalización.....	21
4.2. Antecedentes y aspectos administrativos del contrato.	22
5. ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS	23
6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA	24
7. CONTROL SOCIAL	24
8. VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES.	25
8.1. Personal Administrativo.....	25
8.2. Personal operativo	26
8.3. Pagos salariales y liquidación del personal	27
9. BITÁCORA DIARIA DE OBRA.....	27
10. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	28
10.1. Señalización de la obra.....	28
10.2. Dotación del personal	29
10.3. Accidentalidad en la obra.....	31
11. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	31
12. ASPECTOS FINANCIEROS	34
12.1. Aspectos financieros	34
12.2. Modificaciones o adicionales al contrato.....	41



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



12.3.	Compensación de mayores y menores cantidades	41
12.4.	Avance físico de la obra	42
12.5.	Avance financiero de la obra.....	46
12.6.	Avance plazo contractual	53
13.	SITUACIONES ADVERSAS	55
14.	MATERIAL DE OBRA – BODEGA	56
15.	ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.....	57
1.	AREA EXTERIOR	57
2,00	CUBIERTAS Y DRENAJES.....	58
3,00	ADMINISTRACIÓN	63
4,00	ARCHIVO - ALMACEN	65
5,00	SALA DE AUTOPSIAS	71
6,00	HOSPITALIZACIÓN	73
16.	ASPECTOS FINANCIEROS	78
16.1.	Manejo del anticipo	78
17.	ASPECTOS AMBIENTALES	78
17.1.	Seguimiento a permisos y/o licencias ambientales.....	78
18.	ASPECTOS GENERALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA	79
18.1.	Alcance de la interventoría	79
18.2.	Interventoría técnica.....	80
18.3.	Interventoría administrativa	80
18.4.	Interventoría financiera	80
18.5.	Funciones de la interventoría.....	80
19.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	86
19.1.	Información general contrato de Interventoría.	86
20.	RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	87
20.1.	Pólizas legalización del contrato de Interventoría	87
21.	ACTOS ADMINISTRATIVOS.....	87



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

21.1.	Personal vinculado a la interventoría.....	88
21.2.	Equipos e implementos de oficina utilizados por la interventoría.	88
21.3.	Gastos operacionales	89
21.3.1.	Señalización de la Obra	89
21.3.2.	Alquiler de Oficina (incluye servicios básicos) Comisión topográfica.....	90
21.3.3.	Alquiler de equipos de cómputo, Papelería, insumos de oficina, etc.	90
22.	ASPECTOS TÉCNICOS	91
22.1.	Condiciones contractuales	91
22.2.	Balance financiero del contrato:	93
22.3.	Avance en tiempo:	94
CONCLUSIONES		95
ANEXOS		96

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



LISTA DE TABLAS

TABLA 1. PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE OBRA	12
TABLA 2. ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO DE OBRA NO. 361-2025	20
TABLA 3. GARANTÍAS CONTRACTUALES	21
TABLA 4. ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS DE OBRA	23
TABLA 5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 361-2025	24
TABLA 6. PERSONAL ADMINISTRATIVO VINCULADO AL CONTRATO DE OBRA NO. 361-2025 EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2025 ..	25
TABLA 7. ELEMENTOS ENTREGADOS	30
TABLA 8. SEÑALIZACIÓN EN OBRA	31
TABLA 9. CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA N° 361-2025	34
TABLA 10. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 361-2025	42
TABLA 11. RELACIÓN AVANCE FINANCIERO	46
TABLA 12. COMPONENTES DEL PROYECTO	79
TABLA 13. SUPERVISIÓN TÉCNICA	80
TABLA 14. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA	82
TABLA 15. SUPERVISIÓN FINANCIERA	85
TABLA 16. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	86
TABLA 17. PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTARÍA NO. 469-2025	87
TABLA 18. PÓLIZA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO ANEXO-1	87
TABLA 19. RELACIÓN PERSONAL CONTRATO DE CONSULTARÍA NO. 469-2025	88
TABLA 20. CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA	91
TABLA 21. BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE CONSULTARÍA NO. 469-2025	93



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

LISTA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1. UBICACIÓN DEL PROYECTO - GOOGLE EARTH.....	12
ILUSTRACIÓN 2. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	25
ILUSTRACIÓN 3. ANÁLISIS EJECUTADO VS PROGRAMADO	46
ILUSTRACIÓN 4. AVANCE FINANCIERO	53
ILUSTRACIÓN 5. AVANCE EN TIEMPO.....	54
ILUSTRACIÓN 6. RELACIÓN DE AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO DE OBRA No. 361-2025	54
ILUSTRACIÓN 7. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN EL PERÍODO	56
ILUSTRACIÓN 8. ACOPIO DE MATERIAL Y BODEGA DE OBRA.....	56
ILUSTRACIÓN 9. BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE CONSULTARÍA No. 469-2025	94
ILUSTRACIÓN 10. AVANCE EN EL TIEMPO DE INTERVENTORÍA	94

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

INTRODUCCIÓN

A continuación, el siguiente informe de interventoría en el cual se evidencia las actividades ejecutadas y cumplimiento de cada uno de los ítems pactados durante el desarrollo del contrato de obra No. 361-2025, festejado entre Hospital Especial de Cubará E.S.E y **CONSTRUINDUCIVIL SAS** representado legalmente por XIOMARA MANRIQUE, identificado con el NIT No. 901.375.684-5, cuyo objeto es **"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ"**, comprendidas entre el periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2025, del mismo modo se presenta toda la documentación correspondiente de las actividades realizadas por la empresa **FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS R/L: FANNY KATHERIN BARRERA CORREA**, NIT No. 901.629.231-4, cómo interventoría externa durante el desarrollo del contrato de Consultoría No. 469-2025 que tiene por objeto **"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ"**.

Así mismo se interviene activamente durante el desarrollo de las actividades del proyecto, evidenciando los aspectos administrativos, técnicos y financieros, diariamente ejecutados por el personal profesional encargado de obra, de esta manera se garantiza el cumplimiento de la correcta ejecución de los diferentes aspectos y el buen manejo de los recursos destinados al contrato de obra.

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA
CONTRATO No:	361-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ
CONTRATISTA:	CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L: XIOMARA MANRIQUE
NIT. No:	901.375.684-5
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$616.781.927,00)
PLAZO CONTRACTUAL:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-0570 DEL 07 DE JULIO DEL 2025
FECHA INICIO:	16 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR EXTERNO:	FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS R/L: FANNY KATHERIN BARRERA CORREA NIT. 901.629.231-4
SUPERVISOR:	MARLENY APONTE TORRES SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ
PERIODO DEL INFORME	
FECHA INFORME:	16 de octubre al 15 de noviembre del 2025



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S


NIT: 901.629.231-4

2. ALCANCE DEL PROYECTO

2.1. Localización del contrato de obra No. 361-2025

EL PROYECTO SE LOCALIZA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, ESPECÍFICAMENTE EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ UBICADO EN LA CALLE 3 No. 5-47 DEL BARRIO SAN RAFAEL.

CON LAS SIGUIENTES COORDENADAS: 7°00'03"N - 72°06'24"W

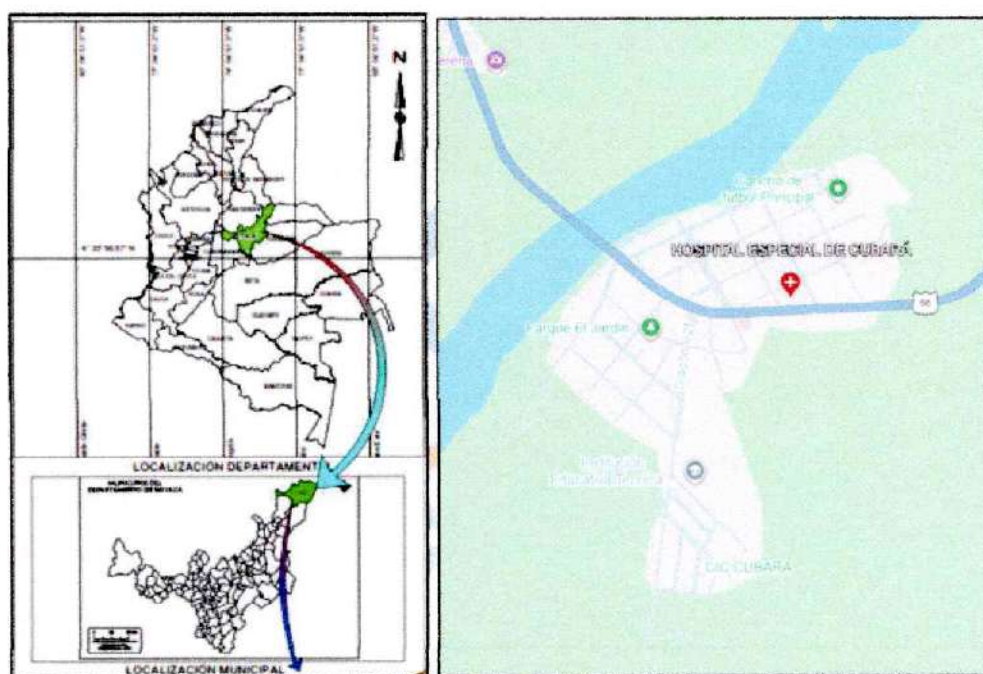

322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



Ilustración 1. Ubicación del proyecto - Google Earth

2.2. Alcance general de la obra

Mediante el Contrato de Obra No. 361-2025 se proyecta realizar la Adecuación Menor de la Infraestructura Física de la E.S.E. Hospital Especial de Cubará, conforme a las especificaciones técnicas, las condiciones contractuales y los lineamientos establecidos por la entidad contratante. El objetivo principal es garantizar la ejecución de una obra de alta calidad que responda a las necesidades institucionales y contribuya al bienestar de la comunidad del sector.

Las actividades contractuales para dar cumplimiento con el alcance del proyecto mediante el contrato de obra No. 361-2025 son las siguientes.

Tabla 1. Presupuesto del contrato de Obra

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	AREA EXTERIOR				TIPO:	OBRA PÚBLICA
1,01	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	1855,92	4%	\$ 7.640,85	\$ 14.748.038,59



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

1,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	1855,92	4%	\$ 17.576,11	\$ 33.924.648,23
1,03	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA CUADRADA DE 1"	M2	146,54		\$ 109.655,00	\$ 16.068.843,70
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 64.741.530,52
A						\$ 16.185.382,63
I						\$ 1.294.830,61
U						\$ 1.942.245,92
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
2	CUBIERTAS Y DRENAJES				TIPO:	OBRA PÚBLICA
2,01	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)	M2	857,50		\$ 7.643,47	\$ 6.554.275,53
2,02	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO	M2	857,50		\$ 94.265,60	\$ 80.832.752,00
2,03	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	450,00	4%	\$ 11.929,22	\$ 5.582.874,96
2,04	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	683,50	4%	\$ 8.791,65	\$ 6.249.456,49
2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	1133,50		\$ 119.304,46	\$ 135.231.605,41
2,06	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	ML	235,75		\$ 99.176,65	\$ 23.380.895,24
2,07	DESMONTE CANALES - BAJANTES.	ML	9,60	4%	\$ 5.809,30	\$ 58.000,05
2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	9,60	4%	\$ 117.117,01	\$ 1.169.296,23
2,09	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO	M2	473,32		\$ 14.761,83	\$ 6.987.069,38
2,10	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	2661,42	4%	\$ 3.338,02	\$ 9.239.228,12
2,11	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	3058,75	4%	\$ 225,00	\$ 715.747,50
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 276.001.200,91
A						\$ 69.000.300,23



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

					I	\$ 5.520.024,02
					U	\$ 8.280.036,03
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
3					TIPO:	OBRA PÚBLICA
3,01	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	2,80	4%	\$ 10.155,28	\$ 29.572,18
3,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	37,58	4%	\$ 17.576,11	\$ 686.930,62
3,03	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	477,26	4%	\$ 10.307,86	\$ 5.116.310,43
3,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	40,13	4%	\$ 20.004,61	\$ 834.896,40
3,05	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	56,11	4%	\$ 14.773,22	\$ 862.082,39
3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UNIDAD	8,00		\$ 38.115,49	\$ 304.923,92
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 7.834.715,94
					A	\$ 1.958.678,99
					I	\$ 156.694,32
					U	\$ 235.041,48
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
4	ARCHIVO - ALMACEN				TIPO:	OBRA PÚBLICA
4,01	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO.	M2	145,77	4%	\$ 11.929,22	\$ 1.808.479,30
4,02	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	4,53	4%	\$ 13.629,00	\$ 64.208,94
4,03	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO	M2	1,53	4%	\$ 33.374,71	\$ 53.105,84
4,04	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	32,34	4%	\$ 13.629,00	\$ 458.392,33
4,05	CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18	ML	138,60		\$ 49.390,38	\$ 6.845.506,67
4,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	145,77		\$ 119.304,46	\$ 17.391.011,13



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

4,07	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	ML	11,30		\$ 99.176,65	\$ 1.120.696,15
4,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	11,30	4%	\$ 117.117,01	\$ 1.376.359,10
4,09	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	32,00	4%	\$ 51.834,72	\$ 1.725.059,48
4,10	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	15,22	4%	\$ 238.795,70	\$ 3.779.849,38
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 18 (Incluye marco, bisagras y pintura)	M2	4,20		\$ 401.082,39	\$ 1.684.546,04
4,12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	29,90	4%	\$ 25.187,68	\$ 783.236,10
4,13	ESTUCO MUROS	M2	29,90	4%	\$ 10.155,28	\$ 315.788,59
4,14	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	113,70	4%	\$ 17.576,11	\$ 2.078.339,86
4,15	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	220,44	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.363.155,24
4,16	CIELO RASO EN PVC	M2	115,96		\$ 71.719,83	\$ 8.316.631,49
4,17	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	481,04	4%	\$ 225,00	\$ 112.563,36
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 50.276.929,00
					A	\$ 12.569.232,25
					I	\$ 1.005.538,58
					U	\$ 1.508.307,87
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
5					TIPO:	OBRA PÚBLICA
5,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	128,20	4%	\$ 10.307,86	\$ 1.374.326,36
5,02	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	9,00	4%	\$ 20.004,61	\$ 187.243,15



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

5.03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	49,50	4%	\$ 14.773,22	\$ 760.525,37
5.04	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	3,20	4%	\$ 10.155,28	\$ 33.796,77
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 2.355.891,65
					A	\$ 588.972,91
					I	\$ 47.117,83
					U	\$ 70.676,75
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
6	HOSPITALIZACION				TIPO:	OBRA PÚBLICA
6.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	432,72	4%	\$ 10.307,86	\$ 4.638.833,87
6.02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	156,52	4%	\$ 17.576,11	\$ 2.861.053,25
6.03	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	M2	213,35	4%	\$ 3.130,72	\$ 694.656,68
6.04	CIELO RASO EN PVC	M2	213,35		\$ 71.719,83	\$ 15.301.425,73
6.05	ESTUCO MUROS	M2	48,21	4%	\$ 10.155,28	\$ 509.169,49
6.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UND	21,00		\$ 38.115,49	\$ 800.425,29
6.07	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	126,10	4%	\$ 14.773,22	\$ 1.937.419,16
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 26.742.983,47
					A	\$ 6.685.745,87
					I	\$ 534.859,67
					U	\$ 802.289,50
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
7					TIPO:	OBRA PÚBLICA
7.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	119,09	4%	\$ 10.307,86	\$ 1.276.665,57
7.02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	108,76	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.988.040,83
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 3.264.706,40



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

					A	\$ 816.176,60
					I	\$ 65.294,13
					U	\$ 97.941,19
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
8					TIPO:	OBRA PÚBLICA
8.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	488,08	4%	\$ 10.307,86	\$ 5.232.302,72
8.02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UNIDAD	1,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 1.579.534,48
8.03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	6,00	4%	\$ 14.773,22	\$ 92.184,89
8.04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	8,00	4%	\$ 20.004,61	\$ 166.436,36
8.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UNIDAD	5,00		\$ 38.115,49	\$ 190.577,45
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 7.261.037,90
					A	\$ 1.815.259,48
					I	\$ 145.220,76
					U	\$ 217.831,14
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
9					TIPO:	OBRA PÚBLICA
9.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	435,57	4%	\$ 10.307,86	\$ 4.669.386,36
9.02	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	METRO CUADRADO	19,74	4%	\$ 13.629,00	\$ 279.797,92
9.03	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UNIDAD	10,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 15.795.344,76
9.04	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	15,60	4%	\$ 14.773,22	\$ 239.680,72
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 20.984.209,76
					A	\$ 5.246.052,44
					I	\$ 419.684,20
					U	\$ 629.526,29
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
10					TIPO:	OBRA PÚBLICA



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

10,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	81,61	4%	\$ 10.307,86	\$ 874.873,43
10,02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UNIDAD	1,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 1.579.534,48
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 2.454.407,91
					A	\$ 613.601,98
					I	\$ 49.088,16
					U	\$ 73.632,24
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
11					TIPO:	OBRA PÚBLICA
11,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	50,82	4%	\$ 10.307,86	\$ 544.799,26
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 544.799,26
					A	\$ 136.199,82
					I	\$ 10.895,99
					U	\$ 16.343,98
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
12					TIPO:	OBRA PÚBLICA
12,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	33,55	4%	\$ 10.307,86	\$ 359.661,85
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 359.661,85
					A	\$ 89.915,46
					I	\$ 7.193,24
					U	\$ 10.789,80
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
13					TIPO:	OBRA PÚBLICA
13,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	233,63	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.504.554,35
13,02	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	29,13	4%	\$ 10.155,28	\$ 307.656,24
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 2.812.210,59
					A	\$ 703.052,65
					I	\$ 56.244,21
					U	\$ 84.366,32
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

14					TIPO:	OBRA PÚBLICA
14,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	246,87	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.646.489,45
14,02	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	10,80	4%	\$ 10.155,28	\$ 114.064,10
14,03	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	58,31	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.065.857,49
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 3.826.411,04
A						\$ 956.602,76
I						\$ 76.528,22
U						\$ 114.792,33
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
15					TIPO:	OBRA PÚBLICA
15,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	211,31	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.265.280,05
15,02	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	19,70	4%	\$ 14.773,22	\$ 302.673,73
15,03	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	45,90	4%	\$ 16.684,41	\$ 796.447,00
15,04	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	12,50	4%	\$ 10.155,28	\$ 132.018,64
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 3.496.419,42
A						\$ 874.104,86
I						\$ 69.928,39
U						\$ 104.892,58
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
16					TIPO:	OBRA PÚBLICA
16,01	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	78,11	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.427.784,75
16,02	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	5,94	4%	\$ 10.155,28	\$ 62.735,26
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 1.490.520,01
A						\$ 372.630,00
I						\$ 29.810,40
U						\$ 44.715,60



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

INFORMACIÓN CONSOLIDADA		
COSTO DIRECTO	\$	474.447.836,00
COSTO INDIRECTO	\$	142.334.291,00
TOTAL	\$	616.781.927,00

3. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

Tabla 2. Actos administrativos contrato de obra No. 361-2025

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
16/10/2025	Acta de inicio	Iniciación del contrato de obra No. 361-2025	SUPERVISIÓN: MARLENY APONTE TORRES Subgerente Administrativa y Financiera E.S.E. Hospital Especial de Cúbará CONTRATISTA: CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA NIT. 901.375.684-5
17/10/2025	Acta de socialización	Socialización del contrato de obra No. 361-2025	Asistentes: representantes de HOSPITAL ESPECIAL DE CUBRA E.S.E por el GERENTE GIOVANNI QUINTERO TELLEZ, presidentes de las comunidades beneficiadas e involucradas, contratista de obra, interventoría, supervisión y comunidad beneficiada.

4. GARANTÍAS DEL CONTRATO

De mutuo acuerdo con las garantías exigidas por la ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA en el contrato de obra N° 361-2025, se suscribe con la compañía de seguro ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA DECIMA PRIMERA del contrato así:



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

Para la ejecución del presente contrato se presenta póliza Garantía Única Cumplimiento y Responsabilidad Civil de la compañía de seguros "ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA", a favor de la ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA, que a continuación se relacionan:

4.1. Pólizas de legalización

Póliza presentada de legalización del Contrato de Obra No. 361-2025:

Tabla 3. Garantías Contractuales.

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° 625-47 994000003468 ANEXO: 0			
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO
CUMPLIMIENTO	08/09/2025	13/03/2026	\$ 61.678.192,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	08/09/2025	13/11/2028	\$ 123.356.385,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	24/11/2025	24/11/2025	\$ 185.034.578,40
CALIDAD DEL SERVICIO	08/09/2025	13/05/2026	\$123,356,385.60

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N°. 625 74 994000001318 ANEXO: 0			
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	08/09/2025	24/03/2026	\$ 185.034.579,00

- Pólizas actualizadas, con inclusión y aclaración del beneficiario adicional, expedidas el 16 de octubre de 2025 por la Aseguradora Solidaria de Colombia, a favor de la ESE Hospital Especial de Cubará y del Ministerio de Salud y Protección Social.:
- Anexo No. 01:

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° 625 47 994000003468 ANEXO: 1			
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO
CUMPLIMIENTO	08/09/2025	13/03/2026	\$ 61.678.192,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	08/09/2025	13/11/2028	\$ 123.356.385,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	24/11/2025	24/11/2025	\$ 185.034.578,40
CALIDAD DEL SERVICIO	08/09/2025	13/05/2026	\$123,356,385.60



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N°. 625 74 994000001318 ANEXO: 1			
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL	CIVIL 08/09/2025	24/03/2026	\$ 185.034.579,00

- Pólizas actualizadas de acuerdo con el Acta de Inicio.
- Anexo No. 02:

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° 625 – 47 - 994000003468 ANEXO: 2			
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO
CUMPLIMIENTO	16/10/2025	30/04/2026	\$ 61.678.192,80
CALIDAD DEL SERVICIO	16/10/2025	30/06/2026	\$ 123.356.385,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/10/2025	30/12/2028	\$123.356.385,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/12/2025	30/12/2028	\$ 185.034.578,40

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N°. 625 74 994000001318 ANEXO: 2			
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO
RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES)	16/10/2025	30/04/2026	\$ 185.034.579,00

4.2. Antecedentes y aspectos administrativos del contrato.

- Este contrato de obra fue emanado del proceso de Licitación de Obra pública No. 361-2025, donde por medio de la Resolución No. AD-083 de 2025 del 05 de septiembre del 2025, fue adjudicado al proponente: CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L XIOMARA MANRIQUE, por valor de SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$ 616.781.927,00).
- El 08 de septiembre de 2025 se firma el contrato de Obra No. 361-2025 entre el representante legal del Hospital Especial de Cubará GIOVANNI QUINTERO TELLEZ y la firma contratista CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. representada por GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA.
- El 16 de octubre de 2025 se firma el Acta de inicio del contrato de Obra No. 361-2025, una vez las garantías presentadas fueron aprobadas por la ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



- El 17 de octubre de 2025 se realiza la socialización del contrato de Obra en instalaciones del HOPITAL ESPECIAL DE CUBARA E.S.E, donde se invitó los presidentes de las comunidades beneficiadas e involucradas con el proyecto, contratista de obra, interventoría, supervisión y comunidad beneficiada, en donde se expuso el alcance de la ejecución del contrato, la metodología de ejecución y el presupuesto destinado para el desarrollo de las actividades contempladas, de igual forma se realizó la presentación del personal profesional del contratista, contratación del personal de la zona, maquinaria a emplear, los inconvenientes posibles para el desarrollo de las actividades, además de socializarse el plan de contingencias por parte de la supervisión.

5. ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS

Durante la ejecución del contrato de obra durante el periodo del presente informe, se han suscrito las siguientes actas de comités técnicos desarrollados entre las partes.

Tabla 4. Actas de Comités Técnicos de Obra

FECHA	MOTIVO	ASISTENTES
11/11/2025	Ejecutar adecuación eléctrica completa y cableado normativo en salón de archivo.	SUPERVISIÓN: MARLENY APONTE TORRES
	Continuar trabajos en área de consulta externa (desmante e instalación de cubierta) durante el fin de semana.	Subgerente Administrativa y Financiera
	Continuar intervención en sala de administración (cubierta, pintura y ajustes internos).	E.S.E. Hospital Especial de Cubará
	Monitorear los frentes de trabajo y emitir conceptos técnicos necesarios para asegurar cumplimiento de especificaciones.	CONTRATISTA: CONSTRUINDUCIVIL SAS
	Coordinar conjuntamente el ingreso para trabajos de adecuación eléctrica.	R/L GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA NIT. 901.375.684-5 INTERVENTORIA: FRASCO SUMINISTRO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS SAS R/L FANNY KATHERIN BARRERA CORREA NIT. 901.629.231-4 ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBRARA: GERENTE GIOVANNI QUINTERO TELLEZ



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

En el periodo de ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se ha enviado y recibido la siguiente correspondencia entre la interventoría, el contratista y la ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ.

Tabla 5. Relación de correspondencia enviada por la Interventoría del Contrato de Obra No. 361-2025.

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCIÓN
24/10/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L: Xiomara Manrique ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ	Asunto: Solicitud de entrega de documentos iniciales previos al inicio de actividades de obra
10/11/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L: Xiomara Manrique ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ	Asunto: Solicitud formal de Comité de Obra No 1 - Contrato de Obra No. 361-2025.

Durante el presente periodo la Interventoría no recibió correspondencia relacionada con el desarrollo del contrato, por lo cual no se registran comunicaciones formales.

7. CONTROL SOCIAL

El día 17 de octubre de 2025, a las 9:00 a.m., se llevó a cabo la socialización del proyecto, a la cual asistieron representantes del Hospital Especial de Cubará, los presidentes de las comunidades beneficiadas e involucradas, el contratista de obra, la interventoría, la supervisión y miembros de la comunidad.

Durante la jornada se presentó el alcance del contrato, el presupuesto asignado para la ejecución de las actividades previstas y el equipo profesional del contratista. Asimismo, se socializó el proceso de contratación de personal local, el equipo que será utilizado, los posibles inconvenientes durante el desarrollo de las obras.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso

**Ilustración 2. Socialización del Proyecto**

8. VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES.

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La interventoría verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

8.1. Personal Administrativo

El personal profesional y administrativo que labora en la obra para el periodo del presente informe es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.

A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses ejecutados:

Tabla 6. Personal administrativo vinculado al contrato de obra No. 361-2025 en el mes de Octubre del 2025

	NOMBRES	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SUELDO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF
1	VIANNEY KARINA	1.094.275.515	RESIDENTE DE OBRA	\$ 3.000.000,00	NUEVA EPS	COLPENSION	POSITIVA	COMFABOY
2	ROSA DANIELA SANTANDER APONTE	1.049.395.519	PROFESIONAL HSEQ	\$ 2.500.000,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
3	KARINA BARRERA AGUABLANCA	1.115.733.517	PROFESIONAL SOCIAL	\$ 2.500.000,00	COOSALUD	COLPENSION	POSITIVA	COMFABOY

**322 7230347****frascingsas@gmail.com****Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso**



8.2. Personal operativo

El contratista utilizó mano de obra no calificada de la región con lo cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo con los requerimientos técnicos de la obra.

A continuación, se relaciona el personal operativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

Tabla 7. Personal operativo vinculado al contrato de obra No. 361-2025 en el mes de Octubre del 2025

MES: OCTUBRE DEL 2025								
	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SALARIO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF
1	JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA	96.167.92.9	OFICIAL DE OBRA	\$ 3.582.570,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
2	BLANCA ISABEL SANTANFÉ ESTEVEZ	1.049.392.734	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
3	CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA	1.094.268.169	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY
4	CARLOS ALBERTO SANTANFÉ CASTELLANOS	1.049.396.199	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
5	FLORO IVAN CARRILLO MORA	1.094.392.738	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
6	HENRY GUTIERREZ BATECA	96.125.112	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
7	RIQUELME CASTELLANOS ROJAS	1.049.393.798	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
8	WILBER ALEXANDER MORENO TORRES	1.049.392.860	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.256.000,00	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY
9	JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO	88.034.175	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY
10	JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS	1.094.280.998	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
11	LUIS FRANCISCO TARAZONA	9.467.070	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY
12	OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL	1.049.394.907	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
13	MARLENIS CAROLINA	1.049.396.351	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

	FERNANDEZ OVIDEO							
14	LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO	4439097	MAESTRO DE OBRA	\$ 3.582.570,00	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY

Por parte de la interventoría se da cumplimiento a las obligaciones que tiene el contratista donde se verifica el listado del personal vinculado con las planillas de los diferentes pagos.

Donde a continuación se da verificación de cada una de ellas

Tabla 11. Seguimiento a los compromisos laborales del contratista- del Contrato de Obra No. 361-2025

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	MES 1		MES 2		
	SI	NO	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X				Cumple
El contratista ha entregado a la supervisión copia de las afiliaciones del personal.	X				Cumple
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X				Cumple
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X				Cumple
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	X				Cumple
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X				Cumple

8.3. Pagos salariales y liquidación del personal

El contratista realizó oportunamente los pagos salariales de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, de acuerdo con el contrato laboral para los meses que se relacionan en el presente informe.

9. BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Se da inicio a la realización de la bitácora de obra el día 16 de octubre del 2025, en la cual se redactan los eventos que se realizaron diariamente durante el proceso de ejecución del contrato de obra, el responsable de su diligenciamiento diario es la ingeniera residente de obra en conjunto con el



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ingeniero residente de interventoría, en esta bitácora fue aprobada por los profesionales de la obra y los profesionales de la interventoría.

En el **ANEXO 1** se presenta copia de la Bitácora Diaria de Obra para el periodo del presente informe.

10. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

En los lugares específicos de la obra se instalaron las respectivas señalizaciones para delimitar y demarcar las áreas de trabajo con el fin de evitar accidentes laborales al personal que labora en la obra y a terceros, definiendo adecuadamente los lugares a demarcar los cuales permiten organizar las diferentes actividades de la obra de acuerdo con el uso que se le dará. De igual manera el contratista de obra realizó charlas para fomentar la seguridad, integridad física, la salud y la disminución de riesgos en el lugar de trabajo.

Así mismo se señalizó y aisló la zona intervenida por el contrato con el fin de aislar la zona donde se ejecuta la construcción, para evitar la entrada de personas ajenas a la obra, darle un buen aspecto y evitar posibles accidentes a personas externas.

10.1. Señalización de la obra.

En el transcurso del periodo de ejecución de los trabajos, el contratista implementó adecuadamente la señalización requerida para el aislamiento de las zonas de trabajo, así como la instalación de las señales informativas y preventivas y vallas necesarias en la ejecución de la obra.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4



NOTA: Diariamente la interventoría inspecciona que dichas señales se encontraran debidamente instaladas en todas las zonas de trabajo de la obra y en buen estado.

10.2. Dotación del personal

El grupo contratista llevó a cabo la entrega de los elementos de protección personal (EPP) al personal que labora en la obra, requeridos para el desarrollo de las labores diarias, haciendo entrega de los siguientes elementos.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

Ilustración 3 Dotación de elementos de protección personal (EPP) entregados a trabajadores vinculados al -Contrato de Obra N°361-2025



Tabla 7. Elementos entregados

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Ingenieros, Maestros, Oficiales, ayudantes, técnica hs
GUANTES REFORZADOS	X		X			Oficiales, ayudantes.
BOTAS	X		X			Ingenieros, Maestros, Oficiales, ayudantes.
GAFAS DE SEGURIDAD	X		X			Oficiales, ayudantes.
CAMISA/PANTALÓN	X		X			Oficiales, ayudantes.
TAPA OÍDOS	X		X			Ingenieros, Maestros, Oficiales, ayudantes, Técnica hs



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



La interventoría verificó día a día el correcto uso de los elementos de protección por parte del personal en obra, haciendo la respectiva exigencia a los trabajadores.

Tabla 8. Señalización en obra

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN	INSTALADOS		ESTADO			LOCALIZACIÓN EN OBRA
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CINTA PELIGRO	X		X			EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL SITIO DE OBRA
AVISOS PREVENTIVOS	X		X			EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL SITIO DE OBRA
AVISOS INFORMATIVOS	X		X			EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL SITIO DE OBRA
AVISOS REGLAMENTARIOS	X		X			EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL SITIO DE OBRA
DELINEADORES	X		X			EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL SITIO DE OBRA
CANECAS PLÁSTICAS O METÁLICAS	X		X			PUNTO ECOLOGICO

10.3. Accidentalidad en la obra

La Interventoría estuvo atenta al registro y atención de los accidentes laborales presentados en obra con el personal vinculado por el contratista. Para el periodo del presente informe no se presenta un accidente laboral en la ejecución del contrato No. 361-2025

11. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

La interventoría verificó que el contratista utilizara en la ejecución de las actividades del contrato la maquinaria y equipo requerido según los APU y especificaciones técnicas del proyecto, así mismo constató el estado físico y de operación de la maquinaria y equipo.

La maquinaria y equipo que el contratista utilizó durante el periodo de ejecución del contrato fue la siguiente:



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

Tipo	Marca	Estado	Regularidad del mantenimiento	Idoneidad de operarios
COMPRESOR	COMPRESO RES JS	Bueno	Mensual	Idóneo
				

Tipo	Marca	Estado	Regularidad del mantenimiento	Idoneidad de operarios
HIDROLAVADORA	STIHL	Bueno	Mensual	Idóneo
				

Tipo	Marca	Estado	Regularidad del mantenimiento	Idoneidad de operarios
------	-------	--------	-------------------------------	------------------------



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

Volqueta	Kodiak	Bueno	Mensual	Idóneo
				

Tipo	Marca	Estado	Regularidad del mantenimiento	Idoneidad de operarios
Retroexcavadora sobre ruedas	Caterpillar	Bueno	Mensual	Idóneo
				

Así mismo la interventoría superviso que la maquinaria y equipos propios y/o alquilados por el contratista estuvieran al día con los seguros y que se haya realizado la respectiva afiliación de los operarios al sistema de seguridad social y ARL.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso

**12. ASPECTOS FINANCIEROS****12.1. Aspectos financieros**

El contrato de obra pública N° 361-2025 cuyo objeto es "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ", el día dieciséis (16) de octubre del 2025 se firma el contrato de obra por la empresa CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L XIOMARA MANRIQUE con Nit. 901.375.684-5 por un valor de SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$616.781.927,00) M/CTE., a continuación, se presenta el desglose del presupuesto contratado:

Tabla 9. Condiciones contractuales contrato de obra N° 361-2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	AREA EXTERIOR				TIPO:	OBRA PÚBLICA
1,01	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	1855,92	4%	\$ 7.640,85	\$ 14.748.038,59
1,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	1855,92	4%	\$ 17.576,11	\$ 33.924.648,23
1,03	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA CUADRADA DE 1"	M2	146,54		\$ 109.655,00	\$ 16.068.843,70
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 64.741.530,52
					A	\$ 16.185.382,63
					I	\$ 1.294.030,01
					U	\$ 1.942.245,92
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
2	CUBIERTAS Y DRENAJES				TIPO:	OBRA PÚBLICA
2,01	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)	M2	857,50		\$ 7.643,47	\$ 6.554.275,53
2,02	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO	M2	857,50		\$ 94.265,60	\$ 80.832.752,00
2,03	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	450,00	4%	\$ 11.929,22	\$ 5.582.874,96
2,04	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	683,50	4%	\$ 8.791,65	\$ 6.249.456,49



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	1133,50		\$ 119.304,46	\$ 135.231.605,41
2,06	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	ML	235,75		\$ 99.176,65	\$ 23.380.895,24
2,07	DESMONTE CANALES - BAJANTES	ML	9,60	4%	\$ 5.809,30	\$ 58.000,05
2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	9,60	4%	\$ 117.117,01	\$ 1.169.296,23
2,09	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO	M2	473,32		\$ 14.761,83	\$ 6.987.069,38
2,10	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	2661,42	4%	\$ 3.338,02	\$ 9.239.228,12
2,11	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	3058,75	4%	\$ 225,00	\$ 715.747,50
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 276.001.200,91
A						\$ 69.000.300,23
I						\$ 5.520.024,02
U						\$ 8.280.036,03
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
3					TIPO:	OBRA PÚBLICA
3,01	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	2,80	4%	\$ 10.155,28	\$ 29.572,18
3,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	37,58	4%	\$ 17.576,11	\$ 686.930,62
3,03	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	477,26	4%	\$ 10.307,86	\$ 5.116.310,43
3,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	40,13	4%	\$ 20.004,61	\$ 834.896,40
3,05	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	56,11	4%	\$ 14.773,22	\$ 862.082,39
3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UNIDAD	8,00		\$ 38.115,49	\$ 304.923,92
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 7.834.715,94
A						\$ 1.958.678,99



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

					I	\$ 156.694,32
					U	\$ 235.041,48
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
4	ARCHIVO - ALMACEN				TIPO:	OBRA PÚBLICA
4,01	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO.	M2	145,77	4%	\$ 11.929,22	\$ 1.808.479,30
4,02	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	4,53	4%	\$ 13.629,00	\$ 64.208,94
4,03	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO	M2	1,53	4%	\$ 33.374,71	\$ 53.105,84
4,04	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	32,34	4%	\$ 13.629,00	\$ 458.392,33
4,05	CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18	ML	138,60		\$ 49.390,38	\$ 6.845.506,67
4,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	145,77		\$ 119.304,46	\$ 17.391.011,13
4,07	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	ML	11,30		\$ 99.176,65	\$ 1.120.696,15
4,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	11,30	4%	\$ 117.117,01	\$ 1.376.359,10
4,09	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	32,00	4%	\$ 51.834,72	\$ 1.725.059,48
4,10	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	15,22	4%	\$ 238.795,70	\$ 3.779.849,38
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 18 (Incluye marco, bisagras y pintura)	M2	4,20		\$ 401.082,39	\$ 1.684.546,04
4,12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	29,90	4%	\$ 25.187,68	\$ 783.236,10
4,13	ESTUCO MUROS	M2	29,90	4%	\$ 10.155,28	\$ 315.788,59



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

4.14	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	113,70	4%	\$ 17.576,11	\$ 2.078.339,86
4.15	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	220,44	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.363.155,24
4.16	CIELO RASO EN PVC	M2	115,96		\$ 71.719,83	\$ 8.316.631,49
4.17	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	481,04	4%	\$ 225,00	\$ 112.563,36
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 50.276.929,00
A						\$ 12.569.232,25
I						\$ 1.005.538,58
U						\$ 1.508.307,87
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
5					TIPO:	OBRA PÚBLICA
5.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	128,20	4%	\$ 10.307,86	\$ 1.374.326,36
5.02	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	9,00	4%	\$ 20.004,61	\$ 187.243,15
5.03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	49,50	4%	\$ 14.773,22	\$ 760.525,37
5.04	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	3,20	4%	\$ 10.155,28	\$ 33.796,77
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 2.355.891,65
A						\$ 588.972,91
I						\$ 47.117,83
U						\$ 70.676,75
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
6	HOSPITALIZACION				TIPO:	OBRA PÚBLICA
6.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	432,72	4%	\$ 10.307,86	\$ 4.638.833,87
6.02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	156,52	4%	\$ 17.576,11	\$ 2.861.053,25
6.03	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	M2	213,35	4%	\$ 3.130,72	\$ 694.656,68
6.04	CIELO RASO EN PVC	M2	213,35		\$ 71.719,83	\$ 15.301.425,73



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

6,05	ESTUCO MUROS	M2	48,21	4%	\$ 10.155,28	\$ 509.169,49
6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UND	21,00		\$ 38.115,49	\$ 800.425,29
6,07	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	126,10	4%	\$ 14.773,22	\$ 1.937.419,16
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 26.742.983,47
					A	\$ 6.685.745,87
					I	\$ 534.859,67
					U	\$ 802.289,50
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
7					TIPO:	OBRA PÚBLICA
7,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	119,09	4%	\$ 10.307,86	\$ 1.276.665,57
7,02	PINTURA FACHADA EN VINOLO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	108,76	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.988.040,83
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 3.264.706,40
					A	\$ 816.176,60
					I	\$ 65.294,13
					U	\$ 97.941,19
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
8					TIPO:	OBRA PÚBLICA
8,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	488,08	4%	\$ 10.307,86	\$ 5.232.302,72
8,02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UNIDAD	1,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 1.579.534,48
8,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	6,00	4%	\$ 14.773,22	\$ 92.184,89
8,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	8,00	4%	\$ 20.004,61	\$ 166.438,36
8,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UNIDAD	5,00		\$ 38.115,49	\$ 190.577,45
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 7.261.037,90
					A	\$ 1.815.259,48



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

					I	\$ 145.220,76
					U	\$ 217.831,14
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
9					TIPO:	OBRA PÚBLICA
9.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	435,57	4%	\$ 10.307,86	\$ 4.669.386,36
9.02	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	METRO CUADRADO	19,74	4%	\$ 13.629,00	\$ 279.797,92
9.03	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UNIDAD	10,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 15.795.344,76
9.04	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	15,60	4%	\$ 14.773,22	\$ 239.680,72
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 20.984.209,76
					A	\$ 5.246.052,44
					I	\$ 419.684,20
					U	\$ 629.526,29
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
10					TIPO:	OBRA PÚBLICA
10.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	81,61	4%	\$ 10.307,86	\$ 874.873,43
10.02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UNIDAD	1,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 1.579.534,48
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 2.454.407,91
					A	\$ 613.601,98
					I	\$ 49.088,16
					U	\$ 73.632,24
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
11					TIPO:	OBRA PÚBLICA
11.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	50,82	4%	\$ 10.307,86	\$ 544.799,26
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 544.799,26
					A	\$ 136.199,82
					I	\$ 10.895,99
					U	\$ 16.343,98
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

12					TIPO:	OBRA PÚBLICA
12,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	33,55	4%	\$ 10.307,86	\$ 359.661,85
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 359.661,85
A						\$ 89.915,46
I						\$ 7.193,24
U						\$ 10.789,86
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
13					TIPO:	OBRA PÚBLICA
13,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	233,63	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.504.554,35
13,02	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	29,13	4%	\$ 10.155,28	\$ 307.656,24
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 2.812.210,59
A						\$ 703.052,65
I						\$ 56.244,21
U						\$ 84.366,32
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
14					TIPO:	OBRA PÚBLICA
14,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	246,87	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.646.489,45
14,02	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	10,80	4%	\$ 10.155,28	\$ 114.064,10
14,03	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	58,31	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.065.857,49
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 3.826.411,04
A						\$ 956.602,76
I						\$ 76.528,22
U						\$ 114.792,33
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
15					TIPO:	OBRA PÚBLICA
15,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	211,31	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.265.280,05
15,02	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	19,70	4%	\$ 14.773,22	\$ 302.673,73



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

15.03	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	45,90	4%	\$ 16.684,41	\$ 796.447,00
15.04	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	12,50	4%	\$ 10.155,28	\$ 132.018,64
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 3.496.419,42
A						\$ 874.104,86
I						\$ 69.928,39
U						\$ 104.892,58
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
16					TIPO:	OBRA PÚBLICA
16.01	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	78,11	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.427.784,75
16.02	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	5,94	4%	\$ 10.155,28	\$ 62.735,26
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 1.490.520,01
A						\$ 372.630,00
I						\$ 29.810,40
U						\$ 44.715,60
INFORMACIÓN CONSOLIDADA						
COSTO DIRECTO			\$	474.447.636,00		
COSTO INDIRECTO			\$	142.334.291,00		
TOTAL			\$	616.781.927,00		

12.2. Modificaciones o adicionales al contrato

A la fecha de corte del presente informe no se le realizaron modificaciones o adiciones al contrato de obra Pública No. 361-2025

12.3. Compensación de mayores y menores cantidades

A la fecha de corte del presente informe no se le realizaron modificaciones o adiciones al contrato de obra Pública No. 361-2025.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

12.4. Avance físico de la obra

Tabla 10. Avance físico del contrato de obra No. 361-2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
1	AREA EXTERIOR				
1,01	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	1855,92	1855,92	100,00%
1,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	1855,92	0,00	0,00%
1,03	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA CUADRADA DE 1"	M2	146,54	0,00	0,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
2	CUBIERTAS Y DRENAJES				
2,01	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)	M2	857,50	857,50	100,00%
2,02	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO	M2	857,50	169,62	19,78%
2,03	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO.	M2	450,00	135,00	30,00%
2,04	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	683,50	559,60	81,87%
2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	1133,50	655,00	57,79%
2,06	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	ML	235,75	126,15	53,51%
2,07	DESMONTE CANALES - BAJANTES.	ML	9,60	0,00	0,00%
2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	9,60	0,00	0,00%
2,09	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO	M2	473,32	388,12	82,00%
2,10	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	2661,42	415,92	15,63%
2,11	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	3058,75	1382,00	45,18%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
3					
3,01	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	2,80	2,80	100,00%
3,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	37,58	0,00	0,00%
3,03	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	477,26	477,26	100,00%
3,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	40,13	40,13	100,00%
3,05	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	56,11	56,11	100,00%
3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UNIDAD	8,00	0,00	0,00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
4	ARCHIVO - ALMACEN				
4,01	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO.	M2	145,77	145,77	100,00%
4,02	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	4,53	4,53	100,00%
4,03	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO	M2	1,53	1,53	100,00%
4,04	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	32,34	32,34	100,00%
4,05	CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18	ML	138,60	138,60	100,00%
4,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	145,77	145,77	100,00%
4,07	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	ML	11,30	11,30	100,00%
4,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	11,30	0,00	0,00%
4,09	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	32,00	32,00	100,00%
4,10	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	15,22	0,00	0,00%
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 18 (Incluye marco, bisagras y pintura)	M2	4,20	0,00	0,00%
4,12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	29,90	0,00	0,00%
4,13	ESTUCO MUROS	M2	29,90	0,00	0,00%
4,14	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	113,70	0,00	0,00%
4,15	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	220,44	0,00	0,00%
4,16	CIELO RASO EN PVC	M2	115,96	0,00	0,00%
4,17	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	481,04	481,04	100,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
5	HOSPITALIZACION				
5,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	128,20	128,20	100,00%
5,02	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	9,00	9,00	100,00%
5,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	49,50	49,50	100,00%
5,04	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	3,20	3,20	100,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
6	HOSPITALIZACION				
6,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	432,72	432,72	100,00%
6,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	156,52	156,52	100,00%
6,03	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	M2	213,35	213,35	100,00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

6,04	CIELO RASO EN PVC	M2	213,35	213,35	100,00%
6,05	ESTUCO MUROS	M2	48,21	48,21	100,00%
6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UND	21,00	21,00	100,00%
6,07	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	126,10	126,10	100,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
7					
7,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	119,09	0,00	0,00%
7,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	108,76	0,00	0,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
8					
8,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	488,08	0,00	0,00%
8,02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UNIDAD	1,00	0,00	0,00%
8,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	6,00	0,00	0,00%
8,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	8,00	0,00	0,00%
8,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UNIDAD	5,00	0,00	0,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
9					
9,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	435,57	0,00	0,00%
9,02	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	METRO CUADRADO	19,74	0,00	0,00%
9,03	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UNIDAD	10,00	0,00	0,00%
9,04	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	15,60	0,00	0,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
10					
10,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	81,61	0,00	0,00%
10,02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UNIDAD	1,00	0,00	0,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
11					
11,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	50,82	0,00	0,00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
12					
12,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	33,55	0,00	0,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
13					
13,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	233,63	0,00	0,00%
13,02	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	29,13	0,00	0,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
14					
14,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	246,87	0,00	0,00%
14,02	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	10,80	0,00	0,00%
14,03	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	58,31	0,00	0,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
15					
15,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	211,31	0,00	0,00%
15,02	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	19,70	0,00	0,00%
15,03	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	45,90	0,00	0,00%
15,04	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	12,50	0,00	0,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
16					
16,01	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	78,11	0,00	0,00%
16,02	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	5,94	0,00	0,00%
TOTAL DE AVANCE FISICO EJECUTADO DE OBRA					40,35%

La anterior tabla ilustra las cantidades ejecutadas respecto a las contratadas durante el total de días de ejecución, teniendo un avance físico total de 40,35%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

De acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas a corte del presente informe, se presenta un avance de ejecución físico del 40,35%, de lo cual se realizó la ejecución total de las actividades establecidas en la minuta del contrato de obra No. 361-2025

Ilustración 3. análisis ejecutado vs programado



12.5. Avance financiero de la obra

A continuación, se presenta el avance financiero del contrato de obra pública N° 361-2025 cuyo objeto es "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ", a la fecha del 16 de octubre del 2025 al 15 de noviembre del 2025.

Tabla 11. Relación avance financiero

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
1	AREA EXTERIOR					TIPO:	OBRA PÚBLICA		
1,01	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	Precios Gober.	M2	1855,92	4%	\$ 7.640,85	\$ 14.748.038,59	1855,92	\$ 14.748.038,59



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCINO S.A.S

NIT: 901.629.231-4

1,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Precios Gober.	M2	1855,92	4%	\$ 17.576,11	\$ 33.924.648,23	0,00	\$ -
1,03	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA CUADRADA DE 1"	Cotización	M2	146,54		\$ 109.655,00	\$ 16.068.843,70	0,00	\$ -

COSTO DIRECTO GRUPO
\$ 64.741.530,52 \$ 14.748.038,59
A \$ 16.185.382,63
I \$ 1.294.830,81
U \$ 1.942.245,92

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
CUBIERTAS Y DRENAJES						TIPO:	OBRA PÚBLICA		
1,01	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)	Cotización	M2	857,50		\$ 7.643,47	\$ 6.554.275,53	857,50	\$ 6.554.275,53
2,02	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL EN CONCRETO	Cotización	M2	857,50		\$ 94.265,60	\$ 80.832.752,00	169,62	\$ 15.989.331,07
2,03	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	Precios Gober.	M2	450,00	4%	\$ 11.929,22	\$ 5.582.874,96	135,00	\$ 1.674.962,49
2,04	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	Precios Gober.	M2	683,50	4%	\$ 8.791,65	\$ 6.249.456,49	559,60	\$ 5.116.599,63
2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	Cotización	M2	1133,50		\$ 119.304,46	\$ 135.231.605,41	655,00	\$ 78.144.421,30
2,06	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	Cotización	ML	235,75		\$ 99.176,65	\$ 23.380.895,24	126,15	\$ 12.511.134,40
2,07	DESMONTE CANALES - BAJANTES	Precios Gober.	ML	9,60	4%	\$ 5.809,30	\$ 56.000,05	0,00	\$ -
2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	Precios Gober.	ML	9,60	4%	\$ 117.117,01	\$ 1.169.298,23	0,00	\$ -
2,09	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO	Cotización	M2	473,32		\$ 14.761,83	\$ 6.967.069,38	388,12	\$ 5.729.361,46
2,10	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	Precios Gober.	KG	2661,42	4%	\$ 3.338,02	\$ 9.239.228,12	415,92	\$ 1.443.883,25
2,11	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	Precios Gober.	KG	3058,75	4%	\$ 225,00	\$ 715.747,50	1382,00	\$ 323.388,00

COSTO DIRECTO GRUPO
\$ 276.001.200,91 \$ 127.487.257,13
A \$ 69.000.300,23
I \$ 5.520.024,02
U \$ 8.280.036,03

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
3							TIPO:	OBRA PÚBLICA	
3,01	ESTUCO MUROS	Precios Gober.	METRO CUADRADO	2,80	4%	\$ 10.155,28	\$ 29.572,18	2,80	\$ 29.572,18
3,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Precios Gober.	METRO CUADRADO	37,58	4%	\$ 17.576,11	\$ 688.930,62	0,00	\$ -
3,03	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gober.	METRO CUADRADO	477,26	4%	\$ 10.307,86	\$ 5.116.310,43	477,26	\$ 5.116.310,43
3,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Precios Gober.	METRO CUADRADO	40,13	4%	\$ 20.004,61	\$ 834.896,40	40,13	\$ 834.896,40



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

3,05	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	Precios Gober.	METRO LINEAL	56,11	4%	\$ 14.773,22	\$ 862.082,39	56,11	\$ 862.082,39
3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	Cotización	UNIDAD	8,00		\$ 38.115,49	\$ 304.923,92	0,00	\$ -

COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 7.834.715,94	\$ 6.842.861,40
A	\$ 1.958.678,99	
I	\$ 156.594,32	
U	\$ 235.041,48	

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
4	ARCHIVO - ALMACEN					TIPO:	OBRA PÚBLICA		
4,01	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO	Precios Gober.	M2	145,77	4%	\$ 11.929,22	\$ 1.808.479,30	145,77	\$ 1.808.479,30
4,02	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	Precios Gober.	M2	4,53	4%	\$ 13.629,00	\$ 64.208,94	4,53	\$ 64.208,94
4,03	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO	Precios Gober.	M2	1,53	4%	\$ 33.374,71	\$ 53.105,84	1,53	\$ 53.105,84
4,04	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	Precios Gober.	M2	32,34	4%	\$ 13.629,00	\$ 458.392,33	32,34	\$ 458.392,33
4,05	CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18	Cotización	ML	138,80		\$ 49.390,38	\$ 6.845.506,67	138,80	\$ 6.845.506,67
4,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	Cotización	M2	145,77		\$ 119.304,46	\$ 17.391.011,13	145,77	\$ 17.391.011,13
4,07	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0.70 M	Cotización	ML	11,30		\$ 99.176,65	\$ 1.120.696,15	11,30	\$ 1.120.696,15
4,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	Precios Gober.	ML	11,30	4%	\$ 117.117,01	\$ 1.376.359,10	0,00	\$ -
4,09	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	Precios Gober.	M2	32,00	4%	\$ 51.834,72	\$ 1.725.059,48	32,00	\$ 1.725.059,48
4,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 16 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	Precios Gober.	M2	15,22	4%	\$ 238.795,70	\$ 3.779.849,38	0,00	\$ -
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 18 (Incluye marco, bisagras y pintura)	Cotización	M2	4,20		\$ 401.082,39	\$ 1.884.546,04	0,00	\$ -
4,12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Precios Gober.	M2	29,90	4%	\$ 25.187,68	\$ 783.236,10	0,00	\$ -
4,13	ESTUCCO MUROS	Precios Gober.	M2	29,90	4%	\$ 10.155,28	\$ 315.788,59	0,00	\$ -
4,14	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Precios Gober.	M2	113,70	4%	\$ 17.576,11	\$ 2.078.339,86	0,00	\$ -
4,15	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	Precios Gober.	M2	220,44	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.363.155,24	0,00	\$ -
4,16	CIELO RASO EN PVC	Cotización	M2	115,96		\$ 71.719,83	\$ 8.316.631,49	0,00	\$ -
4,17	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	Precios Gober.	KG	481,04	4%	\$ 225,00	\$ 112.563,36	481,04	\$ 112.563,36

COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 50.276.929,00	\$ 29.579.023,20
A	\$ 12.569.232,25	\$ 7.394.755,80
I	\$ 1.005.538,58	\$ 591.580,46
U	\$ 1.508.307,87	\$ 887.370,70



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
5						TIPO:	OBRA PÚBLICA		
5,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gover.	METRO CUADRADO	128,20	4%	\$ 10.307,86	\$ 1.374.326,36	128,20	\$ 1.374.326,36
5,02	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Precios Gover.	METRO CUADRADO	9,00	4%	\$ 20.004,61	\$ 187.243,15	9,00	\$ 187.243,15
5,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	Precios Gover.	METRO LINEAL	49,50	4%	\$ 14.773,22	\$ 760.525,37	49,50	\$ 760.525,37
5,04	ESTUCO MUROS	Precios Gover.	METRO CUADRADO	3,20	4%	\$ 10.155,28	\$ 33.796,77	3,20	\$ 33.796,77

COSTO DIRECTO GRUPO	\$	2.355.891,65	\$ 2.355.891,65
A	\$	588.972,91	\$ 588.972,91
I	\$	47.117,83	\$ 47.117,83
U	\$	70.676,75	\$ 70.676,75

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
6	HOSPITALIZACIÓN					TIPO:	OBRA PÚBLICA		
6,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gover.	M2	432,72	4%	\$ 10.307,86	\$ 4.638.833,87	432,72	\$ 4.638.833,87
6,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Precios Gover.	M2	156,52	4%	\$ 17.576,11	\$ 2.861.053,25	156,52	\$ 2.861.053,25
6,03	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	Precios Gover.	M2	213,35	4%	\$ 3.130,72	\$ 694.656,68	213,35	\$ 694.656,68
6,04	CIELO RASO EN PVC	Cotización	M2	213,35		\$ 71.719,83	\$ 15.301.425,73	213,35	\$ 15.301.425,73
6,05	ESTUCO MUROS	Precios Gover.	M2	48,21	4%	\$ 10.155,28	\$ 509.169,49	48,21	\$ 509.169,49
6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	Cotización	UND	21,00		\$ 38.115,49	\$ 800.425,29	21,00	\$ 800.425,29
6,07	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	Precios Gover.	ML	126,10	4%	\$ 14.773,22	\$ 1.937.419,16	126,10	\$ 1.937.419,16

COSTO DIRECTO GRUPO	\$	26.742.983,47	\$ 26.742.983,47
A	\$	6.685.745,87	\$ 6.685.745,87
I	\$	534.859,67	\$ 534.859,67
U	\$	802.289,50	\$ 802.289,50

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
7						TIPO:	OBRA PÚBLICA		
7,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gover.	METRO CUADRADO	119,09	4%	\$ 10.307,86	\$ 1.276.665,57	0,00	\$ -
7,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Precios Gover.	METRO CUADRADO	108,76	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.988.040,83	0,00	\$ -

COSTO DIRECTO GRUPO	\$	3.264.706,40	\$ -
A	\$	816.176,60	\$ -
I	\$	65.294,13	\$ -
U	\$	97.941,19	\$ -



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
8							TIPO: OBRA PÚBLICA		
8,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	Precios Gover.	METRO CUADRADO	488,08	4%	\$ 10.307,86	\$ 5.232.302,72	0,00	\$ -
8,02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	Precios Gover.	UNIDAD	1,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 1.579.534,48	0,00	\$ -
8,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	Precios Gover.	METRO LINEAL	6,00	4%	\$ 14.773,22	\$ 92.184,89	0,00	\$ -
8,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Precios Gover.	METRO CUADRADO	8,00	4%	\$ 20.004,61	\$ 166.438,36	0,00	\$ -
8,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	Cotización	UNIDAD	5,00		\$ 38.115,49	\$ 190.577,45	0,00	\$ -

COSTO DIRECTO GRUPO

\$ 7.261.037,90 \$ -

A \$ 1.815.259,48 \$ -

I \$ 145.220,76 \$ -

U \$ 217.831,14 \$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
9							TIPO: OBRA PÚBLICA		
9,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	Precios Gover.	METRO CUADRADO	436,57	4%	\$ 10.307,86	\$ 4.669.386,36	0,00	\$ -
9,02	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	Precios Gover.	METRO CUADRADO	19,74	4%	\$ 13.629,00	\$ 279.797,92	0,00	\$ -
9,03	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	Precios Gover.	UNIDAD	10,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 15.795.344,76	0,00	\$ -
9,04	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	Precios Gover.	METRO LINEAL	15,60	4%	\$ 14.773,22	\$ 239.680,72	0,00	\$ -

COSTO DIRECTO GRUPO

\$ 20.984.209,76 \$ -

A \$ 5.246.052,44 \$ -

I \$ 419.684,20 \$ -

U \$ 629.526,29 \$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
10							TIPO: OBRA PÚBLICA		
10,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	Precios Gover.	METRO CUADRADO	81,61	4%	\$ 10.307,86	\$ 874.873,43	0,00	\$ -
10,02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	Precios Gover.	UNIDAD	1,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 1.579.534,48	0,00	\$ -

COSTO DIRECTO GRUPO

\$ 2.454.407,91 \$ -

A \$ 613.601,98 \$ -

I \$ 49.088,16 \$ -

U \$ 73.632,24 \$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
------	-------------	--------	--------	---------------------	-------	-------------	------------------	--------------------	-----------------



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

11						TIPO:	OBRA PÚBLICA		
11,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gober.	METRO CUADRADO	50,82	4%	\$ 10.307,86	\$ 544.799,26	0,00	\$ -
COSTO DIRECTO GRUPO							\$ 544.799,26		\$ -
A							\$ 136.199,82		\$ -
I							\$ 10.895,99		\$ -
U							\$ 16.343,98		\$ -
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
12						TIPO:	OBRA PÚBLICA		
12,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gober.	METRO CUADRADO	33,55	4%	\$ 10.307,86	\$ 359.661,85	0,00	\$ -
COSTO DIRECTO GRUPO							\$ 359.661,85		\$ -
A							\$ 89.915,46		\$ -
I							\$ 7.193,24		\$ -
U							\$ 10.789,86		\$ -
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
13						TIPO:	OBRA PÚBLICA		
13,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gober.	METRO CUADRADO	233,63	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.504.554,35	0,00	\$ -
13,02	ESTUCO MUROS	Precios Gober.	METRO CUADRADO	29,13	4%	\$ 10.155,28	\$ 307.656,24	0,00	\$ -
COSTO DIRECTO GRUPO							\$ 2.812.210,59		\$ -
A							\$ 703.052,65		\$ -
I							\$ 56.244,21		\$ -
U							\$ 84.366,32		\$ -
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
14						TIPO:	OBRA PÚBLICA		
14,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gober.	METRO CUADRADO	246,87	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.646.489,45	0,00	\$ -
14,02	ESTUCO MUROS	Precios Gober.	METRO CUADRADO	10,80	4%	\$ 10.155,28	\$ 114.054,10	0,00	\$ -
14,03	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Precios Gober.	METRO CUADRADO	58,31	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.065.857,49	0,00	\$ -
COSTO DIRECTO GRUPO							\$ 3.826.411,04		\$ -
A							\$ 956.802,76		\$ -
I							\$ 76.528,22		\$ -
U							\$ 114.792,33		\$ -
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

15						TIPO:	OBRA PÚBLICA		
15,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gober.	METRO CUADRADO	211,31	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.265.280,05	0,00	\$ -
15,02	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	Precios Gober.	METRO LINEAL	19,70	4%	\$ 14.773,22	\$ 302.673,73	0,00	\$ -
15,03	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	Precios Gober.	METRO CUADRADO	45,90	4%	\$ 16.684,41	\$ 796.447,00	0,00	\$ -
15,04	ESTUCO MUROS	Precios Gober.	METRO CUADRADO	12,50	4%	\$ 10.155,28	\$ 132.018,64	0,00	\$ -
						COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 3.496.419,42		\$ -
						A	\$ 874.104,86		\$ -
						I	\$ 69.928,39		\$ -
						U	\$ 104.892,58		\$ -
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
16						TIPO:	OBRA PÚBLICA		
16,01	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Precios Gober.	METRO CUADRADO	78,11	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.427.784,75	0,00	\$ -
16,02	ESTUCO MUROS	Precios Gober.	METRO CUADRADO	5,94	4%	\$ 10.155,28	\$ 62.735,26	0,00	\$ -
						COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 1.490.520,01		\$ -
						A	\$ 372.630,00		\$ -
						I	\$ 29.810,40		\$ -
						U	\$ 44.715,60		\$ -

**INFORMACIÓN CONSOLIDADA
FORMULACIÓN INICIAL**

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 474.447.636,00	\$ 207.756.055,00
TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 142.334.291,00	\$ 62.326.817,00
TOTAL AVANCE FINANCIERO EJECUTADO DE OBRA	\$ 616.781.927,00	\$ 270.082.872,00
TOTAL PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO DE OBRA		43,79%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso

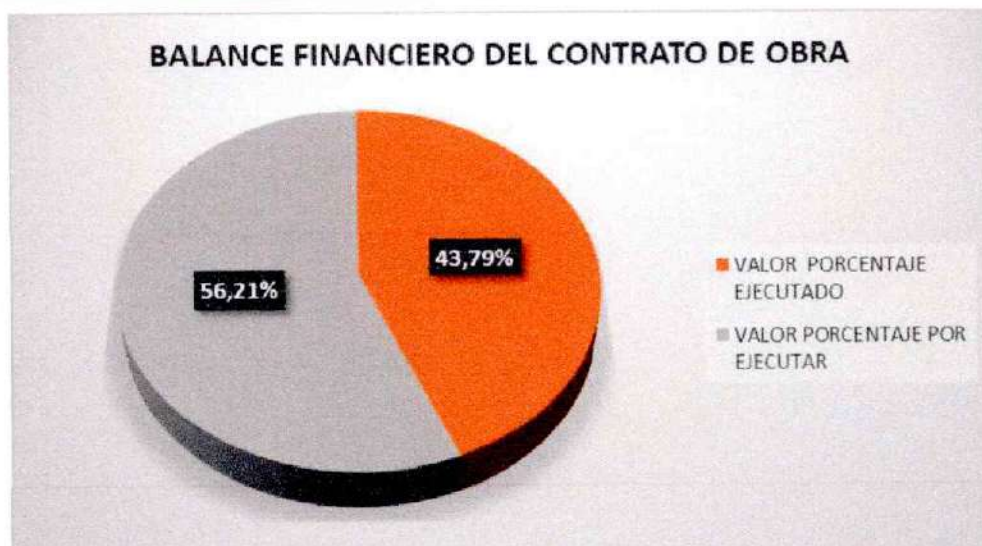


Ilustración 4. Avance financiero

La ilustración muestra el **gasto** realizado durante los 30 días de ejecución, dividido en cada una de las actividades para un mejor seguimiento, se observa un porcentaje de ejecución financiera del 43,79% correspondiente a **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 270.082.872,00) M/CTE.**, para lo cual se realiza la ejecución de las actividades establecidas en la minuta del contrato de obra pública N° 361-2025.

12.6. Avance plazo contractual

Con respecto al plazo contractual, de los setenta y cinco (75) Días establecidos en la minuta del contrato, ha transcurrido un (01) mes desde la fecha de inicio hasta la fecha de corte del presente informe, lo cual equivale a un 40,00% del total del plazo contractual.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

Ilustración 5. Avance en tiempo

AVANCE EN TIEMPO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025	
PLAZO INICIAL	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO EN DÍAS	75
DÍAS TRABAJADOS	30
PORCENTAJE TOTAL	40,00%
ACUMULADOS PLAZO INICIAL	
% DE TIEMPO	
PERIODO DEL 16/10/2025 A 15/11/2025	40,00%
ACUMULADO TOTAL	40,00%
TIEMPO RESTANTE	60,00%

Ilustración 6. Relación de avance en tiempo del contrato de obra No. 361-2025



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



13. SITUACIONES ADVERSAS

Durante el periodo evaluado, la interventoría efectuó la revisión de la programación de obra, las actividades ejecutadas y las condiciones ambientales que incidieron en el desarrollo del proyecto. Como resultado de este análisis, se identificaron situaciones adversas que afectaron la continuidad y el rendimiento de las actividades programadas.

En el transcurso del presente periodo se registraron precipitaciones constantes, según lo verificado en las bitácoras de obra correspondientes a los días 27/10/2025, 29/10/2025, 30/10/2025, 04/11/2025, 05/11/2025, 08/11/2025, 10/11/2025 y 11/11/2025, condiciones climatológicas que impidieron el normal desarrollo de varias actividades constructivas.

Las lluvias continuas generaron condiciones de humedad y riesgo en la zona de intervención, lo cual imposibilitó la ejecución segura y eficiente de las siguientes actividades contempladas dentro del cronograma contractual:

- Desmante de cubiertas en teja de asbesto y/o asbesto-cemento.
- Desmante de cubierta en lámina.
- Suministro e instalación de teja termoacústica tipo trapezoidal A360.
- Instalación de caballete en teja termoacústica A360 con ancho de 0,70 m.
- Limpieza de viga canal en concreto (área interna).
- Impermeabilización de viga canal en concreto.
- Aplicación de pintura en fachada con acabado tipo vinilo para exteriores.
- Mantenimiento del cerramiento existente en tubería metálica cuadrada de 1".

Estas condiciones climáticas adversas ocasionaron retrasos en la ruta crítica del proyecto, debido a que las actividades mencionadas requieren condiciones secas para garantizar su adecuada ejecución, adherencia de materiales, seguridad del personal y calidad final de la obra. Así mismo, se evidenció un incremento en tiempos improductivos y en horas hombre y horas máquina asociadas a la suspensión temporal de labores y a las acciones de protección y alistamiento necesarias antes y después de los eventos de lluvia.

La interventoría deja constancia de estas afectaciones, reiterando que las condiciones climáticas constituyen un factor externo que incide directamente en la ejecución del cronograma y en el desempeño de las actividades técnicas programadas, razón por la cual se recomienda su análisis para efectos de ajustes en la programación y seguimiento contractual.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



Ilustración 7. Imprevistos presentados en el periodo



14. MATERIAL DE OBRA – BODEGA

Para el desarrollo adecuado de las actividades constructivas, se dispuso una bodega destinada exclusivamente al acopio y protección del material de obra. Dicho espacio garantiza condiciones óptimas de almacenamiento, priorizando que los insumos permanezcan en un ambiente seco, ordenado y seguro, con el fin de preservar sus propiedades y asegurar su correcta utilización durante la ejecución del proyecto. A continuación, se presenta el registro fotográfico correspondiente al almacenamiento y organización del material dentro de la bodega por parte del contratista.



Ilustración 8. Acopio de material y bodega de obra



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

15. ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

A continuación, se presentan las actividades realizadas durante el periodo del presente informe:

1. AREA EXTERIOR

ÍTEM 1,01 LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO

En este ítem se ubicó y marco en el terreno o superficie de construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en el plano del proyecto, así como los linderos del mismo.

ACTIVIDAD:		LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO			
ITEM: 1.01				UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		1855.92		CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	1855.92
CANTIDAD EJECUTADA	PRESENTE	1855.92	CANTIDAD POR EJECUTAR:		0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:		100%		PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

2,00 CUBIERTAS Y DRENAJES

ÍTEM 2,01 LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)

Esta actividad fue medida en metros cúbicos según el presupuesto teniendo en cuenta el área excavación mecánica.

ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)		
ITEM: 2.01		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	857.50	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	857.50
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	857.50	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



ÍTEM 2,02 IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO

Esta actividad fue cuantificada en metros cuadrados conforme al presupuesto, considerando el metraje de conformación, nivelación y compactación de subrasante.

ACTIVIDAD:	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO		
ITEM: 2.02		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	857.50	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	169.62
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	169.62	CANTIDAD POR EJECUTAR	687.88
PORCENTAJE EJECUTADO:	19,78%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	80,22%



322 7230347



frascingsas@gmail.com




Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRAScing S.A.S

NIT: 901.629.231-4

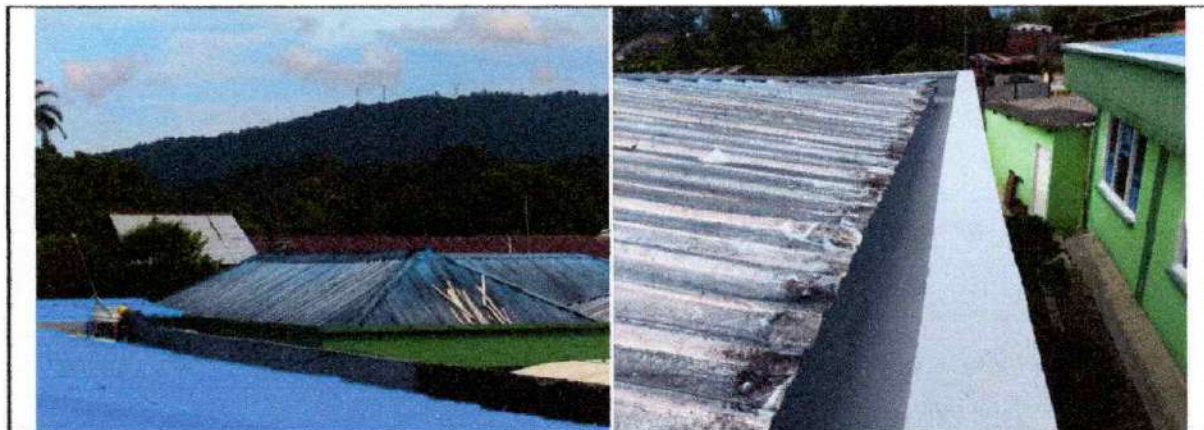

ÍTEM 2,03 DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO

ACTIVIDAD:		DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO	
ITEM: 2.03		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	450,00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	135
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	135,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	315,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	30,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	70,00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 2,04 DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA

ACTIVIDAD:		DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	
ITEM: 2.04		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	683,50	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	559,60
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	559,60	CANTIDAD POR EJECUTAR	123,90
PORCENTAJE EJECUTADO:	81,87%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	18,13%
			

ÍTEM 2,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPOTRAPEZOIDAL A360

ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	
ITEM: 2.05		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1133,50	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	655,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	655,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	478,50
PORCENTAJE EJECUTADO:	57,79%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	42,21%
			



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 2,06 CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M

ACTIVIDAD:	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M		
ITEM: 2.06		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	235.75	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	126.15
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	126.15	CANTIDAD POR EJECUTAR	109.60
PORCENTAJE EJECUTADO:	53.51%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	46.49%

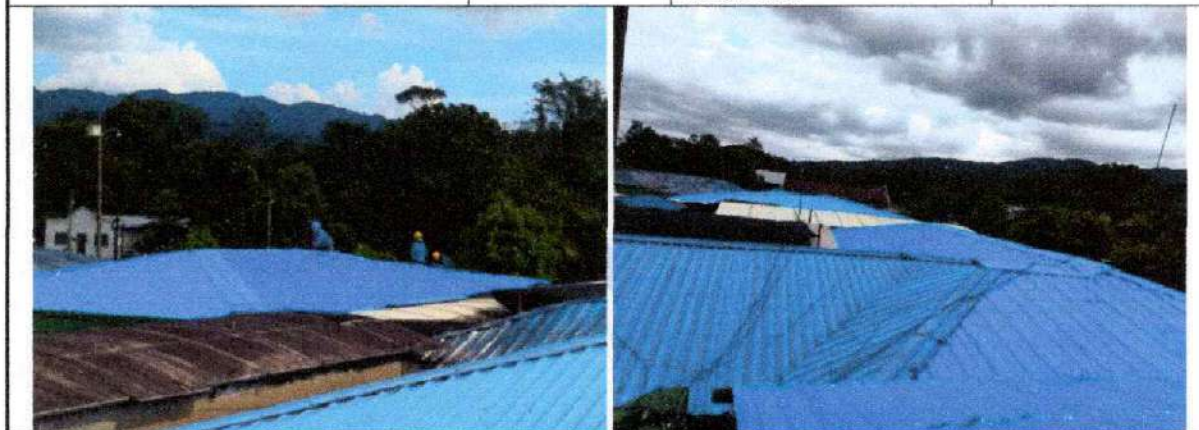

ÍTEM 2,09 LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO

ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO		
ITEM: 2.09		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	473.32	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	388.12
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	388.12	CANTIDAD POR EJECUTAR	85.20
PORCENTAJE EJECUTADO:	82.00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	18.00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 2,10 PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA

ACTIVIDAD:		PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	
ITEM: 2.10		UNIDAD: KG	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	2661.42	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	415.92
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	415.92	CANTIDAD POR EJECUTAR	2245.50
PORCENTAJE EJECUTADO:	15.63%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	84.37%



ÍTEM 2,11 TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM

ACTIVIDAD:		TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	
ITEM: 2.11		UNIDAD: KG	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	3058.75	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	1382.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	1382.00	CANTIDAD POR EJECUTAR	1676.75
PORCENTAJE EJECUTADO:	45.18%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	54.82%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

3,00 ADMINISTRACIÓN

ÍTEM 3,01 ESTUCO MUROS

ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS		
ITEM: 3.01			UNIDAD: M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	2.80	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	M2
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	2.80	CANTIDAD POR EJECUTAR	2.80
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%
			

ÍTEM 3,03 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO		
ITEM: 3.03			UNIDAD: M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	477.26	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	477.26
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	477.26	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%
			



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4



ÍTEM 3,04 ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS

ACTIVIDAD:	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS		
ITEM: 3.04		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	40.13	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	40.13
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	40.13	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 3,05 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS


ACTIVIDAD:	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS		
ITEM: 3.05		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	56.11	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	56.11
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	56.11	CANTIDAD POR EJECUTAR	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



4,00 ARCHIVO - ALMACEN

ÍTEM 4,01 DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.

ACTIVIDAD:	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO		
ITEM: 4.01		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	145,77	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	145,77
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	145,77	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

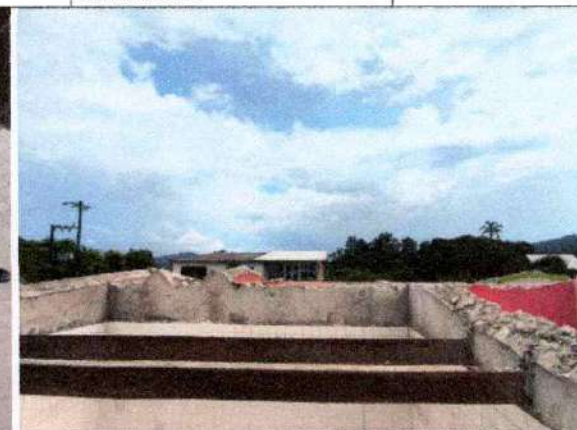

322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4



ÍTEM 4.02 DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.

ACTIVIDAD:		DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts	
ITEM: 4.02		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	4.53	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	4.53
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	4.53	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 4,03 DEMOLICIÓN MESON CONCRETO

ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO		
ITEM: 4.03		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1.53	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	1.53
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	1.53	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



ÍTEM 4,04 DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS

ACTIVIDAD:	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS		
ITEM: 4.04		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	32.34	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	32.34
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	32.34	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 4,05 CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18

ACTIVIDAD:	CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18		
ITEM: 4.05		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	138,60	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	138,60
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	138,60	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



ÍTEM 4,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360		
ITEM: 4.06		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	145,77	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	145,77
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	145,77	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRAScing S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 4.07 CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M

ACTIVIDAD:	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M		
ITEM: 4.07		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	11.30	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	11.30
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	11.30	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



ÍTEM 4.09 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS

ACTIVIDAD:	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS		
ITEM: 4.09		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	32.00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	32.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	32.00	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4



ÍTEM 4,17 TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM

ACTIVIDAD:		TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	
ITEM: 4.17		UNIDAD: KG	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	481,04	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	481,04
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	481,04	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%
			



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

5,00 SALA DE AUTOPSIAS

ÍTEM 5,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO		
ITEM: 5,01		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	128.20	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	128.20
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	128.20	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



ÍTEM 5,02 ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS

ACTIVIDAD:	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS		
ITEM: 5,02		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	9.00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	9.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	9.00	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 5,03 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS

ACTIVIDAD: ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS			
ITEM: 5,03		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	49,50	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	49,50
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	49,50	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



ÍTEM 5,04 ESTUCO MUROS

ACTIVIDAD: ESTUCO MUROS			
ITEM: 5,04		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	3,20	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	3,20
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	3,20	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4



6,00 HOSPITALIZACIÓN

ÍTEM 6,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO		
ITEM: 6,01		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	432,72	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	432,72
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	432,72	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4



ÍTEM 6,02 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES

ACTIVIDAD:		PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	
ITEM: 6.02		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	156.52	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	156.52
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	156.52	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 6,03 DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)

ACTIVIDAD:		DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	
ITEM: 6,03		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	213.35	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	213.35
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	213.35	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



ÍTEM 6,04 CIELO RASO EN PVC

ACTIVIDAD:		DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	
ITEM: 6,04		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	213.35	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	213.35
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	213.35	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4



ÍTEM 6,05 ESTUCO MUROS

ACTIVIDAD: ESTUCO MUROS		UNIDAD: M2	
ITEM: 6,05			
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	48.21	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	48.21
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	48.21	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4



ÍTEM 6,06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W

ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	
ITEM: 6,06		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	21.00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	21.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	21.00	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 6,07 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS

ACTIVIDAD:		ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	
ITEM: 6,07		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	126.10	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	126.10
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	126.10	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



FRASCING S.A.S

16. ASPECTOS FINANCIEROS

16.1. Manejo del anticipo

De acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y la modalidad de pago correspondiente, Para el periodo del presente informe el contratista de obra CONSTRUINDUCIVIL SAS, no presento ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA plan de inversión del anticipo:

17. ASPECTOS AMBIENTALES

17.1. Seguimiento a permisos y/o licencias ambientales

Para el presente proyecto no se requirieron permisos y/o licencias ambientales.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



18. ASPECTOS GENERALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

18.1. Alcance de la interventoría

El informe tiene un alcance que incluye el fortalecimiento de la calidad de cada uno de los componentes del proyecto los cuales son:

Tabla 12. Componentes del proyecto.

COMPONENTES DEL PROYECTO
Verificación de la calidad de los materiales utilizados.
Aseguramiento de la idoneidad profesional y técnica del personal vinculado a la ejecución del proyecto.
Compromiso en la entrega y presentación de la información requerida por la ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA .
Buena comunicación en los canales y medios de comunicación internos y externos establecidos con el contratista y la entidad contratante.
Control de documentos y registros.

De acuerdo con el plan de trabajo elaborado por parte de la interventoría, se documentó todas las etapas de la obra verificando que cumplan con la calidad exigida.

Los documentos elaborados para dar cumplimiento al plan de trabajo de la interventoría son:

- o Registro fotográfico
- o Informes de avances para cortes de obra
- o Actas de ejecución (comités, contractuales entre otros.)
- o Bitácora de Obra
- o Comunicaciones internas y externas escritas
- o Acciones preventivas correctivas (Mejoramiento continuo).



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso

**18.2. Interventoría técnica**

Mediante el contrato de Consultoría No. 469-2025, a cargo de FANNY KATHERIN BARRERA CORREA, realiza el control pertinente de calidad y cantidad de los materiales suministrados por los diferentes proveedores así, como de los trabajos que se fueron ejecutados según ítems contratados. Velar por el buen cumplimiento del plan de trabajo presentado por parte de la empresa CONSTRUINDUCIVIL SAS.

18.3. Interventoría administrativa

La Interventoría debe realizar el control y vigilancia del personal, equipos y recursos que son utilizados para la ejecución del proyecto por parte del Contratista, y exigir el cumplimiento de las leyes en cuando a la incorporación del personal a los sistemas de Seguridad Social.

18.4. Interventoría financiera

La interventoría realiza control y vigilancia al cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), conceptuar sobre la aprobación de precios de ítems no previstos, revisar y comprobar que los soportes de gastos como facturas, comprobantes de egreso, documentos equivalentes y demás, estén bien elaborados; efectuar un seguimiento permanente a los costos del proyecto lo cual incluye contrataciones y ejecuciones de cada uno.

18.5. Funciones de la interventoría

Tabla 13. Supervisión técnica.

SUPERVISIÓN TÉCNICA				
	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE
1	Visita inicial al sitio de la obra	Se Verificó el sitio donde se ejecutarían las obras (contratista e interventoría). Se realizó una Descripción de las actividades preliminares y generales del proyecto.	Al inicio de la obra	Residente de Interventoría



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

2	Seguimiento diario a la obra	Se realizó Supervisión y chequeos de los métodos constructivos y aprobación de materiales llevando un control del avance diario de obra.	Diaria con la ejecución de la obra	Residente de interventoría.
3	Revisión de cantidades de obra contractuales y planos del proyecto	Se efectuó revisión periódica de cada una de las actividades del proyecto, de acuerdo con los planos, las cantidades contractuales y las cantidades ejecutadas.	Al inicio del contrato y en cada pago de acta o modificación de los planos.	Residente de interventoría.
4	Elaboración de bitácora de obra	Se llevó Registro de actividades, control, cambios y compromisos acordados. Firmada por ambas partes (contratista e interventoría), cada una de sus hojas foliadas, usando el <i>modelo establecido</i> .	Diaria con la ejecución de la obra desde el inicio hasta que terminó la obra.	Residente de interventoría.
5	Control al programa de obra	Se realizó Verificación al cumplimiento de las cantidades ejecutadas, fechas de inicio y holguras de las actividades del contrato, de acuerdo al cronograma entregado por el contratista.	Semanal en forma detallada con cantidades reales.	Residente de interventoría.
6	Medidas de las actividades ejecutadas durante el periodo	Se efectuó Cuantificación de las medidas de las actividades ejecutadas durante el periodo para memoria de cantidades y control financiero.	De acuerdo a periodicidad de pagos según contrato y solicitud de supervisión.	Residente de interventoría.
7	Ensayos de campo y laboratorio	Se efectuó revisión y aprobación de resultados de ensayos de campo y laboratorio, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas correspondientes y pliego de condiciones	De acuerdo con las especificaciones técnicas o las normas vigentes	Residente de interventoría.
8	Control de equipo utilizado en obra	Se verificó el estado y rendimiento de la maquinaria y del equipo utilizado en la ejecución de la obra, así como el cumplimiento con la cantidad especificada por el contratista en la propuesta y en los análisis de precios unitarios de obra ordinaria	Diaria con la ejecución de la actividad	Residente de interventoría.
9	Control de calidad de materiales, pruebas y ensayos	Se realizó revisión visual de los materiales. Así como Revisión y exigencia de ensayos de laboratorio	Según los pliegos de condiciones, términos de referencia y normas aplicables	Residente de interventoría



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

10	Elaboración de informes mensuales	Se cumplió con la Elaboración de informes mensuales de interventoría para ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA, dando reporte detallado sobre la ejecución de la obra y los controles técnicos, administrativos y financieros realizados durante el periodo.	Mensual y según requerimiento de la ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA	Residente de interventoría
11	Registro fotográfico	Se realizó un registro fotográfico sobre las actividades y el alcance de la obra.	Diaría con la ejecución de la obra	Residente, de interventoría.
12	Suspensión temporal de la ejecución de la obra	Se presentaron circunstancias que generaron suspensión de obra y de plazo como lo fueron la ola invernal presentada en el departamento durante el periodo de ejecución del contrato.	No se han presentado suspensiones.	Residente de interventoría.
13	Comunicación de las inconformidades que se presenten en la obra	Se mantuvo Comunicación escrita oportuna al contratista, con relación a las inconformidades que se generaron cuando las actividades no se desarrollaron dentro de los límites permitidos establecidos en las especificaciones técnicas.	Durante todo el periodo de ejecución cuando fue necesario.	Residente de interventoría.
14	Estudiar y recomendar las modificaciones que se consideren convenientes o necesarias para el logro de los objetivos del contrato.	Se realizó comunicación oportuna al contratista, previo visto bueno del dueño del proyecto con relación a las recomendaciones o modificaciones necesarias para cumplir los objetivos del contrato.	Cuando fue necesario durante el periodo de ejecución del contrato.	Residente de interventoría.
15	Comités técnicos de obra	Se realizaron y direccionaron los comités técnicos durante la ejecución de la obra. Se efectuó las actas respectivas de cada comité considerando proyecciones, avance de obra, avance financiero, plazo ejecutado, inquietudes técnicas, obra extra presentada, cambio de obra, dificultades en la ejecución de las actividades, e inquietudes del contratista.	Mensual y extraordinario si se requería.	Residente de interventoría.

Tabla 14. Supervisión administrativa

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE
1	Documentos del contrato y demás condiciones contractuales	Se Analizó los pliegos de condiciones, la propuesta del contratista, los documentos de legalización del contrato. De igual manera se verificó el pago de impuestos, la existencia y vigencia de pólizas, el pago de salarios y prestaciones. Se analizó las hojas de vida de personal de obra y comparar con los propuestos por el contratista.	Al inicio del proyecto y Cuando fue necesario durante la ejecución de la obra.	Residente de interventoría.
2	Plan de calidad y plan de manejo ambiental	Se estudió el plan de manejo ambiental revisando el contenido considerando los términos de referencia y pliegos de condiciones.	Al inicio y mensualmente.	Residente, de interventoría.
3	Control de personal mano de obra calificada, profesionales y técnicos	Se estuvo al tanto de la afiliación del personal a ARL, EPS, Caja de compensación, verificando el pago de parafiscales, planillas y pago mensual de las responsabilidades anteriores.	Al inicio y durante la ejecución de la obra.	Residente de interventoría.
4	Actas de obra ejecutadas	Con las mediciones realizadas en obra se efectuó la comparación con las cantidades contractuales y teóricas de cada una de las actividades para el control del presupuesto.	Mensual y según términos de referencia o pliegos de condiciones.	Residente de interventoría.
6	Análisis de precios unitarios (APU) de obra extra	Se evaluaron y aprobaron los APU de obra extra, tomando como referencia los precios vigentes en el mercado para los insumos descritos en el APU, manteniendo los salarios y precios básicos de los APU contractuales.	Cuando fue necesario durante la ejecución de la obra.	Residente de interventoría, con el visto bueno del contratante.
7	Subcontratos	Se evaluaron y aprobaron subcontratos en actividades que lo requerían por ser especializadas, como las instalaciones eléctricas y la cubierta.	Antes de realizarse las actividades	Residente de interventoría.
8	Correspondencia enviada y recibida	Se tiene archivo y control de toda la correspondencia enviada y recibida.	Durante todo el tiempo de ejecución de la obra.	Residente de interventoría.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

		Se Involucra la correspondencia del proyecto, oficios remisorios, solicitudes del contratista o al propietario del proyecto, memorandos, etc., entre el contratista – interventoría o viceversa.		
9	Actas del proyecto	Se elaboraron acta de inicio, acta de suspensión, acta de prórroga a la suspensión, acta de reinicio, y acta de adición en tiempo.	Al inicio de la obra. En el momento que se suspendió la ejecución del contrato. Después de la suspensión.	Residente de interventoría
			Al término de las actividades.	
10	Programas de higiene y seguridad industrial	Se verificó la existencia y funcionalidad de los implementos para protección del personal. Utilización de casco, gafas protectoras, guantes, caretas, botas, arnés, entre otros.	Diario con la ejecución de la obra.	Residente, de interventoría.
11	Ampliación de plazo	Durante el desarrollo de la obra no se hizo necesario realizar ampliaciones de plazo	Cuando se requiriera.	Residente de interventoría.
12	Adición de dinero para terminación de la obra	Durante el desarrollo de la obra, no se hizo necesario adicionar en valor el contrato, ya que el contratista manifestó hacerse cargo de los imprevistos que surgieron durante el periodo de ejecución.	Cuando se requiriera.	Residente de interventoría.
13	Paz y salvo de los trabajadores	Se solicitó al contratista paz y salvo de los trabajadores. Estos documentos fueron necesarios para la realización de la liquidación del contrato.	Al finalizar la obra.	Residente de interventoría.
14	Verificación de participación ciudadana	Se Verificó la existencia del acta de conformación de veeduría ciudadana, cartas de invitación a los diferentes procesos del desarrollo del proyecto y actas de comité de veeduría	Según necesidad.	Residente de interventoría.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

Tabla 15. supervisión financiera

SUPERVISIÓN FINANCIERA				
		DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE
1	Programa de inversión y presupuesto	Se llevó control del programa de inversión y presupuesto y con el avance de la obra y pagos realizados, se realizó el control de la inversión.	Mensual	Residente de interventoría.
2	Desembolso de anticipo	Se llevó control del programa de inversión y presupuesto y con el avance de la obra y pagos realizados, se realizó el control de la inversión.	Mensual	Residente de interventoría.
3	Manejo de dineros	Se controló la revisión de manejo de dineros. Se verificó la apertura de cuenta para anticipo o fiducia. Se revisó el plan de manejo e inversión del anticipo.	Al inicio del contrato	Residente de interventoría.

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso

**19. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS****19.1. Información general contrato de Interventoría.**

Establece de manera resumida las condiciones contractuales del Contrato de Interventoría para el desarrollo de las actividades contenidas en el mismo.

Tabla 16. Ficha técnica del contrato.

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE CONSULTARÍA:	No. 469-2025
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CALLE 5 ENTRE LA CARRERA 8° Y CARRERA 9° DEL BARRIO EL PROGRESO DEL MUNIC BOYACÁ
CONTRATISTA:	FRASCO SUMINISTROS, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. "FRASCING S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	FANNY KATHERIN BARRERA CORREA
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$ 33.211.335,00) M/CTE
PLAZO CONTRACTUAL:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTATO:	15 OCTUBRE DE 2025
FECHA INICIO:	16/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2025
PERIODO DEL INFORME	
FECHA INFORME No. 1:	16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE
DÍAS TRANSCURRIDOS:	30 DÍAS
SUPERVISIÓN:	MARLENY APONTE TORRES SUBGERENTE ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso

**20. RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA****20.1. Pólizas legalización del contrato de Interventoría**

- Póliza de legalización del contrato del contrato anexo-0 con fecha del 15 de octubre del 2025

Tabla 17. Pólizas de legalización del contrato de consultoría No. 469-2025

Anexo	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
0	15/10/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400 47 994000110589	3,321,134.00	15/10/2025	15/04/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			6,642,268.00	15/10/2025	15/12/2028
		CALIDAD DEL SERVICIO			6,642,268.00	15/10/2025	15/06/2026
0	15/10/2025	POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400 74 994000028234	9,963,401.00	15/10/2025	15/04/2026

- Póliza de legalización del contrato anexo-1, incorporación asegurada y/o beneficiario adicional: nación ministerio de salud y protección social Nit. 800.375.481-5, aprobadas por la ESE Hospital Especial de Cubará con fecha del 16 de octubre del 2025

Tabla 18. Póliza de legalización del contrato anexo-1

Anexo	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
1	16/10/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400 47 994000110589	3,321,134.00	15/10/2025	15/04/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			6,642,268.00	15/10/2025	15/12/2028
		CALIDAD DEL SERVICIO			6,642,268.00	15/10/2025	15/06/2026
1	16/10/2025	POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400 74 994000028234	9,963,401.00	15/10/2025	15/04/2026

21. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
16/10/2025	Acta de inicio	Iniciación del contrato de consultoría No. 469-2025	SUPERVISIÓN: MARLENY APONTE TORRES Subgerente Administrativa y Financiera E.S.E. Hospital Especial de Cúbará CONTRATISTA: FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS R/L FANNY KATHERIN BARRERA CORREA NIT. 901.629.231-4
17/10/2025	Acta de socialización	Socialización del contrato de obra No. 361-2025	Asistentes: representantes de HOSPITAL ESPECIAL DE CUBRA E.S.E por el GERENTE GIOVANNI QUINTERO TELLEZ, presidentes de las comunidades beneficiadas e involucradas, contratista de obra, interventoría, supervisión y comunidad beneficiada.

21.1. Personal vinculado a la interventoría.

El personal profesional vinculado a la interventoría corresponde al mismo presentado en la oferta con sus especificaciones teniendo en cuenta el cargo, dedicación y categoría destacando la importancia del desarrollo de la obra; así mismo, por lo que no se presentaron cambios del personal.

El tiempo mensual del personal se presenta a continuación según condiciones contractuales iniciales.

Tabla 19. Relación personal contrato de consultoría No. 469-2025

NOMBRE	CARGO A DESEMPEÑAR	FORMACIÓN ACADÉMICA	MESES
HENRY FABIAN FRASCO	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO CIVIL	1
ANGIE NUÑEZ	SECRETARIA	TECNÓLOGO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1

21.2. Equipos e implementos de oficina utilizados por la interventoría.

El equipo de la consultoría, para la coordinación, supervisión y control de las actividades objeto del Contrato de Obra, dispone de los siguientes recursos técnicos:

- ✓ Señalización de la Obra
- ✓ Alquiler de Oficina (incluye servicios básicos) Comisión topográfica
- ✓ Alquiler de equipos de cómputo, Papelería, insumos de oficina, etc.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



o Elaboración de Informes:

Acorde al programa de trabajo, propuesto por la interventoría, se cumplieron procesos documentados, utilizando registros que muestren la calidad del servicio y de las obras ejecutadas durante todas sus etapas de construcción, cumpliendo los requerimientos del cliente. De esta manera fueron establecidos registros documentados tales como:

- ✓ Registro fotográfico.
- ✓ Informes mensuales de interventoría.
- ✓ Informes ejecutivos para corte de obra.
- ✓ Actas de ejecución (comités, veedurías, contractuales entre otros).
- ✓ Bitácora de Obra.
- ✓ Comunicaciones Internas y externas escritas.

21.3. Gastos operacionales

21.3.1. Señalización de la Obra

Se implementó la señalización preventiva y restrictiva necesaria en el área de intervención, con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, los usuarios de la ESE Hospital Especial de Cubará y los trabajadores que transitan o desarrollan actividades en la zona.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



Meses contratados	Meses ejecutados
2.5	1

21.3.2. Alquiler de Oficina (incluye servicios básicos) Comisión topográfica

Se adecuó un espacio para ser usado como oficina y sede de la empresa FRASCING SAS, ubicado en la Carrera 6 No 4-99, barrio el Jardín.



Meses contratados	Meses ejecutados
2.5	1

21.3.3. Alquiler de equipos de cómputo, Papelería, Insumos de oficina, etc.

Se alquilo una oficina para el servicio de la interventoría, lugar donde los profesionales trabajaran en la elaboración de informes y reproducción de documentos necesarios para el correcto seguimiento de la interventoría a la obra en ejecución.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4



Meses contratados	Meses ejecutados
2.5	1

22. ASPECTOS TÉCNICOS

22.1. Condiciones contractuales

El contrato de Interventoría suscrito entre la ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA y la firma contratista FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO.

Tabla 20. Condiciones contractuales contrato de interventoría.

ITEM	PERFIL / ACTIVIDAD	FUENTE	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO						10.211.487,50



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

1,01	PROFESIONAL CATEGORIA 8 (EXPERIENCIA PROFESIONAL HASTA 2 AÑOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	\$ Gob	Mes	2,50	1,00	4.084.595,0	10.211.487,5
1,02							-
2	PERSONAL TÉCNICO						-
2,01							-
3	OTRO PERSONAL						2.509.073,75
3,01	SECRETARIA 2 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	\$ Gob	Mes	2,50	0,50	2.007.259,0	2.509.073,75
3,02							-
						SUBTOTAL	12.720.561,3
						Factor Multiplicador	2,30
						TOTAL PERSONAL	29.257.290,9
ITEM	BIEN / ACTIVIDAD	FUENTE	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	
4	BIENES						-
4,01							-
4,02							-
						SUBTOTAL	-
					IVA	0,0%	-
					TOTAL BIENES		-
5	SERVICIOS						3.322.726,32
5,01	Señalización de la Obra	Cotizac	Mes	2,50	\$300.000,00		750.000,00



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

5,02	Alquiler de Oficina (incluye servicios basicos)	Cotizac	Mes	2,50	\$ 600.000,00	1.500.000,00
5,03	Alquiler de equipos de computo, Papeleria, insumos de oficina, etc.	Cotizac	Mes	2,50	\$ 429.090,53	1.072.726,32
SUBTOTAL						3.322.726,32
IVA 19,0%						631.318,00
TOTAL SERVICIOS						3.954.044,32
COSTO DIRECTO						COSTO PERSONAL
						12.720.561,00
						FACTOR MULTIPLICADOR (2,3)
						16.536.729,63
						ESTUDIOS TÉCNICOS
						0,00
						BIENES E INSUMOS
						3.322.726,32
						TOTAL COSTO DIRECTO
						32.580.017,00
						IVA
						631.318,00
TOTAL PRESUPUESTO						33.211.335,00

22.2. Balance financiero del contrato:

A la fecha del presente informe del contrato de consultaría No. 469-2025 se presenta el siguiente balance financiero:

Tabla 21. Balance financiero contrato de consultaría No. 469-2025

DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS	VALORES EJECUTADOS
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	\$ 33.211.335,00	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO		\$ 13.284.534,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 19.926.801,00
SUMAS IGUALES	\$ 33.211.335,00	\$ 33.211.335,00



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso

Ilustración 9. Balance financiero contrato de consultoría No. 469-2025



22.3. Avance en tiempo:

Ilustración 10. avance en el tiempo de interventoría



Para el presente informe, el tiempo de ejecución de la Consultoría No. 469-2025 corresponde al 40,00%, equivalente a 30 días cumplidos. En consecuencia, resta por ejecutar un 60,00% del plazo contractual, correspondiente a los 75 días establecidos en el contrato.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

CONCLUSIONES

Conforme con la ejecución del Contrato de Consultoría No. 469-2025 cuyo objetivo es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002-2025, CUYO OBJETO ES LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ", del Contrato de Obra No. 361-2025 se puede resaltar lo siguiente:

De acuerdo con el seguimiento realizado a la ejecución del Contrato de obra No. 361-2025, a la fecha del presente informe, se presentan los siguientes rendimientos: Avance físico general (40,35%) y Avance Financiero 43,79 % correspondiente a \$ 270.082.872,00 M/CTE.

Se garantizó la ejecución de las actividades del contrato de obra No. 361-2025 que tiene como objeto: "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ.", las cuales se ejecutaron dentro de los parámetros técnicos requeridos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas generales del Contrato, garantizando así, la calidad de las obras ejecutadas.

El contratista ha cumplido con los requerimientos y aseguraciones de seguridad y salud a sus empleados cumpliendo así con la normativa exigida y aprobación por parte de la interventoría técnica.

La interventoría presenta a la fecha un avance financiero del 40,00%, correspondiente a un valor ejecutado de \$ 13.284.534,00 y un saldo pendiente por ejecutar de \$ 19.926.801,00. En cuanto al componente físico y de tiempo, el proyecto alcanza un avance del 40,00%, equivalente a 30 días de ejecución sobre los 75 días contractualmente establecidos, evidenciando un desarrollo acorde con la programación prevista.

La interventoría ha cumplido con los requerimientos y aseguraciones de seguridad y salud a sus empleados cumpliendo así con la normativa exigida, así como las demás responsabilidades contempladas en el contrato.

Elaboro y aprobó:


HENRY FABIAN FRASCO
Residente de interventoría


FANNY KATHERIN BARRERA CORREA
R/L FRASCING SAS
NIT. 901.629.231-4



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ANEXOS

ANEXO 1. CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANEXO 2. CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS

ANEXO 3. CERTIFICADO CUMPLIMIENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATO DE OBRA 361-2025

ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO



FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

**ANEXO 1. CERTIFICADO
CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO**

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT No. 901.629.231-4

CERTIFICA:

Que la empresa CONSTRUINDUCIVIL SAS representada legalmente por XIOMARA MANRIQUE con NIT. 901.375.684-5, realizo la aplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) correspondiente al contrato de obra No 361-2025 cuyo objeto es **"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ"**, correspondiente al periodo comprendido del 16 de octubre del 2025 al 15 de noviembre del 2025.

Este documento se firma a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de 2025

FRASCING S.A.S

Fanny Katherin Barrera C.
FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
R/L: FANNY KATHERIN BARRERA CORREA
NIT No. 901.629.231-4
Contrato de consultoría No. 469-2025



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

**ANEXO 2. CERTIFICADO
CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
LOS MATERIALES Y PROCESOS
CONSTRUCTIVOS**

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT No. 901.629.231-4

CERTIFICA:

Que la empresa CONSTRUINDUCIVIL SAS representada legalmente por XIOMARA MANRIQUE con NIT. 901.375.684-5, da cumplimiento a las obligaciones en cuanto la correcta ejecución de los procesos constructivos y las especificaciones técnicas de los materiales en cada actividad ejecutada para el contrato de obra No 361-2025 cuyo objeto es **"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ"**, correspondiente al periodo comprendido del 16 de octubre del 2025 al 15 de noviembre del 2025.

Este documento se firma a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de 2025

FRASCING S.A.S

Fanny Katherin Barrera C.
FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
R/L: FANNY KATHERIN BARRERA CORREA
NIT No. 901.629.231-4
Contrato de consultoría No. 469-2025



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

**ANEXO 3. CERTIFICADO
CUMPLIMIENTO APORTES DE
SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES CONTRATO DE
OBRA N° 361-2025**

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT No. 901.629.231-4

CERTIFICA:

En calidad de persona jurídica, **FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS R/L FANNY KATHERIN BARRERA CORREA**, celebra contrato de consultoría No. 469-2025 con el MUNICIPIO DE CUBARÁ, cuyo objeto corresponde a: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ"**.

Por su parte, la empresa **CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L XIOMARA MANRIQUE** celebra el contrato de obra N° **361-2025** con la **ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA** y cuyo objeto es: **"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ"**, de acuerdo a la supervisión realizada a las actividades, me permito certificar que el contratista ha realizado el pago correspondiente a los aportes de seguridad social y parafiscal correspondiente al periodo comprendido del 16 de octubre del 2025 al 15 de noviembre del 2025.

FRASCING S.A.S

Fanny Katherin Barrera C.
FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
R/L: FANNY KATHERIN BARRERA CORREA
NIT No. 901.629.231-4
Contrato de consultoría No. 469-2025



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE INTERVENTORÍA No. 1

PERIODO DEL INFORME: 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE OBRA N°. No. 361-2025

CONTRATISTA: CONSTRUINDUCIVIL SAS

NIT No. 901.375.684-5

R/L: XIOMARA MANRIQUE

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ.

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

CONTRATO DE CONSULTARÍA No. 469-2025

CONTRATISTA: FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT No. 901.629.231-4

R/L: FANNY KATHERIN BARRERA CORREA

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL MARCO DE
LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002-2025, CUYO OBJETO ES LA
ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA
E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ

SUPERVISOR: MARLENY APONTE TORRES

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

BOYACÁ, NOVIEMBRE 2025



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA
CONTRATO No:	361-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ
CONTRATISTA:	CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L: XIOMARA MANRIQUE
NIT. No:	901.375.684-5
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$616.781.927,00)
PLAZO CONTRACTUAL:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-0570 DEL 07 DE JULIO DEL 2025
FECHA INICIO:	16 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR EXTERNO:	FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS R/L: FANNY KATHERIN BARRERA CORREA NIT. 901.629.231-4
SUPERVISOR:	MARLENY APONTE TORRES SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ
PERIODO DEL INFORME	
FECHA INFORME:	16 de octubre al 15 de noviembre del 2025



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRAScing S.A.S

NIT: 901.629.231-4

REGISTRO FOTOFRAFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

A continuación, se presentan el registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo del presente informe:

1. AREA EXTERIOR

ÍTEM 1,01 LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO

En este ítem se ubicó y marco en el terreno o superficie de construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en el plano del proyecto, así como los linderos del mismo.

ACTIVIDAD:		LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	
ITEM: 1.01.		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		1855.92	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:
			1855.92
CANTIDAD EJECUTADA	PRESENTE	1855.92	CANTIDAD POR EJECUTAR:
INFORME:			0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:		100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:
			0,00%





322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

2,00 CUBIERTAS Y DRENAJES

ÍTEM 2,01 LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)

Esta actividad fue medida en metros cúbicos según el presupuesto teniendo en cuenta el área excavación mecánica.

ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (AREA INTERNA)	
ITEM: 2.01	UNIDAD: M2	
		

ÍTEM 2,02 IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO

Esta actividad fue cuantificada en metros cuadrados conforme al presupuesto, considerando el metraje de conformación, nivelación y compactación de subrasante.

ACTIVIDAD:	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO	
ITEM: 2.02	UNIDAD: M2	
		



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 2,03 DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO

ACTIVIDAD:	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO	
ITEM: 2.03	UNIDAD: M2	
		

ÍTEM 2.04 DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA

ITEM 2.04 DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA		
ACTIVIDAD:	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	
ITEM: 2.04		UNIDAD: M2
		



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

**ÍTEM 2,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA
TIPOTRAPEZOIDAL A360**

TIPO TRAPEZOIDAL A360		
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	
ITEM: 2.05	UNIDAD: M2	
		

ÍTEM 2,06 CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M

ITEM 2.06 CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	
ACTIVIDAD:	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M
ITEM: 2.06	UNIDAD: ML
	



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 2,09 LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO

ITEM 2.09 LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO		
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO	
ITEM: 2.09		UNIDAD: M2
		

ÍTEM 2,10 PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA

ITEM 2.10 PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA		
ACTIVIDAD:	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	
ITEM: 2.10		UNIDAD: KG
		



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 2,11 TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM

ACTIVIDAD:	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	
ITEM: 2.11	UNIDAD: KG	
		

3,00 ADMINISTRACIÓN

ÍTEM 3,01 ESTUCO MUROS

ITEM 3.01 ESTUCO MUROS	
ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS
ITEM: 3.01	UNIDAD: M2
	



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 3,03 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:

VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ITEM: 3.03

UNIDAD: M2



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 3,04 ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS

ACTIVIDAD:	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	
ITEM: 3.04		UNIDAD: M2
		

ÍTEM 3,05 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS

ACTIVIDAD:	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	
ITEM: 3.05		UNIDAD: ML
		



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

4,00 ARCHIVO - ALMACEN

ÍTEM 4,01 DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.

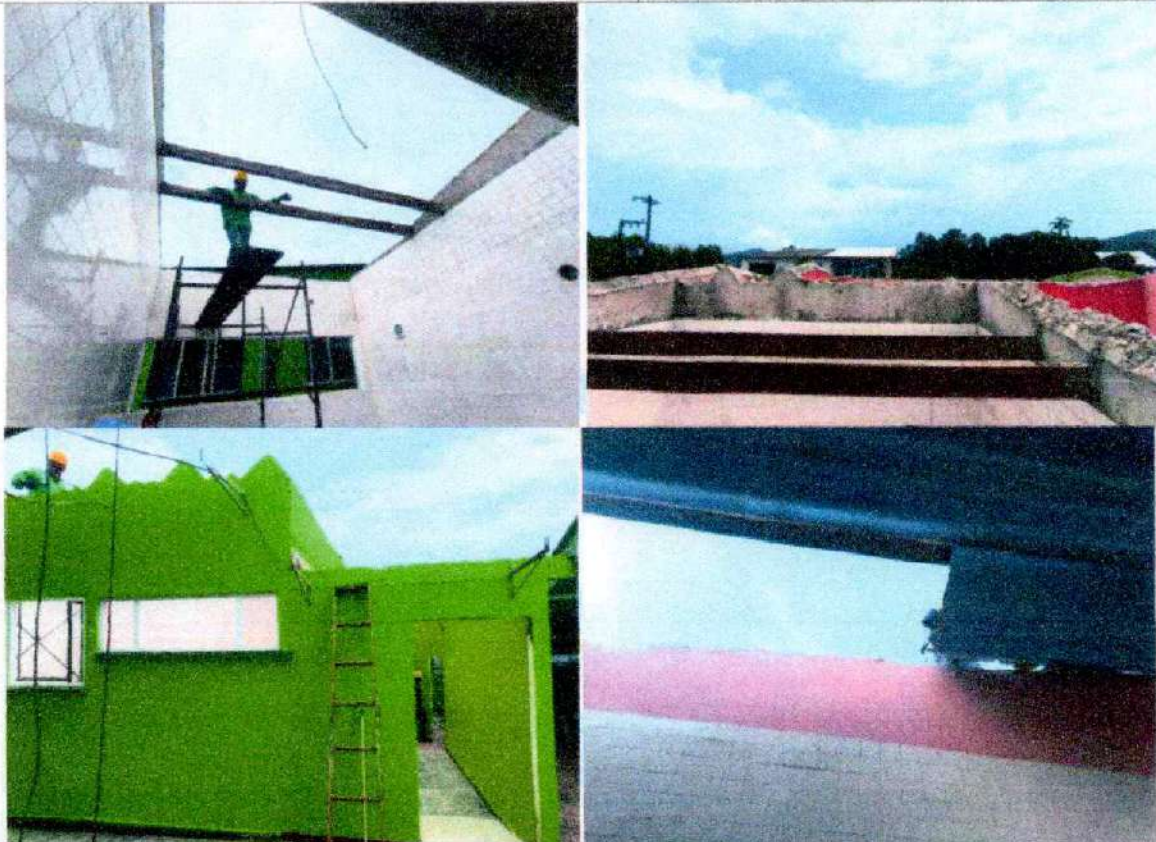ACTIVIDAD:	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	
ITEM: 4.01	UNIDAD: M2	
		



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 4.02 DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.

ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts	
ITEM: 4.02	UNIDAD: M2	
		

ÍTEM 4.03 DEMOLICIÓN MESON CONCRETO

ACTIVIDAD:	DEMOLICION MESON CONCRETO	
ITEM: 4.03	UNIDAD: M2	
		



322 7230347



frascingsas@gmail.com




Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 4,04 DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS

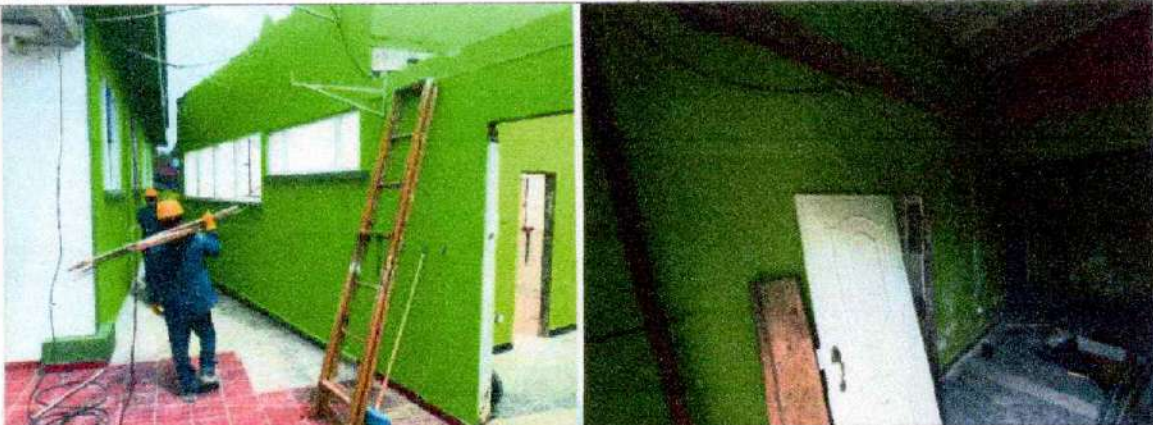ACTIVIDAD:	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	
ITEM: 4.04		UNIDAD: M2
		

ÍTEM 4,05 CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18

ACTIVIDAD:	CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18	
ITEM: 4.05		UNIDAD: M2
		



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 4,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	
ITEM: 4.06		UNIDAD: M2
		

ÍTEM 4,07 CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M

ACTIVIDAD:	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	
ITEM: 4.07		UNIDAD: ML
		



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 4,09 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS

ACTIVIDAD:	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	UNIDAD: M2
ITEM: 4.09		



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 4,17 TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM

ITEM 4.17		TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	
ACTIVIDAD:		TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	
ITEM: 4.17		UNIDAD: KG	
			

5,00 SALA DE AUTOPSIAS

ÍTEM 5,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ITEM: 5,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	
ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	
ITEM: 5,01		UNIDAD: M2
		



322 7230347



frascingsas@gmail.com




Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 5,02 ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS

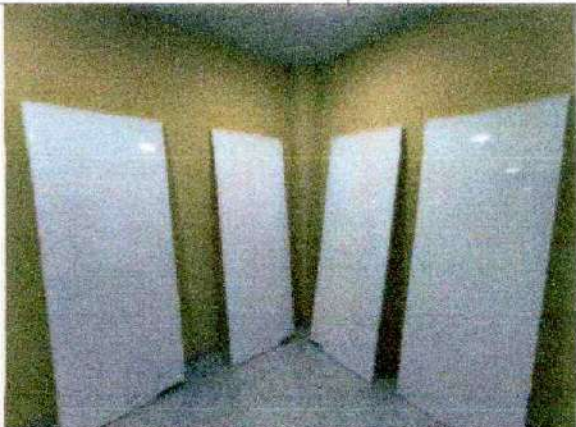ACTIVIDAD:	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	
ITEM: 5,02		UNIDAD: M2
		

ÍTEM 5,03 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS

ACTIVIDAD:	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	
ITEM: 5,03		UNIDAD: ML
		



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 5,04 ESTUCO MUROS

ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS	
ITEM: 5,04	UNIDAD: M2	
		

6,00 HOSPITALIZACIÓN

ÍTEM 6,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PANETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	
ITEM: 6.01		UNIDAD: M2
		



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4



ÍTEM 6,02 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES

ACTIVIDAD:	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	
ITEM: 6,02		UNIDAD: M2

 322 7230347
 frascingsas@gmail.com
 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




FRAScing S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 6,03 DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)

ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	
ITEM: 6,03		UNIDAD: M2
		

ÍTEM 6,04 CIELO RASO EN PVC

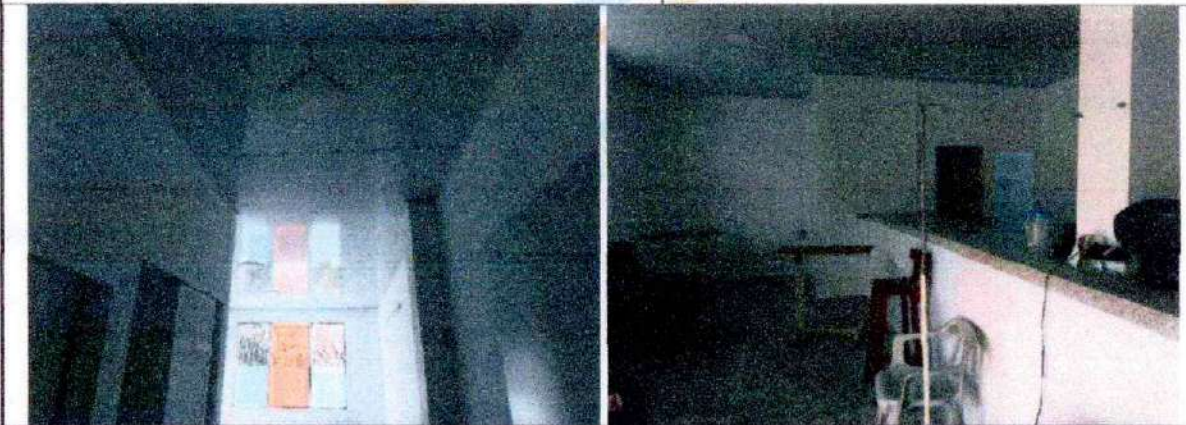ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	
ITEM: 6,04		UNIDAD: M2
		



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4



ÍTEM 6,05 ESTUCO MUROS


ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS	
ITEM: 6,05		UNIDAD: M2

 322 7230347
 frascingsas@gmail.com
 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

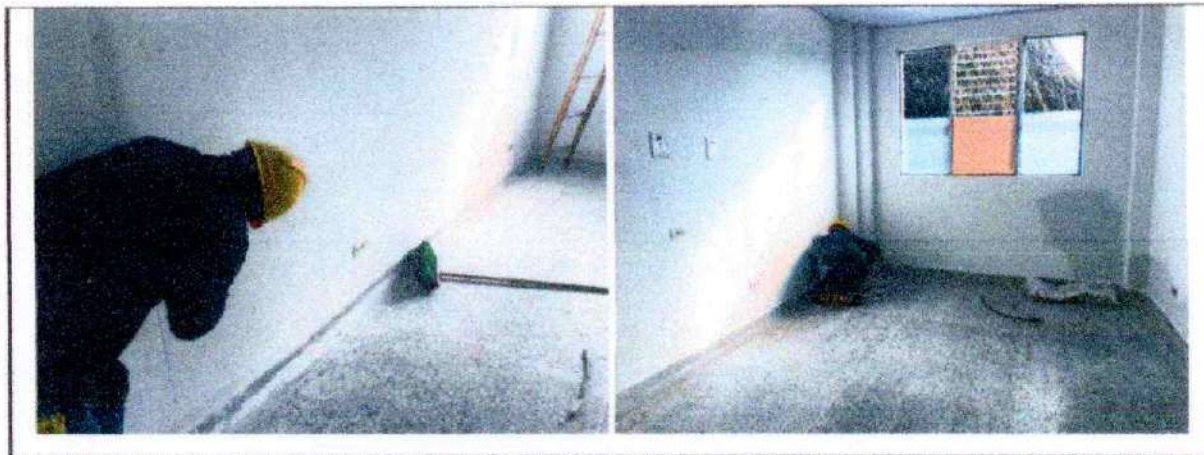

ÍTEM 6,06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	
ITEM: 6,06	UNIDAD:	UND

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ÍTEM 6,07 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS

ACTIVIDAD:	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	
ITEM: 6,07	UNIDAD: ML	
		

Elaboro y reviso:


HENRY FABIAN FRASCO
Residente de interventoría


FANNY KATHERIN BARRERA CORREA
R/L FRASCING SAS
NIT. 901.629.231-4

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

Cubara, Boyacá, 11 de diciembre de 2025

Señores(as):

FANNY KATHERIN BARRERA CORREA

FRASCING S.A.S

Interventoría

MARLENY APONTE TORRES

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ

Supervisora

ASUNTO: entrega de correcciones de informe parcial 1 del contrato de obra N° 361-2025.

REFERENCIA: Contrato de obra N°361-2025-"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ".

Respetados:

Por medio del presente, me permito realizar la entrega del Informe parcial 1 corregido, del contrato de obra **N°361-2025-"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ"**. En el presente informe, se presenta avance físico, y financiero del contrato de obra.

Agradezco su atención prestada y quedo atenta a cualquier observación o comentario que considere pertinente

Cordialmente,

XIOMARA MANRIQUE B.
GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUINDUCIVIL S.A.S

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

[Firma manuscrita]

Firma



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

INFORME DE OBRA PARCIAL No 1

CONTRATO DE OBRA No. 361-2025

PERÍODO DEL INFORME: 16 de octubre al 15 de noviembre del 2025

OBJETO:

"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ".

**CONTRATISTA: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
R/L GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA**

MARLENY APONTE TORRES – SUPERVISOR

CUBARÁ, 2025

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1 ASPECTOS PRECONTRACTUALES	5
PROCESO DE SELECCIÓN	5
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	5
2 ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO	5
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL	5
2.2 LOCALIZACIÓN	6
2.3 ALCANCE	6
3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	6
3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA	6
3.1.1 INFORME CONTRACTUAL – FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA	6
3.1.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO	7
3.1.3 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN	7
3.2 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES	8
3.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS	9
3.4 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS	10
3.5 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA	10
3.6 BITÁCORA DIARIA DE OBRA	11
3.7 VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	11
3.7.1 PERSONAL VINCULADO	11
3.7.2 PERSONAL OPERATIVO VINCULADO	12
3.8 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	13
DOTACIÓN DEL PERSONAL	14
CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	17
ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA	18
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	19
4 ASPECTOS TÉCNICOS	19
4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES	19
4.2 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA	25
4.3 AVANCE DE LA OBRA	32
4.3.1 AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS	32
4.3.2 AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL	36
5 ASPECTOS FINANCIEROS	54
5.1 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL	54
6 IMPREVISTOS	57
7 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	58
7.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	58
7.2 ALQUILER DE OFICINA	58
7.3 ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, PAPELERÍA	59
7.4 ALQUILER DE BODEGA PARA DEPÓSITO DE MATERIALES	59
7.5 TRANSPORTE DE MATERIALES	60
8 APERTURA DE CUENTA BANCARIA	61
9 SEGUIMIENTO AL ANTICIPO	61
10 CERTIFICACIONES INTERVENTORIA	61
11 CONCLUSIONES	62

ISTA DE TABLAS

318 361-2025	Tabla 1. Ficha técnica del contrato	6
318 361-2025	Tabla 2. Pólizas según contrato de obra No. 361-2025	7
318 361-2025	construinducivil@gmail.com	
318 361-2025	Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)	



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

Tabla 3 Pólizas según acta de inicio	8
Tabla 4. Pólizas según acta de inicio	8
Tabla 5 Actos Administrativos Contrato de Obra No. 361-2025	9
Tabla 6. Actas de comité técnicos	10
Tabla 7. Relación de correspondencia recibida por Construcción Integral S.A.S.	10
Tabla 8 Representante legal CONSTRUINDUCIVIL S.A.S octubre de 2025	11
Tabla 9 Personal administrativo vinculado mes de octubre de 2025	12
Tabla 10 Personal técnico vinculado mes de octubre de 2025	12
Tabla 11. Seguimiento entrega de elementos de protección	15
Tabla 12 Condiciones contractuales iniciales del Contrato de Obra No. 361-2025.....	19
Tabla 13 Cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No 361-2025.....	25
Tabla 14. Avance físico de la Obra.....	32
Tabla 15. Avance en tiempo.....	36
Tabla 16. Avance financiero.....	54
Tabla 17. Avance programado vs ejecutado	56

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación general del Municipio de Cubará	6
Ilustración 2. Socialización del proyecto	9
Ilustración 3. Señalización en obra	14
Ilustración 4. entrega de dotación a personal	14
Ilustración 5. registro fotográfico alquiler de oficina	59
Ilustración 6. registro fotográfico de Alquiler de equipos de cómputo y papelería.....	59
Ilustración 7. registro fotográfico bodega para depósito de materiales.....	60
Ilustración 8. registro fotográfico de transporte de materiales	60

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. Pólizas	8
ANEXO 2. Actos Administrativos y Comités de Obra	10
ANEXO 3. Correspondencia enviada y recibida.....	11
ANEXO 4. Bitácoras de obra	11
ANEXO 5. Planillas de Seguridad Social.....	13
ANEXO 6. Nomina.....	13
ANEXO 7. Informe de seguridad y salud en el trabajo	19
ANEXO 8. Acta de avance de obra para parcial No 1	31
ANEXO 9. Registro Fotográfico	37
ANEXO 10. Memorias de cantidades.....	54
ANEXO 11. Programación de Obra.....	57
ANEXO 12. Informe de imprevistos.....	57
ANEXO 13. CONTRATOS DEL PERSONAL CONTRATADO POR PRESTACION DE SERVICIO.....	58
ANEXO 14. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OFICINA	59
ANEXO 15. CONTRATO DE ALQUILER DE COMPUTO, PAPELERIA.....	59
ANEXO 16. CONTRATO DE ALQUILER DE BODEGA	60
ANEXO 17. Factura y Certificación Bancaria.....	61
ANEXO 18. Certificaciones de interventoría	61

3183516384 / 3105718171
construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

INTRODUCCIÓN

El Hospital Especial de Cubará E.S.E. mediante el contrato de obra No. 361-2025 contrató a **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S** representada legalmente por **GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA** para el proyecto denominado "**ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**".

El seguimiento de las actividades contractuales está siendo realizada por la firma interventoría denominada **FRASCO SUMINISTRO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS** representada legalmente por **FANNY KATHERIN BARRERA CORREA**, a través del contrato No. 469-2025, para realizar la "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**". Suscrito con El Hospital Especial de Cubará E.S.E, quien conforma un equipo interdisciplinario con el fin de verificar que las partes contratantes cumplan a cabalidad, con equidad y armonía, los términos y obligaciones pactadas en el contrato; para obtener un resultado de excelente calidad, es decir, con la oportunidad, costos y especificaciones que satisfagan las necesidades de la comunidad interesada.

El presente informe es realizado por **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** del contrato de obra No. 361-2025. El cual contiene la acumulación de las actividades ejecutadas para el informe parcial al contrato de obra, que comprende el período del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2025.

El informe contiene la ejecución técnica, administrativa, financiera del contrato de obra arriba mencionado, en el marco del sistema de calidad y las exigencias de la Entidad Contratante contenidas en las especificaciones técnicas, referidas en los siguientes aspectos:


Trabajos ejecutados: descripción general de las obras ejecutadas evaluadas técnicamente de acuerdo a las especificaciones y diseños para el cumplimiento de los objetivos.

Aspectos Administrativos: Manejo administrativo de todos los documentos y trámites legales correspondientes, legalización, pólizas, actas, personal y equipo empleado para la ejecución de las obras.

Aspectos Técnicos: Control sobre la ejecución diaria de las actividades de obra dentro de los parámetros técnicos establecidos, utilizando el equipo y personal idóneo en la realización de los trabajos.

Aspecto Financiero: Control sobre la ejecución financiera del Contrato de acuerdo con los parámetros establecidos en el mismo.

Control de Calidad: control diario ejecución de obras, utilizando materiales de calidad y el personal idóneo en la ejecución de los trabajos.




5



2.2 LOCALIZACIÓN

- ☐ Este proyecto se llevará a cabo en la zona urbana del Municipio de Cubará, Departamento de Boyacá específicamente en las instalaciones del hospital especial de cubará ubicado en la calle 3 No. 5-47 del barrio San Rafael.

Ilustración 1 Ubicación general del Municipio de Cubará

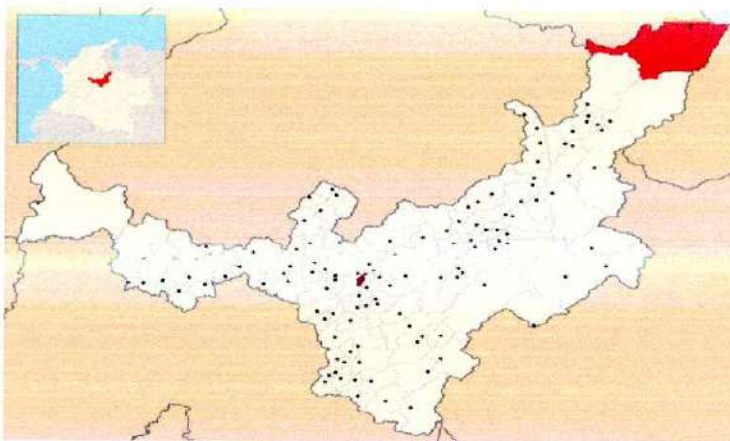

Fuente: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-_Boyaca_-_Cubara.svg

2.3 ALCANCE

El contrato de obra No. 361-2025 dio inicio el 16 de octubre de 2025 y se encuentra en su periodo de ejecución, en el cual se pretende realizar los controles necesarios para que el alcance del contrato de Obra cumpla a cabalidad el objetivo **"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ."**, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, las condiciones contractuales y principalmente cumplir con las expectativas de la entidad contratante en pro de entregar una obra de buena calidad a la comunidad del sector.

3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

3.1.1 Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra

Tabla 1 Ficha técnica del contrato

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA E.S.E
REPRESENTANTE LEGAL:	GIOVANNI QUINTERO TELLEZ
NIT No:	826.002.304-1
INTERVENTOR EXTERNO:	FRASCO SUMINISTRO CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS R/L. FANNY KATHERIN BARRERA CORREA

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA
NIT. No:	901.375.684-5
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
No. DE CONTRATO	361-2025
SUPERVISOR (A):	MARLENY APONTE TORRES Subgerente Administrativa y Financiera Supervisora E.S.E. Hospital Especial de Cúbará
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$ 616.781.927,00)
PLAZO CONTRACTUAL:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA INICIO:	16/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30/12/2025
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION

3.1.2 Garantías del contrato

De acuerdo con las garantías exigidas por la E.S.E Hospital Especial de Cúbará en el Contrato de Obra No. 361-2025, se suscribe con la compañía de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual.

3.1.3 Pólizas de Legalización

Las pólizas según contrato de obra fueron expedidas 16/09/2025 por la Aseguradora Solidaria de Colombia, tomadas por CONSTRUINDUCIVIL S.A.S y como beneficiario el E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ.

POLIZAS INICIALES PARA LEGALIZACION DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 361-2025.				
ANEXO	POLIZA No	AMPAROS	DESDE	HASTA
0	625 47 994000003468 Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento del contrato	08/09/2025	13/03/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	08/09/2025	13/11/2028
		Estabilidad y Calidad de la obra	24/11/2025	24/11/2028
		Calidad del servicio	08/09/2025	13/05/2026
0	625 74 994000001318 Aseguradora Solidaria de Colombia	Responsabilidad Civil Extracontractual	08/09/2025	24/03/2026

Tabla 2. Pólizas según contrato de obra No. 361-2025

Las pólizas con modificación de beneficiario adicional fueron expedidas el 16/10/2025 por la Aseguradora Solidaria de Colombia, tomadas por CONSTRUINDUCIVIL S.A.S y como beneficiario el E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA, y el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL .

POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 361-2025.				
ANEXO	POLIZA No	AMPAROS	DESDE	HASTA
1	625 47 994000003468 Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento del contrato	08/09/2025	13/03/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	08/09/2025	13/11/2028
		Estabilidad y Calidad de la obra	24/11/2025	24/11/2028
		Calidad del servicio	08/09/2025	13/05/2026
1	625 74 994000001318 Aseguradora Solidaria de Colombia	Responsabilidad Civil Extracontractual	08/09/2025	24/03/2026

Tabla 3 Pólizas según acta de inicio

Las pólizas según acta de inicio fueron expedidas el 21/11/2025 por la Aseguradora Solidaria de Colombia, tomadas por CONSTRUINDUCIVIL S.A.S y como beneficiario el E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA, y el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 361-2025.				
ANEXO	POLIZA No	AMPAROS	DESDE	HASTA
2	625 47 994000003468 Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento del contrato	16/10/2025	30/04/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	16/10/2025	30/12/2028
		Estabilidad y Calidad de la obra	30/12/2025	30/12/2028
		Calidad del servicio	16/10/2025	30/06/2026
2	625 74 994000001318 Aseguradora Solidaria de Colombia	Responsabilidad Civil Extracontractual	16/10/2025	30/04/2026

Tabla 4. Pólizas según acta de inicio

ANEXO 1. Pólizas

3.2 IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES

A la fecha del presente informe el contrato de obra No. 361-2025, suscrito con CONSTRUINDUCIVIL S.A.S no presenta ningún requerimiento o imposición de multas o sanciones sobre las obligaciones contractuales.

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901.375.684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

3.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

Tabla 5 Actos Administrativos Contrato de Obra No. 361-2025

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
16/10/2025	Acta de inicio	Iniciación del contrato de obra No. 361-2025	SUPERVISIÓN: MARLENY APONTE TORRES Subgerente Administrativa y Financiera E.S.E. Hospital Especial de Cubará CONTRATISTA: CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA NIT. 901.375.684-5
17/10/2025	Acta de socialización	Socialización del contrato de obra No. 361-2025	Asistentes: representantes de HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA E.S.E por el GERENTE GIOVANNI QUINTERO TELLEZ, presidentes de las comunidades beneficiadas e involucradas, contratista de obra, interventoría, supervisión y comunidad beneficiada.

Acta de Inicio: Se realiza con el propósito de dar inicio a la ejecución del contrato de obra No. 361-2025, suscrito previamente entre el contratista CONSTRUINDUCIVIL S.A.S y la entidad contratante, el HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA E.S.E. En el acta de inicio se establece la fecha de finalización para el día 30 de diciembre de 2025 y es firmada el día 16 de octubre de 2025 por el contratista CONSTRUINDUCIVIL S.A.S representado legalmente por GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA, Supervisor MARLENY APONTE TORRES.

Acta de Socialización: Para este proceso el HOPITAL ESPECIAL DE CUBARA E.S. convocó a una reunión en las instalaciones de el E CONSTRUINDUCIVIL S.A.S, el día 17 de octubre de 2025 a las 9:00 am, a la que asistieron representantes del Hospital Especial de Cubara, los presidentes de las comunidades beneficiadas e involucradas con el proyecto, contratista de obra, interventoría, supervisión y comunidad beneficiada, donde se dio a conocer el alcance del contrato, el presupuesto destinado para la ejecución de las actividades contempladas, se realizó la presentación del personal profesional del contratista, contratación del personal de la zona, maquinaria a emplear, los inconvenientes posibles para el desarrollo de las actividades.



Ilustración 2. Socialización del proyecto

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

3.4 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS

Durante la ejecución del contrato de obra, hasta la fecha de entrega del presente informe se presentaron los siguientes comités de obra:

Tabla 6. Actas de comité técnicos

FECHA	COMPROMISOS	PARTICIPANTE
11/11/2025	E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA- Ejecutar adecuación eléctrica completa y cableado normativo en salón de archivo.	SUPERVISIÓN: MARLENY APONTE TORRES Subgerente Administrativa y Financiera E.S.E. Hospital Especial de Cubará
	CONSTRUINDUCIVIL SAS- Continuar trabajos en consulta externa durante el fin de semana.	CONTRATISTA: CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA NIT. 901.375.684-5
	CONSTRUINDUCIVIL SAS- Continuar intervención en sala de administración	INTERVENTORIA: FRASCO SUMINISTRO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS SAS R/L FANNY KATHERIN BARRERA CORREA NIT. 901.629.231-4
	FRASCO SAS - Monitorear los frentes de trabajo y emitir conceptos técnicos necesarios para asegurar cumplimiento de especificaciones.	ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA: GERENTE GIOVANNI QUINTERO TELLEZ
	SUPERVISION E INTERVENTORIA- Coordinar conjuntamente el ingreso para trabajos de adecuación eléctrica.	

ANEXO 2. Actos Administrativos y Comités de Obra

3.5 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se recibieron las siguientes comunicaciones:

Tabla 7. Relación de correspondencia recibida por Construinducivil S.A.S

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
24/10/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L: Xiomara Manrique ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA E.S.E	Asunto: Solicitud de entrega de documentos iniciales previos al inicio de actividades de obra
10/11/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L: Xiomara Manrique ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA E.S.E	Asunto: Solicitud formal de Comité de Obra No 1 - Contrato de Obra No. 361-2025.
12/11/2025	ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA E.S.E	CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L: Xiomara Manrique	Asunto: Requerimiento de información sobre el personal vinculado al contrato de obra No. 361-2025

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

ANEXO 3. Correspondencia enviada y recibida

3.6 BITACORA DIARIA DE OBRA

Se realiza bitácora diaria de obra desde el día 16 de octubre a la fecha de entrega del presente informe. Esta es diligenciada diariamente por el ingeniero residente de obra y el ingeniero residente de interventoría y si hay lugar a alguna observación por parte de algún profesional de la interventoría este la realiza de manera escrita plasmando su firma junto a esta. La bitácora es abierta y suscrita por la ingeniera residente de obra VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA y el ingeniero residente de interventoría HENRY FABIAN FRASCO.

ANEXO 4. Bitácoras de obra

3.7 VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La Interventoría antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

3.7.1 Personal vinculado

Durante el periodo de ejecución del contrato de obra Pública No. 361-2025, se realizaron las afiliaciones de personal administrativo, la interventoría verificó que el personal ingresado a laborar contara con las afiliaciones pertinentes para el inicio de sus trabajos. Teniendo en cuenta que inicialmente se realizó una suspensión del contrato de obra, debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la zona, esto sumado a los tiempos en los que el contratista tarde en solicitar el personal, y realizar las afiliaciones correspondientes y los exámenes médicos del personal, las actividades de obra dieron inicio el día 27 de octubre del 2025, por lo que el personal inició labores en esta fecha.

A continuación, se relaciona el personal del contratista vinculado a CONSTRUINDUCIVIL S.A.S, identificando las empresas prestadoras de servicios para cada uno de ellos.

Tabla 8 Representante legal CONSTRUINDUCIVIL S.A.S octubre de 2025

N	NOMBRE	N° DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	AFILIADO A			CAJA DE COMPENSACION	No. PLANILLA
				EPS	AFP	ARL		
1	GLADIS XIOMARA MANRIQUE SUAREZ	1049397338	R/L	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY	35255951

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

Tabla 9 Personal administrativo vinculado mes de octubre de 2025

N	NOMBRE	N° DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	AFILIADO A			CAJA DE COMPENSACION	No. PLANILLA
				EPS	AFP	ARL		
1	VIANNEY BUITRAGO	1.094.275.515	RESIDENTE DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY	35401775
2	ROSA DANIELA SANTANDER APONTE	1.049.395.519	PROFESIONAL HSEQ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35401775
3	KARINA BARRERA AGUABLANCA	1.115.733.517	PROFESIONAL SOCIAL	COOSALUD	COLPENSION	POSITIVA	COMFABOY	35401775

3.7.2 Personal operativo vinculado

Durante el periodo de ejecución del contrato de obra Pública No. 361-2025, El contratista utilizó mano de obra no calificada de la región con la cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra.

A continuación, se relaciona el personal operativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

Tabla 10 Personal técnico vinculado mes de octubre de 2025

N	NOMBRE	N° DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	AFILIADO A			CAJA DE COMPENSACION	No. PLANILLA
				EPS	AFP	ARL		
1	JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA	96.167.929	OFICIAL DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35401775
2	BLANCA ISABEL SANTANFÉ ESTEVEZ	1.049.392.734	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35401775
3	CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA	1.094.268.169	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY	35401775
4	CARLOS ALBERTO SANTANFÉ CASTELLANOS	1.049.396.199	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35401775
5	FLORO IVAN CARRILLO MORA	1.094.392.738	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35401775
6	HENRY GUTIERREZ BATECA	96.125.112	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35401775
7	RIQUELME CASTELLANOS ROJAS	1.049.393.798	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35401775
8	WILBER ALEXANDER MORENO TORRES	1.049.392.860	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	COLPENSION	POSITIVA	COMFABOY	35401775
9	JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO	88.034.175	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY	35401775
10	JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS	1.094.280.998	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35401775
11	LUIS FRANCISCO TARAZONA	9.467.070	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	COLPENSION	POSITIVA	COMFABOY	35401775
12	OSCAR EDUARDO	1.049.394.907	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35401775



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

	GUERRERO RANGEL							
13	MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO	1.049.396.351	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	COLPENSION	POSITIVA	COMFABOY	35401775
14	LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO	4439097	MAESTRO DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSION	POSITIVA	COMFABOY	35401775

ANEXO 5. Planillas de Seguridad Social

ANEXO 6. Nomina

3.8 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Durante la ejecución de los trabajos el contratista efectuó seguimiento continuo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), verificando el cumplimiento de las medidas preventivas, el uso correcto de los elementos de protección personal y la aplicación de los protocolos establecido, se implementó la señalización requerida para el aislamiento de las zonas de trabajo, así como la instalación de las señales informativas y preventivas y vallas necesarias en la ejecución de la obra. Asimismo, se dispuso de un botiquín de primeros auxilios, garantizando atención inmediata en caso de incidentes y promoviendo un entorno laboral seguro.



31836163

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

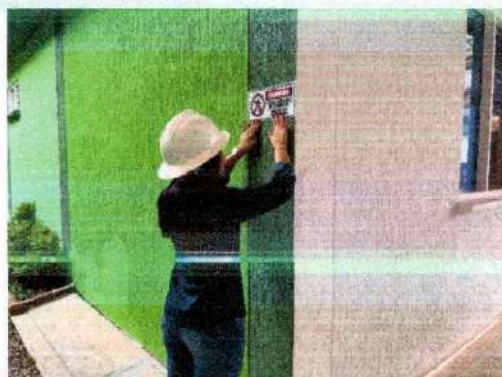


Ilustración 3. Señalización en obra

Dotación del personal

El contratista suministro los equipos y elementos de protección personal (EPP) e igualmente, desarrolló las acciones necesarias para que fueran utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de

los mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los trabajadores. Los elementos de protección personal fueron entregados por CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. Se anexan al final del presente documento las respectivas actas de entrega de dotación debidamente diligenciadas por los integrantes del personal de obra.



Ilustración 4. entrega de dotación a personal

Los suministros de dotación y elementos de protección personal "EPP" entregados por el contratista al personal de obra fueron: Pantalón, Camisa, Casco protector, Guantes reforzados, Tapa oídos y Gafas de seguridad.

3183616384 / 3106716171
construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

Tabla 11. Seguimiento entrega de elementos de protección

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	SI	N	Bueno	Regul	Malo	
PROTECCION DE MANOS						
Guantes reforzados	X		X			JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS HENRY GUTIERREZ BATECA RIQUELME CASTELLANOS ROJAS WILBER ALEXANDER MORENO TORRES JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO
PROTECCION DE OJOS						
Gafas de seguridad	X		X			JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS HENRY GUTIERREZ BATECA RIQUELME CASTELLANOS ROJAS WILBER ALEXANDER MORENO TORRES JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO
PROTECCION AUDITIVA						
Tapa oídos	X		X			JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS HENRY GUTIERREZ BATECA RIQUELME CASTELLANOS ROJAS WILBER ALEXANDER MORENO TORRES JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO
PROTECCION DE CUERPO						

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	SI	N	Bueno	Regul	Malo	
Camisa manga larga	X		X			JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS HENRY GUTIERREZ BATECA RIQUELME CASTELLANOS ROJAS WILBER ALEXANDER MORENO TORRES JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO
Pantalón	X		X			JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS HENRY GUTIERREZ BATECA RIQUELME CASTELLANOS ROJAS WILBER ALEXANDER MORENO TORRES JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO
Botas	X		X			JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS HENRY GUTIERREZ BATECA RIQUELME CASTELLANOS ROJAS WILBER ALEXANDER MORENO TORRES JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO
PROTECCION DE CABEZA						

3769616424 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	SI	N	Bueno	Regul	Malo	
Casco	X		X			JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS HENRY GUTIERREZ BATECA RIQUELME CASTELLANOS ROJAS WILBER ALEXANDER MORENO TORRES JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO

control de maquinaria y equipo en obra

La interventoría verificó que el contratista utilizara en la ejecución de las actividades del contrato la maquinaria y equipo requerido según los APU y especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo constató el estado físico y de operación de la maquinaria y equipo solicitando al contratista sustituirlo por mal estado o realizarle mantenimiento preventivo y/o correctivo, cada vez que fue necesario.

La maquinaria y equipo que el contratista utilizó durante el periodo del presente informe fue el siguiente:

Tipo:	COMPRESOR	
Estado:	Bueno	
Regularidad del mantenimiento:	Mensual	
Vibraciones/ Ruidos:	(No presenta/ presenta)	
Idoneidad de operarios:	idóneo	

Tipo:	SOLDADOR	
Estado:	Bueno	
Regularidad del mantenimiento:	Mensual	
Vibraciones/ Ruidos:	(No presenta/ presenta)	
Idoneidad de operarios:	idóneo	



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 201375664-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

Tipo:	HIDROLAVADORA	
Estado:	Buena	
Regularidad del mantenimiento:	Mensual	
Vibraciones/ Ruidos:	(No presenta/ presenta)	
Idoneidad de operarios:	Idóneo	

Tipo:	RETRO EXCAVADORA PAJARITA	
Estado:	Buena	
Regularidad del mantenimiento:	Mensual	
Vibraciones/ Ruidos:	(No presenta/ presenta)	
Idoneidad de operarios:	Idóneo	

Tipo:	PULIDORA	
Estado:	Buena	
Regularidad del mantenimiento:	Mensual	
Vibraciones/ Ruidos:	(No presenta/ presenta)	
Idoneidad de operarios:	Idóneo	

Accidentalidad en la obra

Durante la ejecución del proyecto se estuvo pendiente del registro y atención de los accidentes laborales presentados en obra con el personal vinculado por el contratista. Para el presente periodo de ejecución de la obra **NO** se presentaron accidentes laborales en la ejecución del contrato de obra Pública No. 361-2025.

Por otro lado, también se estuvo pendiente de cualquier accidente que se hubiese podido ocasionar a terceros en razón de la ejecución de la obra. Para el periodo de ejecución de la

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

obra **NO** se presentaron accidentes a terceros en la ejecución del contrato de obra Pública No. 361-2025.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Vigilancia de salud de los trabajadores

El contratista de obra desarrolló acciones de vigilancia de la Salud de los trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro y los programas de vigilancia epidemiológica; con el propósito de identificar precozmente efectos hacia la Salud derivados de los ambientes de Trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control.

Examen medico

Previo a la incorporación al contrato de obra No. 361 -2025, el contratista les informo a sus trabajadores de la importancia de verificar su estado de salud, para ello se les realizó los respectivos exámenes de ingreso con el fin de conocer si estos se encontraban en condiciones óptimas de salud para desempeñarse en las diferentes actividades a ejecutar.

La interventoría realizó el respectivo control y revisión de los exámenes de cada uno de los trabajadores para verificar su estado de salud y si está en óptimas condiciones para desarrollar las actividades del presente contrato.

ANEXO 7. Informe de seguridad y salud en el trabajo

4 ASPECTOS TECNICOS

4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de obra suscrito entre el Hospital Especial de Cubara E.S.E y la firma contratista CONSTRUINDUCIVIL contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de sesenta (60) días.

Tabla 12 Condiciones contractuales iniciales del Contrato de Obra No. 361-2025

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	AREA EXTERIOR					
1,01	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	1855,92	4%	\$ 7.640,85	\$ 14.748.038,59
1,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	1855,92	4%	\$ 17.576,11	\$ 33.924.648,23

3183616584 / 3106/16171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

1,03	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA CUADRADA DE 1"	M2	146,64		\$ 109.655,00	\$ 16.068.843,70
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 64.741.530,52
2	CUBIERTAS Y DRENAJES					
2,01	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)	M2	857,50		\$ 7.643,47	\$ 6.554.275,53
2,02	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO	M2	857,50		\$ 94.265,60	\$ 80.832.752,00
2,03	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO.	M2	450,00	4%	\$ 11.929,22	\$ 5.582.874,96
2,04	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	683,50	4%	\$ 8.791,65	\$ 6.249.456,49
2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	1133,50		\$ 119.304,46	\$ 135.231.605,41
2,06	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	ML	235,75		\$ 99.176,65	\$ 23.380.895,24
2,07	DESMONTE CANALES - BAJANTES.	ML	9,60	4%	\$ 5.809,30	\$ 58.000,05
2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	9,60	4%	\$ 117.117,01	\$ 1.169.296,23
2,09	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO	M2	473,32		\$ 14.761,83	\$ 6.987.069,38
2,10	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	2661,42	4%	\$ 3.338,02	\$ 9.230.228,12
2,11	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	3058,75	4%	\$ 225,00	\$ 715.747,50
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 276.001.200,91
3	ADMINISTRACION					
3,01	ESTUCCO MUROS	M2	2,80	4%	\$ 10.155,28	\$ 29.572,18
3,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	37,56	4%	\$ 17.576,11	\$ 686.930,62
3,03	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	477,26	4%	\$ 10.307,86	\$ 5.116.310,43
3,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	M2	40,13	4%	\$ 20.004,61	\$ 834.896,40
3,05	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	56,11	4%	\$ 14.773,22	\$ 862.082,39
3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UND	8,00		\$ 38.115,49	\$ 304.923,92

318361684755025077
construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

			COSTO DIRECTO GRUPO			\$
						7.834.715,94
4	ARCHIVO - ALMACEN					
4,01	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	145,77	4%	\$ 11.929,22	\$ 1.808.479,30
4,02	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0,15 mts.	M2	4,53	4%	\$ 13.629,00	\$ 64.208,94
4,03	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO	M2	1,53	4%	\$ 33.374,71	\$ 53.105,84
4,04	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	32,34	4%	\$ 13.629,00	\$ 458.392,33
4,05	CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18	ML	138,60		\$ 49.390,38	\$ 6.845.506,67
4,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	145,77		\$ 119.304,46	\$ 17.391.011,13
4,07	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	ML	11,30		\$ 99.176,65	\$ 1.120.696,15
4,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	11,30	4%	\$ 117.117,01	\$ 1.376.359,10
4,09	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	32,00	4%	\$ 51.834,72	\$ 1.725.059,48
4,10	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	15,22	4%	\$ 238.795,70	\$ 3.779.849,38
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 18 (Incluye marco, bisagras y pintura)	M2	4,20		\$ 401.082,39	\$ 1.684.546,04
4,12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	29,90	4%	\$ 25.187,68	\$ 783.236,10
4,13	ESTUCO MUROS	M2	29,90	4%	\$ 10.155,28	\$ 315.788,59
4,14	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	113,70	4%	\$ 17.576,11	\$ 2.078.339,86
4,15	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	220,44	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.363.155,24
4,16	CIELO RASO EN PVC	M2	115,86		\$ 71.719,83	\$ 8.316.631,49
4,17	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	481,04	4%	\$ 225,00	\$ 112.563,36
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 50.276.929,00



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

5	SALA DE AUTOPSIAS					
5,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	128,20	4%	\$ 10.307,86	\$ 1.374.326,36
5,02	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	M2	9,00	4%	\$ 20.004,61	\$ 187.243,15
5,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	49,50	4%	\$ 14.773,22	\$ 780.525,37
5,04	ESTUCO MUROS	M2	3,20	4%	\$ 10.155,28	\$ 33.798,77
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 2.355.891,65
6	HOSPITALIZACION					
6,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	432,72	4%	\$ 10.307,86	\$ 4.638.833,87
6,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	156,52	4%	\$ 17.576,11	\$ 2.861.053,25
6,03	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	M2	213,35	4%	\$ 3.130,72	\$ 694.656,68
6,04	CIELO RASO EN PVC	M2	213,35		\$ 71.719,83	\$ 15.301.425,73
6,05	ESTUCO MUROS	M2	46,21	4%	\$ 10.155,28	\$ 509.169,49
6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UND	21,00		\$ 38.115,49	\$ 800.425,29
6,07	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	126,10	4%	\$ 14.773,22	\$ 1.937.419,16
	COSTO DIRECTO GRUPO					\$ 26.742.983,47
7	PARTOS Y CIRUGIA					
7,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	119,09	4%	\$ 10.307,86	\$ 1.276.665,57
7,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	108,76	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.988.040,83
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 3.264.706,40
8	URGENCIAS					
8,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	488,08	4%	\$ 10.307,86	\$ 5.232.302,72
8,02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UND	1,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 1.579.534,48
8,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	6,00	4%	\$ 14.773,22	\$ 92.184,89

3183616854 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

8,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	M2	8,00	4%	\$ 20.004,61	\$ 166.438,36
8,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UND	5,00		\$ 38.115,49	\$ 190.577,45
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 7.261.037,90
9	CONSULTA EXTERNA					
9,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	435,57	4%	\$ 10.307,86	\$ 4.669.386,36
9,02	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	19,74	4%	\$ 13.629,00	\$ 279.797,92
9,03	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UND	10,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 15.795.344,76
9,04	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	15,60	4%	\$ 14.773,22	\$ 239.680,72
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 20.984.209,76
10	VACUNACION					
10,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	81,61	4%	\$ 10.307,86	\$ 874.873,43
10,02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UND	1,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 1.579.534,48
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 2.454.407,91
11	SALA DE RAYOS X					
11,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	50,82	4%	\$ 10.307,86	\$ 544.799,26
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 544.799,26
12	CITAS					
12,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	33,55	4%	\$ 10.307,86	\$ 359.661,85
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 359.661,85
13	COCINA Y LAVANDERIA					
13,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	233,63	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.504.554,35
13,02	ESTUCO MUROS	M2	29,13	4%	\$ 10.155,28	\$ 307.656,24
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 2.812.210,59
14	TERAPIA FISICA					

31 6361 6384 / 3105716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

14,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	246,87	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.646.489,46
14,02	ESTUCO MUROS	M2	10,80	4%	\$ 10.155,28	\$ 114.064,10
14,03	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	58,31	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.065.857,49
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 3.826.411,04
15	PARQUEADERO AMBULANCIAS					
15,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	211,31	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.265.280,05
15,02	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	19,70	4%	\$ 14.773,22	\$ 302.673,73
15,03	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	45,90	4%	\$ 16.684,41	\$ 796.447,00
15,04	ESTUCO MUROS	M2	12,50	4%	\$ 10.155,28	\$ 132.018,64
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 3.496.419,42
16	AREA DE SECADO					
16,01	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	78,11	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.427.784,75
16,02	ESTUCO MUROS	M2	5,94	4%	\$ 10.155,28	\$ 62.735,26
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 1.490.520,01
SUBTOTAL						\$ 675.447.836,00
ADMINISTRACION (20%)						\$ 135.089.567,20
IMPUESTOS (5%)						\$ 33.772.391,80
OTROS (10%)						\$ 67.544.783,60
VALOR TOTAL						\$ 911.854.578,60

4.2 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

Para el periodo del contrato que abarca desde del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2025, se ejecutaron las siguientes cantidades para cada uno de los ítems del contrato:

Tabla 13 Cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No 361-2025

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES							TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	PORCENTAJE	CANT	VR TOTAL	PORCENTAJE
1	AREA EXTERIOR											
1,01	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	1855,92	4%	\$ 7.640,85	\$ 14.748.038,59	1.855,92	\$ 14.748.038,59	100,00%	1.855,92	\$ 14.748.038,59	100,00%
1,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	1855,92	4%	\$ 17.576,11	\$ 33.924.648,23	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
1,03	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA CUADRADA DE 1"	M2	146,54		\$ 109.655,00	\$ 16.068.843,70	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
	COSTO DIRECTO GRUPO					\$ 64.741.530,52		\$ 14.748.038,59	33,33%	-	\$ 14.748.038,59	33,33%
2	CUBIERTAS Y DRENAJES											
2,01	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (AREA INTERNA)	M2	857,50		\$ 7.643,47	\$ 6.554.275,53	857,50	\$ 6.554.275,53	100,00%	857,50	\$ 6.554.275,53	100,00%
2,02	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO	M2	857,50		\$ 94.265,60	\$ 80.832.752,00	169,62	\$ 15.989.331,07	19,78%	169,62	\$ 15.989.331,07	19,78%
2,03	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO.	M2	450,00	4%	\$ 11.929,22	\$ 5.382.874,96	135,00	\$ 1.674.862,49	30,00%	135,00	\$ 1.674.862,49	30,00%
2,04	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	683,50	4%	\$ 8.791,65	\$ 6.249.456,49	559,60	\$ 5.116.599,63	81,87%	559,60	\$ 5.116.599,63	81,87%



CONSTRUCCION CIVIL												
2,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	S.A.S. 1133,50		\$ 119.304,46	EMPRESA DE SOLUCIONES 135.231.605,41	655,00	TEGRALES 57,79%	655,00	\$ 78.144.421,30	57,79%	
2,06	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	ML	235,75		\$ 99.176,65	\$ 23.380.895,24	126,15	53,51%	126,15	\$ 12.511.134,40	53,51%	
2,07	DESMONTE CANALES - BAJANTES.	ML	9,60	4%	\$ 5.809,30	\$ 58.000,05	-	0,00%	-	\$ -	0,00%	
2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	9,60	4%	\$ 117.117,01	\$ 1.169.296,23	-	0,00%	-	\$ -	0,00%	
2,09	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO	M2	473,32		\$ 14.761,83	\$ 6.987.069,38	388,12	82,00%	388,12	\$ 5.729.361,46	82,00%	
2,10	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	2661,42	4%	\$ 3.338,02	\$ 9.239.228,12	415,92	15,63%	415,92	\$ 1.443.883,25	15,63%	
2,11	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	3058,75	4%	\$ 225,00	\$ 715.747,50	1.382,00	45,18%	1.382,00	\$ 323.388,00	45,18%	
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 276.001.200,91		\$ 127.487.257,13	44,16%	\$ 127.487.257,13	44,16%	
3	ADMINISTRACION											
3,01	ESTUCCO MUROS	M2	2,80	4%	\$ 10.155,28	\$ 29.572,18	2,80	\$ 29.572,18	100,00%	\$ 2,80	\$ 29.572,18	100,00%
3,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	37,58	4%	\$ 17.576,11	\$ 686.930,62	-	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%
3,03	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	477,26	4%	\$ 10.307,86	\$ 5.116.310,43	477,26	\$ 5.116.310,43	100,00%	\$ 477,26	\$ 5.116.310,43	100,00%
3,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	M2	40,13	4%	\$ 20.004,61	\$ 834.896,40	40,13	\$ 834.896,40	100,00%	\$ 40,13	\$ 834.896,40	100,00%
3,05	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	56,11	4%	\$ 14.773,22	\$ 862.082,39	56,11	\$ 862.082,39	100,00%	\$ 56,11	\$ 862.082,39	100,00%
3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UND	8,00		\$ 38.115,49	\$ 304.923,92	-	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 7.834.715,94		\$ 6.842.861,40	66,67%	\$ 6.842.861,40	66,67%	
4	ARCHIVO - ALMACEN											
4,01	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO.	M2	145,77	4%	\$ 11.929,22	\$ 1.808.479,30	145,77	\$ 1.808.479,30	100,00%	\$ 145,77	\$ 1.808.479,30	100,00%



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES												
4,02	DEMOLICIÓN MUROS SATURADOS 1:1	M2	4,53	4%	\$ 13.629,00	\$ 64.208,94	4,53	\$ 64.208,94	100,00%	4,53	\$ 64.208,94	100,00%
4,03	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO	M2	1,53	4%	\$ 33.374,71	\$ 53.105,84	1,53	\$ 53.105,84	100,00%	1,53	\$ 53.105,84	100,00%
4,04	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	32,34	4%	\$ 13.629,00	\$ 458.392,33	32,34	\$ 458.392,33	100,00%	32,34	\$ 458.392,33	100,00%
4,05	CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18	ML	138,60		\$ 49.390,38	\$ 6.845.506,67	138,60	\$ 6.845.506,67	100,00%	138,60	\$ 6.845.506,67	100,00%
4,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	146,77		\$ 119.304,46	\$ 17.391.011,13	146,77	\$ 17.391.011,13	100,00%	146,77	\$ 17.391.011,13	100,00%
4,07	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	ML	11,30		\$ 99.176,65	\$ 1.120.696,15	11,30	\$ 1.120.696,15	100,00%	11,30	\$ 1.120.696,15	100,00%
4,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	11,30	4%	\$ 117.117,01	\$ 1.376.359,10	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
4,09	MURO EN BLOQUE No 5 E=0.12 MTS	M2	32,00	4%	\$ 51.834,72	\$ 1.725.059,48	32,00	\$ 1.725.059,48	100,00%	32,00	\$ 1.725.059,48	100,00%
4,10	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	16,22	4%	\$ 238.795,70	\$ 3.779.849,38	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 18 (Incluye marco, bisagras y pintura)	M2	4,20		\$ 401.082,39	\$ 1.684.546,04	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
4,12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	29,90	4%	\$ 25.187,68	\$ 783.236,10	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
4,13	ESTUCO MUROS	M2	29,90	4%	\$ 10.155,28	\$ 315.788,59	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
4,14	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	113,70	4%	\$ 17.576,11	\$ 2.078.339,86	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
4,15	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	220,44	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.363.155,24	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
4,16	CIELO RASO EN PVC	M2	115,96		\$ 71.719,83	\$ 8.316.631,49	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%



4,17	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	S.A.S. 481,04	4%	\$ 225,00	EMPRESA DE SOLUC 112.563,36	481,04	\$ 112.563,36	100,00%	481,04	\$ 112.563,36	100,00%
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 50.276.929,00		\$ 29.579.023,29	52,94%		\$ 29.579.023,29	52,94%
5	SALA DE AUTOPSIAS											
5,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	128,20	4%	\$ 10.307,86	\$ 1.374.326,36	128,20	\$ 1.374.326,36	100,00%	128,20	\$ 1.374.326,36	100,00%
5,02	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	M2	9,00	4%	\$ 20.004,61	\$ 187.243,15	9,00	\$ 187.243,15	100,00%	9,00	\$ 187.243,15	100,00%
5,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	49,50	4%	\$ 14.773,22	\$ 760.525,37	49,50	\$ 760.525,37	100,00%	49,50	\$ 760.525,37	100,00%
5,04	ESTUCO MUROS	M2	3,20	4%	\$ 10.155,28	\$ 33.796,77	3,20	\$ 33.796,77	100,00%	3,20	\$ 33.796,77	100,00%
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 2.355.891,65		\$ 2.355.891,65	100,00%		\$ 2.355.891,65	100,00%
6	HOSPITALIZACION											
6,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	432,72	4%	\$ 10.307,86	\$ 4.638.833,87	432,72	\$ 4.638.833,87	100,00%	432,72	\$ 4.638.833,87	100,00%
6,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	156,52	4%	\$ 17.576,11	\$ 2.861.053,25	156,52	\$ 2.861.053,25	100,00%	156,52	\$ 2.861.053,25	100,00%
6,03	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	M2	213,35	4%	\$ 3.130,72	\$ 694.656,68	213,35	\$ 694.656,68	100,00%	213,35	\$ 694.656,68	100,00%
6,04	CIELO RASO EN PVC	M2	213,35		\$ 71.719,83	\$ 15.301.425,73	213,35	\$ 15.301.425,73	100,00%	213,35	\$ 15.301.425,73	100,00%
6,05	ESTUCO MUROS	M2	48,21	4%	\$ 10.155,28	\$ 509.169,49	48,21	\$ 509.169,49	100,00%	48,21	\$ 509.169,49	100,00%
6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UND	21,00		\$ 38.115,49	\$ 800.425,29	21,00	\$ 800.425,29	100,00%	21,00	\$ 800.425,29	100,00%
6,07	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	126,10	4%	\$ 14.773,22	\$ 1.937.419,16	126,10	\$ 1.937.419,16	100,00%	126,10	\$ 1.937.419,16	100,00%



			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 26.742.983,47		\$ 26.742.983,47	100,00%	-	\$ 26.742.983,47	100,00%
7	PARTOS Y CIRUGIA											
7,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	119,09	4%	\$ 10.307,86	\$ 1.276.685,57	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
7,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	108,76	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.988.040,83	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 3.264.796,40		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
8	URGENCIAS											
8,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	488,08	4%	\$ 10.307,86	\$ 5.232.302,72	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
8,02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UND	1,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 1.579.534,48	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
8,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	6,00	4%	\$ 14.773,22	\$ 92.184,96	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
8,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	M2	8,00	4%	\$ 20.004,61	\$ 168.438,36	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
8,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UND	5,00		\$ 38.115,49	\$ 190.577,45	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 7.281.037,90		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
9	CONSULTA EXTERNA											
9,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	435,57	4%	\$ 10.307,86	\$ 4.669.386,36	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
9,02	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	19,74	4%	\$ 13.629,00	\$ 279.797,92	-	\$ -	0%	-	\$ -	0,00%
9,03	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UND	10,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 15.795.344,76	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
9,04	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	15,60	4%	\$ 14.773,22	\$ 239.680,72	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 20.984.209,76		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%



10	VACUNACION											
10.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	81,61	4%	\$ 10.307,86	\$ 874.873,43	-	\$ -	0%	-	\$ -	0,00%
10.02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UND	1,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 1.579.534,48	-	\$ -	0%	-	\$ -	0,00%
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 2.454.407,91		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
11	SALA DE RAYOS X											
11.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	50,82	4%	\$ 10.307,86	\$ 544.799,26	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 544.799,26		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
12	CITAS											
12.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	33,55	4%	\$ 10.307,86	\$ 369.661,85	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 369.661,85		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
13	COCINA Y LAVANDERIA											
13.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	233,63	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.504.554,35	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
13.02	ESTUCO MUROS	M2	29,13	4%	\$ 10.155,28	\$ 307.656,24	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 2.812.210,59		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
14	TERAPIA FISICA											
14.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	246,87	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.646.489,45	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
14.02	ESTUCO MUROS	M2	10,80	4%	\$ 10.155,28	\$ 114.064,10	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
14.03	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	58,31	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.065.857,49	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 3.826.411,04		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
15	PARQUEADERO AMBULANCIAS											



15,01	VINILO TIPO 13 SOBRE 3 MANOS SOBRE ESTUCCO	ML	3,4,3.	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.265.200,05	-	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
15,02	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	19,70	4%	\$ 14.773,22	\$ 302.673,73	-	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
15,03	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	45,90	4%	\$ 16.684,41	\$ 796.447,00	-	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
15,04	ESTUCCO MUROS	M2	12,50	4%	\$ 10.155,28	\$ 132.018,64	-	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	COSTO DIRECTO GRUPO					\$ 3.496.419,42		\$ -	0,00%		0,00%
16	AREA DE SECADO										
16,01	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	78,11	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.427.784,75	-	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
16,02	ESTUCCO MUROS	M2	5,94	4%	\$ 10.155,28	\$ 62.735,26	-	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	COSTO DIRECTO GRUPO					\$ 1.490.520,01		\$ -	0,00%		0,00%
	SUBTOTAL					\$ 4.986.939,43		\$ 207.716.005,00	43,79%	\$ 207.716.005,00	43,79%
	ADMINISTRACION (5%)					\$ 249.346,97		\$ 9.158.914,00	0,55%	\$ 9.158.914,00	43,79%
	IMPUESTOS (5%)					\$ 249.346,97		\$ 9.158.914,00	0,01%	\$ 9.158.914,00	43,79%
	UTILIDAD (5%)					\$ 249.346,97		\$ 9.158.914,00	0,00%	\$ 9.158.914,00	43,79%
	VALOR TOTAL					\$ 5.735.029,34		\$ 225.092.847,00	0,00%	\$ 225.092.847,00	43,79%

ANEXO 8. Acta de avance de obra para parcial No 1



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

4.3 AVANCE DE LA OBRA

4.3.1 Avance Físico de las obras

De acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas en el periodo desde el 16 de octubre de al 15 de noviembre de 2025, se presenta un avance físico del 40,54%

Tabla 14. Avance físico de la Obra

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	CANT	PORCENTAJE
1	AREA EXTERIOR				
1.01	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	1855,92	1,855,92	100,00%
1.02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	1855,92	-	0,00%
1.03	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA CUADRADA DE 1"	M2	146,54	-	0,00%
	TOTAL				33,33%
2	CUBIERTAS Y DRENAJES				
2.01	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)	M2	857,50	857,50	100,00%
2.02	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO	M2	857,50	169,62	19,78%
2.03	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	450,00	135,00	30,00%
2.04	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	683,50	559,60	81,87%
2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	1133,50	655	57,79%
2.06	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	ML	235,75	126,15	53,51%
2.07	DESMONTE CANALES - BAJANTES.	ML	9,60	-	0,00%
2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	9,60	-	0,00%
2.09	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO	M2	473,32	388,12	82,00%
2.10	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	2661,42	415,92	15,63%
2.11	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	3058,75	1.382,00	45,18%
	TOTAL				44,16%
3	ADMINISTRACION				
3.01	ESTUCO MUROS	M2	2,80	2,80	100,00%
3.02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	37,58	-	0,00%
3.03	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	477,26	477,26	100,00%
3.04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	M2	40,13	40,13	100,00%
3.05	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	56,11	56,11	100,00%

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

3.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UND	8,00		0,00%
	TOTAL				66,67%
4	ARCHIVO - ALMACEN				
4.01	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	145,77	145,77	100,00%
4.02	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	4,53	4,53	100,00%
4.03	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO	M2	1,53	1,53	100,00%
4.04	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	32,34	32,34	100,00%
4.05	CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18	ML	138,60	138,60	100,00%
4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	145,77	145,77	100,00%
4.07	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0.70 M	ML	11,30	11,30	100,00%
4.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	11,30	-	0,00%
4.09	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	32,00	32,00	100,00%
4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	15,22	-	0,00%
4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 18 (incluye marco, bisagras y pintura)	M2	4,20	-	0,00%
4.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	29,90	-	0,00%
4.13	ESTUCO MUROS	M2	29,90	-	0,00%
4.14	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	113,70	-	0,00%
4.15	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	220,44	-	0,00%
4.16	CIELO RASO EN PVC	M2	115,96	-	0,00%
4.17	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	481,04	481,04	100,00%
	TOTAL				52,94%
5	SALA DE AUTOPSIAS				
5.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	128,20	128,20	100,00%
5.02	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	M2	9,00	9,00	100,00%
5.03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	M2	49,50	49,50	100,00%
5.04	ESTUCO MUROS	M2	3,20	3,20	100,00%
	TOTAL				100,00%
6	HOSPITALIZACION				
6.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	432,72	432,72	100,00%
6.02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	156,52	156,52	100,00%
6.03	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	M2	213,35	213,35	100,00%

3183516341
construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubaró-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

6.04	CIELO RASO EN PVC	M2	213,35	213,35	100,00%
6.05	ESTUCCO MUROS	M2	48,21	48,21	100,00%
6.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UND	21,00	21,00	100,00%
6.07	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	126,10	126,10	100,00%
COSTO DIRECTO GRUPO					100,00%
7	PARTOS Y CIRUGIA				
7.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	119,09	-	0,00%
7.02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	108,76	-	0,00%
COSTO DIRECTO GRUPO					0,00%
8	URGENCIAS				
8.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	488,08	-	0,00%
8.02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UND	1,00	-	0,00%
8.03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	6,00	-	0,00%
8.04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	M2	8,00	-	0,00%
8.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UND	5,00	-	0,00%
COSTO DIRECTO GRUPO					0,00%
9	CONSULTA EXTERNA				
9.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	435,57	-	0,00%
9.02	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	19,74	-	0,00%
9.03	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UND	10,00	-	0,00%
9.04	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	15,60	-	0,00%
COSTO DIRECTO GRUPO					0,00%
10	VACUNACION				
10.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	81,61	-	0,00%
10.02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UND	1,00	-	0,00%
COSTO DIRECTO GRUPO					0,00%
11	SALA DE RAYOS X				
11.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	50,82	-	0,00%
COSTO DIRECTO GRUPO					0,00%
12	CITAS				
12.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	33,55	-	0,00%
COSTO DIRECTO GRUPO					0,00%
13	COCINA Y LAVANDERIA				
13.01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	233,63	-	0,00%



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

13,02	ESTUCCO MUROS	M2	29,13	-	0,00%
COSTO DIRECTO GRUPO					0,00%
14	TERAPIA FISICA				
14,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	246,87	-	0,00%
14,02	ESTUCCO MUROS	M2	10,80	-	0,00%
14,03	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	58,31	-	0,00%
COSTO DIRECTO GRUPO					0,00%
15	PARQUEADERO AMBULANCIAS				
15,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	211,31	-	0,00%
15,02	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	19,70	-	0,00%
15,03	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	45,70	-	0,00%
15,04	ESTUCCO MUROS	M2	12,50	-	0,00%
TOTAL					0,00%
16	AREA DE SECADO				
16,01	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	78,11	-	0,00%
16,02	ESTUCCO MUROS	M2	3,94	-	0,00%
					0,00%
AVANCE TOTAL ACUMULADO					40,35%

La anterior tabla ilustra las cantidades ejecutadas respecto a las contratadas durante el total de días de ejecución, teniendo un avance físico total de 40,35%.



Avance Físico de la Obra

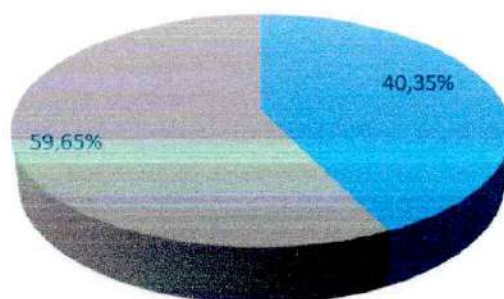

■ PORCENTAJE AVANCE FISICO ■ PORCENTAJE RESTANTE

Grafico 1. Avance físico de la obra

4.3.2 Avance del plazo contractual

Con respecto al plazo contractual, de los tiempos establecidos en la minuta del contrato, han transcurrido 31 días desde la fecha de inicio hasta la fecha del 15 de noviembre del 2025, lo cual equivale a un 41.33% del total del plazo contractual.

Tabla 15. Avance en tiempo

AVANCE EN TIEMPO	
PLAZO DEL CONTRATO (DIAS)	75
TIEMPO LABORADO	31
TIEMPO RESTANTE	45
GRAFICA DE AVANCE	
PORCENTAJE LABORADO	41.33%
PORCENTAJE RESTANTE	58,67%



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 90131

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

GRAFICA DE AVANCE

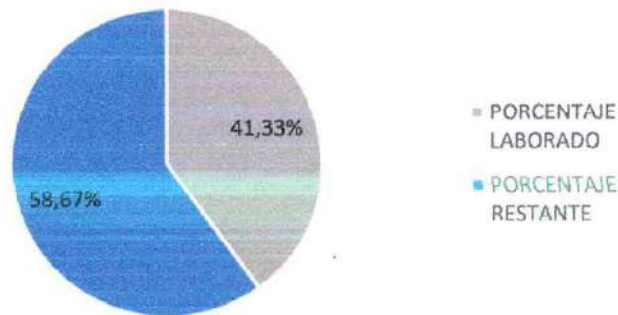


Grafico 2. Avance en tiempo

ANEXO 9. Registro Fotográfico

ACTIVIDAD:	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO		
ITEM:	1.01	UNIDAD:	M ²
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1855.92	CANTIDAD ACUMULADA:	1855.92
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	1855.92	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)		
ITEM:	2.01	UNIDAD:	M ²
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	857.50	CANTIDAD ACUMULADA:	857.50
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	857.50	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDAD:	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO		
ITEM:	2.02	UNIDAD:	M ²
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	857.50	CANTIDAD ACUMULADA:	169.62
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	169.62	CANTIDAD POR EJECUTAR:	687.88
PORCENTAJE EJECUTADO:	19.78%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	80.22%

REGISTRO FOTOGRAFICO

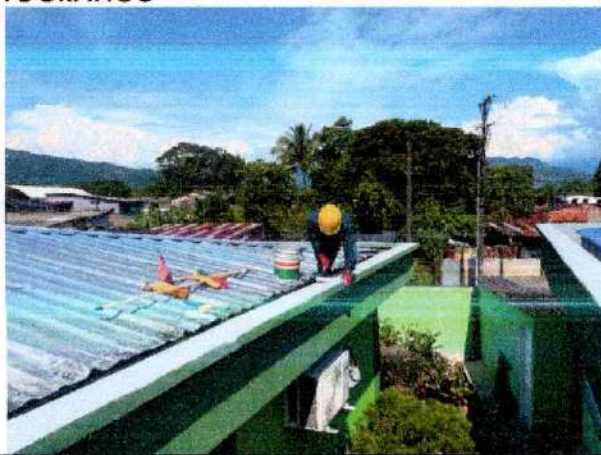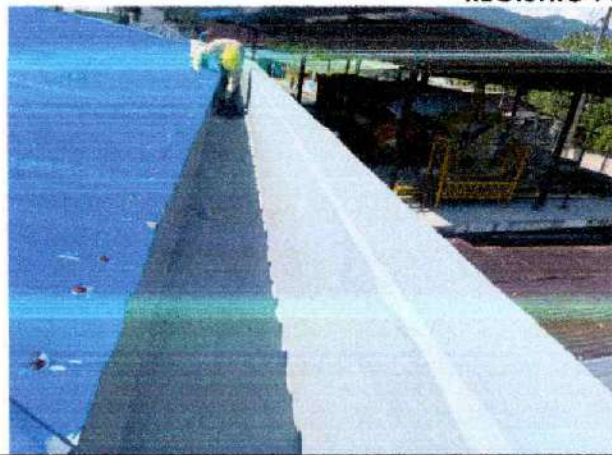

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES


ACTIVIDAD:	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.		
ITEM:	2.03	UNIDAD:	M ²
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	450,00	CANTIDAD ACUMULADA:	135
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	135,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	315,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	30,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	70,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDAD:	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA		
ITEM:	2.04	UNIDAD:	M ²
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	683,50	CANTIDAD ACUMULADA:	559,60
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	559,60	CANTIDAD POR EJECUTAR:	123,90
PORCENTAJE EJECUTADO:	81,87%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	18,13%

REGISTRO FOTOGRAFICO

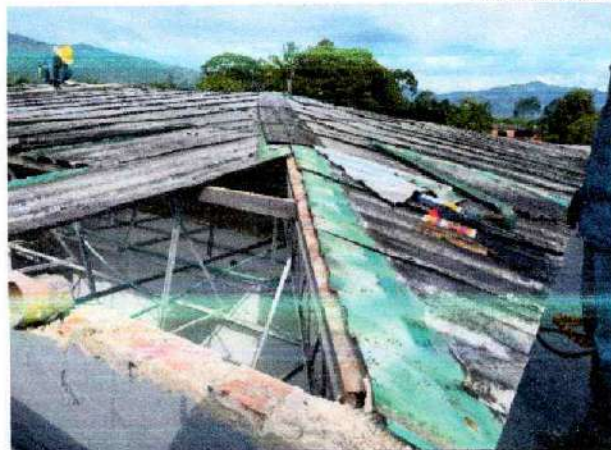

3183616384 / 3106716171
construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360		
ITEM:	2.05	UNIDAD:	M ²
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1133,50	CANTIDAD ACUMULADA:	655
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	655	CANTIDAD POR EJECUTAR:	478.50
PORCENTAJE EJECUTADO:	57.79%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	42.21%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDAD:	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M		
ITEM:	2.06	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	235.75	CANTIDAD ACUMULADA:	126.15
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	126.15	CANTIDAD POR EJECUTAR:	109.60
PORCENTAJE EJECUTADO:	53.51%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	46.49%

REGISTRO FOTOGRAFICO

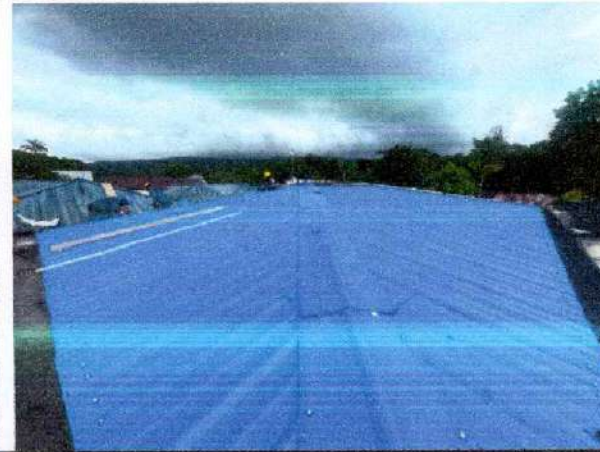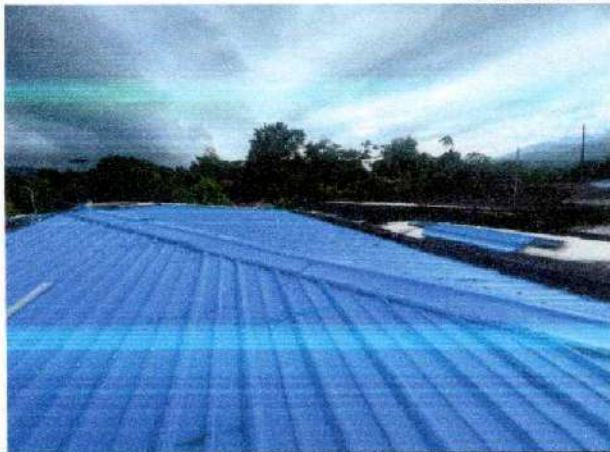

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)




CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO		
ITEM:	2.09	UNIDAD:	M ²
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	473.32	CANTIDAD ACUMULADA:	388.12
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	388.12	CANTIDAD POR EJECUTAR:	85.20
PORCENTAJE EJECUTADO:	82.00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	18.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

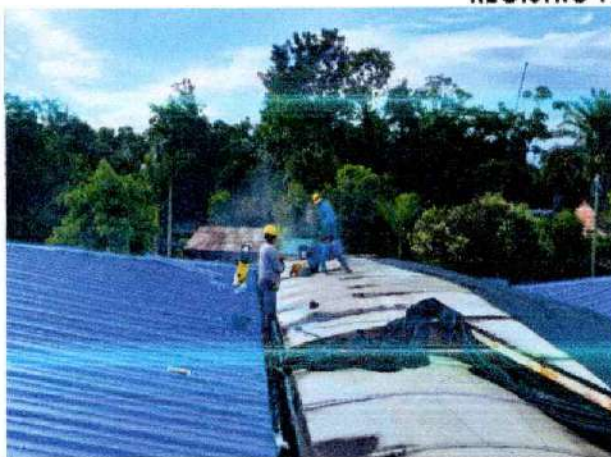

ACTIVIDAD:	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA		
ITEM:	2.10	UNIDAD:	KG
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	2661.42	CANTIDAD ACUMULADA:	415.92
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	415.92	CANTIDAD POR EJECUTAR:	2245.50
PORCENTAJE EJECUTADO:	15.63%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	84.37%

REGISTRO FOTOGRAFICO



3183616384 / 3106716171
construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM		
ITEM:	2.11	UNIDAD:	KG
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	3058.75	CANTIDAD ACUMULADA:	1382.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	1382.00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	1676.75
PORCENTAJE EJECUTADO:	45.18%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	54.82%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS		
ITEM:	3.01	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	2.80	CANTIDAD ACUMULADA:	2.80
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	2.80	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



3183616384 / 3106716171
 construinducivil@gmail.com
 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD: VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO			
ITEM:	3.03	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	477.26	CANTIDAD ACUMULADA:	477.26
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	477.26	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDAD: ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS			
ITEM:	3.04	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	40.13	CANTIDAD ACUMULADA:	40.13
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	40.13	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD: ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS

ITEM: 3.05

UNIDAD:

ML

CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE: 56.11

CANTIDAD ACUMULADA: 56.11

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME: 56.11

CANTIDAD POR EJECUTAR: 0

PORCENTAJE EJECUTADO: 100%

PORCENTAJE POR EJECUTAR: 0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDAD: DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.

ITEM: 4.01

UNIDAD:

M2

CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE: 145.77

CANTIDAD ACUMULADA: 145.77

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME: 145.77

CANTIDAD POR EJECUTAR: 0.00

PORCENTAJE EJECUTADO: 100%

PORCENTAJE POR EJECUTAR: 0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO






CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.		
ITEM:	4.02	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	4.53	CANTIDAD ACUMULADA:	4.53
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	4.53	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

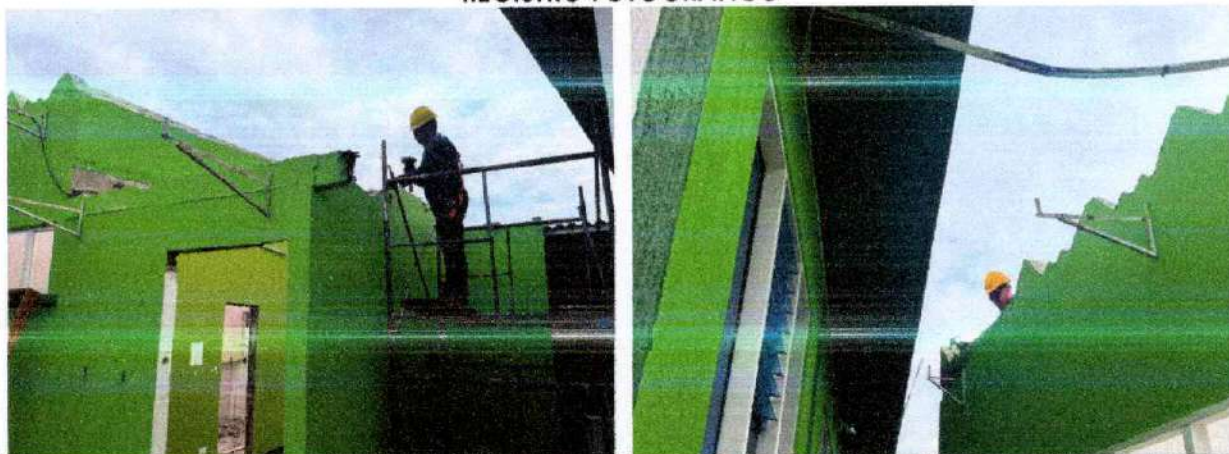

ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO		
ITEM:	4.03	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1.53	CANTIDAD ACUMULADA:	1.53
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	1.53	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



3183616384 / 3106716171
 construinducivil@gmail.com
 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD: DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS

ITEM:	4.04	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	32.34	CANTIDAD ACUMULADA:	32.34
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	32.34	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%


REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDAD: CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18

ITEM:	4.05	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	138,60	CANTIDAD ACUMULADA:	138,60
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	138,60	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

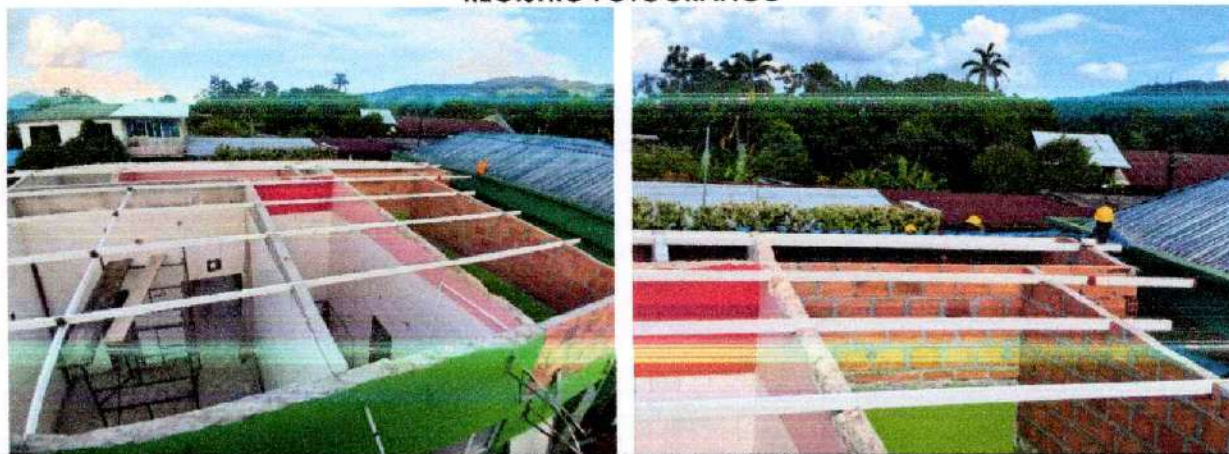

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES


ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360		
ITEM:	4.06	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	145.77	CANTIDAD ACUMULADA:	145.77
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	145.77	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDAD:	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M		
ITEM:	4.07	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	11.30	CANTIDAD ACUMULADA:	11.30
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	11.30	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO


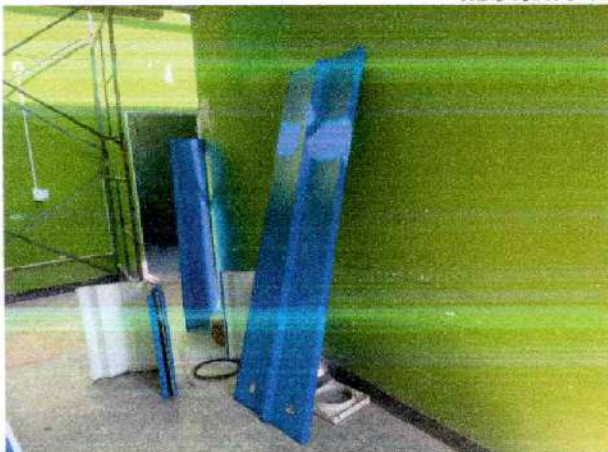


3183616384 / 3106716171
 construinducivil@gmail.com
 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



ACTIVIDAD:	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS		
ITEM:	4.09	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	32.00	CANTIDAD ACUMULADA:	32.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	32.00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

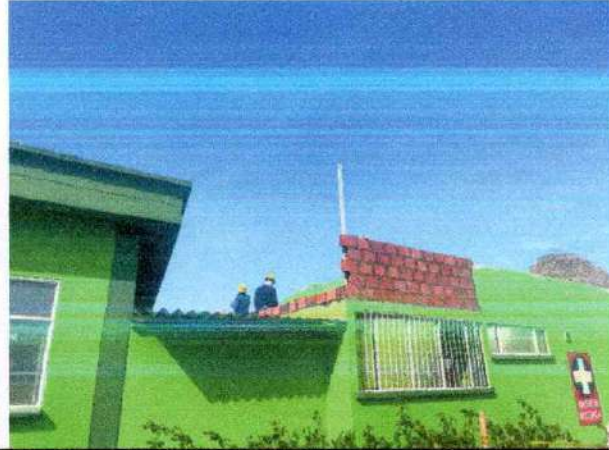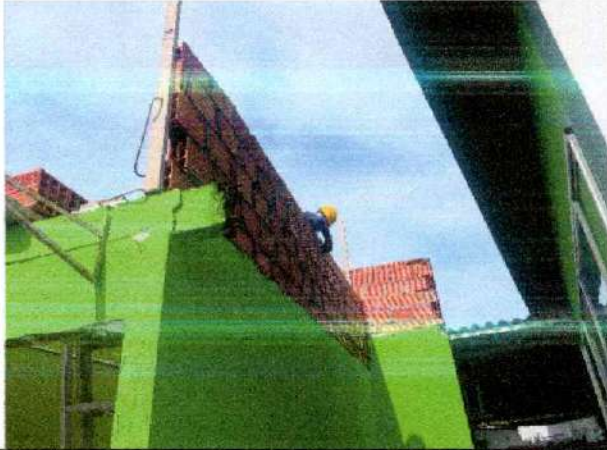

ACTIVIDAD:	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM		
ITEM:	4.17	UNIDAD:	KG
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	481.04	CANTIDAD ACUMULADA:	481.04
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	481.04	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO






CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES


ACTIVIDAD: VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO			
ITEM:	5.01	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	128.20	CANTIDAD ACUMULADA:	128.20
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	128.20	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

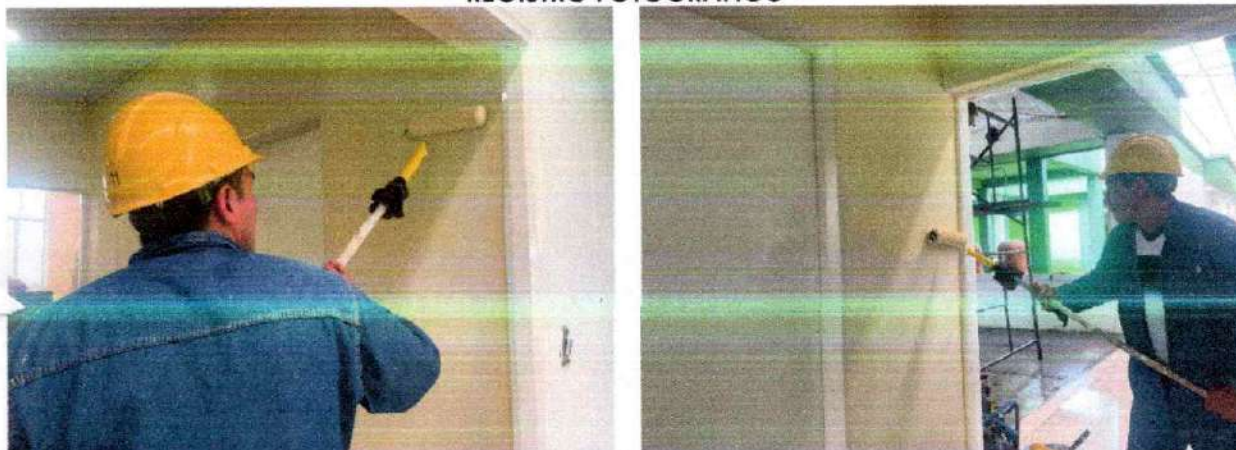

ACTIVIDAD: ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS			
ITEM:	5.02	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	9.00	CANTIDAD ACUMULADA:	9.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	9.00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

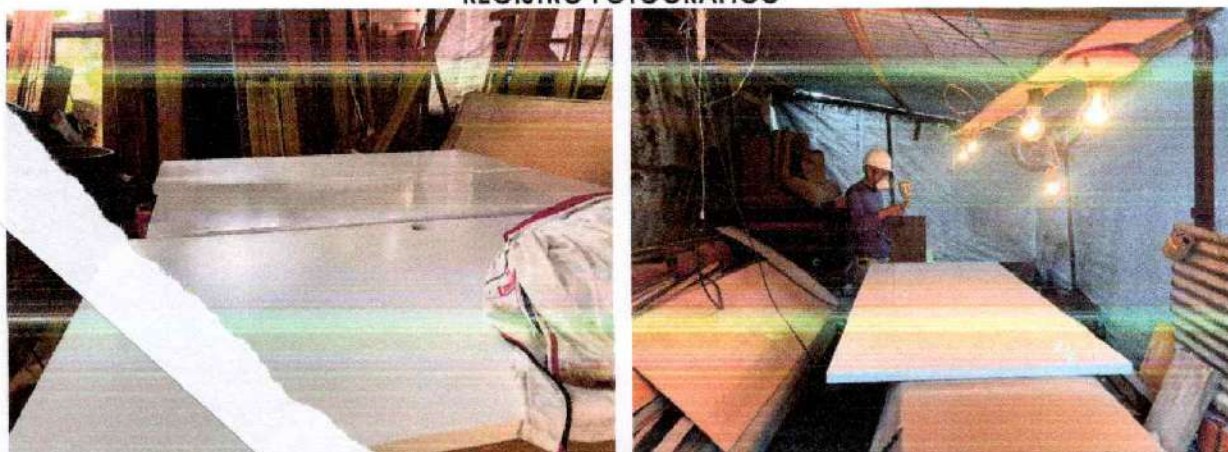

3183616384 / 3106716171
construinducivil@gmail.com
Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



ACTIVIDAD:	ESMALIE MARCOS LAMINA 3 MANOS		
ITEM:	5.03	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	49.50	CANTIDAD ACUMULADA:	49.50
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	49.50	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS		
ITEM:	5.04	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	3.20	CANTIDAD ACUMULADA:	3.20
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	3.20	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

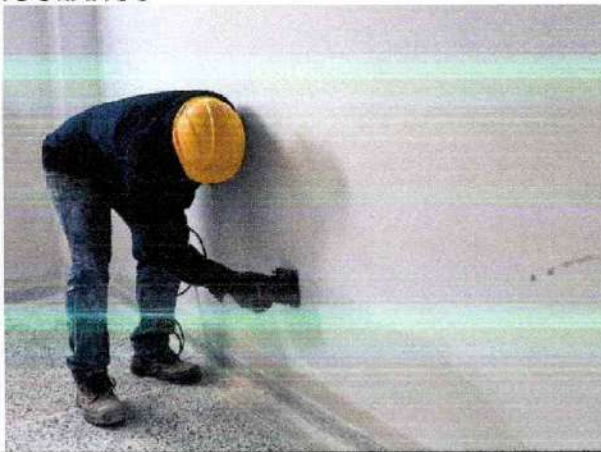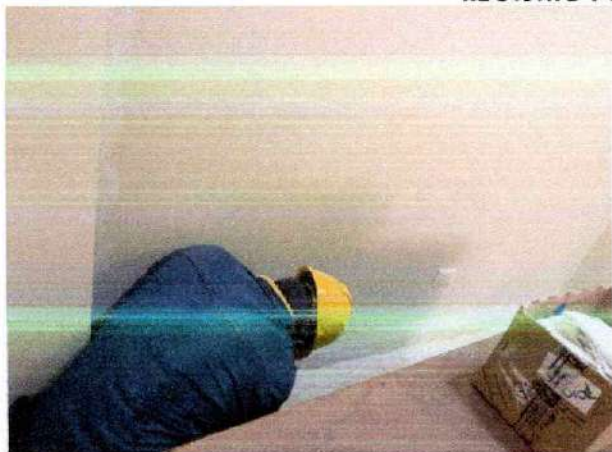

3183616384 / 3106716171
construinducivil@gmail.com
Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO		
ITEM:	6.01	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	432.72	CANTIDAD ACUMULADA:	432.72
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	432.72	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDAD:	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES		
ITEM:	6.02	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	156.52	CANTIDAD ACUMULADA:	156.52
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	156.52	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



3183616384 / 3106716171
construinducivil@gmail.com
Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)		
ITEM:	6.03	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	213.35	CANTIDAD ACUMULADA:	213.35
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	213.35	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDAD:	CIELO RASO EN PVC		
ITEM:	6.04	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	213.35	CANTIDAD ACUMULADA:	213.35
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	213.35	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



3183616384 / 3106716171
 construinducivil@gmail.com
 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES


ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS		
ITEM:	6.05	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	48.21	CANTIDAD ACUMULADA:	48.21
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	48.21	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W		
ITEM:	6.06	UNIDAD:	UND
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	21.00	CANTIDAD ACUMULADA:	21.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	21.00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

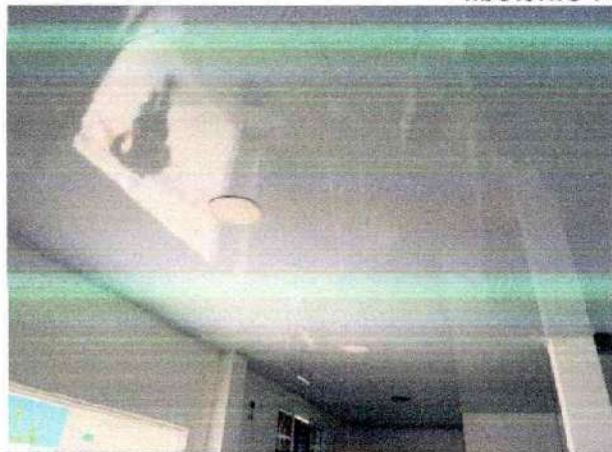

3183616384 / 3106716171
 construinducivil@gmail.com
 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS		
ITEM:	6.06	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	126.10	CANTIDAD ACUMULADA:	126.10
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	126.10	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ANEXO 10. Memorias de cantidades

5 ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

A la fecha del presente informe el contratista cuenta con un avance financiero de doscientos veinte millones seiscientos veinticinco mil doscientos doce pesos (\$ 230.337.591,76) indicándome un porcentaje financiero del 54,27%

Tabla 16. Avance financiero
AVANCE FINANCIERO

ITEM	CAPITULO	VALOR TOTAL DIRECTO	AVANCE PARCIAL 1	PORCENTAJE
1	AREA EXTERIOR	\$ 64.741.530,52	\$ 14.748.038,59	33,33%
2	CUBIERTAS Y DRENAJES	\$ 76.001.200,91	\$ 127.487.257,13	44,51%
3	ADMINISTRACION	\$ 7.834.715,94	\$ 6.842.861,40	66,67%
4	ARCHIVO-ALMACEN	\$ 50.276.929,00	\$ 9.579.023,20	52,94%



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

5	SALA DE AUTOPSIAS	\$	2.355.891,65	\$	2.355.891,65	100,00%
6	HOSPITALIZACION	\$	26.742.983,47	\$	26.742.983,47	100,00%
7	PARTOS Y CIRUGIA	\$	3.264.706,40	\$	-	0,00%
8	URGENCIAS	\$	7.261.037,90	\$	-	0,00%
9	CONSULTA EXTERNA	\$	20.984.209,76	\$	-	0,00%
10	VACUNACION	\$	2.454.407,91	\$	-	0,00%
11	SALA DE RAYOS X	\$	544.799,26	\$	-	0,00%
12	CITAS	\$	359.661,85	\$	-	0,00%
13	COCINA Y LAVANDERIA	\$	2.812.210,59	\$	-	0,00%
14	TERAPIA FISICA	\$	3.826.411,04	\$	-	0,00%
15	PARQUEADERO AMBULANCIAS	\$	3.496.419,42	\$	-	0,00%
16	AREA DE SECADO	\$	1.490.520,01	\$	-	0,00%
AVANCE TOTAL		\$	474.447.635,63	\$	207.756.055,44	43,79%

AVANCE FINANCIERO

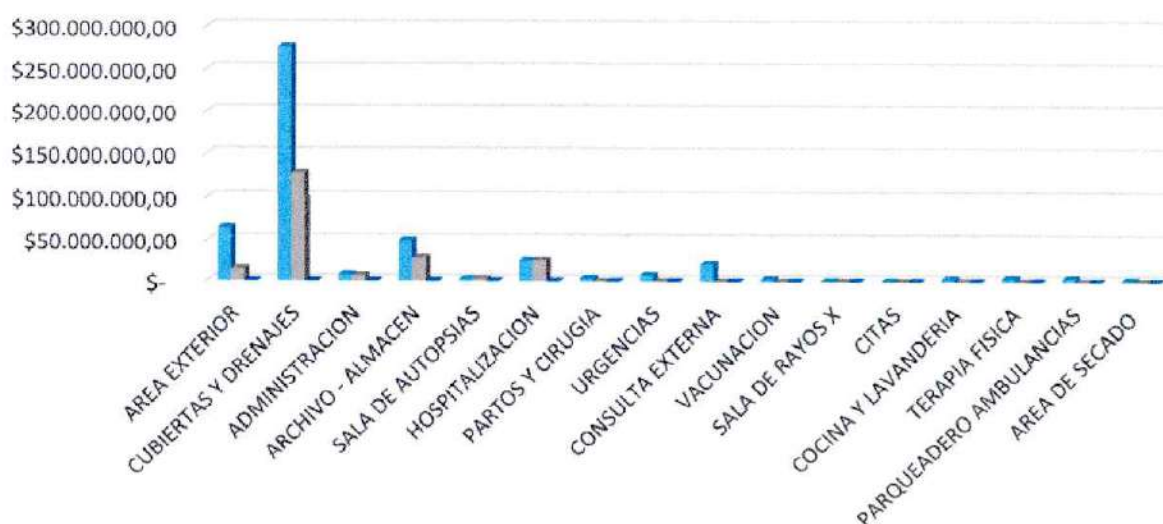


Grafico 3. Grafica de avance financiero



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

5.2 PROGRAMACION DE OBRA

Se realizó la programación de obra, en la cual se establece la planificación de las actividades necesarias para la ejecución del proyecto, se realizó una comparación en cuanto a la programación inicial de obra, y la programación real en cuanto a el avance de obra a la fecha.

A continuación, se presenta la siguiente tabla con los porcentajes (%) de obra ejecutada a la fecha de corte del presente informe, comparando lo programado con lo ejecutado.

Tabla 17. Avance programado vs ejecutado

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO			
ITEM	CAPITULO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO
1	AREA EXTERIOR	57%	33,33%
2	CUBIERTAS Y DRENAJES	39%	44,51%
3	ADMINISTRACION	100%	66,67%
4	ARCHIVO - ALMACEN	100%	52,94%
5	SALA DE AUTOPSIAS	100%	100,00%
6	HOSPITALIZACION	28%	100,00%
7	PARTOS Y CIRUGIA	0%	0,00%
8	URGENCIAS	0%	0,00%
9	CONSULTA EXTERNA	32%	0,00%
10	VACUNACION	0%	0,00%
11	SALA DE RAYOS X	100%	0,00%
12	CITAS	0%	0,00%
13	COCINA Y LAVANDERIA	100%	0,00%
14	TERAPIA FISICA	100%	0,00%
15	PARQUEADERO AMBULANCIAS	43%	0,00%
16	AREA DE SECADO	0%	0,00%
TOTAL ACUMULADO		49,94%	43,79%

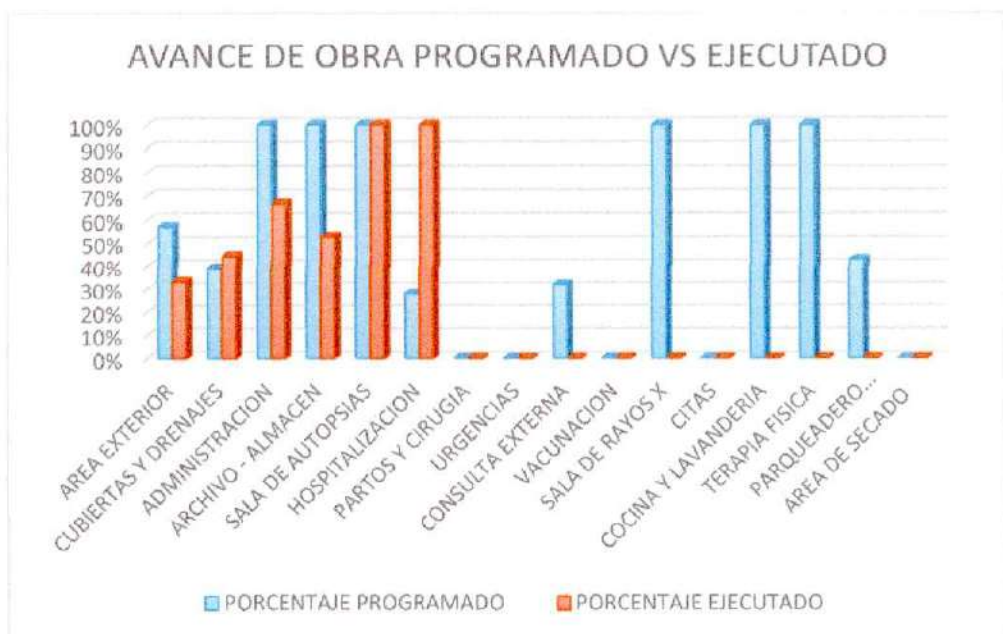


Gráfico 4. Grafica de avance de obra programado vs ejecutado

De acuerdo con la gráfica de avance programada vs el avance de obra ejecutada, se observa una disminución considerable del avance de obra programada por capítulo a la fecha, esto debido a los imprevistos presentados durante la ejecución del proceso de obra.

ANEXO 11. Programación de Obra

6 IMPREVISTOS

Durante la ejecución del contrato de Pública No. 361-2025 **"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ"**, En la etapa de pintura, en el área de hospitalización, se presenta un imprevisto, que impacta el presupuesto original de este rubro. En las memorias contractuales no se había contemplado la aplicación de pintura en las áreas de baños de las habitaciones y cubículos existentes en la recepción, esta omisión en la medición inicial resultó en la necesidad de adquirir y aplicar una cantidad adicional de pintura mayor a lo presupuestado, por otro lado se han venido presentando lluvias, lo que ha generado un gasto económico en horas máquina, horas hombre, debido a estas lluvias se han presentado actividades o trabajos extras para no generar retraso en el cronograma de actividades.

ANEXO 12. Informe de imprevistos

7 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Conforme con la propuesta presentada por el CONSTRUINDUCIVIL S.A.S., se contaba con un treinta (30%) del costo directo del proyecto para ser ejecutada durante la ejecución de la obra. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta el Presupuesto de Desglose del AIU, se han desarrollado las siguientes actividades como cumplimiento a las actividades administrativas:

7.1 Personal administrativo

La siguiente tabla, relaciona el personal administrativo, presentado en el AIU del proyecto:

PERSONAL ADMINISTRATIVO	No. DE IDENTIFICACION	CARGO	EPS	AFP	ARL	CAJA DE COMPENSACION	No. PLANILLA
VIANNEY KARINA JITRAGO	1094275515	residente de obra	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	CONFABOY	9492574491
ADRIANA MARCELA MENDOZA	1094282780	tecnólogo en áreas de Ingeniería	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	-	35255951
GEIDY ESPERANZA MANRIQUE	1118565441	secretaria	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	CONFABOY	35256845
XIOMARA MANRIQUE BECERRA	1049397338	contador	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	CONFABOY	35401775
LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO	4439097	maestro de obra	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	CONFABOY	35401775
CARLOS RENE AGUABLANCA DUARTE	1094243208	almacenista	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	CONFABOY	35256845

ANEXO 13. CONTRATOS DEL PERSONAL CONTRATADO POR PRESTACION DE SERVICIO.

7.2 Alquiler de Oficina

Se adecuó un espacio para ser usado como oficina y sede del CONSTRUINDUCIVIL S.A.S., ubicado en la carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín, cumpliendo con lo normativo, en lo que respecta a instalación de botiquín, extintor, camilla, punto ecológico, buzón para el manejo de PQRS, etc.



Ilustración 5. registro fotográfico alquiler de oficina

ANEXO 14. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OFICINA

7.3 Alquiler de equipos de cómputo, papelería

Se utilizaron equipos y materiales de apoyo para la gestión documental, elaboración de informes, control de avances y demás labores administrativas.



Ilustración 6. registro fotográfico de Alquiler de equipos de cómputo y papelería

ANEXO 15. CONTRATO DE ALQUILER DE COMPUTO, PAPELERIA

7.4 Alquiler de bodega para depósito de materiales

Para el almacenamiento temporal de materiales e insumos de construcción, se dispuso una bodega. El espacio arrendado cumple con las condiciones técnicas mínimas de seguridad, accesibilidad y protección frente a factores climáticos, permitiendo el adecuado almacenamiento y conservación de los insumos.



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

La bodega se emplea como punto de acopio controlado, facilitando la logística de suministro y el manejo eficiente de los materiales destinados a las actividades programadas. Durante el período evaluado, el contratista mantuvo el espacio en condiciones óptimas de orden y custodia, garantizando la disponibilidad oportuna de los elementos requeridos en la obra.



Ilustración 7. registro fotográfico bodega para depósito de materiales

ANEXO 16. CONTRATO DE ALQUILER DE BODEGA

7.5 Transporte de Materiales

El transporte de materiales e insumos se realizó de manera planificada, asegurando rutas y horarios adecuados para garantizar su llegada oportuna a la obra. Se aplicaron medidas de seguridad durante la carga, traslado y descarga, así como protecciones específicas para evitar daños por factores ambientales o manipulación, garantizando así la conservación y disponibilidad de los materiales en el sitio de trabajo.



Ilustración 8. registro fotográfico de transporte de materiales



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

8 APERTURA DE CUENTA BANCARIA

CONSTRUINDUCIVIL S.A.S realiza la suscripción de la apertura de cuenta bancaria para manejo de pagos del contrato de obra Pública No. 361-2025, la entidad bancaria BANCOLOMBIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA No.	31773531628
FECHA DE APERTURA	10/17/2024
NOMBRE DE LA CUENTA	CONSTRUINDUCIVIL SAS
NIT	901.375.684-5
ESTADO DE CUENTA	ACTIVA

9 SEGUIMIENTO AL ANTICIPO

Para la ejecución del contrato de obra Pública No. 361-2025, no se contempló el otorgamiento de anticipo, por lo cual no se registra inversión inicial por este concepto ni se considera necesario el seguimiento a su aplicación. En consecuencia, la ejecución de las obligaciones se realiza con recursos propios del contratista y conforme a los plazos y condiciones establecidos en el contrato.

ANEXO 17. Factura y Certificación Bancaria

10 CERTIFICACIONES INTERVENTORIA

Durante la ejecución del contrato la interventoría verifica la aplicación y cumplimiento de los programas ejecutados por el contratista para el contrato de obra Pública No. 361-2025.

ANEXO 18. Certificaciones de Interventoría



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES


11 CONCLUSIONES

De acuerdo con la ejecución del contrato de obra Pública No. 361-2025, cuyo objeto es **"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ"**.

Se puede resaltar lo siguiente:

- ☐ Se hizo la respectiva revisión de los diseños del contrato de obra No. 361-2025, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas generales del Contrato, garantizando así, la calidad de la obra ejecutada.
- ☐ Se garantizó la ejecución de las actividades del contrato de obra Pública No. 361-2025, las cuales se ejecutaron de los parámetros técnicos requeridos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas generales del contrato.
- ☐ En la ejecución de la obra **"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ"**, CONSTRUINDUCIVIL S.A.S tuvo como prioridad la sostenibilidad de proteger al medio ambiente y promover beneficios sociales, calidad de vida y responsabilidad social y ambiental.
- ☐ CONSTRUINDUCIVIL S.A.S ha cumplido con los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo a sus empleados cumpliendo así con la normativa exigida y aprobación por parte de la interventoría técnica.
- ☐ Se presenta un avance de obra hasta el día 15 de noviembre de 2025 ejecutando las actividades contratadas según las especificaciones técnicas y aprobaciones por parte de la interventoría, de acuerdo con la ejecución de obra del Contrato No. 361-2025, se presentan los siguientes rendimientos.
 - ☒ Avance Financiero **43.79%** que equivale a \$ **270.082.872,0**
 - ☒ Avance físico **40.35%**
 - ☒ Avance en tiempo **41.33%**

Atentamente:


VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA

ANEXO 1. PÓLIZAS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6250098909

PÓLIZA No: 625 -74 - 994000001318 ANEXO:0

AGENCIA EXPIDIDORA: SEAS YOPAL				COD AGE: 625				RAMO: 74				PAP:			
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS
16	09	2025		08	09	2025	23:59	24	03	2026	23:59	16	09	2025	
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DE LA POLIZA				VIGENCIA DESDE A LAS				VIGENCIA HASTA A LAS			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION			

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION				VIGENCIA DEL ANEXO				DIA MES AÑO HORAS				DIA MES AÑO HORAS			
				08 09 2025 23:59				24 03 2026 23:59				16 09 2025			
				VIGENCIA DESDE A LAS				VIGENCIA HASTA A LAS							

DATOS DEL TOMADOR				IDENTIFICACIÓN: NIT				901.375.684-5			
NOMBRE: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S											
DIRECCIÓN: CARRERA 3 7 A 67 BARRIO JARDIN				CIUDAD: CUBARÁ, BOYACÁ				TELÉFONO: 3102610204			

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO				IDENTIFICACIÓN: NIT				826.002.304-1			
ASEGURADO: E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA											
DIRECCIÓN: CALLE 3 NO. 5-47				CIUDAD: CUBARÁ, BOYACÁ				TELÉFONO: 78838077			
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS				IDENTIFICACIÓN: NIT				001-8			

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS				NIT : 826002304			
ASEGURADO: E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA							
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOYACÁ				CIUDAD: CUBARÁ			
DIRECCIÓN: CALLE 1 No. 1-1							
ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA							
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO				TIPO DE RIESGO: SERVICIOS			
				MANZANA: 1-2			
DESCRIPCION AMPAROS				SUMA ASEGURADA % INVAR			
CONTRATO				\$ 185,034,579.00			
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES				185,034,579.00			
BENEFICIARIOS							
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS							

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA # 361-2025 DE FECHA 08/09/2025 REFERENTE A ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA.

ASEGURADO BENEFICIARIO ADICIONAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA NIT 826002304-1

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***185,034,579.00	VALOR PRIMA: \$ *****299,604	GASTOS EXPEDICION \$ *****9,000.00	IVA: \$ *****58,635	TOTAL A PAGAR: \$ *****367,239
INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	CLAVE 7274	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	%PART VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradora-solidaria.com.co/selecione-de-interesa/libreria-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradora-solidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR	(415)7701861000019(8020)000000000007000625009890	FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

LUSOLERT 0

C8DA25780F06F4775F

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 06 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:

Compañía de Seguros

GRA - CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/13 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6250098883

PÓLIZA No: 625-47-994000003468 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS YOPAL**

COD AGENCIA: 625 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

D/A MES AÑO
16 09 2025
FECHA DE EXPEDICIÓN

D/A MES AÑO
16 09 2025
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S**

IDENTIFICACION: NIT **901.375.684-5**

DIRECCIÓN: **CARRERA 3 7 A 67 BARRIO JARDIN**

Ciudad: **CUBARÁ, BOYACÁ**

TELÉFONO: **3183616384**

ASEGURADO: **E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA**

IDENTIFICACION: NIT **826.002.304-1**

BENEFICIARIO: **E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA**

IDENTIFICACION: NIT **826.002.304-1**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO	08/09/2025	13/03/2026	61,678,192.80
CUMPLIMIENTO	08/09/2025	13/11/2028	123,356,385.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	VER	NOTA ACLARATORIA	185,034,578.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/09/2025	13/05/2026	123,356,385.60
CALIDAD DEL SERVICIO			

BENEFICIARIOS
NIT 826002304 - **E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA NO. 361-2025, DE FECHA 08/09/2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
\$ ****493,425,542.40	\$ *****2,126,461	\$ ****15,000.00	\$ *****406,878	\$ *****2,548,339

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	7274	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGROS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA VÍO SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES. POR FAVOR REGISTRAR AL CORREO: GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR NOTIFICAR A: https://www.solidaria.com.co/boas-distribucion-ventas

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, IMPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx>

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/publicacion-de-clausulas.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR



FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
C8DA25780F06F47657

CLIENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6250098909

PÓLIZA No: 625 -74 - 994000001318 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL			COD. AGE: 625			RAMO: 74			PAP:					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
16	10	2025	08	09	2025	23:59	24	03	2026	23:59	197	16	10	2025
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA POLIZA			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			FECHA DE IMPRESIÓN		
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL			ALAS			ALAS			DÍAS			IMPRESIÓN		

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION			VIGENCIA DEL ANEXO			DIA			MES			AÑO			HORAS			DÍAS											
			08			09			2025			23:59			24			03			2026			23:59			197		
			VIGENCIA DESDE			A LAS			VIGENCIA HASTA			A LAS			VIGENCIA HASTA			A LAS											

DATOS DEL TOMADOR			IDENTIFICACIÓN: NIT			901.375.684-5		
NOMBRE: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S			DIRECCIÓN: CARRERA 3 7 A 67 BARRIO JARDIN			CIUDAD: CUBARÁ, BOYACÁ		
			TELÉFONO: 3122412224					

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO			IDENTIFICACIÓN: NIT			826.002.304-1		
ASEGURADO: E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA			DIRECCIÓN: CALLE 3 NO. 5-47			CIUDAD: CUBARÁ, BOYACÁ		
			TELÉFONO: 78838077					
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS			IDENTIFICACIÓN: NIT			001-8		

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS			ASEGURADO: E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA			NIT : 826002304		
ITEM: 1			DEPARTAMENTO: BOYACÁ			CIUDAD: CUBARÁ		
DIRECCIÓN: CALLE 1 No. 1-1			ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA			TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO		
			TIPO DE RIESGO: SERVICIOS			MANZANA: 1-2		

DESCRIPCION			AMPAROS			SUMA ASEGURADA % INVAR			SUBLIMITE		
CONTRATO			PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			\$ 185,034,579.00			185,034,579.00		
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES											
BENEFICIARIOS											
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS											
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA ASEGURADO BENEFICIARIO ADICIONAL											
ASEGURADO BENEFICIARIO ADICIONAL											
NACION-MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL NIT 800375481-5											
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT 826002304-1											

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA 361-2025 DE FECHA 08/09/2025 REPRESENTA A ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA.

ASEGURADO BENEFICIARIO ADICIONAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA NIT 826002304-1

VALOR ASEGURADO TOTAL:		VALOR PRIMA:		GASTOS EXPEDICION:		IVA:		TOTAL A PAGAR:	
\$ *****0.00		\$ *****0		\$ *****0.00		\$ *****0		\$ *****0	
INTERMEDIARIO		CLAVE		%PART		COASEGURO CEDIDO		%PART	
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA		7274		100.00					
NOMBRE		CLAVE		%PART		NOMBRE COMPAÑIA		VALOR ASEGURADO	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://www.aseguradora-solidaria.com.co/interior/obligaciones-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradora-solidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR		FIRMA TOMADOR	
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá		LUSOLERTPT 0	

C8DA25780B0EFC7F5D

Defensor del Consumidor Financiero - Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero - Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 #114 - 09 oficina 502 Bogotá - **Teléfonos:** (601) 213 13 70 - 213 13 22 - **Celular:** 321 524 04 79 - 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pagoabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: <https://www.aseguradora-solidaria.com.co/interior/obligaciones-de-clausulados.aspx>

Compañía de Seguros

GRA : CONTRIBUYENTE RES.2508 DIC/13 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6250098883

PÓLIZA No: 625-47-994000003468 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS YOPAL**

COD. AGENCIA: 625 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **MODIFICACION**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA MES AÑO
16 10 2025
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
16 10 2025
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.375.684-5**

DIRECCIÓN: **CARRERA 3 7 A 67 BARRIO JARDIN**

Ciudad: **CUBARÁ, BOYACÁ**

TELÉFONO: **3183616384**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **826.002.304-1**

BENEFICIARIO: **E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **826.002.304-1**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	08/09/2025	13/03/2026	61.678.192.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	08/09/2025	13/11/2028	123.356.385.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER	NOTA ACLARATORIA	185.034.578.40
CALIDAD DEL SERVICIO	08/09/2025	13/05/2026	123.356.385.60

BENEFICIARIOS
NIT 826002304 - E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA ASEGURADO BENEFICIARIO ADICIONAL

ASEGURADO BENEFICIARIO ADICIONAL
NACION-MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL NIT 800375481-5
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT 826002304-1

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA NO. 361-2025, DE FECHA 08/09/2025 CEBLEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA.

NOTA ACLARATORIA

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	7274	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJES POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECANTERAS@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES. POR FAVOR, SEÑALAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INCREMENTAR A: gestioncomercial@solidaria.com.co

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPLENIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx>

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU POLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co> EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR



FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
C8DA25780E2EPC7E59

CLIENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA PÓLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL

COD AGENCIA: 625

RAMO: 47

Nº PÓLIZA: 994000003468

ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S

IDENTIFICACION: NIT 901.375.684-5

ASEGURADO: E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA

IDENTIFICACION: NIT 826.002.304-1

BENEFICIARIO: E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA

IDENTIFICACION: NIT 826.002.304-1

TEXTO ITEM 1

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6250098883

PÓLIZA No: 625-47-994000003468 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS YOPAL**

COD. AGENCIA: 625 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA**

TIPO DE IMPRESIÓN: **REIMPRESION**

DÍA MES AÑO
21 11 2025
FECHA DE EXPEDICIÓN

DÍA MES AÑO
21 11 2025
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.375.684-5**

DIRECCIÓN: **CARRERA 3 7 A 67 BARRIO JARDIN**

Ciudad **CUBARÁ, BOYACÁ**

TELÉFONO: **3183616384**

ASEGURADO: **E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **826.002.304-1**

BENEFICIARIO: **E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **826.002.304-1**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	16/10/2025	30/04/2026	61,679,192.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	16/10/2025	30/12/2028	123,356,385.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA	ACLARATORIA	185,034,578.40
CALIDAD DEL SERVICIO	16/10/2025	30/06/2026	123,356,385.60

BENEFICIARIOS
NIT 826002304 - **E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD CON ACTA DE INICIO DE FECHA 16/10/2025 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 361-2025.

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA

AMPARO VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	16/10/2025	30/04/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	16/10/2025	30/12/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	16/10/2025	30/06/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30/12/2025	30/12/2028

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: NACION-MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL NIT 800375481-5
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT 826002304-1
TODO LO DEMAS NO SE MODIFICA, CONTINUA EN IGUALES CONDICIONES.

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
\$ ****493,425,542.40	\$ *****	\$*****0.00	\$ *****	\$ *****

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	7274	100.00			

DECLARACION Y AUTORIZACION: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASI COMO PARA EL ENVIO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVES DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERIA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRONICOS Y LLAMADAS TELEFONICAS DE CARACTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS SUTENEDORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACION, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRONICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTION AUTOMATICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTION DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRONICO: GESTION@CARTERAASOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO: GESTION@CARTERAASOLIDARIA.COM.CO Y PARA SERVICIOS O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: informacion@solidaria.com.co

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACION, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUEEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPLENIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1981 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMAS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACION DEL VINCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.aspx>

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU POLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESAR AL SIGUIENTE LINK: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TITULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIEN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA DESDE NUESTRA PAGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co> EN EL MENU "SERVICIOS", OPCION "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701881000019(8020)0000000007000625009888

FIRMA TOMADOR

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
C8DA2578050DF97A5B

CLIENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA PÓLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL

COD AGENCIA: 625 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000003468 ANEXO 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S

IDENTIFICACIÓN NIT 901.375.684-5

ASEGURADO: E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA

IDENTIFICACIÓN NIT 846.002.304-1

BENEFICIARIO: E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA

IDENTIFICACIÓN NIT 826.002.304-1

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA NO. 361-2025, DE FECHA 08/09/2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA.

VOTA ADECUACIÓN

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DATOS DE LA PÓLIZA

DATOS DE LA PÓLIZA

Mo. POLIZA: 994000001318	ANEXO: 1	TIPO DE MOVIMIENTO: 0
TRANSACCION: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S		IDENTIFICACION: 901.375.584-5
		PAGINA: 2

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. & NIT	VINCULACION DEL PREMIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	M.D.E. COSE-ANA ESPECIAL DE	0000000000 -	VENUE E INV. S.A.	BARRANQUILLA	0.00	0	0
					PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA	
					0	0	

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS

6250098909

PÓLIZA No: 625 -74 - 994000001318 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL			COD AGE: 625			RAMO: 74			PAP:					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
21	11	2025	24	03	2026	23:59	30	04	2026	23:59	37	21	11	2025
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA POLIZA			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			FECHA DE IMPRESIÓN		
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL			VIGENCIA DESDE			A LAS			VIGENCIA HASTA			A LAS		
TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN														

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA			VIGENCIA DEL ANEXO			DIA			MES			AÑO			HORAS			DIA			MES			AÑO			HORAS			DIA		
			24			03			2026			23:59			30			04			2026			23:59			37					
			VIGENCIA DESDE			A LAS			VIGENCIA HASTA			A LAS			VIGENCIA DESDE			A LAS			VIGENCIA HASTA			A LAS								

DATOS DEL TOMADOR		
NOMBRE:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S	IDENTIFICACIÓN: NIT
DIRECCIÓN:	CARRERA 3 7 A 67 BARRIO JARDIN	901.375.684-5
Ciudad:	CUBARÁ, BOYACÁ	TELÉFONO:
		3133616784

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO		
ASEGURADO:	E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA	IDENTIFICACIÓN: NIT
DIRECCIÓN:	CALLE 3 NO. 5-47	826.002.304-1
Ciudad:	CUBARÁ, BOYACÁ	TELÉFONO:
		78838077
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	IDENTIFICACIÓN: NIT
		001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS		
ASEGURADO:	E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA	NIT : 826002304
ITEM: 1	DEPARTAMENTO: BOYACÁ	Ciudad: CUBARÁ
DIRECCIÓN:	CALLE 1 No. 1-1	
ACTIVIDAD:	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	
TIPO EDIFICIO:	NO APLICA PARA ESTE RAMO	TIPO DE RIESGO: SERVICIOS
		MANZANA: 1-2
DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA % INVAR
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 185,034,579.00
		185,034,579.00
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD CON ACTA DE INICIO DE FECHA 16/10/2025 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 361-2025.
VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA
AMPARO VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 16/10/2025 30/04/2026
ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL. NACION-MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL NIT 800375481-5
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT 826002304-1
TODO LO DEMAS NO SE MODIFICA CONTINUA EN IGUALES CONDICIONES.

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA # 361-2025 DE FECHA 08/09/2025 REFERENTE A ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***185,034,579.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00
INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	7274	100.00		

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA DESDE NUESTRA PAGINA WEB <http://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR	(415)7701861000019(8020)00000000007000625009890	FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C6DA25780E0DF97A5F

CLIENTE



POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS YOPAL**

COD. AGENCIA: **625**

RAMO: **74**

No POLIZA: **994000001316** ANEXO: **2**

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S**

IDENTIFICACION: NIT **901.375.684-5**

RESPONSABLE: **E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA**

IDENTIFICACION: NIT **820.002.504-1**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS**

IDENTIFICACION: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

ASEGURADO BENEFICIARIO ADICIONAL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA NIT 826002304-1

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000001318	ANEXO: 2	TIPO DE MOVIMIENTO: 0	PAGINA: 3
TOMADOR: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S		IDENTIFICACION: 901.375.684-5	

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. & NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	RESP. CIVIL ESPECIAL DE	925025047	CALLE 1 N° 111	BOGOTÁ	163,034,579.00	0	0
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						0	0

ANEXO 2. ACTOS ADMINISTRATIVOS Y COMITÉS DE OBRA



HOSPITAL ESPECIAL
DE CUBARÁ

"Uniendo esfuerzos por la salud"

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA No. 361-2025
(08 de septiembre de 2025)

Derivado de la Convocatoria Pública No. 002-2025 – Adjudicado mediante Resolución No. AD-083 de 2025

CONTRATANTE	
CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ. NIT: 828.002.304-1
REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNI QUINTERO TELLEZ identificado con la cédula de ciudadanía No 79.824.210 de Bogotá D.C
CORREO ELECTRONICO	gerencia@hospitalcubara.gov.co
CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S identificada con el NIT No. 901375684-5
DOMICILIO	Carrera 3 No. 7ª-67 Barrio el Jardín, Cubará, Boyacá.
TELEFONO	3183616384
CORREO ELECTRONICO	construinducivil@gmail.com
DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de obra
MODALIDAD	Convocatoria Publica No. 002-2025
OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ
VALOR:	SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$616.781.927,00)
PLAZO:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
DOMICILIO CONTRACTUAL	Cubará, Boyacá.

En la E.S.E. Hospital Especial de Cubará, el dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron la Subgerente administrativa y financiera **MARLENY APONTE TORRES**, en calidad de supervisora del contrato y **GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA** con cedula de ciudadanía número 1.049.397.338 expedida en Cubará, Boyacá en calidad de representante legal de **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S** identificada con el NIT No. 901375684-5, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio.

CONSIDERANDO

- Que se llevó a cabo el ocho (08) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), la suscripción del contrato cuyo objeto es **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**.
- Que, una vez revisados los requisitos de ejecución del contrato, el supervisor del mismo manifiesta haberse dado cumplimiento a los mismos para poder llevar a cabo su inicio.
- SOPORTE FINANCIERO**

N°	FECHA	DENOMINACIÓN	VALOR
25-0570	07/07/2025	2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y	



HOSPITAL ESPECIAL
DE CUBARÁ

“Uniendo esfuerzos por la salud”

	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 616.781.927,00
--	------------------------------	-------------------

4. VALOR FISCAL DEL CONTRATO

Los aportes del contrato son:

DESCRIPCIÓN DEL APORTANTE	VALOR FISCAL
Ministerio de Salud y Protección Social- Resolución de Asignación de Recursos No. 00002422 de 2024.	\$ 616.781.927,00
TOTAL DE CONTRATO	\$ 616.781.927,00


En razón de lo anterior,

ACUERDAN


PRIMERO: Dar inicio al contrato a partir del dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SEGUNDO: Fijar como fecha de terminación del contrato el día treinta (30) de Diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, en Cúbará, Boyacá, el dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)


MARLENY APONTE TORRES
Subgerente Administrativa y Financiera
Supervisora


GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA
R/L CONSTRUINDUCIVIL SAS

Revisó: Charloth Yanine Mogollón Sánchez	Asesor Jurídico	
--	-----------------	---



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 01






PROYECTO: ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ

Fecha y lugar: Cubará, 11 de noviembre de 2025

Hora inicio: 07:00am

Hora finalización: 07:30am

I. PARTICIPANTES

ENTIDAD/EMPRESA	PARTICIPANTES	FIRMA
Supervisión – E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ	Marleny Aponte Torres – Supervisora Subgerente ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA	
	Ing. Brayan Jeudiel Lozano – Apoyo a la Supervisión	
Interventoría – Contrato de Consultoría No. 469-2025 FRASCING SAS – NIT 901.629.231-4	Fanny Katherin Barrera Correa – Representante legal	
	Henry Fabián Frasco Residente de Interventoría	
Contratista de Obra – Contrato de Obra No. 361-2025 CONSTRUINDUCIVIL SAS – NIT 901.375.684-5	Xiomara Manrique Representante legal	
	Vianney Karina Buitrago Residente de Obra	

II. OBJETO DEL COMITÉ

Revisión técnica, administrativa y operativa del proyecto, en relación con las condiciones encontradas durante la intervención en el salón de archivo, el desarrollo de actividades en consulta externa, sala de administración y sala de partos, así como la necesidad de acciones correctivas para garantizar la continuidad del cronograma de obra.

III. DESARROLLO DEL COMITÉ

Situación eléctrica en el Salón de Archivo

Durante la intervención en el salón de archivo, el contratista y la interventoría evidenciaron que toda la instalación eléctrica existente se encuentra en cable dúplex, el cual estaba suelto y sin cumplir la normativa técnica vigente (RETIE y NTC aplicables).

Dicha condición representa riesgo y además impide el avance de actividades, especialmente:

- Instalación de cielo raso.
- Adecuaciones internas posteriores.
- Ejecución segura de la obra en un entorno hospitalario.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



Se recuerda que en este espacio ya se ejecutó:

- Desmonte de cubierta.
- Instalación de nueva cubierta en teja termoacústica tipo trapezoidal A360.

La interventoría y el contratista coinciden en que no es técnicamente viable avanzar sin que la entidad realice la instalación eléctrica adecuada y el cableado reglamentario.

La E.S.E. Hospital Especial de Cubará, a través de la Supervisión, manifiesta que ejecutará de manera prioritaria la adecuación eléctrica completa, incluyendo:

- Retiro de instalaciones obsoletas.
- Instalación de tubería, canalizaciones y cableado normativo.

El objetivo es evitar afectaciones al cronograma establecido y garantizar condiciones técnicas y de seguridad.

Sala de Partos – Cambio de cubierta

El contratista de obra informa la presencia de goteras en un tramo de la sala de partos, afectando el normal funcionamiento y condiciones de higiene. Se presume que:

- La afectación se origina por intervenciones previas o por un mantenimiento inadecuado en la viga canal, lo que provoca el desplazamiento de la teja durante el tránsito y genera la aparición de goteras.
- El área comprometida de cubierta existente es aproximadamente 41.6 m².

Se determina la necesidad del cambio de cubierta en ese tramo, por razones de seguridad, salubridad y protección de la infraestructura hospitalaria.

Intervención en Sala de Hospitalización

El contratista de obra, en conjunto con la interventoría, durante la verificación de las cantidades de pintura correspondientes a la sala de hospitalización, evidenció que dentro de la actividad denominada "Vinilo Tipo I sobre pañete, tres manos sobre estuco" no se incluyó el área correspondiente a baños y cubículos de closets, estimándose un faltante aproximado de 165.28 m². En el presente comité se expone la situación para efectos de aprobación de las cantidades adicionales, bajo el entendido de que el contratista manifiesta su disposición de asumir dicho costo con cargo a los imprevistos de la obra.

Avance de actividades – Consulta Externa

El contratista informa que durante el fin de semana se ejecutarán actividades correspondientes a:

- Desmonte de cubierta en el área de consulta externa.
- Instalación de cubierta nueva, conforme al cronograma y especificaciones técnicas

Intervención en Sala de Administración

La Supervisión pregunta sobre el inicio de actividades en este espacio.

El contratista responde:

Ya se iniciaron actividades de mantenimiento de puertas.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



Una vez concluya la intervención en consulta externa, se continuará con:

- Cambio de cubierta en administración.
- Pintura interna y demás adecuaciones programadas en esta área.

La interventoría solicita mantener comunicación constante sobre los traslados de frente de obra para garantizar seguimiento técnico en tiempo real.

IV. COMPROMISOS

RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA LÍMITE
E.S.E. Hospital Especial de Cubará – Supervisión	Ejecutar adecuación eléctrica completa y cableado normativo en salón de archivo.	Máxima prioridad / fecha definida por supervisión.
Contratista – CONSTRUINDUCIVIL SAS	Continuar trabajos en área de consulta externa (desmonte e instalación de cubierta) durante el fin de semana.	Según cronograma.
Contratista – CONSTRUINDUCIVIL SAS	Continuar intervención en sala de administración (cubierta, pintura y ajustes internos).	Tras finalizar consulta externa.
Interventoría – FRASCING SAS	Monitorear los frentes de trabajo y emitir conceptos técnicos necesarios para asegurar cumplimiento de especificaciones.	Permanente.
Supervisión e Interventoría	Coordinar conjuntamente el ingreso para trabajos de adecuación eléctrica.	Inmediato.

V. CIERRE DEL COMITÉ

No siendo otro el asunto por tratar, se levanta la presente acta, la cual se firma para constancia por los asistentes.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso

ANEXO 3. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA



Cubará, 24 de octubre de 2025

Señores
CONSTRUINDUCIVIL SAS
NIT. 901.375.684-5
R/L: Xiomara Manrique
construinducivil@gmail.com
Cubará-Boyacá

Asunto: Solicitud de entrega de documentos iniciales previos al inicio de actividades de obra.

Cordial saludo:

En calidad de interventoría designada mediante el Contrato de Consultoría No. 469-2025, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002-2025, CUYO OBJETO ES LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ", nos permitimos solicitar de manera atenta la entrega de los documentos iniciales requeridos para el inicio de las actividades del Contrato de Obra No. 361-2025, cuyo objeto corresponde a la "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ".

De acuerdo con lo manifestado en la reunión de socialización del proyecto realizada el día 17 de octubre de 2025, en presencia de la comunidad, representantes del Hospital Especial de Cubará, Asojuntas y sindicato, se estableció que el inicio de actividades de obra, conforme al cronograma y plan de contingencia del hospital, está programado para el lunes 27 de octubre del presente año.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los procedimientos técnicos, administrativos, ambientales y de seguridad exigidos por la normatividad vigente y las condiciones contractuales, se requiere allegar a la interventoría, previo al inicio de actividades, la siguiente documentación:

1. Copia Análisis de precios unitarios
2. Memorias de cálculo del proyecto
3. Presupuesto de obra
4. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): Versión final y aprobada, incluyendo la matriz de riesgos específica para las actividades a realizar en el Hospital.
5. Plan de Trabajo
6. Plan de Manejo Ambiental (PMA): Protocolos y procedimientos para el manejo de residuos, escombros, ruido y material particulado, garantizando el mínimo impacto al funcionamiento del Hospital.
7. Copia de las pólizas suscritas: Copias de las garantías contractuales actualizadas y aprobadas, que cumplan con la totalidad de los amparos y valores requeridos por la E.S.E.
8. Actualización de las pólizas de acuerdo con el Acta de inicio suscrita
9. Programación de Obras



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

10. Plan de contingencia
11. Cronograma de Obra Detallado: La versión ajustada y aprobada del cronograma que contemple las fechas de inicio y finalización de cada actividad, acorde al Plan de Contingencia socializado.
12. Hoja de vida del personal propuesto
13. Cuadro en el cual se relacione el personal que hará parte en la ejecución de las obras, con la indicación respectiva de afiliación al sistema de seguridad social y parafiscal. Igualmente se evidencie el personal por JAC, sindicato, comunidad indígena y Contratista, según corresponda.


NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEDICACIÓN	AFILIACIONES				FECHA DE INGRESO
				SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN	

14. Copia de las Afiliaciones al sistema de Seguridad social y parafiscales del personal que hará parte en la ejecución de las obras
15. Protocolos de calidad de los materiales
16. Copia de los Permisos y licencias correspondientes (si aplica).

Lo anterior en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales

Agradezco su atención a la presente

Atentamente,


FRASCING SAS

NIT: 901.629.231-4

R/L FANNY KATHERIN BARRERA CORREA

CC. Supervisión: E.S.E. Hospital Especial de Cubará
Subgerente Marleny Aponte
subgerencia@hospitalcubara.gov.co



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

465-2025-002

Cubará, 10 de Noviembre de 2025

Supervisión
ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA
subgerencia@hospitalcubara.gov.co

Contratista
CONSTRUINDUCIVIL SAS
NIT: 901.375.654-5
R/L: Xiomara Manrique
construinducivil@gmail.com
Cubará-Boyacá

Asunto: Solicitud formal de Comité de Obra No 1 - Contrato de Obra No. 361-2025.

Cordial saludo:

En calidad de interventoría designada mediante el Contrato de Consultoría No. 469-2025, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002-2025, CUYO OBJETO ES LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ", nos permitimos solicitar formalmente la convocatoria a un Comité de Obra para el día de mañana, 11 de noviembre de 2025, a primera hora, o en la franja horaria que la Supervisión defina.

El objetivo de esta reunión es ejercer la función de vigilancia y control preventivo (como lo establece la normativa para la Interventoría) para evaluar conjuntamente la ejecución del Contrato de Obra No. 361-2025, cuyo objeto corresponde a la "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ".

Temas a tratar:

- Estado de los avances de obra: revisión de actividades ejecutadas hasta la fecha, comparación con cronograma, contingencias técnicas identificadas, cumplimiento de hitos.
- Actividades de mayores y menores cantidades de obra: análisis de los ítems en los que se han presentado variaciones de cantidades (mayores o menores), revisión de su justificación técnica, administrativa y contractual, y su adecuación al presupuesto aprobado.
- Nuevas actividades o ítems propuestos que requieren modificación contractual: identificación de actividades o ítems no contemplados inicialmente, justificación técnica detallada, impacto sobre el plazo, costos, y riesgos contractuales.

Según el manual de supervisión e interventoría, la función de la interventoría implica, entre otros, conocer y entender los términos y condiciones del contrato, asegurar que éste tenga las disposiciones necesarias para su seguimiento, advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas correctivas pertinentes.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

En ese sentido, la convocatoria a este comité obedece a la necesidad de asegurar que los procedimientos técnicos, administrativos y financieros se adelanten de forma adecuada y en estricto cumplimiento del contrato adjudicado, así como de las obligaciones que nos competen en la interventoría.

Agradezco de antemano su atención a la presente y quedamos atentos a su confirmación del horario y lugar para la realización del comité.

Atentamente,

Fanny Katherin Barrera C.
FRASCING SAS

NIT: 901.629.231-4

R/L FANNY KATHERIN BARRERA CORREA



FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso

 HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ Unidad de Atención Primaria del Hospital General de Cúbará	Sistema Integrado de Garantía de la Calidad					 VIGILADO Supersalud Línea de Atención al Usuario 0800 870 8000 Línea Gratuita Nacional 0155 3301000
	Proceso gestión gerencial					
	Formato comunicaciones internas y externas					
CÓDIGO	PG-F-1.GG	VERSIÓN	1	F. APROBACIÓN	28/04/2025	Página 1 de 2

110-05.1- 568

Cubará, Boyacá 12 de noviembre de 2025.

CONSTRUINDUCIVIL S.A.S

NIT. 901.375.684-5

Carrera 3 No. 7A-67, Barrio El Jardín – Cubará, Boyacá

Correo: construinducivil@gmail.com

REF: Requerimiento de información sobre el personal vinculado al Contrato de Obra No. 361-2025

Respetados señores:

En mi calidad de supervisora del Contrato de Obra No. 361-2025, y de conformidad con lo previsto en la Cláusula Séptima (Supervisión y Coordinación) y la Cláusula Tercera (Obligaciones del Contratista) de la minuta contractual, me permito realizar el presente requerimiento formal.

El día 27 de octubre de 2025, esta Entidad recibió una comunicación suscrita por la señora ROSA DANIELA SANTANDER, en la que manifestó su inconformidad frente al uso de su hoja de vida dentro del proceso de selección pública Convocatoria No. 002-2025, proceso del cual resultó adjudicataria su empresa.

Al respecto, revisado el expediente contractual, se constató que, al momento de la presentación de la oferta, la hoja de vida de la mencionada profesional fue aportada junto con la autorización expresa firmada por ella, la cual fue verificada y evaluada por el Comité Asesor y Evaluador dentro del trámite de adjudicación. Por tanto, su inclusión fue legítima y válida dentro del proceso precontractual.

Sin embargo, la comunicación posterior deja en claro que la profesional no tiene vínculo alguno con ustedes para efectos de la ejecución contractual, razón por la cual esta supervisión, en cumplimiento de sus funciones, debe verificar que el personal actualmente vinculado al desarrollo de la obra cumpla con las condiciones de idoneidad y perfil técnico ofertado y aprobado.

En consecuencia, se requiere que dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la recepción del presente oficio, la empresa remita la siguiente información actualizada:

Calle 3 Nro. 5-47 Barrio San Rafael Cubará – Boyacá Cel. 3134204942
<mailto:correspondencia@hospitalcubara.gov.co>
 hospitalcubara.gov.co

 HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ Unidad de Atención al Usuario	Sistema Integrado de Garantía de la Calidad Proceso gestión gerencial Formato comunicaciones internas y externas				VIGILADO Supersalud Línea de Atención al Usuario: 800050 Hospital Línea Gestión Financiera: 01600000000
CÓDIGO	PG-F-1-GG	VERSIÓN	1	F. APROBACIÓN:	28/04/2025
					Página 2 de 2

- ✓ Relación completa del personal técnico, administrativo y operativo vinculado actualmente a la ejecución del contrato, indicando nombres, cargos o funciones, modalidad de vinculación y fecha de inicio de actividades.
- ✓ Hojas de vida y soportes que acrediten la formación, experiencia e idoneidad técnica del personal efectivamente vinculado, conforme a los perfiles ofertados.

En caso de sustitución o cambio de personal frente a la oferta adjudicada, remitir la respectiva justificación y solicitud de autorización previa para su evaluación y aprobación por parte de la Entidad, en cumplimiento de la Cláusula Tercera del contrato.

Se recuerda que la E.S.E. Hospital Especial de Cubará no interviene ni resuelve diferencias entre colaboradores o terceros vinculados por el contratista, pero sí debe verificar y dejar constancia de la idoneidad del personal que participa en la ejecución, como parte del seguimiento y control contractual.

Agradezco su atención y colaboración para mantener actualizada la información del proyecto y garantizar la correcta ejecución del contrato.

Cordialmente,



MARLENY APONTE TORRES

Subgerente Administrativa y Financiera
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ E.S.E

ELABORADO POR: Charloth Yanine Mogollon Sanchez Asesora Jurídica	APROBADO POR: Marleny Aponte Torres Subgerente
---	---

ANEXO 4. BITÁCORAS DE OBRA

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DÍA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		1	16	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
Se realiza firma del acta de inicio, se inicia tramite de actualizacion de polizas.							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA		HORAS	
Maestro general		Residente de Obra	1				
Oficiales		Profesional HSQ					
Ayudantes							
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	6			CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND				 HENRY ADRIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

	BITACORA DE OBRA	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	361-2025	2	17	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS					
Se realizó la socialización de proyecto con la comunidad					
se solicita personal para obra					

PERSONAL EN OBRA						TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general		Residente de Obra	1				
Oficiales		Profesional HSO					
Ayudantes							
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO				
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL			X				
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							

Proyectó:	Aprobó:
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640161 GND	 HENRY FABIAN FRASGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS

 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	BITACORA DE OBRA		CONSECUATIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	381-2025		3	16	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
no se labora						
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO		
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA		HORAS
Maestro general		Residente de Obra	1			
Oficiales		Profesional HSQ				
Ayudantes						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO		
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL		
Nº HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X		
CUMPLE	X	NO CUMPLE				
OBSERVACIONES						
Proyectó: Vianney Karina Buitrago VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA Nº 091037-0540151 CND			Aprobó: HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA Nº 54202-341877 NTS			

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		4	19	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDOCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
no se labora por ser día domingo							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA		HORAS	
Maestro general		Residente de Obra	1				
Oficiales		Profesional HSO					
Ayudantes							
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	8			CUMPLE		NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0840151 CND				 HENRY FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

	BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	381-2025		5	20	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDOCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL	GLADIS XIOMARA MANRIQUE SECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
Se realiza revision de documentacion contractual, y aspectos tecnicos						
Se realiza revision de cantidades de obra						
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO		
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA		HORAS
Maestro general		Residente de Obra	1			
Oficiales		Profesional HSQ				
Ayudantes						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO		
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL		
Nº HORAS	B			CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X		
CUMPLE	X	NO CUMPLE				
OBSERVACIONES						
Proyectó: Vianney Karina Buitrago VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA Nº 091037-0640151 CND			Aprobó:  HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA Nº 54202-341877 NTS			

[illegible]

	BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	361-2025		7	22	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E S E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
se recepcionan las hojas de vida del personal de obra y se realizan las afiliaciones						
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO		
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA		HORAS
Maestro general		Residente de Obra	1			
Oficiales		Profesional HSQ				
Ayudantes						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO		
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SERIALIZACION TEMPORAL		
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X		
CUMPLE	X	NO CUMPLE				
OBSERVACIONES						
Proyectó:			Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0840161 CND			 HENRY FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

	BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	361-2025		6	23	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
Se continúa la revisión de documentación contractual, y aspectos técnicos						
Se elabora el cronograma de obra y se organiza el plan de trabajo						
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO		
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS	
Maestro general	1	Residente de Obra	1			
Oficiales		Profesional HSQ				
Ayudantes						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO		
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL		
Nº HORAS	6			CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL			X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE				
OBSERVACIONES						
Proyectó:			Aprobó:			
Vianney Karina Buitrago RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND			HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

	BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	361-2025		9	24	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
Se realizó limpieza y adecuación de la bodega						
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO		
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS	
Maestro general	1	Residente de Obra	1			
Oficiales		Profesional HSQ				
Ayudantes						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO		
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL		
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X		
CUMPLE	X	NO CUMPLE				
OBSERVACIONES						
Proyectó:			Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 GND			 HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

[illegible]

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		381-2025		11	26	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
No se labora							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA		HORAS	
Maestro general		Residente de Obra	1				
Oficiales		Profesional HSQ					
Ayudantes							
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SERIALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
							
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND				HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		12	27	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA F.E.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
Se realizo la induccion del personal y se entrego app							
se inicia la lavada de la fachada							
se inician actividades de desmonte de cubiertas de teja en asbesto en el area de Archivo - Almacen							
se inicia con la demolición de muros en ladrillo E=0.15 mts en el área de Archivo - Almacén							
se realiza el desmonte de marcos, puertas y ventanas en el área de Archivo - Almacén							
se realizó la demolición del cielo raso, y la estructura en aluminio del área de hospitalización							
Se descargo materia de construcción							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Oficiales	1	Profesional HSO	1				
Ayudantes	12						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
				Hidrolavadora			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL			
Nº HORAS	6		2	CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARZA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND				 HENRY FABIAN FERRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

[illegible]

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		381-2025		14	29	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA C.E.H HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
Continúa la aplicación de estuco en muros del área de hospitalización							
Continúa la lavada de la fachada							
Se inicia la limpieza de cubierta tipo domo							
continua la construcción de muro en bloque No. 5 en el área de Archivo - Almacén							
Continúa la limpieza de viga canal en el área de hospitalización							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Oficiales	1	Profesional HSQ	1				
Ayudantes	12						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
				Hidrolavadora			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL			
N° HORAS	5		3	CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
Vianney Karina Buitrago VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCÍA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND				 HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

 CONSTRUIDUCIL S.A.S.	BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	361-2025		15	30	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE I A F E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
Continua la aplicación de estuco en muros del area de hospitalización						
Continúa la lavada de la fachada						
Continúa la limpieza de cubierta tipo domo						
continua la construcción de muro en bloque No. 5 en el área de Archivo - Almacén						
Continúa la limpieza de viga canal en el área de hospitalización						
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO		
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS	
Maestro general		Residente de Obra	1			
Oficiales		Profesional HSQ	1			
Ayudantes	(2)					
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO		
				Hidrotaladora		
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL		
Nº HORAS	7		1	CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X		
CUMPLE	X	NO CUMPLE				
OBSERVACIONES						
Proyectó:				Aprobó:		
Vianney Karina Buitrago VIANNY KARINA BUITRAGO GARCÍA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0840151 CND				HENRY FAJAN ENASCÓ RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTT		

 CONSTRUINDUCIVIL SAS	BITACORA DE OBRA	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	361-2025	16	31	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA F.E.F HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS					
Continúa la aplicación de estuco en muros del área de hospitalización					
Continúa la lavada de la fachada					
Continúa la limpieza de cubierta tipo domo					
continua la construcción de muro en bloque No. 5 en el area de Archivo - Almacén					
Continúa la limpieza de viga canal en el área de hospitalización					
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Maestro general	1	Residente de Obra	1		
Orientales	1	Profesional HSQ	1		
Plyuantes	12				
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO		
			Hidrolavadora		
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL	
Nº HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
SEGURIDAD SOCIAL					
CUMPLE	X	NO CUMPLE			
OBSERVACIONES					
Proyectó:			Aprobó:		
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCÍA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND			HENRY FRANCISCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS		

	BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	361-2025		17	1	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
no se laboro						
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO		
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS	
Maestro general	1	Residente de Obra	1			
Oficiales	1	Profesional HSQ	1			
Ayudantes	12					
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO		
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL		
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X		
CUMPLE	X	NO CUMPLE				
OBSERVACIONES						
Proyectó:			Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND			 HENRY CABALLERO FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		18	2	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
no se laboro							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Oficiales	1	Profesional HSG	1				
Ayudantes	12						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND				 HENRY CASANOVAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		19	3	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
no se labora por ser día festivo							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA		HORAS	
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Oficiales	1	Profesional HSQ	1				
Ayudantes	12						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	B			CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCÍA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 081037-0840151 CND				 HENRY FAJARDO FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

	BITACORA DE OBRA	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	381-2025	20	4	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA F.E.F HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDOCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL:	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS					
Continúa la aplicación de estuco en muros del área de hospitalización					
Continúa la lavada de la fachada					
Continúa la limpieza de cubierta tipo domo					
se realizó el suministro de cornisa metálica de 3 x 1 1/2 cal 18, en el área de Archivo-Almacén					
Continúa la limpieza de viga canal					
se iniciaron actividades de mantenimiento de cerramiento en tubería metálica cuadrada de 1"					
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Maestro general	1	Residente de Obra	1		
Oficiales	1	Profesional HSQ	1		
Hydantes	12				
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO		
			Hidrolavadora		
			compresor		
			equipo de soldadura		
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL	
Nº HORAS	6		2	CUMPLE	NO CUMPLE
SEGURIDAD SOCIAL			X		
CUMPLE	X	NO CUMPLE			
OBSERVACIONES					
Proyectó:			Aprobó:		
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCÍA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 061037-0640151 GND			 HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS		

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		21	5	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA F.S.F HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS Xiomara Manrique Becerra					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
Continua la aplicación de estuco en muros del area de hospitalización							
Se descargo material de construcción							
Continua la limpieza de cubierta tipo domo							
se realizo la instalación de correa metálica de 3 x 1 1/2 cal 18, en el area de Archivo-Almacen							
Continua la limpieza de viga canal							
se iniciaron actividades de mantenimiento de carramiento en tubería metálica cuadrada de 1"							
PERSONAL EN OBRA							
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	TIEMPO PERDIDO		HORAS	
Maestro general	1	Residente de Obra	1	CAUSA		HORAS	
Oficiales	1	Profesional HSO	1				
ayudantes	12						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA							
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO							
Hidroavadora							
compresor							
equipo de soldadura							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	5		3	CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL							
CUMPLE	X	NO CUMPLE		X			
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GAROIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640161 CND				 HENRY FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

	BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	381-2025		22	8	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
Continúa la aplicación de estuco en muros del área de hospitalización						
Continúan las actividades de mantenimiento de cerramiento en tubería metálica cuadrada de 1"						
Continúa la limpieza de cubierta tipo domo						
Se realizó la instalación de Correa metálica de 3 x 1 1/2 cal 18, en el área de Archivo-Almacén						
Continúa la limpieza de viga canal						
Se inician actividades de desmonte de cubierta lamina en el área de hospitalización						
Se inicia la instalación de teja termoacústica tipo trapezoidal A360 en las áreas de hospitalización y archivo-almacen						
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO		
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS	
Maestro general		1 Residente de Obra	1			
Oficiales		1 Profesional HSC	1			
Ayudantes	12					
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO		
				Hidrolavadora		
				compresor		
				equipo de soldadura		
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL		
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X		
CUMPLE	X	NO CUMPLE				
OBSERVACIONES						
Proyectó:			Aprobó:			
 WAINER KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 081037-0640151 CND			 HENRY FARÍNAS FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

[illegible]

	BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	361-2025		24	8	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA F.O.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
Continúan las actividades de mantenimiento de cerramiento en tubería metálica cuadrada de 1"						
continúan las actividades de desmonte de cubierta lamina en el área de hospitalización						
Se continúa la instalación de teja termoacústica tipo trapezoidal A360 en las áreas de hospitalización y archivo-almacen						
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO		
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS	
Maestro general	1	Residente de Obra	1			
Oficiales	1	Profesional HSQ	1			
Ayudantes	12					
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO		
				Hidrolavadora		
				compresor		
				equipo de soldadura		
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL		
Nº HORAS	7		1	CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X		
CUMPLE	X	NO CUMPLE				
OBSERVACIONES						
Proyectó:			Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUTRAGO GARCIA RESIDENTE OE OBRA MATRICULA Nº 091037-0640151 CND			 HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA Nº 54202-341877 NTS			

	BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	381-2025		25	9	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
No se labora						
PERSONAL EN OBRA			TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS	
Maestro general	1	Residente de Obra	1			
Oficiales	1	Profesional HSQ	1			
Ayudantes	12					
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL		
Nº HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X		
CUMPLE	X	NO CUMPLE				
OBSERVACIONES						
Proyectó:			Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0840161 CND			 HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

	BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	381-2025		26	10	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.F. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
Continúan las actividades de mantenimiento de cerramiento en tubera metálica cuadrada de 1"						
continúan las actividades de desmonte de cubierta lámina en el área de hospitalización						
Se continúa la instalación de teja termoacústica tipo trapezoidal A360 en las áreas de hospitalización y archivo-almacen						
se inician actividades de aplicación de pañete liso, en el área de Archivo-Almacén						
se realizan actividades de aplicación de esmalte marcos lámina 3 manos						
se realizan actividades de aplicación de esmalte madera lámina 3 manos						
PERSONAL EN OBRA						
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	TIEMPO PERDIDO		
Maestro general	1	Residente de Obra	1	CAUSA	HORAS	
Oficiales	1	Profesional HSQ	1			
Ayudantes	12					
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO		
				Hidrolavadora		
				compresor		
				equipo de soldadura		
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL		
N° HORAS	5		3	CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X		
CUMPLE	X	NO CUMPLE				
OBSERVACIONES						
Proyectó:						
Aprobó:						
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 081037-0640151 CND  HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS						

[illegible]

 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO																																																
CONTRATO DE OBRA		361-2025		28	12	11	2025																																																
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADSCRIBCIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ																																																					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.																																																					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BÉCERRA																																																					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS																																																							
Continúan las actividades de mantenimiento de cerramiento en tubería metálica cuadrada de 1"																																																							
Continúa la aplicación de vinilo tipo I sobre pañete tres metros sobre estuco en hospitalización																																																							
Se realizan actividades de aplicación de esmalte marcos lamina 3 metros, en el área de hospitalización																																																							
Se da inicio a la instalación de piso raso en pvc																																																							
Se inicio la aplicación de pintura de la estructura metálica de los domos																																																							
Se realizaron actividades de desmonte de cubierta en lamina en el área de administración																																																							
Se realizaron actividades de instalación de teja termoacustica tipo trapezoidal A360 en las áreas de hospitalización y archivo-almacen																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">PERSONAL EN OBRA</th> <th colspan="2">TIEMPO PERDIDO</th> </tr> <tr> <th>CARGO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>CARGO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>CAUSA</th> <th>HORAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maestro general</td> <td>1</td> <td>Residente de Obra</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oficiales</td> <td>1</td> <td>Profesional HSG</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ayudantes</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO		CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS	Maestro general	1	Residente de Obra	1			Oficiales	1	Profesional HSG	1			Ayudantes	12																						
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO																																																			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS																																																		
Maestro general	1	Residente de Obra	1																																																				
Oficiales	1	Profesional HSG	1																																																				
Ayudantes	12																																																						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO																																																			
				compresor																																																			
				equipo de soldadura																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO DEL TIEMPO</th> <th>SECO-SOLEADO</th> <th>NUBLADO</th> <th>LLUVIA</th> <th colspan="2">SEÑALIZACIÓN TEMPORAL</th> </tr> <tr> <th>N° HORAS</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>CUMPLE</th> <th>NO CUMPLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">SEGURIDAD SOCIAL</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUMPLE</td> <td>X</td> <td>NO CUMPLE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL		N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE		8					SEGURIDAD SOCIAL				X		CUMPLE	X	NO CUMPLE																							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL																																																			
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE																																																		
	8																																																						
SEGURIDAD SOCIAL				X																																																			
CUMPLE	X	NO CUMPLE																																																					
OBSERVACIONES																																																							
Proyectó:			Aprobó:																																																				
 VIANNEY KARIM BUÑRAGO RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND			 HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS																																																				

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		351-2025		29	13	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.F. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
Continúan las actividades de mantenimiento de cerramiento en tubería metálica cuadrada de 1"							
Continúa la aplicación de vinilo tipo I sobre pañeta tras manos sobre estuco en hospitalización							
continúa la instalación de piso raso en pvc							
se realizaron actividades de desmonte de cubierta en lámina en el área de administración							
se realizaron actividades de instalación de teja termoacústica tipo trapezoidal A380 en las áreas de hospitalización y archivo-almacen							
se inicia la impermeabilización de viga canal en concreto							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Oficiales	1	Profesional HSQ	1				
ayudantes	12						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
				compresor			
				equipo de soldadura			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0840151 CND				 HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 64202-341877 NTS			

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		30	14	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA F.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S A S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
Continúan las actividades de mantenimiento de cerramiento en tubería metálica cuadrada de 1"							
Continúa la aplicación de vinilo tipo I sobre pañete tres manos sobre estuco en hospitalización							
se realizó suministro e instalación de panel led cuadrado de sobrepasar de 36 w							
se realizaron actividades de desmonte cubiertas teja de asbesto y/ o asbesto cemento.							
se realizaron actividades de instalación de teja termoacustica tipo trapezoidal A360 en el área de consulta externa							
se realizó la aplicación de pintura fachada en vinilo para exteriores en el área de hospitalización							
PERSONAL EN OBRA							
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA		HORAS	
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Oficiales	1	Profesional HSO	1				
Ayudantes	12						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA							
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO							
compresor							
equipo de soldadura							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	8			CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND				 HENRY FABIAN TRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

[illegible]

ANEXO 5. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

 ASOPAGOS
S.p.A.

IDENTIFICACION		DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	Razon Social		Clase		Código		R.R.		F. Presentación		Act. Eco		Tipo de BARRERA	
15-02-23	15-02-24	CONSTRUCCIONES SAE		II		000		POSTIVA - 14-23		SECURAL		4290		Aire Aca	
MUN. DEP		DIRECCION		TELEFONO		TELEGRAM		EMAIL		E. ENTRO DE PAGAR / SOCIALES					
15-23		CARRETERA 3 KM. TA. DE BARRIO JARDON								CONSTRUCCIONES SAE@gmail.com				3	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
ENTIDAD PENSION	PERIODO DE	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS A MORA	EMITIDO RECAUDO
2025-10	2025-11	SEAGUITE	E	2025-11-10	TODOS LOS CENTROS	TO	TO	1000.00	0	10-11-2025
N° ATILANOS	REF. DE PAGO	ESTADO PLANILLA								
17	2025-11-24	Pagada								

EMPLOYEE ID		1. OVERLEAFS										PERSON										2. LUJ										CCF										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE										TABLA PIVOT										TABLA PIVOT										HIS-SCORE									
-------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	AFL	PRESENTACIÓN	ACT. EDO	TIPO DE EMPRESA		
M 901355894	CONSTRUCCIONES SAS	8	902	POSITIVA - 14-03	SUCURSAL	4200	Jardín		
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO			EMAIL			EDIFICIO DE PARAFISCALES	
16353	CARRERA 3 NRO 7A 97 BARRIO JARDIN	311856217			CONSTRUCCIONES@GMAIL.COM			S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
2025-10	2025-11	35461775	E	2025-11-19	YODORES CENTROS	TECOCOS	TECOCOS	5.952.932	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
17	35461775	2025-11-24	Pagada						

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARA
5.952.932	5.952.932	5.952.932	5.952.932	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	BALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				17	953.000	0	0	0	1.53.000
PORVENIR	230301	800224808	8	10	448.000	0	0	0	448.000
COUPENS-ONES	25-14	000336004	7	7	505.000	0	0	0	505.000
EPS(Administradoras: 4)				17	239.400	0	0	0	239.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPSC37	900156264	2	3	42.900	0	0	0	42.900
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226716	1	11	116.800	0	0	0	116.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPSC41	900156264	2	2	66.300	0	0	0	66.300
COOSALUD	EPSC42	900226716	3	1	13.400	0	0	0	13.400
ARP(Administradoras: 1)				17	414.900	0	0	0	414.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	17	414.900	0	0	0	414.900
CCF(Administradoras: 1)				17	239.400	0	0	0	239.400
COMFABOY	CCF10	891800213	8	17	239.400	0	0	0	239.400
Gran Total					1.646.700	0	0	0	1.646.700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO
NI 901375684	5	CONSTRUDUCIVIL SAS	B	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-223	CARRERA 3 NRO 7A 67 BARRIO JARDIN		3110200217		CONSTRUDUCIVIL@GMAIL.COM		\$

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
2025-10	2025-11	35258845	E	2025-11-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.939.200	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
7	35258845	2025-11-24	Pagada						

EMPLEADO				NOVEDADES												DÍAS		PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot. Est. 1150 Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica						
#	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TUE	TAE	TOP	TAP	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	APR	EPST	AFPT	APR	EPST	AFPT	ING	RET	CCF	ING	RET	CCF	APR	RET	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.										
1	CC 3492210	CHAPETA SILVA CESAR	1.950.915	F														0			30	30	30	30	1.950.915	312.200	0	NOVA EPS OSA-EP5037	1.950.915	78.100	COMPABOY-CCF10	1.950.915	78.100	1.950.915	135.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	604.200	\$	5429001
2	CC 9460184	WILLAMIZAR MARTINEZ EFRAIN	2.573.010	F														0			30	30	30	30	2.573.010	411.700	0	EPS S ODOOSALLUD-SSC24	2.573.010	103.000	COMPABOY-CCF10	2.573.010	103.000	2.573.010	179.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	706.800	\$	5429001
3	CC 9460571	GARCIA DURAN JUAN DE JESUS	2.573.010	F														0			30	30	30	30	2.573.010	411.700	0	EPS S ODOOSALLUD-SSC24	2.573.010	103.000	COMPABOY-CCF10	2.573.010	103.000	2.573.010	179.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	706.800	\$	5429001
4	CC 91496344	LIZCANO BEKEERA CARLOS ENRIQUE	3.000.000	F														0			30	30	30	30	3.000.000	480.000	0	NOVA EPS OSA-EP5037	3.000.000	120.000	COMPABOY-CCF10	3.000.000	120.000	3.000.000	206.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	928.899	\$	5429001
5	CC 164939372	GUERRERO KANGEL JULIO RAFAEL	1.950.915	F														0			30	30	30	30	1.950.915	312.200	0	EPS S ODOOSALLUD-SSC24	1.950.915	78.100	COMPABOY-CCF10	1.950.915	78.100	1.950.915	135.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	604.200	\$	5429001
6	CC 1694243208	AGUIBLANCA DUARTE CARLOS RENE	1.950.915	F														0			30	30	30	30	1.950.915	312.200	0	NOVA EPS OSA-NOV-EP5041	1.950.915	78.100	COMPABOY-CCF10	1.950.915	78.100	1.950.915	135.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	604.200	\$	5711091
7	CC 1110585441	MANRIQUE AGUDELO GEDY ISPERANZA	1.950.915	F														0			30	30	30	30	1.950.915	312.200	0	EPS S ODOOSALLUD-SSC24	1.950.915	78.100	COMPABOY-CCF10	1.950.915	78.100	1.950.915	135.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	604.200	\$	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901375684	5	CONSTRUINDUCIVEL SAI	B	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-223	CARRERA 3 NRO 7A 67 BARRIO JARDIN		3116260217		CONSTRUINDUCIVEL@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35296845	E	2025-11-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.939.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35296845	2025-11-24	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RESGOS	IBC CALIAS	IBC PARAF
15.949.680	15.949.680	15.949.680	15.949.680	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ASP(Administradoras: 1)				7	2.552.200	0	0	0	2.552.200
PORVENIR	230301	800224808	8	7	2.552.200	0	0	0	2.552.200
EPS(Administradoras: 3)				7	638.400	0	0	0	638.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EP3037	900156264	2	2	198.100	0	0	0	198.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EP3041	900156264	2	1	78.100	0	0	0	78.100
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	4	362.200	0	0	0	362.200
ASP(Administradoras: 1)				7	1.110.200	0	0	0	1.110.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	1.110.200	0	0	0	1.110.200
CCF(Administradoras: 1)				7	638.400	0	0	0	638.400
COMFABOY	CCF10	891800213	8	7	638.400	0	0	0	638.400
Gran Total					4.939.200	0	0	0	4.939.200

ANEXO 6. NOMINA

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



CONSTRUINDUCIVIL SAS


NIT 901375684

CR 3 7A 67 BRR JARDIN

Tel: 3106716171

Cubará - Colombia

construInducivil@gmail.com



Periodo de Pago: **20251001 - 20251030**

Comprobante Número: **83**

Fecha y hora de generación: **27/11/2025 - 11:53 AM**

Fecha y hora de expedición: **27/11/2025 - 11:54 AM**

Empleado: **CARLOS RENE AGUABLANCA DUARTE**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **1094243208**

Cargo: **ALMACENISTA**

Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				4	\$ 255.460
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				4	\$ 26.667
Total Ingresos					\$ 282.127

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 10.216
Fondo de pensión	4.00	\$ 10.216
Total Deducciones		\$ 20.436

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
----------	--------	-----	----------

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) \$ 261.691

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 261.691

Soporte de pago: DNE83

CUNE: 1a55f7a2f4942ec6511ee2a92d4e940c546da7b2659d1503c3c1e277c0c08b925625c60dac864a5ae2230cedc4f1f963


Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo, **CARLOS RENE AGUABLANCA DUARTO**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.094.243.208**, quien prestó sus servicios en calidad de Almacenista, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de octubre del 2025.



CARLOS RENE AGUABLANCA DUARTO
C.C.1.094.243.208

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



CONSTRUINDUCIVIL SAS
Nit 801375684
CR 3 7A 57 BRR JARDIN
Tel: 3106716171
Cubará - Colombia

construinducivil@gmail.com



Periodo de Pago: **20251001 - 20251030**

Comprobante Número: **83**

Fecha y hora de generación: **27/11/2025 - 11:53 AM**

Fecha y hora de expedición: **27/11/2025 - 11:54 AM**

Empleado: **GEIDY ESPERANZA MANRIQUE AGUDELO**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **1118565441**

Cargo: **SECRETARIA**

Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				4	\$ 255.460
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				4	\$ 26.667
Total Ingresos					\$ 282.127

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 10.218
Fondo de pensión	4.00	\$ 10.218
Total Deducciones		\$ 20.436

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
----------	--------	-----	----------

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) \$ 261.691

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 261.691

Soporte de pago: DNE83

CUNE: 1a55f7a2f4942ec6511ee2a92d4e940c546da7b2659d1503c3c1e277c0c08b925625c60dac864a5ae2230cedc4f1f963

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL


Yo, **GEIDY ESPERANZA MANRIQUE AGUDELO**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.118.565.441**, quien prestó sus servicios en calidad de Secretaria, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es" **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de octubre del 2025.

Geidy Manrique
GEIDY ESPERANZA MANRIQUE AGUDELO
C.C 1.118.565.441

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251001 - 20251030**

Comprobante Número: **87**

Fecha y hora de generación: **27/11/2025 - 11:53 AM**

Fecha y hora de expedición: **27/11/2025 - 11:54 AM**

Empleado: **JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **1094280988**

Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS						
Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor	
Sueldo				4	\$ 255.480	
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				4	\$ 28.687	
Vacaciones liquidación contrato				1	\$ 10.644	
Prima liquidación contrato				4	\$ 23.511	
Cesantías liquidación contrato			0	0	\$ 23.511	
Intereses cesantías liquidación contrato			12	0	\$ 31	
Total Ingresos					\$ 339.824	

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES			
Concepto	Porcentaje	Valor	
Fondo de salud	4.00	\$ 10.218	
Fondo de pensión	4.00	\$ 10.218	
Total Deducciones		\$ 20.436	

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
----------	--------	-----	----------

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) \$ 319.388

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 319.388

Soporte de pago: DNE87

CUNE: db523ea7542ba7b72fd9719eac491ed50a32b3bd5dea98fcc19ad54e7ca1b46b01e8363a89c2cfe42d152e9d4cee950

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL


Yo **JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.094.280.998**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es "**ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de octubre del 2025.

Juan de Dios T.
JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS
C.C. 1.094.280.998

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Período de Pago: 20251001 - 20251030

Comprobante Número: 92

Fecha y hora de generación: 27/11/2025 - 11:53 AM

Fecha y hora de expedición: 27/11/2025 - 11:54 AM

Empleado: LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA

Ciudad: Cubará

Identificación: 9467070

Cargo: OBRERO DE CONSTRUCCION

Salario básico: \$1.915.950

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				4	\$ 255.460
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				4	\$ 26.667
Total Ingresos					\$ 282.127

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 10.218
Fondo de pensión	4.00	\$ 10.218
Total Deducciones		\$ 20.438

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
----------	--------	-----	----------

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) \$ 261.691

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 261.691

Soporte de pago: DNE92

CUNE: 2f5f8da31aa2bdfd4e9d791bdf32ac3f4778822c9107c177b2c12463be5a8fc1a5e28789cc8eedb3e583e21c7054182

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL


Yo **LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **9.467.070**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de octubre del 2025.

Luis Francisco Tarazona
LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA
C.C. 9.467.070

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: 20251001 - 20251030

Comprobante Número: 93

Fecha y hora de generación: 27/11/2025 - 11:53 AM

Fecha y hora de expedición: 27/11/2025 - 11:54 AM

Empleado: JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO

Ciudad: Cubará

Identificación: 88034175

Cargo: OBRERO DE CONSTRUCCION

Salario básico: \$1.915.950

INGRESOS					
Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				4	\$ 255.460
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				4	\$ 26.657
Total Ingresos					\$ 282.127

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES			
Concepto	Porcentaje	Valor	
Fondo de salud	4.00	\$ 10.218	
Fondo de pensión	4.00	\$ 10.218	
Total Deducciones		\$ 20.436	

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
----------	--------	-----	----------

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) \$ 261.691

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 261.691

Soporte de pago: DNE93

CUNE: 6a93869d690728413758c5832b8cbaa94562953290ddfb0e36702b8e6bf53b360f1d22608db623fcdc1b7a798c4b9fc8e

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO**, mayor de edad identificado con C.C. No. **88.034.175**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es "**ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de octubre del 2025.


JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO
C.C. 88.034.175

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: 20251001 - 20251030

Comprobante Número: 91

Fecha y hora de generación: 27/11/2025 - 11:53 AM

Fecha y hora de expedición: 27/11/2025 - 11:54 AM

Empleado: HENRY GUTIERREZ BATECA

Ciudad: Cubará

Identificación: 96125112

Cargo: OBRERO DE CONSTRUCCION

Salario básico: \$1.915.950

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				4	\$ 255.460
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				4	\$ 26.667
Total Ingresos					\$ 282.127

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 10.218
Fondo de pensión	4.00	\$ 10.218
Total Deducciones		\$ 20.436

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
----------	--------	-----	----------

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) \$ 261.691

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 261.691

Soporte de pago: DNE91

CUNE: ccc5289afefb460737066c35b4bee95228c6334bcff605d4016860b47fd532ff7d677fd5916b7dd4be3df75a58128bd4

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL


Yo **HENRY GUTIERREZ BATECA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **96.125.112**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es" **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de octubre del 2025.

Henry Gutierrez B
HENRY GUTIERREZ BATECA
C.C. 96.125.112

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: 20251001 - 20251030

Comprobante Número: 90

Fecha y hora de generación: 27/11/2025 - 11:53 AM

Fecha y hora de expedición: 27/11/2025 - 11:54 AM

Empleado: JAIME JOANNIS

Ciudad: Cubará

Identificación: 98167929

Cargo: OFICIAL DE CONSTRUCCION

Salario básico: \$2.573.010

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				4	\$ 343.068
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				4	\$ 26.667
Total Ingresos					\$ 369.735

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 13.723
Fondo de pensión	4.00	\$ 13.723
Total Deducciones		\$ 27.446

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
----------	--------	-----	----------

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) \$ 342.289

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 342.289

Soporte de pago: DNE90

CUNE: a53b183d545f139e6f9cf2e16ac6925d0f16ae1c85efb09546b6f2b18cca60c5c3df794fdc779574aad68bce9300641b

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **JAIMES JOANNIS CONTRERAS PEÑA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **96.167.929**, quien prestó sus servicios en calidad de oficial de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es" **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:


1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de octubre del 2025.



JAIMES JOANNIS CONTRERAS PEÑA
C.C. 96.167.929

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: 20251001 - 20251030

Comprobante Número: 81

Fecha y hora de generación: 27/11/2025 - 11:53 AM

Fecha y hora de expedición: 27/11/2025 - 11:54 AM

Empleado: **WILBER ALEXANDER MORENO TORRES**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **1049392860**

Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$1.515.950**

INGRESOS						
Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor	
Sueldo				4	\$ 255.460	
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				4	\$ 26.667	
Total Ingresos					\$ 282.127	

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES			
Concepto	Porcentaje	Valor	
Fondo de salud	4.00	\$ 10.218	
Fondo de pensión	4.00	\$ 10.218	
Total Deducciones		\$ 20.436	

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 261.691

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 261.691

Soporte de pago: DNE81

CUNE: 270efd9b2fe80aa570720310a749077bc2ea6a82ebbc9dfcb7f75004e7f42314a19dc7ead56ea8db679b0bcdd5d7043a

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL


Yo **WILBER ALEXANDER MORENO TORRES**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.392.860**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es **"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ"**, manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de octubre del 2025.


WILBER ALEXANDER MORENO TORRES
C.C. 1.049.392.860

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: 20251001 - 20251030

Comprobante Número: 60

Fecha y hora de generación: 27/11/2025 - 11:53 AM

Fecha y hora de expedición: 27/11/2025 - 11:53 AM

Empleado: RIQUELME CASTELLANOS ROJAS

Ciudad: Cubará

Identificación: 104933798

Cargo: OBRERO DE CONSTRUCCION

Salario básico: \$1.915.950

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				4	\$ 255.460
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				4	\$ 28.667
Vacaciones liquidación contrato				1	\$ 10.644
Prima liquidación contrato				4	\$ 23.511
Cesantías liquidación contrato			0	0	\$ 23.511
Intereses cesantías liquidación contrato			12	0	\$ 31
Total Ingresos					\$ 339.824

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 10.218
Fondo de pensión	4.00	\$ 10.218
Total Deducciones		\$ 20.436

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
----------	--------	-----	----------

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) \$ 319.388

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 319.388

Soporte de pago: DNE80

CUNE: ae47d190ff3c0a098f9116527e636b687f45b4f3286f31d35f7ff06ae3ecd603df32d7bce974bb7c93482ef6af9a2d2

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **RIQUELME CASTELLANOS ROJAS**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.393.798**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es "**ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de octubre del 2025.

Riquelme Castellanos
RIQUELME CASTELLANOS ROJAS
C.C. 1.049.393.798

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: 20251001 - 20251030

Comprobante Número: 82

Fecha y hora de generación: 27/11/2025 - 11:53 AM

Fecha y hora de expedición: 27/11/2025 - 11:54 AM

Empleado: OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL

Ciudad: Cubará

Identificación: 1049394907

Cargo: OBRERO DE CONSTRUCCION

Salario básico: \$1.915.950

INGRESOS					
Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				4	\$ 256.480
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				4	\$ 26.667
Total Ingresos					\$ 282.127

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES			
Concepto	Porcentaje	Valor	
Fondo de salud	4.00	\$ 10.218	
Fondo de pensión	4.00	\$ 10.218	
Total Deducciones		\$ 20.436	

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
----------	--------	-----	----------

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) \$ 261.691

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 261.691

Soporte de pago: ONE82

CUNE: 22f4ee3a2dc962793f7b6f9bab880a5a857d964ad372401bf2155f4f922eb298b34eb951a35dcc2be71c84b800aac006

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL


Yo **OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.394.907**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de octubre del 2025.

Oscar Guerrero
OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL
C.C. 1.049.394.907

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: 20251001 - 20251030

Comprobante Número: 83

Fecha y hora de generación: 27/11/2025 - 11:53 AM

Fecha y hora de expedición: 27/11/2025 - 11:54 AM

Empleado: CARLOS ALBERTO SANTAFE CASTELLANOS

Ciudad: Cubará

Identificación: 1049396199

Cargo: OBRERO DE CONSTRUCCION

Salario básico: \$1.916.960

INGRESOS					
Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				4	\$ 255.460
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				4	\$ 26.867
Total Ingresos					\$ 282.127

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES			
Concepto	Porcentaje	Valor	
Fondo de salud	4.00	\$ 10.218	
Fondo de pensión	4.00	\$ 10.218	
Total Deducciones			\$ 20.436

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 261.691

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 261.691

Soporte de pago: DNE83

CUNE: 1a55f7a2f4942ec6511ee2a92d4e940c546da7b2659d1503c3c1e277c0c08b925625c60dac864a5ae2230cedc4f1f963

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.396.199**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:


1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de octubre del 2025.



CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS
C.C. 1.049.396.199

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: 20251001 - 20251030

Comprobante Número: 84

Fecha y hora de generación: 27/11/2025 - 11:53 AM

Fecha y hora de expedición: 27/11/2025 - 11:54 AM

Empleado: MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIEDO

Ciudad: Cubará

Identificación: 1049396351

Cargo: OBRERO DE CONSTRUCCION

Salario básico: \$1.915.950

INGRESOS					
Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				4	\$ 255.460
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				4	\$ 28.667
Vacaciones liquidación contrato				1	\$ 10.644
Prima liquidación contrato				4	\$ 23.511
Cesantías liquidación contrato			0	0	\$ 23.511
Intereses cesantías liquidación contrato			12	0	\$ 31
Total Ingresos					\$ 339.824

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES			
Concepto	Porcentaje	Valor	
Fondo de salud	4.00	\$ 10.218	
Fondo de pensión	4.00	\$ 10.218	
Total Deducciones			\$ 20.436

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
----------	--------	-----	----------

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) \$ 319.388

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 319.388

Soporte de pago: DNE84

CUNE: bdcbb78ce2dac8b02d6fe555d8c88f382a06652ad0c00047f0e842e9634a58ff458a44adb0b24d1fcd4995d8972b5b933


Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO**, mayor de edad identificada con C.C. No. 1.049.396.351, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de octubre del 2025.


MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO
C.C. 1.049.396.351

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: 20251001 - 20251030

Comprobante Número: 86

Fecha y hora de generación: 27/11/2025 - 11:53 AM

Fecha y hora de expedición: 27/11/2025 - 11:54 AM

Empleado: CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA

Ciudad: Cubará

Identificación: 1094268169

Cargo: OBRERO DE CONSTRUCCION

Salario básico: \$1.915.950

INGRESOS					
Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				4	\$ 255.460
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				4	\$ 26.667
Total Ingresos					\$ 282.127

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES			
Concepto	Porcentaje	Valor	
Fondo de salud	4.00	\$ 10.218	
Fondo de pensión	4.00	\$ 10.218	
Total Deducciones			\$ 20.436

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
----------	--------	-----	----------

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) \$ 261.691

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria \$ 261.691

Soporte de pago: DNE85

CUNE: 118e205ab5ec8d3b70ced1e22efb666bc332a6493e3752143aed312dddb8d0a6168e577659e0c4f7674c6c41fda3fc0

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL


Yo **CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.194.268.169**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es "**ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de octubre del 2025.

Christian Bocota
CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA
C.C. 1.194.268.169

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: 20251001 - 20251030

Comprobante Número: 86

Fecha y hora de generación: 27/11/2025 - 11:53 AM

Fecha y hora de expedición: 27/11/2025 - 11:54 AM

Empleado: VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA

Ciudad: Cubará

Identificación: 1094275515

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

Salario básico: \$3.000.000

INGRESOS						
Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor	
Sueldo				14	\$ 1.400.000	
Total Ingresos					\$ 1.400.000	

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES			
Concepto	Porcentaje	Valor	
Fondo de salud	4.00	\$ 56.000	
Fondo de pensión	4.00	\$ 56.000	
Total Deducciones			\$ 112.000

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
----------	--------	-----	----------

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) \$ 1.288.000

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 1.288.000

Soporte de pago: DNE86

CUNE: 037e38b2c8472e9ea88f9dd12c9396114d80a5d46b6a2b07b88dc0c0d4fe1617cdf808b473de4d9f1e53e5e656860354

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.094.275.515**, quien prestó sus servicios en calidad de Residente de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

4. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
5. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
6. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de octubre del 2025.

Vianney Karina Buitrago
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
C.C. 1.094.275.515

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: 20251001 - 20251030

Comprobante Número: 88

Fecha y hora de generación: 27/11/2025 - 11:53 AM

Fecha y hora de expedición: 27/11/2025 - 11:54 AM

Empleado: KARINA BARRERA AGUABLANCA

Ciudad: Cubará

Identificación: 1115733517

Cargo: TRABAJADORA SOCIAL

Salario básico: \$2.500.000

INGRESOS					
Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				4	\$ 333.333
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				4	\$ 26.667
Total Ingresos					\$ 360.000

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 13.333
Fondo de pensión	4.00	\$ 13.333
Total Deducciones		\$ 26.666

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 333.334

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 333.334

Soporte de pago: DNE88

CUNE: 1c9fa2479dc960844b009befd7c167d7cf81e004ef63558fa8cc970556761a65efc5a54d517f2f626b0339f722bddba1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **KARINA BARRERA AGUABLANCA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.115.733.517** quien prestó sus servicios en calidad de trabajadora social, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de octubre del 2025.

Karina Barrera A
KARINA BARRERA AGUABLANCA
C.C. 1.115.733.517



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **FLORO IVAN CARRILLO MORA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.392.736**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de octubre del 2025.

Floro Ivan Carrillo
FLORO IVAN CARILLO MORA
C.C. 1.049.392.736



DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



CONSTRUINDUCIVIL SAS

Nit 901375684

CR 3 7A 67 BRR JARDIN

Tel: 3106716171

Cubará - Colombia

construinducivil@gmail.com



Periodo de Pago: 20251001 - 20251030

Comprobante Número: 83

Fecha y hora de generación: 27/11/2025 - 11:53 AM

Fecha y hora de expedición: 27/11/2025 - 11:54 AM

Empleado: FLORO IVAN CARRILLO

Ciudad: Cubará

Identificación: 1049392736

Cargo: OBRERO DE CONSTRUCCION

Salario básico: \$1.915.950

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				4	\$ 255.460
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				4	\$ 26.667
Total Ingresos					\$ 282.127

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 10.218
Fondo de pensión	4.00	\$ 10.218
Total Deducciones		\$ 20.436

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
----------	--------	-----	----------

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)

\$ 261.691

Observaciones:


Condiciones de pago: Efectivo \$ 261.691

Soporte de pago: DNE83

CUNE: 1a55f7a2f4942ec6511ee2a92d4e940c546da7b2659d1503c3c1e277c0c08b925625c60dac864a5ae2230cedc4f1f963

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: 20251001 - 20251030

Comprobante Número: 89

Fecha y hora de generación: 27/11/2025 - 11:53 AM

Fecha y hora de expedición: 27/11/2025 - 11:54 AM

Empleado: LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO

Ciudad: Cubará

Identificación: 4439097

Cargo: MAESTRO DE CONSTRUCCION

Salario básico: \$3.582.570

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				4	\$ 477.676
Total ingresos					\$ 477.676

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 19.107
Fondo de pensión	4.00	\$ 19.107
Total Deducciones		\$ 38.214

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
----------	--------	-----	----------

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) \$ 439.462

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 439.462

Soporte de pago: DNE89

CUNE: e4523704ec75e6cfc53e948682355ec78e8eb746349510dde8fd31ad30bc78771a584ee89801bd4a6d7d1d8abf0bcfaa


Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **LUIS ALBERTO TRUJILLO**, mayor de edad identificada con C.C. No. **4.439.097**, quien prestó sus servicios en calidad de Maestro de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es" **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de octubre del 2025


LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO
C.C. 4.439.097

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **BLANCA ISABEL SANTAFE ESTEVEZ**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.392.734**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de octubre del 2025

Blanca Isabel Santafe Estevez
BLANCA ISABEL SANTAFE ESTEVEZ
C.C. 1.049.392.734

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



CONSTRUINDUCIVIL SAS
 Nit 901375684
 CR 3 7A 67 BRR JARDIN
 Tel: 3106716171
 Cubará - Colombia
 construinducivil@gmail.com



Periodo de Pago: **20251001 - 20251030**

Comprobante Número: **83**

Fecha y hora de generación: **27/11/2025 - 11:53 AM**

Fecha y hora de expedición: **27/11/2025 - 11:54 AM**

Empleado: **BLANCA ISABEL SANTAFE ESTEVEZ**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **1049392734**

Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				4	\$ 255.460
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				4	\$ 26.667
Total Ingresos					\$ 282.127

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 10.218
Fondo de pensión	4.00	\$ 10.218
Total Deducciones		\$ 20.436

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
----------	--------	-----	----------

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)

\$ 261.691

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 261.691

Soporte de pago: DNE83

CUNE: 1a55f7a2f4942ec6511ee2a92d4e940c546da7b2659d1503c3c1e277c0c08b925625c60dac864a5ae2230cedc4f1f963

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo, **ROSA DANIELA SANTANDER APONTE**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.395.519**, quien prestó sus servicios en calidad de profesional SST, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de octubre del 2025

DANIELA SANTANDER
ROSA DANIELA SANTANDER APONTE
C.C. 1.049.395.519

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



CONSTRUINDUCIVIL SAS
Nit 901375684
CR 3 7A 67 BRR JARDIN
Tel: 3106716171
Cubará - Colombia

construinducivil@gmail.com



Periodo de Pago: 20251001 - 20251030

Comprobante Número: 88

Fecha y hora de generación: 27/11/2025 - 11:53 AM

Fecha y hora de expedición: 27/11/2025 - 11:54 AM

Empleado: ROSA DANIELA SANTANDER APONTE

Ciudad: Cubará

Identificación: 1049395519

Cargo: PROFESIONAL SST

Salario básico: \$2.500.000

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				4	\$ 333.333
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				4	\$ 26.667
Total Ingresos					\$ 360.000

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 13.333
Fondo de pensión	4.00	\$ 13.333
Total Deducciones		\$ 26.666

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
----------	--------	-----	----------

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	\$ 333.334
---	------------

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 333.334

Soporte de pago: DNE88

CUNE: 1c9fa2479dc960644b009befd7c167d7cf81e004ef63558fa8cc970556761a65efc5a54d517f2f626b0339f722bddba1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

ANEXO 7. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CONTRATO DE OBRA
No. 361-2025**

CONTRATO DE OBRA No. 361-2025

PERIODO: DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025

**OBJETO:
ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL
ESPECIAL DE CUBARÁ**

**CONTRATISTA: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
R/L GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA**

MARLENY APONTE TORRES- SUPERVISOR

CUBARÁ, 2025

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	OBJETIVOS	4
3	MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	5
4	AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.....	5
5	PROGRAMACIÓN DE CHARLAS Y ACTIVIDADES FORMATICAS EN SST	10
6	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	11
7	SEÑALIZACIÓN IMPLEMENTADA EN OBRA.....	12
8	ELEMENTOS DE EMERGENCIA: CAMILLA, EXTINTOR Y BOTIQUÍN	14
9	CHARLAS.....	15

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1.	Representante legal CONSTRUINDUCIVIL S.A.S octubre	5
Tabla 2.	Personal administrativo vinculado mes de octubre de 2025.....	5
Tabla 3.	Personal administrativo vinculado mes de noviembre de 2025.....	6
Tabla 4.	Personal técnico vinculado mes de octubre de 2025	6
Tabla 5.	Dotación de elementos de protección Contrato de Obra No. 361-2025.....	7

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1	Exámenes médicos.....	5
ANEXO 2	Afiliaciones a seguridad social	7
ANEXO 3.	Actas de entrega de dotación y elementos de protección personal.....	12
ANEXO 4.	Planillas de asistencia charlas.....	10

1 INTRODUCCIÓN

Las obras de infraestructura generan un gran impacto en la población laboral, que deben ser regulados por medio del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, además de la transversalidad del Sistema Integrado de Gestión con el que cuenta la empresa, los cuales están fundamentados en el cumplimiento de la legislación laboral vigente y otras aplicables.

Durante el desarrollo de cada una de estas actividades se pueden presentar posibles impactos y/o afectación adversa o benéfica, directa y puntual sobre los elementos ambientales y sociales como suelo, agua, flora, fauna, la comunidad, las actividades económicas y/o los servicios, por la movilización de maquinaria y vehículos, montaje de campamentos y equipos, captación de agua, generación de residuos sólidos y líquidos, transporte de material de construcción, excavaciones, construcción de estructuras, entre otras

CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. tiene entre sus propósitos desarrollar prevención en SST, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, dentro del desarrollo de la obra, la prevención en SST dentro de la obra está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador.

2 OBJETIVOS

Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad y salud en el trabajo y protección ambiental de proyecto **"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ"** Conforme a la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y en coherencia con el plan anual de trabajo nuestro objetivo es:

- ✓ Disminuir la accidentalidad y aparición de enfermedades profesionales en los trabajadores independiente de la forma de contratación o vinculación.
- ✓ Fortalecer los conocimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la implementación de un plan anual de capacitación.
- ✓ Implementar las medidas de promoción, prevención y control de acuerdo a la identificación de peligros, evaluación y valoración de los factores de riesgo, mediante la mejora del sistema.
- ✓ Realizar las evaluaciones medicas requeridas para el monitoreo de las condiciones de salud de los trabajadores.
- ✓ Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para control de riesgos y los equipos de protección personal que el empleador suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo
- ✓ Suministrar inducción adecuada a los trabajadores antes que inicie cualquier ocupación, sobre los riesgos y peligros que pueden afectarles, y sobre la forma, métodos y sistemas que deban observar para prevenirlos o evitarlos.

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Exámenes médicos pre-ocupacionales o de Ingreso:

Evalúan la salud física, mental y social de la persona a laborar, determinando su capacidad o no para la ejecución de la labor a realizar, sin que ponga en riesgo su salud o la de terceros, de acuerdo con las demandas del trabajo y los riesgos a los que va a estar expuesto.

ANEXO 1 Exámenes médicos

Los exámenes médicos ocupacionales se realizaron con el fin de verificar las condiciones de salud del personal antes y durante la ejecución de las actividades, garantizando su aptitud para las labores asignadas y cumpliendo con los requisitos establecidos en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este control permite prevenir riesgos, identificar posibles restricciones y asegurar un desempeño seguro en los frentes de obra.

AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el contrato, **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**, afilia a todo el personal dando así acatamiento a la ley 100 en el cual estipula la afiliación tanto a la EPS, AFP, ARL y caja de compensación familiar con el fin de brindarles todas las comodidades necesarias al empleado en el ejercicio de sus funciones.

Tabla 1. Representante legal CONSTRUINDUCIVIL S.A.S octubre

N	NOMBRE	Nº DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	AFILIADO A			CAJA DE COMPENSACION	No. PLANILLA
				EPS	AFP	ARL		
1	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA	1049397338	R/L	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	CONFABOY	35255951

Tabla 2. Personal administrativo vinculado mes de octubre de 2025

N	NOMBRE	Nº DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	AFILIADO A			CAJA DE COMPENSACION	No. PLANILLA
				EPS	AFP	ARL		
1	VIANNEY BUITRAGO	1.094.275.515	RESIDENTE DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	CONFABOY	35401775
2	ROSA DANIELA SANTANDER APONTE	1.049.395.519	PROFESIONAL HSEQ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	CONFABOY	35401775
3	KARINA RABERA AGUABLANCA	1.115.733.517	PROFESIONAL SOCIAL	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	CONFABOY	35401775

Tabla 3. Personal técnico vinculado mes de octubre de 2025

N	NOMBRE	N° DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	AFILIADO A			CAJA DE COMPENSACION	No. PLANILLA
				EPS	AFF	ARL		
1	JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA	96.167.929	OFICIAL DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35401775
2	BLANCA ISABEL GARCIA ESTEVEZ	1.074.072.704	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35401775
3	CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA	1.094.268.169	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY	35401775
4	CARLOS ALBERTO SANTANFE CASTELLANOS	1.049.396.199	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35401775
5	FLORIO IVAN CARRILLO MORA	1.074.072.730	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35401775
6	HENRY GUTIERREZ BATECA	96.125.112	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35401775
7	RIQUELME CASTELLANOS ROJAS	1.049.393.798	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35401775
8	WILBER ALEXANDER MORENO TORRES	1.049.392.860	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	COLPENSION	POSITIVA	COMFABOY	35401775
9	JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO	88.034.175	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY	35401775
10	JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS	1.094.280.998	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35401775
11	LUIS FRANCISCO TARAZONA	9.467.070	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	COLPENSION	POSITIVA	COMFABOY	35401775
12	OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL	1.049.394.907	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35401775
13	MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO	1.049.396.351	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	COLPENSION	POSITIVA	COMFABOY	35401775
14	LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO	4439097	MAESTRO DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSION	POSITIVA	COMFABOY	35401775

ANEXO 2. Afiliaciones a seguridad social

Tabla 4. Dotación de elementos de protección Contrato de Obra No. 361-2025

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGA DOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	SI	N	Buena	Regul	Mala	
PROTECCION DE MANOS						
Guantes reforzados	X		X			JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS HENRY GUTIERREZ BATECA RIQUELME CASTELLANOS ROJAS WILBER ALEXANDER MORENO TORRES JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO FLORO IVAN CARRILLO MORA BLANCA ISABEL SANTAFÉ ESTEVEZ CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA
PROTECCION DE OJOS						
Gafas de seguridad	X		X			JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS HENRY GUTIERREZ BATECA RIQUELME CASTELLANOS ROJAS WILBER ALEXANDER MORENO TORRES JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO FLORO IVAN CARRILLO MORA BLANCA ISABEL SANTAFÉ ESTEVEZ CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA
PROTECCION AUDITIVA						
Tapa oidos	X		X			JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS HENRY GUTIERREZ BATECA RIQUELME CASTELLANOS ROJAS WILBER ALEXANDER MORENO TORRES JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO FLORO IVAN CARRILLO MORA BLANCA ISABEL SANTAFÉ ESTEVEZ CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA
PROTECCION DE CUERPO						



ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGA DOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	SI	N	Bueno	Regul	Malo	
Camisa manga larga	X		X			JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS HENRY GUTIERREZ BATECA RIQUELME CASTELLANOS ROJAS WILBER ALEXANDER MORENO TORRES JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO FLORO IVAN CARRILLO MORA BLANCA ISABEL SANTAFE ESTEVEZ CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA
Botas	X		X			JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS HENRY GUTIERREZ BATECA RIQUELME CASTELLANOS ROJAS WILBER ALEXANDER MORENO TORRES JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO FLORO IVAN CARRILLO MORA BLANCA ISABEL SANTAFE ESTEVEZ CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA
Pantalón	X		X			JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS HENRY GUTIERREZ BATECA RIQUELME CASTELLANOS ROJAS WILBER ALEXANDER MORENO TORRES JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO FLORO IVAN CARRILLO MORA BLANCA ISABEL SANTAFE ESTEVEZ CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA
PROTECCION DE CABEZA						




ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGA DOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	SI	N	Bueno	Regul	Malo	
Casco	X		X			JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS HENRY GUTIERREZ BATECA RIQUELME CASTELLANOS ROJAS WILBER ALEXANDER MORENO TORRES JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO FLORO IVAN CARRILLO MORA BLANCA ISABEL SANTAFE ESTEVEZ CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA

PROGRAMACIÓN DE CHARLAS Y ACTIVIDADES FORMATICAS EN SST

Se llevarán a cabo charlas y capacitaciones orientadas a fortalecer la cultura de seguridad y salud en el trabajo, dirigidas por el profesional en HSEQ responsable del área. Estas actividades tuvieron como objetivo sensibilizar al personal sobre la importancia del autocuidado, el cumplimiento de las normas y el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

Entre los temas desarrollados se destacan:

- Inducción inicial y socialización de peligros y riesgos asociados a las labores.
- Uso correcto de los EPP, procedimientos de trabajo seguro y reporte oportuno de incidentes y accidentes laborales.

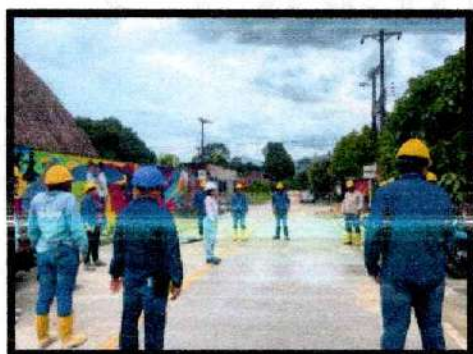

ANEXO 4. Planillas de asistencia charlas


Las planillas de asistencia se utilizan para llevar control del personal que participa en las charlas de seguridad, garantizando evidencia documental del cumplimiento formativo y asegurando que los trabajadores reciban las orientaciones necesarias para prevenir riesgos en los frentes de obra.

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

La interventoría verificó que el contratista utilizara en la ejecución de las actividades del contrato la maquinaria y equipo requerido según los APU y especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo constató el estado físico y de operación de la maquinaria y equipo solicitando al contratista sustituirlo por mal estado o realizarle mantenimiento preventivo y/o correctivo, cada vez que fue necesario.

La maquinaria y equipo que el contratista utilizó durante el periodo del presente informe fue el siguiente:

Tipo:	COMPRESOR	
Estado:	Bueno	
Regularidad del mantenimiento:	Mensual	
Vibraciones/ Ruidos:	(No presenta/ presenta)	
Idoneidad de operarios:	idóneo	

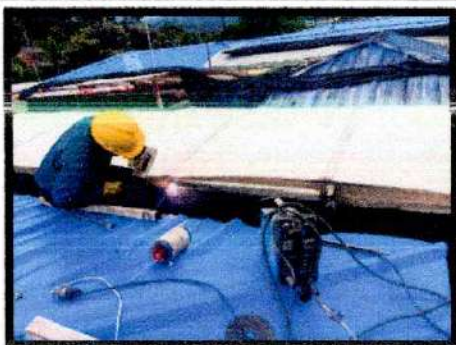Tipo:	MAQUINA DE SOLDAR	
Estado:	Bueno	
Regularidad del mantenimiento:	Mensual	
Vibraciones/ Ruidos:	(No presenta/ presenta)	
Idoneidad de operarios:	idóneo	

Tipo:	HIDROLAVADORA
Estado:	Bueno
Regularidad del mantenimiento:	Mensual
Vibraciones/ Ruidos:	(No presenta/ presenta)
Idoneidad de operarios:	idóneo



Tipo:	MAQUINA RETRO ESCABADORA
Estado:	Bueno
Regularidad del mantenimiento:	Mensual
Vibraciones/ Ruidos:	(No presenta/ presenta)
Idoneidad de operarios:	idoneo



Tipo:	PULIDORA
Estado:	Bueno
Regularidad del mantenimiento:	Mensual
Vibraciones/ Ruidos:	(No presenta/ presenta)
Idoneidad de operarios:	idóneo



SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MAQUINARIA

Se realizó seguimiento y control de la maquinaria y equipos propios y/o alquilados por el contratista, verificando que los seguros se encuentren vigentes y que los operarios cuenten con su respectiva afiliación al sistema de seguridad social integral y ARL.

Asimismo, se confirmó que el contratista dispone de los seguros necesarios relacionados con la operación, alquiler y manipulación de la maquinaria y equipos, con el fin de prevenir posibles riesgos derivados de daños, accidentes o afectaciones a terceros.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO					
	MES 1		MES 2			
	SI	N	S	N		
	O	I	O			
El contratista cuenta con los contratos de alquiler de la maquinaria y equipo que no son de su propiedad debidamente suscritos con terceros.	X					
Los operadores de la maquinaria y equipos se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social integral y ARL.	X					
Los vehículos maquinaria y equipo que el contratista tiene en la obra cumplen con los siguientes requisitos: • SOAT • Seguro contra todo riesgo • Tarjeta de propiedad • Licencia de conducción de la persona responsable	X					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Como parte del cumplimiento de las actividades del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizó la entrega de dotación al personal con el fin de garantizar su protección durante las labores diarias. Los elementos entregados fueron guantes, tapabocas, tapa oídos, botas, camisetas, casco y gafas de seguridad, con reposición periódica según el estado de los mismos.

Asimismo, se registró la entrega mediante formato de control de dotación y cada trabajador firmó como constancia de recibido. Esta gestión busca minimizar los riesgos asociados a las actividades operativas, promover el autocuidado y asegurar el adecuado uso de los elementos de protección personal.

Fotografía 1. Registro fotográfico – entrega de (EPP)



ANEXO 3. Actas de entrega de dotación y elementos de protección personal


Las actas de entrega de dotación y elementos de protección personal permiten dejar registro formal de que cada trabajador recibió los equipos necesarios para su actividad, garantizando el cumplimiento de los requisitos de seguridad y facilitando el control, seguimiento y responsabilidad en el uso adecuado de los EPP dentro del proyecto.

SEÑALIZACIÓN IMPLEMENTADA EN OBRA

En el marco de las actividades desarrolladas en los diferentes frentes de trabajo, se llevó a cabo la instalación de señalización preventiva e informativa con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y orientación para el personal.


- ✓ **Señalización Preventiva:** Instalación de señales de advertencia para identificar la presencia de escombros, frentes de obra y áreas con riesgo operativo, garantizando la alerta temprana al personal y visitantes.

Fotografía 2. Registro fotográfico de advertencias por escombros y zonas de obras

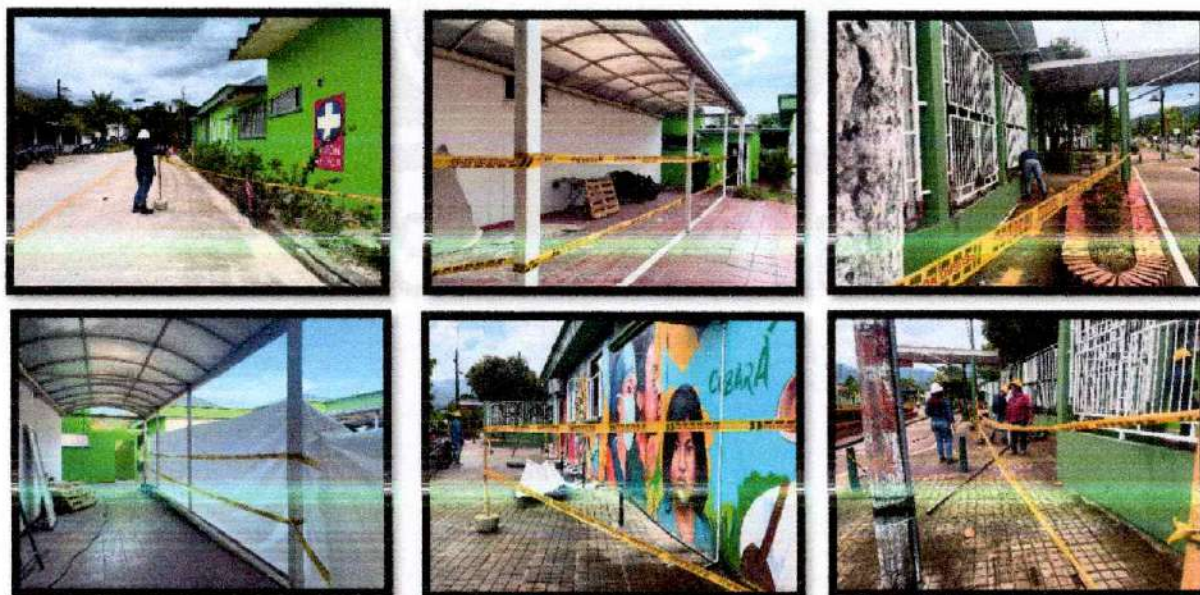

- ✓ **Señalización Informativa:** Implementación de señalización visible y estandarizada para orientar sobre la ubicación de la salida de emergencia, zonas de uso obligatorio de EPP, restricción de acceso a personal no autorizado, punto de encuentro, centro de acopio, punto ecológico y botiquín de primeros auxilios.

Fotografía 3. Registro fotográfico del seguimiento de señalización.

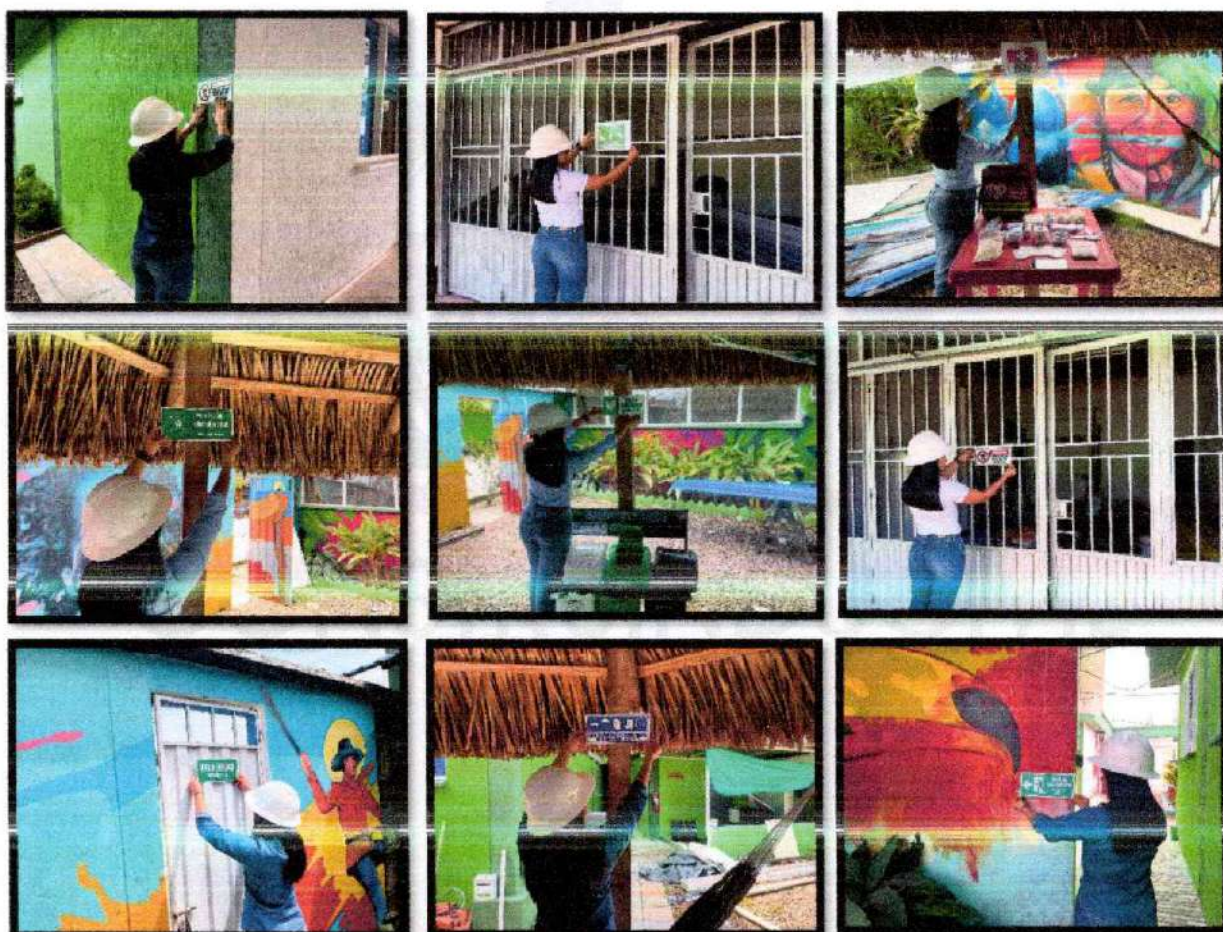

Las señalizaciones instaladas cumplen con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, garantizando el control de riesgos y la orientación adecuada del personal. Estas acciones fortalecen el SC-SST y contribuyen a un entorno de trabajo seguro y organizado.

ELEMENTOS DE EMERGENCIA: CAMILLA, EXTINTOR Y BOTIQUÍN

En el área de trabajo se verificó la presencia y adecuada disposición de los elementos esenciales para la atención de emergencias, tales como la camilla, el extintor y el botiquín. Estos equipos son fundamentales para responder de manera oportuna ante situaciones de riesgo, garantizar la seguridad del personal y cumplir con los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Fotografía 4. Registro fotográfico – elementos de emergencia



La camilla, el extintor y el botiquín cumplen con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y la Resolución 2400 de 1979, garantizando los elementos mínimos para emergencias y primeros auxilios en obra. Estos equipos, junto con lo indicado en la NTC 2050 y NTC 2885, aseguran una respuesta adecuada ante incidentes y fortalecen el compromiso con la seguridad y bienestar de los trabajadores.

Charlas.

Importancia del uso de los elementos de protección personal (EPP)

La presente charla tuvo como propósito reforzar la importancia del uso adecuado de los Equipos de Protección Personal (EPP) dentro de las actividades laborales. Durante la sesión, además de socializar los riesgos presentes en el entorno de trabajo, se realizaron dinámicas y juegos participativos orientados a sensibilizar a los trabajadores sobre el valor de cada parte de su cuerpo y la vulnerabilidad que existe cuando no se emplean correctamente los EPP.

Fotografía 4. Registro fotográfico



Como resultado, se evidenció una mayor comprensión sobre la relevancia de portar los EPP de manera correcta, así como una participación activa y consciente por parte del equipo.

Levantamientos de carga pesadas

La presente charla tuvo como propósito sensibilizar al personal sobre la importancia de aplicar correctamente las técnicas de levantamiento manual de cargas pesadas. Esta actividad, frecuente en las labores diarias, representa uno de los principales factores de riesgo ergonómico en los entornos laborales. Por ello, se enfatizó en la adopción de posturas adecuadas, el uso de ayudas mecánicas cuando sea posible y la prevención de lesiones musculoesqueléticas que pueden afectar la salud y el desempeño del trabajador.

Fotografía 5. Registro fotográfico – levantamiento de cargas pesadas.




La charla reforzó la conciencia del personal sobre el levantamiento seguro de cargas y la importancia de aplicar las recomendaciones para prevenir accidentes y lesiones. Se resaltó la responsabilidad individual en la seguridad diaria, aportando al bienestar del equipo y al cumplimiento del SG-SST.

Pausa de estiramiento laboral

La pausa de estiramientos es un espacio corto destinado a relajar y activar nuestro cuerpo durante la jornada laboral. Su objetivo principal es disminuir la tensión muscular, mejorar la postura y prevenir molestias causadas por movimientos repetitivos o posiciones prolongadas. A través de ejercicios sencillos y guiados, esta pausa nos ayuda a mantenernos más saludables, concentrados y con mayor bienestar físico y mental.

Fotografía 6. Registro fotográfico - pausa de estiramientos.

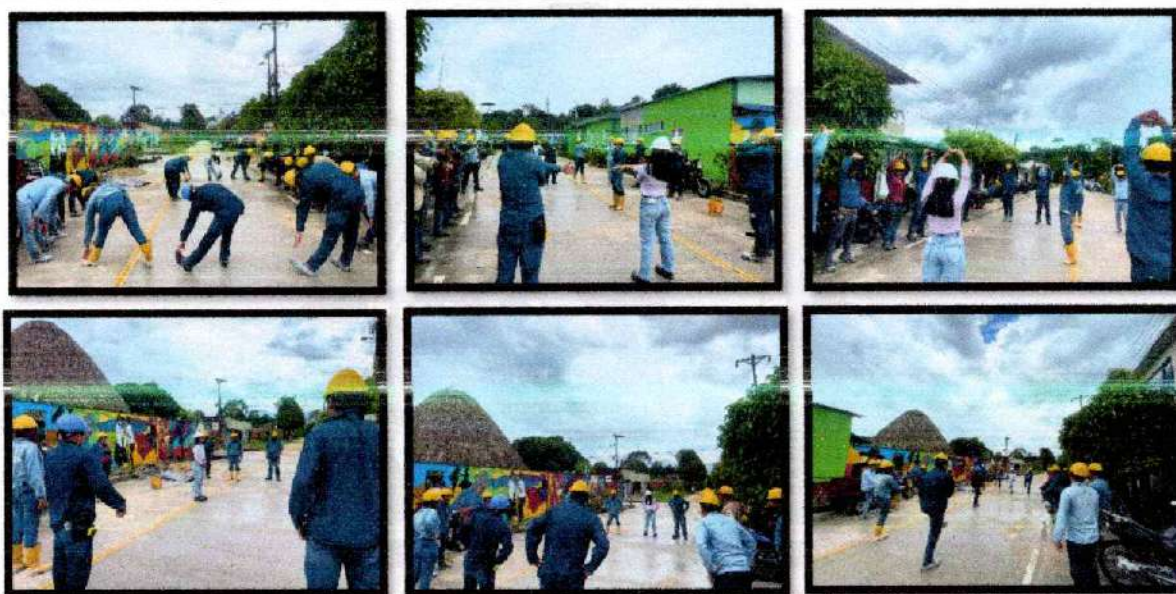


La pausa activa de estiramientos mostró resultados positivos al mejorar la movilidad, reducir la tensión muscular y aumentar la concentración. Los ejercicios ayudaron a disminuir la fatiga y generar bienestar general, consolidándose como una práctica sencilla y efectiva para mantener un buen desempeño físico y mental.

Identificación de riesgos

Durante la charla de Identificación de Riesgos se desarrolló una dinámica participativa en la cual cada trabajador recibía una pelota que contenía una pregunta relacionada con los peligros presentes en los frentes de obra. Al responder, el personal reforzó sus conocimientos sobre los riesgos más comunes, las medidas de control y la importancia de la prevención. Esta actividad permitió una interacción más dinámica, facilitando la comprensión de los temas y fortaleciendo la cultura de seguridad dentro del equipo.

Fotografía 7. Registro fotográfico - Identificación de riesgos.

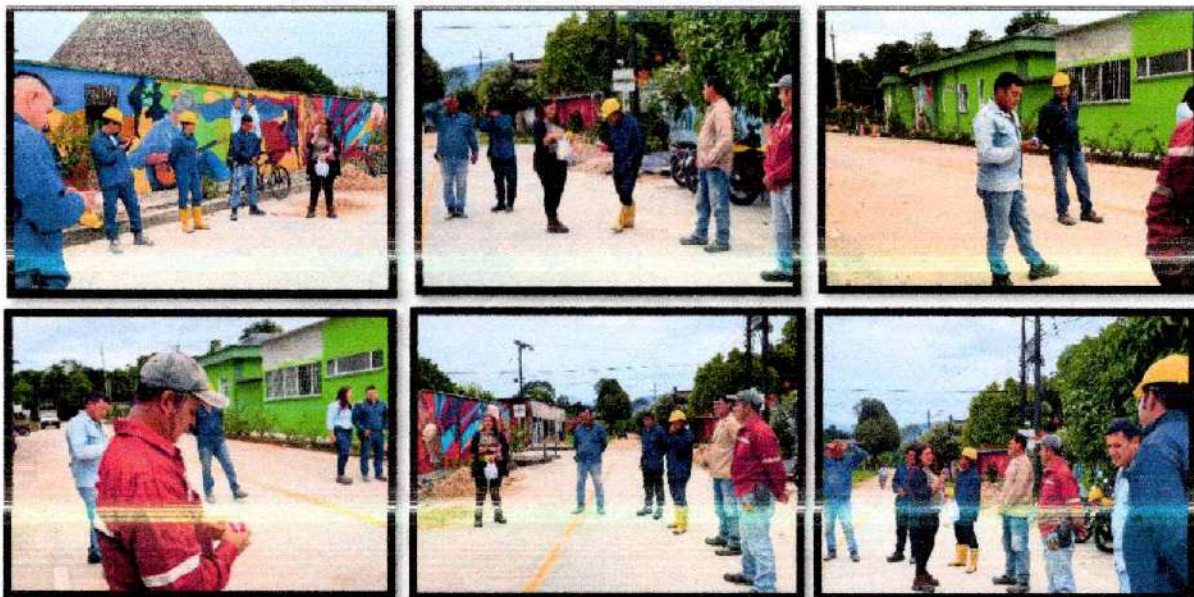

La dinámica realizada en la charla de Identificación de Riesgos permitió reforzar los conocimientos del personal sobre los peligros y las medidas de control, facilitando la comprensión de los temas y promoviendo una cultura de seguridad más sólida dentro del equipo.

CONCLUSIONES

Las actividades desarrolladas han contribuido significativamente a identificar y resaltar los aspectos fundamentales para la correcta implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Estas jornadas permitieron reconocer las necesidades reales de los trabajadores, promover la prevención de riesgos y fortalecer la cultura del autocuidado.

Asimismo, se logró analizar los peligros a los que están expuestos los colaboradores en sus labores diarias, destacando la importancia de la información, la capacitación continua y el uso adecuado de los elementos de protección personal y herramientas de trabajo. Todo ello con el propósito de garantizar entornos laborales más seguros y eficientes.

DANIELA SANTANDER

Atentamente:

ROSA DANIELA SANTANDER APONTE
PROFESIONAL SST

Anexo 1

Exámenes médicos

**WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA****NIT 76308195****CALLE 2 # 4-38****Teléfono : 313 8463293****CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL****Nro. ATENCIÓN** 00025711
FECHA Y HORA 23/10/2025 11:14**Página** 1**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

Nombres y apellidos	Nro. Identific.	Fec. Nac	Edad	Sexo
CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA	CC1094268169	02/02/1992	33 A	M
Dirección del Paciente	Teléfono	Estado Civil	Escolaridad	
CUBARA, Barrio Libertadores, CONOCIDA	123456789	Soltero	Básica	
Empresa	Cargo	Profesión		
CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	AYUDANTE OBRA CIVIL	OBrero NO CALIFICADO		

EXÁMENES REALIZADOS:

- EXAMEN FISICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
- EXAMEN FISICO CON ENFASIS EN TRABAJO EN ALTURAS

- RECOMENDACIONES MÉDICAS:
Control PYP por EPS.

EXAMEN MÉDICO DE INGRESO:

No existen restricciones para la ocupación del cargo.

- ESTILOS DE VIDA:
Dieta balanceada.
Ejercicio regular.
Actividad sano esparcimiento.

EXAMEN MÉDICO DE ALTURA:

No presenta restricciones para trabajar en altura.

- INCLUSIÓN SVE:
Osteomuscular.

OBSERVACIONES:

CONFORME A LA LEY 1751 DE 2015, ART. 10.
"Derechos y deberes de las personas, relacionados con la prestación del servicio de salud. Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio de salud: g) A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley,". SE GARANTIZA LA CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE.

RECOMENDACIONES:

- Uso de elementos de protección individual.
- Higiene postural.
- Calistenia al día.

Certifico que la información suministrada es completa y verídica, que no he omitido ninguna información sobre mi estado de salud y que comprendí las explicaciones y recomendaciones del médico.

Firma y Sello Médico especialista en salud ocupacional

Wellintong Moises Quiñones Daza
Médico Especialista
Univ. Internacional de la Rioja
Lic. SSP961/22

WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA C.C.76308195 R.M. 9942-88

Wellintong Moises Quiñones Daza
MÉDICO ESPECIALISTA GSSP
Univ. Internacional de la Rioja
Lic. SSP961/22

Cristian Bocota
Firma del paciente

**WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA**

NIT 76306195

CALLE 2 # 4-38

Teléfono : 313 8463293

**CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL**Nro. ATENCIÓN 00025690
FECHA Y HORA 22/10/2025 12:21

Página 1

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombres y apellidos	Nro. identific.	Fec. Nac	Edad	Sexo
JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO	CC88034175	22/07/1984	41 A	M
Dirección del Paciente	Teléfono	Estado Civil	Escolaridad	
CUBARA, Vereda Puerto Nuevo Bajo, CONOCIDA	313 2571542	Soltero	Media Técnico	
Empresa	Cargo	Profesión		
CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	AYUDANTE OBRA CIVIL	OBrero NO CALIFICADO		

EXÁMENES REALIZADOS:

- EXAMEN FISICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
- EXAMEN FISICO CON ENFASIS EN TRABAJO DE ALTURA

- RECOMENDACIONES MÉDICAS:
Control PYP por EPS.

EXAMEN MÉDICO DE INGRESO:

No existen restricciones para la ocupación del cargo.

- ESTILOS DE VIDA:
Dieta balanceada.
Ejercicio regular.
Actividad sano esparcimiento.

EXAMEN MÉDICO DE ALTURA:

No presenta restricciones para trabajar en altura.

- INCLUSIÓN SVE:
Osteomuscular.

OBSERVACIONES:

CONFORME A LA LEY 1751 DE 2015, ART. 10.
"Derechos y deberes de las personas, relacionados con la prestación del servicio de salud. Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio de salud: g) A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley,". SE GARANTIZA LA CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE.

RECOMENDACIONES:

- Uso de elementos de protección individual.
- Higiene postural.
- Calistenia al día.

Certifico que la información suministrada es completa y verídica, que no he omitido ninguna información sobre mi estado de salud y que comprendí las explicaciones y recomendaciones del médico.

Firma y Sello Médico especialista en salud ocupacional

Wellintong Moises Quiñones Daza
Médico Cirujano
Univ. Internacional de la Rioja
Lic. SSP861/22

WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA C.C.76306195 R.M. 9942-88

Wellintong Moises Quiñones Daza
MÉDICO ESPECIALISTA OSSP
Univ. Internacional de la Rioja
Lic. SSP861/22

Jaime Medina
Firma del paciente



WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA
NIT 76306195
CALLE 2 # 4-38
Teléfono : 313 8463293



CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL

Nro. ATENCIÓN 00025707
FECHA Y HORA 22/10/2025 16:47
Página 1

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombres y apellidos	Nro. Identific.	Fec. Nac	Edad	Sexo
JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA	CC96167929	02/03/1978	47 A	M
Dirección del Paciente	Teléfono	Estado Civil	Escolaridad	
TOLEDO, Corregimiento de Gibraltar, XXX	3213646269	Casado	Técnico	
Empresa	Cargo	Profesión		
CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	OFICIAL OBRA CIVIL	OBrero CALIFICADO		

EXÁMENES REALIZADOS:

- EXAMEN FISICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
- EXAMEN FISICO CON ENFASIS EN TRABAJO EN ALTURAS

EXAMEN MÉDICO DE INGRESO:

No existen restricciones para la ocupación del cargo.

EXAMEN MÉDICO DE ALTURA:

No presenta restricciones para trabajar en altura.

OBSERVACIONES:

CONFORME A LA LEY 1751 DE 2015, ART. 10.
"Derechos y deberes de las personas, relacionados con la prestación del servicio de salud. Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio de salud: g) A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley,". SE GARANTIZA LA CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE.

RECOMENDACIONES:

- Higiene postural.
- Calistenia al día.
- RECOMENDACIONES MÉDICAS:
Control PYP por EPS.
- ESTILOS DE VIDA:
Dieta balanceada.
Ejercicio regular.
Actividad sano esparcimiento.
- INCLUSIÓN SVE:
Osteomuscular.

Wellintong Moises Quiñones Daza
MÉDICO ESPECIALISTA GSSP
Univ. Internacional de la Rioja
Lic. SSP961/22

RECOMENDACIONES:

- Uso de elementos de protección individual.

Certifico que la información suministrada es completa y verídica, que no he omitido ninguna información sobre mi estado de salud y que comprendí las explicaciones y recomendaciones del médico.

Firma y Sello Médico especialista en salud ocupacional

Wellintong Moises Quiñones Daza
Médico Cirujano
Univ. Internacional de la Rioja - España
C.C. 76306195

JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA

Firma del paciente

**WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA**

NIT 76306195

CALLE 2 # 4-38

Teléfono : 313 8463293

**CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL**Nro. ATENCIÓN 00025705
FECHA Y HORA 22/10/2025 16:39

Página 1

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombres y apellidos	Nro. Identifio.	Fec. Nac	Edad	Sexo
BLANCA ISABEL SANTAFE ESTEVEZ	CC1049392734	18/05/1988	37 A	F
Dirección del Paciente	Teléfono	Estado Civil	Escolaridad	
CUBARA, Barrio Villa Esperanza, CONOCIDA	3227152878	Soltero	Tecnólogo	
Empresa	Cargo	Profesión		
CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	AYUDANTE OBRA CIVIL	OBRERO NO CALIFICADO		

EXÁMENES REALIZADOS:

- EXAMEN FISICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
- EXAMEN FISICO CON ENFASIS EN TRABAJO EN ALTURAS

EXAMEN MÉDICO DE INGRESO:

No existen restricciones para la ocupación del cargo.

EXAMEN MÉDICO DE ALTURA:

No presenta restricciones para trabajar en altura.

OBSERVACIONES:

CONFORME A LA LEY 1751 DE 2016, ART. 10.
"Derechos y deberes de las personas, relacionados con la prestación del servicio de salud. Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio de salud: g) A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley,". SE GARANTIZA LA CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE.

RECOMENDACIONES:

- Higiene postural.
- Calistenia al día.
- RECOMENDACIONES MÉDICAS:
Control PYP por EPS.
- ESTILOS DE VIDA:
Dieta balanceada.
Ejercicio regular.
Actividad sano esparcimiento.
- INCLUSIÓN SVE:
Osteomuscular.



Wellintong Moises Quiñones Daza
MÉDICO ESPECIALISTA GSSP
Univ. Internacional de la Rioja
Lic. SSP961/22

RECOMENDACIONES:

- Uso de elementos de protección individual.

Certifico que la información suministrada es completa y verídica, que no he omitido ninguna información sobre mi estado de salud y que comprendí las explicaciones y recomendaciones del médico.

Firma y Sello Médico especialista en salud ocupacional


Wellintong Moises Quiñones Daza
Médico Cirujano
Univ. Internacional de la Rioja - España
C.C. 76306195

WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA C.C.76306195 R.M. 9942-88

Blanca Isabel Santafé E.
Firma del paciente

**WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA**

NIT 76306195
CALLE 2 # 4-38
Teléfono : 313 8463293

**CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL**

Nro. ATENCIÓN 00025692
FECHA Y HORA 22/10/2025 14:24

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombres y apellidos	Nro. Identifio.	Fec. Nac	Edad	Sexo
MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIEDO	CC1049396351	29/01/1987	38 A	F
Dirección del Paciente	Teléfono	Estado Civil	Escolaridad	
CUBARA, Barrio el Jardin, XXXXX	3144790521	Unión Libre	Media Técnico	
Empresa	Cargo	Profesión		
CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	AYUDANTE OBRA CIVIL	OBrero NO CALIFICADO		

EXÁMENES REALIZADOS:

- EXAMEN FISICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
- EXAMEN FISICO CON ENFASIS EN TRABAJO DE ALTURAS

EXAMEN MÉDICO DE INGRESO:

No existen restricciones para la ocupación del cargo.

EXAMEN MÉDICO DE ALTURA:


No presenta restricciones para trabajar en altura.

OBSERVACIONES:

CONFORME A LA LEY 1751 DE 2015, ART. 10.
"Derechos y deberes de las personas, relacionados con la prestación del servicio de salud. Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio de salud: g) A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización paciente o en los casos previstos en la ley,". SE GARANTIZA LA CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE.

RECOMENDACIONES:

- Higiene postural.
- Calistenia al día.
- RECOMENDACIONES MÉDICAS:
Control PYP por EPS.
- ESTILOS DE VIDA:
Dieta balanceada.
Ejercicio regular.
Actividad sano esparcimiento.
- INCLUSIÓN SVE:
Osteomuscular.


Wellintong Moises Quiñones Daza
MÉDICO ESPECIALISTA GSSP
Univ. Internacional de la Rioja
Lic. SSP961/22

RECOMENDACIONES:


- Uso de elementos de protección individual.

Certifico que la información suministrada es completa y verídica, que no he omitido ninguna información sobre mi estado de salud y que comprendí las explicaciones y recomendaciones del médico.

Firma y Sello Médico especialista en salud ocupacional


Wellintong Moises Quiñones Daza
Médico Cirujano
Unidad de Cirugía - Remota
C.R. 1005004

WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA C.C.76306195 R.M. 9942-88


Marlenis F.
Firma del paciente

**WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA**

NIT 76306195

CALLE 2 # 4-38

Teléfono : 313 8463293

**CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL**

Nro. ATENCIÓN 00025696

FECHA Y HORA 22/10/2025 14:42

Página 1

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombres y apellidos	Nro. Identific.	Fec. Nac	Edad	Sexo
JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS	CC1094280996	22/12/1997	27 A	M
Dirección del Paciente	Teléfono	Estado Civil	Escolaridad	
CUBARA, Barrio San Rafael, CONOCIDA	3185621942	Soltero	Universitario	
Empresa	Cargo	Profesión		
CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	AYUDANTE OBRA CIVIL	OBrero NO CALIFICADO		

EXÁMENES REALIZADOS:

- EXAMEN FISICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
- EXAMEN FISICO CON ENFASIS EN TRABAJO EN ALTURAS

RECOMENDACIONES:

- Higiene postural.
- Calistenia al día.

EXAMEN MÉDICO DE INGRESO:

No existen restricciones para la ocupación del cargo.

RECOMENDACIONES MÉDICAS:

Control PYP por EPS.

EXAMEN MÉDICO DE ALTURA:

No presenta restricciones para trabajar en altura.

ESTILOS DE VIDA:

- Dieta balanceada.
- Ejercicio regular.
- Actividad sano esparcimiento.

OBSERVACIONES:

CONFORME A LA LEY 1751 DE 2015, ART. 10.
"Derechos y deberes de las personas, relacionados con la prestación del servicio de salud. Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio de salud: g) A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley,". SE GARANTIZA LA CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE.

INCLUSIÓN SVE:

Osteomuscular.

RECOMENDACIONES:

- Uso de elementos de protección individual.

Certifico que la información suministrada es completa y verídica, que no he omitido ninguna información sobre mi estado de salud y que comprendí las explicaciones y recomendaciones del médico.

Firma y Sello Médico especialista en salud ocupacional

Wellintong Moises Quiñones Daza
Médico Cirujano
Univ. Internacional de la Rioja
C.C. 9942-88

Wellintong Moises Quiñones Daza
MÉDICO ESPECIALISTA GSSP
Univ. Internacional de la Rioja
Lic. SSP981/22

WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA C.C.76306195 R.M. 9942-88

Juan de Dios T.
Firma del paciente



WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA

NIT 76306195

CALLE 2 #4-38

Teléfono : 313 8463293



CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL

Nro. ATENCIÓN

00025698

FECHA Y HORA

22/10/2025 14:51

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Página

1

Nombres y apellidos

Nro. Identific.

Fec. Nac

Edad

Sexo

OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL

CC1049394907

07/10/1993

32 A

M

Dirección del Paciente

Teléfono

Estado Civil

Escolaridad

CUBARA, Barrio el Comercio, CONOCIDA

3222570439

Soltero

Media Técnico

Empresa

Cargo

Profesión

CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

AYUDANTE OBRA CIVIL

OBrero NO CALIFICADO

EXÁMENES REALIZADOS:

- EXAMEN FISICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
- EXAMEN FISICO CON ENFASIS EN TRABAJO EN ALTURAS

EXAMEN MÉDICO DE INGRESO:

No existen restricciones para la ocupación del cargo.

EXAMEN MÉDICO DE ALTURA:

No presenta restricciones para trabajar en altura.

OBSERVACIONES:

CONFORME A LA LEY 1751 DE 2015, ART. 10.
"Derechos y deberes de las personas, relacionados con la prestación del servicio de salud. Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio de salud: g) A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley.". SE GARANTIZA LA CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE.

RECOMENDACIONES:

- Higiene postural.
- Calistenia al día.
- RECOMENDACIONES MÉDICAS:
Control PYP por EPS.
- ESTILOS DE VIDA:
Dieta balanceada.
Ejercicio regular.
Actividad sano esparcimiento.
- INCLUSIÓN SVE:
Osteomuscular.

RECOMENDACIONES:

- Uso de elementos de protección individual.

Certifico que la información suministrada es completa y verídica, que no he omitido ninguna información sobre mi estado de salud y que comprendí las explicaciones y recomendaciones del médico.

Firma y Sello Médico especialista en salud ocupacional

Wellintong Moises Quiñones Daza
Médico Cirujano
Univ. Internacional de la Rioja
Lic. SSP961/22

WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA C.C.76306195 R.M. 9942-88

Wellintong Moises Quiñones Daza
MÉDICO ESPECIALISTA GSSP
Univ. Internacional de la Rioja
Lic. SSP961/22

Oscar Guerrero
Firma del paciente



WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA

NIT 78306195
CALLE 2 # 4-38
Teléfono : 313 8463293



CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL

Nro. ATENCIÓN 00025699
FECHA Y HORA 22/10/2025 14:57
Página 1

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombres y apellidos	Nro. Identific.	Fec. Nac	Edad	Sexo
RIQUELME CASTELLANOS ROJAS	CC1049393798	22/08/1990	35 A	M
Dirección del Paciente	Teléfono	Estado Civil	Escolaridad	
CUBARA, Barrio 6 de Febrero, CONOCIDA	3161187113	Soltero	Media Técnico	
Empresa	Cargo	Profesión		
CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	AYUDANTE OBRA CIVIL	OBRERO NO CALIFICADO		

EXÁMENES REALIZADOS:

- EXAMEN FISICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
- EXAMEN FISICO CON ENFASIS EN TRABAJO EN ALTURAS

AMEN MÉDICO DE INGRESO:

No existen restricciones para la ocupación del cargo.

EXAMEN MÉDICO DE ALTURA:

No presenta restricciones para trabajar en altura.

OBSERVACIONES:

CONFORME A LA LEY 1751 DE 2015, ART. 10.
"Derechos y deberes de las personas, relacionados con la prestación del servicio de salud. Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio de salud: g) A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley,". SE GARANTIZA LA CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE.

RECOMENDACIONES:

- Higiene postural.
- Calistenia al día.
- RECOMENDACIONES MÉDICAS:
Control PYF por EPS.
- ESTILOS DE VIDA:
Dieta balanceada.
Ejercicio regular.
Actividad sano esparcimiento.
- INCLUSIÓN SVE:
Osteomuscular.

RECOMENDACIONES:

- Uso de elementos de protección individual.

Certifico que la información suministrada es completa y verídica, que no he omitido ninguna información sobre mi estado de salud y que comprendí las explicaciones y recomendaciones del médico.

Firma y Sello Médico especialista en salud ocupacional

Wellintong Moises Quiñones Daza
Médico Cirujano
Unidad de Gestión - Remota
C.A. 9942-88

WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA C.C.78306195 R.M. 9942-88

Wellintong Moises Quiñones Daza
MÉDICO ESPECIALISTA GSSP
Univ. Internacional de la Rioja
Lic. SSP961/22

Riquelme Castellanos
Firma del paciente



WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA

NIT 76306195
CALLE 2 # 4-38
Teléfono : 313 8463293



CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL

Nro. ATENCIÓN 00025700
FECHA Y HORA 22/10/2025 15:10
Página 1

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombres y apellidos	Nro. Identific.	Fec. Nac	Edad	Sexo
WILBER ALEXANDER MORENO TORRES	CC1049392860	25/11/2006	18 A	M
Dirección del Paciente	Teléfono	Estado civil	Escolaridad	
CUBARA, Barrio el Progreso, CONOCIDA	3224096213	Soltero	Básica	
Empresa	Cargo	Profesión		
CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	AYUDANTE OBRA CIVIL	OBRERO NO CALIFICADO		

EXÁMENES REALIZADOS:

- EXAMEN FISICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
- EXAMEN FISICO CON ENFASIS EN TRABAJO EN ALTURAS

RECOMENDACIONES:

- Higiene postural.
- Calistenia al día.
- RECOMENDACIONES MÉDICAS:
Control PYP por EPS.
- ESTILOS DE VIDA:
Dieta balanceada.
Ejercicio regular.
Actividad sano esparcimiento.
- INCLUSIÓN SVE:
Osteomuscular.

EXAMEN MÉDICO DE INGRESO:

No existen restricciones para la ocupación del cargo.

EXAMEN MÉDICO DE ALTURA:

No presenta restricciones para trabajar en altura.

OBSERVACIONES:

CONFORME A LA LEY 1751 DE 2015, ART. 10.
"Derechos y deberes de las personas, relacionados con la prestación del servicio de salud. Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio de salud: g) A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley,". SE GARANTIZA LA CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE.

Wellintong Moises Quiñones Daza
MÉDICO ESPECIALISTA GSSP
Univ. Internacional de la Rioja
Lic. SSP951/22

RECOMENDACIONES:

- Uso de elementos de protección individual.

Certifico que la información suministrada es completa y verídica, que no he omitido ninguna información sobre mi estado de salud y que comprendí las explicaciones y recomendaciones del médico.

Firma y Sello Médico especialista en salud ocupacional

Wellintong Moises Quiñones Daza
Médico Cirujano
Univ. Internacional de la Rioja
Lic. SSP951/22

Wilber M.

Firma del paciente

**WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA**

NIT 76306195

CALLE 2 # 4-38

Teléfono : 313 8463293

**CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL**

Nro. ATENCIÓN

00025702

FECHA Y HORA

22/10/2025 15:23

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Página

1

Nombres y apellidos	Nro. Identific.	Fec. Nac	Edad	Sexo
FLORO IVAN CARRILLO MORA	CC1049392738	17/08/1988	37 A	M
Dirección del Paciente	Teléfono	Estado civil	Escolaridad	
CUBARA, Barrio el Jardín, CONOCIDA	11111	Soltero	Media Técnico	
Empresa	Cargo	Profesión		
CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	AYUDANTE OBRERA CIVIL	OBRAERO NO CALIFICADO		

EXÁMENES REALIZADOS:

- EXAMEN FISICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
- EXAMEN FISICO CON ENFASIS EN TRABAJO EN ALTURAS

RECOMENDACIONES:

- Higiene postural.
- Calistenia al día.

AMEN MÉDICO DE INGRESO:

No existen restricciones para la ocupación del cargo.

RECOMENDACIONES MÉDICAS:

Control PYP por EPS.

EXAMEN MÉDICO DE ALTURA:

No presenta restricciones para trabajar en altura.

ESTILOS DE VIDA:

- Dieta balanceada.
- Ejercicio regular.
- Actividad sano esparcimiento.

OBSERVACIONES:

CONFORME A LA LEY 1751 DE 2015, ART. 10.
"Derechos y deberes de las personas, relacionados con la prestación del servicio de salud. Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio de salud: g) A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley,". SE GARANTIZA LA CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE.

INCLUSIÓN SVE:

Osteomuscular.

RECOMENDACIONES:

- Uso de elementos de protección individual.

Wellintong Moises Quiñones Daza
MÉDICO ESPECIALISTA GSSP
Univ. Internacional de la Rioja
Lic. 32P961/22

Certifico que la información suministrada es completa y verídica, que no he omitido ninguna información sobre mi estado de salud y que comprendí las explicaciones y recomendaciones del médico.

Firma y Sello Médico especialista en salud ocupacional

Wellintong Moises Quiñones Daza
Médico Cirujano
Unidad de Gestión - Salud
T.P. 9942-88

WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA C.C.76306195 R.M. 9942-88

Floro Ivan Carrillo
Firma del paciente



WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA
NIT 76308195
CALLE 2 # 4-38
Teléfono : 313 8463293



CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL

Nro. ATENCIÓN 00025703
FECHA Y HORA 22/10/2025 15:28
Página 1

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombres y apellidos	Nro. Identific.	Fec. Nac	Edad	Sexo
CARLOS ALBERTO SANTAFE CASTELLANOS	CC1049396199	03/07/1997	28 A	M
Dirección del Paciente	Teléfono	Estado Civil	Escolaridad	
CUBARA, Barrio San Rafael, CONOCIDA	3105697452	Soltero	Media Técnico	
Empresa	Cargo	Profesión		
CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	AYUDANTE OBRA CIVIL	OBrero NO CALIFICADO		

EXÁMENES REALIZADOS:

- EXAMEN FISICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
- EXAMEN FISICO CON ENFASIS EN TRABAJO EN ALTURAS

RECOMENDACIONES:

- Higiene postural.
- Calistenia al día.

AMEN MÉDICO DE INGRESO:

No existen restricciones para la ocupación del cargo.

- RECOMENDACIONES MÉDICAS:
Control PYP por EPS.

EXAMEN MÉDICO DE ALTURA:

No presenta restricciones para trabajar en altura.

- ESTILOS DE VIDA:
Dieta balanceada.
Ejercicio regular.
Actividad sano esparcimiento.

OBSERVACIONES:

CONFORME A LA LEY 1751 DE 2015, ART. 10.
"Derechos y deberes de las personas, relacionados con la prestación del servicio de salud. Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio de salud: g) A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley,". SE GARANTIZA LA CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE.

- INCLUSIÓN SVE:
Osteomuscular.


Wellintong Moises Quiñones Daza
MÉDICO ESPECIALISTA GSEP
Univ. Internacional de la Rioja
Lic. GSEP931/22

RECOMENDACIONES:

- Uso de elementos de protección individual.

Certifico que la información suministrada es completa y verídica, que no he omitido ninguna información sobre mi estado de salud y que comprendí las explicaciones y recomendaciones del médico.

Firma y Sello Médico especialista en salud ocupacional


Wellintong Moises Quiñones Daza
Médico Cirujano
Universidad de Calicut, Rajasthan
I.A. 9942-88

WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA C.C.76308195 R.M. 9942-88


Firma del paciente

**WELLINTONG MOISES QUINONES DAZA**

NIT 76306195

CALLE 2 # 4-38

Teléfono : 313 8483293

**CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL**

Nro. ATENCIÓN

00025704

FECHA Y HORA

22/10/2025 15:33

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Página

1

Nombres y apellidos	Nro. Identifio.	Fec. Nac	Edad	Sexo
LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO	CC4439097	25/07/1984	41 A	M
Dirección del Paciente	Teléfono	Estado Civil	Escolaridad	
CUBARA, Barrio el Jardín, CONOCIDA	3116334215	Soltero	Media Técnico	
Empresa	Cargo	Profesión		
CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	MAESTRO OBRA CIVIL	OBrero CALIFICADO		

EXÁMENES REALIZADOS:

- EXAMEN FISICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
- EXAMEN FISICO CON ENFASIS EN TRABAJO EN ALTURAS

RECOMENDACIONES:

- Higiene postural.
- Calistenia al día.

AMEN MÉDICO DE INGRESO:

No existen restricciones para la ocupación del cargo.

EXAMEN MÉDICO DE ALTURA:

No presenta restricciones para trabajar en altura.

RECOMENDACIONES MÉDICAS:

Control PYP por EPS.

ESTILOS DE VIDA:

- Dieta balanceada.
- Ejercicio regular.
- Actividad sano esparcimiento.

OBSERVACIONES:

CONFORME A LA LEY 1751 DE 2015, ART. 10.
"Derechos y deberes de las personas, relacionados con la prestación del servicio de salud. Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio de salud: g) A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley,". SE GARANTIZA LA CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE.

INCLUSIÓN SVE:

Osteomuscular.

RECOMENDACIONES:

- Uso de elementos de protección individual.

Certifico que la información suministrada es completa y verídica, que no he omitido ninguna información sobre mi estado de salud y que comprendí las explicaciones y recomendaciones del médico.

Firma y Sello Médico especialista en salud ocupacional

Wellintong Moisés Quinones Daza
Médico Cirujano
Unidad de Cirugía - Remota
T.P. 9942/88

Wellintong Moisés Quinones Daza
MÉDICO ESPECIALISTA GSSP
Univ. Internacional de la Rioja
Lic. SSP961/22

WELLINTONG MOISES QUINONES DAZA C.C.76306195 R.M. 9942-88

Luis Trujillo
Firma del paciente



WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA

NIT 76306195
CALLE 2 # 4-38
Teléfono : 313 8463293



CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL

Nro. ATENCIÓN 00025694
FECHA Y HORA 22/10/2025 14:37
Página 1

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombres y apellidos	Nro. Identific.	Fec. Nac	Edad	Sexo
LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA	CC9467070	20/04/1982	43 A	M
Dirección del Paciente	Teléfono	Estado Civil	Escolaridad	
CUBARA, Barrio el Jardín, XXXXX	3209866053	Unión Libre	Media Técnico	
Empresa	Cargo	Profesión		
CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	OFICIAL OBRA CIVIL	OBrero CALIFICADO		

EXÁMENES REALIZADOS:

- EXAMEN FISICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR
- EXAMEN FISICO CON ENFASIS EN TRABAJO EN ALTURAS

EXAMEN MÉDICO DE INGRESO:

No existen restricciones para la ocupación del cargo.

EXAMEN MÉDICO DE ALTURA:

No presenta restricciones para trabajar en altura.

OBSERVACIONES:

CONFORME A LA LEY 1751 DE 2015, ART. 10.
"Derechos y deberes de las personas, relacionados con la prestación del servicio de salud. Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio de salud: g) A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley,". SE GARANTIZA LA CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE.

RECOMENDACIONES:

- Higiene postural.
- Calistenia al día.

RECOMENDACIONES MÉDICAS:

Control PYP por EPS.

ESTILOS DE VIDA:

- Dieta balanceada.
- Ejercicio regular.
- Actividad sano esparcimiento.

INCLUSIÓN SVE:

Osteomuscular.

Wellintong Moises Quiñones Daza
MÉDICO ESPECIALISTA GSSF
Univ. Internacional de la Rioja
Lic. SSP951/22

RECOMENDACIONES:

- Uso de elementos de protección individual.

Certifico que la información suministrada es completa y verídica, que no he omitido ninguna información sobre mi estado de salud y que comprendí las explicaciones y recomendaciones del médico.

Firma y Sello Médico especialista en salud ocupacional

Wellintong Moises Quiñones Daza
Médico Cirujano
Unidad de Salud Ocupacional
C.C. 76306195

WELLINTONG MOISES QUIÑONES DAZA C.C.76306195 R.M. 9942-88

Luis Francisco Tarazona
Firma del paciente

Anexo 2

Afiliaciones a seguridad social

 3183616384 / 3106716171

 construinducivil@gmail.com

 Carrero 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubaró-Boyacá)

**LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:**

FLORO IVAN CARRILLO MORA identificado con Cédula Ciudadanía **1094392738** registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR	
Nombres y/o Razón Social	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
Tipo y Número de Documento	NIT 901375684
INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL	
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/10/27
Estado de Afiliación	Activo
Tipo de Vinculación	Dependiente
Código Actividad Económica	5411201
Clase de Riesgo	5
Fecha de Retiro	Sin Retiro

Esta certificación se expide a los 2025/10/29.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.**

Positiva Compañía de Seguros S.A.
Nit. 980.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (801) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Petyo Valentin (Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 1C #37A - 13, Oficina 501, Bogotá | +57 (801) 810 9784 | Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 8:00 p.m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva. Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación.

**LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS**

**LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:**

BLANCA ISABEL SANTAFE ESTEVEZ identificado con **Cédula Ciudadanía 1049392734** registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR	
Nombres y/o Razón Social	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
Tipo y Número de Documento	NIT 901375684
INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL	
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/10/27
Estado de Afiliación	Activo
Tipo de Vinculación	Dependiente
Código Actividad Económica	5411201
Clase de Riesgo	5
Fecha de Retiro	Sin Retiro

Esta certificación se expide a los 2025/10/29.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.**

Positiva Compañía de Seguros S.A.
NIT 860.011.153-9 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (801) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensorcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502.
Pregón 1 - 57 (801) 810 8864 | Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.
Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación.

**LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS**



**LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:**

JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA identificado con **Cédula Ciudadanía 96167929** registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR	
Nombres y/o Razón Social	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
Tipo y Número de Documento	NIT 901375684
INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL	
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/10/27
Estado de Afiliación	Activo
Tipo de Vinculación	Dependiente
Código Actividad Económica	5411201
Clase de Riesgo	5
Fecha de Retiro	Sin Retiro

Esta certificación se expide a los 2025/10/29.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.**

Positiva Compañía de Seguros S.A.
NIT: 860.011.353-8 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfonos: +57 (801) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Orozco (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensorcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502, Bogotá | +57 (801) 810 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 8:00 p.m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva. Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación.

**LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS**

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaCol PositivaSeguros

www.positiva.gov.co

**LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:**

MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIEDO identificado con Cédula Ciudadanía 1049396351 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR	
Nombres y/o Razón Social	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
Tipo y Número de Documento	NIT 901375684
INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL	
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/10/27
Estado de Afiliación	Activo
Tipo de Vinculación	Dependiente
Código Actividad Económica	5411201
Clase de Riesgo	S
Fecha de Retiro	Sin Retiro

Esta certificación se expide a los 2025/10/29.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.**

Positiva Compañía de Seguros S.A.
NIT. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-179 - Teléfonos: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 # 97A - 13, Oficina 502.
Bogotá | +57 (601) 910 9164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. - 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.
Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación.

**LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS**

**LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:**

LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO identificado con Cédula Ciudadanía **4439097** registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR	
Nombres y/o Razón Social	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
Tipo y Número de Documento	NIT 901375684
INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL	
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/10/27
Estado de Afiliación	Activo
Tipo de Vinculación	Dependiente
Código Actividad Económica	5411201
Clase de Riesgo	5
Fecha de Retiro	Sin Retiro

Esta certificación se expide a los 2025/10/29.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

**LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:**

OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL identificado con Cédula Ciudadanía 1049394907 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR	
Nombres y/o Razón Social	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
Tipo y Número de Documento	NIT 901375684
INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL	
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/10/27
Estado de Afiliación	Activo
Tipo de Vinculación	Dependiente
Código Actividad Económica	5411201
Clase de Riesgo	5
Fecha de Retiro	Sin Retiro

Esta certificación se expide a los 2025/10/29.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

Positiva Compañía de Seguros S.A.
Nít. 960.011.153-8 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502, Bogotá | +57 (601) 890 2184 | Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. El Defensor, resolverá los quejos o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva. Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación.

**LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS**

**LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:**

LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA identificado con Cédula Ciudadanía **9467070** registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR	
Nombres y/o Razón Social	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
Tipo y Número de Documento	NIT 901375684
INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL	
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/10/27
Estado de Afiliación	Activo
Tipo de Vinculación	Dependiente
Código Actividad Económica	5411201
Clase de Riesgo	5
Fecha de Retiro	Sin Retiro

Esta certificación se expide a los 2025/10/29.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

Positiva Compañía de Seguros S.A.
Nt. 800.016153-8 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 930 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502.
Bogotá | +57 (601) 810 8154 | lunes a Viernes 8:00 a. m. - 6:00 p. m. | El Defensor resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.
Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o lo SFC u otro organismo de autoregulación.

**LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS**

**LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:**

JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS identificado con **Cédula Ciudadanía 1094280998** registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR	
Nombres y/o Razón Social	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
Tipo y Número de Documento	NIT 901375684
INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL	
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/10/27
Estado de Afiliación	Activo
Tipo de Vinculación	Dependiente
Código Actividad Económica	5411201
Clase de Riesgo	5
Fecha de Retiro	Sin Retiro

Esta certificación se expide a los 2025/10/29.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

Positiva Compañía de Seguros S.A.
Nit. 880.011.153-81 Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (801) 990 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensorcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502.
Bogotá | +57 (801) 810 8184 | Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.
Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autoregulación.

**LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS**

**LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:**

JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO identificado con **Cédula Ciudadanía 88034175** registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR	
Nombres y/o Razón Social	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
Tipo y Número de Documento	NIT 901375684
INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL	
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/10/27
Estado de Afiliación	Activo
Tipo de Vinculación	Dependiente
Código Actividad Económica	5411201
Clase de Riesgo	5
Fecha de Retiro	Sin Retiro

Esta certificación se expide a los 2025/10/29.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.**

Positiva Compañía de Seguros S.A.
NR. 860.011.63-8 | Línea Gratuita Nacional (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 602, Bogotá | +57 (601) 810-8184 | Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 8:00 p.m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva. Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o lo SFC u otro organismo de autorregulación.

**LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS**

**LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:**

WILBER ALEXANDER MORENO TORRES identificado con **Cédula Ciudadanía 1049392860** registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR	
Nombres y/o Razón Social	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
Tipo y Número de Documento	NIT 901375684
INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL	
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/10/27
Estado de Afiliación	Activo
Tipo de Vinculación	Dependiente
Código Actividad Económica	5411201
Clase de Riesgo	5
Fecha de Retiro	Sin Retiro

Esta certificación se expide a los 2025/10/29.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.**

Positiva Compañía de Seguros S.A.
Nit. 980.011.169-8 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (801) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giráldez (Principal) - Pablo Valencia (Suplante) | defensor@cliente.positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502.
Bogotá | +57 (801) 890 8184 | Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.
Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autogestión.

**LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS**

**LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:**

RIQUELME CASTELLANOS ROJAS identificado con **Cédula Ciudadanía 1049393798** registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR	
Nombres y/o Razón Social	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
Tipo y Número de Documento	NIT 901375684
INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL	
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/10/27
Estado de Afiliación	Activo
Tipo de Vinculación	Dependiente
Código Actividad Económica	5411201
Clase de Riesgo	5
Fecha de Retiro	Sin Retiro

Esta certificación se expide a los 2025/10/29.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.**

Positiva Compañía de Seguros S.A.
NIT. 860.011.55-8 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (60) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Gilalco (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502.
Bogotá | +57 (60) 610 8194 | Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.
Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autoregulación.

**LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS**

**LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:**

HENRY GUTIERREZ BATECA identificado con **Cédula Ciudadanía 96125112** registra la siguiente información en el
ramp de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR	
Nombres y/o Razón Social	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
Tipo y Número de Documento	NIT 901375684
INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL	
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/10/27
Estado de Afiliación	Activo
Tipo de Vinculación	Dependiente
Código Actividad Económica	5411201
Clase de Riesgo	5
Fecha de Retiro	Sin Retiro

Esta certificación se expide a los 2025/10/29.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.**

Positiva Compañía de Seguros S.A.
NIT. 880.011.153-8 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (801) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13. Oficina 502.
Bogotá | +57 (801) 810 8184 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. - 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.
Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro
organismo de autorregulación.

**LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS**

**LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:**

CARLOS ALBERTO SANTAFE CASTELLANOS identificado con **Cédula Ciudadanía 1049396199** registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR	
Nombres y/o Razón Social	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
Tipo y Número de Documento	NIT 901375684
INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL	
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/10/27
Estado de Afiliación	Activo
Tipo de Vinculación	Dependiente
Código Actividad Económica	5411201
Clase de Riesgo	5
Fecha de Retiro	Sin Retiro

Esta certificación se expide a los 2025/10/29.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

Positiva Compañía de Seguros S.A.
Nit. 890.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfonos: +57 (801) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #87A - 13, Oficina 802.
Bogotá | +57 (801) 810 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.
Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación.

**LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS**

**LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:**

CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA identificado con Cédula Ciudadanía **1094268169** registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR	
Nombres y/o Razón Social	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
Tipo y Número de Documento	NIT 901375684
INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL	
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/10/27
Estado de Afiliación	Activo
Tipo de Vinculación	Dependiente
Código Actividad Económica	5411201
Clase de Riesgo	5
Fecha de Retiro	Sin Retiro

Esta certificación se expide a los 2025/10/29.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.**

Positiva Compañía de Seguros S.A.
N.º: 880.011.169-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (801) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Paola Valencia (Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502, Bogotá | +57 (801) 810 8184 | Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 8:00 p.m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva. Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/queja/defensora-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SEC u otro organismo de autorregulación.

**LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS**

Anexo 3

Actas de entrega de dotacion y EPP


 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ		 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
	FORMATO: "ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL"		
IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR	1049394907	FECHA DE ENTREGA	27-oct-25
NOMBRE DEL TRABAJADOR	MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO		
CARGO	AYUDANTE DE OBRA		
CENTRO DE TRABAJO	Calle 3 No 5-47 Cubará Boyacá E.S.E Especial de Cubará		

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230 de la resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al decreto 1072 de 2015 (Art 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art 2.2.4.6.24 inciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, la EMPRESA CONSTRUINDUCIVIL S.A.S hace entrega de los siguientes elementos los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de peligros y riesgos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
PANTALON	1	14	
CAMISA	1	L	
GUANTE REFORZADO	1		
CASCO DE SEGURIDAD	1		
TAPA BOCAS	1		
TAPA OIDOS	1		
BOTAS	1	37	
GAFAS	1		

El trabajador Acepta:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.
- Usar la dotación que se le entrega y desechar la anterior, que este en mal estado.


MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO
 1049394907
 AYUDANTE DE OBRA


ROSA DANIELA SANTANDER APONTE
 C.C 1049395519 DE CUBARÁ
 HSEQ. CONSTRUINDUCIVIL.

 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ		 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
	FORMATO: "ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL "		
IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR	1049394907	FECHA DE ENTREGA	27-oct-25
NOMBRE DEL TRABAJADOR	OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL		
CARGO	AYUDANTE DE OBRA		
CENTRO DE TRABAJO	Calle 3 No 5-47 Cubará Boyacá E.S.E Especial de Cubará		

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230 de la resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al decreto 1072 de 2015 (Art 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art 2.2.4.6.24 inciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, la EMPRESA CONSTRUINDUCIVIL S.A.S hace entrega de los siguientes elementos los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de peligros y riesgos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
PANTALON	1	32	
CAMISA	1	M	
GUANTE REFORZADO	1		
CASCO DE SEGURIDAD	1		
TAPA BOCAS	1		
TAPA OIDOS	1		
BOTAS	1	41	
GAFAS	1		

El trabajador Acepta:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.
- Usar la dotación que se le entrega y desechar la anterior, que este en mal estado.


OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL
 1049394907
 AYUDANTE DE OBRA


ROSA DANIELA SANTANDER APONTE
 C.C 1049395519 DE CUBARÁ
 HSEQ. CONSTRUINDUCIVIL

 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ		 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
	FORMATO: "ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL"		
IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR	1049396199	FECHA DE ENTREGA	27-oct-25
NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARLOS ALBERTO SANTANPÉ CASTELLANOS		
CARGO	AYUDANTE DE OBRA		
CENTRO DE TRABAJO	Calle 3 No 5-47 Cubará Boyacá E.S.E Hospital Especial de Cubará		


Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230 de la resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al decreto 1072 de 2015 (Art 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art 2.2.4.6.24 inciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, la EMPRESA CONSTRUINDUCIVIL S.A.S hace entrega de los siguientes elementos los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de peligros y riesgos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
PANTALON	1	32	
CAMISA	1	M	
GUANTE REFORZADO	1		
CASCO DE SEGURIDAD	1		
TAPA BOCAS	1		
TAPA OIDOS	1		
BOTAS	1	40	
GAFAS	1		

El trabajador Acepta:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.
- Usar la dotación que se le entrega y desechar la anterior, que este en mal estado.


CARLOS ALBERTO SANTANPÉ CASTELLANOS
 1049396199
 AYUDANTE DE OBRA


ROSA DANIELA SANTANDER APONTE
 C.C 1049395519 DE CUBARÁ
 HSEQ. CONSTRUINDUCIVIL


 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ		 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
	FORMATO: "ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL"		
IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR	1049392860	FECHA DE ENTREGA	27-oct-25
NOMBRE DEL TRABAJADOR	WILBER ALEXANDER MORENO TORRES		
CARGO	AYUDANTE DE OBRA		
CENTRO DE TRABAJO	Calle 3 No 5-47 Cubará Boyacá E.S.E Especial de Cubará		


Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230 de la resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al decreto 1072 de 2015 (Art 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art 2.2.4.6.24 inciso 5, párrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, la EMPRESA CONSTRUINDUCIVIL S.A.S hace entrega de los siguientes elementos los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de peligros y riesgos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
PANTALON	1	32	
CAMISA	1	M	
GUANTE REFORZADO	1		
CASCO DE SEGURIDAD	1		
TAPA BOCAS	1		
TAPA OIDOS	1		
BOTAS	1	41	
GAFAS	1		

El trabajador Acepta:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.
- Usar la dotación que se le entrega y desechar la anterior, que este en mal estado.


WILBER ALEXANDER MORENO TORRES
 1049392860
 AYUDANTE DE OBRA


ROSA DANIELA SANTANDER APONTE
 C.C 1049395519 DE CUBARÁ
 HSEQ. CONSTRUINDUCIVIL

 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ		 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
	FORMATO: "ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL"		
IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR	1064268169	FECHA DE ENTREGA	27-oct-25
NOMBRE DEL TRABAJADOR	CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA		
CARGO	AYUDANTE DE OBRA		
CENTRO DE TRABAJO	Calle 3 No 5-47 Cuhará Boyacá E.S.E Especial de Cuhará		


Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230 de la resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al decreto 1072 de 2015 (Art 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art 2.2.4.6.24 inciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, la EMPRESA CONSTRUINDUCIVIL S.A.S hace entrega de los siguientes elementos los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de peligros y riesgos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
PANTALON	1	28	
CAMISA	1	S	
GUANTE REFORZADO	1		
CASCO DE SEGURIDAD	1		
TAPA BOCAS	1		
TAPA OIDOS	1		
BOTAS	1	37	
GAFAS	1		

El trabajador Acepta:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.
- Usar la dotación que se le entrega y desechar la anterior, que este en mal estado.


CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA
 1094268169
 AYUDANTE DE OBRA


ROSA DANIELA SANTANDER APONTE
 C.C 1049395519 DE CUBARÁ
 HSEQ. CONSTRUINDUCIVIL

 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ		 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
	FORMATO: "ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL"		

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR	1049393798	FECHA DE ENTREGA	27-oct-25
NOMBRE DEL TRABAJADOR	RIQUELME CASTELLANOS ROJAS		
CARGO	AYUDANTE DE OBRA		
CENTRO DE TRABAJO	Calle 3 No 5-47 Cubará Boyacá E.S.E Especial de Cubará		

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230 de la resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al decreto 1072 de 2015 (Art 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art 2.2.4.6.24 inciso 3, párrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, la EMPRESA CONSTRUINDUCIVIL S.A.S hace entrega de los siguientes elementos los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de peligros y riesgos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
PANTALON	1	34	
CAMISA	1	L	
GUANTE REFORZADO	1		
CASCO DE SEGURIDAD	1		
TAPA BOCAS	1		
TAPA OIDOS	1		
BOTAS	1	40	
GAFAS	1		

El trabajador Acepta:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.
- Usar la dotación que se le entrega y desechar la anterior, que este en mal estado.

Riquelme

RIQUELME CASTELLANOS ROJAS
1049393798
AYUDANTE DE OBRA

Rosa Daniela Santander Aponte

ROSA DANIELA SANTANDER APONTE
C.C 1049395819 DE CUBARÁ
HSEQ. CONSTRUINDUCIVIL


	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ		
	FORMATO: "ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL"		
IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR	88034175	FECHA DE ENTREGA	27-oct-25
NOMBRE DEL TRABAJADOR	JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO		
CARGO	AYUDANTE DE OBRA		
CENTRO DE TRABAJO	Calle 3 No 3-47 Cubará Boyacá E.S.E Especial de Cubará		


Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230 de la resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al decreto 1072 de 2015 (Art 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art 2.2.4.6.24 inciso 5, párrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, la EMPRESA CONSTRUINDUCIVIL S.A.S hace entrega de los siguientes elementos los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de peligros y riesgos:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
PANTALON	1	34	
CAMISA	1	L	
GUANTE REFORZADO	1		
CASCO DE SEGURIDAD	1		
TAPA BOCAS	1		
TAPA OIDOS	1		
BOTAS	1	40	
GAFAS	1		

El trabajador Acepta:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.
- Usar la dotación que se le entrega y desechar la anterior, que esté en mal estado.


JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO
 88034175
 AYUDANTE DE OBRA


ROSA DANIELA SANTANDER APONTE
 C.C 1049395519 DE CUBARÁ
 HSEQ. CONSTRUINDUCIVIL


 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ		 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
	FORMATO: "ACTA DE ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL"		
IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR	1049392738	FECHA DE ENTREGA	27-oct-25
NOMBRE DEL TRABAJADOR	FLORO IVAN CARRILLO MORA		
CARGO	AYUDANTE DE OBRA		
CENTRO DE TRABAJO	Calle 3 No 5-47 Cubará Boyacá E.S.E Hospital Especial de Cubará		

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230 de la resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al decreto 1072 de 2015 (Art 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art 2.2.4.6.24 inciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, la EMPRESA CONSTRUINDUCIVIL S.A.S hace entrega de los siguientes elementos los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de peligros y riesgos:



DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
PANTALON	1	36	
CAMISA	1	L	
GUANTE REFORZADO	1		
CASCO DE SEGURIDAD	1		
TAPA BOCAS	1		
TAPA OIDOS	1		
BOTAS	1	40	
GAFAS	1		

El trabajador Acepta:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.
- Usar la dotación que se le entrega y desechar la anterior, que este en mal estado.


FLORO IVAN CARRILLO MORA
 1049392738
 AYUDANTE DE OBRA


ROSA DANIELA SANTANDER APONTE
 C.C 1049395519 DE CUBARÁ
 HSEQ. CONSTRUINDUCIVIL

 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ		 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.																																				
	FORMATO: "ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL"																																						
IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR	4439097	FECHA DE ENTREGA	27-oct-25																																				
NOMBRE DEL TRABAJADOR	LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO																																						
CARGO	MAESTRO DE OBRA																																						
CENTRO DE TRABAJO	Calle 3 No 5-47 Cubará Boyacá E.S.E Especial de Cubará																																						
Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230 de la resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al decreto 1072 de 2015 (Art 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art 2.2.4.6.24 inciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, la EMPRESA CONSTRUINDUCIVIL S.A.S hace entrega de los siguientes elementos los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de peligros y riesgos:																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TALLA</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PANTALON</td> <td>1</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAMISA</td> <td>1</td> <td>M</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GUANTE REFORZADO</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CASCO DE SEGURIDAD</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TAPA BOCAS</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TAPA OIDOS</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BOTAS</td> <td>1</td> <td>39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GAFAS</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES	PANTALON	1	30		CAMISA	1	M		GUANTE REFORZADO	1			CASCO DE SEGURIDAD	1			TAPA BOCAS	1			TAPA OIDOS	1			BOTAS	1	39		GAFAS	1		
DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES																																				
PANTALON	1	30																																					
CAMISA	1	M																																					
GUANTE REFORZADO	1																																						
CASCO DE SEGURIDAD	1																																						
TAPA BOCAS	1																																						
TAPA OIDOS	1																																						
BOTAS	1	39																																					
GAFAS	1																																						
El trabajador Acepta:																																							
• Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación. • Que conoce la obligatoriedad de su uso. • Hacer buen uso de los elementos entregados. • Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones. • Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad. • Usar la dotación que se le entrega y desechar la anterior, que este en mal estado.																																							
 LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO 4439097 MAESTRO DE OBRA		 ROSA DANIELA SANTANDER APONTE C.C 1049395519 DE CUBARÁ HSEQ. CONSTRUINDUCIVIL																																					

 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ		 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.																																				
FORMATO: "ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL"																																							
IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR	96167929	FECHA DE ENTREGA	27-oct-25																																				
NOMBRE DEL TRABAJADOR	JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA																																						
CARGO	OFICIAL DE OBRA																																						
CENTRO DE TRABAJO	Calle 3 No 5-47 Cubará Boyacá E.S.E Especial de Cubará																																						
Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230 de la resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al decreto 1072 de 2015 (Art 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art 2.2.4.6.24 inciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, la EMPRESA CONSTRUINDUCIVIL S.A.S hace entrega de los siguientes elementos los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de peligros y riesgos:																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TALLA</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PANTALON</td> <td>1</td> <td>34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAMISA</td> <td>1</td> <td>M</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GUANTE REFORZADO</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CASCO DE SEGURIDAD</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TAPA BOCAS</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TAPA OIDOS</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BOTAS</td> <td>1</td> <td>41</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GAFAS</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES	PANTALON	1	34		CAMISA	1	M		GUANTE REFORZADO	1			CASCO DE SEGURIDAD	1			TAPA BOCAS	1			TAPA OIDOS	1			BOTAS	1	41		GAFAS	1		
DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES																																				
PANTALON	1	34																																					
CAMISA	1	M																																					
GUANTE REFORZADO	1																																						
CASCO DE SEGURIDAD	1																																						
TAPA BOCAS	1																																						
TAPA OIDOS	1																																						
BOTAS	1	41																																					
GAFAS	1																																						
El trabajador Acepta:																																							
• Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación. • Que conoce la obligatoriedad de su uso. • Hacer buen uso de los elementos entregados. • Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones. • Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad. • Usar la dotación que se le entrega y desechar la anterior, que este en mal estado.																																							
 JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA 96167929 OFICIAL DE OBRA		 ROSÁ DANIELA SANTANDER APONTÉ C.C 1049395519 DE CUBARÁ HSEQ. CONSTRUINDUCIVIL																																					

 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ		 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
	FORMATO: "ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL"		

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR	1048392734	FECHA DE ENTREGA	27-oct-25
NOMBRE DEL TRABAJADOR	BLANCA ISABEL SANTAFÉ ESTEVEZ		
CARGO	AYUDANTE DE OBRA		
CENTRO DE TRABAJO	Calle 3 No 5-47 Cubará Boyacá E.S.E Especial de Cubará		

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230 de la resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al decreto 1072 de 2015 (Art 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art 2.2.4.6.24 inciso 5, párrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, la EMPRESA CONSTRUINDUCIVIL S.A.S hace entrega de los siguientes elementos los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de peligros y riesgos:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
PANTALÓN	1	10	
CAMISA	1	M	
GUANTE REFORZADO	1		
CASCO DE SEGURIDAD	1		
TAPA BOCAS	1		
TAPA OÍDOS	1		
BOTAS	1	39	
GAFAS	1		

El trabajador Acepta:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.
- Usar la dotación que se le entrega y desechar la anterior, que este en mal estado.

Blanca Santafé

BLANCA ISABEL SANTAFÉ ESTEVEZ
1049392734
AYUDANTE DE OBRA

Rosa Daniela Santander Aponte

ROSA DANIELA SANTANDER APONTE
C.C 1049395519 DE CUBARÁ
HSEQ. CONSTRUINDUCIVIL


	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ		
	FORMATO: "ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL"		
IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR	9467070	FECHA DE ENTREGA	27-oct-25
NOMBRE DEL TRABAJADOR	LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA		
CARGO	OFICIAL DE OBRA		
CENTRO DE TRABAJO	Calle 3 No 5-47 Cubará Boyacá E.S.E Especial de Cubará		


Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230 de la resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al decreto 1072 de 2015 (Art 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art 2.2.4.6.24 inciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, la EMPRESA CONSTRUINDUCIVIL S.A.S hace entrega de los siguientes elementos los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de peligros y riesgos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
PANTALON	1	32	
CAMISA	1	S	
GUANTE REFORZADO	1		
CASCO DE SEGURIDAD	1		
TAPA BOCAS	1		
TAPA OIDOS	1		
BOTAS	1	39	
GAFAS	1		

El trabajador Acepta:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.
- Usar la dotación que se le entrega y desechar la anterior, que este en mal estado.


LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA
 9467070
 OFICIAL DE OBRA


ROSA DANIELA SANTANDER APONTE
 C.C 1049395519 DE CUBARÁ
 HSEQ. CONSTRUINDUCIVIL

 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ		 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
	FORMATO: "ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL "		

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR	1094280998	FECHA DE ENTREGA	27-oct-25
NOMBRE DEL TRABAJADOR	JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS		
CARGO	AYUDANTE DE OBRA		
CENTRO DE TRABAJO	Calle 3 No 5-47 Cubará Boyacá E.S.E Especial de Cubará		


Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230 de la resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al decreto 1072 de 2015 (Art 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art 2.2.4.6.24 inciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, la EMPRESA CONSTRUINDUCIVIL S.A.S hace entrega de los siguientes elementos los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de peligros y riesgos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
PANTALON	1	38	
CAMISA	1	XXL	
GUANTE REFORZADO	1		
CASCO DE SEGURIDAD	1		
TAPA BOCAS	1		
TAPA OIDOS	1		
BOTAS	1	44	
GAFAS	1		

El trabajador Acepta:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.
- Usar la dotación que se le entrega y desechar la anterior, que este en mal estado.


 JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS
 1094280998
 AYUDANTE DE OBRA


 ROSA DANIELA SANTANDER APONTE
 C.C 1049395519 DE CUBARÁ
 HSEQ. CONSTRUINDUCIVIL

 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ		 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
	FORMATO: "ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL"		
IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR	86125112	FECHA DE ENTREGA	27-oct-25
NOMBRE DEL TRABAJADOR	HENRY GUTIERREZ BATECA		
CARGO	OFICIAL DE OBRA		
CENTRO DE TRABAJO	Calle 3 No 5-47 Cubará Boyacá E.S.E Especial de Cubará		

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230 de la resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al decreto 1072 de 2015 (Art 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art 2.2.4.6.24 inciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, la EMPRESA CONSTRUINDUCIVIL S.A.S hace entrega de los siguientes elementos los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de peligros y riesgos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
PANTALON	1	32	
CAMISA	1	M	
GUANTE REFORZADO	1		
CASCO DE SEGURIDAD	1		
TAPA BOCAS	1		
TAPA OIDOS	1		
BOTAS	1	40	
GAFAS	1		

El trabajador Acepta:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.
- Usar la dotación que se le entrega y desechar la anterior, que este en mal estado.


HENRY GUTIERREZ BATECA
 96125112
 OFICIAL DE OBRA


ROSA DANIELA SANTANDER APONTE
 C.C 1049395519 DE CUBARÁ
 HSEQ. CONSTRUINDUCIVIL

Anexo 4

Planillas de asistencia Charlas




ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ

CARGAS PESADAS Y POSTURAS.

[illegible]

IMPORTANCIA DEL USO DEL EPP.

[illegible]



**ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL
ESPECIAL DE CURARÁ**

AA: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

[illegible]

ANEXO 8. ACTA DE AVANCE DE OBRA PARA PARCIAL NO 1

CONTRATO N°		361-2025					VALOR INICIAL		\$	616.781.927,30	FECHA DE INICIO		16/10/2025
CONTRATANTE		E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA					VALOR ANTICIPO		\$		FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA		30/12/2025
CONTRATISTA		CONSTRUINDOCIVIL SAS NIT: 901.375.684-5 RL GLADS Xiomara Manrique Becerra					PLAZO DE EJECUCION		DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO		% EJECUTADO		43,79%
INTERVENTORIA		FRASCOING SAS NIT: 901.629.231-4 RL FANNY KATHERIN BARERA CORREA					ESTADO DEL CONTRATO		EN EJECUCION		FECHA DE LA PRESENTE ACTA		15/11/2025
OBJETO		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA											
SUPERVISOR		MARLENY APONTE TORRES											
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES							TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION	LMD	CANT	DMT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	PORCENTAJE	CANT	VR TOTAL	PORCENTAJE	
1	AREA EXTERIOR												
1,01	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	1855,92	4%	\$ 7.640,85	\$ 14.748.038,59	1.855,92	\$ 14.748.038,59	100,00%	1.855,92	\$ 14.748.038,59	100,00%	
1,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	1855,92	4%	\$ 17.575,11	\$ 33.924.648,23		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	
1,03	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA CUADRAOA DE 1"	M2	146,54		\$ 109.655,00	\$ 16.068.843,70		\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	
			COSTO DIRECTO GRUPO			\$ 84.741.530,52		\$ 14.748.038,59	33,33%	-	\$ 14.748.038,59	33,33%	
2	CUBIERTAS Y DRENAJES												
2,01	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (AREA INTERNA)	M2	857,50		\$ 7.643,47	\$ 6.554.275,53	857,50	\$ 6.554.275,53	100,00%	857,50	\$ 6.554.275,53	100,00%	
2,02	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO	M2	857,50		\$ 94.255,50	\$ 80.832.752,30	169,62	\$ 15.909.331,07	19,78%	169,62	\$ 15.909.331,07	19,78%	
2,03	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO.	M2	450,00	4%	\$ 11.620,22	\$ 5.582.874,96	135,00	\$ 1.674.862,49	30,00%	135,00	\$ 1.674.862,49	30,00%	
2,04	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	683,50	4%	\$ 8.791,55	\$ 6.249.456,49	569,60	\$ 5.116.599,63	81,87%	569,60	\$ 5.116.599,63	81,87%	
2,05	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	1133,50		\$ 119.304,46	\$ 135.231.605,41	655,00	\$ 78.144.421,30	57,79%	655,00	\$ 78.144.421,30	57,79%	
2,06	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	ML	235,75		\$ 99.175,55	\$ 23.380.695,24	126,15	\$ 12.511.134,40	53,51%	126,15	\$ 12.511.134,40	53,51%	
2,07	DESMONTE CANALES - BAJANTES.	ML	9,60	4%	\$ 5.809,30	\$ 58.000,05	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	
2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	9,60	4%	\$ 117.117,01	\$ 1.189.296,23	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	
2,09	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO	M2	473,32		\$ 14.761,83	\$ 6.987.069,38	388,12	\$ 5.729.361,46	82,00%	388,12	\$ 5.729.361,46	82,00%	

2.10	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	2661,42	4%	\$ 3.338,02	\$ 9.239.226,12	415,92	\$ 1.443.883,25	15,63%	415,32	\$ 1.443.883,25	15,63%
2.11	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	3068,75	4%	\$ 225,90	\$ 715.747,50	1.382,00	\$ 323.398,00	45,18%	1.382,00	\$ 323.398,00	45,18%
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 276.001.200,91		\$ 187.497.251,13	64,10%		\$ 127.887.257,13	44,10%
3						ADMINISTRACION						
3.01	ESTUQUE MUROS	M2	2,80	4%	\$ 10.155,28	\$ 29.572,18	2,86	\$ 29.572,18	100,00%	2,80	\$ 29.572,18	100,00%
3.02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	37,58	4%	\$ 17.576,11	\$ 686.930,82	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
3.03	VINILO TIPO I SOBRE PARETE TRES MANOS SOBRE ESTUQUE	M2	477,26	4%	\$ 10.307,86	\$ 5.118.310,43	477,26	\$ 5.118.310,43	100,00%	477,26	\$ 5.118.310,43	100,00%
3.04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	M2	40,13	4%	\$ 20.004,81	\$ 834.896,40	40,13	\$ 834.896,40	100,00%	40,13	\$ 834.896,40	100,00%
3.05	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	56,11	4%	\$ 14.773,22	\$ 962.082,39	56,11	\$ 962.082,39	100,00%	56,11	\$ 962.082,39	100,00%
3.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UND	8,00		\$ 38.115,49	\$ 304.823,82	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 7.834.715,94		\$ 8.842.881,40	68,67%		\$ 6.542.861,40	48,67%
4						ARCHIVO - ALMACEN						
4.01	DES MONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	M2	145,77	4%	\$ 11.929,22	\$ 1.808.479,30	145,77	\$ 1.808.479,30	100,00%	145,77	\$ 1.808.479,30	100,00%
4.02	DEMOLICION MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	4,53	4%	\$ 13.829,00	\$ 64.208,94	4,53	\$ 64.208,94	100,00%	4,53	\$ 64.208,94	100,00%
4.03	DEMOLICION MESON CONCRETO	M2	1,53	4%	\$ 32.371,71	\$ 53.105,84	1,53	\$ 53.105,84	100,00%	1,53	\$ 53.105,84	100,00%
4.04	DES MONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	32,34	4%	\$ 13.629,00	\$ 458.392,33	32,34	\$ 458.392,33	100,00%	32,34	\$ 458.392,33	100,00%
4.05	CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18	ML	138,60		\$ 49.390,38	\$ 6.845.506,67	138,60	\$ 6.845.506,67	100,00%	138,60	\$ 6.845.506,67	100,00%
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	145,77		\$ 119.304,46	\$ 17.391.011,13	145,77	\$ 17.391.011,13	100,00%	145,77	\$ 17.391.011,13	100,00%
4.07	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	ML	11,30		\$ 99.176,85	\$ 1.120.596,15	11,30	\$ 1.120.596,15	100,00%	11,30	\$ 1.120.596,15	100,00%
4.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	11,30	4%	\$ 117.117,91	\$ 1.375.359,10	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
4.09	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	32,00	4%	\$ 1.834,72	\$ 1.725.059,48	32,00	\$ 1.725.059,48	100,00%	32,00	\$ 1.725.059,48	100,00%
4.10	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	15,22	4%	\$ 298.795,70	\$ 3.779.849,38	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA COLO ROLLED CAL. 18RE 18 (incluye marco, bisagras y pintura)	M2	4,20		\$ 401.082,39	\$ 1.584.646,04	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
4.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	29,90	4%	\$ 25.187,98	\$ 783.236,10	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%

4,13	ESTUCO MUROS	M2	29,90	4%	\$ 10.155,29	\$ 315.788,59	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
4,14	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	113,70	4%	\$ 17.576,11	\$ 2.078.339,86	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
4,15	VINILO TIPO I SOBRE PANELE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	220,44	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.353.156,24	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
4,16	CIELO RASO EN PVC	M2	115,96		\$ 71.719,83	\$ 8.316.831,49	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
4,17	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	481,04	4%	\$ 225,00	\$ 112.563,36	481,04	\$ 112.563,36	100,00%	481,04	\$ 112.563,36	100,00%
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 50.276.929,00		\$ 29.579.083,29	58,84%		\$ 20.579.821,29	41,16%
5	SALA DE AUTOPSIAS											
5,01	VINILO TIPO I SOBRE PANELE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	128,20	4%	\$ 10.307,86	\$ 1.374.326,36	128,20	\$ 1.374.326,36	100,00%	128,20	\$ 1.374.326,36	100,00%
5,02	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	M2	9,00	4%	\$ 20.804,61	\$ 187.243,15	9,00	\$ 187.243,15	100,00%	9,00	\$ 187.243,15	100,00%
5,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	49,50	4%	\$ 14.773,22	\$ 760.525,37	49,50	\$ 760.525,37	100,00%	49,50	\$ 760.525,37	100,00%
5,04	ESTUCCO MUROS	M2	3,20	4%	\$ 10.155,29	\$ 33.796,77	3,20	\$ 33.796,77	100,00%	3,20	\$ 33.796,77	100,00%
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 2.355.891,65		\$ 2.355.891,65	100,00%		\$ 2.355.891,65	100,00%
6	HOSPITALIZACION											
6,01	VINILO TIPO I SOBRE PANELE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	432,72	4%	\$ 10.307,86	\$ 4.638.833,87	432,72	\$ 4.638.833,87	100,00%	432,72	\$ 4.638.833,87	100,00%
6,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	156,52	4%	\$ 17.576,11	\$ 2.861.053,25	156,52	\$ 2.861.053,25	100,00%	156,52	\$ 2.861.053,25	100,00%
6,03	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	M2	213,36	4%	\$ 3.130,72	\$ 694.856,68	213,36	\$ 694.856,68	100,00%	213,36	\$ 694.856,68	100,00%
6,04	CIELO RASO EN PVC	M2	213,36		\$ 71.719,83	\$ 15.301.425,73	213,36	\$ 15.301.425,73	100,00%	213,36	\$ 15.301.425,73	100,00%
6,05	ESTUCCO MUROS	M2	48,21	4%	\$ 10.155,29	\$ 509.169,49	48,21	\$ 509.169,49	100,00%	48,21	\$ 509.169,49	100,00%
6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UND	21,00		\$ 38.119,49	\$ 800.425,29	21,00	\$ 800.425,29	100,00%	21,00	\$ 800.425,29	100,00%
6,07	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	126,10	4%	\$ 14.773,22	\$ 1.937.419,16	126,10	\$ 1.937.419,16	100,00%	126,10	\$ 1.937.419,16	100,00%
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 26.742.983,47		\$ 26.742.983,47	100,00%		\$ 26.742.983,47	100,00%
7	PARTOS Y CEBADIA											
7,01	VINILO TIPO I SOBRE PANELE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	119,09	4%	\$ 10.307,86	\$ 1.278.666,57	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
7,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	108,78	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.988.040,83	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 2.266.707,40		\$ -	0,00%		\$ -	0,00%
8	URGENCIAS											
8,01	VINILO TIPO I SOBRE PANELE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	488,08	4%	\$ 10.307,86	\$ 5.232.302,72	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
8,02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACAN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UND	1,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 1.579.534,48	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
8,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	6,00	4%	\$ 14.773,22	\$ 92.194,99	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
8,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	M2	8,00	4%	\$ 20.804,61	\$ 166.436,96	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%

0,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UND	5,00		\$ 38.115,49	\$ 190.577,45	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 7.291.067,90	\$ -	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
9					CONSULTA EXTERNA							
9,01	VINILO TIPO I SOBRE PARETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	435,57	4%	\$ 10.307,86	\$ 4.669.386,36	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
9,02	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	19,74	4%	\$ 13.529,00	\$ 279.797,92	-	\$ -	0%	-	\$ -	0,00%
9,03	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UND	10,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 15.795.344,76	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
9,04	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	15,80	4%	\$ 14.773,22	\$ 239.880,72	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 26.864.209,76	\$ -	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
10					MACULACION							
10,01	VINILO TIPO I SOBRE PARETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	81,61	4%	\$ 10.307,86	\$ 874.873,43	-	\$ -	0%	-	\$ -	0,00%
10,02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UND	1,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 1.579.534,48	-	\$ -	0%	-	\$ -	0,00%
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 2.454.407,91	\$ -	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
11					SALA DE BAÑOS X							
11,01	VINILO TIPO I SOBRE PARETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	50,82	4%	\$ 10.307,86	\$ 544.789,26	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 544.789,26	\$ -	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
12					CITAS							
12,01	VINILO TIPO I SOBRE PARETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	33,55	4%	\$ 10.307,86	\$ 359.661,85	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 359.661,85	\$ -	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
13					COCINA Y LAVANDERIA							
13,01	VINILO TIPO I SOBRE PARETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	233,83	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.504.564,36	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
13,02	ESTUCCO MUROS	M2	29,13	4%	\$ 10.155,28	\$ 307.666,24	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 2.812.230,60	\$ -	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
14					TERAPIA FISICA							
14,01	VINILO TIPO I SOBRE PARETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	246,87	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.546.499,46	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
14,02	ESTUCCO MUROS	M2	10,80	4%	\$ 10.155,28	\$ 114.064,10	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
14,03	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	59,31	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.065.857,49	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 3.826.411,04	\$ -	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%

ANEXO 9. REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO		
ITEM:	1.01	UNIDAD:	M ²
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1855.92	CANTIDAD ACUMULADA:	1855.92
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	1855.92	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

REGISTRO FOTOGRAFICO

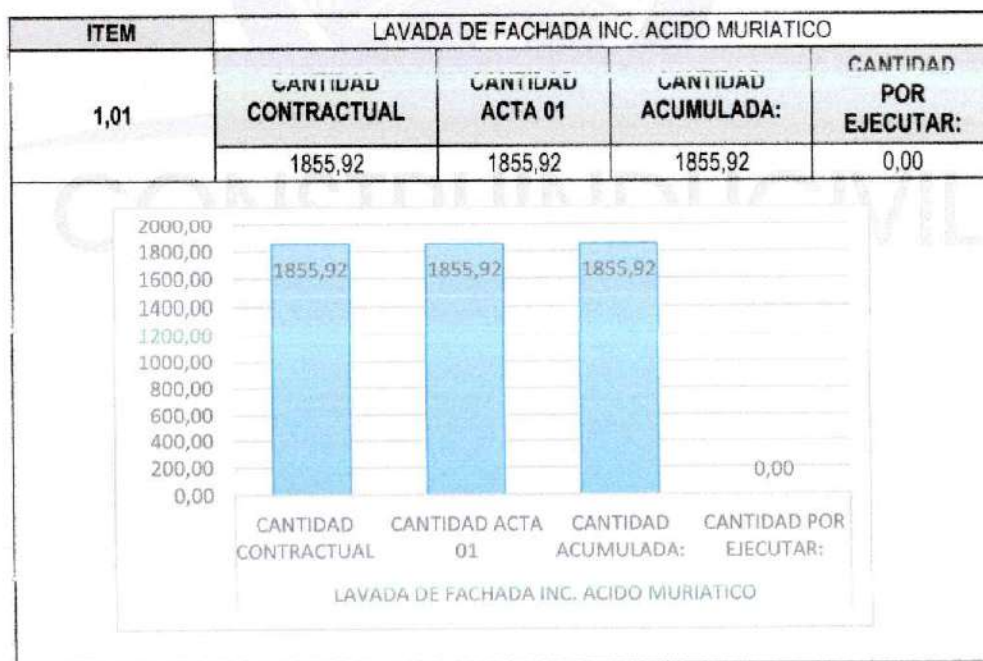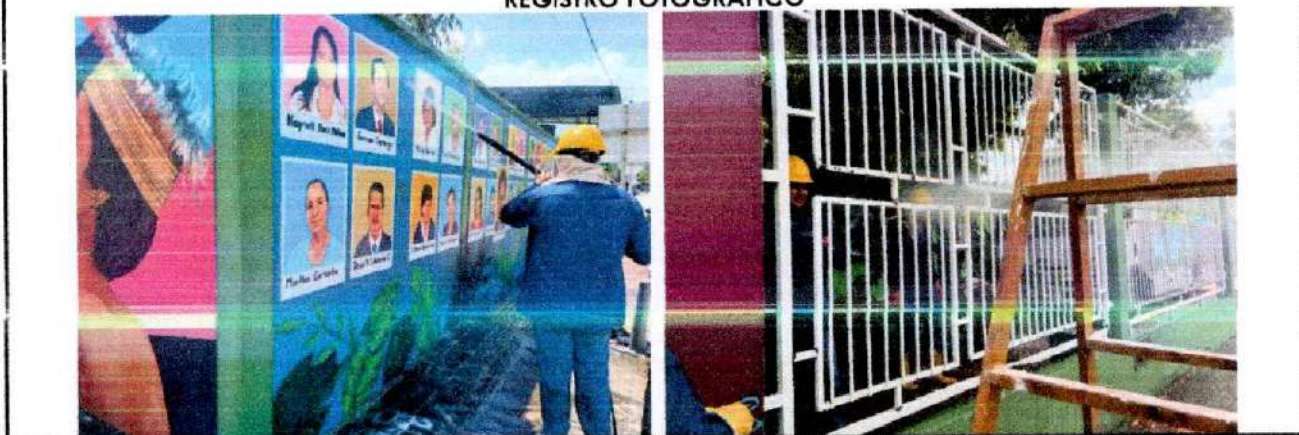



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT 001375584-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)		
ITEM:	2.01	UNIDAD:	M ²
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	857.50	CANTIDAD ACUMULADA:	857.50
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	857.50	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)			
2,01	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	857,50	857,50	857,50	0,00



☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)




CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO		
ITEM:	2.02	UNIDAD:	M ²
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	857.50	CANTIDAD ACUMULADA:	169.62
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	169.62	CANTIDAD POR EJECUTAR:	687.88
PORCENTAJE EJECUTADO:	19.78%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	80.22%

REGISTRO FOTOGRAFICO

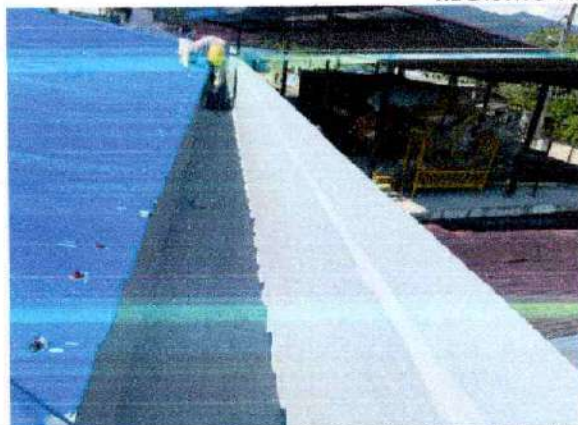

ITEM	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO			
2,02	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	857,50	169,62	169,62	687,88

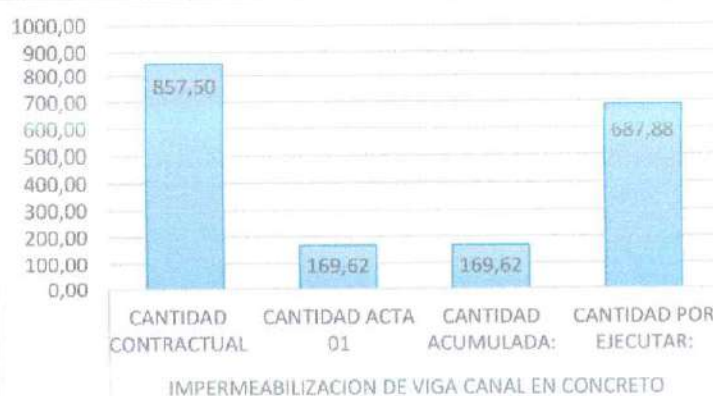



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.		
ITEM:	2.03	UNIDAD:	M ²
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	450,00	CANTIDAD ACUMULADA:	135
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	135,00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	315,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	30,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	70,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.			
2,03	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	450,00	135,00	135,00	315,00





CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA		
ITEM:	2.04	UNIDAD:	M ²
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	683,50	CANTIDAD ACUMULADA:	559,60
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	559,60	CANTIDAD POR EJECUTAR:	123,90
PORCENTAJE EJECUTADO:	81.87%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	18.13%

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360		
ITEM:	2.05	UNIDAD:	M ²
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1133,50	CANTIDAD ACUMULADA:	655
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	655	CANTIDAD POR EJECUTAR:	478.50
PORCENTAJE EJECUTADO:	57.79%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	42.21%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360			
2.05	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	1133,50	813,70	813,70	319,80

1200,00	1000,00	800,00	600,00	400,00	200,00	0,00
1133,50	655	655	478.50			
CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:			

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)






CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M		
ITEM:	2.06	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	235.75	CANTIDAD ACUMULADA:	126.15
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	126.15	CANTIDAD POR EJECUTAR:	109.60
PORCENTAJE EJECUTADO:	53.51%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	46.49%

REGISTRO FOTOGRAFICO

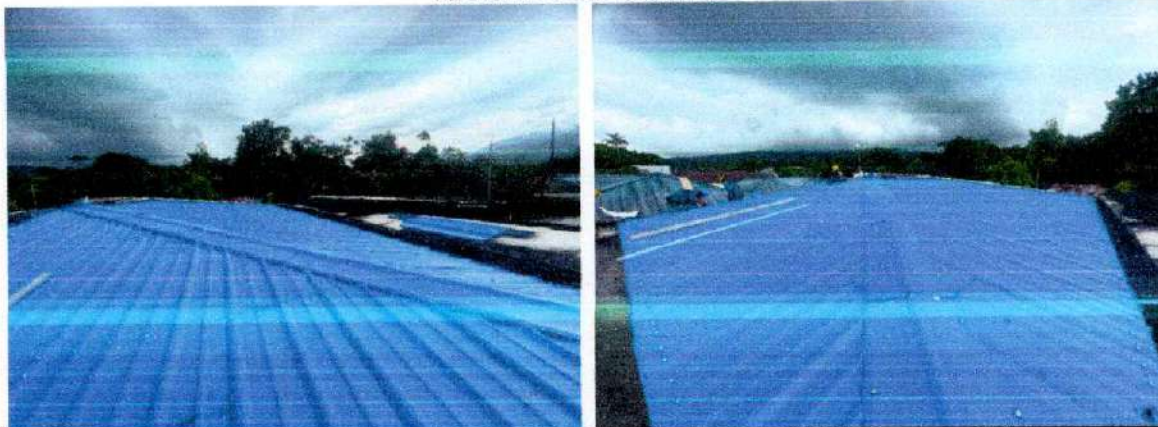

ITEM	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M			
2,06	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	235,75	126,15	126,15	109,60





CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT 901375484-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO		
ITEM:	2.09	UNIDAD:	M ²
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	473.32	CANTIDAD ACUMULADA:	388.12
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	388.12	CANTIDAD POR EJECUTAR:	85.20
PORCENTAJE EJECUTADO:	82.00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	18.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO			
2.09	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	473,32	388,12	388,12	85,20

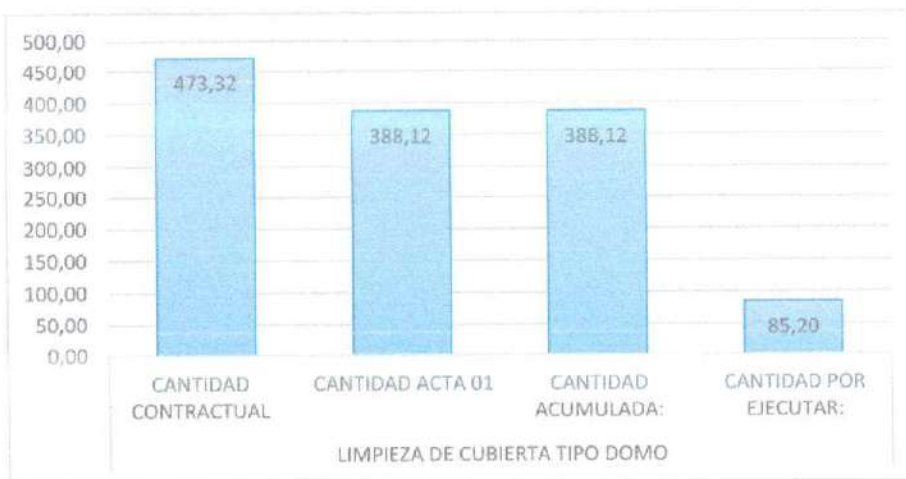




CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA		
ITEM:	2.10	UNIDAD:	KG
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	2661.42	CANTIDAD ACUMULADA:	415.92
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	415.92	CANTIDAD POR EJECUTAR:	2245.50
PORCENTAJE EJECUTADO:	15.63%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	84.37%

REGISTRO FOTOGRAFICO

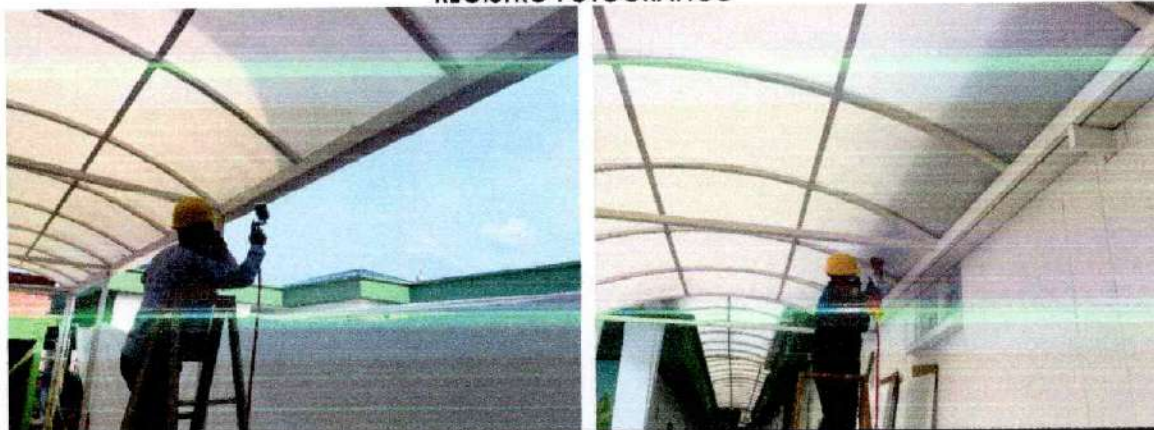

ITEM	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA			
2,10	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	2661,42	415,92	415,92	2245,50



LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM		
ITEM:	2.11	UNIDAD:	KG
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	3058.75	CANTIDAD ACUMULADA:	1382.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	1382.00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	1676.75
PORCENTAJE EJECUTADO:	45.18%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	54.82%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM			
2,11	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	3058,75	1382,00	1382,00	1676,75

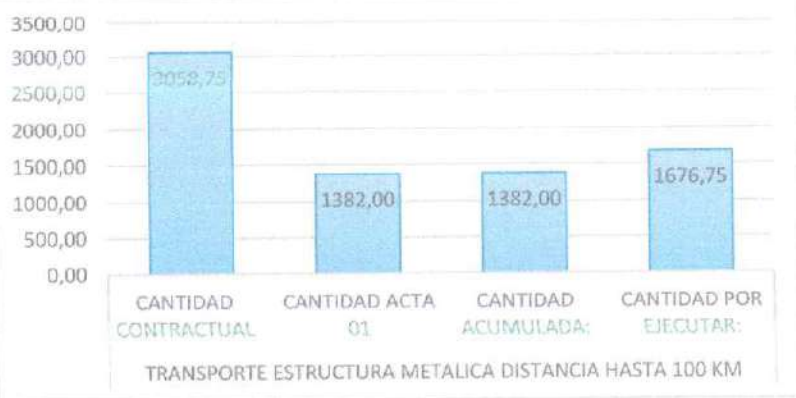



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT 901375684-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS		
ITEM:	3.01	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	2.80	CANTIDAD ACUMULADA:	2.80
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	2.80	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	ESTUCO MUROS			
3,01	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	2,80	2,80	2,80	0,00

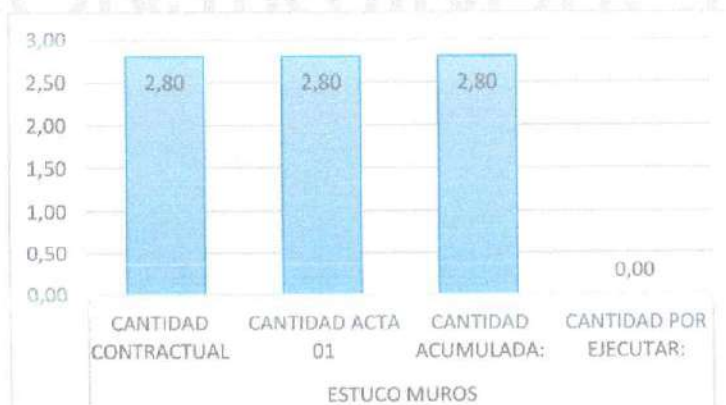




CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	VINOLO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO		
ITEM:	3.03	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	477.26	CANTIDAD ACUMULADA:	477.26
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	477.26	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

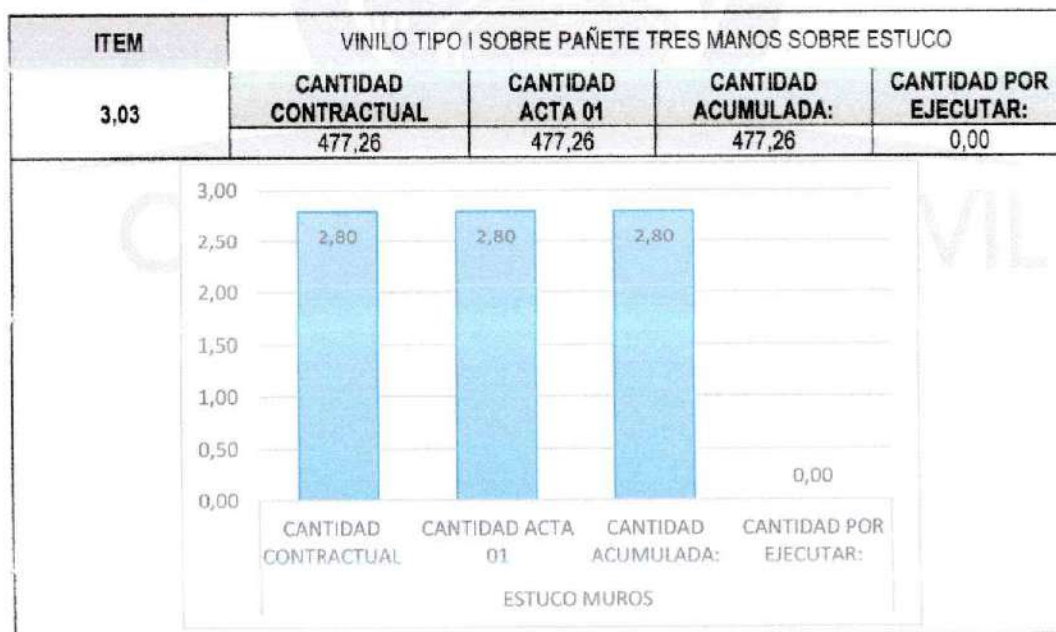



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

ACTIVIDAD:	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS		
ITEM:	3.04	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	40.13	CANTIDAD ACUMULADA:	40.13
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	40.13	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS			
3,04	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	40,13	40,13	40,13	0,00

ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS




CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT 901375684-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS		
ITEM:	3.05	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	56.11	CANTIDAD ACUMULADA:	56.11
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	56.11	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

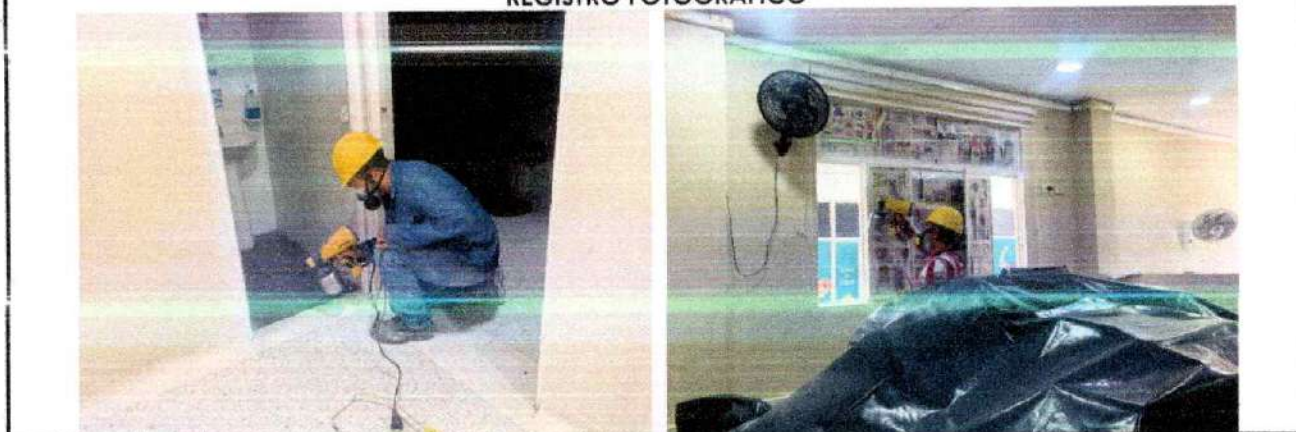

ITEM	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS			
3,05	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	56,11	56,11	56,11	0,00

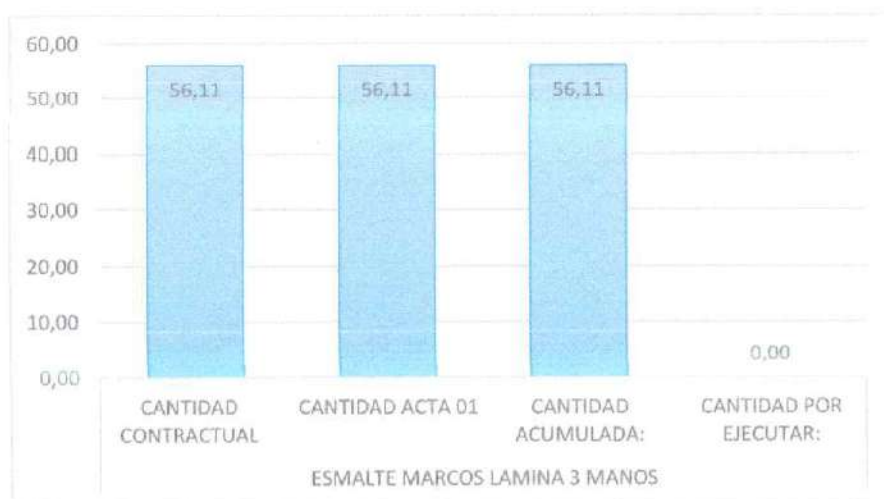

3183616384 / 3106716171
 construinducivil@gmail.com
 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)





CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT 901375684-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.		
ITEM:	4.01	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	145,77	CANTIDAD ACUMULADA:	145,77
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	145,77	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.			
4,01	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	145,77	145,77	145,77	0,00

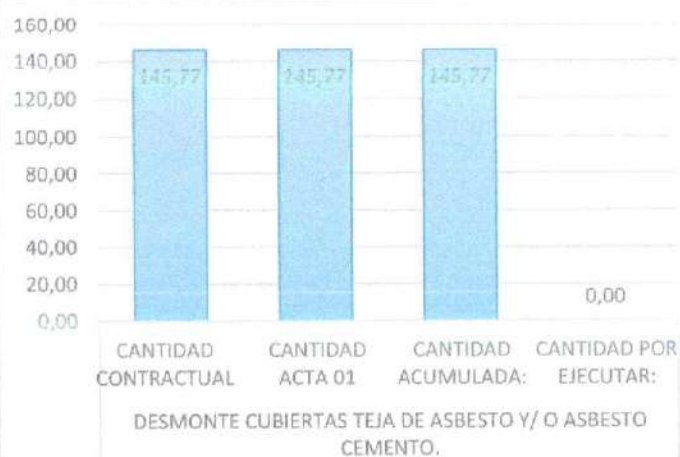




CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.		
ITEM:	4.02	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	4.53	CANTIDAD ACUMULADA:	4.53
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	4.53	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

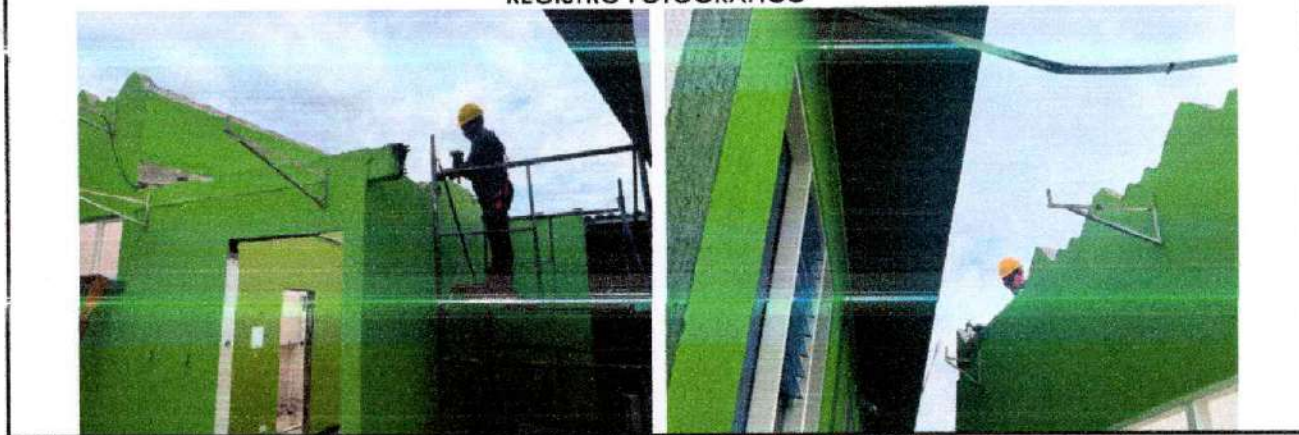

ITEM	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.			
4,02	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	4,53	4,53	4,53	0,00

DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO		
ITEM:	4.03	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1.53	CANTIDAD ACUMULADA:	1.53
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	1.53	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO			
4,03	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	1,53	1,53	1,53	0,00

DEMOLICIÓN MESON CONCRETO



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS		
ITEM:	4.04	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	32.34	CANTIDAD ACUMULADA:	32.34
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	32.34	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS			
4,04	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	32,34	32,34	32,34	0,00

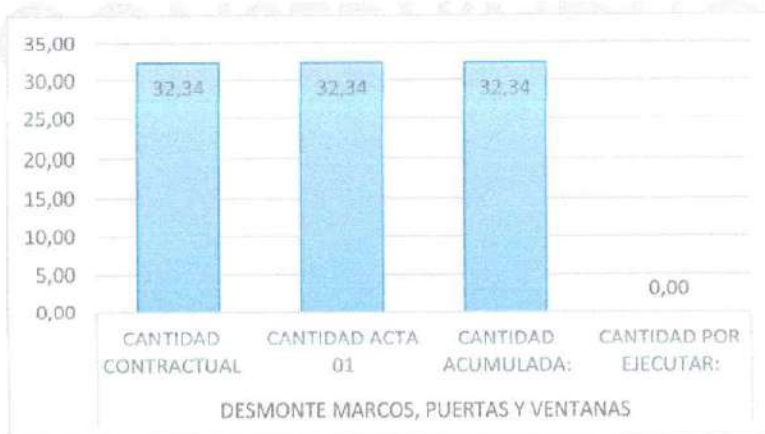



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18		
ITEM:	4.05	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	138,60	CANTIDAD ACUMULADA:	138,60
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	138,60	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18			
4,05	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	138,60	138,60	138,60	0,00

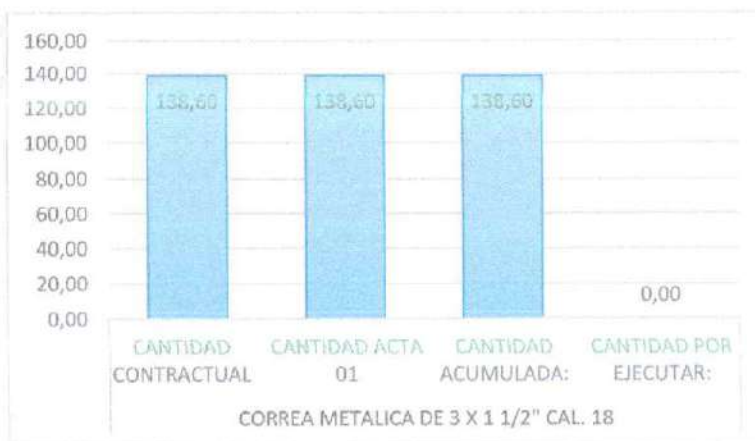




CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360		
ITEM:	4.06	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	145.77	CANTIDAD ACUMULADA:	145.77
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	145.77	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

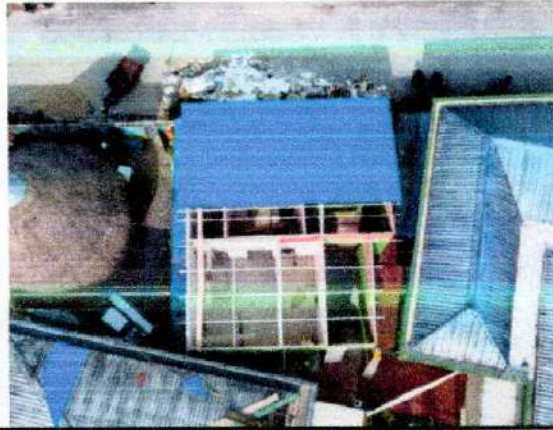

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360			
4.06	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	145,77	145,77	145,77	0,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360

☎ 3183616384 / 3106716171
 ✉ construinducivil@gmail.com
 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)





CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT 901375684-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M		
ITEM:	4.07	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	11.30	CANTIDAD ACUMULADA:	11.30
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	11.30	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

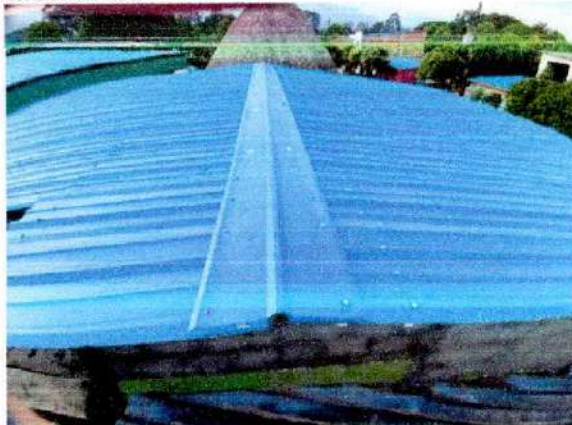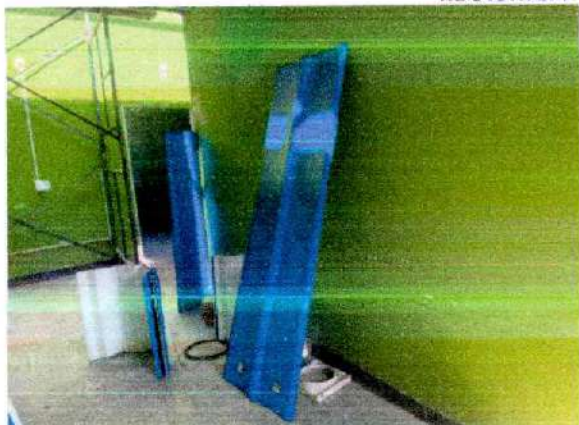

ITEM	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M			
4,07	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	11,30	11,30	11,30	0,00

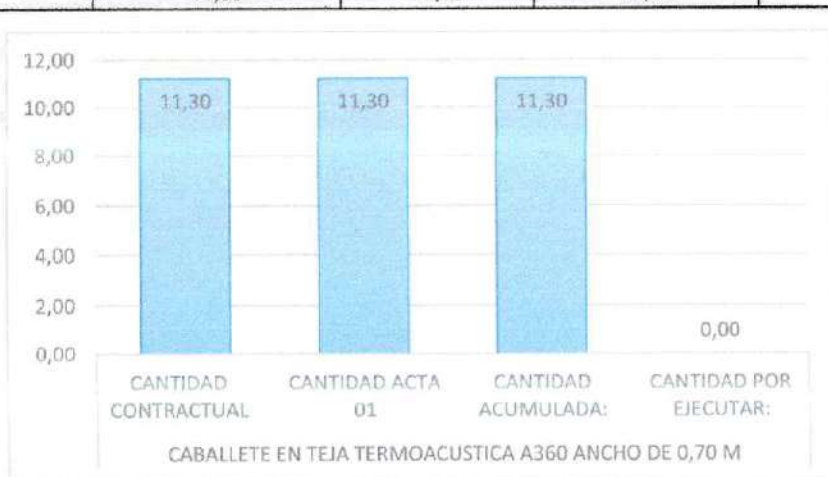




CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
NIT 901375684-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS		
ITEM:	4.09	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	32.00	CANTIDAD ACUMULADA:	32.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	32.00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

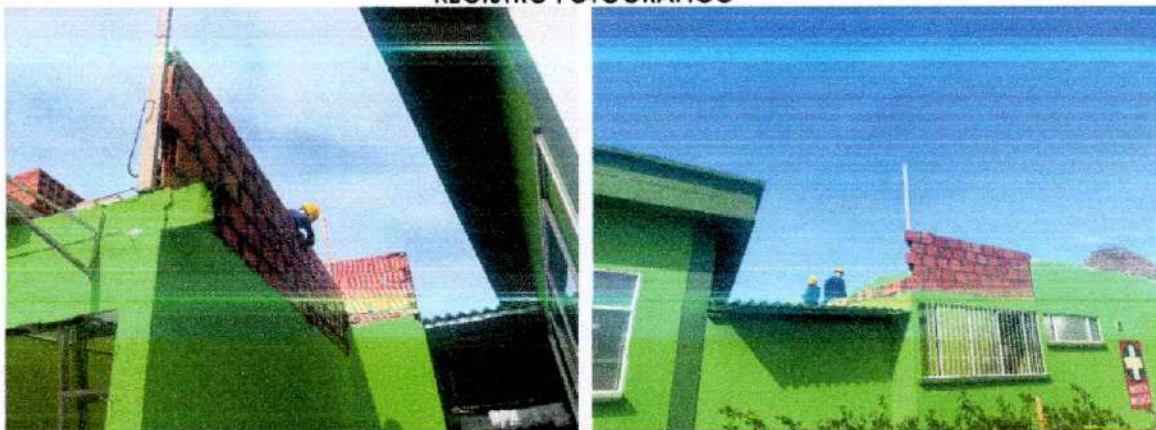

ITEM	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS			
4,09	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	32,00	32,00	32,00	0,00

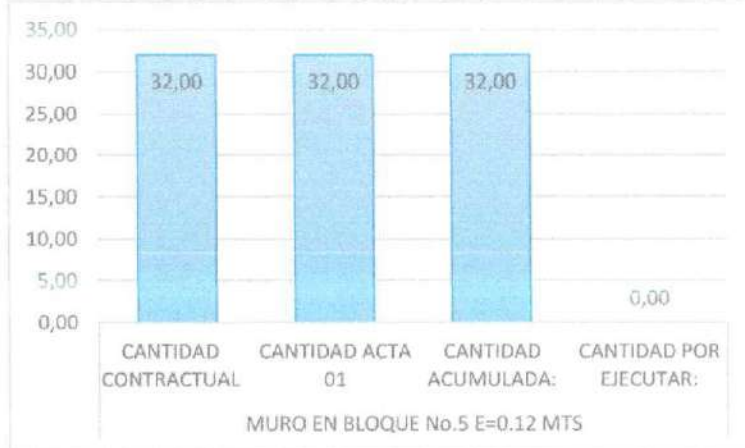



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT 901375484-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM		
ITEM:	4.17	UNIDAD:	KG
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	481,04	CANTIDAD ACUMULADA:	481,04
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	481,04	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM			
4,17	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	481,04	481,04	481,04	0,00






CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO		
ITEM:	5.01	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	128.20	CANTIDAD ACUMULADA:	128.20
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	128.20	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

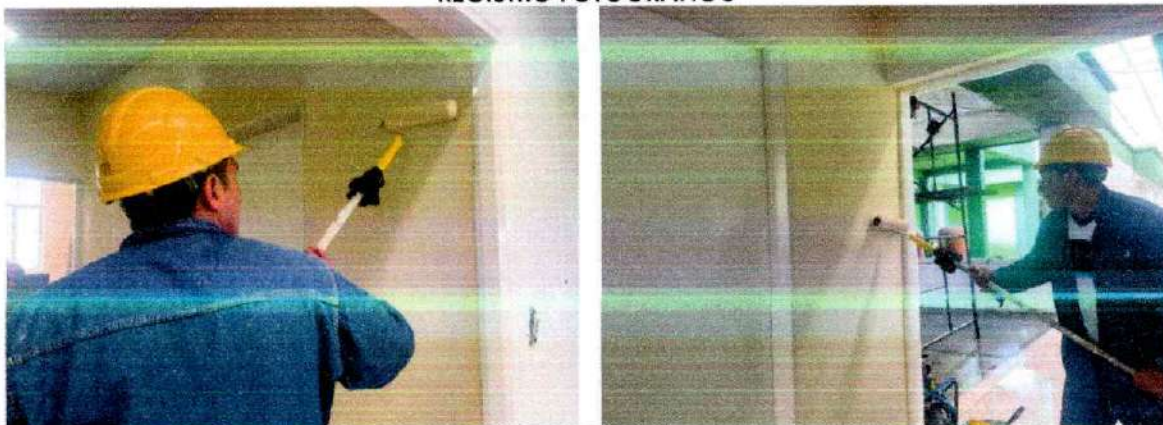

ITEM	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO			
5,01	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	128,20	128,20	128,20	0,00

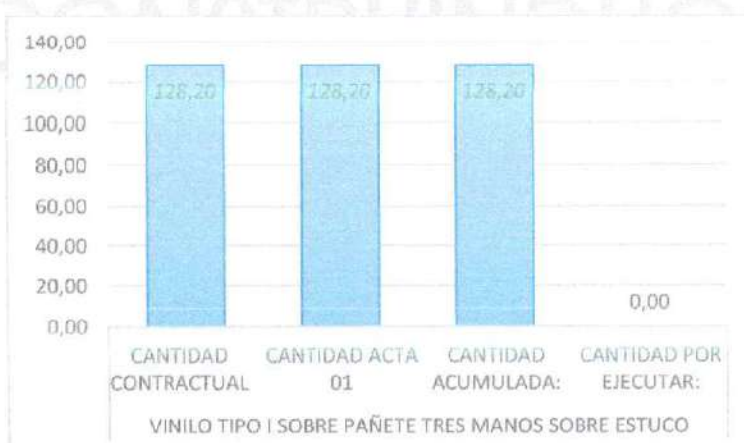




CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT 901375684-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS		
ITEM:	5.02	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	9.00	CANTIDAD ACUMULADA:	9.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	9.00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

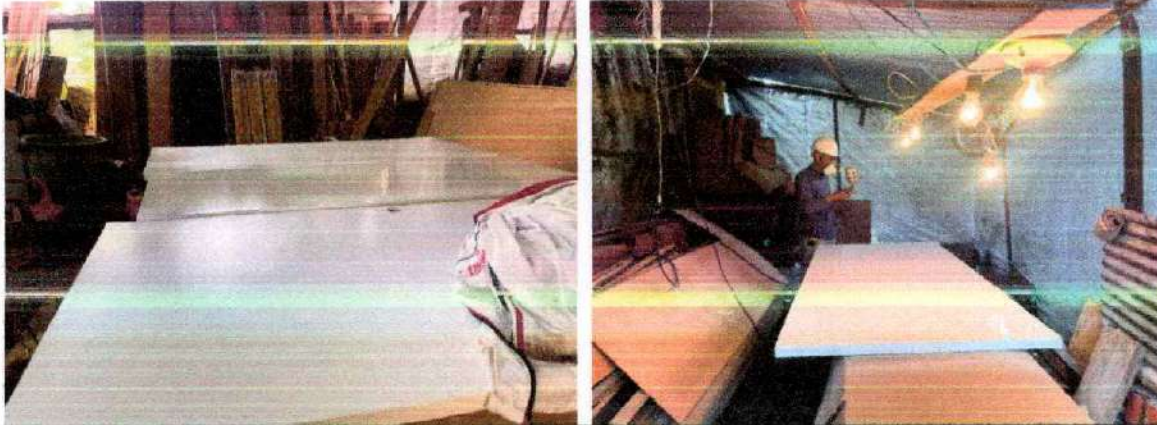

ITEM	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS			
5,02	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	9,00	9,00	9,00	0,00

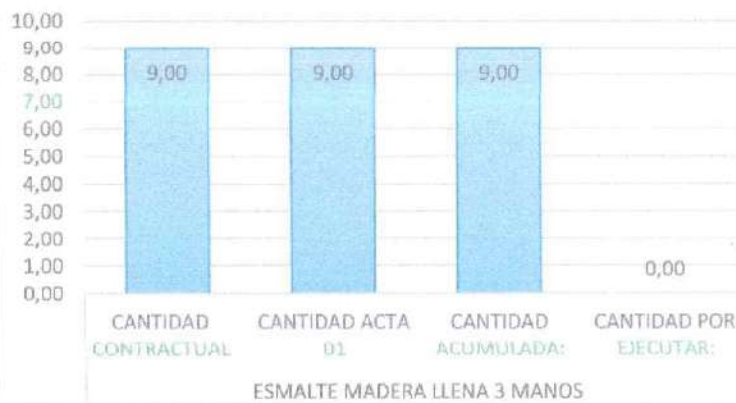



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS		
ITEM:	5.03	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	49.50	CANTIDAD ACUMULADA:	49.50
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	49.50	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS			
5,03	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	49,50	49,50	49,50	0,00

ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS

3183616384 / 3106716171
 construinducivil@gmail.com
 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)






CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
NIT 901375684-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS		
ITEM:	5.04	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	3.20	CANTIDAD ACUMULADA:	3.20
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	3.20	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	ESTUCO MUROS			
5,04	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	3,20	3,20	3,20	0,00

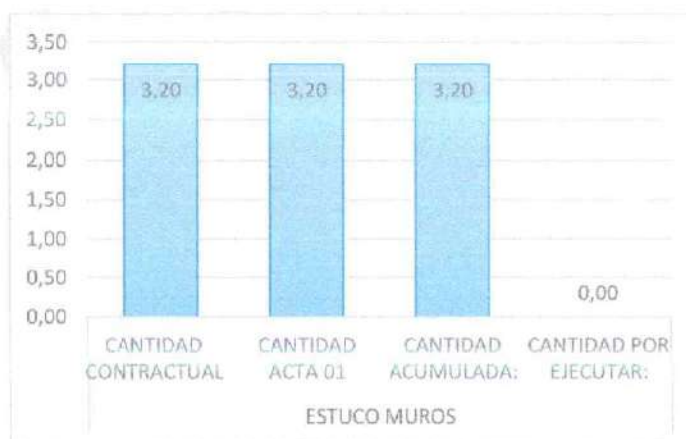



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO		
ITEM:	6.01	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	432,72	CANTIDAD ACUMULADA:	432,72
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	432,72	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO			
6,01	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	432,72	432,72	432,72	0,00



☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)





CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES		
ITEM:	6.02	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	156.52	CANTIDAD ACUMULADA:	156.52
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	156.52	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES			
6,02	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	156,52	156,52	156,52	0,00



☎ 3183616384 / 3106716171
 ✉ construinducivil@gmail.com
 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)




CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
NIT 001375684-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)		
ITEM:	6.03	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	213.35	CANTIDAD ACUMULADA:	213.35
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	213.35	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

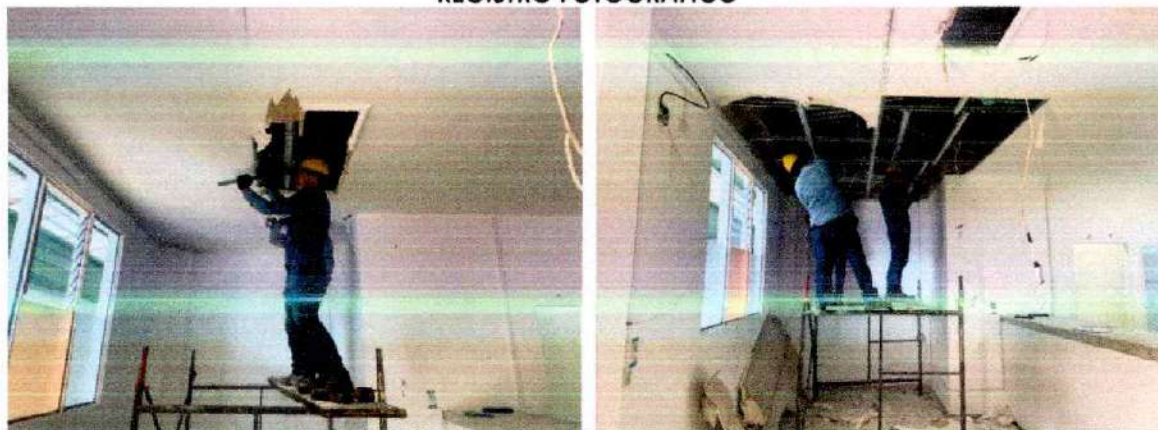

ITEM	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)			
6,03	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	213,35	213,35	213,35	0,00

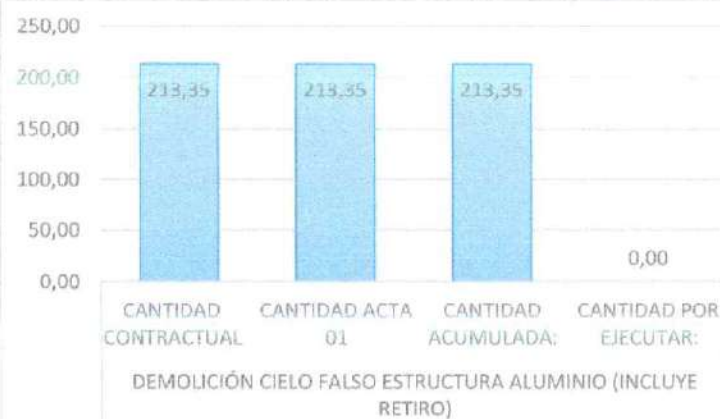

3183616384 / 3106716171
 construinducivil@gmail.com
 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)




CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
NIT 001375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	CIELO RASO EN PVC		
ITEM:	6.04	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	213.35	CANTIDAD ACUMULADA:	213.35
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	213.35	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

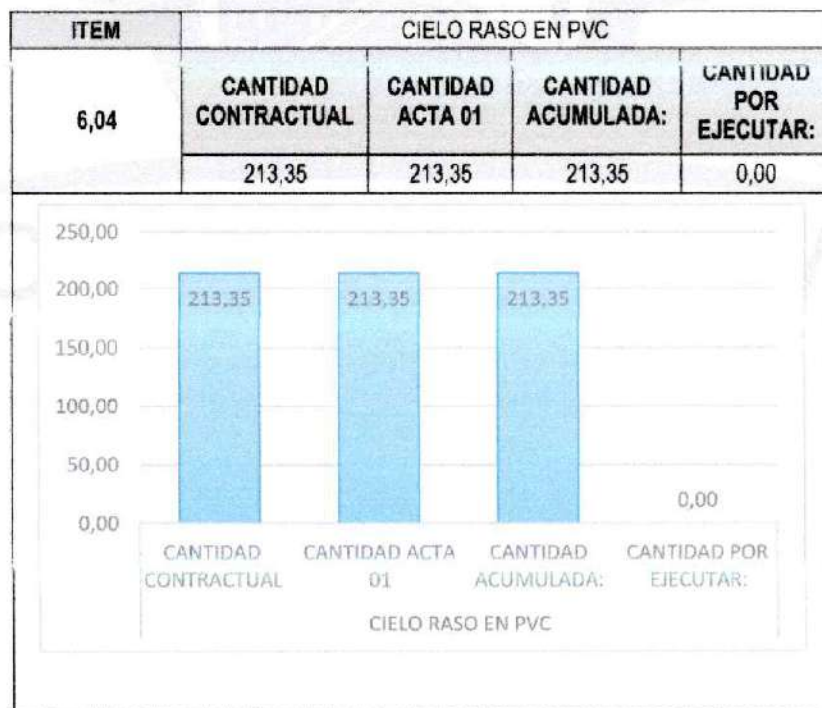




CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT. 901375684-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS		
ITEM:	6.05	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	48.21	CANTIDAD ACUMULADA:	48.21
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	48.21	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

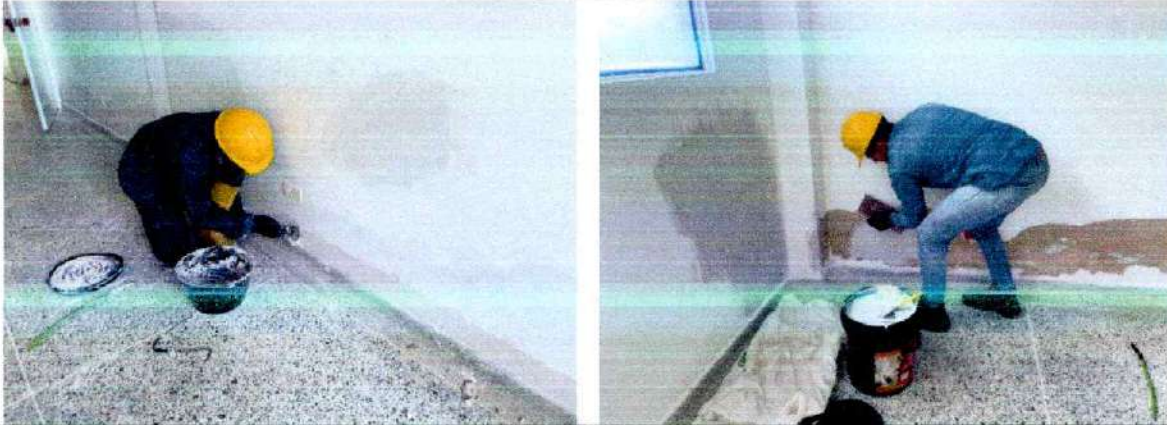

ITEM	ESTUCO MUROS			
6,05	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	48,21	48,21	48,21	0,00

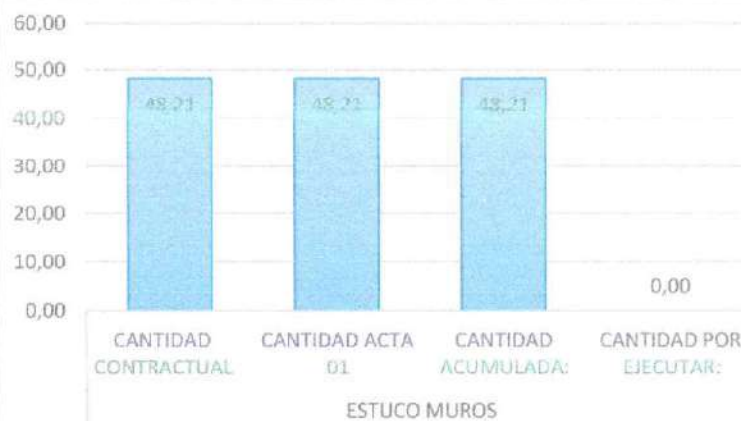




CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W		
ITEM:	6.06	UNIDAD:	UND
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	21.00	CANTIDAD ACUMULADA:	21.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	21.00	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

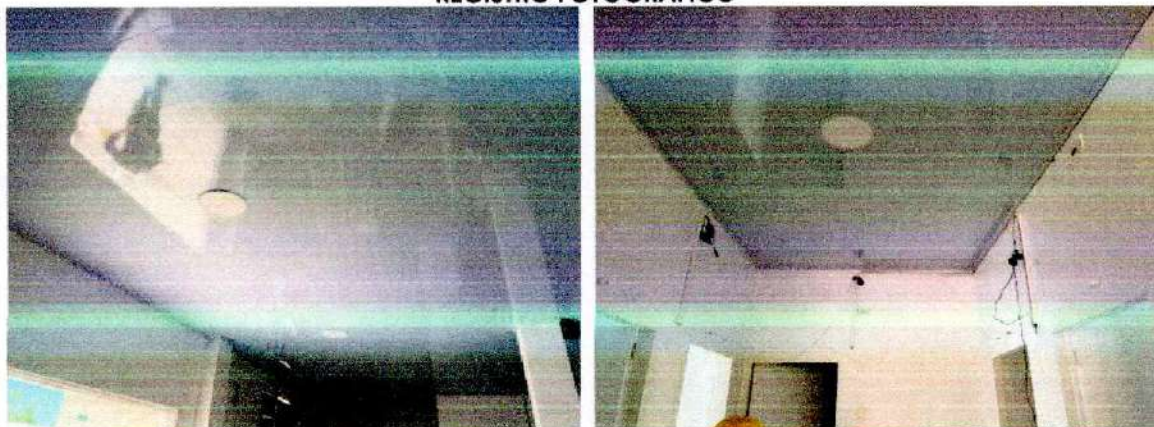

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W			
6,06	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	21,00	21,00	21,00	0,00


CANTIDAD CONTRACTUAL CANTIDAD ACTA 01 CANTIDAD ACUMULADA CANTIDAD POR EJECUTAR
 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W




CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

ACTIVIDAD:		ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	
ITEM:	6.06	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		CANTIDAD ACUMULADA:	126.10
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:		CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:		PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

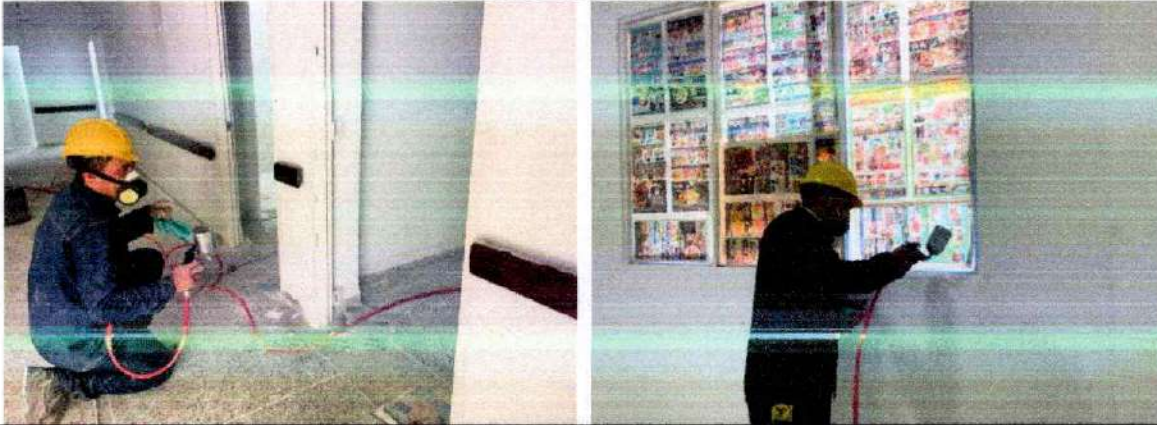

ITEM	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS			
6,07	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA 01	CANTIDAD ACUMULADA:	CANTIDAD POR EJECUTAR:
	126,10	126,10	126,10	0,00

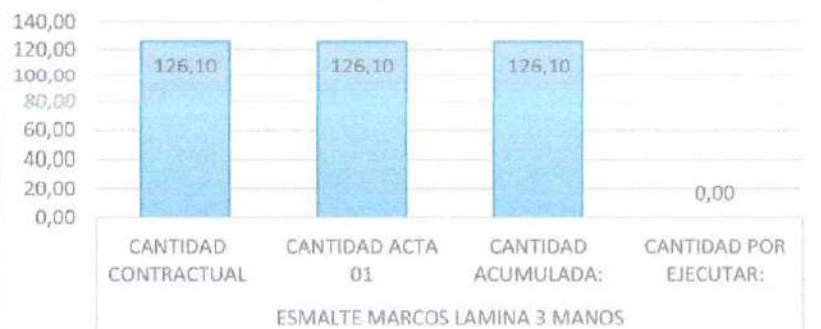

Vianney Karina Buitrago

VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA

3183616384 / 3106716171
construinducivil@gmail.com
Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ANEXO 10. MEMORIAS DE CANTIDADES

 3163616384 / 3106716171
 construinducivil@gmail.com
 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)





RECONSTRUCCIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA



CAPÍTULO	1.00	ÁREA EXTERIOR					
ITEM	1.01	LAVADO DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO					
UNIDAD		METRO CUADRADO					
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRAFICO							
							
#	DESCRIPCION - UBICACION	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
1	FACHADA FRONTAL (CALLE NACIONAL)						
2	MUROS FACHADA ZONA ADMINISTRACION	30.70	3.00	1.20	120	92.10	92.10
3	DESCUENTO VENTANA	2.00	1.50	1.00	10	3.00	-12.00
4	MUROS ENTRADA ADMINISTRACION	6.80	3.00	1.20	120	23.40	23.40
5	DESCUENTO PUERTA	2.80	2.00	1.00	10	5.60	-5.60
6	DESCUENTO VENTANA	1.05	3.95	1.00	10	1.85	-1.85
7	MUROS ENTRADA URGENCIAS	11.40	2.85	1.20	120	32.49	32.49
8	PLACA ENTRADA URGENCIAS	3.40	2.70	1.20	120	9.16	9.16
9	DESCUENTO PORTON ENTRADA URGENCIAS	2.85	2.10	1.00	10	5.90	-5.90
10	MURO DE CERRAMIENTO	67.80	1.35	1.20	120	91.53	91.53
11	COLUMNAS DE CERRAMIENTO	0.72	2.10	2.10	2100	1.51	31.25
12	FACHADA LATERAL IZQUIERDA (Carrera 4)						
13	MURO EXTERIOR MORGUE	24.80	3.27	1.20	120	80.44	80.44
14	DESCUENTO PORTON DE MORGUE	2.50	2.89	1.00	10	10.15	-10.15
15	DESCUENTO VENTANA MORGUE	2.00	1.50	1.00	10	3.00	-3.00
16	MURO EXTERIOR TERAPIA RESPIRATORIA Y URGENCIAS	42.00	2.72	1.18	118	114.24	114.24
17	DESCUENTO VENTANA	1.45	1.50	1.00	10	2.18	-2.18
18	DESCUENTO VENTANA	1.80	1.17	1.00	10	2.11	-2.11
19	DESCUENTO VENTANA	1.56	1.56	1.00	10	2.34	-2.34
20	DESCUENTO VENTANA	2.50	1.50	1.00	10	3.75	-15.00
21	DESCUENTO VENTANA	1.00	0.88	1.00	10	0.80	-2.40
22	DESCUENTO VENTANA	1.00	1.50	1.00	10	1.50	-3.00
23	DESCUENTO REJA METALICA	1.85	2.80	1.00	10	5.18	-5.18
24	FACHADA LATERAL DERECHA (Carrera 3)						
25	MURO DIVISORIO	18.20	2.85	1.20	120	51.87	51.87
26	MURO DIVISORIO	6.60	4.05	1.20	120	26.73	26.73
27	DESCUENTO VENTANA	2.10	0.69	1.00	10	1.26	-1.26
28	MURO DIVISORIO	4.00	2.90	1.20	120	11.80	11.80
29	DESCUENTO VENTANA	3.20	1.20	1.00	10	3.84	-3.84
30	MURO DIVISORIO	3.16	2.35	1.20	120	7.29	7.29
31	MURO DIVISORIO	17.00	3.60	1.20	120	61.20	61.20
32	DESCUENTO VENTANA	1.50	1.95	1.00	10	1.56	-4.13
33	DESCUENTO VENTANA	1.50	0.50	1.00	10	0.75	-1.00
34	DESCUENTO PORTON ENTRADA A TERAPIA	2.35	1.83	1.00	10	4.14	-4.14
35	MURO DIVISORIO	10.40	3.60	1.20	120	37.44	37.44
36	DESCUENTO VENTANA	2.60	1.50	1.00	10	3.90	-6.20
37	FACHADA POSTERIOR (Calle 2)						
38	MURO DIVISORIO TRASERO	1.10	3.27	1.20	120	3.60	3.60
39	MURO DIVISORIO TRASERO	50.00	2.85	1.20	120	142.50	285.00
40	DESCUENTO PORTON ENTRADA AMBULANCIAS	4.60	3.23	1.00	10	12.80	-12.80
41	DESCUENTO REJA PLANT. ELECTRICA	2.30	1.39	1.00	10	2.99	-2.99
42	LAVADO AP. EXTERNA DE VIGAS CANALES						
43	BLOQUE HOSPITALIZACION						
44	BLOQUE SALA DEPARTO-ESTERILIZACION						
45	VIGA CANAL EN CONCRETO	89.00	1.78	1.20	120	122.82	122.82
46	BLOQUE CONSULTA EXTERNA URGENCIAS LABORATORIO						
47	VIGA CANAL EN CONCRETO	89.00	1.50	1.20	120	90.90	90.90
48	BLOQUE CAFETERIA / LANCHERIA TERAPIA FISICA ADMINISTRACION						
49	VIGA CANAL EN CONCRETO	204.87	1.78	1.20	120	364.31	364.31
50	BLOQUE CAFETERIA / LANCHERIA TERAPIA FISICA ADMINISTRACION						
51	VIGA CANAL EN CONCRETO	169.80	1.50	1.20	120	253.50	253.50
52	VIGA CANAL EN CONCRETO	8.80	1.80	1.20	120	15.48	15.48
53	VIGA CANAL EN CONCRETO	8.50	1.80	1.20	120	12.35	12.35
54	BLOQUE GARAJE - MORGUE						
55	VIGA CANAL EN CONCRETO	83.00	1.78	1.20	120	147.74	147.74
56	SUBTOTAL					1855.92	1855.92
57	TOTAL					1855.92	1855.92

PLANOS Y LISTADOS A CONSULTAR	ARCHIVO FOTOGRAFICO
-------------------------------	---------------------

PLANOS Y MEMORIAS A CONSULTAR

ARCHIVO FOTOGRAFICO

Proyecto 150

Aprobado:

Ulanney Kuma B
INGENIERO EN INGENIERIA CIVIL
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 081007-0540151 CND

HENRY FERRER
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 54002-3116 CND



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	2.00		CUBIERTOS Y DRENAJES
ITEM	2.01		LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (AREA INTERNA)
UNIDAD			METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRAFICO



#	DESCRIPCION - UBICACION	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Urd)	AREA (m²)	TOTAL
1	BLOQUE HOSPITALIZACION						
2	VIGA CANAL EN CONCRETO	1.56	3.00		1.00	109.02	109.02
3	BLOQUE SALA DE PARTO-ESTERILIZACION						
4	VIGA CANAL EN CONCRETO	1.29	0.50		1.00	60.60	60.60
5	BLOQUE CONSULTA EXTERNA-URGENCIAS-LABORATORIO						
6	VIGA CANAL EN CONCRETO	1.80	14.57		1.00	327.47	327.47
7	BLOQUE CAFETERIA-LAVANDERIA-TERAPIA FISICA-ADMINISTRACION						
8	VIGA CANAL EN CONCRETO	1.30	19.00		1.00	219.70	219.70
9	VIGA CANAL EN CONCRETO	1.80	1.60		1.00	15.48	15.48
10	VIGA CANAL EN CONCRETO	1.50	1.50		1.00	12.35	12.35
11	BLOQUE GARAJE - MORGUE						
12	VIGA CANAL EN CONCRETO	1.36	3.00		1.00	112.88	112.88
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
SUBTOTAL							857.50
TOTAL							857.50

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

Proyectó:

Vianey K. Butrago
VIANEY KATIA BUTRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0640151 CTI

Aprobó:


FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENCIÓN
MATRICULA N° 54202-341877 NIT




ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	2.00	CUBERTAS Y DRENAJES
ITEM	2.02	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL EN CONCRETO
UNIDAD		METRO CUADRADO

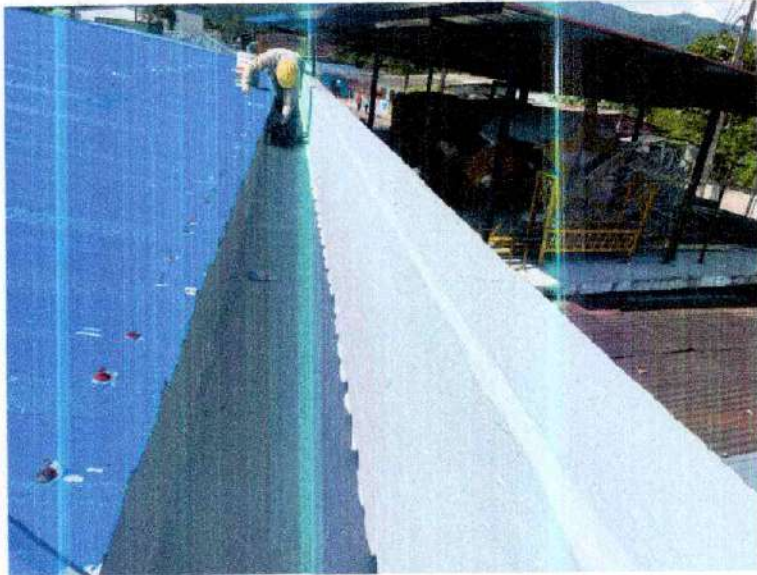ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	1	BLOQUE HOSPITALIZACIÓN						
	2	VIGA CANAL EN CONCRETO	1,98	60,00		1,00	109,02	109,02
	3	BLOQUE SALA DE PARTO-ESTERILIZACIÓN						
	4	VIGA CANAL EN CONCRETO	1,29	60,00		1,00	60,60	60,60
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	23							
	24							
	25							
	26							
	27							
	28							
	29							
	30							
	31							
	32							
	33							
	34							
	35							
	36							
	37							
	38							
	39							
	40							
	55							
SUBTOTAL							199,62	199,62
TOTAL							199,62	199,62

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

Proyectó:

Uribe K. Buñago
VIRNEY KARINA GUTIÉRREZ GARCÍA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0040151 CND

Aprobó:


HENRY FRANCISCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MATRICULA N° 54202-341577 NTS



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	1.00		CUBIERTAS Y DRENAJES
ITEM	1.03		DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO
UNIDAD			METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRAFICO		#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
		1	AREA CONSULTA EXTERNA						
		2	ESTRUCTURA EXISTENTE				1.00	135.00	135.00
		3							
		4							
		5							
		6							
		7							
		8							
		9							
		10							
		11							
		12							
		13							
		14							
		15							
		16							
		17							
		18							
		19							
		20							
		21							
		22							
		23							
		24							
		25							
		26							
		27							
		28							
		29							
		30							
		31							
		32							
		33							
		34							
		35							
		36							
		37							
PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR									
									SUBTOTAL 135.00
									TOTAL 135.00

Proyectó:

Vianney K. Buitrago
VIANNEY KARINA BUITRAGO SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0640111 CND

Aprobó:


HENRY ABRAHAM FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MATRICULA N° 54202-341571 NTS




ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	2.00	CUBIERTAS Y DRENAJES
ITEM	2.04	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA
UNIDAD		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRAFICO

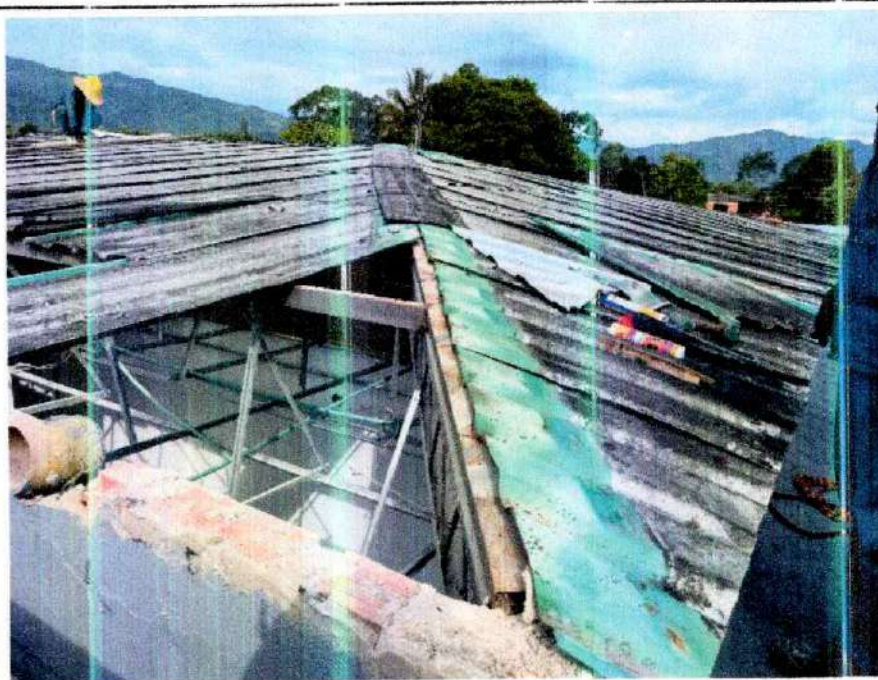

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
1	AREA ADMINISTRACION						
2	ESTRUCTURA EXISTENTE				1,00	250,00	250,00
3	AREA HOSPITALIZACION						
4	ESTRUCTURA EXISTENTE				1,00	270,00	270,00
5							39,60
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
60							
SUBTOTAL						559,60	
TOTAL						559,60	

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

Proyectó:

Vianney K. Butago
VIANNEY KARBIN BUTAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-340151 CND

Aprobó:

Henry Fabian Frasco
HENRY FABIAN FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MATRICULA N° 54202-341877 N°5




ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	2.00	CUBIERTAS Y DRENAJES
ÍTEM	2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOCÚSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360
UNIDAD		METRO CUADRADO

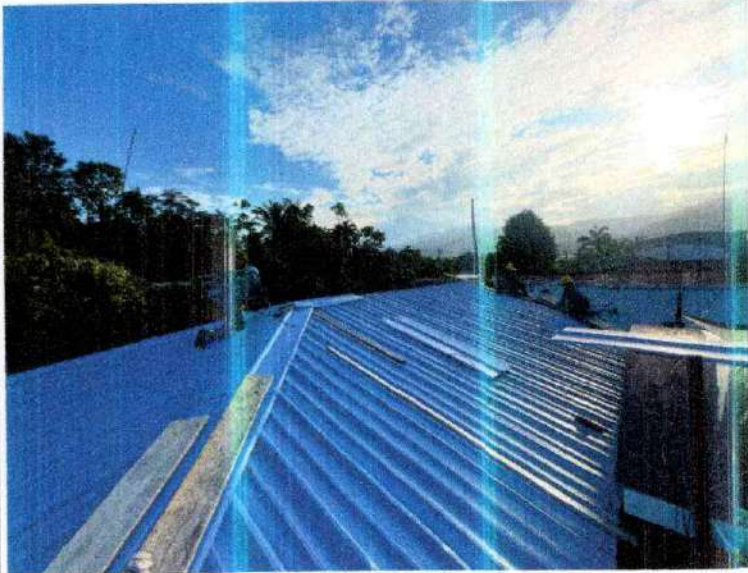ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	1			AREA ADMINISTRACION		1.00	250.00	250.00
	2	ESTRUCTURA EXISTENTE		AREA HOSPITALIZACION		1.00	270.00	270.00
	3							
	4	ESTRUCTURA EXISTENTE		AREA CONSULTA EXTERNA		1.00	135.00	135.00
	5							
	6	ESTRUCTURA EXISTENTE						
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	23							
	24							
	25							
	26							
	27							
	28							
	29							
	30							
	31							
	32							
	33							
	34							
	35							
	36							
	37							
	38							
	39							
	40							
	41							
	42							
	43							
	44							
	45							
	46							
	47							
	48							
	49							
	50							
PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR							SUBTOTAL	655.00
							TOTAL	655.00

Proyectó:

Vianey K. Buitrago
VIANEY KATIA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0540191 CND

Aprobó:


HENRY FABIAN FRASCO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN
MATRICULA N° 54202-34167 N° 13





ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	2.00	CUBIERTAS Y DRENAJES
ITEM	2.06	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M
UNIDAD		METRO LINEAL

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRAFICO

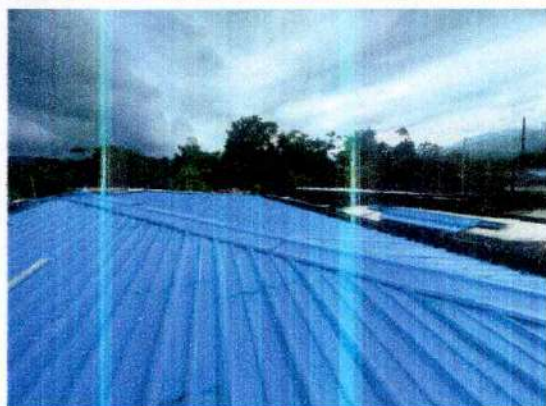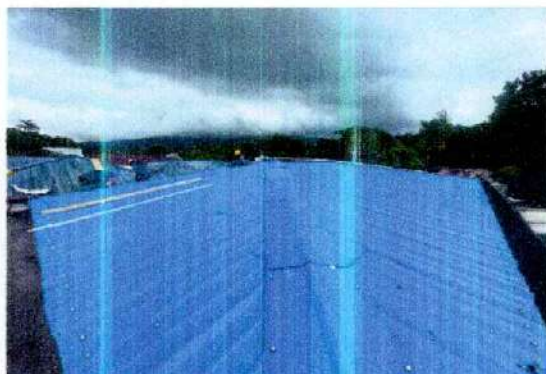

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Ind)	METRO LINEAL (ML)	TOTAL
1							
2	ESTRUCTURA EXISTENTE		AREA ADMINISTRACION				
3			55,15		1,00	55,15	55,15
4	ESTRUCTURA EXISTENTE		AREA HOSPITALIZACION				
5			45,00		1,00	45,00	45,00
6	ESTRUCTURA EXISTENTE		AREA CONSULTA EXTERNA				
7			26,00		1,00	26,00	26,00
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
						SUBTOTAL	126,15
						TOTAL	126,15

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

ARQUITECTONICO

Proyecto:

Aprobó:

Vianney K. Buitrago
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0840181 CND

HENRY ROSA FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENCIÓN
MATRICULA N° 54202-341677112



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRAS

CAPÍTULO	2.00	CUBIERTAS Y DRENAJES
ÍTEM	2.09	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO
UNIDAD		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
1	CUBIERTA 1 TIPO DOMO - CONSULTA EXTERNA	7,20	9,90		1,00	71,28	71,28
2	CUBIERTA 2 TIPO DOMO - CONSULTA EXTERNA	4,10	5,80		1,00	22,98	22,98
3	CUBIERTA 3 TIPO DOMO - CONSULTA EXTERNA	2,80	8,60		1,00	24,08	24,08
4	CUBIERTA 4 TIPO DOMO - CONSULTA EXTERNA	4,20	8,10		1,00	34,02	34,02
5	CUBIERTA 5 TIPO DOMO - AREA DE ESPERA CONSULTA EXTERNA	7,00	8,50		1,00	59,50	59,50
6	CUBIERTA 6 TIPO DOMO - PASILLO URGENCIAS A HOSPITALIZACIÓN	2,90	40,00		1,00	116,00	116,00
7	CUBIERTA 7 TIPO DOMO - PASILLO HOSPITALIZACIÓN	3,20	9,90		1,00	31,68	31,68
8	CUBIERTA 8 TIPO DOMO - PASILLO HOSPITALIZACIÓN	2,20	13,00		1,00	28,60	28,60
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
56							
57							
						SUBTOTAL	388,12
						TOTAL	388,12

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

Proyectó:

Vianney K. Buitrago
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRAS
MATRICULA N° 091937-004/151 CND

Aprobó:


HENRY FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MATRICULA N° 54262-3418/7 NTS



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	2.00	CUBIERTAS Y DRENAJES
ITEM	2.10	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA
UNIDAD		KILOGRAMO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	KG X ML	UNIDAD (Und)	PESO (KG)	TOTAL
	1	CUBIERTA 7 TIPO DOMO - PASILLO HOSPITALIZACIÓN						
	2	ESTRUCURA EN TUBO 2"	3,20		1,87	14,00	5,98	83,78
	3	ESTRUCURA EN TUBO 2"		9,90	1,87	4,00	18,51	74,05
	4	COLUMNAS EN TUBO CUADRADO DE 3"		2,60	2,61	3,00	6,79	20,36
	5	COLUMNAS EN TUBO CUADRADO DE 4"		3,20	4,00	2,00	12,80	25,50
	6							
	7	CUBIERTA 8 TIPO DOMO - PASILLO HOSPITALIZACIÓN						
	8	ESTRUCURA EN TUBO 2"	2,20		1,87	16,00	4,11	85,82
	9	ESTRUCURA EN TUBO 2"		13,00	1,87	4,00	24,31	97,24
	10	COLUMNAS EN TUBO CUADRADO DE 3"		2,35	2,61	8,00	6,13	49,07
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	23							
	24							
	25							
	26							
	27							
	28							
	29							
	30							
	31							
	32							
	33							
	34							
	35							
	36							
	37							
	38							
	39							
	40							
SUBTOTAL							415,92	
TOTAL							415,92	

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

Proyectó:

Wlamey K. Butrago
WILMEY KARINA BUTRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0640151 CNI

Aprobó:


HENRY FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENCIÓN
MATRICULA N° 94202-341677 NTS



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	2,00		CUBERTAS Y DRENAJES
ITEM	2,11		TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM
UNIDAD			KILOGRAMO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	AREA (m2)	PISO X M2	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	KILOGRAMO (KG)	TOTAL
1							
2	CUBIERTA EXISTENTE	136,00	3,00		1,01	405,00	405,00
3							
4		270,00	2,50		1,01	675,00	675,00
5							
6	CUBIERTA EXISTENTE	120,90	2,50		1,01	302,00	302,00
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
						SUBTOTAL	1382,00
						TOTAL	1382,00

Proyectó:

Yanney K. Borhago
YANNEY KARINA BORTUÑO GARCIA
RESIDENTE DE OBRAS
MATRICULA N° 091037 DE 10151 CND

Aprobó:

Henry Ralson Frascino
RESIDENTE DE INTERVENCIÓN
MATRICULA N° 54202 34 DE 7 NIS



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	3,00	ADMINISTRACION
ÍTEM	3,01	ESTUCCO MUROS
UNIDAD		METRO CUADRADO

ESQUEMA DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	1	MUROS CON HUMEDAD SALON AUDITORIO	1,00		2,80	1,00	2,80	2,80
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	53							
	54							
	55							
	56							
	57							
	58							
	59							
PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	SUBTOTAL							2,80
	TOTAL							2,80

Proyectó:

Vianney K. Bulcago
VIANNEY K. ARINA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0840151 CND

Aprobó:


HENRY FABIAN FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MATRICULA N° 54202-341677 NTS



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	3.00	ADMINISTRACIÓN
ÍTEM	3.03	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO
UNIDAD		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Urd)	AREA (m²)	TOTAL
	1	MUROS INTERIORES - AREA DE OFICINAS, DROGUERIA, BODEGA DROGUERIA, FACTURACION, OFICINA GERENCIA		147,90	2,80	1,00	414,12	414,12
	2	DESCUENTO PUERTA		2,00	2,05	- 30	4,10	-4,10
	3	DESCUENTO VENTANA		1,50	1,46	- 30	2,19	-2,19
	4	DESCUENTO VENTANA		1,00	1,46	- 30	1,46	-1,46
	5	DESCUENTO PUERTA		0,80	1,95	- 30	1,56	-3,12
	6	DESCUENTO PUERTA		1,00	1,95	- 30	1,95	-1,95
	7	DESCUENTO VENTANA		1,50	1,50	- 30	2,25	-2,25
	8	DESCUENTO VENTANA		2,00	1,50	- 30	3,00	-12,00
	9	DESCUENTO PUERTA		0,70	1,95	- 30	1,37	-2,73
	10	DESCUENTO PUERTA		0,80	1,95	- 30	1,56	-3,12
	11	MURO DIVISORIOS DE CUBICULOS		84,60	1,15	1,00	97,29	97,29
	12	AREA SUPERIOR DE LOS MURO DIVISORIOS DE CUBICULOS	1,13	42,26		1,00	5,49	5,49
	13	DESCUENTO DE PUERTAS DE ACCESO A CUBICULOS	0,80		1,15	- 30	0,92	-5,52
	14	DESCUENTO DE PUERTAS DE ACCESO A CUBICULOS	0,05		1,15	- 30	1,21	-1,21
PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	23							
							SUBTOTAL	477,26
							TOTAL	477,26

Proyecto:

Vianney K. Buitrago
 VIANNEY K. BUITRAGO GARCIA
 RESIDENTE DE OBRA
 MATRICULA N° 001037-0640151 CND

Aprobó:


 HENRY FABIAN FRASCO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 MATRICULA N° 54202-41877 NTS



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUIARÁ

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA



CAPÍTULO	3,00	ADMINISTRACION
ITEM	3,04	ESMA. TE MADERA LLENA 3 MANOS
UNIDAD		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
1	PUERTA OFICINA GERENCIA	0.80		2.10	2.00	1.68	3.36
2	PUERTA DE ACCESO AREA	2.00		2.10	2.00	4.20	8.40
3	PUERTA BODEGA DROGUERIA	0.80		2.10	2.00	1.68	3.36
4	PUERTA DROGUERIA	0.80		2.10	2.00	1.68	3.36
5	PUERTA AUDITORIO	1.00		2.10	2.00	2.10	4.20
6	PUERTA BAÑO	0.70		2.10	2.00	1.47	2.94
7	PUERTAS DE ACCESO A CUBICULOS	0.80		1.24	12.00	0.99	11.90
8	PUERTAS DE ACCESO A CUBICULOS	1.05		1.24	2.00	1.30	2.60
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
						SUBTOTAL	40.13
						TOTAL	40.13

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

ARQUITECTÓNICO

Proyectó:

Vianney K. Buitrago
VIANNEY KARIN A. BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0840151 CND

Aprobó:

Henry P. Buitrago
HENRY PABLO FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MATRICULA N° 54202-341877 NTS



ADECUACIÓN MINOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OERA

CAPÍTULO	3,00	ADMINISTRACION
ITEM	3,05	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS
UNIDAD		METRO LINEAL

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRAFICO



#	DESCRIPCION - UBICACION	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Un f)	METRO LINEAL (ML)	TOTAL
1	MARCO PUERTA OFICINA DE REFERENCIA		5,00		1,00	5,00	5,00
2	MARCO PUERTA DE ACCESO ADMINISTRACION		6,20		1,00	6,20	6,20
3	PUERTA BODEGA DROGUERIA		5,00		1,00	5,00	5,00
4	PUERTA DROGUERIA		5,00		1,00	5,00	5,00
5	PUERTA AUDITORIO		5,20		1,00	5,20	5,20
6	PUERTA BAÑO		4,90		1,00	4,90	4,90
7	PUERTAS DE ACCESO A CURSOS		3,28		1,00	3,28	3,28
8	PUERTAS DE ACCESO A CURSOS		3,53		1,00	3,53	3,53
9	VENTANA ATENCION FACTURACION		10,50		1,00	10,50	10,50
10	VENTANA ATENCION DROGUERIA		7,50		1,00	7,50	7,50
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
SUBTOTAL							56,11
TOTAL							56,11

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTA

ARQUITECTÓNICO

Proyectó:

Vannay K. Burkago
VIANEY KARINA BUTRAGO GARCIA
RESIDENTE DE CUBA
MATRICULA N° 091037-0 440151 CND

Aprobó:

HENRY F. ARSCO
RESIDENTE DE CUBA
MATRICULA N° 54207-341877 NTS




ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	4.00	ARCHIVO - ALMACEN
ITEM	4.01	DESMONTE CUBIERTAS TEJAS DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO
UNIDAD		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

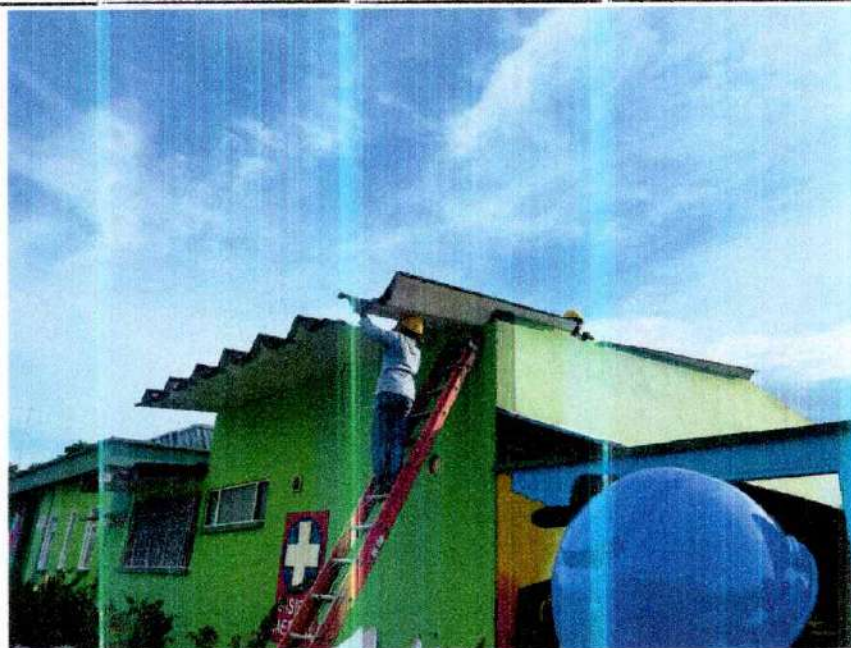

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
1	CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO	11.30	12.90		1.00	145,77	145,77
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
						SUBTOTAL	145,77
						TOTAL	145,77

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

ARQUITECTÓNICO

Proyectó:

Vanney K. Buitrago
VANNHEY KARINA BUITRAGO JARCA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 391037-0940111 CND

Aprobó:

HENRY J. FRASCO
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 54232-341877 UTE




ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	4,00	ARCHIVO - ALMACEN
ITEM	4,02	DEMOLICIÓN MUR DE LADRILLO E = 0.15 mts.
UNIDAD		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

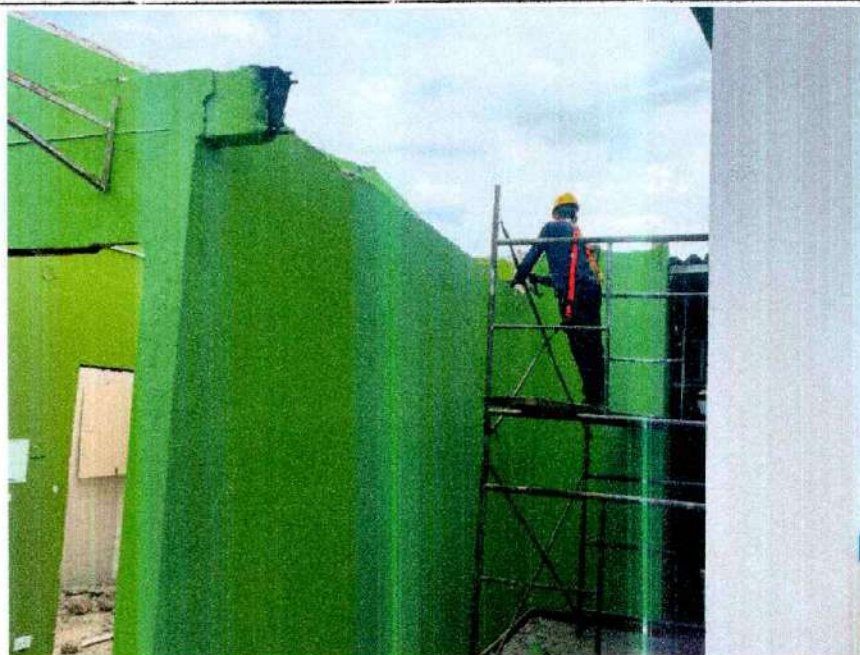

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
1	NIVELACION DE CUCHILLAS DE CUBIERTA		15,0	0,30	1,00	4,50	4,53
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
						SUBTOTAL	4,53
						TOTAL	4,53

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

ARQUITECTÓNICO

Proyectó:

Vianney K. Buitrago
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0640151 C.O.D.

Aprobó:

Henry Fabian Frasco
HENRY FABIAN FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENTOR
MATRICULA N° 54202-341677 INT



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	4.00	ARCHIVO - ALMACEN
ITEM	4.03	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO
UNIDAD		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
1	MESON EN CONCRETO EXISTENTE EN EL AREA DE ARCHIVO	0,50	2,10		1,00	1,05	1,05
2	MESON EN CONCRETO EXISTENTE EN EL AREA DE ARCHIVO	0,50	0,95		1,00	0,48	0,48
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
57							
						SUBTOTAL	1,53
						TOTAL	1,53

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

ARG. ITECTÓNICO

Proyectó:

Vianney K. Buitrago
VIANNEY KATINA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0640151 CND

Aprobó:

Henry Fabian Frasco
HENRY FABIAN FRASCO
RESIDENTE DE INTERVINTORIA
MATRICULA N° 54202-34 577 NTS



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO

4,00

ARCHIVO - ALMACEN

ITEM

4,04

DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS

UNIDAD

METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
1	PUERTA EN MADERA AREA DE ARCHIVO	0,70		2,07	1,00	1,45	1,45
2	PUERTA EN MADERA AREA BODEGA Y ARCHIVO	0,70		2,07	3,00	1,45	4,35
3	PUERTA EN MADERA AREA ARCHIVO	1,56		2,00	1,00	3,12	3,12
4	PUERTA EN MADERA AREA ARCHIVO	1,35		2,00	2,00	2,70	5,40
5	PUERTA DE ACCESO A BODEGA	1,00		2,05	1,00	2,05	2,05
6	VENTA INTERNA	0,75		1,00	1,00	0,75	0,75
7	VENTANA EXTERIOR LATERAL		4,80	1,00	1,00	4,80	4,80
8	VENTANA EXTERIOR LATERAL		2,20	0,50	1,00	1,32	1,32
9	VENTANA EXTERIOR FRONTAL		4,00	1,00	1,00	4,00	4,00
10	VENTANA EXTERIOR POSTERIOR		3,20	1,20	1,00	3,84	3,84
11	VENTANA EXTERIOR POSTERIOR		2,10	0,50	1,00	1,26	1,26
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
59							
60							
61							

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

ARQUITECTÓNICO

SUBTOTAL 32,34

TOTAL 32,34

Proyectó:

Aprobó:

Vianey K. Buitrago
VIANEY K. PRINA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0640151 CND

Henry Fabian Frasisco
HENRY FABIAN FRASISCO
RESIDENTE DE INTERVENCIÓN
MATRICULA N° 54202-341377 NTS




ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO	4,00	ARCHIVO - ALMACEN
ITEM	4,05	CORREA METÁLICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18
UNIDAD		METRO LINEAL

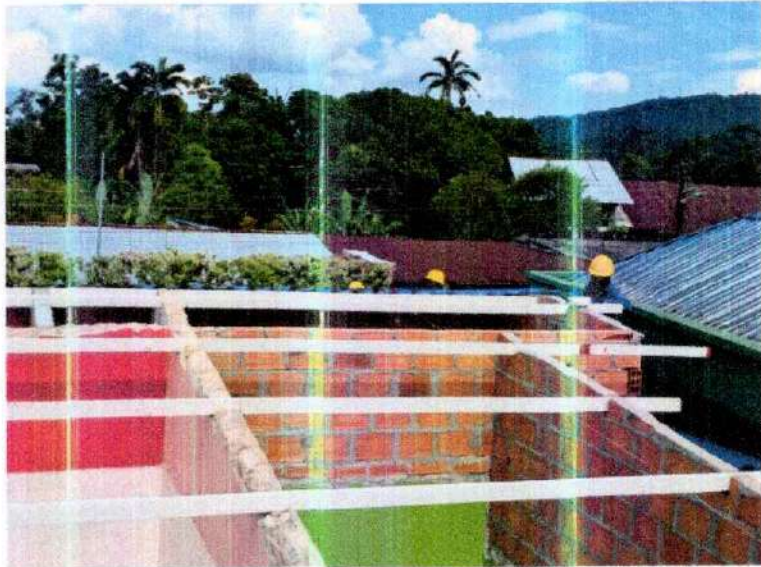ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	METRO LINEAL (Ml)	TOTAL
	1	TUBO RECTANGULAR PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE ARCHIVO Y ALMACEN		9,90		14,00	9,90	138,60
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	23							
	24							
	25							
	26							
	27							
	28							
	29							
	30							
PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	ARQUITECTÓNICO						SUBTOTAL	138,60
							TOTAL	138,60

Proyectó:

Vanney K. Butrago
 VANNEY KARINA BUTRAGO GARCIA
 RESIDENTE DE C.S.A.
 MATRICULA N° 091037-01-0151 CND

Aprobó:


Henry Urbán Frasco
 HENRY URBAN FRASCO
 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
 MATRICULA N° 54202-341877 NT



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

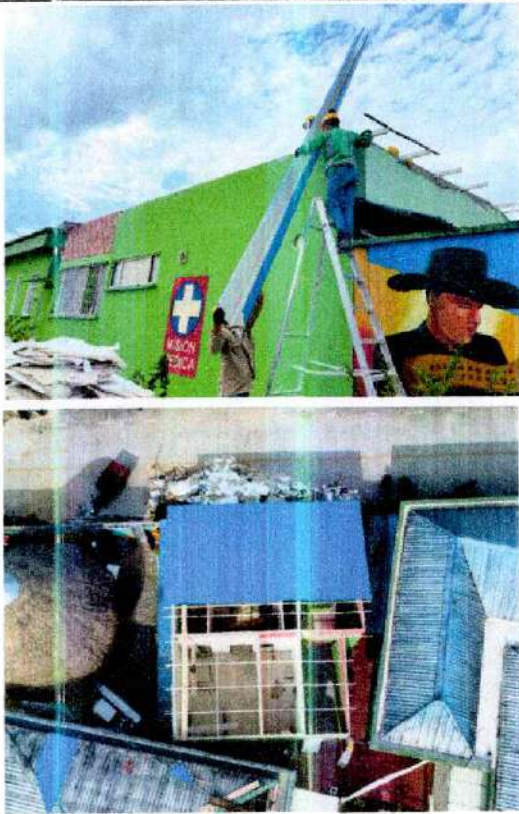CAPITULO	4.00	ARCHIVO - ALMACEN							
ITEM	4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOCÚSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360							
UNIDAD		METRO CUADRADO							
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO		#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
		1	CUBIERTA EN TEJA TERMOCÚSTICA	11.30	12.90		1.00	145.77	145.77
		2							
		3							
		4							
		5							
		6							
		7							
		8							
		9							
		10							
		11							
		12							
		13							
		14							
		15							
		16							
		17							
		18							
		19							
		20							
		21							
		22							
		23							
		24							
		25							
		26							
		27							
		28							
		29							
		30							
		31							
		32							
		33							
		34							
		35							
		36							
		37							
		38							
		39							
		40							
		41							
		42							
		43							
		44							
		45							
		46							
		47							
		48							
		49							
		50							
PLANOS / DISEÑOS A CONSULTAR								SUBTOTAL	145.77
								TOTAL	145.77

Proyecto:

Aprobó:

viannet k. Burkago
VIANNEY KARINAI UTRAGO BARRERA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 061237-0640191 CND


HENRY FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENCIÓN
MATRICULA N° 54222-341877 ITJ



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	4,00	ARCHIVO - ALMACEN
ÍTEM	4,07	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M
UNIDAD		METRO LINEAL

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	METRO LINEAL (Ml)	TOTAL
1	CABALLETE SOBRE CUBIERTA		11,30		1,00	11,30	11,30
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
50							
						SUBTOTAL	11,30
						TOTAL	11,30

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

ARQUITECTÓNICO

Proyectó:

Vianney K. Barrios
VIANNEY KARINA B. ITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037 0640151 CND

Aprobó:

Henry Fabian Frasco
HENRY FABIAN FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENCIÓN
MATRICULA N° 54202-341677 NTE



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

APÍTULO	4,00	ARCHIVO - ALMACEN
TEM	4,09	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS
INIDAD		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRAFICO		#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
 		1	NIVELACION DE CUCHILLAS PERIMETRALES PARA CUBIERTA		27,18	1,10	1,00	29,90	29,90
		2	NIVELACION DE CUCHILLA INTERNA	2,10		1,00	1,00	2,10	2,10
		3							
		4							
		5							
		6							
		7							
		8							
		9							
		10							
		11							
		12							
		13							
		14							
		15							
		16							
		57							
		58							
		59							
PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR									SUBTOTAL 32,00
ARQUITECTÓNICO									TOTAL 32,00

Proyectó:

Vianney K. Buitrago
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0340151 CND

Aprobó:

Henry Fabian Frasco
HENRY FABIAN FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENCIÓN
MATRICULA N° 54202-341877 NTS



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CAPÍTULO	4,00	ARCHIVO - ALMACEN
ÍTEM	4,17	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM
UNIDAD		KILOGRAMO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO		#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	AREA (m2)	PESO X M2	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	KILOGRAMO (KG)	TOTAL
		1	AREA CONSULTA EXTERNA						
		2	AREA DESMONTE CUBIERTA EXISTENTE	145,77	3,30		1,00	481,04	481,04
		3							
		4							
		5							
		6							
		7							
		8							
		9							
		10							
		11							
		12							
		13							
		14							
		15							
		16							
		17							
		18							
		19							
		20							
		21							
		22							
		23							
		24							
		25							
		26							
SUBTOTAL								481,04	481,04
TOTAL								481,04	481,04

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

ARQUITECTÓNICO

Proyectó:


 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
 RESIDENTE DE OBRA
 MATRICULA N° 091037-0640151 CND

Aprobó:


 HENRY FABIAN FRASCINO
 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN
 MATRICULA N° 54202-341877 NTS



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	5,00	SALA DE AUTOPSIAS
ÍTEM	5,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO
UNIDAD		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO		#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	1	MUROS INTERNOS MORGUE		6,50	2,75	1,00	17,88	17,88	
	2	DESCUENTO VENTANA		2,00	1,50	-1,00	3,00	-3,00	
	3	DESCUENTO PUERTA DE ACCESO A MORGUE		1,50	2,00	-1,00	3,00	-3,00	
	4	MUROS INTERNOS MORGUE		19,70	2,60	1,00	51,22	51,22	
	5	DESCUENTO PUERTA		1,00	2,00	-1,00	2,00	-2,00	
	6	DESCUENTO PUERTA		0,80	2,00	-2,00	1,60	-3,20	
	7	DESCUENTO VANO		1,40	2,00	-1,00	2,80	-2,80	
	8	DESCUENTO VENTANA		2,00	1,50	-1,00	3,00	-3,00	
	9	DESCUENTO PUERTA		1,50	2,00	-2,00	3,00	-6,00	
	10	MUROS INTERNOS BAÑO, VESTIER Y ZONA DE NEVERA		20,38	0,70	1,00	14,27	14,27	
	11	DESCUENTO VENTANA		1,04	0,50	-2,00	0,52	-1,04	
	12	MURO INTERNO MORGUE		35,66	2,60	1,00	92,72	92,72	
	13	DESCUENTO PUERTA		2,00	1,50	-3,00	3,00	-9,00	
	14	DESCUENTO PUERTA		2,00	1,00	-2,00	2,00	-4,00	
	15	DESCUENTO VANO		1,96	2,00	-2,00	3,92	-7,84	
	16	DESCUENTO VENTANA		2,00	1,50	-1,00	3,00	-3,00	
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	41								
	42								
	43								
	44								
	45								
	46								
	47								
	48								
PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR								SUBTOTAL	128,20
								TOTAL	128,20

Proyectó:

Vanney Karina Buitrago
VANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0640151 CND

Aprobó:

Henry Fabian Frasco
HENRY FABIAN FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MATRICULA N° 54202 341677 NTS




ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	5,00	SALA DE AUTOPSIAS
ÍTEM	5,02	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS
UNIDAD		METRO CUADRADO

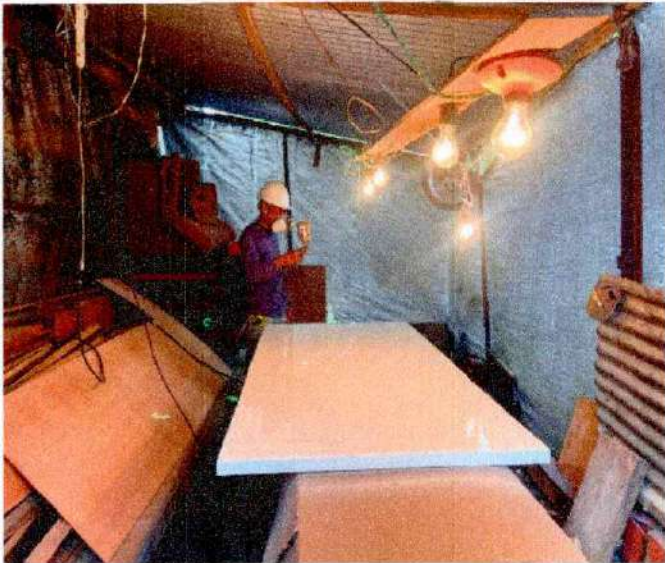ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO		#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	1	PUERTAS DE ACCESO A MORGUE	1,50		2,00	3,00	3,00	9,00	
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
	13								
	14								
	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	23								
	24								
	25								
	64								
PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR		ARQUITECTÓNICO		SUBTOTAL					9,00
				TOTAL					9,00

Proyectó:

Aprobó:

Yanney Karina Buitrago
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 081037-0640151 CNE

Henry Frasco
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MATRICULA N° 54202-341877 NTS



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	5,00	SALA DE AUTOPSIAS
ÍTEM	5,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS
UNIDAD		METRO LINEAL

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	METRO LINEAL (MI)	TOTAL
	1	PUERTAS DE ACCESO A MORGUE		5,50	3,00	3,00	16,50	49,50
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	37							
	38							
	39							
	61							
PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR								SUBTOTAL 49,50
								TOTAL 49,50

Proyectó:

Vianney Karina Buitrago
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0640151 CND

Aprobó:

Henry Fabian Frasco
HENRY FABIAN FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MATRICULA N° 54202-341877 NTS



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	5,00	SALA DE AUTOPSIAS
ITEM	5,04	ESTUCO MUROS
UNIDAD		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	1	ESTUCO SOBRE AREA INFERIOR DE MUROS CON HUMEDAD		8,00	0,40	1,00	3,20	3,20
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	23							
	24							
	25							
	26							
	27							
	28							
	29							
	30							
SUBTOTAL								3,20
TOTAL								3,20

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

ARQUITECTÓNICO

Proyectó:

Vianney Karina Buitrago
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0640151 CND

Aprobó:


HENRY FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MATRICULA N° 54202-341877 NTS



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	6,00	HOSPITALIZACIÓN
ÍTEM	6,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO
UNIDAD		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO		#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
		1	SALA DE RECEPCION						
		2	MUROS INTERNOS		43.50	2.85	1.00	123.98	123.98
		3	DESCUENTO VENTANA	2.00		1.50	-1.00	3.00	-3.00
		4	DESCUENTO PUERTA DE ACCESO	2.00		2.05	-1.00	4.10	-4.10
		5	DESCUENTO PUERTA SALA DE	0.75		2.05	-5.00	1.54	-7.69
		6	DESCUENTO PUERTA	0.90		2.05	-5.00	1.85	-11.07
		7	MURO DE MESON DE RECEPCION		14.50	1.10	1.00	16.05	16.05
		8	ESTACION ENFERMERAS						
		9	CUARTOS DE PACIENTES						
		10	MUROS CUARTOS		23.00	2.70	6.00	62.10	372.60
		11	DESCUENTOS PUERTA DE ACCESO	0.90		2.05	-5.00	1.85	-11.07
		12	DESCUENTO PUERTA DE BAÑO	0.88		2.05	-5.00	1.80	-10.82
		13	DESCUENTO PUERTA DE CLOSET	1.18		2.00	-5.00	2.36	-14.16
		14	DESCUENTO VENTANA	2.00		1.50	-5.00	3.00	-18.00
		15							
		16							
		17							
		18							
		19							
		20							
		21							
		22							
		23							
		24							
		50							
PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR		ARQUITECTÓNICO							
		SUBTOTAL							432.72
		TOTAL							432.72

Proyectó:

Vianney Karina Buitrago
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0940151 CND

Aprobó:


HENRY FABIAN FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MATRICULA N° 54202-34187 NTS



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	6,00	HOSPITALIZACIÓN
ÍTEM	6,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES
UNIDAD		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO		#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
		1	MUROS EXTERIORES						
		2	MURO FRONTAL		18.30	1.49	1,00	27.27	27.27
		4	DESCUENTO PUERTA DE ACCESO		2.05	2.05	-1,00	4.20	-4.20
		5	DESCUENTO VENTANA		1.05	1.45	-1,00	2.83	-2.83
		6	DESCUENTO VENTANA		1.05	0.45	-1,00	0.47	-0.47
		7							
		8	MURO POSTERIOR		18.30	3.60	1,00	65.88	65.88
		10							
		11	MURO LATERAL DERECHO		13.76	3.50	1,00	48.16	48.16
		13	DESCUENTO VENTANA		2.00	1.45	-4,00	2.90	-11.60
		14							
		15	MURO LATERAL IZQUIERDO		13.76	2.95	1,00	40.59	40.59
		17	DESCUENTO VENTANA		2.00	1.45	-2,00	2.90	-5.80
		18	DESCUENTO VENTANA		1.05	0.45	-1,00	0.47	-0.47
		19							
		20							
		21							
		22							
		23							
		24							
		25							
		52							
		53							
		54							
		55							
		56							
		57							
		58							
		59							
		60							
		61							
		62							
PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR		SUBTOTAL							156.52
ARQUITECTÓNICO		TOTAL							156.52

Proyectó:

Vianney Karina Butago
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0640151 CND

Aprobó:

Henry Frasco
HENRY FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENCIÓN
MATRICULA N° 54202-341877 NTS



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	6.00	HOSPITALIZACIÓN
ÍTEM	6.03	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)
UNIDAD		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO		#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL	
	1	CIELO RASO EXISTENTE RECEPCIÓN AREA 1	1,52	6,81			1,00	10,35	10,35	
	2	CIELO RASO EXISTENTE RECEPCIÓN AREA 2	5,20	10,00			1,00	52,00	52,00	
	3	CIELO RASO EXISTENTE RECEPCIÓN A PASILLO A CUARTOS PACIENTES	2,00	8,50			1,00	17,00	17,00	
	4	CIELO RASO CUARTO DE PACIENTES					5,00	25,80	134,00	
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									
	13									
	16									
	17									
	18									
	19									
	20									
	21									
	22									
	23									
	24									
	SUBTOTAL									213,35
	TOTAL									213,35



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	6,00	HOSPITALIZACION
ÍTEM	6,04	CIELO RASO EN PVC
UNIDAD		METRO CUADRADO

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO		#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	1	CIELO RASO EXISTENTE RECEPCION AREA 1	1,52	6,81		1,00	10,35	10,35	
	2	CIELO RASO EXISTENTE RECEPCION AREA 2	5,20	10,00		1,00	52,00	52,00	
	3	CIELO RASO EXISTENTE RECEPCION A PASILLO A CUARTOS PACIENTES	2,00	8,50		1,00	17,00	17,00	
	4	CIELO RASO CUARTO DE PACIENTES				5,00	26,80	134,00	
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
	49								
	50								
	51								
	52								
	53								
	54								
	55								
	56								
	57								
	58								
	59								
	60								
PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR		ARQUITECTÓNICO		SUBTOTAL					213,35
				TOTAL					213,35

Proyectó:

Vianney Karina Buitrago
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0640151 CND

Aprobó:


HENRY FABIAN FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MATRICULA N° 54262-341877 NTS



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO		6.00	HOSPITALIZACION							
ITEM		6.05	ESTUCCO MUROS							
UNIDAD			METRO CUADRADO							
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO			#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
 			1	SALA DE RECEPCION						
			2	MUROS INTERNOS		43.00	0.30	13.00	12.90	12.90
			3	DESCUENTO PUERTA DE ACCESO	2.00		0.30	0.60	-0.60	
			4	DESCUENTO PUERTAS SALA DE ESTACION EFERMERAS	0.75		0.30	0.23	-1.13	
			5	DESCUENTO PUERTAS HABITACION	0.90		0.30	0.27	-1.92	
			6	MURO DE MESON DE RECEPCION ESTACION EFERMERAS		14.60	0.30	4.38	4.38	
			7	HABITACIONES						
			8	MUROS CUARTOS		22.00	0.30	6.60	36.60	
			9	DESCUENTOS PUERTA DE ACCESO	0.90		0.30	0.27	-1.92	
			10	DESCUENTO PUERTA DE BAÑO	0.86		0.30	0.26	-1.56	
			11	DESCUENTO PUERTA DE CLOSET	1.16		0.30	0.35	-2.12	
			12							
			13							
			14							
			15							
			16							
			17							
			18							
			19							
			20							
			21							
			22							
			23							
			24							
			25							
			26							
			27							
			28							
			29							
			30							
SUBTOTAL									48.21	
TOTAL									48.21	
PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR			ARQUITECTÓNICO							

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

ARQUITECTÓNICO

Proyectó:

Vanney Buitrago
VANNY KARINA BUITRAGO JANCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0840151 CND

Aprobó:

Henry F. Buitrago
HENRY F. BUITRAGO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN
MATRICULA N° 54262341677 NTS



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	6,00	HOSPITALIZACIÓN
ÍTEM	6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W
UNIDAD		UNIDAD

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	UNIDAD (Und)	TOTAL
	1	CUARTOS PACIENTES				5.00	3.00	15.00
	2	SALA DE RECEPCION Y PASILLO A CUARTOS DE PACIENTES				1.00	6.00	6.00
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	35							
	36							
	37							
	38							
							SUBTOTAL	21.00
							TOTAL	21.00

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR

ARQUITECTÓNICO

Proyectó:

Vianney Karina Buitrago
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
 RESIDENTE DE OBRA
 MATRÍCULA N° 091037/0640151 CND

Aprobó:

Henry Fabian Frasco
 HENRY FABIAN FRASCO
 RESIDENTE DE INTERVENCIÓN
 MATRÍCULA N° 54202-341677 NTS



ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ



FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	6,00	HOSPITALIZACION
ÍTEM	6,07	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS
UNIDAD		METRO LINEAL

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO		#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	METRO LINEAL (ML)	TOTAL
		1	PUERTA DE ACCESO A CUARTOS DE PACIENTES		5,00		6,00	5,00	30,00
		2	PUERTA DE BAÑOS CUARTOS PACIENTES		5,00		6,00	5,00	30,00
		3	PUERTA DE ACCESO A VENTANAS CUARTOS PACIENTES		6,10		1,00	6,10	6,10
		4			10,00		6,00	10,00	60,00
		5							
		6							
		7							
		8							
		9							
		10							
		11							
		12							
		13							
		14							
		15							
		16							
		17							
		18							
		19							
		20							
		49							
PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR		ARQUITECTÓNICO							

ANEXO 11. PROGRAMACIÓN DE OBRA

Id	Modo de tarea	Nombre de la tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	19 oct '25	26 oct '25	2 nov '25	7 nov '25	16 nov '25	23 nov '25	30 nov '25	7 dic '25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 1/12/25


Tarea
Duración
Hito
Resumen

Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo

Fecha límite
Progreso
Progreso manual

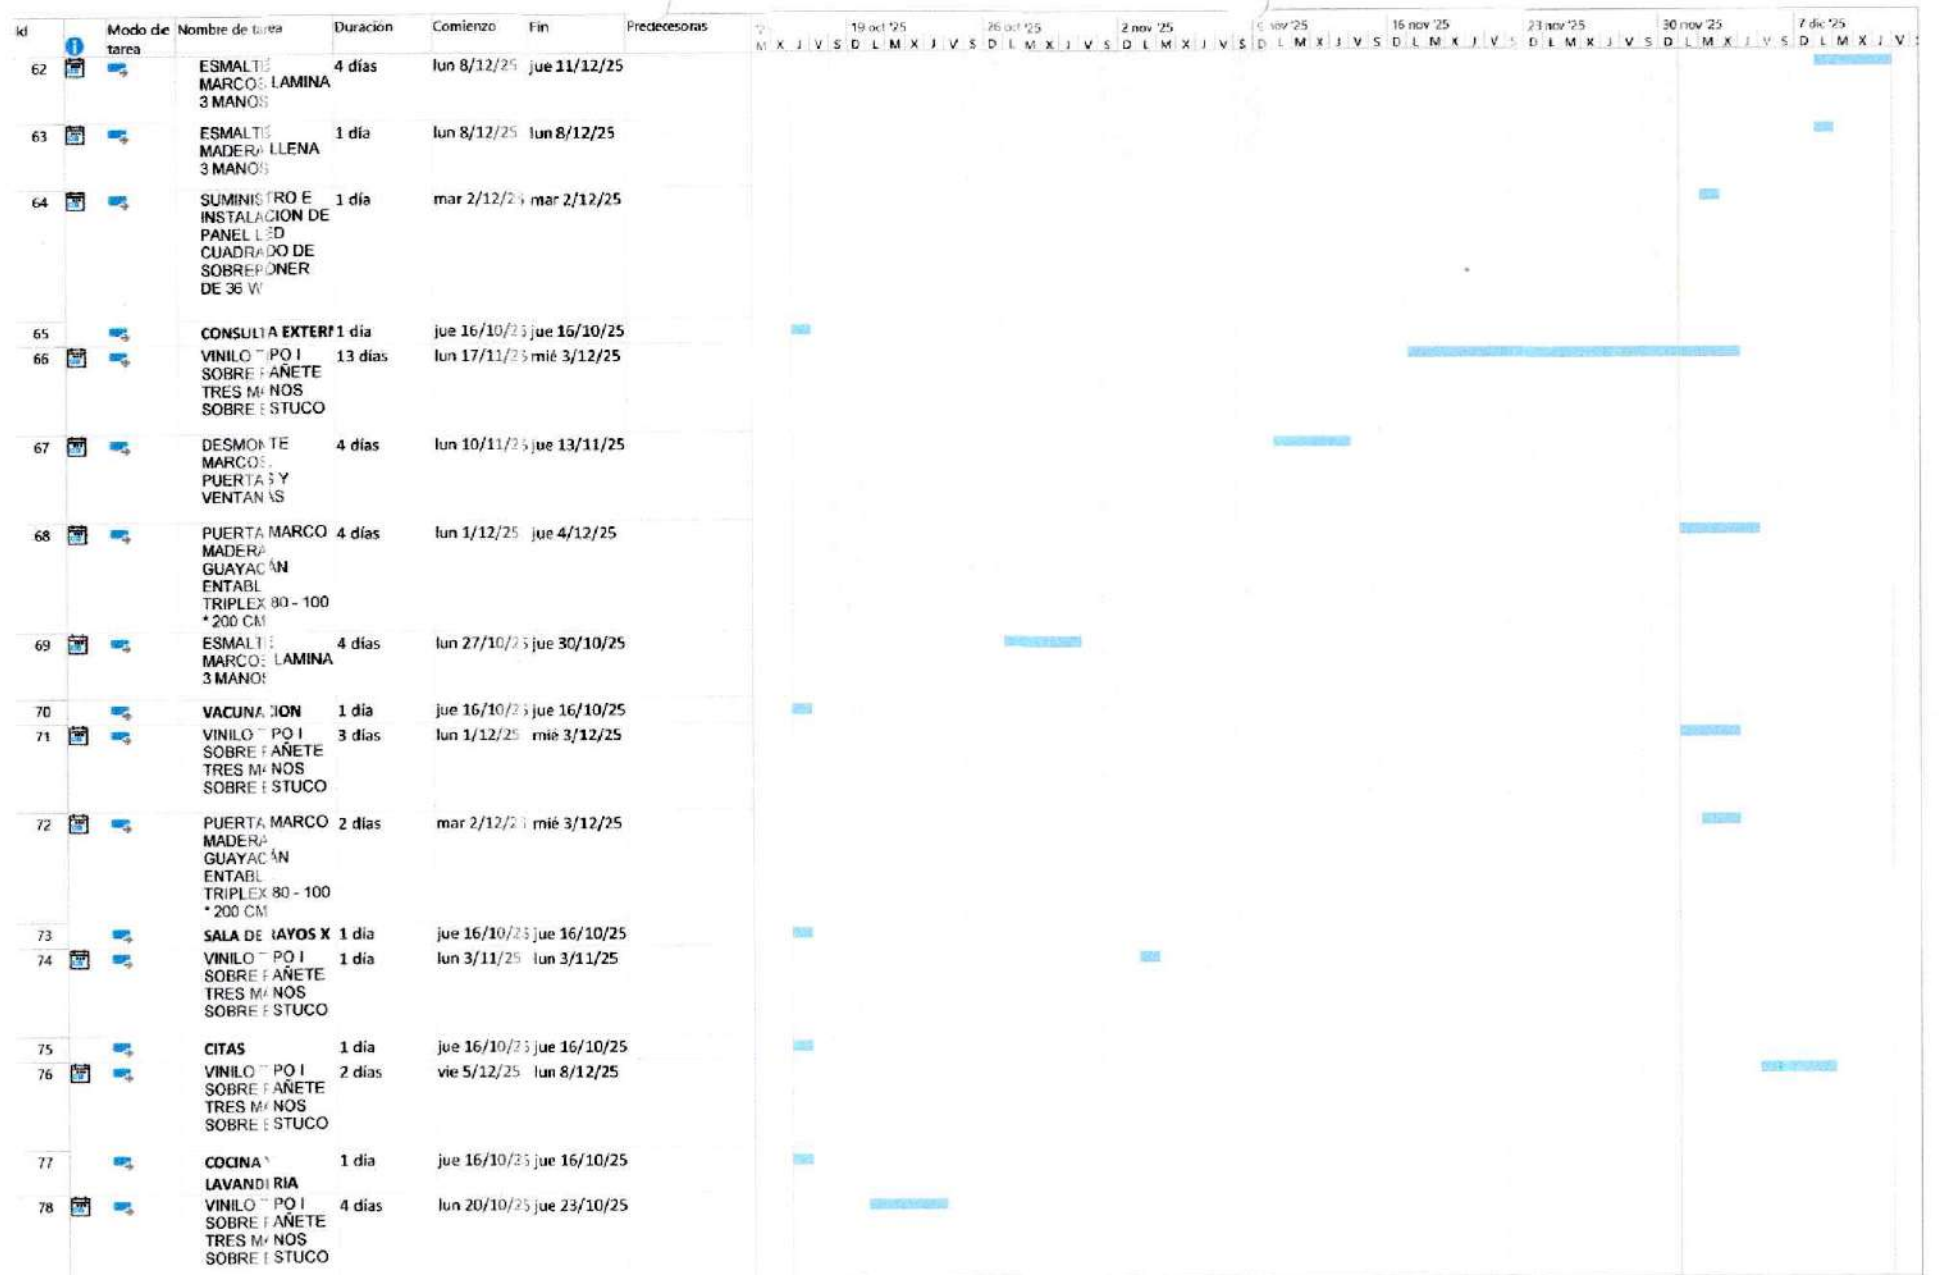

Proyecto: Proyecto 1
Fecha: lun 1/12/25

Área
División
Hito
Resumen

Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo

Fecha límite
Progreso
Progreso manual

ANEXO 12. INFORME DE IMPREVISTOS

INFORME DE IMPREVISTOS

CONTRATO DE OBRA No. 361-2025

PERIODO DEL INFORME: 16 de octubre al 15 de noviembre del 2025

OBJETO:

"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ".

**CONTRATISTA: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
R/L GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA**

MARLENY APONTE TORRES – SUPERVISOR

CUBARÁ, 2025

El presente informe tiene como propósito documentar, analizar y justificar los imprevistos ocurridos durante la ejecución del proyecto "Adecuación Menor de la Infraestructura Física de la E.S.E. Hospital Especial de Cubará", cuyo alcance comprendió intervenciones de mejoramiento arquitectónico, estructural liviano y mantenimiento general en distintas áreas funcionales del hospital, tales como Hospitalización, Archivo-Almacén, fachada, cubiertas y cerramientos metálicos.

Durante el desarrollo de las actividades programadas se presentaron condiciones no previstas que afectaron directamente los rendimientos, la continuidad de los frentes de trabajo y los costos asociados al proceso constructivo. En particular, se registraron eventos climatológicos adversos (lluvias de diferentes intensidades y duraciones) entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre de 2025, situación que impactó actividades sensibles a la humedad como lavado de fachada con hidro lavadora, aplicación de estuco, instalación de teja termoacústica, trabajos de mantenimiento metálico, aplicación de esmaltes, labores en cubiertas y actividades en altura.

Estas afectaciones obligaron a reducir ritmos de trabajo, interrumpir actividades por seguridad, reprogramar procesos y minimizar el uso operativo de ciertos equipos debido a la falta de condiciones adecuadas de superficie, visibilidad, accesibilidad o riesgo eléctrico. Así mismo, la obra presentó un segundo tipo de imprevisto asociado a incrementos en cantidades reales ejecutadas, específicamente en un ítem inicialmente presupuestado en 432,72 m², el cual al momento de su ejecución alcanzó 598,00 m², generando 165,28 m² adicionales no previstos en el presupuesto original, con repercusión económica directa en el contrato.

El presente informe consolida y justifica exclusivamente los imprevistos ocurridos durante la ejecución del proyecto, detallando las afectaciones generadas por las lluvias y por el incremento no previsto en las cantidades de obra. Estos sucesos impactaron directamente la continuidad operacional, los rendimientos esperados y los costos asociados a procesos constructivos sensibles a condiciones climáticas o variaciones de volumen. En consecuencia, se expone de manera técnica y verificable cómo dichos eventos obligaron a emplear los recursos del rubro de imprevistos, conforme a su naturaleza contractual, para cubrir los mayores costos derivados de tiempos improductivos, reprogramaciones operativas, interrupciones por seguridad y ejecución de cantidades adicionales no contempladas en el presupuesto original. Este análisis permite sustentar la correcta aplicación de los recursos destinados a imprevistos, asegurando transparencia y coherencia técnica en el desarrollo del proyecto.

JUSTIFICACION

La presente justificación se formula con el propósito de sustentar técnicamente las causas que originaron el uso del rubro de imprevistos durante la ejecución del proyecto de Adecuación Menor de la Infraestructura Física de la E.S.E. Hospital Especial de Cubará. Dichos imprevistos se derivaron de dos factores principales: las afectaciones climáticas por lluvias y el incremento real de cantidades en uno de los ítems de obra, ambos no previstos en la programación inicial ni en el presupuesto contractual.

En primer lugar, las precipitaciones registradas entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre de 2025 generaron interrupciones y disminución en los rendimientos de actividades que requieren condiciones ambientales secas, tales como lavado de fachada con hidrolavadora, limpieza y mantenimiento de cubiertas, instalación de teja termoacústica, aplicación de estuco y esmaltes, trabajos de soldadura y mantenimiento de cerramientos metálicos. Estas labores, al verse afectadas por humedad superficial, baja adherencia, riesgo eléctrico o reducción de visibilidad y seguridad, obligaron a detener total o parcialmente los frentes de trabajo, generando tiempos improductivos, reprogramaciones operativas y disminución en los índices de productividad del personal y los equipos.

Adicionalmente, durante la ejecución se evidenció un incremento en la cantidad real de obra correspondiente a un ítem presupuestado inicialmente en 432,72 m², el cual alcanzó una ejecución de 598,00 m², generando 165,28 m² adicionales con un valor unitario de \$10.307,86, lo que representa un mayor costo no contemplado en la planeación original. Este aumento responde a ajustes técnicos necesarios en sitio, orientados a garantizar la funcionalidad, continuidad y correcta terminación de las áreas intervenidas del hospital.

Ambos factores —las lluvias y el incremento de cantidades— configuran imprevistos conforme a la normatividad de contratación estatal, al tratarse de eventos ajenos a la voluntad del contratista y no previstos en la planeación ni en los estudios previos. El uso de los recursos de imprevistos se encuentra plenamente justificado en tanto permitió cubrir los mayores costos derivados de la afectación climática, la ralentización de actividades, la necesidad de adecuar tiempos y equipos, y la ejecución de metrajes adicionales requeridos para cumplir adecuadamente con el objeto del contrato.

En consecuencia, el uso del rubro de imprevistos responde a la necesidad de garantizar la continuidad del proyecto, la estabilidad técnica de las intervenciones y la correcta prestación de los servicios en la infraestructura hospitalaria intervenida.



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

TIPOS DE IMPREVISTOS

IMPREVISTO CLIMATICO- (EVENTOS DE LLUVIAS)

Las lluvias registradas entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre de 2025 constituyen imprevistos climatológicos que generan afectaciones directas sobre actividades que requieren condiciones ambientales secas para garantizar su correcta adherencia, calidad y seguridad operacional. Entre las actividades sensibles a estas condiciones se encuentran:

- Lavado de fachada con hidrolavadora.
- Desmonte e instalación de cubiertas.
- Limpieza y mantenimiento de domos y viga canal.
- Aplicación de estuco y pañete liso.
- Aplicación de esmaltes en carpintería metálica y madera.
- Trabajos con equipos eléctricos y neumáticos (hidrolavadora, compresor, soldadura).

La presencia de humedad en superficie y ambiente reduce la capacidad de ejecución continua, exige pausas operativas por seguridad eléctrica y en alturas, impide la correcta aplicación de acabados y disminuye los rendimientos esperados.

Asimismo, actividades como instalación de teja termoacústica, lavado de fachada y trabajos de cerramiento metálico presentan restricciones operativas durante precipitaciones, lo que conduce a tiempos improductivos y reprogramación de frentes de trabajo.

Estos eventos climatológicos configuran imprevistos porque no pueden ser anticipados en su intensidad ni duración y alteran las condiciones normales previstas para el desarrollo seguro y eficiente de las actividades del proyecto.

Imprevistos Técnicos por Incremento de Cantidades Ejecutadas

Durante la ejecución se verificó que un ítem proyectado inicialmente para 432,72 m² presentó una cantidad real de 598,00 m², lo que representa un incremento de 165,28 m² adicionales. Este tipo de imprevisto obedece a factores técnicos detectados en campo, tales como:

- Diferencias entre condiciones reales y las previstas en estudios iniciales.
- Necesidad de ampliar el área de intervención para garantizar continuidad, nivelación o uniformidad en acabados, ya que dentro de lo contratado no se había tenido cuenta la instalación de pintura en baños y closeth de habitaciones

Cuando se identifican estas variaciones durante el proceso constructivo, la ejecución debe ajustarse para garantizar la estabilidad técnica, la calidad final y la operatividad del área hospitalaria intervenida, lo cual implica consumo adicional de materiales, recursos y tiempos que no estaban contemplados en la programación inicial.

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

13/11/2025



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

COSTOS DE IMPREVISTOS

PRESUPUESTO DE IMPREVISTOS- MOTIVOS DE LLUVIAS						
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD DE PERSONAL	HORA HOMBRE	VALOR TOTAL	TOTAL
1	12 AYUDANTES	HORA	12	19	\$ 7,983.13	\$ 1,820,152.50
2	MAESTRO	HORA	1	19	\$ 14,927.38	\$ 283,620.13
3	1 OFICIAL	HORA	1	19	\$ 10,721.00	\$ 203,699.00
4	COMPRESOR	HORA	1	13	\$ 11,349.00	\$ 147,537.00
5	EQUIPO DE SOLDADURA	HORA	1	13	\$ 15,532.00	\$ 201,916.00
6	PULIDORA	HORA	1	13	\$ 4,666.63	\$ 60,666.13
7	HIDROLAVADORA	HORA	1	14	\$ 4,000.00	\$ 56,000.00
						\$ 2,773,590.75

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD DE PERSONAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	165.28	\$ 10,307.86	\$ 1,703,683.10
					\$ 1,703,683.10

CUADRO RESUMEN DE IMPREVISTOS	
PRESUPUESTO DE IMPREVISTOS- MOTIVOS DE LLUVIAS	\$ 2,773,590.75
VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	\$ 1,703,683.10
TOTAL DE IMPREVISTOS PRIMER PERIODO	\$ 4,477,273.85

Valor total de imprevistos en el presente mes de cuatro millones cuatrocientos setenta y siete mil doscientos setenta y tres pesos con ochenta y cinco centavos

COSTOS TOTALES DE LA OBRA	
COSTO INDIRECTO	\$ 474,447,636.00
ADMINISTRACION	\$ 118,611,909.00
IMPREVISTOS	\$ 9,488,953.00
UTILIDAD	\$ 14,233,429.00
TOTAL DE LA OBRA	\$ 616,781,927.00

El contrato contempla un rubro de imprevistos equivalente al 2 % de la base de cálculo de los costos indirectos, por un valor de \$9.488.953,00, incluido dentro del valor total de la obra de \$616.781.927,00.

3183616384 / 3106716171
 Durante el periodo evaluado, los imprevistos asociados a:
 construinducivil@gmail.com
 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyocá)



tiempos improductivos por lluvias (personal y equipos), y

mayor cantidad ejecutada del ítem "Vinilo Tipo I sobre pañete tres manos sobre estuco".

generaron un valor ejecutado de \$4.477.273,85, que corresponde aproximadamente al 47,18 % del rubro de imprevistos contratado.

Con corte al presente informe, el valor reconocido financieramente por concepto de imprevistos asciende a \$4.155.121,00, equivalente al 43,79 % del rubro de imprevistos.

De esta forma, el saldo disponible del rubro de imprevistos es de \$5.011.679,15, correspondiente al 52,82 % del valor contratado para imprevistos, manteniéndose dentro del límite del 2 % definido contractualmente.

El corte financiero reconoce por imprevistos un valor de:

Imprevistos reconocidos: \$ 4.155.121,00

Esto equivale a: 43,79 % del rubro total de imprevistos (2 %).

El saldo pendiente por ejecutar en el rubro, con base en los valores contratados y ejecutados, es:

Saldo del rubro: \$5.011.679,15

Este valor representa: 52.82 % del total contratado para imprevistos (2 %).

Concepto	Valor	% del rubro de imprevistos (2 %)
Imprevistos contratados	\$9.488.953,00	100 %
Imprevistos ejecutados	\$4.477.273,85	47,18 %
Imprevistos reconocidos	\$4.155.121,00	43,79 %
Saldo disponible	\$5.011.679,15	52,82 %

DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y JUSTIFICADA DE LOS IMPREVISTOS

Imprevistos por Lluvias – Mano de Obra y Equipos

Durante el periodo comprendido entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre de 2025, se presentaron lluvias de distintas intensidades que afectaron directamente la continuidad de actividades como lavado de fachada, intervención de cubiertas, mantenimiento de viga canal, soldadura, aplicación de estuco y esmalte, instalación de teja termoacústica y labores en alturas. Estas actividades requieren estrictamente superficies secas, estabilidad climática y condiciones operativas seguras, especialmente al emplear equipos eléctricos y neumáticos.

Como consecuencia, se generaron tiempos improductivos, disminución en rendimientos y obligación de mantener al personal y equipos disponibles en obra a pesar de la restricción para trabajar bajo lluvia. Esto constituye un imprevisto climatológico plenamente justificable, documentado en el registro de lluvias y uso de equipos en días húmedos.

A continuación, se desglosa el gasto justificado por cada componente:

MANO DE OBRA

Ayudantes

Los ayudantes asignados a lavado de fachada, apoyo en cubiertas, asistencia a oficiales y actividades de aseo y preparación de área, permanecieron en obra durante los días de lluvia sin posibilidad de avanzar en las tareas asignadas.

El tiempo improductivo y la disponibilidad obligatoria justifican el valor registrado.

Maestros

Los maestros, encargados de supervisión, control de frentes de trabajo y apoyo técnico, no pudieron desarrollar actividades de dirección operativa durante los periodos de lluvia.

Su presencia se mantuvo debido a posibles ventanas cortas de trabajo y decisiones de reprogramación inmediata.

Oficial

El oficial, asignado a actividades de estuco, desmontes y apoyo especializado, tuvo restricciones operativas por humedad en superficie y riesgo eléctrico, generando tiempo no productivo.

EQUIPOS

Compresor

Equipo indispensable para labores de mantenimiento metálico, limpieza por aire y apoyo a soldadura. No puede operar bajo lluvia por riesgo eléctrico y pérdida de eficiencia. El costo corresponde a disponibilidad del equipo en obra durante los días afectados.

Equipo de soldadura

La soldadura está totalmente restringida bajo condiciones húmedas por riesgo eléctrico y afectación en la calidad de cordones. Aunque no operó continuamente, estuvo movilizado y disponible en los frentes previstos.

Pulidora

Equipo utilizado para cortes y ajustes metálicos (cerramiento frontal). No puede emplearse bajo lluvia, pero permaneció disponible en obra según programación establecida.

Hidro lavadora

programada para lavado de vigas canales los días 27, 29, 30 de octubre y 4, 5, 8 y 10 de noviembre.

El trabajo se vio restringido por lluvias, generando tiempos improductivos del equipo.

Durante la ejecución se evidenció un incremento real de 165,28 m² en el ítem:

"Vinilo Tipo I sobre pañete tres manos sobre estuco".

Este aumento responde a ajustes técnicos en campo que exigieron ampliar el área prevista para garantizar continuidad en acabados, uniformidad en muros y cumplimiento de los requisitos de terminación en el área hospitalaria intervenida.

Costo unitario: \$10.307,86 / m²

Cantidad adicional: 165,28 m²

Valor total: \$ 1.703.683,10

Este imprevisto corresponde a mayor cantidad de obra no prevista en la planeación original pero necesaria para garantizar funcionalidad y calidad en los acabados del proyecto.



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

Registro fotográfico imprevistos por lluvias



☎ 3183616384 / 3106716171
✉ construinducivil@gmail.com
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

NIT 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



☎ 3183616384 / 3106716171
✉ construinducivil@gmail.com
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

CONCLUSIONES

- Los eventos de lluvia ocurridos entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre de 2025 constituyeron imprevistos climatológicos que modificaron las condiciones normales de ejecución, afectando actividades que requieren ambiente seco como lavado de fachada, aplicación de estuco y pintura, instalación de teja termoacústica y trabajos con equipos eléctricos y neumáticos.
- Las condiciones de humedad obligaron a realizar pausas operativas por seguridad, reduciendo los rendimientos programados y generando tiempos improductivos tanto del personal como de los equipos asignados a los frentes de trabajo.
- Equipos como hidrolavadora, compresor, pulidora y equipos de soldadura presentaron restricciones técnicas por humedad y riesgo eléctrico, lo que impidió su operación continua, aunque debieron permanecer disponibles en obra conforme a la programación.
- Se presentó un imprevisto técnico consistente en un incremento real de 165,28 m² sobre el ítem de vinilo Tipo I sobre pañete tres manos, respecto a los 432,72 m² inicialmente presupuestados, siendo necesario para garantizar uniformidad y correcta terminación de las superficies intervenidas en el área hospitalaria.
- La mayor cantidad ejecutada fue indispensable para cumplir con los criterios técnicos, los requerimientos de acabado y la funcionalidad del espacio intervenido, razón por la cual su reconocimiento se considera procedente.
- El valor total ejecutado en imprevistos durante el periodo asciende a \$4.477.273,85, resultado de los tiempos improductivos por lluvias y de las cantidades adicionales requeridas para cumplir con los estándares técnicos del proyecto.
- El valor financiero reconocido en el corte correspondiente fue de \$4.155.121,00, generando una diferencia de \$322.152,85, correspondiente a mayor consumo operativo no previsto inicialmente.
- El contrato dispone de un rubro de imprevistos equivalente al 2 %, por un total de \$9.488.953,00, de los cuales los imprevistos ejecutados representan el 47,18 %, mientras que el valor reconocido equivale al 43,79 %.
- El saldo disponible en el rubro de imprevistos es de \$5.011.679,15, correspondiente al 52,82 %, garantizando la capacidad financiera para atender imprevistos adicionales que se presenten en el desarrollo del contrato.
- La documentación técnica recopilada evidencia que los imprevistos fueron ajenos a la planeación inicial, afectaron las condiciones operativas reales del proyecto y se enmarcan dentro de los eventos susceptibles de cobertura mediante el rubro de imprevistos.



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

- La aplicación del rubro de imprevistos permitió mantener la continuidad de las actividades, asegurar la calidad de los procesos constructivos y cumplir con los estándares técnicos requeridos para Infraestructura hospitalaria, mitigando los efectos de la variabilidad climática y compensando la mayor cantidad ejecutada.

Vianney Karina Buitrago
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA

☎ 3183616384 / 3106716171
✉ construinducivil@gmail.com
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jordán (Cubará-Boyacá)

4/2024

ANEXO 13. CONTRATOS DEL PERSONAL CONTRATADO POR PRESTACION DE SERVICIO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Nombre del empleador:	CONSTRUINDUCIVIL SAS
Representante legal:	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA
Nombre del empleado(a):	ADRIANA MARCELA MENDOZA NIÑO
Identificado con cédula N°:	1.094.282.780
Cargo por desempeñar:	TECNOLOGO EN AREAS DE INGENIERIA
valor salario:	Dos millones cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos con cincuenta y cuatro centavos (\$ 2.047.440,54)

Entre el empleador y trabajador(a), ambos mayores de edad, se suscribe **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**, regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Lugar. El trabajador(a) desarrollará sus funciones en la dependencia o ubicación del HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ E.S.E.

SEGUNDA: Funciones. El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse como ayudante de obra, ejecutando labores como:

- Apoyar técnicamente la ejecución diaria de las actividades de obra conforme a planos, especificaciones y procedimientos aprobados.
- Realizar controles de calidad en materiales, procesos constructivos y cumplimiento de normas técnicas aplicables.
- Elaborar registros diarios, informes técnicos, bitácoras y registro fotográfico del avance físico de la obra.
- Ejecutar mediciones y control de cantidades en campo, verificando coherencia entre lo programado y lo ejecutado.
- Apoyar la verificación del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás requisitos normativos.

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

TERCERA: Elementos de trabajo. Corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios para el normal desempeño de las funciones del cargo contratado.

CUARTA: Obligaciones del contratado. El trabajador(a) por su parte, prestará su fuerza laboral con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente sus funciones ya especificadas en el contrato, cumpliendo las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, al igual que no laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oficio, mientras esté vigente este contrato.

El contratado se obliga a no divulgar a terceras partes, la información que reciba por parte de la empresa **CONSTRUINDUCIVIL SAS.**

El contratado se obliga a mantener en confidencialidad cualquier información, técnica, administrativa y demás que le sea suministrada y sea íntimo de la empresa **CONSTRUINDUCIVIL SAS.**

QUINTA: Término del contrato. El presente contrato tendrá una duración de **término indefinido**, pero podrá darse por terminado por cualquiera de las partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto.

SEPTIMA: Justas causas para despedir: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato por cualquiera de las partes, el incumplimiento a las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del Código sustantivo del Trabajo. Además del incumplimiento o violación a sus funciones ya estipuladas dentro del contrato.

OCTAVA: Salario. El empleador cancelará al trabajador(a) de forma mensual y tendrá cinco días hábiles para el respectivo pago el valor de Dos millones cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos con cincuenta y cuatro centavos (\$ 2.047.440,54)

NOVENA: Afiliación y pago de seguridad social. Es obligación del trabajador presentar las afiliaciones a la seguridad social como es salud, pensión y riesgos laborales, y presentar en el momento que el contratista le solicite el pago de seguridad social.

DECIMA: Modificaciones. Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento.

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubaró-Boyacá)

2021
10/10/2021



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

DECIMA PRIMERA: Efectos. El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.

DECIMA SEGUNDA: Dedicación. El contratista dedicará el 25% de su tiempo laboral habitual a la prestación de los servicios descritos en este contrato, según se acuerde entre las partes.

Se firma por las partes en el municipio de Cubará - Boyacá, el día dieciséis (16) del mes de octubre de 2025.

Xiomara Manrique
CONSTRUINDUCIVIL SAS

R/L.GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA.

NIL901.375.684-5

Adriana Mendoza
ADRIANA MARCELA MENDOZA NIÑO

TECNOLOGO EN AREAS DE INGENIERIA

CC. 1.094.282.780

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

1002

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094282780			ADRIANA MARCELA MENDOZA NIÑO		INDEPENDIENTE	Principal	Calle 4 #03-16	CUBARA-BOYACA	3118194392	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave			Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	93980613		9492574491	I	2025/11/21	2025/10/22	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
Ciudad: CUBARA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
1	CC 1094282780	MENDOZA ADRIANA	210301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094282780		ADRIANA MARCELA MENDOZA NIÑO	INDEPENDIENTE	Principal	Calles 4 #03-15	CUBARA-BOYACA	3138194392	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	93980613	9492574491	1	2025/11/21	2025/10/22	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ADRIANA MARCELA MENDOZA NIÑO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1094282780, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 121037-0700540 NTS desde el 11 de Enero de 2024, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2024000521.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de Diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.094.282.780

MENDOZA NIÑO

APELLIDOS

ADRIANA MARCELA

NOMBRES

Adriana Mendoza

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

CUBARA
(BOYACA)

18-SEP-1998

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

25-NOV-2016 PAMPLONA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-2506400-00872991-F-1094282780-20161222

0052780739A 1

46881226

ANEXO 14. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OFICINA

CONTRATANTE:	CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA
CONTRATISTA:	LUIS BARRERA SEDANO
CEDULA DE CIUDADANIA:	13.252.931 CUCUTA N.S
DIRECCIÓN:	CUBARA (BOYACÁ).
OBJETO:	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
VALOR DEL CONTRATO:	UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 1.700.000,00)
FECHA DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO:	DOS (02) MESES

Entre los suscritos **GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA**, mayor de edad, domiciliado en Cubará Boyaca, quien actúa en calidad de Representante Legal de CONSTRUINDUCIVIL SAS, quien para efectos de este contrato se denominará **CONTRATANTE**, de una parte, y de la otra el señor **LUIS BARRERA SEDANO**, mayor de edad, quien para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha celebrado el siguiente contrato de arrendamiento:

PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga para con **EL CONTRATANTE** a prestar el servicio de arrendamiento de una oficina ubicada en el barrio el comercio, Cubará-Boyacá, PARA EL CONTRATO DE OBRA No 361 DE 2025, cuyo Objeto es "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ". Los términos descritos sólo podrán ser modificados mediante convenio escrito celebrado entre **EL CONTRATISTA** y **EL CONTRATANTE**.

SEGUNDA: PLAZO. EL CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios, durante el periodo de ejecución del Contrato el cual está establecido a término de obra.

TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato de prestación de servicios es de: **UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 1.700.000,00).** **SUPERVISIÓN:** El **CONTRATANTE** o su representante supervisarán las condiciones óptimas de las instalaciones de la oficina y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El **CONTRATISTA**.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Es obligación de **EL CONTRATISTA:** entregar un sitio adecuado para oficina con derecho a servicios públicos, que satisfagan las necesidades requeridas por el contratante, prestar servicio de soporte técnico compute, dotar de una oficina en excelentes condiciones con los servicios básicos necesarios.

QUINTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE. Son obligaciones de **EL CONTRATANTE:** dar buen uso de la oficina, informar a tiempo de alguna avería o daño presentado, mantener la oficina en perfectas condiciones.

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

SEXTA: IMPUESTOS. Cualquier impuesto, tasa o gravamen que pudiera afectar el costo estipulado en este contrato será a cargo de **EL CONTRATISTA**.

SÉPTIMA: CLAUSULA COMPROMISORIA. Ambas partes acuerdan que todas las diferencias que ocurran entre ellas con ocasión de la celebración, interpretación, ejecución, liquidación o terminación de este contrato y que no hayan sido resueltas entre ellas mismas, serán resueltas por un Tribunal de Arbitramento domiciliado en Cubara y conformado por un (1) árbitro nombrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio del piedemonte araucano. El árbitro designado será un abogado inscrito, fallará en derecho y se regirá y someterá a las leyes colombianas.

OCTAVA. - CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.


NOVENA. - TERMINACIÓN. El presente contrato terminara por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Para constancia se firma en cubara, a los quince (15) días del mes de octubre de 2025.


Sin otro en particular.

Xiomara Manrique B
CONSTRUINDUCIVIL SAS
R/L GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

Luis Barrera
LUIS BARRERA
C.C. 13.252.931 de Cubará Boyacá

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CECULA DE CIUDADANIA
 NÚMERO **13.252.931**
BARRERA SEDANO
 APELLIDOS
 MNS




 FECHA DE NACIMIENTO **19-MAR-1954**
BOLIVAR
 (SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 **A+** **M**
 ESTATURA G.B. PH SEXO
19-JUN-1978 CUCUTA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 INDICE DERECHO

 A-0705900-35153953-M-0015252991-20080114 03830-08014A D2 210703701

ANEXO 15. CONTRATO DE ALQUILER DE COMPUTO, PAPELERIA

CONTRATANTE: CONSTRUINDUCIVIL SAS
R/L GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

CONTRATISTA: **XAVIER ALEJANDRO MORA**

CEDULA DE CIUDADANIA: 1.094.271.327

DIRECCIÓN: CUBARA (BOYACÁ).

OBJETO: ALQUILER DE EQUIPOS COMPUTO

VALOR DEL CONTRATO: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 3.000.000,00)

FECHA DE INICIO: 15 DE OCTUBRE DE 2024

PLAZO: DOS (02) MESES

Entre los suscritos **GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA**, mayor de edad, domiciliado en Cubará Boyaca, quien actúa en calidad de Representante Legal de CONSTRUINDUCIVIL SAS, quien para efectos de este contrato se denominará **CONTRATANTE**, de una parte, y de la otra el señor **XAVIER ALEJANDRO MORA**, mayor de edad, quien para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha celebrado el siguiente contrato de arrendamiento:

PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga para con **EL CONTRATANTE** a prestar el servicio de alquiler de equipos computos, PARA EL CONTRATO DE OBRA No.361 DE 2025, cuyo Objeto es "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ". Los términos descritos sólo podrán ser modificados mediante convenio escrito celebrado entre **EL CONTRATISTA** y **EL CONTRATANTE**.

SEGUNDA: PLAZO. EL CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios, durante el periodo de ejecución del Contrato el cual está establecido a término de obra.

TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato de prestación de servicios es de: **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 3.000.000,00).** **SUPERVISIÓN:** **EL CONTRATANTE** o su representante supervisarán las condiciones óptimas de las instalaciones de la oficina y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con **EL CONTRATISTA**.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Es obligación de **EL CONTRATISTA:** suministrar 3 equipos computo que satisfagan las necesidades requeridas por el contratante, prestar servicio de soporte técnico computo, dotar de una oficina en excelentes condiciones con los servicios básicos necesarios.

QUINTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE. Son obligaciones de **EL CONTRATANTE:** dar buen uso de la oficina, informar a tiempo de alguna averia o daño presentado, mantener la oficina en perfectas condiciones.



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

SEXTA: IMPUESTOS. Cualquier impuesto, tasa o gravamen que pudiera afectar el costo estipulado en este contrato será a cargo de **EL CONTRATISTA**.

SÉPTIMA: CLAUSULA COMPROMISORIA. Ambas partes acuerdan que todas las diferencias que ocurran entre ellas con ocasión de la celebración, interpretación, ejecución, liquidación o terminación de este contrato y que no hayan sido resueltas entre ellas mismas, serán resueltas por un Tribunal de Arbitramento domiciliado en Cubara y conformado por un (1) árbitro nombrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio del piedemonte araucano. El árbitro designado será un abogado inscrito, fallará en derecho y se regirá y someterá a las leyes colombianas.

OCTAVA. - CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

NOVENA. - TERMINACIÓN. El presente contrato terminara por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Para constancia se firma en cubara, a los quince (15) días del mes de octubre de 2025.

Sin otro en particular.

XIOMARA MANRIQUE B
CONSTRUINDUCIVIL SAS
R/L GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA


XAVIER ALEJANDRO MORA
C.C. 1.094.271.327 de Cubará Boyacá

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.004.271.007
MORA BUITRAGO
APELLIDOS
XAVIER ALEJANDRO






FECHA DE NACIMIENTO 10-AGO-1993
CUBARA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 **A+** **M**
ESTATURA **G.S. RH** **SEXO**

24-AGO-2011 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ALBERTO MORALES TORRES

INDICE DE PIEDAD



P-2506400-00342790-M-1094271927-20111019 0028335607A 1 57285185

ANEXO 16. CONTRATO DE ALQUILER DE BODEGA

CONTRATANTE: CONSTRUINDUCIVIL SAS
R/L GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA
CONTRATISTA: **DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO**
CEDULA DE CIUDADANÍA: 1.094.266.057
DIRECCIÓN: CUBARA (BOYACÁ).
OBJETO: ARRENDAMIENTO DE BODEGA
VALOR DEL CONTRATO: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 3.000.000,00)
FECHA DE INICIO: 15 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO: DOS (02) MESES

Entre los suscritos **GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA**, mayor de edad, domiciliado en Cubará Boyaca, quien actúa en calidad de Representante Legal de CONSTRUINDUCIVIL SAS, quien para efectos de este contrato se denominará **CONTRATANTE**, de una parte, y de la otra el señor **DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO**, mayor de edad, quien para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha celebrado el siguiente contrato de arrendamiento:

PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga para con **EL CONTRATANTE** a prestar el servicio de arrendamiento de una bodega ubicada en el barrio san rafael, Cubará-Boyacá, PARA EL CONTRATO DE OBRA No.361 DE 2025, cuyo Objeto es "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ". Los términos descritos sólo podrán ser modificados mediante convenio escrito celebrado entre **EL CONTRATISTA** y **EL CONTRATANTE**.

SEGUNDA: PLAZO. EL CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios, durante el periodo de ejecución del Contrato el cual está establecido a término de obra.

TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato de prestación de servicios es de: **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 3.000.000,00).** **SUPERVISIÓN:** El **CONTRATANTE** o su representante supervisarán las condiciones óptimas de las instalaciones de la oficina y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El **CONTRATISTA**.

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Es obligación de **EL CONTRATISTA:** suministrar 3 equipos compute que satisfagan las necesidades requeridas por el contratante, prestar servicio de soporte técnico compute, dotar de una oficina en excelentes condiciones con los servicios básicos necesarios.

QUINTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE. Son obligaciones de **EL CONTRATANTE:** dar buen uso de la oficina, informar a tiempo de alguna avería o daño presentado, mantener la oficina en perfectas condiciones.



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

SEXTA: IMPUESTOS. Cualquier impuesto, tasa o gravamen que pudiera afectar el costo estipulado en este contrato será a cargo de **EL CONTRATISTA**.

SÉPTIMA: CLAUSULA COMPROMISORIA. Ambas partes acuerdan que todas las diferencias que ocurran entre ellas con ocasión de la celebración, interpretación, ejecución, liquidación o terminación de este contrato y que no hayan sido resueltas entre ellas mismas, serán resueltas por un Tribunal de Arbitramento domiciliado en Cubara y conformado por un (1) árbitro nombrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio del piedemonte araucano. El árbitro designado será un abogado inscrito, fallará en derecho y se regirá y someterá a las leyes colombianas.

OCTAVA. - CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

NOVENA. - TERMINACIÓN. El presente contrato terminara por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Para constancia se firma en cubara, a los quince (15) días del mes de octubre de 2025.
Sin otro en particular.

XIOMARA MANRIQUE B
CONSTRUINDUCIVIL SAS
R/L GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA


DIANA CAROLINA BARRERA
C.C. 1.094.266.057

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construiinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.094.266.057

BARRERA CAMARGO

APELLIDOS

DIANA CAROLINA

NOMBRES

Diana C. Barrera C.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-ENE-1991

CUBARA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

18-FEB-2009 PAMPLONA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2506400-00155164 F-1094266057-20090424

0011046953A 1

27331204



EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ANEXO 17. FACTURA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA

 3183616384 / 3106716171
 construinducivil@gmail.com
 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)





CONSTRUINDUCIVIL SAS
NIT 901.375.684-5
CR 3 7A 67 BRR JARDIN
Tel: 3183616384
Cubará - Colombia
construinducivil@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FECO 32

Señores	ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA		
NIT	826.002.304-1	Teléfono	(608) 3106152106 - Ext. 000
Dirección	CLL 3#5-47	Ciudad	Cubará - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2025, 17:51
Expedición	10/12/2025, 17:51
Vencimiento	10/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PARCIAL 1 CONTRATO DE OBRA 361-2025	1.00	0 %	0.00	207,756,055.00
2	ADMINISTRACION 25%	1.00	0 %	0.00	51,939,014.00
3	IMPREVISTOS 2%	1.00	0 %	0.00	4,155,121.00
4	UTILIDAD 3%	1.00	19 %	995,134.10	6,232,682.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Doscientos setenta millones ochenta y dos mil ochocientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 270,082,872.00

Observaciones:
"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ" CONTRATO N° 361-2025

Total Bruto	269,087,737.90
IVA 19%	995,134.10
Total a Pagar	270,082,872.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764091283806 aprobado en 20250330 prefijo FECO desde el número 27 al 100 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: 33f67a9f1c3bb7e7f3ddc20b5e8c5fad9224536a68e399367cf947904b27637a6c14dd3ba3aee08433f53e8d44c19e9b

Arauca, 17 de octubre de 2024

Certificación

BANCOLOMBIA S.A., se permite informar que: **CONSTRUINDUCIVIL SAS** identificado (a) con NIT Nro. **901375684** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos

Producto	No. Producto	Fecha de Apertura AAAA/MM/DD	Estado
Cuenta Ahorros	31773531628	2024/10/17	Activa

Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números 607-8853325 Ext. 192 de Arauca o en nuestra sucursal ARAUCA 317.

Atentamente,


Asesor de servicios N° 156
Cédula N° 20312916

LUIS ERNESTO SOTO CONTRERAS.
Asesor Comercial Móvil
