



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA No 02



FRASCING S.A.S

CONTRATO DE CONSULTARÍA NO. 469-2025

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL MARCO DE LA
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002-2025, CUYO OBJETO ES LA
ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E.
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**

CUBARÁ - BOYACÁ 2025



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

INFORME FINAL No 02 DE INTERVENTORÍA

PERIODO DEL INFORME: 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025



CONTRATO DE OBRA No. 361-2025

FRASCING S.A.S

CONTRATISTA: CONSTRUINDUCIVIL SAS

NIT No. 901.375.684-5

R/L: XIOMARA MANRIQUE

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

CONTRATO DE CONSULTARÍA No. 469-2025

CONTRATISTA: FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT No. 901.629.231-4

R/L: FANNY KATHERIN BARRERA CORREA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002-2025, CUYO OBJETO ES LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ.

FRASCING S.A.S

SUPERVISOR:

MARLENY APONTE TORRES

SUBGERENTE DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ.

CUBARÁ - BOYACÁ 2025



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	9
1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	10
1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	10
2. ALCANCE DEL PROYECTO.....	11
2.1. Localización del contrato de obra No. 361-2025.....	11
2.2. Alcance general de la obra.....	12
3. ACTOS ADMINISTRATIVOS.....	20
4. GARANTÍAS DEL CONTRATO.....	20
4.1. Pólizas de legalización.....	21
4.2. Antecedentes y aspectos administrativos del contrato.....	23
5. ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS	23
6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.....	24
7. CONTROL SOCIAL	25
8. VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES.....	26
8.1. Personal Administrativo.....	26
8.2. Personal operativo.....	27
8.3. Pagos salariales y liquidación del personal	30
9. BITÁCORA DIARIA DE OBRA.....	31
10. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	31
10.1. Señalización de la obra.....	31
10.2. Dotación del personal.....	32
10.3. Accidentalidad en la obra.....	34
11. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	34
12. ASPECTOS FINANCIEROS	37
12.1. Aspectos financieros	37
12.2. Modificaciones o adicionales al contrato.....	45



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



12.3.	Compensación de mayores y menores cantidades	45
12.4.	Avance físico de la obra	45
12.5.	Avance financiero de la obra.....	50
12.6.	Avance plazo contractual	58
13.	SITUACIONES ADVERSAS	59
14.	MATERIAL DE OBRA – BODEGA	60
15.	ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.....	61
1.	AREA EXTERIOR	61
2,00	CUBIERTAS Y DRENAJES.....	62
3,00	ADMINISTRACIÓN	68
4,00	ARCHIVO - ALMACEN	72
5,00	SALA DE AUTOPSIAS	83
6,00	HOSPITALIZACIÓN	85
7,00	PARTOS Y CIRUJIAS.....	91
8,00	URGENCIAS.....	92
9,00	CONSULTA EXTERNA	95
10,00	VACUNACIÓN	98
11,00	SALA DE RAYOS X	99
12,00	CITAS.....	100
13,00	COCINA Y LAVANDERIA	100
14,00	TERAPIA FISICA.....	101
15,00	PARQUEADERO AMBULANCIAS	103
16,00	AREA DE SECADO	106
16.	ASPECTOS FINANCIEROS	107
16.1.	Manejo del anticipo	107
17.	ASPECTOS AMBIENTALES	107
17.1.	Seguimiento a permisos y/o licencias ambientales.....	107
18.	ASPECTOS GENERALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA	107



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



18.1.	Alcance de la interventoría	107
18.2.	Interventoría técnica	108
18.3.	Interventoría administrativa	109
18.4.	Interventoría financiera	109
18.5.	Funciones de la interventoría.....	109
19.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	114
19.1.	Información general contrato de Interventoría.	114
20.	RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	115
20.1.	Pólizas legalización del contrato de Interventoría	115
21.	ACTOS ADMINISTRATIVOS.....	116
21.1.	Personal vinculado a la interventoría.....	117
21.2.	Equipos e implementos de oficina utilizados por la interventoría.	117
21.3.	Gastos operacionales	118
21.3.1.	Señalización de la Obra	118
21.3.2.	Alquiler de Oficina (incluye servicios básicos) Comisión topográfica.....	119
21.3.3.	Alquiler de equipos de cómputo, Papelería, insumos de oficina, etc.	119
22.	ASPECTOS TÉCNICOS	120
22.1.	Condiciones contractuales	120
22.2.	Balance financiero del contrato:	122
22.3.	Avance en tiempo:	123
	CONCLUSIONES.....	125
	ANEXOS.....	126



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



LISTA DE TABLAS

TABLA 1. PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE OBRA.....	12
TABLA 2. ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO DE OBRA NO. 361-2025	20
TABLA 3. GARANTÍAS CONTRACTUALES.	21
TABLA 4. ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS DE OBRA.....	24
TABLA 5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 361-2025.....	24
TABLA 6. PERSONAL ADMINISTRATIVO VINCULADO AL CONTRATO DE OBRA NO. 361-2025 EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2025 ..	26
TABLA 7. PERSONAL ADMINISTRATIVO VINCULADO AL CONTRATO DE OBRA NO. 361-2025 EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 202527	
TABLA 8. PERSONAL ADMINISTRATIVO VINCULADO AL CONTRATO DE OBRA NO. 361-2025 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	27
TABLA 9. PERSONAL OPERATIVO VINCULADO AL CONTRATO DE OBRA NO. 361-2025 EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	28
TABLA 10. PERSONAL OPERATIVO VINCULADO AL CONTRATO DE OBRA NO. 361-2025 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	29
TABLA 11. ELEMENTOS ENTREGADOS.....	33
TABLA 12. SEÑALIZACIÓN EN OBRA	34
TABLA 13. CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA N° 361-2025.....	37
TABLA 14. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 361-2025.....	45
TABLA 15. RELACIÓN AVANCE FINANCIERO.....	50
TABLA 16. COMPONENTES DEL PROYECTO.	108
TABLA 17. SUPERVISIÓN TÉCNICA.	109
TABLA 18. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA.....	111
TABLA 19. SUPERVISIÓN FINANCIERA.....	113
TABLA 20. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO.....	114
TABLA 21. PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTARÍA NO. 469-2025	115
TABLA 22. PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTARÍA NO. 469-2025	116
TABLA 23. PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE CONSULTARÍA NO. 469-2025	116
TABLA 24. RELACIÓN PERSONAL CONTRATO DE CONSULTARÍA NO. 469-2025	117
TABLA 25. CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	120
TABLA 26. BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE CONSULTARÍA NO. 469-2025.....	122



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



LISTA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1. UBICACIÓN DEL PROYECTO - GOOGLE EARTH	12
ILUSTRACIÓN 2. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	26
ILUSTRACIÓN 3. ANÁLISIS EJECUTADO VS PROGRAMADO	50
ILUSTRACIÓN 4. AVANCE FINANCIERO	57
ILUSTRACIÓN 5. AVANCE EN TIEMPO	58
ILUSTRACIÓN 6. RELACIÓN DE AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 361-2025	59
ILUSTRACIÓN 7. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN EL PERIODO	60
ILUSTRACIÓN 8. ACOPIO DE MATERIAL Y BODEGA DE OBRA	61
ILUSTRACIÓN 9. BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE CONSULTARÍA NO. 469-2025	123
ILUSTRACIÓN 10. AVANCE EN EL TIEMPO DE INTERVENTORÍA	124



FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



INTRODUCCIÓN

A continuación, el siguiente informe de interventoría en el cual se evidencia las actividades ejecutadas y cumplimiento de cada uno de los ítems pactados durante el desarrollo del contrato de obra No. 361-2025, festejado entre Hospital Especial de Cubará E.S.E y **CONSTRUINDUCIVIL SAS** representado legalmente por XIOMARA MANRIQUE, identificado con el NIT No. 901.375.684-5, cuyo objeto es “**ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**”, comprendidas entre el periodo del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2025, del mismo modo se presenta toda la documentación correspondiente de las actividades realizadas por la empresa **FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS R/L: FANNY KATHERIN BARRERA CORREA**, NIT No. 901.629.231-4, cómo interventoría externa durante el desarrollo del contrato de Consultoría No. 469-2025 que tiene por objeto “**ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**”.

Así mismo se interviene activamente durante el desarrollo de las actividades del proyecto, evidenciando los aspectos administrativos, técnicos y financieros, diariamente ejecutados por el personal profesional encargado de obra, de esta manera se garantiza el cumplimiento de la correcta ejecución de los diferentes aspectos y el buen manejo de los recursos destinados al contrato de obra.

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA
CONTRATO No:	361-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ
CONTRATISTA:	CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L: XIOMARA MANRIQUE
NIT. No:	901.375.684-5
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$616.781.927,00)
PLAZO CONTRACTUAL:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-0570 DEL 07 DE JULIO DEL 2025
FECHA INICIO:	16 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR EXTERNO:	FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS R/L: FANNY KATHERIN BARRERA CORREA NIT. 901.629.231-4
SUPERVISOR:	MARLENY APONTE TORRES SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ
PERIODO DEL INFORME	
FECHA INFORME:	16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




2. ALCANCE DEL PROYECTO

2.1. Localización del contrato de obra No. 361-2025

EL PROYECTO SE LOCALIZA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, ESPECÍFICAMENTE EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ UBICADO EN LA CALLE 3 No. 5-47 DEL BARRIO SAN RAFAEL.

CON LAS SIGUIENTES COORDENADAS: 7°00'03"N - 72°06'24"W

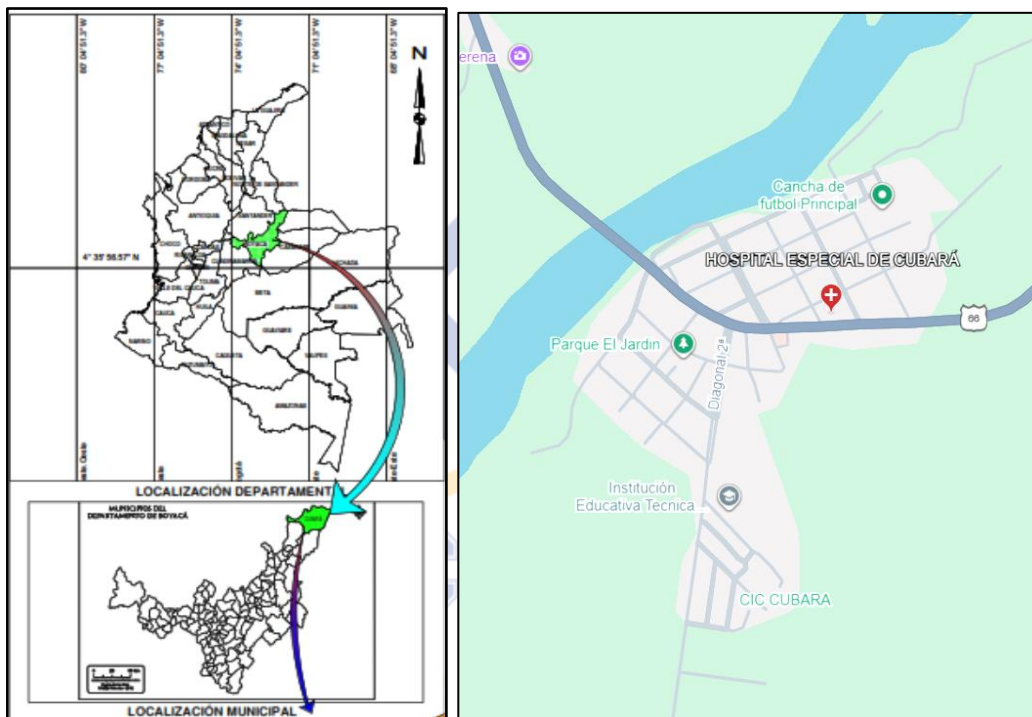

322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso

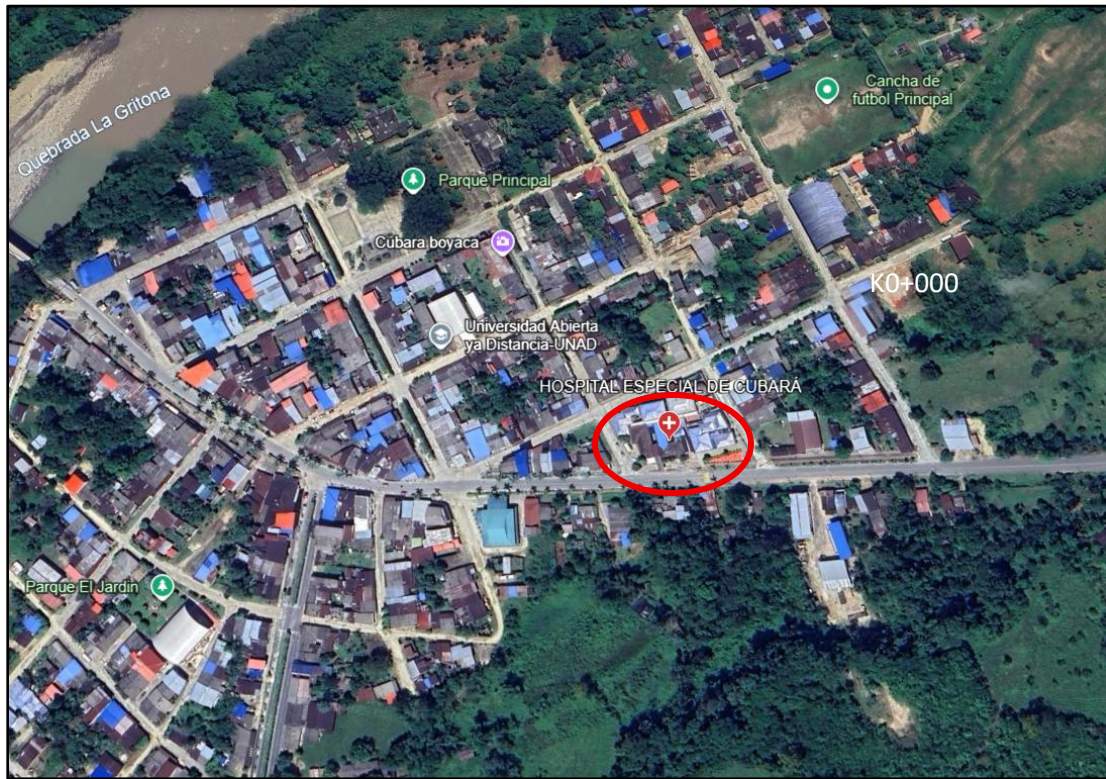


Ilustración 1. Ubicación del proyecto - Google Earth


2.2. Alcance general de la obra


Mediante el Contrato de Obra No. 361-2025 se proyecta realizar la Adecuación Menor de la Infraestructura Física de la E.S.E. Hospital Especial de Cubará, conforme a las especificaciones técnicas, las condiciones contractuales y los lineamientos establecidos por la entidad contratante. El objetivo principal es garantizar la ejecución de una obra de alta calidad que responda a las necesidades institucionales y contribuya al bienestar de la comunidad del sector.


Las actividades contractuales para dar cumplimiento con el alcance del proyecto mediante el contrato de obra No. 361-2025 son las siguientes.

Tabla 1. Presupuesto del contrato de Obra

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	AREA EXTERIOR				TIPO:	OBRA PÚBLICA
1,01	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	1855,92	4%	\$ 7.640,85	\$ 14.748.038,59

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



1,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	1855,92	4%	\$ 17.576,11	\$ 33.924.648,23
1,03	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA CUADRADA DE 1"	M2	146,54		\$ 109.655,00	\$ 16.068.843,70
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 64.741.530,52
A						\$ 16.185.382,63
I						\$ 1.294.830,61
U						\$ 1.942.245,92
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
2	CUBIERTAS Y DRENAJES				TIPO:	OBRA PÚBLICA
2,01	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)	M2	857,50		\$ 7.643,47	\$ 6.554.275,53
2,02	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO	M2	857,50		\$ 94.265,60	\$ 80.832.752,00
2,03	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	450,00	4%	\$ 11.929,22	\$ 5.582.874,96
2,04	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	683,50	4%	\$ 8.791,65	\$ 6.249.456,49
2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	1133,50		\$ 119.304,46	\$ 135.231.605,41
2,06	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	ML	235,75		\$ 99.176,65	\$ 23.380.895,24
2,07	DESMONTE CANALES - BAJANTES.	ML	9,60	4%	\$ 5.809,30	\$ 58.000,05
2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	9,60	4%	\$ 117.117,01	\$ 1.169.296,23
2,09	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO	M2	473,32		\$ 14.761,83	\$ 6.987.069,38
2,10	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	2661,42	4%	\$ 3.338,02	\$ 9.239.228,12
2,11	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	3058,75	4%	\$ 225,00	\$ 715.747,50
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 276.001.200,91
A						\$ 69.000.300,23



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
					I	\$ 5.520.024,02
					U	\$ 8.280.036,03
3					TIPO:	OBRA PÚBLICA
3,01	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	2,80	4%	\$ 10.155,28	\$ 29.572,18
3,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	37,58	4%	\$ 17.576,11	\$ 686.930,62
3,03	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	477,26	4%	\$ 10.307,86	\$ 5.116.310,43
3,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	40,13	4%	\$ 20.004,61	\$ 834.896,40
3,05	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	56,11	4%	\$ 14.773,22	\$ 862.082,39
3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UNIDAD	8,00		\$ 38.115,49	\$ 304.923,92
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 7.834.715,94
					A	\$ 1.958.678,99
					I	\$ 156.694,32
					U	\$ 235.041,48
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
4	ARCHIVO - ALMACEN				TIPO:	OBRA PÚBLICA
4,01	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	145,77	4%	\$ 11.929,22	\$ 1.808.479,30
4,02	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	4,53	4%	\$ 13.629,00	\$ 64.208,94
4,03	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO	M2	1,53	4%	\$ 33.374,71	\$ 53.105,84
4,04	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	32,34	4%	\$ 13.629,00	\$ 458.392,33
4,05	CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18	ML	138,60		\$ 49.390,38	\$ 6.845.506,67
4,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	145,77		\$ 119.304,46	\$ 17.391.011,13



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



4,07	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	ML	11,30		\$ 99.176,65	\$ 1.120.696,15
4,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	11,30	4%	\$ 117.117,01	\$ 1.376.359,10
4,09	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	32,00	4%	\$ 51.834,72	\$ 1.725.059,48
4,10	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	15,22	4%	\$ 238.795,70	\$ 3.779.849,38
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 18 (Incluye marco, bisagras y pintura)	M2	4,20		\$ 401.082,39	\$ 1.684.546,04
4,12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	29,90	4%	\$ 25.187,68	\$ 783.236,10
4,13	ESTUCO MUROS	M2	29,90	4%	\$ 10.155,28	\$ 315.788,59
4,14	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	113,70	4%	\$ 17.576,11	\$ 2.078.339,86
4,15	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	220,44	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.363.155,24
4,16	CIELO RASO EN PVC	M2	115,96		\$ 71.719,83	\$ 8.316.631,49
4,17	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	481,04	4%	\$ 225,00	\$ 112.563,36
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 50.276.929,00
A						\$ 12.569.232,25
I						\$ 1.005.538,58
U						\$ 1.508.307,87
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
5					TIPO:	OBRA PÚBLICA
5,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	128,20	4%	\$ 10.307,86	\$ 1.374.326,36
5,02	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	9,00	4%	\$ 20.004,61	\$ 187.243,15



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



5,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	49,50	4%	\$ 14.773,22	\$ 760.525,37
5,04	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	3,20	4%	\$ 10.155,28	\$ 33.796,77
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 2.355.891,65
A						\$ 588.972,91
I						\$ 47.117,83
U						\$ 70.676,75
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
6	HOSPITALIZACION				TIPO:	OBRA PÚBLICA
6,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	432,72	4%	\$ 10.307,86	\$ 4.638.833,87
6,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	156,52	4%	\$ 17.576,11	\$ 2.861.053,25
6,03	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	M2	213,35	4%	\$ 3.130,72	\$ 694.656,68
6,04	CIELO RASO EN PVC	M2	213,35		\$ 71.719,83	\$ 15.301.425,73
6,05	ESTUCO MUROS	M2	48,21	4%	\$ 10.155,28	\$ 509.169,49
6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UND	21,00		\$ 38.115,49	\$ 800.425,29
6,07	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	126,10	4%	\$ 14.773,22	\$ 1.937.419,16
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 26.742.983,47
A						\$ 6.685.745,87
I						\$ 534.859,67
U						\$ 802.289,50
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
7					TIPO:	OBRA PÚBLICA
7,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	119,09	4%	\$ 10.307,86	\$ 1.276.665,57
7,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	108,76	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.988.040,83
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 3.264.706,40



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
					A	\$ 816.176,60
					I	\$ 65.294,13
					U	\$ 97.941,19
8					TIPO:	OBRA PÚBLICA
8,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	488,08	4%	\$ 10.307,86	\$ 5.232.302,72
8,02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UNIDAD	1,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 1.579.534,48
8,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	6,00	4%	\$ 14.773,22	\$ 92.184,89
8,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	8,00	4%	\$ 20.004,61	\$ 166.438,36
8,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UNIDAD	5,00		\$ 38.115,49	\$ 190.577,45
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 7.261.037,90
					A	\$ 1.815.259,48
					I	\$ 145.220,76
					U	\$ 217.831,14
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
9					TIPO:	OBRA PÚBLICA
9,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	435,57	4%	\$ 10.307,86	\$ 4.669.386,36
9,02	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	METRO CUADRADO	19,74	4%	\$ 13.629,00	\$ 279.797,92
9,03	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UNIDAD	10,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 15.795.344,76
9,04	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	15,60	4%	\$ 14.773,22	\$ 239.680,72
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 20.984.209,76
					A	\$ 5.246.052,44
					I	\$ 419.684,20
					U	\$ 629.526,29
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
10					TIPO:	OBRA PÚBLICA



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



10,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	81,61	4%	\$ 10.307,86	\$ 874.873,43
10,02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UNIDAD	1,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 1.579.534,48
						COSTO DIRECTO GRUPO \$ 2.454.407,91
						A \$ 613.601,98
						I \$ 49.088,16
						U \$ 73.632,24
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
11					TIPO:	OBRA PÚBLICA
11,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	50,82	4%	\$ 10.307,86	\$ 544.799,26
						COSTO DIRECTO GRUPO \$ 544.799,26
						A \$ 136.199,82
						I \$ 10.895,99
						U \$ 16.343,98
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
12					TIPO:	OBRA PÚBLICA
12,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	33,55	4%	\$ 10.307,86	\$ 359.661,85
						COSTO DIRECTO GRUPO \$ 359.661,85
						A \$ 89.915,46
						I \$ 7.193,24
						U \$ 10.789,86
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
13					TIPO:	OBRA PÚBLICA
13,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	233,63	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.504.554,35
13,02	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	29,13	4%	\$ 10.155,28	\$ 307.656,24
						COSTO DIRECTO GRUPO \$ 2.812.210,59
						A \$ 703.052,65
						I \$ 56.244,21
						U \$ 84.366,32
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	
14						TIPO:	OBRA PÚBLICA
14,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	246,87	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.646.489,45	
14,02	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	10,80	4%	\$ 10.155,28	\$ 114.064,10	
14,03	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	58,31	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.065.857,49	
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 3.826.411,04	
A						\$ 956.602,76	
I						\$ 76.528,22	
U						\$ 114.792,33	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	
15						TIPO:	OBRA PÚBLICA
15,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	211,31	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.265.280,05	
15,02	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	19,70	4%	\$ 14.773,22	\$ 302.673,73	
15,03	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	45,90	4%	\$ 16.684,41	\$ 796.447,00	
15,04	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	12,50	4%	\$ 10.155,28	\$ 132.018,64	
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 3.496.419,42	
A						\$ 874.104,86	
I						\$ 69.928,39	
U						\$ 104.892,58	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	
16						TIPO:	OBRA PÚBLICA
16,01	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	78,11	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.427.784,75	
16,02	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	5,94	4%	\$ 10.155,28	\$ 62.735,26	
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 1.490.520,01	
A						\$ 372.630,00	
I						\$ 29.810,40	
U						\$ 44.715,60	



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



INFORMACIÓN CONSOLIDADA	
COSTO DIRECTO	\$ 474.447.636,00
COSTO INDIRECTO	\$ 142.334.291,00
TOTAL	\$ 616.781.927,00

3. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

Tabla 2. Actos administrativos contrato de obra No. 361-2025

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
16/10/2025	Acta de inicio	Iniciación del contrato de obra No. 361-2025	SUPERVISIÓN: MARLENY APONTE TORRES Subgerente Administrativa y Financiera E.S.E. Hospital Especial de Cubará CONTRATISTA: CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA NIT. 901.375.684-5
17/10/2025	Acta de socialización	Socialización del contrato de obra No. 361-2025	Asistentes: representantes de HOSPITAL ESPECIAL DE CUBRA E.S.E por el GERENTE GIOVANNI QUINTERO TELLEZ, presidentes de las comunidades beneficiadas e involucradas, contratista de obra, interventoría, supervisión y comunidad beneficiada.

4. GARANTÍAS DEL CONTRATO

De mutuo acuerdo con las garantías exigidas por la ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA en el contrato de obra N° 361-2025, se suscribe con la compañía de seguro ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA DECIMA PRIMERA del contrato así:



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



Para la ejecución del presente contrato se presenta póliza Garantía Única Cumplimiento y Responsabilidad Civil de la compañía de seguros “ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA”, a favor de la ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA, que a continuación se relacionan:

4.1. Pólizas de legalización

Póliza presentada de legalización del Contrato de Obra No. 361-2025:

Tabla 3. Garantías Contractuales.

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° 625-47 994000003468 ANEXO: 0			
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO
CUMPLIMIENTO	08/09/2025	13/03/2026	\$ 61.678.192,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	08/09/2025	13/11/2028	\$ 123.356.385,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Tres (03) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra		\$ 185.034.578,40
CALIDAD DEL SERVICIO	08/09/2025	13/05/2026	\$123,356,385.60

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N°. 625 74 994000001318 ANEXO: 0			
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	08/09/2025	24/03/2026	\$ 185.034.579,00

- Pólizas actualizadas, con inclusión y aclaración del beneficiario adicional, expedidas el 16 de octubre de 2025 por la Aseguradora Solidaria de Colombia, a favor de la ESE Hospital Especial de Cubará y del Ministerio de Salud y Protección Social.:

- Anexo No. 01:

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° 625 47 994000003468 ANEXO: 1			
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO
CUMPLIMIENTO	08/09/2025	13/03/2026	\$ 61.678.192,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	08/09/2025	13/11/2028	\$ 123.356.385,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Tres (03) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra		\$ 185.034.578,40
CALIDAD DEL SERVICIO	08/09/2025	13/05/2026	\$123,356,385.60



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N°. 625 74 994000001318 ANEXO: 1				
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL	CIVIL	08/09/2025	24/03/2026	\$ 185.034.579,00

- Pólizas actualizadas de acuerdo con el Acta de Inicio.

- Anexo No. 02:

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° 625 – 47 - 994000003468 ANEXO: 2				
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO
CUMPLIMIENTO		16/10/2025	30/04/2026	\$ 61.678.192,80
CALIDAD DEL SERVICIO		16/10/2025	30/06/2026	\$ 123.356.385,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		16/10/2025	30/12/2028	\$123,356,385.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		Tres (03) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra		\$ 185.034.578,40

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N°. 625 74 994000001318 ANEXO: 2				
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO
RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES)		16/10/2025	30/04/2026	\$ 185.034.579,00

- Pólizas según acta según recibo final

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° 625 – 47 - 994000003468 ANEXO: 3				
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO
CUMPLIMIENTO		16/10/2025	01/05/2026	\$ 61.678.192,80
CALIDAD DEL SERVICIO		16/10/2025	01/07/2026	\$ 123.356.385,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		16/10/2025	31/12/2028	\$123,356,385.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		Tres (03) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra		\$ 185.034.578,40



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



4.2. Antecedentes y aspectos administrativos del contrato.

- Este contrato de obra fue emanado del proceso de Licitación de Obra pública No. 361-2025, donde por medio de la Resolución No. AD-083 de 2025 del 05 de septiembre del 2025, fue adjudicado al proponente: CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L XIOMARA MANRIQUE, por valor de SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$ 616.781.927,00).
- El 08 de septiembre de 2025 se firma el contrato de Obra No. 361-2025 entre el representante legal del Hospital Especial de Cubará GIOVANNI QUINTERO TELLEZ y la firma contratista CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. representada por GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA.
- El 16 de octubre de 2025 se firma el Acta de inicio del contrato de Obra No. 361-2025, una vez las garantías presentadas fueron aprobadas por la ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA.
- El 17 de octubre de 2025 se realiza la socialización del contrato de Obra en instalaciones del HOPITAL ESPECIAL DE CUBARA E.S.E, donde se invitó los presidentes de las comunidades beneficiadas e involucradas con el proyecto, contratista de obra, interventoría, supervisión y comunidad beneficiada, en donde se expuso el alcance de la ejecución del contrato, la metodología de ejecución y el presupuesto destinado para el desarrollo de las actividades contempladas, de igual forma se realizó la presentación del personal profesional del contratista, contratación del personal de la zona, maquinaria a emplear, los inconvenientes posibles para el desarrollo de las actividades, además de socializarse el plan de contingencias por parte de la supervisión.

5. ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS

Durante la ejecución del contrato de obra durante el periodo del presente informe, se han suscrito las siguientes actas de comités técnicos desarrollados entre las partes.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



Tabla 4. Actas de Comités Técnicos de Obra

FECHA	MOTIVO	ASISTENTES
11/11/2025	<p>Ejecutar adecuación eléctrica completa y cableado normativo en salón de archivo.</p> <p>Continuar trabajos en área de consulta externa (desmonte e instalación de cubierta) durante el fin de semana.</p> <p>Continuar intervención en sala de administración (cubierta, pintura y ajustes internos).</p> <p>Monitorear los frentes de trabajo y emitir conceptos técnicos necesarios para asegurar cumplimiento de especificaciones.</p> <p>Coordinar conjuntamente el ingreso para trabajos de adecuación eléctrica.</p>	<p>SUPERVISIÓN: MARLENY APONTE TORRES Subgerente Administrativa y Financiera E.S.E. Hospital Especial de Cubará</p> <p>CONTRATISTA: CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA NIT. 901.375.684-5</p> <p>INTERVENTORIA: FRASCO SUMINISTRO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS SAS R/L FANNY KATHERIN BARRERA CORREA NIT. 901.629.231-4</p> <p>ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBRARA: GERENTE GIOVANNI QUINTERO TELLEZ</p>
24/11/2025	<p>En el Comité de Obra se acordó ejecutar el suministro e instalación de teja termoacústica tipo trapezoidal A360 correspondiente al ítem 2.05 del contrato, ajustando las cantidades inicialmente previstas en el área de Terapia Física debido a que la cubierta existente se encuentra en buenas condiciones; adicionalmente, se aprobó la ejecución de una nueva área de 39,60 m² de cubierta en las zonas de Partos y Cirugía, decisión que cuenta con la validación de la Supervisión e Interventoría, quienes realizarán el seguimiento técnico necesario para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la correcta ejecución de la actividad.</p>	<p>SUPERVISIÓN: MARLENY APONTE TORRES Subgerente Administrativa y Financiera E.S.E. Hospital Especial de Cubará</p> <p>CONTRATISTA: CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA NIT. 901.375.684-5</p> <p>INTERVENTORIA: FRASCO SUMINISTRO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS SAS R/L FANNY KATHERIN BARRERA CORREA NIT. 901.629.231-4</p> <p>ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBRARA: GERENTE GIOVANNI QUINTERO TELLEZ</p>

6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

En el periodo de ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se ha enviado y recibido la siguiente correspondencia entre la interventoría, el contratista y la ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA.

Tabla 5. Relación de correspondencia enviada por la Interventoría del Contrato de Obra No. 361-2025.

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCIÓN
24/10/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L: Xiomara Manrique ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ	Asunto: Solicitud de entrega de documentos iniciales previos al inicio de actividades de obra



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCIÓN
10/11/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L: Xiomara Manrique ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ	Asunto: Solicitud formal de Comité de Obra No 1 - Contrato de Obra No. 361- 2025.
12/11/2025	ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA E.S.E	CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L: Xiomara Manrique	Asunto: Requerimiento de información sobre el personal vinculado al contrato de obra No. 361-2025
24/11/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L: Xiomara Manrique	Asunto: Solicitud de entrega de informe mensual de obra No. 01
02/12/2025	CONSTRUINDUCIVIL SAS	INTERVENTORIA EXTERNA R/L: Fanny Katherin Barrera Correa	Asunto: Entrega de informe parcial 1 de contrato de obra N°361 - 2025
05/12/2025	INTERVENTORIA EXTERNA	CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L: Xiomara Manrique	Asunto: Respuesta a la entrega del Informe Parcial de Obra Contrato No. 361-2025 y remisión de observaciones y correcciones.

Durante el presente periodo la Interventoría no recibió correspondencia relacionada con el desarrollo del contrato, por lo cual no se registran comunicaciones formales.

7. CONTROL SOCIAL

El día 17 de octubre de 2025, a las 9:00 a.m., se llevó a cabo la socialización del proyecto, a la cual asistieron representantes del Hospital Especial de Cubará, los presidentes de las comunidades beneficiadas e involucradas, el contratista de obra, la interventoría, la supervisión y miembros de la comunidad.

Durante la jornada se presentó el alcance del contrato, el presupuesto asignado para la ejecución de las actividades previstas y el equipo profesional del contratista. Asimismo, se socializó el proceso de contratación de personal local, el equipo que será utilizado, los posibles inconvenientes durante el desarrollo de las obras.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



Ilustración 2. Socialización del Proyecto

8. VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES.

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La interventoría verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.


8.1. Personal Administrativo


El personal profesional y administrativo que labora en la obra para el periodo del presente informe es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.


A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses ejecutados:

Tabla 6. Personal administrativo vinculado al contrato de obra No. 361-2025 en el mes de Octubre del 2025

	NOMBRES	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SUELDO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF
1	VIANNEY KARINA	1.094.275.515	RESIDENTE DE OBRA	\$ 3.000.000,00	NUEVA EPS	COLPENSION	POSITIVA	COMFABOY
2	ROSA DANIELA SANTANDER APONTE	1.049.395.519	PROFESIONAL HSEQ	\$ 2.500.000,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
3	KARINA BARRERA AGUABLANCA	1.115.733.517	PROFESIONAL SOCIAL	\$ 2.500.000,00	COOSALUD	COLPENSION	POSITIVA	COMFABOY

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso

**Tabla 7. Personal administrativo vinculado al contrato de obra No. 361-2025 en el mes de Noviembre del 2025**

	NOMBRES	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SUELDO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF
1	VIANNEY KARINA	1.094.275.515	RESIDENTE DE OBRA	\$ 3.000.000,00	NUEVA EPS	COLPENSION	POSITIVA	COMFABOY
2	ROSA DANIELA SANTANDER APONTE	1.049.395.519	PROFESIONAL HSEQ	\$ 2.500.000,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
3	KARINA BARRERA AGUABLANCA	1.115.733.517	PROFESIONAL SOCIAL	\$ 2.500.000,00	COOSALUD	COLPENSION	POSITIVA	COMFABOY

Tabla 8. Personal administrativo vinculado al contrato de obra No. 361-2025 en el mes de Diciembre del 2025

	NOMBRES	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SUELDO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF
1	VIANNEY KARINA	1.094.275.515	RESIDENTE DE OBRA	\$ 3.000.000,00	NUEVA EPS	COLPENSION	POSITIVA	COMFABOY
2	ROSA DANIELA SANTANDER APONTE	1.049.395.519	PROFESIONAL HSEQ	\$ 2.500.000,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
3	KARINA BARRERA AGUABLANCA	1.115.733.517	PROFESIONAL SOCIAL	\$ 2.500.000,00	COOSALUD	COLPENSION	POSITIVA	COMFABOY

8.2. Personal operativo

El contratista utilizó mano de obra no calificada de la región con lo cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo con los requerimientos técnicos de la obra.

A continuación, se relaciona el personal operativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

Tabla 9. Personal operativo vinculado al contrato de obra No. 361-2025 en el mes de Octubre del 2025

MES: OCTUBRE DEL 2025								
	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SALARIO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF
1	JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA	96.167.92.9	OFICIAL DE OBRA	\$ 3.582.570,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
2	BLANCA ISABEL SANTANFÉ ESTEVEZ	1.049.392.734	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
3	CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA	1.094.268.169	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



4	CARLOS ALBERTO SANTANFÉ CASTELLANOS	1.049.396.199	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
5	FLORO IVAN CARRILLO MORA	1.094.392.738	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
6	HENRY GUTIERREZ BATECA	96.125.112	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
7	RIQUELME CASTELLANOS ROJAS	1.049.393.798	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
8	WILBER ALEXANDER MORENO TORRES	1.049.392.860	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.256.000,00	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY
9	JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO	88.034.175	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY
10	JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS	1.094.280.998	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
11	LUIS FRANCISCO TARAZONA	9.467.070	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY
12	OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL	1.049.394.907	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
13	MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO	1.049.396.351	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY
14	LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO	4439097	MAESTRO DE OBRA	\$ 3.582.570,00	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY

Tabla 9. Personal operativo vinculado al contrato de obra No. 361-2025 en el mes de Noviembre del 2025

MES: NOVIEMBRE DEL 2025								
	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SALARIO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF
1	JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA	96.167.92.9	OFICIAL DE OBRA	\$ 3.582.570,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
2	BLANCA ISABEL SANTANFÉ ESTEVEZ	1.049.392.734	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
3	CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA	1.094.268.169	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY
4	CARLOS ALBERTO SANTANFÉ CASTELLANOS	1.049.396.199	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
5	FLORO IVAN CARRILLO MORA	1.094.392.738	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
6	HENRY GUTIERREZ BATECA	96.125.112	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY



322 7230347



frascingsas@gmail.com






Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



7	RIQUELME CASTELLANOS ROJAS	1.049.393.798	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
8	WILBER ALEXANDER MORENO TORRES	1.049.392.860	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.256.000,00	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY
9	JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO	88.034.175	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY
10	JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS	1.094.280.998	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
11	LUIS FRANCISCO TARAZONA	9.467.070	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY
12	OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL	1.049.394.907	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
13	MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO	1.049.396.351	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY
14	LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO	4439097	MAESTRO DE OBRA	\$ 3.582.570,00	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY

Tabla 10. Personal operativo vinculado al contrato de obra No. 361-2025 en el mes de Diciembre del 2025

MES: DICIEMBRE DEL 2025								
	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SALARIO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF
1	JAIME JOANNIS CONTRERAS PEÑA	96.167.92.9	OFICIAL DE OBRA	\$ 3.582.570,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
2	BLANCA ISABEL SANTANFÉ ESTEVEZ	1.049.392.734	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
3	CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA	1.094.268.169	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY
4	CARLOS ALBERTO SANTANFÉ CASTELLANOS	1.049.396.199	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
5	FLORO IVAN CARRILLO MORA	1.094.392.738	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
6	HENRY GUTIERREZ BATECA	96.125.112	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
7	RIQUELME CASTELLANOS ROJAS	1.049.393.798	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
8	WILBER ALEXANDER MORENO TORRES	1.049.392.860	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.256.000,00	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY
9	JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO	88.034.175	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY

 322 7230347 frascingsas@gmail.com Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



10	JUAN DE DIOS TRUJILLO CASTELLANOS	1.094.280.998	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
11	LUIS FRANCISCO TARAZONA	9.467.070	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY
12	OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL	1.049.394.907	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
13	MARLENIS CAROLINA FERNANDEZ OVIDEO	1.049.396.351	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.915.950,00	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY
14	LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO	4439097	MAESTRO DE OBRA	\$ 3.582.570,00	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY

Por parte de la interventoría se da cumplimiento a las obligaciones que tiene el contratista donde se verifica el listado del personal vinculado con las planillas de los diferentes pagos.


Donde a continuación se da verificación de cada una de ellas


Tabla 11. Seguimiento a los compromisos laborales del contratista- del Contrato de Obra No. 361-2025


ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	MES 1		MES 2		
	SI	NO	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X				Cumple
El contratista ha entregado a la supervisión copia de las afiliaciones del personal.	X				Cumple
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X				Cumple
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X				Cumple
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	X				Cumple
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X				Cumple

8.3. Pagos salariales y liquidación del personal

El contratista realizó oportunamente los pagos salariales de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, de acuerdo con el contrato laboral para los meses que se relacionan en el presente informe.

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



9. BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Se da inicio a la realización de la bitácora de obra el día 16 de octubre del 2025, en la cual se redactan los eventos que se realizaron diariamente durante el proceso de ejecución del contrato de obra, el responsable de su diligenciamiento diario es la ingeniera residente de obra en conjunto con el ingeniero residente de interventoría, en esta bitácora fue aprobada por los profesionales de la obra y los profesionales de la interventoría.

En el **ANEXO 1** se presenta copia de la Bitácora Diaria de Obra para el periodo del presente informe.

10. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

En los lugares específicos de la obra se instalaron las respectivas señalizaciones para delimitar y demarcar las áreas de trabajo con el fin de evitar accidentes laborales al personal que labora en la obra y a terceros, definiendo adecuadamente los lugares a demarcar los cuales permiten organizar las diferentes actividades de la obra de acuerdo con el uso que se le dará. De igual manera el contratista de obra realizo charlas para fomentar la seguridad, integridad física, la salud y la disminución de riesgos en el lugar de trabajo.

Así mismo se señalizó y aisló la zona intervenida por el contrato con el fin de aislar la zona donde se ejecuta la construcción, para evitar la entrada de personas ajenas a la obra, darle un buen aspecto y evitar posibles accidentes a personas externas.

10.1. Señalización de la obra.

En el transcurso del periodo de ejecución de los trabajos, el contratista implementó adecuadamente la señalización requerida para el aislamiento de las zonas de trabajo, así como la instalación de las señales informativas y preventivas y vallas necesarias en la ejecución de la obra.




322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso

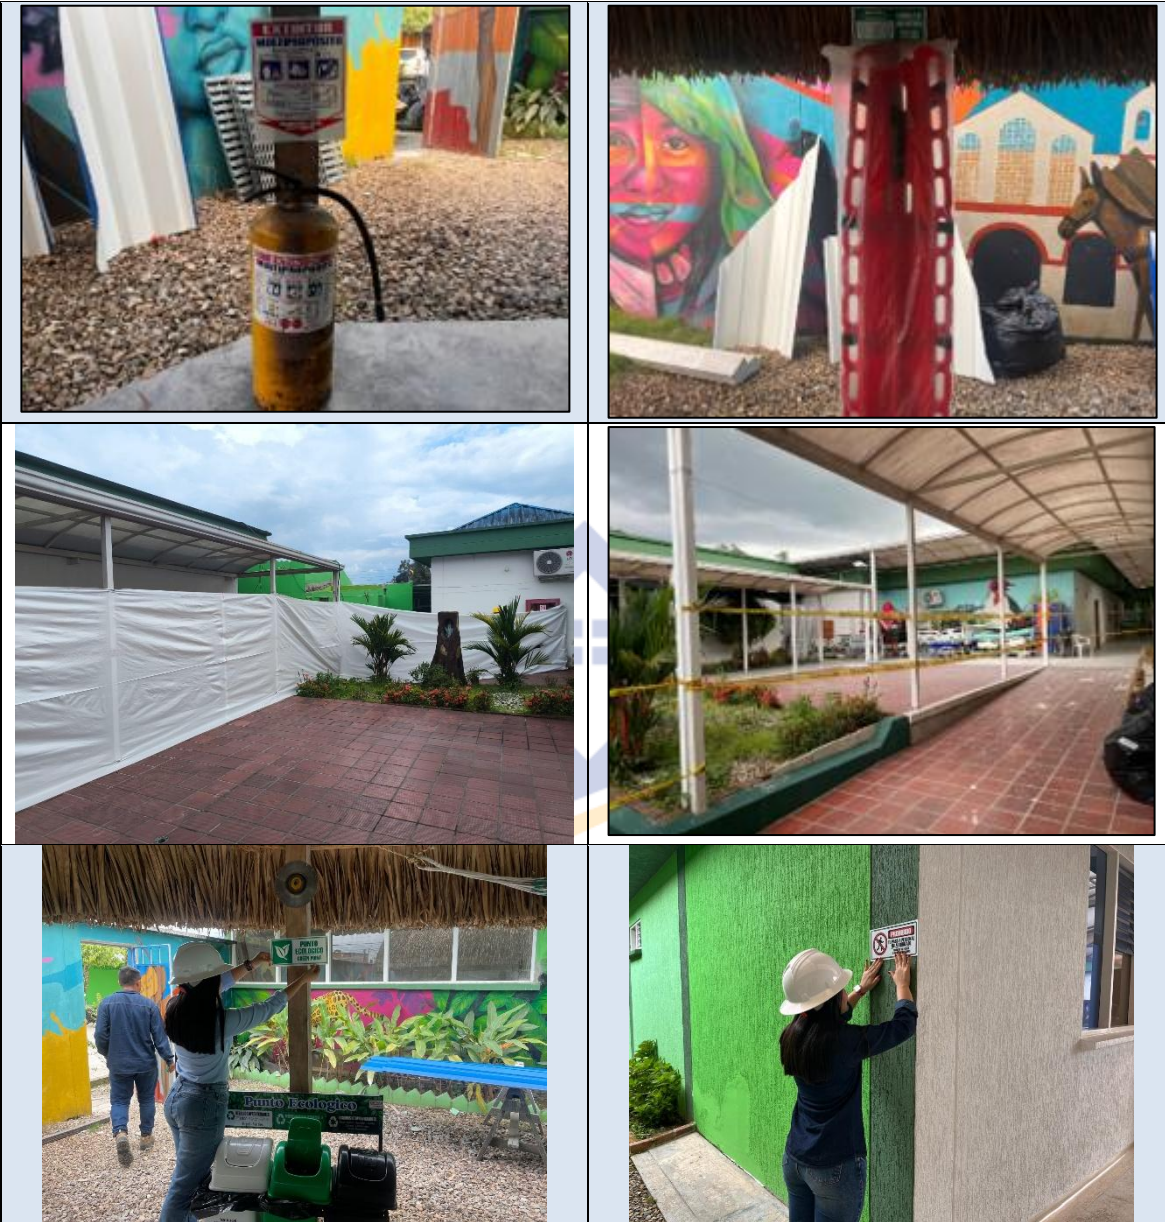

NOTA: Diariamente la interventoría inspecciono que dichas señales se encontraran debidamente instaladas en todas las zonas de trabajo de la obra y en buen estado.

10.2. Dotación del personal



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



El grupo contratista llevó a cabo la entrega de los elementos de protección personal (EPP) al personal que labora en la obra, requeridos para el desarrollo de las labores diarias, haciendo entrega de los siguientes elementos.

Ilustración 3 Dotación de elementos de protección personal (EPP) entregados a trabajadores vinculados al -Contrato de Obra N°361-2025



Tabla 11. Elementos entregados

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Sí	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Ingenieros, Maestros, Oficiales, ayudantes. técnica hs
GUANTES REFORZADOS	X		X			Oficiales, ayudantes.
BOTAS	X		X			Ingenieros, Maestros, Oficiales, ayudantes.
GAFAS DE SEGURIDAD	X		X			Oficiales, ayudantes.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



CAMISA/PANTALÓN	X		X			Oficiales, ayudantes.
TAPA OÍDOS	X		X			Ingenieros, Maestros, Oficiales, ayudantes. Técnica hs

La interventoría verificó día a día el correcto uso de los elementos de protección por parte del personal en obra, haciendo la respectiva exigencia a los trabajadores.

Tabla 12. Señalización en obra

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN	INSTALADOS		ESTADO			LOCALIZACIÓN EN OBRA
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CINTA PELIGRO	X		X			EN PUNTOS ESTARTEGICOS DEL SITIO DE OBRA
AVISOS PREVENTIVOS	X		X			EN PUNTOS ESTARTEGICOS DEL SITIO DE OBRA
AVISOS INFORMATIVOS	X		X			EN PUNTOS ESTARTEGICOS DEL SITIO DE OBRA
AVISOS REGLAMENTARIOS	X		X			EN PUNTOS ESTARTEGICOS DEL SITIO DE OBRA
DELINEADORES	X		X			EN PUNTOS ESTARTEGICOS DEL SITIO DE OBRA
CANECAS PLÁSTICAS O METÁLICAS	X		X			PUNTO ECOLOGICO

FRASCING S.A.S

10.3. Accidentalidad en la obra

La Interventoría estuvo atenta al registro y atención de los accidentes laborales presentados en obra con el personal vinculado por el contratista. Para el periodo del presente informe no se presenta un accidente laboral en la ejecución del contrato No. 361-2025

11. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

La interventoría verificó que el contratista utilizara en la ejecución de las actividades del contrato la maquinaria y equipo requerido según los APU y especificaciones técnicas del proyecto, así mismo constató el estado físico y de operación de la maquinaria y equipo.



322 7230347



frascingsas@gmail.com





Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





La maquinaria y equipo que el contratista utilizó durante el periodo de ejecución del contrato fue la siguiente:

Tipo	Marca	Estado	Regularidad del mantenimiento	Idoneidad de operarios
COMPRESOR	COMPRESO RES JS	Bueno	Mensual	Idóneo
				

Tipo	Marca	Estado	Regularidad del mantenimiento	Idoneidad de operarios
HIDROLAV ADORA	STIHL	Bueno	Mensual	Idóneo
				

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



Tipo	Marca	Estado	Regularidad del mantenimiento	Idoneidad de operarios
Volqueta	Kodiak	Bueno	Mensual	Idóneo
				

Tipo	Marca	Estado	Regularidad del mantenimiento	Idoneidad de operarios
Retroexcavadora sobre ruedas	Caterpillar	Bueno	Mensual	Idóneo
				

Así mismo la interventoría superviso que la maquinaria y equipos propios y/o alquilados por el contratista estuvieran al día con los seguros y que se haya realizado la respectiva afiliación de los operarios al sistema de seguridad social y ARL.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




12. ASPECTOS FINANCIEROS


12.1. Aspectos financieros


El contrato de obra pública N° 361-2025 cuyo objeto es “ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ”, el día dieciséis (16) de octubre del 2025 se firma el contrato de obra por la empresa CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L XIOMARA MANRIQUE con Nit. 901.375.684-5 por un valor de SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$616.781.927,00) M/CTE., a continuación, se presenta el desglose del presupuesto contratado:

Tabla 13. Condiciones contractuales contrato de obra N° 361-2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	AREA EXTERIOR				TIPO:	OBRA PÚBLICA
1,01	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	1855,92	4%	\$ 7.640,85	\$ 14.748.038,59
1,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	1855,92	4%	\$ 17.576,11	\$ 33.924.648,23
1,03	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA CUADRADA DE 1"	M2	146,54		\$ 109.655,00	\$ 16.068.843,70
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 64.741.530,52
					A	\$ 16.185.382,63
					I	\$ 1.294.830,61
					U	\$ 1.942.245,92
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL
2	CUBIERTAS Y DRENAJES				TIPO:	OBRA PÚBLICA
2,01	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)	M2	857,50		\$ 7.643,47	\$ 6.554.275,53
2,02	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO	M2	857,50		\$ 94.265,60	\$ 80.832.752,00
2,03	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	450,00	4%	\$ 11.929,22	\$ 5.582.874,96

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



2,04	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	683,50	4%	\$ 8.791,65	\$ 6.249.456,49
2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	1133,50		\$ 119.304,46	\$ 135.231.605,41
2,06	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	ML	235,75		\$ 99.176,65	\$ 23.380.895,24
2,07	DESMONTE CANALES - BAJANTES.	ML	9,60	4%	\$ 5.809,30	\$ 58.000,05
2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	9,60	4%	\$ 117.117,01	\$ 1.169.296,23
2,09	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO	M2	473,32		\$ 14.761,83	\$ 6.987.069,38
2,10	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	2661,42	4%	\$ 3.338,02	\$ 9.239.228,12
2,11	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	3058,75	4%	\$ 225,00	\$ 715.747,50
COSTO DIRECTO GRUPO						\$ 276.001.200,91
A						\$ 69.000.300,23
I						\$ 5.520.024,02
U						\$ 8.280.036,03
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL
3	ADMINISTRACIÓN				TIPO:	OBRA PÚBLICA
3,01	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	2,80	4%	\$ 10.155,28	\$ 29.572,18
3,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	37,58	4%	\$ 17.576,11	\$ 686.930,62
3,03	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	477,26	4%	\$ 10.307,86	\$ 5.116.310,43
3,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	40,13	4%	\$ 20.004,61	\$ 834.896,40
3,05	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	56,11	4%	\$ 14.773,22	\$ 862.082,39



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UNIDAD	8,00		\$ 38.115,49	\$ 304.923,92
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 7.834.715,94
					A	\$ 1.958.678,99
					I	\$ 156.694,32
					U	\$ 235.041,48
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL
4	ARCHIVO - ALMACEN				TIPO:	OBRA PÚBLICA
4,01	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	145,77	4%	\$ 11.929,22	\$ 1.808.479,30
4,02	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	4,53	4%	\$ 13.629,00	\$ 64.208,94
4,03	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO	M2	1,53	4%	\$ 33.374,71	\$ 53.105,84
4,04	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	32,34	4%	\$ 13.629,00	\$ 458.392,33
4,05	CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18	ML	138,60		\$ 49.390,38	\$ 6.845.506,67
4,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	145,77		\$ 119.304,46	\$ 17.391.011,13
4,07	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	ML	11,30		\$ 99.176,65	\$ 1.120.696,15
4,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	11,30	4%	\$ 117.117,01	\$ 1.376.359,10
4,09	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	32,00	4%	\$ 51.834,72	\$ 1.725.059,48
4,10	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	15,22	4%	\$ 238.795,70	\$ 3.779.849,38
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 18 (Incluye marco, bisagras y pintura)	M2	4,20		\$ 401.082,39	\$ 1.684.546,04
4,12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	29,90	4%	\$ 25.187,68	\$ 783.236,10



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



4,13	ESTUCO MUROS	M2	29,90	4%	\$ 10.155,28	\$ 315.788,59
4,14	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	113,70	4%	\$ 17.576,11	\$ 2.078.339,86
4,15	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	220,44	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.363.155,24
4,16	CIELO RASO EN PVC	M2	115,96		\$ 71.719,83	\$ 8.316.631,49
4,17	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	481,04	4%	\$ 225,00	\$ 112.563,36
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 50.276.929,00
					A	\$ 12.569.232,25
					I	\$ 1.005.538,58
					U	\$ 1.508.307,87
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL
5	SALA DE AUTOPSIAS				TIPO:	OBRA PÚBLICA
5,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRAD O	128,20	4%	\$ 10.307,86	\$ 1.374.326,36
5,02	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRAD O	9,00	4%	\$ 20.004,61	\$ 187.243,15
5,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	49,50	4%	\$ 14.773,22	\$ 760.525,37
5,04	ESTUCO MUROS	METRO CUADRAD O	3,20	4%	\$ 10.155,28	\$ 33.796,77
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 2.355.891,65
					A	\$ 588.972,91
					I	\$ 47.117,83
					U	\$ 70.676,75
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL
6	HOSPITALIZACION				TIPO:	OBRA PÚBLICA
6,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	432,72	4%	\$ 10.307,86	\$ 4.638.833,87



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



6,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	156,52	4%	\$ 17.576,11	\$ 2.861.053,25
6,03	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	M2	213,35	4%	\$ 3.130,72	\$ 694.656,68
6,04	CIELO RASO EN PVC	M2	213,35		\$ 71.719,83	\$ 15.301.425,73
6,05	ESTUCO MUROS	M2	48,21	4%	\$ 10.155,28	\$ 509.169,49
6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UND	21,00		\$ 38.115,49	\$ 800.425,29
6,07	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	126,10	4%	\$ 14.773,22	\$ 1.937.419,16
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 26.742.983,47
					A	\$ 6.685.745,87
					I	\$ 534.859,67
					U	\$ 802.289,50
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL
7	PARTOS Y CIRUGIA				TIPO:	OBRA PÚBLICA
7,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	119,09	4%	\$ 10.307,86	\$ 1.276.665,57
7,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	108,76	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.988.040,83
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 3.264.706,40
					A	\$ 816.176,60
					I	\$ 65.294,13
					U	\$ 97.941,19
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL
8	URGENCIAS				TIPO:	OBRA PÚBLICA
8,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	488,08	4%	\$ 10.307,86	\$ 5.232.302,72
8,02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UNIDAD	1,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 1.579.534,48



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



8,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	6,00	4%	\$ 14.773,22	\$ 92.184,89
8,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	8,00	4%	\$ 20.004,61	\$ 166.438,36
8,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UNIDAD	5,00		\$ 38.115,49	\$ 190.577,45
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 7.261.037,90
					A	\$ 1.815.259,48
					I	\$ 145.220,76
					U	\$ 217.831,14
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL
9	CONSULTA EXTERNA				TIPO:	OBRA PÚBLICA
9,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	435,57	4%	\$ 10.307,86	\$ 4.669.386,36
9,02	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	METRO CUADRADO	19,74	4%	\$ 13.629,00	\$ 279.797,92
9,03	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UNIDAD	10,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 15.795.344,76
9,04	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	15,60	4%	\$ 14.773,22	\$ 239.680,72
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 20.984.209,76
					A	\$ 5.246.052,44
					I	\$ 419.684,20
					U	\$ 629.526,29
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL
10	VACUNACION				TIPO:	OBRA PÚBLICA
10,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	81,61	4%	\$ 10.307,86	\$ 874.873,43
10,02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UNIDAD	1,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 1.579.534,48
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 2.454.407,91



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



					A	\$	613.601,98
					I	\$	49.088,16
					U	\$	73.632,24
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	
11	COSTO DIRECTO GRUPO				TIPO:		OBRA PÚBLICA
11,0 1	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	50,82	4%	\$ 10.307,86	\$	544.799,26
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$	544.799,26
					A	\$	136.199,82
					I	\$	10.895,99
					U	\$	16.343,98
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	
12	CITAS				TIPO:		OBRA PÚBLICA
12,0 1	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	33,55	4%	\$ 10.307,86	\$	359.661,85
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$	359.661,85
					A	\$	89.915,46
					I	\$	7.193,24
					U	\$	10.789,86
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL	
13	COCINA Y LAVANDERIA				TIPO:		OBRA PÚBLICA
13,0 1	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	233,63	4%	\$ 10.307,86	\$	2.504.554,35
13,0 2	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	29,13	4%	\$ 10.155,28	\$	307.656,24
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$	2.812.210,59
					A	\$	703.052,65
					I	\$	56.244,21
					U	\$	84.366,32



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL
14	TERAPIA FISICA				TIPO:	OBRA PÚBLICA
14,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	246,87	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.646.489,45
14,02	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	10,80	4%	\$ 10.155,28	\$ 114.064,10
14,03	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	58,31	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.065.857,49
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 3.826.411,04
					A	\$ 956.602,76
					I	\$ 76.528,22
					U	\$ 114.792,33
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL
15	PARQUEADERO AMBULANCIAS				TIPO:	OBRA PÚBLICA
15,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	211,31	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.265.280,05
15,02	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	19,70	4%	\$ 14.773,22	\$ 302.673,73
15,03	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	45,90	4%	\$ 16.684,41	\$ 796.447,00
15,04	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	12,50	4%	\$ 10.155,28	\$ 132.018,64
					COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 3.496.419,42
					A	\$ 874.104,86
					I	\$ 69.928,39
					U	\$ 104.892,58
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOTAL
16	AREA DE SECADO				TIPO:	OBRA PÚBLICA
16,01	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	78,11	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.427.784,75



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



16,0 2	ESTUCO MUROS	METRO CUADRAD O	5,94	4%	\$ 10.155,28	\$ 62.735,26	
						COSTO DIRECTO	\$
						GRUPO	1.490.520,01
						A	\$ 372.630,00
						I	\$ 29.810,40
						U	\$ 44.715,60
INFORMACIÓN CONSOLIDADA							
						COSTO DIRECTO	\$ 474.447.636,00
						COSTO INDIRECTO	\$ 142.334.291,00
						TOTAL	\$ 616.781.927,00

12.2. Modificaciones o adicionales al contrato

A la fecha de corte del presente informe no se le realizaron modificaciones o adiciones al contrato de obra Pública No. 361-2025


12.3. Compensación de mayores y menores cantidades


A la fecha de corte del presente informe no se le realizaron modificaciones o adiciones al contrato de obra Pública No. 361-2025.


12.4. Avance físico de la obra

Tabla 14. Avance físico del contrato de obra No. 361-2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
1	AREA EXTERIOR				
1,01	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	1855,92	1855,92	100,00%
1,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	1855,92	1855,92	100,00%
1,03	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA CUADRADA DE 1"	M2	146,54	146,54	100,00%

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
2	CUBIERTAS Y DRENAJES				
2,01	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)	M2	857,50	857,50	100,00%
2,02	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO	M2	857,50	857,50	100,00%
2,03	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	450,00	450,00	100,00%
2,04	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	683,50	683,50	100,00%
2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	1133,50	1133,50	100,00%
2,06	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	ML	235,75	235,75	100,00%
2,07	DESMONTE CANALES - BAJANTES.	ML	9,60	9,60	100,00%
2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	9,60	9,60	100,00%
2,09	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO	M2	473,32	473,32	100,00%
2,10	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	2661,42	2661,42	100,00%
2,11	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	3058,75	3058,75	100,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
3	ADMINISTRACION				
3,01	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	2,80	2,80	100,00%
3,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	37,58	37,58	100,00%
3,03	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	477,26	477,26	100,00%
3,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	40,13	40,13	100,00%
3,05	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	56,11	56,11	100,00%
3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UNIDAD	8,00	8,00	100,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
4	ARCHIVO - ALMACEN				
4,01	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	145,77	145,77	100,00%
4,02	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	4,53	4,53	100,00%
4,03	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO	M2	1,53	1,53	100,00%
4,04	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	32,34	32,34	100,00%
4,05	CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18	ML	138,60	138,60	100,00%
4,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	M2	145,77	145,77	100,00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



4,07	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	ML	11,30	11,30	100,00%
4,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	11,30	11,30	100,00%
4,09	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	32,00	32,00	100,00%
4,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	15,22	15,22	100,00%
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 18 (Incluye marco, bisagras y pintura)	M2	4,20	4,20	100,00%
4,12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	29,90	29,90	100,00%
4,13	ESTUCO MUROS	M2	29,90	29,90	100,00%
4,14	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	113,70	113,70	100,00%
4,15	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	220,44	220,44	100,00%
4,16	CIELO RASO EN PVC	M2	115,96	115,96	100,00%
4,17	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	KG	481,04	481,04	100,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
5	SALA DE AUTOPSIAS				
5,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	128,20	128,20	100,00%
5,02	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	9,00	9,00	100,00%
5,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	49,50	49,50	100,00%
5,04	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	3,20	3,20	100,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
6	HOSPITALIZACION				
6,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	432,72	432,72	100,00%
6,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	156,52	156,52	100,00%
6,03	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	M2	213,35	213,35	100,00%
6,04	CIELO RASO EN PVC	M2	213,35	213,35	100,00%
6,05	ESTUCO MUROS	M2	48,21	48,21	100,00%
6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UND	21,00	21,00	100,00%
6,07	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	126,10	126,10	100,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
7	PARTOS Y CIRUGIA				
7,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	119,09	119,09	100,00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
7,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	108,76	108,76	100,00%
8	URGENCIAS				
8,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	488,08	488,08	100,00%
8,02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UNIDAD	1,00	1,00	100,00%
8,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	6,00	6,00	100,00%
8,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	8,00	8,00	100,00%
8,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UNIDAD	5,00	5,00	100,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
9	CONSULTA EXTERNA				
9,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	435,57	435,57	100,00%
9,02	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	METRO CUADRADO	19,74	19,74	100,00%
9,03	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UNIDAD	10,00	10,00	100,00%
9,04	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	15,60	15,60	100,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
10	VACUNACION				
10,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	81,61	81,61	100,00%
10,02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UNIDAD	1,00	1,00	100,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
11	SALA DE RAYOS X				
11,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	50,82	50,82	100,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
12	CITAS				
12,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	33,55	33,55	100,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
13	COCINA Y LAVANDERIA				
13,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	233,63	233,63	100,00%
13,02	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	29,13	29,13	100,00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com




Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
14	TERAPIA FISICA				
14,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	246,87	246,87	100,00%
14,02	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	10,80	10,80	100,00%
14,03	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	58,31	58,31	100,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
15	PARQUEADERO AMBULANCIAS				
15,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	METRO CUADRADO	211,31	211,31	100,00%
15,02	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	METRO LINEAL	19,70	19,70	100,00%
15,03	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	METRO CUADRADO	45,90	45,90	100,00%
15,04	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	12,50	12,50	100,00%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FISICO
16	AREA DE SECADO				
16,01	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	METRO CUADRADO	78,11	78,11	100,00%
16,02	ESTUCO MUROS	METRO CUADRADO	5,94	5,94	100,00%
TOTAL, DE AVANCE FISICO EJECUTADO DE OBRA					100,00%

La anterior tabla ilustra las cantidades ejecutadas respecto a las contratadas durante el total de días de ejecución, teniendo un avance físico total de 100,00%

De acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas a corte del presente informe, se presenta un avance de ejecución físico del 100%, de lo cual se realizó la ejecución total de las actividades establecidas en la minuta del contrato de obra No. 361-2025

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com


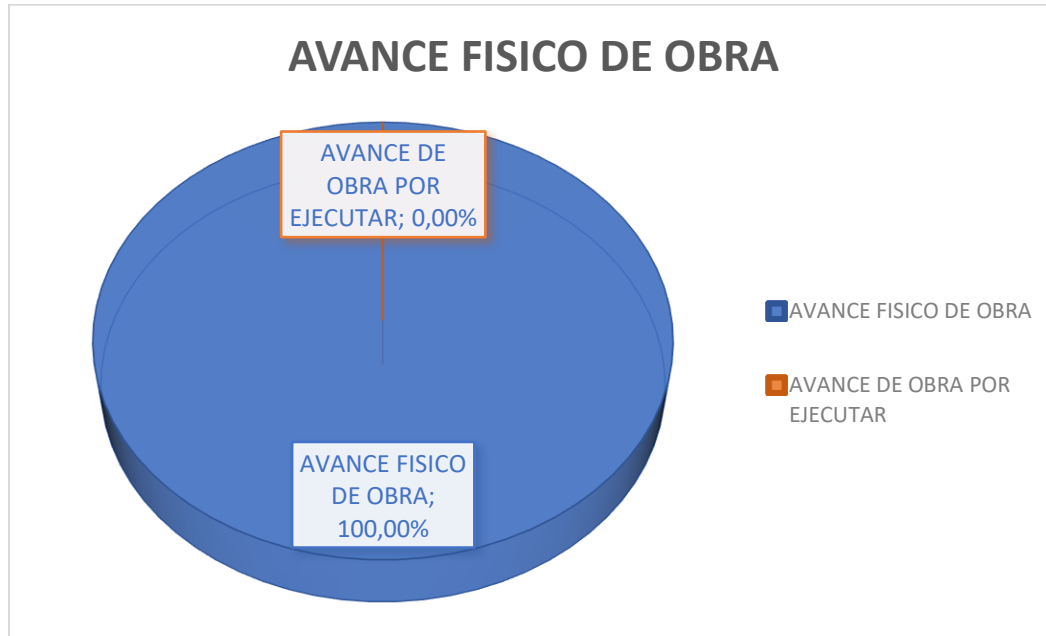
 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



Ilustración 3. Análisis ejecutado vs programado



12.5. Avance financiero de la obra

A continuación, se presenta el avance financiero del contrato de obra pública N° 361-2025 cuyo objeto es “ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ”, a la fecha del 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2025

Tabla 15. Relación avance financiero

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
1	AREA EXTERIOR					TIPO:	OBRA PÚBLICA		
1,01	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIÁTICO	Precios Gover.	M2	1855,92	4%	\$ 7.640,85	\$ 14.748.038,59	1855,92	\$ 14.748.038,59
1,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Precios Gover.	M2	1855,92	4%	\$ 17.576,11	\$ 33.924.648,23	1855,92	\$ 33.924.648,23
1,03	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA CUADRADA DE 1"	Cotización	M2	146,54		\$ 109.655,00	\$ 16.068.843,70	146,54	\$ 16.068.843,70
COSTO DIRECTO GRUPO							\$ 64.741.530,52		\$ 64.741.530,52
A							\$ 16.185.382,63		



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
						I	\$ 1.294.830,61		
						U	\$ 1.942.245,92		
2	CUBIERTAS Y DRENAJES					TIPO:	OBRA PÚBLICA		
2,01	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)	Cotización	M2	857,50		\$ 7.643,47	\$ 6.554.275,53	857,50	\$ 6.554.275,53
2,02	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO	Cotización	M2	857,50		\$ 94.265,60	\$ 80.832.752,00	857,50	\$ 80.832.752,00
2,03	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	Precios Gober.	M2	450,00	4%	\$ 11.929,22	\$ 5.582.874,96	450,00	\$ 5.582.874,96
2,04	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	Precios Gober.	M2	683,50	4%	\$ 8.791,65	\$ 6.249.456,49	683,50	\$ 6.249.456,49
2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	Cotización	M2	1133,50		\$ 119.304,46	\$ 135.231.605,41	1133,50	\$ 135.231.605,41
2,06	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	Cotización	ML	235,75		\$ 99.176,65	\$ 23.380.895,24	235,75	\$ 23.380.895,24
2,07	DESMONTE CANALES - BAJANTES.	Precios Gober.	ML	9,60	4%	\$ 5.809,30	\$ 58.000,05	9,60	\$ 58.000,05
2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	Precios Gober.	ML	9,60	4%	\$ 117.117,01	\$ 1.169.296,23	9,60	\$ 1.169.296,23
2,09	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO	Cotización	M2	473,32		\$ 14.761,83	\$ 6.987.069,38	473,32	\$ 6.987.069,38
2,10	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	Precios Gober.	KG	2661,42	4%	\$ 3.338,02	\$ 9.239.228,12	2661,42	\$ 9.239.228,12
2,11	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	Precios Gober.	KG	3058,75	4%	\$ 225,00	\$ 715.747,50	3058,75	\$ 715.747,50
						COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 276.001.200,91		\$ 276.001.200,91
						A	\$ 69.000.300,23		
						I	\$ 5.520.024,02		
						U	\$ 8.280.036,03		
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
3						TIPO:	OBRA PÚBLICA		
3,01	ESTUCO MUROS	Precios Gober.	METRO CUADRADO	2,80	4%	\$ 10.155,28	\$ 29.572,18	2,80	\$ 29.572,18
3,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Precios Gober.	METRO CUADRADO	37,58	4%	\$ 17.576,11	\$ 686.930,62	37,58	\$ 686.930,62
3,03	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gober.	METRO CUADRADO	477,26	4%	\$ 10.307,86	\$ 5.116.310,43	477,26	\$ 5.116.310,43
3,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Precios Gober.	METRO CUADRADO	40,13	4%	\$ 20.004,61	\$ 834.896,40	40,13	\$ 834.896,40
3,05	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	Precios Gober.	METRO LINEAL	56,11	4%	\$ 14.773,22	\$ 862.082,39	56,11	\$ 862.082,39
3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	Cotización	UNIDAD	8,00		\$ 38.115,49	\$ 304.923,92	8,00	\$ 304.923,92
						COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 7.834.715,94		\$ 7.834.715,94
						A	\$ 1.958.678,99		



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
						I	\$ 156.694,32		
						U	\$ 235.041,48		
4	ARCHIVO - ALMACEN					TIPO:	OBRA PÚBLICA		
4,01	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	Precios Gober.	M2	145,77	4%	\$ 11.929,22	\$ 1.808.479,30	145,77	\$ 1.808.479,30
4,02	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	Precios Gober.	M2	4,53	4%	\$ 13.629,00	\$ 64.208,94	4,53	\$ 64.208,94
4,03	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO	Precios Gober.	M2	1,53	4%	\$ 33.374,71	\$ 53.105,84	1,53	\$ 53.105,84
4,04	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	Precios Gober.	M2	32,34	4%	\$ 13.629,00	\$ 458.392,33	32,34	\$ 458.392,33
4,05	CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18	Cotización	ML	138,60		\$ 49.390,38	\$ 6.845.506,67	138,60	\$ 6.845.506,67
4,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	Cotización	M2	145,77		\$ 119.304,46	\$ 17.391.011,13	145,77	\$ 17.391.011,13
4,07	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	Cotización	ML	11,30		\$ 99.176,65	\$ 1.120.696,15	11,30	\$ 1.120.696,15
4,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	Precios Gober.	ML	11,30	4%	\$ 117.117,01	\$ 1.376.359,10	11,30	\$ 1.376.359,10
4,09	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	Precios Gober.	M2	32,00	4%	\$ 51.834,72	\$ 1.725.059,48	32,00	\$ 1.725.059,48
4,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	Precios Gober.	M2	15,22	4%	\$ 238.795,70	\$ 3.779.849,38	15,22	\$ 3.779.849,38
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 18 (Incluye marco, bisagras y pintura)	Cotización	M2	4,20		\$ 401.082,39	\$ 1.684.546,04	4,20	\$ 1.684.546,04
4,12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Precios Gober.	M2	29,90	4%	\$ 25.187,68	\$ 783.236,10	29,90	\$ 783.236,10
4,13	ESTUCCO MUROS	Precios Gober.	M2	29,90	4%	\$ 10.155,28	\$ 315.788,59	29,90	\$ 315.788,59
4,14	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Precios Gober.	M2	113,70	4%	\$ 17.576,11	\$ 2.078.339,86	113,70	\$ 2.078.339,86
4,15	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	Precios Gober.	M2	220,44	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.363.155,24	220,44	\$ 2.363.155,24
4,16	CIELO RASO EN PVC	Cotización	M2	115,96		\$ 71.719,83	\$ 8.316.631,49	115,96	\$ 8.316.631,49
4,17	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	Precios Gober.	KG	481,04	4%	\$ 225,00	\$ 112.563,36	481,04	\$ 112.563,36
						COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 50.276.929,00		\$ 50.276.929,00
						A	\$ 12.569.232,25		\$ 12.569.232,25
						I	\$ 1.005.538,58		\$ 1.005.538,58
						U	\$ 1.508.307,87		\$ 1.508.307,87
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
5						TIPO:	OBRA PÚBLICA		
5,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	Precios Gober.	METRO CUADRO	128,20	4%	\$ 10.307,86	\$ 1.374.326,36	128,20	\$ 1.374.326,36



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

5,02	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Precios Gober.	METRO CUADRADO	9,00	4%	\$ 20.004,61	\$ 187.243,15	9,00	\$ 187.243,15
5,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	Precios Gober.	METRO LINEAL	49,50	4%	\$ 14.773,22	\$ 760.525,37	49,50	\$ 760.525,37
5,04	ESTUCO MUROS	Precios Gober.	METRO CUADRADO	3,20	4%	\$ 10.155,28	\$ 33.796,77	3,20	\$ 33.796,77
COSTO DIRECTO GRUPO							\$ 2.355.891,65		\$ 2.355.891,65
							A	\$ 588.972,91	\$ 588.972,91
							I	\$ 47.117,83	\$ 47.117,83
							U	\$ 70.676,75	\$ 70.676,75
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
6	HOSPITALIZACION					TIPO:	OBRA PÚBLICA		
6,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gober.	M2	432,72	4%	\$ 10.307,86	\$ 4.638.833,87	432,72	\$ 4.638.833,87
6,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Precios Gober.	M2	156,52	4%	\$ 17.576,11	\$ 2.861.053,25	156,52	\$ 2.861.053,25
6,03	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	M2	213,35	4%	\$ 3.130,72	\$ 694.656,68	213,35	\$ 694.656,68
6,04	CIELO RASO EN PVC	Cotización	M2	213,35		\$ 71.719,83	\$ 15.301.425,73	213,35	\$ 15.301.425,73
6,05	ESTUCO MUROS	Precios Gober.	M2	48,21	4%	\$ 10.155,28	\$ 509.169,49	48,21	\$ 509.169,49
6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	Cotización	UND	21,00		\$ 38.115,49	\$ 800.425,29	21,00	\$ 800.425,29
6,07	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	Precios Gober.	ML	126,10	4%	\$ 14.773,22	\$ 1.937.419,16	126,10	\$ 1.937.419,16
COSTO DIRECTO GRUPO							\$ 26.742.983,47		\$ 26.742.983,47
							A	\$ 6.685.745,87	\$ 6.685.745,87
							I	\$ 534.859,67	\$ 534.859,67
							U	\$ 802.289,50	\$ 802.289,50
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
7						TIPO:	OBRA PÚBLICA		
7,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gober.	METRO CUADRADO	119,09	4%	\$ 10.307,86	\$ 1.276.665,57	119,09	\$ 1.276.665,57
7,02	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Precios Gober.	METRO CUADRADO	108,76	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.988.040,83	108,76	\$ 1.988.040,83
COSTO DIRECTO GRUPO							\$ 3.264.706,40		\$ 3.264.706,40
							A	\$ 816.176,60	\$ 816.176,60
							I	\$ 65.294,13	\$ 65.294,13
							U	\$ 97.941,19	\$ 97.941,19
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
8						TIPO:	OBRA PÚBLICA		



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

8,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gober.	METRO CUADRA DO	488,08	4%	\$ 10.307,86	\$ 5.232.302,72	488,08	\$ 5.232.302,72
8,02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	Precios Gober.	UNIDAD	1,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 1.579.534,48	1,00	\$ 1.579.534,48
8,03	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	Precios Gober.	METRO LINEAL	6,00	4%	\$ 14.773,22	\$ 92.184,89	6,00	\$ 92.184,89
8,04	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Precios Gober.	METRO CUADRA DO	8,00	4%	\$ 20.004,61	\$ 166.438,36	8,00	\$ 166.438,36
8,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	Cotización	UNIDAD	5,00		\$ 38.115,49	\$ 190.577,45	5,00	\$ 190.577,45
COSTO DIRECTO GRUPO							\$ 7.261.037,90		\$ 7.261.037,90
							A	\$ 1.815.259,48	\$ 1.815.259,48
							I	\$ 145.220,76	\$ 145.220,76
							U	\$ 217.831,14	\$ 217.831,14
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
9						TIPO:	OBRA PÚBLICA		
9,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gober.	METRO CUADRA DO	435,57	4%	\$ 10.307,86	\$ 4.669.386,36	435,57	\$ 4.669.386,36
9,02	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	Precios Gober.	METRO CUADRA DO	19,74	4%	\$ 13.629,00	\$ 279.797,92	19,74	\$ 279.797,92
9,03	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	Precios Gober.	UNIDAD	10,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 15.795.344,76	10,00	\$ 15.795.344,76
9,04	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	Precios Gober.	METRO LINEAL	15,60	4%	\$ 14.773,22	\$ 239.680,72	15,60	\$ 239.680,72
COSTO DIRECTO GRUPO							\$ 20.984.209,76		\$ 20.984.209,76
							A	\$ 5.246.052,44	\$ 5.246.052,44
							I	\$ 419.684,20	\$ 419.684,20
							U	\$ 629.526,29	\$ 629.526,29
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
10						TIPO:	OBRA PÚBLICA		
10,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gober.	METRO CUADRA DO	81,61	4%	\$ 10.307,86	\$ 874.873,43	81,61	\$ 874.873,43
10,02	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	Precios Gober.	UNIDAD	1,00	4%	\$ 1.518.783,15	\$ 1.579.534,48	1,00	\$ 1.579.534,48
COSTO DIRECTO GRUPO							\$ 2.454.407,91		\$ 2.454.407,91
							A	\$ 613.601,98	\$ 613.601,98
							I	\$ 49.088,16	\$ 49.088,16
							U	\$ 73.632,24	\$ 73.632,24
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
11						TIPO:	OBRA PÚBLICA		



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



11,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gober.	METRO CUADRA DO	50,82	4%	\$ 10.307,86	\$ 544.799,26	50,82	\$ 544.799,26
							COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 544.799,26	\$ 544.799,26
							A	\$ 136.199,82	\$ 136.199,82
							I	\$ 10.895,99	\$ 10.895,99
							U	\$ 16.343,98	\$ 16.343,98
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
12						TIPO:	OBRA PÚBLICA		
12,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gober.	METRO CUADRA DO	33,55	4%	\$ 10.307,86	\$ 359.661,85	33,55	\$ 359.661,85
							COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 359.661,85	\$ 359.661,85
							A	\$ 89.915,46	\$ 89.915,46
							I	\$ 7.193,24	\$ 7.193,24
							U	\$ 10.789,86	\$ 10.789,86
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
13						TIPO:	OBRA PÚBLICA		
13,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gober.	METRO CUADRA DO	233,63	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.504.554,35	233,63	\$ 2.504.554,35
13,02	ESTUCO MUROS	Precios Gober.	METRO CUADRA DO	29,13	4%	\$ 10.155,28	\$ 307.656,24	29,13	\$ 307.656,24
							COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 2.812.210,59	\$ 2.812.210,59
							A	\$ 703.052,65	\$ 703.052,65
							I	\$ 56.244,21	\$ 56.244,21
							U	\$ 84.366,32	\$ 84.366,32
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
14						TIPO:	OBRA PÚBLICA		
14,01	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gober.	METRO CUADRA DO	246,87	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.646.489,45	246,87	\$ 2.646.489,45
14,02	ESTUCO MUROS	Precios Gober.	METRO CUADRA DO	10,80	4%	\$ 10.155,28	\$ 114.064,10	10,80	\$ 114.064,10
14,03	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Precios Gober.	METRO CUADRA DO	58,31	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.065.857,49	58,31	\$ 1.065.857,49
							COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 3.826.411,04	\$ 3.826.411,04
							A	\$ 956.602,76	\$ 956.602,76
							I	\$ 76.528,22	\$ 76.528,22
							U	\$ 114.792,33	\$ 114.792,33
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



15						TIPO:	OBRA PÚBLICA		
15,01	VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Precios Gober.	METRO CUADRA DO	211,31	4%	\$ 10.307,86	\$ 2.265.280,05	211,31	\$ 2.265.280,05
15,02	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	Precios Gober.	METRO LINEAL	19,70	4%	\$ 14.773,22	\$ 302.673,73	19,70	\$ 302.673,73
15,03	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	Precios Gober.	METRO CUADRA DO	45,90	4%	\$ 16.684,41	\$ 796.447,00	45,90	\$ 796.447,00
15,04	ESTUCO MUROS	Precios Gober.	METRO CUADRA DO	12,50	4%	\$ 10.155,28	\$ 132.018,64	12,50	\$ 132.018,64
COSTO DIRECTO GRUPO							\$ 3.496.419,42		\$ 3.496.419,42
A							\$ 874.104,86		\$ 874.104,86
I							\$ 69.928,39		\$ 69.928,39
U							\$ 104.892,58		\$ 104.892,58

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
16						TIPO:	OBRA PÚBLICA		
16,01	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Precios Gober.	METRO CUADRA DO	78,11	4%	\$ 17.576,11	\$ 1.427.784,75	78,11	\$ 1.427.784,75
16,02	ESTUCO MUROS	Precios Gober.	METRO CUADRA DO	5,94	4%	\$ 10.155,28	\$ 62.735,26	5,94	\$ 62.735,26
COSTO DIRECTO GRUPO							\$ 1.490.520,01		\$ 1.490.520,01
A							\$ 372.630,00		\$ 372.630,00
I							\$ 29.810,40		\$ 29.810,40
U							\$ 44.715,60		\$ 44.715,60

INFORMACIÓN CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	474.447.636,00	\$	474.447.636,00
----------------------------	----	-----------------------	----	-----------------------

Bienes	
Servicios	\$ -
Obra Pública	\$ 474.447.636,00

TOTAL COSTO INDIRECTO	\$	142.334.291,00	\$	142.334.291,00
------------------------------	----	-----------------------	----	-----------------------

OBRA PÚBLICA					
Administración	25%	\$ 118.611.909,00		\$ 118.611.909,00	
imprevistos	2%	\$ 9.488.953,00	A+I+U	\$ 142.334.291,00	\$ 9.488.953,00
Utilidad	3%	\$ 14.233.429,00			\$ 14.233.429,00



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



CERTIFICACIONES					
		RETIE + RETILAP	\$ -		
BIENES					
IVA Equipos Especiales	19%	\$ -	IVA	\$ -	
TOTAL		\$	616.781.927,00	\$	616.781.927,00
100,00%					

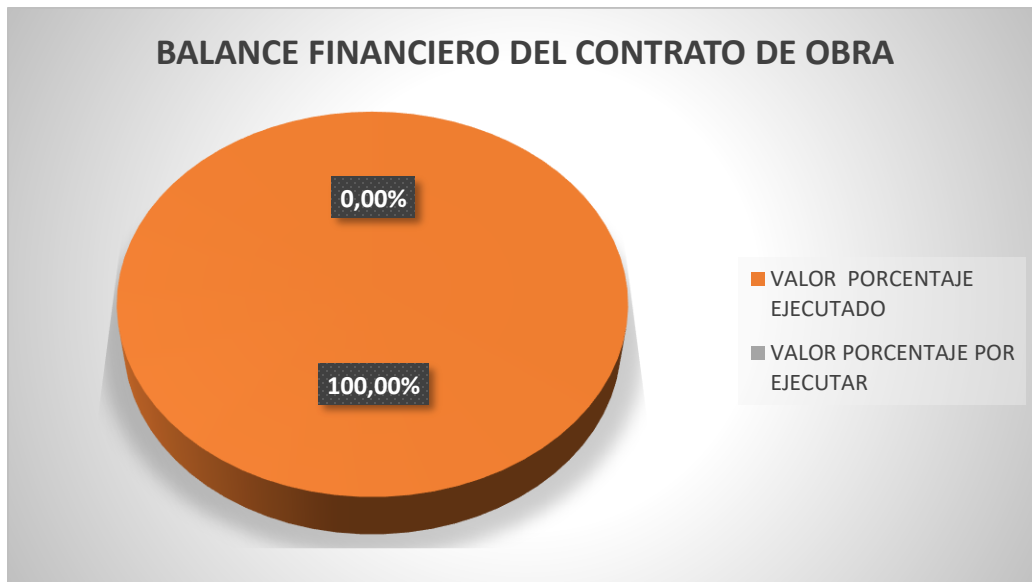


Ilustración 4. Avance financiero

La ilustración muestra el gasto realizado durante los 61 días de ejecución, dividido en cada una de las actividades para un mejor seguimiento, se observa un porcentaje de ejecución financiera del 100% correspondiente a **SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$ 616.781.926,00) M/CTE.**, para lo cual se realiza la ejecución de las actividades establecidas en la minuta del contrato de obra pública N° 361-2025.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



12.6. Avance plazo contractual

Con respecto al plazo contractual, de los setenta y cinco (75) Días establecidos en la minuta del contrato, y de acuerdo al acta de recibo final anticipada por ha transcurrido sesenta y un (61) días tiempo que corresponde a la fecha de corte del presente informe, lo cual equivale a un 100,00% del total del plazo contractual.

Ilustración 5. Avance en tiempo

AVANCE EN TIEMPO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	
PLAZO INICIAL	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO EN DÍAS	75
PLAZO EN DÍAS ACTUALIZADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL ANTICIPADA	61
DÍAS TRABAJADOS	61
PORCENTAJE TOTAL	100,00%
ACUMULADOS PLAZO INICIAL % DE TIEMPO	
PERIODO DEL 16/10/2025 A 15/11/2025	49,18%
PERIODO DEL 16/11/2025 A 15/12/2025	50,82%
ACUMULADO TOTAL	100,00%
TIEMPO RESTANTE	0,00%



322 7230347




frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



Ilustración 6. Relación de avance en tiempo del contrato de obra No. 361-2025

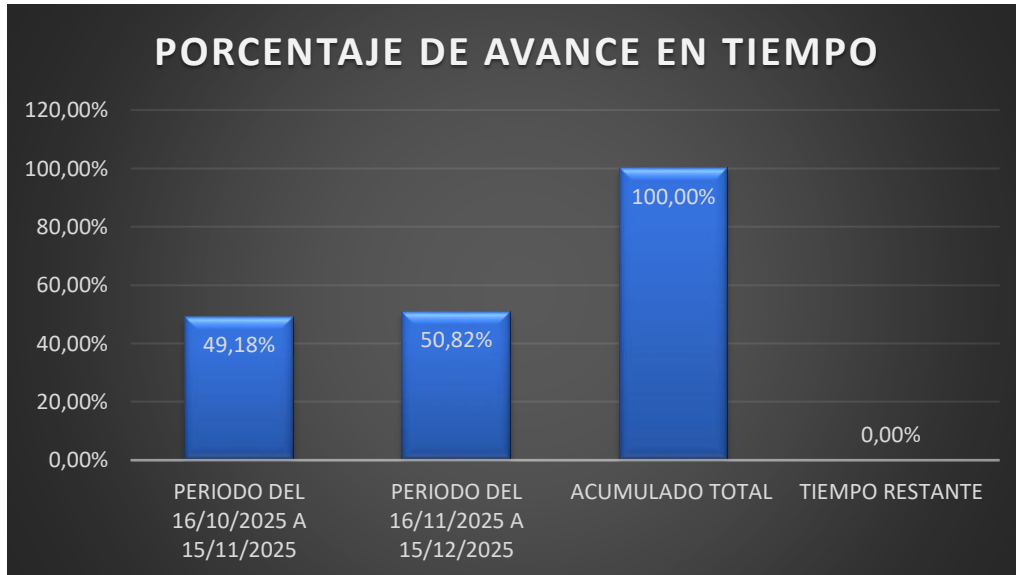

13. SITUACIONES ADVERSAS

Durante el periodo evaluado, la interventoría efectuó la revisión de la programación de obra, las actividades ejecutadas y las condiciones ambientales que incidieron en el desarrollo del proyecto. Como resultado de este análisis, se identificaron situaciones adversas que afectaron la continuidad y el rendimiento de las actividades programadas.

En el transcurso del presente periodo se registraron precipitaciones constantes, según lo verificado en las bitácoras de obra correspondientes a los días 27/10/2025, 29/10/2025, 30/10/2025, 04/11/2025, 05/11/2025, 08/11/2025, 10/11/2025 y 11/11/2025, condiciones climatológicas que impidieron el normal desarrollo de varias actividades constructivas.

Las lluvias continuas generaron condiciones de humedad y riesgo en la zona de intervención, lo cual imposibilitó la ejecución segura y eficiente de las siguientes actividades contempladas dentro del cronograma contractual:

- Desmonte de cubiertas en teja de asbesto y/o asbesto-cemento.
- Desmonte de cubierta en lámina.
- Suministro e instalación de teja termoacústica tipo trapezoidal A360.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



- Instalación de caballete en teja termoacústica A360 con ancho de 0,70 m.
- Limpieza de viga canal en concreto (área interna).
- Impermeabilización de viga canal en concreto.
- Aplicación de pintura en fachada con acabado tipo vinilo para exteriores.
- Mantenimiento del cerramiento existente en tubería metálica cuadrada de 1”.

Estas condiciones climáticas adversas ocasionaron retrasos en la ruta crítica del proyecto, debido a que las actividades mencionadas requieren condiciones secas para garantizar su adecuada ejecución, adherencia de materiales, seguridad del personal y calidad final de la obra. Así mismo, se evidenció un incremento en tiempos improductivos y en horas hombre y horas máquina asociadas a la suspensión temporal de labores y a las acciones de protección y alistamiento necesarias antes y después de los eventos de lluvia.

La interventoría deja constancia de estas afectaciones, reiterando que las condiciones climáticas constituyen un factor externo que incide directamente en la ejecución del cronograma y en el desempeño de las actividades técnicas programadas, razón por la cual se recomienda su análisis para efectos de ajustes en la programación y seguimiento contractual.

Ilustración 7. Imprevistos presentados en el periodo



14. MATERIAL DE OBRA – BODEGA

Para el desarrollo adecuado de las actividades constructivas, se dispuso una bodega destinada exclusivamente al acopio y protección del material de obra. Dicho espacio garantiza condiciones óptimas de almacenamiento, priorizando que los insumos permanezcan en un ambiente seco,



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ordenado y seguro, con el fin de preservar sus propiedades y asegurar su correcta utilización durante la ejecución del proyecto. A continuación, se presenta el registro fotográfico correspondiente al almacenamiento y organización del material dentro de la bodega por parte del contratista.



Ilustración 8. Acopio de material y bodega de obra

15. ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME


A continuación, se presentan las actividades realizadas durante el periodo del presente informe:


1. AREA EXTERIOR


ÍTEM 1,01 LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO

En este ítem se ubicó y marco en el terreno o superficie de construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en el plano del proyecto, así como los linderos del mismo.

ACTIVIDAD:	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO		
ITEM: 1.01.			UNIDAD: M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1855.92		CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA: 1855.92
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	1855.92		CANTIDAD POR EJECUTAR: 0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%		PORCENTAJE POR EJECUTAR: 0,00%

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




2,00 CUBIERTAS Y DRENAJES


ÍTEM 2,01 LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)


Esta actividad fue medida en metros cúbicos según el presupuesto teniendo en cuenta el área excavación mecánica.

ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)		
ITEM: 2.01		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	857.50	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	857.50
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	857.50	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 2,02 IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO

Esta actividad fue cuantificada en metros cuadrados conforme al presupuesto, considerando el metraje de conformación, nivelación y compactación de subrasante.

ACTIVIDAD:	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO		
ITEM: 2.02			UNIDAD: M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	857.50	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	857.50
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	857.50	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



FRASCING S.A.S

ÍTEM 2,03 DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO

ACTIVIDAD:	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO		
ITEM: 2.03			UNIDAD: M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	450,00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	450,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	450,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 2,04 DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA

ACTIVIDAD:	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA		
ITEM: 2.04		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	683,50	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	683,50
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	683,50	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



ÍTEM 2,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPOTRAPEZOIDAL A360

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360		
ITEM: 2.05		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1133,50	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	1133,50



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	1133,50	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



ÍTEM 2,06 CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M

ACTIVIDAD:	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M		
ITEM: 2.06		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	235.75	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	235.75
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	235.75	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



ÍTEM 2,07 DESMONTE CANALES - BAJANTES

ACTIVIDAD:	DESMONTE CANALES - BAJANTES.	
ITEM: 2.07		UNIDAD: ML



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	9.60	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	9.60
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	9.60	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100.00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





ÍTEM 2,08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"		
ITEM: 2.08		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	9.60	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	9.60
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	9.60	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100.00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 2,09 LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO


ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO		
ITEM: 2.09		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	473.32	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	473.32
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	473.32	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100.00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





ÍTEM 2,10 PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA

ACTIVIDAD:	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA		
ITEM: 2.10		UNIDAD: KG	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	2661.42	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	2661.42
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	2661.42	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100.00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 2,11 TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM


ACTIVIDAD:	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM		
ITEM: 2.11		UNIDAD: KG	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	3058.75	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	3058.75
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	3058.75	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100.00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





3,00 ADMINISTRACIÓN

ÍTEM 3,01 ESTUCO MUROS

ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS		
ITEM: 3.01		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	2.80	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	2.80
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	2.80	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




ÍTEM 3,02 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES


ACTIVIDAD:	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES		
ITEM: 3.02		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	37.58	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	37.58
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	37.58	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%




ÍTEM 3,03 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO		
ITEM: 3.03		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	477.26	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	477.26
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	477.26	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com


 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





FRASCING S.A.S

ÍTEM 3,04 ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS

ACTIVIDAD:	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS		
ITEM: 3.04		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	40.13	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	40.13
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	40.13	CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

 322 7230347


 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




ÍTEM 3,05 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS


ACTIVIDAD:	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS		
ITEM: 3.05		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	56.11	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	56.11
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	56.11	CANTIDAD POR EJECUTAR	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

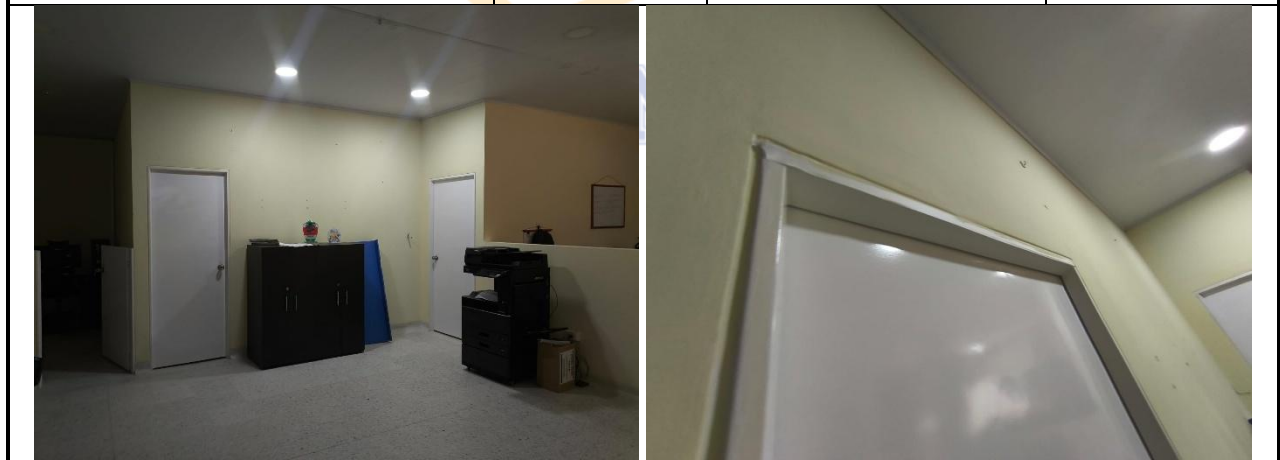


ÍTEM 3,06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W		
ITEM: 3.06		UNIDAD: ML	

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	8.00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	8.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	8.00	CANTIDAD POR EJECUTAR	0
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%





4,00 ARCHIVO - ALMACEN


ÍTEM 4,01 DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.

ACTIVIDAD:	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.		
ITEM: 4.01		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	145,77	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	145,77
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	145,77	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 4,02 DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.

ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts		
ITEM: 4.02		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	4.53	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	4.53
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	4.53	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



ÍTEM 4,03 DEMOLICIÓN MESON CONCRETO

ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO		
ITEM: 4.03		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1.53	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	1.53



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	1.53	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



ÍTEM 4,04 DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS

ACTIVIDAD:	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS		
ITEM: 4.04		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	32.34	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	32.34
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	32.34	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

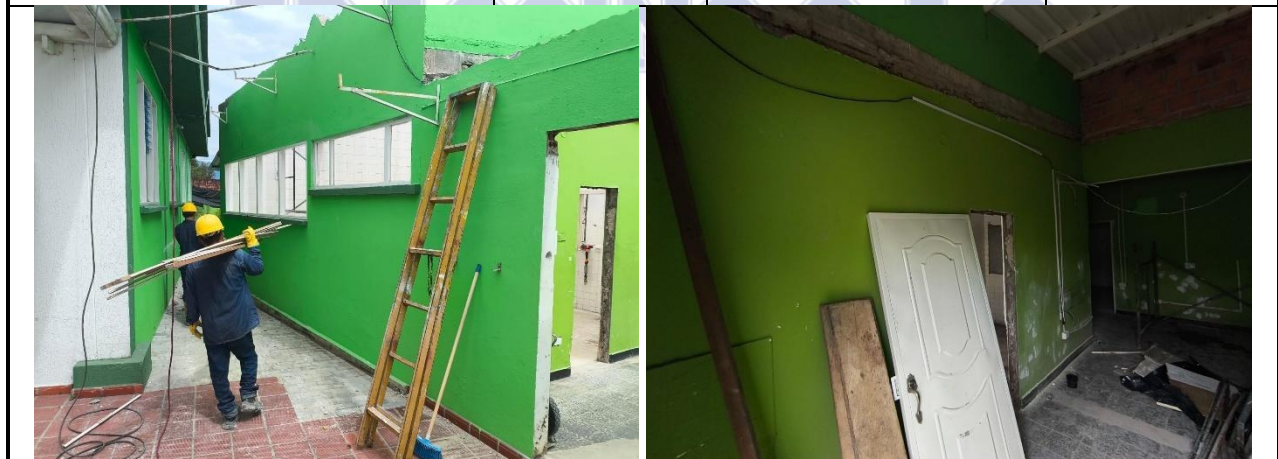

ÍTEM 4,05 CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18

ACTIVIDAD:	CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18
------------	---------------------------------------



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ITEM: 4.05		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	138,60	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	138,60
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	138,60	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



ÍTEM 4,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360		
ITEM: 4.06	UNIDAD: M2		
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	145.77	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	145.77
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	145.77	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



322 7230347




frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





ÍTEM 4,07 CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M


ACTIVIDAD:	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M		
ITEM: 4.07		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	11.30	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	11.30
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	11.30	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%
			

ÍTEM 4,08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"		
ITEM: 4.08		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	11.30	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	11.30
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	11.30	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com


 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





ÍTEM 4,09 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS

ACTIVIDAD:	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS		
ITEM: 4.09		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	32.00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	32.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	32.00	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 4,10 SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR

ACTIVIDAD:	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR		
ITEM: 4.10		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	15.22	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	15.22
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	15.22	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



ÍTEM 4,11 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 18 (Incluye marco, bisagras y pintura)

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 18 (Incluye marco, bisagras y pintura)	
ITEM: 4.11		UNIDAD: M2



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	4.20	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	4.20
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	4.20	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%





ÍTEM 4,12 PAÑETE LISO MUROS 1:4

ACTIVIDAD:	PAÑETE LISO MUROS 1:4		
ITEM: 4.12		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	29.90	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	29.90
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	29.90	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




ÍTEM 4,13 ESTUCO MUROS


ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS		
ITEM: 4.13		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	29.90	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	29.90
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	29.90	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%




ÍTEM 4,14 PINTURA FACHADA EN VINOLO PARA EXTERIORES

ACTIVIDAD:	PINTURA FACHADA EN VINOLO PARA EXTERIORES		
ITEM: 4.14		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	113.70	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	113.70
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	113.70	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com


 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





ÍTEM 4,15 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO


ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO		
ITEM: 4.15		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	220,44	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	220,44
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	220,44	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso

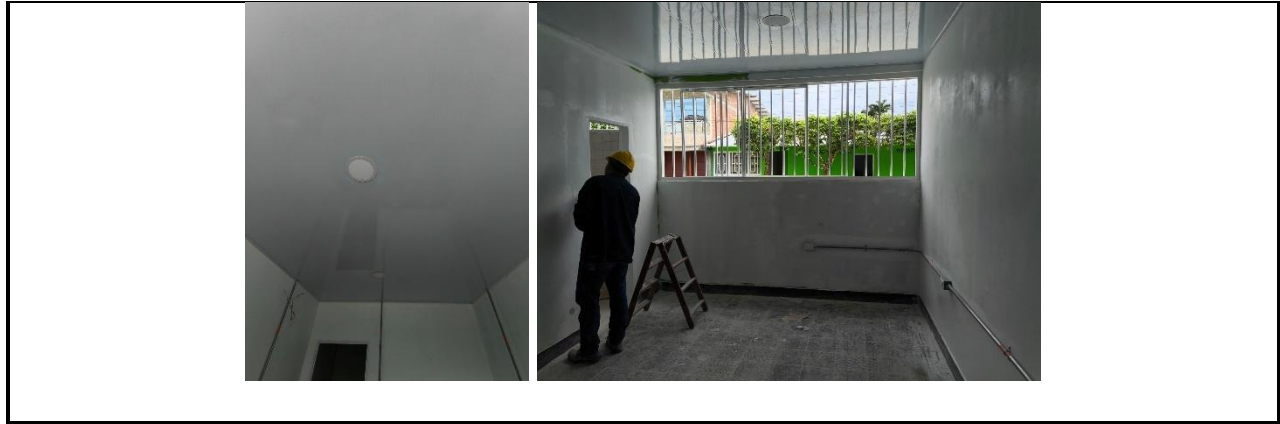

ÍTEM 4,16 CIELO RAZO EN PVC

ACTIVIDAD:	CIELO RAZO EN PVC		
ITEM: 4.15		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	220,44	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	220,44
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	220,44	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

ÍTEM 4,17 TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM

ACTIVIDAD:	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM		
ITEM: 4.17		UNIDAD: KG	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	481,04	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	481,04
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	481,04	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

5,00 SALA DE AUTOPSIAS

ÍTEM 5,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO		
ITEM: 5,01		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	128.20	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	128.20
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	128.20	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



ÍTEM 5,02 ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS

ACTIVIDAD:	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS		
ITEM: 5,02		UNIDAD: M2	



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	9.00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	9.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	9.00	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%





ÍTEM 5,03 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS

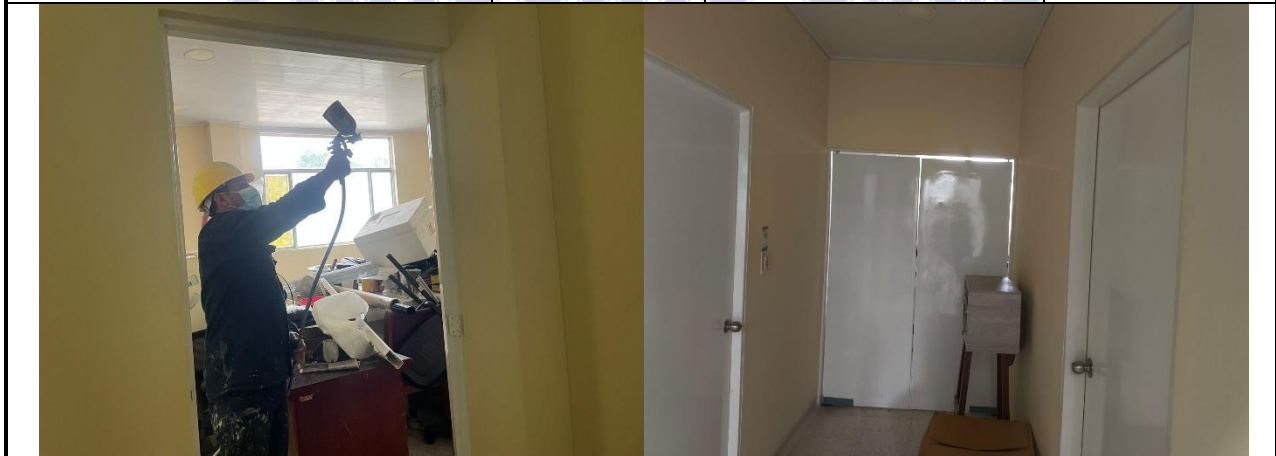ACTIVIDAD:	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS		
ITEM: 5,03		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	49.50	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	49.50
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	49.50	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%




 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




ÍTEM 5,04 ESTUCO MUROS


ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS		
ITEM: 5,04	UNIDAD: M2		
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	3.20	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	3.20
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	3.20	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%
			


6,00 HOSPITALIZACIÓN

ÍTEM 6,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO		
ITEM: 6,01	UNIDAD: M2		
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	432,72	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	432,72
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	432,72	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

ÍTEM 6,02 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES

ACTIVIDAD:	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES		
ITEM: 6,02		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	156.52	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	156.52
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	156.52	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 6,03 DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)

ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)		
ITEM: 6,03		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	213.35	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	213.35
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	213.35	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



ÍTEM 6,04 CIELO RASO EN PVC

ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)		
ITEM: 6,04		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	213.35	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	213.35



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	213.35	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



ÍTEM 6,05 ESTUCO MUROS

ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS		
ITEM: 6,05		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	48.21	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	48.21
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	48.21	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

ÍTEM 6,06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W		
ITEM: 6,06		UNIDAD:	UND
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	21.00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	21.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	21.00	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com




Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





ÍTEM 6,07 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS

ACTIVIDAD:	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS		
ITEM: 6,07		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	126.10	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	126.10
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	126.10	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



7,00 PARTOS Y CIRUJIAS


ÍTEM 7,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO


ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO		
ITEM: 7,01			UNIDAD: M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	119,09	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	119,09
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	119,09	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%




ÍTEM 7,02 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES

ACTIVIDAD:	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES		
ITEM: 7,02			UNIDAD: M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	108.76	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	108.76
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	108.76	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com


 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



8,00 URGENCIAS

ÍTEM 8,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINOLO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO		
ITEM: 8,01		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	488.08	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	488.08
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	488.08	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

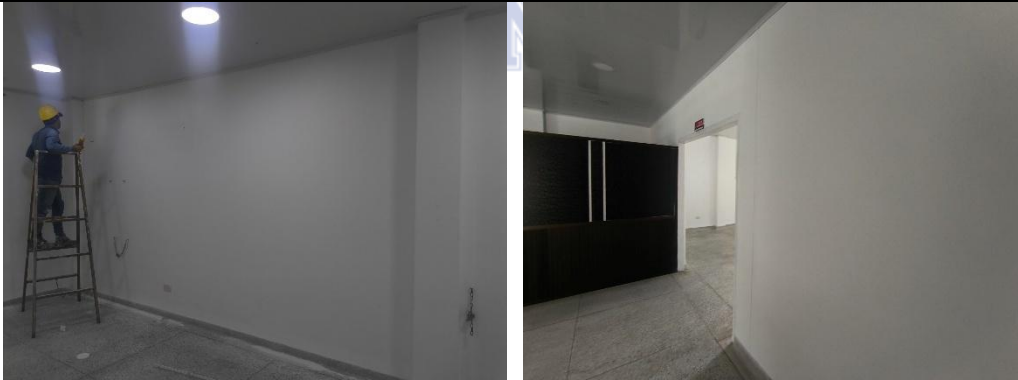

322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




ÍTEM 8,02 PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM


ACTIVIDAD:	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM		
ITEM: 8,02		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1,00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	1,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	1,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%




ÍTEM 8,03 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS



ACTIVIDAD:	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS		
ITEM: 8,03		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	6,00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	6,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	6,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00

 322 7230347



 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%
			

ÍTEM 8,04 ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS

ACTIVIDAD:	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS		
ITEM: 8,04		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	8,00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	8,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	8,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%
			



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 8,05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W


ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W		
ITEM: 8,05		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	5,00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	5,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	5,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%





9,00 CONSULTA EXTERNA


ÍTEM 9,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO		
ITEM: 9,01		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	435,57	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	435,57
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	435,57	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

 322 7230347


 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso

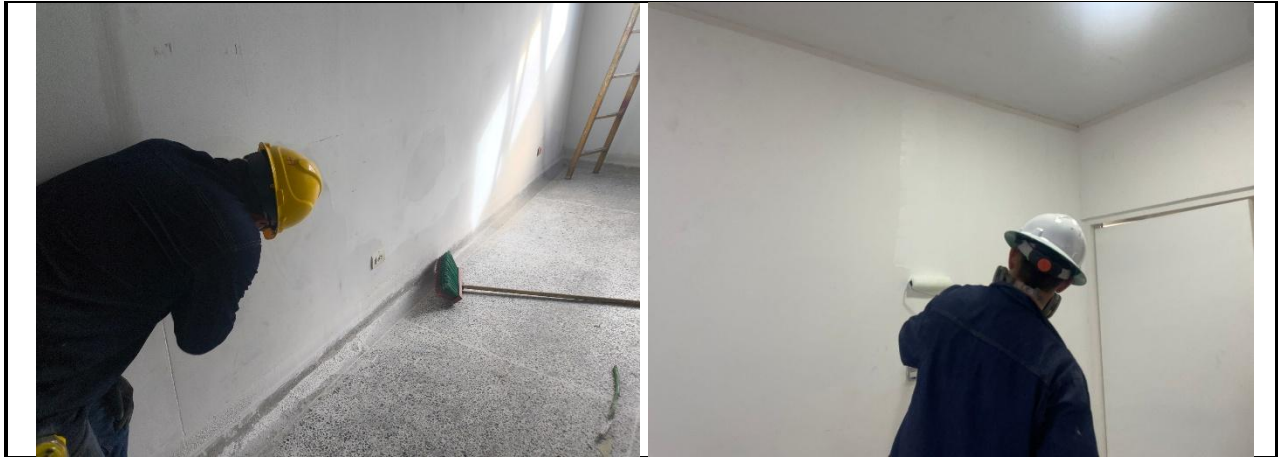

ÍTEM 9,02 DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS

ACTIVIDAD:	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS		
ITEM: 9,02		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	19,74	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	19,74
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	19,74	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

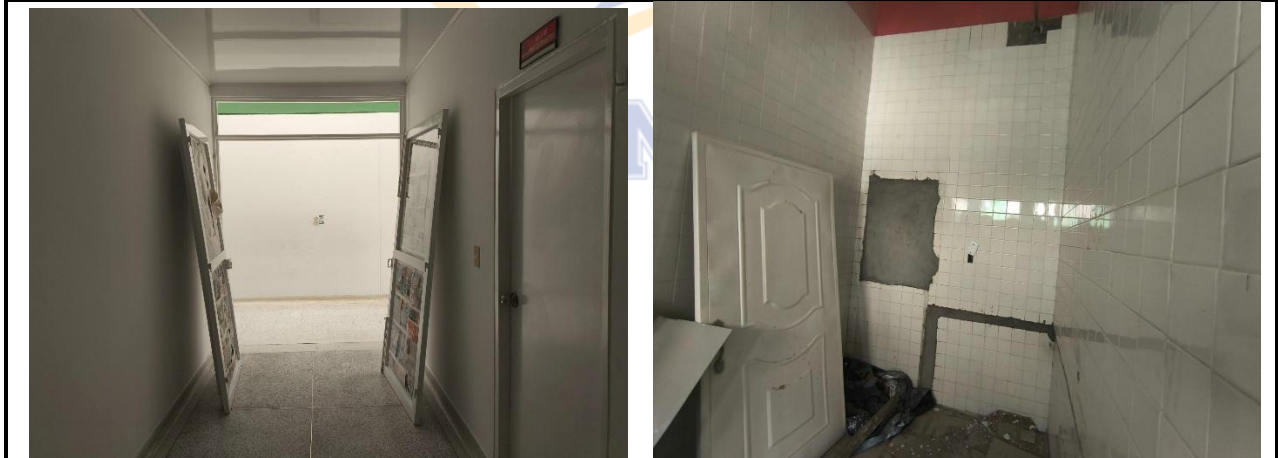

ÍTEM 9,03 PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM

ACTIVIDAD:	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM		
ITEM: 9,03		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	10,00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	10,00



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	10,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

ÍTEM 9,04 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS

ACTIVIDAD:	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS		
ITEM: 9,03		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	15,60	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	15,60
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	15,60	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

322 7230347

frascingsas@gmail.com

Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



10,00 VACUNACIÓN


ÍTEM 10,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO


ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO		
ITEM: 10,01		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	81,61	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	81,61
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	81,61	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%




ÍTEM 10,02 PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM

ACTIVIDAD:	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM		
ITEM: 10,02		UNIDAD: UND	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1,00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	1,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	1,00	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



11,00 SALA DE RAYOS X

ÍTEM 11,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO		
ITEM: 10,01		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	50,82	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	50,82
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	50,82	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



12,00 CITAS

ÍTEM 12,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO		
ITEM: 12,01			UNIDAD: M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	33,55	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	33,55
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	33,55	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%





13,00 COCINA Y LAVANDERIA


FRASCING S.A.S

ÍTEM 13,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO		
ITEM: 13,01			UNIDAD: M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	233,63	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	233,63
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	233,63	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 13,02 ESTUCO MUROS

ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS		
ITEM: 13,02		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	29,13	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	29,13
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	29,13	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



14,00 TERAPIA FISICA

ÍTEM 14,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO
------------	----------------------------------------------------



322 7230347




frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





ITEM: 14,01		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	246,87	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	246,87
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	246,87	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

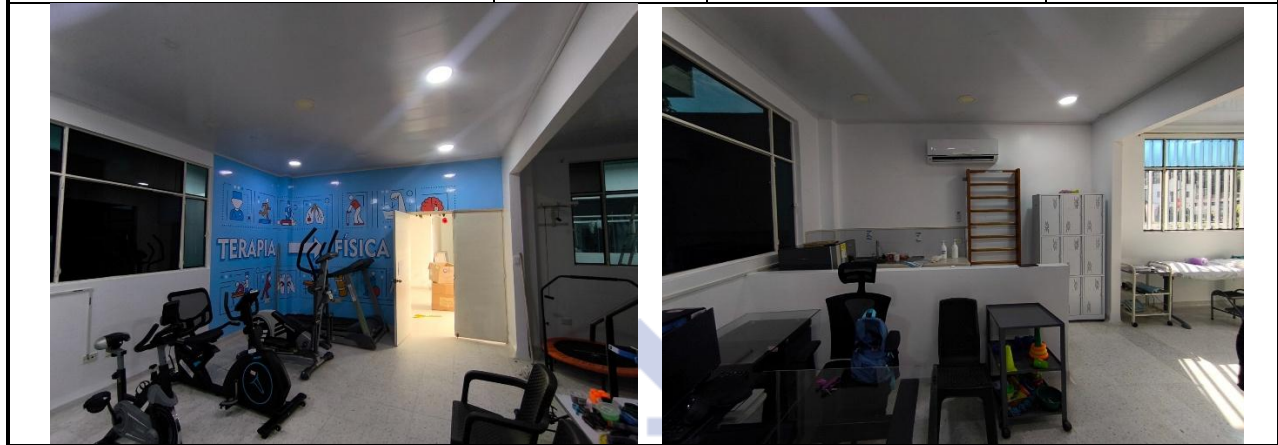



ÍTEM 14,02 ESTUCO MUROS

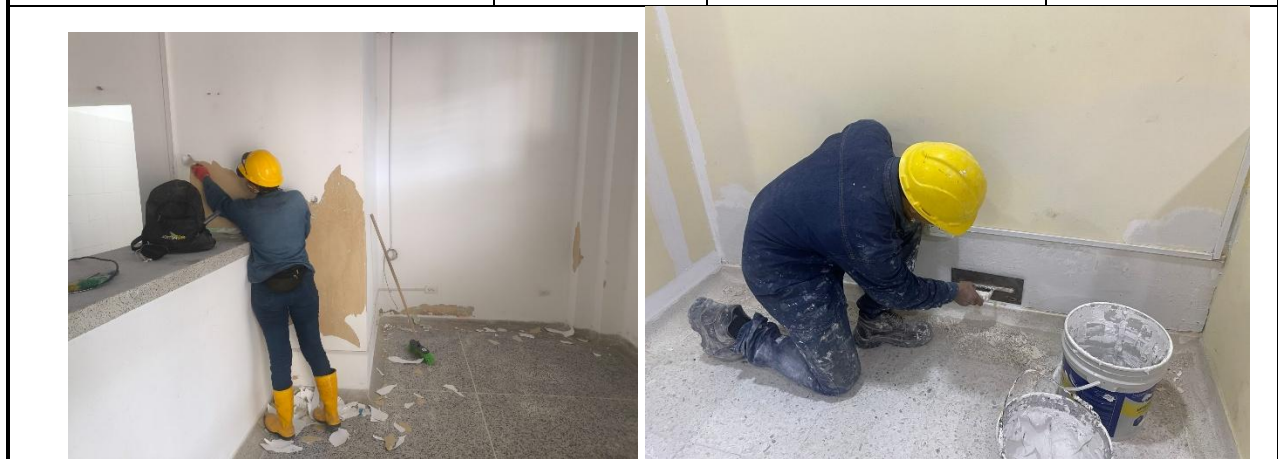ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS		
ITEM: 14,02		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	10,80	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	10,80
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	10,80	CANTIDAD POR EJECUTAR:	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 14,03 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES

ACTIVIDAD:	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES		
ITEM: 14,03		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	58,31	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	58,31
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	58,31	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



15,00 PARQUEADERO AMBULANCIAS



ÍTEM 15,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO		
ITEM: 15,01		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	211,31	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	211,31
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	211,31	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 15,02 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS

ACTIVIDAD:	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS		
ITEM: 14,03		UNIDAD: ML	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	19,70	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	19,70
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	19,70	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



ÍTEM 15,03 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS

ACTIVIDAD:	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	
ITEM: 15,03		UNIDAD: M2



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	45,90	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	45,90
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	45,90	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



ÍTEM 15,04 ESTUCO MUROS

ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS		
ITEM: 15,04		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	12,50	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	12,50
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	12,50	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



16,00 AREA DE SECADO


ÍTEM 16,01 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES


ACTIVIDAD:	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES		
ITEM: 16,01		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	78,11	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	78,11
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	78,11	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%




ÍTEM 16,02 ESTUCO MUROS

ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS		
ITEM: 16,02		UNIDAD: M2	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	5,94	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	5,94
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	5,94	CANTIDAD POR EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0.00%

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



16. ASPECTOS FINANCIEROS

16.1. Manejo del anticipo

De acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y la modalidad de pago correspondiente, Para el periodo del presente informe el contratista de obra CONSTRUINDUCIVIL SAS, no presento ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA plan de inversión del anticipo:

FRASCING S.A.S

17. ASPECTOS AMBIENTALES

17.1. Seguimiento a permisos y/o licencias ambientales

Para el presente proyecto no se requirieron permisos y/o licencias ambientales.

18. ASPECTOS GENERALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

18.1. Alcance de la interventoría

El informe tiene un alcance que incluye el fortalecimiento de la calidad de cada uno de los componentes del proyecto los cuales son:



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



Tabla 16. Componentes del proyecto.

COMPONENTES DEL PROYECTO
Verificación de la calidad de los materiales utilizados.
Aseguramiento de la idoneidad profesional y técnica del personal vinculado a la ejecución del proyecto.
Compromiso en la entrega y presentación de la información requerida por la ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA .
Buena comunicación en los canales y medios de comunicación internos y externos establecidos con el contratista y la entidad contratante.
Control de documentos y registros.

De acuerdo con el plan de trabajo elaborado por parte de la interventoría, se documentó todas las etapas de la obra verificando que cumplan con la calidad exigida.

Los documentos elaborados para dar cumplimiento al plan de trabajo de la interventoría son:

- o Registro fotográfico
- o Informes de avances para cortes de obra
- o Actas de ejecución (comités, contractuales entre otros.)
- o Bitácora de Obra
- o Comunicaciones internas y externas escritas
- o Acciones preventivas correctivas (Mejoramiento continuo).

18.2. Interventoría técnica

Mediante el contrato de Consultoría No. 469-2025, a cargo de FANNY KATHERIN BARRERA CORREA, realiza el control pertinente de calidad y cantidad de los materiales suministrados por los diferentes proveedores así, como de los trabajos que se fueron ejecutados según ítems contratados. Velar por el buen cumplimiento del plan de trabajo presentado por parte de la empresa CONSTRUINDUCIVIL SAS.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



18.3. Interventoría administrativa

La Interventoría debe realizar el control y vigilancia del personal, equipos y recursos que son utilizados para la ejecución del proyecto por parte del Contratista, y exigir el cumplimiento de las leyes en cuando a la incorporación del personal a los sistemas de Seguridad Social.

18.4. Interventoría financiera

La interventoría realiza control y vigilancia al cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), conceptuar sobre la aprobación de precios de ítems no previstos, revisar y comprobar que los soportes de gastos como facturas, comprobantes de egreso, documentos equivalentes y demás, estén bien elaborados; efectuar un seguimiento permanente a los costos del proyecto lo cual incluye contrataciones y ejecuciones de cada uno.

18.5. Funciones de la interventoría

Tabla 17. Supervisión técnica.

SUPERVISIÓN TÉCNICA				
	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE
1	Visita inicial al sitio de la obra	Se Verificó el sitio donde se ejecutarían las obras (contratista e interventoría). Se realizó una Descripción de las actividades preliminares y generales del proyecto.	Al inicio de la obra	Residente de Interventoría
2	Seguimiento diario a la obra	Se realizó Supervisión y chequeos de los métodos constructivos y aprobación de materiales llevando un control del avance diario de obra.	Diaria con la ejecución de la obra	Residente de interventoría.
3	Revisión de cantidades de obra contractuales y planos del proyecto	Se efectuó revisión periódica de cada una de las actividades del proyecto, de acuerdo con los planos, las cantidades contractuales y las cantidades ejecutadas.	Al inicio del contrato y en cada pago de acta o modificación de los planos.	Residente de interventoría.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



4	Elaboración de bitácora de obra	Se llevó Registro de actividades, control, cambios y compromisos acordados. Firmada por ambas partes (contratista e interventoría), cada una de sus hojas foliadas, usando el modelo establecido.	Diaria con la ejecución de la obra desde el inicio hasta que terminó la obra.	Residente de interventoría.
5	Control al programa de obra	Se realizó Verificación al cumplimiento de las cantidades ejecutadas, fechas de inicio y holguras de las actividades del contrato, de acuerdo al cronograma entregado por el contratista.	Semanal en forma detallada con cantidades reales.	Residente de interventoría.
6	Medidas de las actividades ejecutadas durante el periodo	Se efectuó Cuantificación de las medidas de las actividades ejecutadas durante el periodo para memoria de cantidades y control financiero.	De acuerdo a periodicidad de pagos según contrato y solicitud de supervisión.	Residente de interventoría.
7	Ensayos de campo y laboratorio	Se efectuó revisión y aprobación de resultados de ensayos de campo y laboratorio, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas correspondientes y pliego de condiciones	De acuerdo con las especificaciones técnicas o las normas vigentes	Residente de interventoría.
8	Control de equipo utilizado en obra	Se verificó el estado y rendimiento de la maquinaria y del equipo utilizado en la ejecución de la obra, así como el cumplimiento con la cantidad especificada por el contratista en la propuesta y en los análisis de precios unitarios de obra ordinaria	Diaria con la ejecución de la actividad	Residente de interventoría.
9	Control de calidad de materiales, pruebas y ensayos	Se realizó revisión visual de los materiales. Así como Revisión y exigencia de ensayos de laboratorio	Según los pliegos de condiciones, términos de referencia y normas aplicables	Residente de interventoría
10	Elaboración de informes mensuales	Se cumplió con la Elaboración de informes mensuales de interventoría para ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA, dando reporte detallado sobre la ejecución de la obra y los controles técnicos, administrativos y financieros realizados durante el periodo.	Mensual y según requerimiento de la ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA	Residente de interventoría
11	Registro fotográfico	Se realizó un registro fotográfico sobre las actividades y el alcance de la obra.	Diaria con la ejecución de la obra	Residente, de interventoría.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



12	Suspensión temporal de la ejecución de la obra	Se presentaron circunstancias que generaron suspensión de obra y de plazo como lo fueron la ola invernal presentada en el departamento durante el periodo de ejecución del contrato.	No se han presentado suspensiones.	Residente de interventoría.
13	Comunicación de las inconformidades que se presenten en la obra	Se mantuvo Comunicación escrita oportuna al contratista, con relación a las inconformidades que se generaron cuando las actividades no se desarrollaron dentro de los límites permitidos establecidos en las especificaciones técnicas.	Durante todo el periodo de ejecución cuando fue necesario.	Residente de interventoría.
14	Estudiar y recomendar las modificaciones que se consideren convenientes o necesarias para el logro de los objetivos del contrato.	Se realizó comunicación oportuna al contratista, previo visto bueno del dueño del proyecto con relación a las recomendaciones o modificaciones necesarias para cumplir los objetivos del contrato.	Cuando fue necesario durante el periodo de ejecución del contrato.	Residente de interventoría.
15	Comités técnicos de obra	Se realizaron y direccionaron los comités técnicos durante la ejecución de la obra. Se efectuó las actas respectivas de cada comité considerando proyecciones, avance de obra, avance financiero, plazo ejecutado, inquietudes técnicas, obra extra presentada, cambio de obra, dificultades en la ejecución de las actividades, e inquietudes del contratista.	Mensual y extraordinario si se requería.	Residente de interventoría.

Tabla 18. Supervisión administrativa

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA				
	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE
1	Documentos del contrato y demás condiciones contractuales	Se Analizó los pliegos de condiciones, la propuesta del contratista, los documentos de legalización del contrato. De igual manera se verificó el pago de impuestos, la existencia y vigencia de pólizas, el pago de salarios y prestaciones.	Al inicio del proyecto y Cuando fue necesario durante la ejecución de la obra.	Residente de interventoría.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



		Se analizó las hojas de vida de personal de obra y comparar con los propuestos por el contratista.		
2	Plan de calidad y plan de manejo ambiental	Se estudió el plan de manejo ambiental revisando el contenido considerando los términos de referencia y pliegos de condiciones.	No aplica, para las actividades desarrolladas durante el contrato de obra	Residente, de interventoría.
3	Control de personal mano de obra calificada, profesionales y técnicos	Se estuvo al tanto de la afiliación del personal a ARL, EPS, Caja de compensación, verificando el pago de parafiscales, planillas y pago mensual de las responsabilidades anteriores.	Al inicio y durante la ejecución de la obra.	Residente de interventoría.
4	Actas de obra ejecutadas	Con las mediciones realizadas en obra se efectuó la comparación con las cantidades contractuales y teóricas de cada una de las actividades para el control del presupuesto.	Mensual y según términos de referencia o pliegos de condiciones.	Residente de interventoría.
6	Análisis de precios unitarios (APU) de obra extra	Se evaluaron y aprobaron los APU de obra extra, tomando como referencia los precios vigentes en el mercado para los insumos descritos en el APU, manteniendo los salarios y precios básicos de los APU contractuales.	Cuando fue necesario durante la ejecución de la obra.	Residente de interventoría, con el visto bueno del contratante.
7	Subcontratos	Se evaluaron y aprobaron subcontratos en actividades que lo requerían por ser especializadas, como las instalaciones eléctricas y la cubierta.	Antes de realizarse las actividades	Residente de interventoría.
8	Correspondencia enviada y recibida	Se tiene archivo y control de toda la correspondencia enviada y recibida. Se involucra la correspondencia del proyecto, oficios remisorios, solicitudes del contratista o al propietario del proyecto, memorandos, etc., entre el contratista – interventoría o viceversa.	Durante todo el tiempo de ejecución de la obra.	Residente de interventoría.
9	Actas del proyecto	Se elaboraron acta de inicio, acta de suspensión, acta de prórroga a la suspensión, acta de reinicio, y acta de adición en tiempo.	Al inicio de la obra. En el momento que se suspendió la ejecución del contrato. Después de la suspensión.	Residente de interventoría



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



			Al término de las actividades.	
10	Programas de higiene y seguridad industrial	Se verificó la existencia y funcionalidad de los implementos para protección del personal. Utilización de casco, gafas protectoras, guantes, caretas, botas, arnés, entre otros.	Diario con la ejecución de la obra.	Residente, de interventoría.
11	Ampliación de plazo	Durante el desarrollo de la obra no se hizo necesario realizar ampliaciones de plazo	Cuando se requiriera.	Residente de interventoría.
12	Adición de dinero para terminación de la obra	Durante el desarrollo de la obra, no se hizo necesario adicionar en valor el contrato, ya que el contratista manifestó hacerse cargo de los imprevistos que surgieron durante el periodo de ejecución.	Cuando se requiriera.	Residente de interventoría.
13	Paz y salvo de los trabajadores	Se solicitó al contratista paz y salvo de los trabajadores. Estos documentos fueron necesarios para la realización de la liquidación del contrato.	Al finalizar la obra.	Residente de interventoría.
14	Verificación de participación ciudadana	Se Verificó la existencia del acta de conformación de veeduría ciudadana, cartas de invitación a los diferentes procesos del desarrollo del proyecto y actas de comité de veeduría	Según necesidad.	Residente de interventoría.

Tabla 19. Supervisión Financiera

SUPERVISIÓN FINANCIERA			
	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE



322 7230347




frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



1	Programa de inversión y presupuesto	Se llevó control del programa de inversión y presupuesto y con el avance de la obra y pagos realizados, se realizó el control de la inversión.	Mensual	Residente de interventoría.
2	Desembolso de anticipo	Se llevó control del programa de inversión y presupuesto y con el avance de la obra y pagos realizados, se realizó el control de la inversión.	El contratista de obra no presenta plan de inversión de anticipo	Residente de interventoría.
3	Manejo de dineros	Se controló la revisión de manejo de dineros. Se verifico la apertura de cuenta para anticipo o fiducia. Se reviso el plan de manejo e inversión del anticipo.	No aplica	Residente de interventoría.



19. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Información general contrato de Interventoría.

Establece de manera resumida las condiciones contractuales del Contrato de Interventoría para el desarrollo de las actividades contenidas en el mismo.

Tabla 20. Ficha técnica del contrato.

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE CONSULTARÍA:	No. 469-2025
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CALLE 5 ENTRE LA



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



	CARRERA 8° Y CARRERA 9° DEL BARRIO EL PROGRESO DEL MUNIC BOYACÁ
CONTRATISTA:	FRASCO SUMINISTROS, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. "FRASCING S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	FANNY KATHERIN BARRERA CORREA
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$ 33.211.335,00) M/CTE
PLAZO CONTRACTUAL:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTATO:	15 OCTUBRE DE 2025
FECHA INICIO:	16/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2025
PERIODO DEL INFORME	
FECHA INFORME No. 2:	16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
DÍAS TRANSCURRIDOS:	61 DÍAS
SUPERVISIÓN:	MARLENY APONTE TORRES SUBGERENTE ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA

20. RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

20.1. Pólizas legalización del contrato de Interventoría

- Póliza de legalización del contrato del contrato anexo-0 con fecha del 15 de octubre del 2025

Tabla 21. Pólizas de legalización del contrato de consultaría No. 469-2025

Anexo	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
0	15/10/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400 47 994000110589	3,321,134.00	15/10/2025	15/04/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			6,642,268.00	15/10/2025	15/12/2028
		CALIDAD DEL SERVICIO			6,642,268.00	15/10/2025	15/06/2026



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



0	15/10/2025	POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400 74 994000028234	9,963,401.00	15/10/2025	15/04/2026
---	------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------	------------	------------

- Póliza de legalización del contrato del contrato anexo-1, incorporación asegurada y/o beneficiario adicional: nación ministerio de salud y protección social Nit. 800.375.481-5, aprobadas por la ESE Hospital Especial de Cubará con fecha del 16 de octubre del 2025

Tabla 22. Pólizas de legalización del contrato de consultaría No. 469-2025

Anexo	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
1	15/10/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400 47 994000110589	3,321,134.00	15/10/2025	15/04/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			6,642,268.00	15/10/2025	15/12/2028
		CALIDAD DEL SERVICIO			6,642,268.00	15/10/2025	15/06/2026
1	15/10/2025	POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400 74 994000028234	9,963,401.00	15/10/2025	15/04/2026

- Póliza según acta de inicio del contrato del contrato anexo-2 con fecha del 16 de diciembre del 2025

Tabla 23. Pólizas según acta de inicio del contrato de consultaría No. 469-2025

Anexo	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
2	16/12/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400 47 994000110589	3,321,134.00	15/10/2025	30/04/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			6,642,268.00	15/10/2025	30/12/2028
		CALIDAD DEL SERVICIO			6,642,268.00	15/10/2025	30/06/2026
2	16/12/2025	POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400 74 994000028234	9,963,401.00	15/04/2026	30/04/2026

21. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
-------	---------------------	--------------------------------	--------------



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



16/10/2025	Acta de inicio	Iniciación del contrato de consultaría No. 469-2025	SUPERVISIÓN: MARLENY APONTE TORRES Subgerente Administrativa y Financiera E.S.E. Hospital Especial de Cubará CONTRATISTA: FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS R/L FANNY KATHERIN BARRERA CORREA NIT. 901.629.231-4
17/10/2025	Acta de socialización	Socialización del contrato de obra No. 361-2025	Asistentes: representantes de HOSPITAL ESPECIAL DE CUBRA E.S.E por el GERENTE GIOVANNI QUINTERO TELLEZ, presidentes de las comunidades beneficiadas e involucradas, contratista de obra, interventoría, supervisión y comunidad beneficiada.

21.1. Personal vinculado a la interventoría.

El personal profesional vinculado a la interventoría corresponde al mismo presentado en la oferta con sus especificaciones teniendo en cuenta el cargo, dedicación y categoría destacando la importancia del desarrollo de la obra; así mismo, por lo que no se presentaron cambios del personal.

El tiempo mensual del personal se presenta a continuación según condiciones contractuales iniciales.

Tabla 24. Relación personal contrato de consultaría No. 469-2025

NOMBRE	CARGO A DESEMPEÑAR	FORMACIÓN ACADÉMICA	MESES
HENRY FABIAN FRASCO	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO CIVIL	1
ANGIE NUÑEZ	SECRETARIA	TECNÓLOGO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1

21.2. Equipos e implementos de oficina utilizados por la interventoría.

El equipo de la consultaría, para la coordinación, supervisión y control de las actividades objeto del Contrato de Obra, dispone de los siguientes recursos técnicos:

- ✓ Señalización de la Obra
- ✓ Alquiler de Oficina (incluye servicios básicos) Comisión topográfica
- ✓ Alquiler de equipos de cómputo, Papelería, insumos de oficina, etc.

o Elaboración de Informes:



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



Acorde al programa de trabajo, propuesto por la interventoría, se cumplieron procesos documentados, utilizando registros que muestren la calidad del servicio y de las obras ejecutadas durante todas sus etapas de construcción, cumpliendo los requerimientos del cliente. De esta manera fueron establecidos registros documentados tales como:

- ✓ Registro fotográfico.
- ✓ Informes mensuales de interventoría.
- ✓ Informes ejecutivos para corte de obra.
- ✓ Actas de ejecución (comités, veedurías, contractuales entre otros).
- ✓ Bitácora de Obra.
- ✓ Comunicaciones Internas y externas escritas.

21.3. Gastos operacionales

21.3.1. Señalización de la Obra

Se implementó la señalización preventiva y restrictiva necesaria en el área de intervención, con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, los usuarios de la ESE Hospital Especial de Cubará y los trabajadores que transitan o desarrollan actividades en la zona.



Meses contratados	Meses ejecutados
2.5	2.5



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



21.3.2. Alquiler de Oficina (incluye servicios básicos) Comisión topográfica

Se adecuó un espacio para ser usado como oficina y sede de la empresa FRASCING SAS, ubicado en la Carrera 6 No 4-99, barrio el Jardín.



Meses contratados	Meses ejecutados
2.5	2.5

FRASCING S.A.S

21.3.3. Alquiler de equipos de cómputo, Papelería, insumos de oficina, etc.

Se alquilo una oficina para el servicio de la interventoría, lugar donde los profesionales trabajaran en la elaboración de informes y reproducción de documentos necesarios para el correcto seguimiento de la interventoría a la obra en ejecución.




322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



Meses contratados	Meses ejecutados
2.5	2.5

22. ASPECTOS TÉCNICOS

22.1. Condiciones contractuales

FRASCING S.A.S

El contrato de Interventoría suscrito entre la ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA y la firma contratista FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO.

Tabla 25. Condiciones contractuales contrato de interventoría.

ITEM	PERFIL / ACTIVIDAD	FUENTE	UNIDAD	CAN T	REND	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO						10.211.487,50



322 7230347




frascingsas@gmail.com





Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



1,01	PROFESIONAL CATEGORIA 8 (EXPERIENCIA PROFESIONAL HASTA 2 AÑOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	\$ Gob	Mes	2,50	2,50	4.084.595,0	10.211.487,5
1,02							-
2	PERSONAL TÉCNICO						-
2,01							-
3	OTRO PERSONAL						2.509.073,75
3,01	SECRETARIA 2 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	\$ Gob	Mes	2,50	2,50	2.007.259,0	2.509.073,75
3,02							-
						SUBTOTAL	12.720.561,3
						Factor Multiplicador	2,30
						TOTAL PERSONAL	29.257.290,9
ITEM	BIEN / ACTIVIDAD	FUENTE	UNIDAD	CANT		VR UNITARIO	VR TOTAL
4	BIENES						-
4,01							-
4,02							-
						SUBTOTAL	-
						IVA	0,0%
						TOTAL BIENES	-
5	SERVICIOS						3.322.726,32
5,01	Señalización de la Obra	Cotizac	Mes	2,50		\$300.000,00	750.000,00

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




5,02	Alquiler de Oficina (incluye servicios basicos)	Cotizac	Mes	2,50	\$ 600.000,00	1.500.000,00
5,03	Alquiler de equipos de computo, Papelería, insumos de oficina, etc.	Cotizac	Mes	2,50	\$ 429.090,53	1.072.726,32
						SUBTOTAL
						3.322.726,32
					IVA 19,0%	631.318,00
					TOTAL SERVICIOS	3.954.044,32
						COSTO PERSONAL
						12.720.561,00
						FACTOR MULTIPLICADOR (2,3)
						16.536.729,63
						ESTUDIOS TÉCNICOS
						0,00
						BIENES E INSUMOS
						3.322.726,32
						TOTAL COSTO DIRECTO
						32.580.017,00
					IVA	631.318,00
					TOTAL PRESUPUESTO	33.211.335,00


22.2. Balance financiero del contrato:

A la fecha del presente informe del contrato de consultaría No. 469-2025 se presenta el siguiente balance financiero:

Tabla 26. Balance financiero contrato de consultaría No. 469-2025

DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS	VALORES EJECUTADOS
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	\$ 33.211.335,00	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO		\$ 33.211.335,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 33.211.335,00	\$ 33.211.335,00

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com


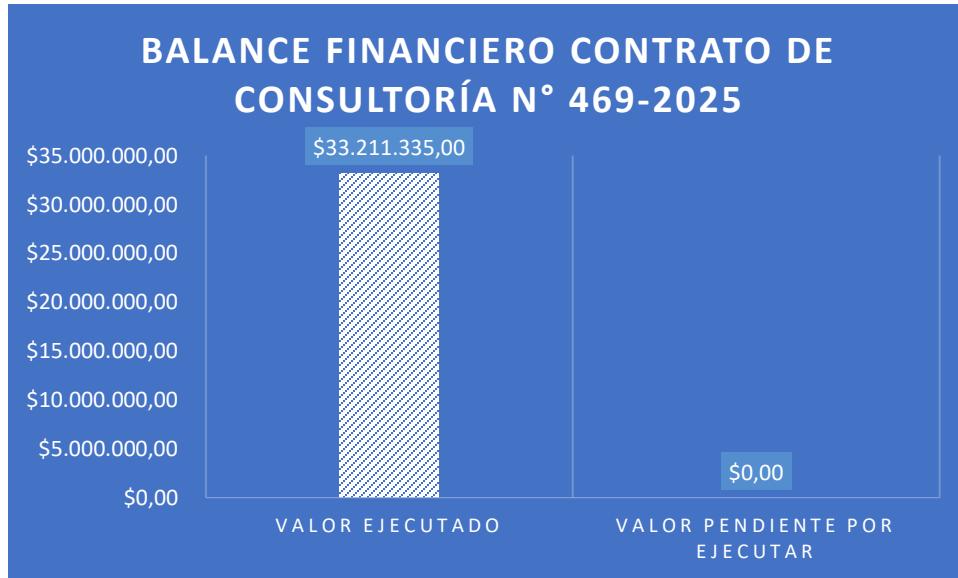
 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





Ilustración 9. Balance financiero contrato de consultaría No. 469-2025



22.3. Avance en tiempo:

AVANCE EN TIEMPO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025	
PLAZO INICIAL	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO EN DÍAS	75
PLAZO EN DÍAS ACTUALIZADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL ANTICIPADA	61
DÍAS TRABAJADOS	61
PORCENTAJE TOTAL	100,00%
ACUMULADOS PLAZO INICIAL	
PERIODO DEL 16/10/2025 A 15/11/2025	49,18%
PERIODO DEL 16/11/2025 A 15/12/2025	50,82%
ACUMULADO TOTAL	100,00%
TIEMPO RESTANTE	0,00%

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com


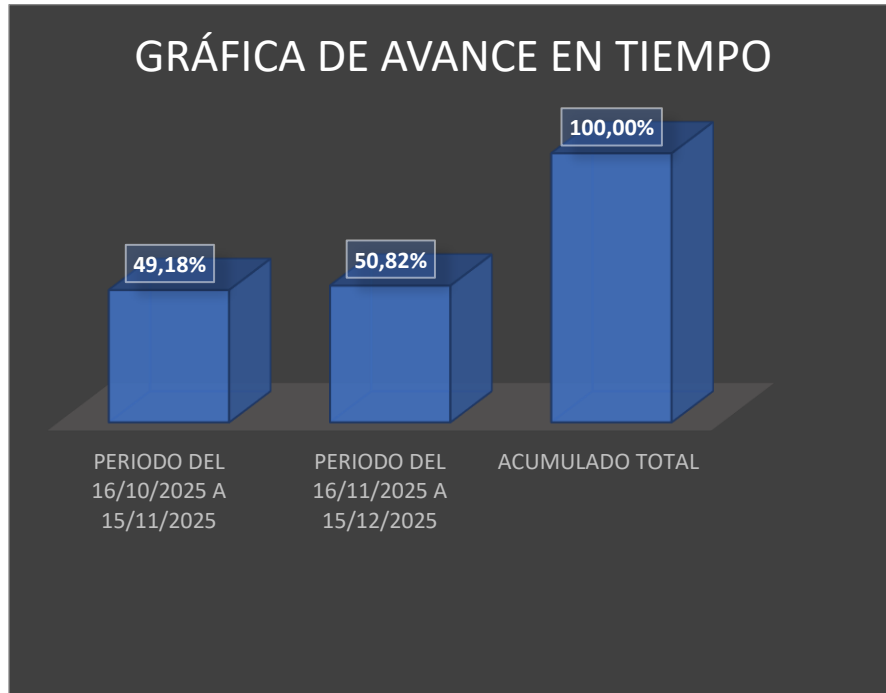
 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



Ilustración 10. avance en el tiempo de interventoría



Para el presente informe, el tiempo de ejecución de la Consultoría No. 469-2025 corresponde al 100,00%, equivalente a 61 días, correspondiente a los 75 días establecidos en el contrato.

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



CONCLUSIONES

Conforme con la ejecución del Contrato de Consultoría No. 469-2025 cuyo objetivo es la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002-2025, CUYO OBJETO ES LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ”, del Contrato de Obra No. 361-2025 se puede resaltar lo siguiente:

De acuerdo con el seguimiento realizado a la ejecución del Contrato de obra No. 361-2025, a la fecha del presente informe, se presentan los siguientes rendimientos: Avance físico general 100% y Avance Financiero 100 % correspondiente a \$ \$ 616.781.927,00 M/CTE.

Se garantizó la ejecución de las actividades del contrato de obra No. 361-2025 que tiene como objeto: “ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ.”, las cuales se ejecutaron dentro de los parámetros técnicos requeridos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas generales del Contrato, garantizando así, la calidad de las obras ejecutadas.

El contratista ha cumplido con los requerimientos y aseguraciones de seguridad y salud a sus empleados cumpliendo así con la normativa exigida y aprobación por parte de la interventoría técnica.


La interventoría presenta a la fecha un avance financiero del 100,00%, correspondiente a un valor ejecutado de \$ \$ 616.781.927,00. En cuanto al componente físico y de tiempo, el proyecto alcanza un avance del 100,00%, equivalente a 61 días de ejecución sobre los 75 días contractualmente establecidos, evidenciando un desarrollo acorde con la programación prevista.


La interventoría ha cumplido con los requerimientos y aseguraciones de seguridad y salud a sus empleados cumpliendo así con la normativa exigida, así como las demás responsabilidades contempladas en el contrato.


Elaboro y aprobó:


HENRY FABIAN FRASCO
Residente de interventoría


FANNY KATHERIN BARRERA CORRÉA
R/L FRASCING SAS
NIT. 901.629.231-4

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ANEXOS

- ANEXO 1.** Copia de Bitácora Diaria de Obra.
- ANEXO 2.** Copia de actos administrativos
- ANEXO 3.** Correspondencia enviada y recibida
- ANEXO 4.** Copia de pólizas y aprobación de pólizas de interventoría
- ANEXO 5.** Actas de comité de Obra
- ANEXO 6.** Nómina del personal de obra
- ANEXO 7.** Planillas de pago de seguridad social de obra.
- ANEXO 8.** Planillas de pago de seguridad social R/L de obra.
- ANEXO 9.** Nómina del personal de interventoría
- ANEXO 10.** Planillas de seguridad social del R/L de interventoría
- ANEXO 11.** Certificado de cumplimiento especificaciones técnicas de los materiales y procesos constructivos
- ANEXO 12.** Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría
- ANEXO 13.** Certificado Aprobación informe de seguridad y salud en el trabajo
- ANEXO 14.** Registro Fotográfico.
- ANEXO 15.** acta de avance de interventoría mensual.
- ANEXO 16.** Factura



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

**ANEXO 1. COPIA DE BITÁCORA
DIARIA DE OBRA.**

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com






Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso









EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALSS




ANEXO 4. BITÁCORAS DE OBRA



-  3183616384 / 3106716171
-  construinducivil@gmail.com
-  Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubaró-Boyacá)



		BITACORA DE OBRA	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		381-2025	32	16	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
Continúan las actividades de mantenimiento de cerramiento en tubería metálica cuadrada de 1"						
se realizaron actividades de desmonte cubiertas teja de asbesto y/ o asbesto cemento. En el área de consulta externa						
se realizaron actividades de instalación de teja termocústica tipo trapezoidal A360 en el área de consulta externa						
Se realizó la aplicación de esmalte marcos de lamina a 3 manos en el área de consulta externa						
Se inicio la aplicación de vinilo tipo I sobre pañete tres manos sobre estuco en el área de consulta externa						
PERSONAL EN OBRA						
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	TIEMPO PERDIDO		HORAS
Maestro general	1	Residente de Obra	1	CAUSA		
Oficiales	1	Profesional HSQ	1			
Ayudantes	11					
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO		
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL		
N° HORAS	3	5		CUMPLE	NO CUMPLE	
				X		
SEGURIDAD SOCIAL						
CUMPLE	X	NO CUMPLE				
OBSERVACIONES						
Proyectó:				Aprobó:		
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND				 HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS		

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		33	17	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
Continúan las actividades de mantenimiento de cerramineto en tubera metálica cuadrada de 1"							
Se inicio la aplicación de vinilo tipo i sobre pañeta tres manos sobre estuco en el area de consulta externa							
se realizaron actividades de pintura en esmalte en madera llena a tres manos para el area de administracion							
Se realizo la aplicación de esmalte marcos de lamina a 3 manos en el area de consulta externa							
continua la aplicación de pintura de la estructura metálica de los domos							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Oficiales	1	Profesional HSQ	1				
Ayudantes	11						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	3	5		CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND				 HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		34	18	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E. S. E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
Continúan las actividades de mantenimiento de cerramiento en tubería metálica cuadrada de 1"							
Se inicio la aplicación de vinilo tipo I sobre pañete tres manos sobre estuco en el área de consulta externa							
se inicio la pintura fachada en vinilo para exteriores en el área de partos y cirugías							
se realizo el suministro e instalacion de panel led cuadrado de sobreponer de 30 w en el area de administracion							
continúa la aplicación de pintura de la estructura metálica de los domos							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Oficiales	1	Profesional HSO	1				
Ayudantes	11						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				CUMPLE	NO CUMPLE		
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND				 HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		35	19	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
Continúan las actividades de mantenimiento de cerramieto en tubería metálica cuadrada de 1"							
continúa la pintura fachada en vinilo para exteriores en el área de partos y cirugías							
continúa la aplicación de pintura de la estructura metálica de los domos							
se realizaron actividades de pintura fachada en vinilo para exteriores en el área exterior							
se continuo la impermeabilización de viga canal en concreto							
se descargo material de construcción							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Oficiales	1	Profesional HSQ	1				
Ayudantes	11						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	3		5	CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUTRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND				 HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

**BITACORA DE OBRA**

CONSECUTIVO

DIA

MES

AÑO

CONTRATO DE OBRA

361-2025

36

20

11

2025

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUIDUCIVIL S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL

GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Continúan las actividades de mantenimiento de cerramineto en tubería metálica cuadrada de 1"

continúa la pintura fachada en vinilo para exteriores en el área de partos y cirugías

continúa la aplicación de pintura de la estructura metálica de los domos

se realizaron actividades de pintura fachada en vinilo para exteriores en el área exterior

se continuo la impermeabilización de viga canal en concreto

PERSONAL EN OBRA**TIEMPO PERDIDO**

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Maestro general	1	Residente de Obra	1		
Oficiales	1	Profesional HSQ	1		
Ayudantes	11				

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA**MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO**

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE
				CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			




SEGURIDAD SOCIAL**OBSERVACIONES**




Proyectó:




Aprobó:




Vianne Karina Buitrago
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
 RESIDENTE DE OBRA
 MATRICULA N° 091037-0640151 CND




Henry Fabian Frasco
 HENRY FABIAN FRASCO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 MATRICULA N° 54202-341877 NTS

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		37	21	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
Continúan las actividades de mantenimiento de cerramiento en tubería metálica cuadrada de 1"							
continúa la pintura fachada en vinilo para exteriores en el área de patios y cirugías							
continúa la aplicación de pintura de la estructura metálica de los domos							
se realizaron actividades de pintura fachada en vinilo para exteriores en el área exterior							
se continuo la impermeabilización de viga canal en concreto							
se realizaron actividades de limpieza de cubiertas tipo domo							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Oficiales	1	Profesional HSQ	1				
Ayudantes	11						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	3		5	CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND				 HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		36	22	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
Continúan las actividades de mantenimiento de cerramieto en tubería metálica cuadrada de 1"							
continúa la pintura fachada en vinilo para exteriores en el área de partos y cirugías							
se realizó la aplicación de pintura vinilo tipo I sobre pañete tres manos sobre estuco en el área de cocina y lavandería							
se realizaron actividades de pintura fachada en vinilo para exteriores en el área exterior							
se continuó la impermeabilización de viga canal en concreto							
se realizaron actividades de limpieza de cubiertas tipo domo							
se realizaron actividades de aplicación esmalte marcos lamina 3 manos en el área de cocina y lavandería							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Oficiales	1	Profesional HSQ	1				
Ayudantes	11						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE		
CUMPLE	X	NO CUMPLE		X			
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND				 HENRY FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		40	24	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
Continúan las actividades de mantenimiento de cerramineto en tubería metálica cuadrada de 1"							
continúa la pintura fachada en vinilo para exteriores en el área de partos y cirugías							
continúa la aplicación de pintura de la estructura metálica de los domos							
se realizó la aplicación de pintura vinilo tipo i sobre pañete tres manos sobre estuco en el área de cocina y lavandería							
se continuo la impermeabilización de viga canal en concreto							
se realizaron actividades de limpieza de cubiertas tipo domo							
se realizaron actividades de aplicación esmalte marcos lamina 3 manos en el área de cocina y lavandería							
se realizo la aplicación de pintura vinilo tipo i sobre pañete tres manos sobre estuco en el área de cocina y lavandería							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Oficiales	1	Profesional HSQ	1				
Ayudantes	11						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE		
				X			
SEGURIDAD SOCIAL							
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-064D151 CND				 HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		41	25	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
Continúan las actividades de mantenimiento de cerramiento en tubería metálica cuadrada de 1"							
continúa la pintura fachada en vinilo para exteriores en el área de partos y cirugías							
continúa la aplicación de pintura de la estructura metálica de los domos							
se realizó la aplicación de pintura vinilo tipo i sobre pañete tres manos sobre estuco en el área de cocina y lavandería							
se continuó la impermeabilización de viga canal en concreto							
se realizaron actividades de limpieza de cubiertas tipo domo							
se realizaron actividades de aplicación esmalte marcos lamina 3 manos en el área de cocina y lavandería							
se realizó la aplicación de pintura vinilo tipo i sobre pañete tres manos sobre estuco en el área de cocina y lavandería							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Oficiales	1	Profesional HSQ	1				
Ayudantes	11						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:  VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND				Aprobó:  HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		42	26	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
Continúan las actividades de mantenimiento de cerramieto en tubería metálica cuadrada de 1"							
se realizaron actividades de pintura fachada en vinilo para exteriores							
se realizo la aplicación de pintura vinilo tipo i sobre pañete tres manos sobre estuco en el area de cocina y lavandería							
se continuo la impermeabilización de viga canal en concreto							
PERSONAL EN OBRA							
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	TIEMPO PERDIDO			
Maestro general	1	Residente de Obra	1	CAUSA	HORAS		
Oficiales	1	Profesional HSQ	1				
Ayudantes	11						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
Nº HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND				 HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

**BITACORA DE OBRA**

CONSECUTIVO

DIA

MES

AÑO

CONTRATO DE OBRA

361-2025

43

27

11

2025

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL

GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

se realizaron actividades de desmonte de cubiertas teja de asbesto en el area de urgencias

Continuan las actividades de mantenimiento de cerramieto en tubería metálica cuadrada de 1"

se realizaron actividades de pintura fachada en vinilo para exteriores

se realizo el suministro e instalacion de teja termoacustica tipo trapezoidal 360 en el area de urgencias

se realizo el suministro e instalacion de caballete en teja termoacustica tipo trapezoidal A360 ancho de 0,70M

PERSONAL EN OBRA**TIEMPO PERDIDO**

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Maestro general	1	Residente de Obra	1		
Oficiales	1	Profesional HSQ	1		
Ayudantes	11				

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA**MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO**

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			




SEGURIDAD SOCIAL**OBSERVACIONES**




Proyectó:

Aprobó:

Vianney Karina Buitrago
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0640151 CND

Henry Fabian Frasco
HENRY FABIAN FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MATRICULA N° 54202-341877 NTS

		BITACORA DE OBRA	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025	43	28	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
se realizaron actividades de desmonte de cubiertas teja de asbesto en el area de urgencias						
Continuan las actividades de mantenimiento de cerramieto en tubería metalica cuadrada de 1"						
se realizaron actividades de pintura fachada en vinilo para exteriores						
se realizo el suministro e instalacion de teja termoacustica tipo trapezoidal 360 en el area de urgencias						
se realizo el suministro e instalacion de caballete en teja termoacustica tipo trapezoidal A360 ancho de 0,70M						
PERSONAL EN OBRA						
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	TIEMPO PERDIDO		
Maestro general	1	Residente de Obra	1	CAUSA	HORAS	
Oficiales	1	Profesional HSQ	1			
Ayudantes	11					
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA						
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO						
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL		
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X		
CUMPLE	X	NO CUMPLE				
OBSERVACIONES						
Proyectó:			Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND			 HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		381-2025		43	29	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
se realizaron actividades de desmonte de cubiertas teja de asbesto en el area de urgencias							
Continuan las actividades de mantenimiento de cerramieto en tubería metalica cuadrada de 1"							
se realizaron actividades de pintura fachada en vinilo para exteriores							
se realizo el suministro e instalacion de teja termoacustica tipo trapezoidal 360 en el area de urgencias							
se realizo el suministro e instalacion de caballete en teja termoacustica tipo trapezoidal A360 ancho de 0,70M							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Oficiales	1	Profesional HSQ	1				
Ayudantes	11						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND				 HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			



BITACORA DE OBRA

CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
-------------	-----	-----	-----

CONTRATO DE OBRA	361-2025	46	30	11	2025
------------------	----------	----	----	----	------

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ

CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUIDUCIVIL S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL: GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

no se labora

PERSONAL EN OBRA

TIEMPO PERDIDO

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Maestro general		Residente de Obra			
Oficiales		Profesional HSQ			
Ayudantes					

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE
SEGURIDAD SOCIAL				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

OBSERVACIONES

Proyectó:

Aprobó:

Vianney K. Buitrago
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
 RESIDENTE DE OBRA
 MATRICULA N° 091037-0640151 CND

[Signature]
 HENRY FABIAN FRASCO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 MATRICULA N° 54202-341877 NTS

**BITACORA DE OBRA**

CONSECUTIVO

DIA

MES

AÑO

CONTRATO DE OBRA

361-2025

47

1

12

2025

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL

GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

se realizo el suministro e instalacion de teja termoacustica tipo trapezoidal 360 en el area de urgencias

se realizo el suministro e instalacion de caballete en teja termoacustica tipo trapezoidal A360 ancho de 0.70M

se realizo el suministro e instalacion de canal en lamina galv. cal. 22 tipo "pecho de paloma" en el area de archivo

se iniciaron actividades de pintura envinito tipo i sobre pañete tres manos sobre estuco en el area de urgencias

PERSONAL EN OBRA**TIEMPO PERDIDO**

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Masstro general	1	Residente de Obra	1		
Oficiales	1	Profesional HSQ	1		
Ayudantes	10				

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA**MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO**

ESTADO DEL TIEMPO

SECO-SOLEADO

NUBLADO

LLUVIA

SEÑALIZACION TEMPORAL

N° HORAS

CUMPLE

NO CUMPLE

SEGURIDAD SOCIAL

X

CUMPLE

X

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Proyectó:

Aprobó:

Vianney K. Buitrago
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
 RESIDENTE DE OBRA
 MATRICULA N° 091037-0640151 CND

[Signature]
 HENRY FABIAN FRASCO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 MATRICULA N° 54202-341877 NTS

**BITACORA DE OBRA**

CONSECUTIVO

DIA

MES

AÑO

CONTRATO DE OBRA

361-2025

48

2

12

2025

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL

GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

se realizo el desmonte de cubierta en lamina en el area de servicios amigables

se realizo el suministro e instalacion de canal en lamina galv. cal. 22 tipo "pecho de paloma" en el area de archivo

se realizo el suministro e instalacion de teja termoacustica tipo trapezoidal 360 en el area de servicios amigables

se realizo el suministro e instalacion de caballete en teja termoacustica tipo trapezoidal A360 ancho de 0,70M en el area de servicios amigables

continuan actividades de pintura envinilo tipo i sobre pafete tres manos sobre estuco en el area de urgencias

PERSONAL EN OBRA**TIEMPO PERDIDO**

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Maestro general	1	Residente de Obra	1		
Oficiales	1	Profesional HSQ	1		
Ayudantes	10				

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA**MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO**

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
Nº HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			




SEGURIDAD SOCIAL**OBSERVACIONES**

Proyectó:

Aprobó:

Vianney K. Buitrago
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARITA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0840151 CND

Henry Karim Frasco
HENRY KARIM FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MATRICULA N° 54202-341877 NTS

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		50	4	12	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
continuan actividades de pintura en vinilo tipo i sobre pafete tres manos sobre estuco en el area de urgencias							
continuo la aplicación de estuco en muros en el area de terapia fisica							
Se realizo el suministro e instalación ventana lamina cal. 18 con vidrio en el area de archivo-bodega							
se realizo el suministro e instalación de panel led cuadrado de sobreponer de 38 w en el area de urgencias							
se realizaron actividades de pintura marcos lamina 3 manos en el area de urgencias							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Oficiales	1	Profesional HSQ	1				
Ayudantes	10						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND				 HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

**BITACORA DE OBRA**

CONSECUTIVO

DIA

MES

AÑO

CONTRATO DE OBRA

361-2025

51

5

12

2025

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL

GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

continuan actividades de pintura envinilo tipo l sobre pañete tres manos sobre estuco en el area de urgencias

finalizase arealizan actividades de pintura fachada en vinilo para exteriores en el area de archivo-bodega

Se realizo el suministro e instalacion ventana lamina cal 18 con vidrio en el area de archivo-bodega

se realizo el suministro e instalacion de panel led cuadrado de sobreponer de 38 w en el area de urgencias

inician actividades de pintura envinilo tipo l sobre pañete tres manos sobre estuco en el area de terapia fisica

PERSONAL EN OBRA**TIEMPO PERDIDO**

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Maestro general	1	Residente de Obra	1		
Oficiales	1	Profesional HSQ	1		
Ayudantes	10				

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA**MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO**

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
SEGURIDAD SOCIAL					
CUMPLE	X	NO CUMPLE			




OBSERVACIONES

Proyectó:

Aprobó:

Vianney K. Buitrago
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
 RESIDENTE DE OBRA
 MATRICULA N° 091037-0840151 CND

Henry Fabian Frasco
HENRY FABIAN FRASCO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 MATRICULA N° 54202-341877 NTS

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		52	6	12	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
continúan actividades de pintura envinilo tipo I sobre pañete tres manos sobre estuco en las áreas de urgencias y terapia física							
finalizase arealizan actividades de pintura fachada en vinilo para exteriores en el area de archivo-bodega							
se realizaron actividades de pintura madera lлена 3 manos en el area de urgencias							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Oficiales	1	Profesional HSO	1				
Ayudantes	10						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
Nº HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE		
				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND				 HENRY PAGAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341677 NTS			

**BITACORA DE OBRA**

CONSECUTIVO

DIA

MES

AÑO

CONTRATO DE OBRA

361-2025

53

7

12

2025

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL

GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

continuan actividades de pintura envinilo tipo i sobre pañete tres manos sobre estuco en las areas de urgencias y terapia fisica

finalizase arealizan actividades de pintura fachada en vinilo para exteriores en el area de archivo-bodega

se realizaron actividades de pintura madera llena 3 manos en el area de urgencias

se realizo el suministro e instalacion de teja termoacustica tipo trapezoidal 360 en el area de urgencias

se realizo el suministro e instalacion de caballete en teja termoacustica tipo trapezoidal A360 ancho de 0.70M

PERSONAL EN OBRA**TIEMPO PERDIDO**

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Maestro general	1	Residente de Obra	1		
Oficiales	1	Profesional HSQ	1		
Ayudantes	10				

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA**MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO**

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE

SEGURIDAD SOCIAL

CUMPLE	X	NO CUMPLE		X	
--------	---	-----------	--	---	--

OBSERVACIONES

Proyectó:

Aprobó:

VIANNEY K. BUITRAGO
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0640151 CND

HENRY FABIAN FRASCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MATRICULA N° 54202-341877 NTS

**BITACORA DE OBRA**

CONSECUTIVO

DIA

MES

AÑO

CONTRATO DE OBRA

361-2025

54

8

12

2025

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUIDUCIVIL S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL

GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

se inicio la aplicación de estuco en muros del area de archivo y bodega

se realizaron actividades de pintura en vinilo tipo i sobre pañete tres manos sobre estuco en el area de terapia fisica

se realizaron actividades de pintura fachada en vinilo para exteriores en el area de terapia fisica

se realizo el desmonte de cubierta de lamina en el area de terapia fisica

se realizo el suministro e instalacion de teja termoacustica tipo trapezoidal 360 en el area de urgencias

se realizo el suministro e instalacion de caballete en teja termoacustica tipo trapezoidal A360 ancho de 0,70M

PERSONAL EN OBRA**TIEMPO PERDIDO**

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Maestro general	1	Residente de Obra	1		
Oficiales	1	Profesional HSQ	1		
Ayudantes	10				

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA**MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO**

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			




SEGURIDAD SOCIAL**OBSERVACIONES**

Proyectó:

Aprobó:

Vianney Karina Buitrago
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 091037-0840151 CND

Henry F. Prasco
HENRY F. PRASCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MATRICULA N° 54202-341877 NTS

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		55	9	12	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
se realizo la instalacion de puertas marco madera guayacán entabl. triplex 60 - 100 * 200 cm en las areas de urgencias y consulta externa							
se realizo el desmonte marcos, puertas y ventanas							
se realizaron actividades de instalacion de cielo raso en pvc en el area de archivo-bodega							
continua la aplicacion de estuco en muros del area de archivo y bodega							
se realizaron actividades de pintura fachada en vinilo para exteriores en el area de terapia fisica							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Oficiales	1	Profesional HSQ	1				
Ayudantes	10						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				CUMPLE	NO CUMPLE		
CUMPLE	X	NO CUMPLE		X			
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND				 HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

**BITACORA DE OBRA**

CONSECUTIVO

DIA

MES

AÑO

CONTRATO DE OBRA

361-2025

56

10

12

2025

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL

GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

se realizaron actividades de instalacion de cielo raso en pvc en el area de archivo-bodega

finaliza la aplicacion de estuco en muros del area de archivo y bodega

se realizo la instalacion de puertas marco madera guayacán entabl. triplex B0 - 100 * 200 cm en las areas de urgencias y consulta externa

se realizo el desmonte marcos, puertas y ventanas

PERSONAL EN OBRA**TIEMPO PERDIDO**

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Maestro general	1	Residente de Obra	1		
Oficiales	1	Profesional HSQ	1		
Ayudantes	10				

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA**MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO**

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
SEGURIDAD SOCIAL					
CUMPLE	X	NO CUMPLE			




OBSERVACIONES

Proyectó:

Aprobó:

Vianney K. Buitrago
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
 RESIDENTE DE OBRA
 MATRICULA N° 091037-0640151 CND

[Firma]
HENRY FABIAN ERASCO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 MATRICULA N° 54202-341877 NTS

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		57	11	12	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
continuan actividades de pintura envinilo tipo i sobre pañete tres manos sobre estuco en el area departamentos y cirugias							
se realizaron actividades de instalacion de cielo razo en pvc en el area de archivo-bodega							
se realizaron actividades de pintura envinilo tipo i sobre pañete tres manos sobre estuco en el area archivo-bodega							
se realizo la aplicación de esmalte lamina tres manos en el area de parqueadero ambulancias							
se realizo la aplicación de esmalte marcos tres manos en el area de parqueadero ambulancias							
se realizaron actividades de pintura fachada en vinilo para exteriores en el area de terapia fisica							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Oficiales	1	Profesional HSQ	1				
Ayudantes	10						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				CUMPLE	NO CUMPLE		
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND				 HENRY FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

**BITACORA DE OBRA**

CONSECUTIVO

DIA

MES

AÑO

CONTRATO DE OBRA

361-2025

58

12

12

2025

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL

GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

continuan actividades de pintura envinilo tipo i sobre pañete tras manos sobre estuco en el area departos y cirugias

se realizaron actividades de pintura envinilo tipo i sobre pañete tras manos sobre estuco en el area archivo-bodega

se realizaron actividades de pintura envinilo tipo i sobre pañete tras manos sobre estuco en el area de raxos x

se realizo la aplicación de esmalte lamina tres manos en el area de parqueadero ambulancias

se realizo la aplicación de esmalte marcos tres manos en el area de parqueadero ambulancias

se realizo la aplicación de estuco en muros del area de parqueadero de ambulancias

PERSONAL EN OBRA**TIEMPO PERDIDO**

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Maestro general	1	Residente de Obra	1		
Oficiales	1	Profesional HSQ	1		
Ayudantes	10				

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA**MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO**

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE
				CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			




SEGURIDAD SOCIAL**OBSERVACIONES**




Proyectó:

Aprobó:

Vianney K. Buitrago
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
 RESIDENTE DE OBRA
 MATRICULA N° 091037-0840151 CND


 HENRY FABIAN FRASCO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 MATRICULA N° 54202-341877 NTS

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025		59	13	12	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
se realizaron actividades de pintura envinilo tipo I sobre pañete tres manos sobre estuco en el area de citas							
se realizaron actividades de pintura envinilo tipo I sobre pañete tres manos sobre estuco en el area de vacunacion							
se realizo la aplicación de estuco en muros del area de secado							
se realizo la aplicación de estuco en muros del area de parqueadero de ambulancias							
se realizo la aplicación de estuco en muros del area de secado							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Oficiales	1	Profesional HSQ	1				
Ayudantes	10						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
Nº HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE		
CUMPLE				X			
NO CUMPLE							
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA Nº 091037-0640151 CND				 HENRY FABIAN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA Nº 54202-341877 NTS			

		BITACORA DE OBRA	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		361-2025	60	14	12	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ				
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
continuan actividades de pintura envinilo tipo i sobre pañete tres manos sobre estuco en el area de area de secado						
continuan actividades de pintura envinilo tipo i sobre pañete tres manos sobre estuco en el area de parqueadero de ambulancias						
se realizo la aplicación de estuco en muros del area de secado						
se realizo el suministro e instalacion de puerta metalica en lamina alvanized cold rolled calibre 18						
PERSONAL EN OBRA			TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS	
Maestro general	1	Residente de Obra	1			
Oficiales	1	Profesional HSQ	1			
Ayudantes	10					
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL		
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X		
CUMPLE	X	NO CUMPLE				
OBSERVACIONES						
Proyectó:			Aprobó:			
 VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° 091037-0640151 CND			 HENRY PAJÓN FRASCO RESIDENTE DE INTERVENTORIA MATRICULA N° 54202-341877 NTS			

**BITACORA DE OBRA**

CONSECUTIVO

DIA

MES

AÑO

CONTRATO DE OBRA

361-2025

61

15

12

2025

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL

GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

se realizo la instalacion de puerta marco madera guayacán entabl. triplex 80 - 100 * 200 cm en el area de urgencias

se realizo la instalacion de puerta marco madera guayacán entabl. triplex 80 - 100 * 200 cm en el area de vacunacion

continuan actividades de pintura envinilo tipo I sobre pañete tres manos sobre estuco en el area de parqueadero de ambulancias

continuan actividades de pintura envinilo tipo I sobre pañete tres manos sobre estuco en el area de area de secado

PERSONAL EN OBRA**TIEMPO PERDIDO**

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Maestro general	1	Residente de Obra	1		
Oficiales	1	Profesional HSQ	1		
Ayudantes	10				

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA**MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO**

ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			

SEGURIDAD SOCIAL**OBSERVACIONES**

Proyectó:

Aprobó:

Vianney K. Buitrago
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
 RESIDENTE DE OBRA
 MATRICULA N° 091037-0640151 CND

Henry Fabian Frasco
HENRY FABIAN FRASCO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 MATRICULA N° 54202-341877 NTS



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ANEXO 2. COPIA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ANEXO 3. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA



FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ANEXO 4. COPIA DE PÓLIZAS Y
APROBACIÓN DE PÓLIZAS DE
INTERVENTORÍA

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ANEXO 5. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 02

PROYECTO: ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ

Fecha y lugar: Cubará, 24 de noviembre de 2025

Hora inicio: 07:00am

Hora finalización: 07:30am

VI. PARTICIPANTES

ENTIDAD/EMPRESA	PARTICIPANTES	FIRMA
Supervisión – E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ	Marleny Aponte Torres – Supervisora Subgerente ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA	
	Ing. Brayan Jeudiel Lozano – Apoyo a la Supervisión	
Interventoría – Contrato de Consultoría No. 469-2025 FRASCING SAS – NIT 901.629.231-4	Fanny Katherin Barrera Correa – Representante legal	
	Henry Fabián Frasco Residente de Interventoría	
Contratista de Obra – Contrato de Obra No. 361-2025 CONSTRUINDUCIVIL SAS – NIT 901.375.684-5	Xiomara Manrique Representante legal	
	Vianney Karina Buitrago Residente de Obra	

VII. OBJETO DEL COMITÉ

En el marco del Contrato de Obra No. 365 de 2025, y en ejercicio de las funciones propias de la supervisión e interventoría del contrato, el día veinticuatro (24) de noviembre de 2025 se llevó a cabo una reunión técnica entre el contratista, la supervisión y la interventoría, realizada en las instalaciones del hospital, con el fin de efectuar una revisión conjunta de los puntos de intervención contemplados en el alcance contractual, específicamente aquellos relacionados con las cubiertas incluidas dentro de la memoria de áreas del proyecto..

VIII. DESARROLLO DEL COMITÉ

Durante el desarrollo de la reunión se procedió a realizar una verificación técnica en sitio de la cubierta correspondiente al área de terapia física, la cual había sido inicialmente considerada como punto de intervención dentro del Ítem 2.05 – Suministro e instalación de teja termoacústica tipo trapezoidal A360. Como resultado de dicha inspección, se evidenció que la cubierta existente en esta área se encuentra en buenas condiciones estructurales y funcionales, sin presentar deterioros significativos, filtraciones, goteras o afectaciones que hicieran necesaria la intervención en la magnitud inicialmente prevista.

En razón de lo anterior, y atendiendo criterios de eficiencia técnica, pertinencia de la intervención y correcta ejecución del objeto contractual, se determinó que en la memoria de área de terapia física la cantidad correspondiente al Ítem 2.05 debía ser reducida, toda vez que el estado actual de la cubierta no ameritaba una intervención mayor.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



De manera paralela, durante la misma revisión técnica se evaluaron otras áreas del hospital, identificándose que la cubierta correspondiente a las áreas de partos y cirugía presenta deficiencias consistentes en filtraciones y goteras, situación que resulta especialmente sensible debido a la naturaleza crítica de estos espacios para la prestación del servicio de salud, en los cuales no es admisible la presencia de este tipo de afectaciones por los riesgos sanitarios, operativos y funcionales que implican.

Como consecuencia de lo anterior, y tras el análisis técnico realizado de manera conjunta entre el contratista, la supervisión y la interventoría, se estableció que en el área de partos y cirugía se requiere la intervención de una superficie equivalente a treinta y nueve punto sesenta metros cuadrados (39,60 m²) mediante el suministro e instalación de teja termoacústica tipo trapezoidal A360, correspondiente al Ítem 2.05 del contrato.

Esta situación fue debidamente socializada, evaluada y concertada, acordándose de mutuo acuerdo trasladar la cantidad reducida del área de terapia física hacia las áreas de partos y cirugía, priorizando así la atención de los espacios que efectivamente requieren la intervención, sin que ello implique modificación alguna en el valor total del contrato, ni alteración de su objeto, alcance general o condiciones económicas.

En consecuencia, la supervisión e interventoría del contrato aprueban expresamente el ajuste realizado al Ítem 2.05, dejando constancia de que dicha decisión obedece a una revisión técnica objetiva, orientada a garantizar una ejecución adecuada del contrato, el uso racional de los recursos públicos y la correcta prestación del servicio hospitalario.

Lo aquí consignado se deja como constancia formal del acuerdo técnico y administrativo alcanzado entre las partes, precisando que el ajuste efectuado no genera desequilibrio económico, ni constituye una modificación sustancial del contrato, sino una adecuación técnica razonable y necesaria, plenamente justificada dentro del marco de lo contractualmente pactado.

IX. COMPROMISOS

RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA LÍMITE
Supervisión e Interventoría	se acordó ejecutar el suministro e instalación de teja termoacústica tipo trapezoidal A360 correspondiente al ítem 2.05 del contrato, ajustando las cantidades inicialmente previstas en el área de Terapia Física debido a que la cubierta existente se encuentra en buenas condiciones; adicionalmente, se aprobó la ejecución de una nueva área de 39,60 m ² de cubierta en las zonas de Partos y Cirugía, decisión que cuenta con la validación de la Supervisión e Interventoría, quienes realizarán el seguimiento técnico necesario para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la correcta ejecución de la actividad	Inmediato.

X. CIERRE DEL COMITÉ

No siendo otro el asunto por tratar, se levanta la presente acta, la cual se firma para constancia por los asistentes.



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

**ANEXO 6. NÓMINA DEL PERSONAL
DE OBRA**

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso






EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

ANEXO 6. NOMINA




EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

NOMINAS NOVIEMBRE

-  3183616384 / 3106716171
-  construinducivil@gmail.com
-  Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**

Comprobante Número: **107**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 12:56 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 12:57 AM**

Empleado: **LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **9467070**

Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	\$ 1.915.950
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	\$ 200.000
Total Ingresos					\$ 2.115.950

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 76.638
Fondo de pensión	4.00	\$ 76.638
Total Deducciones		\$ 153.276

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 1.962.674

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 1.962.674

Soporte de pago: DNE107

CUNE:

c281d274c7308e6ed1944210ec4078bfc8efb76d44f4ae44905eaa2964ac2242a47ac25cc6a57b498ff5a4975e28e451

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **9.467.070**, quien prestó sus servicios en calidad de oficial de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de noviembre del 2025.


Luis Tarazona
LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA
C.C. 9.467.070

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubaró-Boyacá)

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**
Comprobante Número: **106**
Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 12:56 AM**
Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 12:57 AM**

Empleado: **HENRY GUTIERREZ BATECA**
Ciudad: **Cubará**
Identificación: **96125112**
Cargo: **OBrero DE CONSTRUCCION**
Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				10	\$ 638.650
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				10	\$ 66.667
Vacaciones liquidación contrato				1	\$ 34.594
Prima liquidación contrato				13	\$ 71.594
Cesantías liquidación contrato			0.0	0	\$ 71.594
Intereses cesantías liquidación contrato			12.0	0	\$ 310
Total Ingresos					\$ 883.409

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 25.546
Fondo de pensión	4.00	\$ 25.546
Total Deduciones		\$ 51.092

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deduciones)			\$ 832.317

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 832.317

Soporte de pago: DNE106

CUNE:

08b2d48dba593817a88adf13c1479f4703567d0ab860e7b9b5639e2e10a35f9de1732c89044d729e60b0459354d82c47

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES


PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **HENRY GUTIERRES BATECA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **96125112**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:


1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de noviembre del 2025.

Henry Gutierrez
HENRY GUTIERRES BATECA
C.C. 96125112



DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**

Comprobante Número: **99**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 12:56 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 12:57 AM**

Empleado: **ROSA DANIELA SANTANDER APONTE**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **1049395519**

Cargo: **HSEQ**

Salario básico: **\$1.423.500**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	\$ 2.500.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	\$ 200.000
Total Ingresos					\$ 2.700.000

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 100.000
Fondo de pensión	4.00	\$ 100.000
Total Deducciones		\$ 200.000

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 2.500.000

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 2.500.000

Soporte de pago: DNE99

CUNE:

33862d8687132784f065c83be061fd1a920a42865e0cdcdd96e89cd674fca17760183a3f5b98ede1eb844beb62f87751

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **ROSA DANIELA SANTANDER APONTE**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.395.519**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:


1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de noviembre del 2025.

DANIELA SANTANDER
ROSA DANIELA SANTANDER APONTE
C.C. 1.049.395.519



DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**
Comprobante Número: **108**
Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 12:56 AM**
Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 12:57 AM**

Empleado: **RAFAEL GARCIA CRUZ**
Ciudad: **Cubará**
Identificación: **9466615**
Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**
Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	\$ 1.915.950
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	\$ 200.000
Total Ingresos					\$ 2.115.950

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4,00	\$ 76.638
Fondo de pensión	4,00	\$ 76.638
Total Deducciones		\$ 153.276

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 1.962.674

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 1.962.674

Soporte de pago: DNE108

CUNE:

9e24a962ed38c832728165c8643dccad94d87201476f4bc2aca1306b3b0bd403b1c9a4940376c89b5818b55d5102af62

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL


Yo **RAFAEL GARCIA CRUZ**, mayor de edad identificada con C.C. No. **9.466.615**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de noviembre del 2025.

RAFAEL G.
RAFAEL GARCIA CRUZ
C.C. 9.466.615

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**

Comprobante Número: **104**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 12:56 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 12:57 AM**

Empleado: **LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **4439097**

Cargo: **MAESTRO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$3.582.570**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	\$ 3.582.570
Total Ingresos					\$ 3.582.570

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 143.303
Fondo de pensión	4.00	\$ 143.303
Total Deducciones		\$ 286.606

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 3.295.964

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 3.295.964

Soporte de pago: DNE104

CUNE:

6e69c57e654d2e4733b9549dbf70d69ec306ba5a3d6f7f901fccf4ac6a27e71ee7c2ea1fe8550c88d23441c7b5be8643

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **LUIS ALBERTO TRUJILLO**, mayor de edad identificada con C.C. No. **4.439.097**, quien prestó sus servicios en calidad de Maestro de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de noviembre del 2025.


Luis Trujillo
LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO
C.C. 4.439.097

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**
Comprobante Número: **103**
Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 12:56 AM**
Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 12:57 AM**

Empleado: **KARINA BARRERA AGUABLANCA**
Ciudad: **Cubará**
Identificación: **1115733517**
Cargo: **TRABAJADORA SOCIAL**
Salario básico: **\$2.500.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	\$ 2.500.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	\$ 200.000
Total Ingresos					\$ 2.700.000

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 100.000
Fondo de pensión	4.00	\$ 100.000
Total Deduciones		\$ 200.000

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deduciones)			\$ 2.500.000

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 2.500.000

Soporte de pago: DNE103

CUNE:

afc271f482f7585c22bd43ffd58aac30c2120b88d0ca2e39dc312f255f70cf579e071d58185829207aeae40495c2c492

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8


PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **KARINA BARRERA AGUABLANCA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.115.733.517** quien prestó sus servicios en calidad de trabajadora social, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:


1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de noviembre del 2025.

Karina Aguablanca
KARINA BARRERA AGUABLANCA
C.C. 1.115.733.517



DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**

Comprobante Número: **102**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 12:56 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 12:58 AM**

Empleado: **VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **1094275515**

Cargo: **RESIDENTE DE OBRA**

Salario básico: **\$3.000.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	\$ 3.000.000
Total Ingresos					\$ 3.000.000

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 120.000
Fondo de pensión	4.00	\$ 120.000
Total Deducciones		\$ 240.000

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 2.760.000

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 2.760.000

Soporte de pago: DNE102

CUNE:

5340f4794a241466e79f6206ee9f8770e6c81c1f10177a47bf383a48b0e984908b21f64c5b353a62147f361a010a86e3

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.094.275.515**, quien prestó sus servicios en calidad de Residente de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.


En constancia se firma en el mes de noviembre del 2025.

Vianney Karina Buitrago
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
C.C. 1.094.275.515

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ construinducivil@gmail.com
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

[Firma manuscrita]

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**
Comprobante Número: **101**
Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 12:56 AM**
Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 12:57 AM**

Empleado: **CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA**
Ciudad: **Cubará**
Identificación: **1094268169**
Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**
Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	\$ 1.915.950
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	\$ 200.000
Total Ingresos					\$ 2.115.950

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 76.638
Fondo de pensión	4.00	\$ 76.638
Total Deducciones		\$ 153.276

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 1.962.674

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria \$ 1.962.674

Soporte de pago: DNE101

CUNE:

11e78b5f1484ca218d9cfc653c8327d393932bb88f935a2cc033cace3857ed1b1fb1201fb55213d9eb03025be0515eb7

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.194.268.169**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de noviembre del 2025.


Cristian Bocota
CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA
C.C. 1.194.268.169

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**

Comprobante Número: **100**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 12:56 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 12:57 AM**

Empleado: **CARLOS ALBERTO SANTAFE CASTELLANOS**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **1049396199**

Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	\$ 1.915.950
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	\$ 200.000
Total Ingresos					\$ 2.115.950

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 76.638
Fondo de pensión	4.00	\$ 76.638
Total Deduciones		\$ 153.276

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deduciones)			\$ 1.962.674

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 1.962.674

Soporte de pago: DNE100

CUNE:

14a2f071df90df6feb69e31f9902aeb4eefe878244b74acdece2c54a49084edf4414a6d2367bea2327881acf9b1f9b33

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES


PAZ Y SALVO DEL PERSONAL


Yo **CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.396.199**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:


1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de noviembre del 2025.



CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS
C.C. 1.049.396.199

 3183616384 / 3106716171

 construinducivil@gmail.com

 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubaró-Boyacá)

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**

Comprobante Número: **98**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 12:56 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 12:57 AM**

Empleado: **OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **1049394907**

Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	\$ 1.915.950
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	\$ 200.000
Total Ingresos					\$ 2.115.950

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 76.638
Fondo de pensión	4.00	\$ 76.638
Total Deducciones		\$ 153.276

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 1.962.674

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 1.962.674

Soporte de pago: DNE98

CUNE:

db726215b87ac4db09f8f31e80157d7f17ac3fe63d59513d7e0da0646b546ac292268c0749d76330fc22b37d446898de

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.394.907**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de noviembre del 2025.

Oscar Guerrero
OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL
C.C. 1.049.394.907

☎ 3183616384 / 3106716171


✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará Boyacá)

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



CONSTRUINDUCIVIL
CONSTRUINDUCIVIL SAS
Nit 901375684
CR 3 7A 67 BRR JARDIN
Tel: 3106716171
Cubará - Colombia
construinducivil@gmail.com



Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**

Comprobante Número: **97**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 12:56 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 12:57 AM**

Empleado: **JOSE ALBEIRO ALBARRACIN LOZANO**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **1049393885**

Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	\$ 1.915.950
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	\$ 200.000
Total Ingresos					\$ 2.115.950

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 76.638
Fondo de pensión	4.00	\$ 76.638
Total Deducciones		\$ 153.276

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 1.962.674

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria \$ 1.962.674

Soporte de pago: DNE97

CUNE:

fe6ed18a2f4334bc821d20755bd20aa3e3928b03a8d798caff97086473d964b09232fa0cc1b6d7a7fc56b6a2b6646a99

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **JOSE ALBEIRO ALBARRACIN LOZANO**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.393.885**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de noviembre del 2025.


Albeiro Albarracín
JOSE ALBEIRO ALBARRACIN LOZANO
C.C. 1.049.393.885

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**

Comprobante Número: **96**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 12:56 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 12:56 AM**

Empleado: **WILBER ALEXANDER MORERNO TORRES**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **1049392860**

Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	\$ 1.915.950
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	\$ 200.000
Total Ingresos					\$ 2.115.950

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 76.638
Fondo de pensión	4.00	\$ 76.638
Total Deducciones		\$ 153.276

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 1.962.674

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 1.962.674

Soporte de pago: DNE96

CUNE:

2da22ee494167d54c0817a2e9714a0a30015a51b75adfd325c9d344a6d6376c2c0e05f4ff6ca1819c6b2c6119c66c915

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **WILBER ALEXANDER MORENO TORRES**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.392.860**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es "**ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de noviembre del 2025.


Wilber Moreno
WILBER ALEXANDER MORENO TORRES
C.C. 1.049.392.860

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**
Comprobante Número: **95**
Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 12:56 AM**
Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 12:56 AM**

Empleado: **FLORO IVAN CARRILLO MORA**
Ciudad: **Cubará**
Identificación: **1049392738**
Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**
Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	\$ 1.915.950
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	\$ 200.000
Total Ingresos					\$ 2.115.950

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 76.638
Fondo de pensión	4.00	\$ 76.638
Total Deducciones		\$ 153.276

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 1.962.674

Observaciones:

Condiciones de pago: Trámite simple (Recarga o envío) \$ 1.962.674

Soporte de pago: DNE95

CUNE:

b4293217d1da504c8c97289058a343834962956937ef7e070638258c6deaf3411d6677e03d008dd1a0ec7aa421ef0c9c

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **FLORO IVAN CARRILLO MORA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.392.736**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.


En constancia se firma en el mes de noviembre del 2025.

Floro Carrillo

FLORO IVAN CARRILLO MORA
C.C. 1.049.392.736



DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**
Comprobante Número: **94**
Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 12:56 AM**
Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 12:57 AM**

Empleado: **BLANCA ISABEL SANTAFE ESTEVEZ**
Ciudad: **Cubará**
Identificación: **1049392734**
Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**
Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	\$ 1.915.950
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	\$ 200.000
Total Ingresos					\$ 2.115.950

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 76.638
Fondo de pensión	4.00	\$ 76.638
Total Deducciones		\$ 153.276

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 1.962.674

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria \$ 1.962.674

Soporte de pago: DNE94

CUNE:

d1ab849ae3f56c6b30dab41ca2956921d2e5878cf650e5887255b2d07fe80b0ba4f315dd70196efe6b1ed4bdead8acc6

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **BLANCA ISABEL SANTAFE ESTEVEZ**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.392.734**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.


En constancia se firma en el mes de noviembre del 2025.

Blanca Santafé
BLANCA ISABEL SANTAFE ESTEVEZ
C.C. 1.049.392.734



NOTA DE AJUSTE DEL DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Reemplazo



Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**

Comprobante Número: **14**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 01:30 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 01:30 AM**

Empleado: **JAIME JOANNIS**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **96167929**

Cargo: **OFICIAL DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$2.573.010**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	\$ 2.573.010
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	\$ 200.000
Total Ingresos					\$ 2.773.010

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.0	\$ 102.920
Fondo de pensión	4.0	\$ 102.920
Total Deduciones		\$ 205.840

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deduciones)			\$ 2.567.170

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 2.567.170

Soporte de pago: DNA14

CUNE:

a9dbd91cabb7e150fa1e3376d81968589587f0724d2e2f2b2e74b03a2b6079dc87ae902a2f369b324fe5cefbf0dbaf46

Esta nota de ajuste reemplaza el documento:

Consecutivo: DNE105

Fecha de generación: 23/12/2025

CUNE:

1e714766ae5bcb9443bf3a69732ba148d8a0fade816ed47f0f4bbcb9b3024f13357b58ad6bf25720d2ba2c6c3a60d65d

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL


Yo **JAIMES JOANNIS CONTRERAS PEÑA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **96.167.929**, quien prestó sus servicios en calidad de oficial de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de noviembre del 2025.

JAIMES JOANNIS CONTRERAS PEÑA
C.C. 96.167.929

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**
Comprobante Número: **109**
Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 12:56 AM**
Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 12:57 AM**

Empleado: **JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO**
Ciudad: **Cubará**
Identificación: **88034175**
Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**
Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	\$ 1.915.950
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	\$ 200.000
Total Ingresos					\$ 2.115.950

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 76.638
Fondo de pensión	4.00	\$ 76.638
Total Deducciones		\$ 153.276

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 1.962.674

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 1.962.674

Soporte de pago: DNE109

CUNE:

1326766f19241492af0c0ca6cf70ef71e477eab0f4ef53993eab1f6b18ba80df8852eedc277a806c4142025e38ac2fbd

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO**, mayor de edad identificada con C.C. No. **88.034.175**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.


En constancia se firma en el mes de noviembre del 2025.

Jaime Medina
JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO
C.C. 88.034.175




EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

NOMINAS DICIEMBRE

-  3183616384 / 3106716171
-  construinducivil@gmail.com
-  Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**
Comprobante Número: **118**
Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 10:27 AM**
Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Empleado: **VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA**
Ciudad: **Cubará**
Identificación: **1094275515**
Cargo: **RESIDENTE DE OBRA**
Salario básico: **\$3.000.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				16	\$ 1.600.000
Vacaciones liquidación contrato				1	\$ 250.000
Prima liquidación contrato				60	\$ 500.000
Cesantías liquidación contrato			0.0	0	\$ 500.000
Intereses cesantías liquidación contrato			12.0	0	\$ 10.000
Total Ingresos					\$ 2.860.000

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 64.000
Fondo de pensión	4.00	\$ 64.000
Total Deducciones		\$ 128.000

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 2.732.000

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 2.732.000

Soporte de pago: DNE118

CUNE:

8ec9346876a3f3e14ce1c7366eef95d1cdba6a6ccc21ca8e6861f62d8ea63782018fe9d5727f8c4fc9c8cba5580317f8

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.094.275.515**, quien prestó sus servicios en calidad de Residente de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:


1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de diciembre del 2025.

Vianney Karina Buitrago
VIANNEY KARINA BUITRAGO GARCIA
C.C. 1.094.275.515



DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**

Comprobante Número: **113**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Empleado: **JOSE ALBEIRO ALBARRACIN LOZANO**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **1049393885**

Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				16	\$ 1.021.840
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				16	\$ 106.667
Vacaciones liquidación contrato				1	\$ 122.408
Prima liquidación contrato				46	\$ 270.371
Cesantías liquidación contrato			0.0	0	\$ 270.371
Intereses cesantías liquidación contrato			12.0	0	\$ 4.146
Total Ingresos					\$ 1.795.803

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 40.874
Fondo de pensión	4.00	\$ 40.874
Total Deducciones		\$ 81.748

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 1.714.055

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria \$ 1.714.055

Soporte de pago: DNE113

CUNE:

e3fbb590aebc49bc5e293bcd7be4086bce6a1f451d6cf52e17177b015d31365ee616cf7644ff0a39dfe49dbd919a5b97

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **JOSE ALBEIRO ALBARRACIN LOZANO**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.393.885**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:


1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de diciembre del 2025.

Albeiro Albarracin
JOSE ALBEIRO ALBARRACIN LOZANO
C.C. 1.049.393.885



DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**

Comprobante Número: **110**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Empleado: **BLANCA ISABEL SANTAFE ESTEVEZ**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **1049392734**

Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				5	\$ 319.325
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				5	\$ 33.333
Vacaciones liquidación contrato				1	\$ 103.781
Prima liquidación contrato				39	\$ 229.228
Cesantías liquidación contrato			0.0	0	\$ 229.228
Intereses cesantías liquidación contrato			12.0	0	\$ 2.980
Total Ingresos					\$ 917.875

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 12.773
Fondo de pensión	4.00	\$ 12.773
Total Deducciones		\$ 25.546

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad	
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)				\$ 892.329

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria \$ 892.329

Soporte de pago: DNE110

CUNE:

69e841f41ac4ca0223aea6b1c372f09831974e8c285e8fa821972eda43631b361cf75b4f85cb39e17fac573d011b125b

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL


Yo **BLANCA ISABEL SANTAFE ESTEVEZ**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.392.734**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es "**ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de diciembre del 2025.

Blanca Santafe
BLANCA ISABEL SANTAFE ESTEVEZ
C.C. 1.049.392.734

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**
Comprobante Número: **115**
Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 10:27 AM**
Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Empleado: **ROSA DANIELA SANTANDER APONTE**
Ciudad: **Cubará**
Identificación: **1049395519**
Cargo: **HSEQ**
Salario básico: **\$1.423.500**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				16	\$ 1.333.333
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				16	\$ 106.667
Vacaciones liquidación contrato				1	\$ 173.611
Prima liquidación contrato				50	\$ 375.000
Cesantías liquidación contrato			0.0	0	\$ 375.000
Intereses cesantías liquidación contrato			12.0	0	\$ 6.250
Total Ingresos					\$ 2.369.861

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 53.333
Fondo de pensión	4.00	\$ 53.333
Total Deducciones		\$ 106.666

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 2.263.195

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 2.263.195

Soporte de pago: DNE115

CUNE:

55a2937514864ec4e1a7cd08c155b6cd5ba45a853b84758ad5b93b801594e3d3ebf46b6ad231f76bac466a30bb55262a

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **ROSA DANIELA SANTANDER APONTE**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.395.519**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:


1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que fuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de diciembre del 2025.

DANIELA SANTANDER
ROSA DANIELA SANTANDER APONTE
C.C. 1.049.395.519



DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**
Comprobante Número: **124**
Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 10:27 AM**
Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Empleado: **JAIME JOANNIS**
Ciudad: **Cubará**
Identificación: **96167929**
Cargo: **OFICIAL DE CONSTRUCCION**
Salario básico: **\$2.573.010**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				16	\$ 1.372.272
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				16	\$ 106.667
Vacaciones liquidación contrato				1	\$ 178.681
Prima liquidación contrato				50	\$ 385.140
Cesantías liquidación contrato			0.0	0	\$ 385.140
Intereses cesantías liquidación contrato			12.0	0	\$ 6.419
Total Ingresos					\$ 2.434.319

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 54.891
Fondo de pensión	4.00	\$ 54.891
Total Deducciones		\$ 109.782

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 2.324.537

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 2.324.537

Soporte de pago: DNE124

CUNE:

29337a712061ec94e9abb9023ec36fd95a0e4237af3b031931ac9dacafa0d84deea722fac609b5f46745853d12c99b33

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **JAIMES JOANNIS CONTRERAS PEÑA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **96.167.929**, quien prestó sus servicios en calidad de oficial de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:


1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de diciembre del 2025.

JAIMES JOANNIS CONTRERAS PEÑA
C.C. 96.167.929



DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**

Comprobante Número: **112**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Empleado: **WILBER ALEXANDER MORENO TORRES**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **1049392860**

Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				16	\$ 1.021.840
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				16	\$ 106.667
Vacaciones liquidación contrato				1	\$ 133.052
Prima liquidación contrato				50	\$ 293.882
Cesantías liquidación contrato			0.0	0	\$ 293.882
Intereses cesantías liquidación contrato			12.0	0	\$ 4.898
Total Ingresos					\$ 1.854.221

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 40.874
Fondo de pensión	4.00	\$ 40.874
Total Deducciones		\$ 81.748

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 1.772.473

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 1.772.473

Soporte de pago: DNE112

CUNE:

2662912d00eea303c23c70c0e363c0116dfceee6881b88acb0b6b45302fe8603a0617c009e62c8770aa0befaf6d4d68d

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **WILBER ALEXANDER MORENO TORRES**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.392.860**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es "**ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:


1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de diciembre del 2025.

Wilber Moreno
WILBER ALEXANDER MORENO TORRES
C.C. 1.049.392.860



DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**

Comprobante Número: **114**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Empleado: **OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **1049394907**

Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				16	\$ 1.021.840
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				16	\$ 106.667
Vacaciones liquidación contrato				1	\$ 133.052
Prima liquidación contrato				50	\$ 293.882
Cesantías liquidación contrato			0.0	0	\$ 293.882
Intereses cesantías liquidación contrato			12.0	0	\$ 4.898
Total Ingresos					\$ 1.854.221

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 40.874
Fondo de pensión	4.00	\$ 40.874
Total Deduciones		\$ 81.748

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deduciones)			\$ 1.772.473

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 1.772.473

Soporte de pago: DNE114

CUNE:

5769526d0612dd261f8bf67fe5597c3909d9c5fda51cc87df4a75def43af9562223d29a2ef3adae8e5f9a12fd2fc713c

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL


Yo **OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.394.907**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de diciembre del 2025.

Oscar Guerrero
OSCAR EDUARDO GUERRERO RANGEL
C.C. 1.049.394.907

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**

Comprobante Número: **116**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Empleado: **CARLOS ALBERTO SANTAFE CASTELLANOS**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **1049396199**

Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				16	\$ 1.021.840
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				16	\$ 106.667
Vacaciones liquidación contrato				1	\$ 133.052
Prima liquidación contrato				50	\$ 293.882
Cesantías liquidación contrato			0.0	0	\$ 293.882
Intereses cesantías liquidación contrato			12.0	0	\$ 4.898
Total Ingresos					\$ 1.854.221

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 40.874
Fondo de pensión	4.00	\$ 40.874
Total Deducciones		\$ 81.748

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 1.772.473

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 1.772.473

Soporte de pago: DNE116

CUNE:

de7c2eb5983c7bd12b4c126b99c8138dfce5d4e65092d59d73d6900590b5098af97aa58975899e6861dee2e441ec7091

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL


Yo **CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.396.199**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de diciembre del 2025.


CARLOS ALBERTO SANTAFÉ CASTELLANOS
C.C. 1.049.396.199

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**

Comprobante Número: **117**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Empleado: **CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **1094268169**

Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				5	\$ 319.325
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				5	\$ 33.333
Vacaciones liquidación contrato				1	\$ 103.781
Prima liquidación contrato				39	\$ 229.228
Cesantías liquidación contrato			0,0	0	\$ 229.228
Intereses cesantías liquidación contrato			12,0	0	\$ 2.980
Total Ingresos					\$ 917.875

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4,00	\$ 12.773
Fondo de pensión	4,00	\$ 12.773
Total Deduciones		\$ 25.546

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
----------	--------	-----	----------

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deduciones) \$ 892.329

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria \$ 892.329

Soporte de pago: DNE117

CUNE:

f226fcd8218fc2e156aa1d998fbb6d0cfca26f66a1da8457e7311936137b192fcf2659231cce034ef716cfe502cd89b8

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES


PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.194.268.169**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:


1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de diciembre del 2025.

Cristian Bocota
CRISTIAN FABIAN BOCOTA BOCOTA
C.C. 1.194.268.169



DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**

Comprobante Número: **111**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Empleado: **FLORO IVAN CARRILLO MORA**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **1049392738**

Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				10	\$ 638.650
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				10	\$ 66.667
Vacaciones liquidación contrato				1	\$ 117.086
Prima liquidación contrato				44	\$ 258.616
Cesantías liquidación contrato			0.0	0	\$ 258.616
Intereses cesantías liquidación contrato			12.0	0	\$ 3.793
Total Ingresos					\$ 1.343.428

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 25.546
Fondo de pensión	4.00	\$ 25.546
Total Deducciones		\$ 51.092

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 1.292.336

Observaciones:

Condiciones de pago: Trámite simple (Recarga o envío) \$ 1.292.336

Soporte de pago: DNE111

CUNE:

5941cf935b6350cbd0790ce27c1a50e07313e03fcaa2196029fb93f464fa9abb98a18ea7c7444ca2b630dbc637c97605

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL


Yo **FLORO IVAN CARRILLO MORA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.049.392.736**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de diciembre del 2025.

Floro Carrillo
FLORO IVAN CARILLO MORA
C.C. 1.049.392.736

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**

Comprobante Número: **122**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Empleado: **RAFAEL GARCIA CRUZ**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **9466615**

Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				5	\$ 319.325
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				5	\$ 33.333
Vacaciones liquidación contrato				1	\$ 93.136
Prima liquidación contrato				35	\$ 205.717
Cesantías liquidación contrato			0.0	0	\$ 205.717
Intereses cesantías liquidación contrato			12.0	0	\$ 2.400
Total Ingresos					\$ 859.628

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 12.773
Fondo de pensión	4.00	\$ 12.773
Total Deduciones		\$ 25.546

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deduciones)			\$ 834.082

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 834.082

Soporte de pago: DNE122

CUNE:

6ce465783bf0f6be71e4b559a0732fa0bc6a8b65d3b254a38f5c373c952ac1d26940caae2a9a098b13727355c6250a8a

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **RAFAEL GARCIA CRUZ**, mayor de edad identificada con C.C. No. **9.466.615**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es" **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:


1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de diciembre del 2025.

RAFAEL G.
RAFAEL GARCIA CRUZ
C.C. 9.466.615



DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**
Comprobante Número: **119**
Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 10:27 AM**
Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Empleado: **KARINA BARRERA AGUABLANCA**
Ciudad: **Cubará**
Identificación: **1115733517**
Cargo: **TRABAJADORA SOCIAL**
Salario básico: **\$2.500.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				16	\$ 1.333.333
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				16	\$ 106.667
Vacaciones liquidación contrato				1	\$ 173.611
Prima liquidación contrato				50	\$ 375.000
Cesantías liquidación contrato			0.0	0	\$ 375.000
Intereses cesantías liquidación contrato			12.0	0	\$ 6.250
Total Ingresos					\$ 2.369.861

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 53.333
Fondo de pensión	4.00	\$ 53.333
Total Deduciones		\$ 106.666

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deduciones)			\$ 2.263.195

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 2.263.195

Soporte de pago: DNE119

CUNE:

15612939ed50c1f6fcac1a8772e7b00fd698ae7410968b1c685b08b9b1639161c1e0401947b14c535a7a0588130876f2

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL


Yo **KARINA BARRERA AGUABLANCA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **1.115.733.517** quien prestó sus servicios en calidad de trabajadora social, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de diciembre del 2025.

Karina Aguablanca
KARINA BARRERA AGUABLANCA
C.C. 1.115.733.517

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**

Comprobante Número: **120**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Empleado: **LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **4439097**

Cargo: **MAESTRO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$3.582.570**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				16	\$ 1.910.704
Vacaciones liquidación contrato				1	\$ 248.790
Prima liquidación contrato				50	\$ 497.579
Cesantías liquidación contrato			0.0	0	\$ 497.579
Intereses cesantías liquidación contrato			12.0	0	\$ 8.293
Total Ingresos					\$ 3.162.945

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 76.428
Fondo de pensión	4.00	\$ 76.428
Total Deducciones		\$ 152.856

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 3.010.089

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 3.010.089

Soporte de pago: DNE120

CUNE:

b239617c91b564343c62026128a285c14d82349d09a9848b57ab88e947fa7b0f8d16af50fbe7f5e0501a1dfcfb7f9e7f

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL


Yo **LUIS ALBERTO TRUJILLO**, mayor de edad identificada con C.C. No. **4.439.097**, quien prestó sus servicios en calidad de Maestro de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es" **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de diciembre del 2025.

Luis Trujillo
LUIS ALBERTO TRUJILLO LOZANO
C.C. 4.439.097

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**

Comprobante Número: **121**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Empleado: **JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **88034175**

Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				5	\$ 319.325
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				5	\$ 33.333
Vacaciones liquidación contrato				1	\$ 103.781
Prima liquidación contrato				39	\$ 229.228
Cesantías liquidación contrato			0.0	0	\$ 229.228
Intereses cesantías liquidación contrato			12.0	0	\$ 2.980
Total Ingresos					\$ 917.875

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 12.773
Fondo de pensión	4.00	\$ 12.773
Total Deducciones		\$ 25.546

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)			\$ 892.329

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 892.329

Soporte de pago: DNE121

CUNE:

58b1f7fd9e0cbc3b7fbccbea2d7195d5f012a22b479982eea570130aec5665c00501c546c6d835ea3c2d2c241087202d

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL


Yo **JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO**, mayor de edad identificada con C.C. No. **88.034.175**, quien prestó sus servicios en calidad de ayudante de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es "**ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salvo al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de diciembre del 2025.

Jaime Medina
JAIME ERDULFO MEDINA PATIÑO
C.C. 88.034.175

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**

Comprobante Número: **123**

Fecha y hora de generación: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Fecha y hora de expedición: **23/12/2025 - 10:27 AM**

Empleado: **LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA**

Ciudad: **Cubará**

Identificación: **9467070**

Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**

Salario básico: **\$1.915.950**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				5	\$ 319.325
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				5	\$ 33.333
Vacaciones liquidación contrato				1	\$ 103.781
Prima liquidación contrato				39	\$ 229.228
Cesantías liquidación contrato			0.0	0	\$ 229.228
Intereses cesantías liquidación contrato			12.0	0	\$ 2.980
Total Ingresos					\$ 917.875

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	\$ 12.773
Fondo de pensión	4.00	\$ 12.773
Total Deduciones		\$ 25.546

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad
NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deduciones)			\$ 892.329

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo \$ 892.329

Soporte de pago: DNE123

CUNE:

956cbfbb2dc6d9ad6ecbb7a5901aa3892bf34adc10f7bf3814ba174effbb4ad2f115be92f0affe1e76530a36a7f5801e


PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Yo **LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA**, mayor de edad identificada con C.C. No. **9.467.070**, quien prestó sus servicios en calidad de oficial de obra, dentro de la ejecución del Contrato No. 361-2025, cuyo objeto es " **ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**", manifiesto que:

1. He recibido a satisfacción el pago correspondiente por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos, aportes a seguridad social y demás acreencias laborales a las que tuve derecho durante el tiempo de ejecución de la obra.
2. Declaro que no tengo reclamación pendiente contra el contratista **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** por ningún concepto laboral.
3. En consecuencia, otorgo la presente paz y salva al contratista, liberándolo de cualquier responsabilidad económica derivada de mi vinculación a la obra.

En constancia se firma en el mes de diciembre del 2025.

Luis Tarazona
LUIS FRANCISCO TARAZONA COBARIA
C.C. 9.467.070





FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ANEXO 7. PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA.



FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com






Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

-  3183616384 / 3106716171
-  construinducivil@gmail.com
-  Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.
CARRERA 3 N° 7A-67 BARRIO EL JARDÍN
CUBARÁ-BOYACÁ

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Ni 901375684	5	CONSTRUDUCIVIL SAS	B	002	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN. DEP.	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-223	CARRERA 3 NRO 7A 67 BARRIO JARDIN		3118260217		CONSTRUDUCIVIL@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECALUDO
2025-11	2025-1-2	35797270	E	2025-12-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.535.200	20.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	35797270	2025-12-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
33.953.730	33.953.730	33.953.730	33.953.730	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				16	5.433.200	0	10.400	0	5.443.600
PORVENIR	230301	800224808	8	10	3.153.500	0	6.000	0	3.159.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	2.279.700	0	4.400	0	2.284.100
EPS(Administradoras: 4)				16	1.359.000	0	2.700	0	1.361.700
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	10	742.200	0	1.400	0	743.600
NUEVA E.P.S.- S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	196.700	0	400	0	197.100
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	100.000	0	200	0	100.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	320.100	0	700	0	320.800
ARP(Administradoras: 1)				16	2.363.800	0	4.500	0	2.368.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	16	2.363.800	0	4.500	0	2.368.300
CCF(Administradoras: 1)				16	1.359.000	0	2.600	0	1.361.600
COMFABOY	CCF10	891800213	8	16	1.359.000	0	2.600	0	1.361.600
Gran Total					10.515.000	0	20.200	0	10.535.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 901375684	5	CONSTRUINDOCIVIL SAS	B	002	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-223	CARRERA 3 NRO 7A 87 BARRIO JARDIN		3118260217		CONSTRUINDOCIVIL@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35764496	E	2025-12-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.297.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	35764496	2026-01-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.872.279	13.872.279	13.872.279	13.872.279	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				15	2.219.900	0	0	0	2.219.900
PORVENIR	230301	800224808	8	9	1.341.300	0	0	0	1.341.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	878.600	0	0	0	878.600
EPS(Administradoras: 4)				15	555.400	0	0	0	555.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	76.800	0	0	0	76.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	155.500	0	0	0	155.500
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	9	269.700	0	0	0	269.700
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	53.400	0	0	0	53.400
ARP(Administradoras: 1)				15	966.600	0	0	0	966.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	15	966.600	0	0	0	966.600
CCF(Administradoras: 1)				15	555.400	0	0	0	555.400
COMFABOY	CCF10	891800213	8	15	555.400	0	0	0	555.400
Gran Total					4.297.300	0	0	0	4.297.300



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ANEXO 8. PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL R/L DE OBRA.

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com




Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

SEGURIDAD SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL

 3183616384 / 3106716171

 construinducivil@gmail.com

 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubaró-Boyacá)



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ANEXO 9. NÓMINA DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




PAZ Y SALVO

Con la presente se certifica que la empresa FRASCING SAS identificada con NIT. N°. 901.629.231-4 se encuentra a paz y salvo por todo concepto para el contrato 465-2025 de acuerdo a los servicios profesionales prestados.

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año 2025.

Cordialmente.



FRASCING S.A.S

HENRY FABIAN FRASCO RAMON

CC. 1.094.265.577



313 2063878



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

PAZ Y SALVO

Con la presente se certifica que la empresa FRASCING SAS identificada con NIT. N°. 901.629.231-4 se encuentra a paz y salvo por todo concepto para el contrato 465-2025 de acuerdo a los servicios como tecnología prestados.

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año 2025.



Cordialmente.

FRASCING S.A.S

Angie Katherine Núñez C.
ANGIE KATERINE NÚÑEZ CUTAS

CC. 1.007.545.371



313 2063878



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso

RAZÓN SOCIAL :	ANGIE KATERINE NUÑEZ CUTAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007545371
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-20
FECHA DE PAGO:	2025-12-22
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35466175
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35466175
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/02/2026
----------------------------------	------------

Se certifica que en la fecha 2025-12-22 la empresa ANGIE KATERINE NUÑEZ CUTAS con documento de identificación CC 1007545371 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante NUÑEZ CUTAS ANGIE KATERINE identificado con CC-1007545371, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-1007545371		ANGIE KATERINE NUÑEZ CUTAS		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
35466175	I	2025-12-22	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900226715	ESSC24	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

RAZÓN SOCIAL :	ANGIE KATERINE NUÑEZ CUTAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007545371
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-17
FECHA DE PAGO:	2025-11-24
ENTIDAD DE PAGO:	NU
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35285520
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35285520
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/01/2026
----------------------------------	------------

Se certifica que en la fecha 2025-11-24 la empresa ANGIE KATERINE NUÑEZ CUTAS con documento de identificación CC 1007545371 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante NUÑEZ CUTAS ANGIE KATERINE identificado con CC-1007545371, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-1007545371		ANGIE KATERINE NUÑEZ CUTAS		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
35285520	I	2025-11-24	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900226715	ESSC24	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

RAZÓN SOCIAL :	ANGIE KATERINE NUÑEZ CUTAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007545371
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-20
FECHA DE PAGO:	2025-11-06
ENTIDAD DE PAGO:	NU
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34983947
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34983947
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/12/2025
----------------------------------	------------

Se certifica que en la fecha 2025-11-06 la empresa ANGIE KATERINE NUÑEZ CUTAS con documento de identificación CC 1007545371 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante NUÑEZ CUTAS ANGIE KATERINE identificado con CC-1007545371, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-1007545371		ANGIE KATERINE NUÑEZ CUTAS		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
34983947	I	2025-11-06	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900226715	ESSC24	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

RAZÓN SOCIAL :	HENRY FABIAN FRASCO RAMON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1094265577
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-21
FECHA DE PAGO:	2025-10-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35000712
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35000712
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100	\$ 534.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/12/2025
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	HENRY FABIAN FRASCO RAMON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1094265577
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-18
FECHA DE PAGO:	2025-12-10
ENTIDAD DE PAGO:	NU
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35199310
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35199310
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100	\$ 534.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/01/2026
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	HENRY FABIAN FRASCO RAMON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1094265577
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-21
FECHA DE PAGO:	2025-12-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35682286
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35682286
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100	\$ 534.100

PAGADO


FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/02/2026
----------------------------------	------------



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ANEXO 10. Planillas de seguridad social del R/L de interventoría



FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901629231	4	FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-223	CRA 6 NRO 4 -99 BRR EL PROGRESO		313206387			FRASINGSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35655779	E	2025-12-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	349.800	500	NU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35655779	2025-12-09	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica													
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.										
1	CC 1049392597	BARRERA CORREA FANNY KATHERIN	1.423.500	F																0			30	30	30	30		COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV- EPS041	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349.300	S	1749001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901629231	4	FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-223	CRA 6 NRO 4 -99 BRR EL PROGRESO		313206387			FRASINGSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35655779	E	2025-12-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	349.800	500	NU
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35655779	2025-12-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	200	0	228.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	200	0	228.000
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	100	0	57.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	100	0	57.100
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	100	0	7.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.500	0	100	0	7.600
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	100	0	57.100
COMFABOY	CCF10	891800213	8	1	57.000	0	100	0	57.100
Gran Total					349.300	0	500	0	349.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901629231	4	FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-223	CRA 6 NRO 4 -99 BRR EL PROGRESO		313206387		FRASCINGSAS@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35809909	E	2025-12-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	351.700	0	BANCO AGRARIO
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35809909	2026-01-09	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica														
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.												
1	CC 1049392597	BARRERA CORREA FANNY KATHERIN	1.423.500	F		X														0			30	30	30	30		COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV- EPS041	57.000		COMFABOY-CCF10	1.482.813	59.400		1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351.700	S	1749001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901629231	4	FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-223	CRA 6 NRO 4 -99 BRR EL PROGRESO		313206387		FRASCINGSAS@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35809909	E	2025-12-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	351.700	0	BANCO AGRARIO
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35809909	2026-01-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.482.813	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	0	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.500	0	0	0	7.500
CCF(Administradoras: 1)				1	59.400	0	0	0	59.400
COMFABOY	CCF10	891800213	8	1	59.400	0	0	0	59.400
Gran Total					351.700	0	0	0	351.700



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ANEXO 11. Certificado de cumplimiento
especificaciones técnicas de los materiales
y procesos constructivos

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT No. 901.629.231-4

CERTIFICA:

Que la empresa CONSTRUINDUCIVIL SAS representada legalmente por XIOMARA MANRIQUE con NIT. 901.375.684-5, da cumplimiento a las obligaciones en cuanto la correcta ejecución de los procesos constructivos y las especificaciones técnicas de los materiales en cada actividad ejecutada para el contrato de obra No 361-2025 cuyo objeto es “**ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**”, correspondiente al periodo comprendido del 16 de noviembre del 2025 al 15 de diciembre del 2025.

Este documento se firma a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

FRASCING S.A.S

Fanny Katherin Barrera C.

FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

R/L: FANNY KATHERIN BARRERA CORREA

NIT No. 901.629.231-4

Contrato de consultoría No. 469-2025



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ANEXO 12. Certificación de
cumplimiento de pagos a seguridad social
y parafiscales del contratista de obra
expedida por el director de la
interventoría

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT No. 901.629.231-4

CERTIFICA:

En calidad de persona jurídica, **FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS R/L FANNY KATHERIN BARRERA CORREA**, celebra contrato de consultoría No. 469-2025 con el MUNICIPIO DE CUBARÁ, cuyo objeto corresponde a: **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ”**.

Por su parte, la empresa **CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L XIOMARA MANRIQUE** celebra el contrato de obra N° **361-2025** con la ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA y cuyo objeto es; **“ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ”**, de acuerdo a la supervisión realizada a las actividades, me permito certificar que el contratista ha realizado el pago correspondiente a los aportes de seguridad social y parafiscal correspondiente al periodo comprendido del 16 de noviembre del 2025 al 15 de diciembre del 2025.

FRASCING S.A.S

Fanny Katherin Barrera C.

FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

R/L: FANNY KATHERIN BARRERA CORREA

NIT No. 901.629.231-4

Contrato de consultoría No. 469-2025



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ANEXO 13. Certificado Aprobación informe de seguridad y salud en el trabajo



FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT No. 901.629.231-4

CERTIFICA:

Que la empresa CONSTRUINDUCIVIL SAS representada legalmente por XIOMARA MANRIQUE con NIT. 901.375.684-5, realizo la aplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) correspondiente al contrato de obra No 361-2025 cuyo objeto es “**ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**”, correspondiente al periodo comprendido del 16 de noviembre del 2025 al 15 de diciembre del 2025.

Este documento se firma a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

FRASCING S.A.S

Fanny Katherin Barrera C.

FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

R/L: FANNY KATHERIN BARRERA CORREA

NIT No. 901.629.231-4

Contrato de consultoría No. 469-2025



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ANEXO 14. Registro Fotográfico



FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



REGISTRO FOTOGRAFICO DE INTERVENTORÍA No. 1

PERIODO DEL INFORME: 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE OBRA N°. No. 361-2025

CONTRATISTA: CONSTRUINDUCIVIL SAS

NIT No. 901.375.684-5

R/L: XIOMARA MANRIQUE

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ.

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



CONTRATO DE CONSULTARÍA No. 469-2025

CONTRATISTA: FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT No. 901.629.231-4

R/L: FANNY KATHERIN BARRERA CORREA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002-2025, CUYO OBJETO ES LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ

FRASCING S.A.S

SUPERVISOR:

MARLENY APONTE TORRES

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

BOYACÁ, DICIEMBRE 2025



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA
CONTRATO No:	361-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ
CONTRATISTA:	CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L: XIOMARA MANRIQUE
NIT. No:	901.375.684-5
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$616.781.927,00)
PLAZO CONTRACTUAL:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-0570 DEL 07 DE JULIO DEL 2025
FECHA INICIO:	16 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR EXTERNO:	FRASCO SUMINISTROS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS R/L: FANNY KATHERIN BARRERA CORREA NIT. 901.629.231-4
SUPERVISOR:	MARLENY APONTE TORRES SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ
PERIODO DEL INFORME	
FECHA INFORME:	16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



REGISTRO FOTOFRAFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

A continuación, se presentan el registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo del presente informe:

1. AREA EXTERIOR

ÍTEM 1,01 LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO

En este ítem se ubicó y marco en el terreno o superficie de construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en el plano del proyecto, así como los linderos del mismo.

ACTIVIDAD:	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	
ITEM: 1.01.		UNIDAD: M2
		

2,00 CUBIERTAS Y DRENAJES

ÍTEM 2,01 LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)

Esta actividad fue medida en metros cúbicos según el presupuesto teniendo en cuenta el área excavación mecánica.

ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (ÁREA INTERNA)	
ITEM: 2.01		UNIDAD: M2



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 2,02 IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO

Esta actividad fue cuantificada en metros cuadrados conforme al presupuesto, considerando el metraje de conformación, nivelación y compactación de subrasante.

ACTIVIDAD:	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO	
ITEM: 2.02		UNIDAD: M2



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





ÍTEM 2,03 DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO


ACTIVIDAD:	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO	
ITEM: 2.03		UNIDAD: M2

ÍTEM 2,04 DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA

ACTIVIDAD:	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	
ITEM: 2.04		UNIDAD: M2

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4



ÍTEM 2,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPOTRAPEZOIDAL A360

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360
ITEM: 2.05	UNIDAD: M2



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4



ÍTEM 2,06 CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M

ACTIVIDAD:	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M
ITEM: 2.06	UNIDAD: ML



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 2,07 DESMONTE CANALES - BAJANTES

ACTIVIDAD:	DESMONTE CANALES - BAJANTES.	UNIDAD: ML
ITEM: 2.07		
		

ÍTEM 2,08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	UNIDAD: ML
ITEM: 2.08		
		



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





ÍTEM 2,09 LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO


ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE CUBIERTA TIPO DOMO	UNIDAD: M2
ITEM: 2.09		

ÍTEM 2,10 PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA

ACTIVIDAD:	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	UNIDAD: KG
ITEM: 2.10		

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




ÍTEM 2,11 TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM


ACTIVIDAD:	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	
ITEM: 2.11		UNIDAD: KG
		


3,00 ADMINISTRACIÓN

ÍTEM 3,01 ESTUCO MUROS

ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS	
ITEM: 3.01		UNIDAD: M2
		

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 3,02 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES


ACTIVIDAD:	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	
ITEM: 3.02		UNIDAD: M2





ÍTEM 3,03 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	
ITEM: 3.03		UNIDAD: M2



 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




FRASCING S.A.S


NIT: 901.629.231-4




ÍTEM 3,04 ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS

ACTIVIDAD:	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	
ITEM: 3.04		UNIDAD: M2

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





ÍTEM 3,05 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS


ACTIVIDAD:	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	UNIDAD: ML
ITEM: 3.05		
		

ÍTEM 3,06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	UNIDAD: ML
ITEM: 3.06		
		

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com


 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





4,00 ARCHIVO - ALMACEN

ÍTEM 4,01 DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.

ACTIVIDAD:	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.
ITEM: 4.01	UNIDAD: M2

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





ÍTEM 4,02 DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.


ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts
ITEM: 4.02	UNIDAD: M2
	

ÍTEM 4,03 DEMOLICIÓN MESON CONCRETO

ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO
ITEM: 4.03	UNIDAD: M2
	

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





ÍTEM 4,04 DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS


ACTIVIDAD:	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	
ITEM: 4.04		UNIDAD: M2
		

ÍTEM 4,05 CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18

ACTIVIDAD:	CORREA METALICA DE 3 X 1 1/2" CAL. 18	
ITEM: 4.05		UNIDAD: M2
		

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 4,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A360	
ITEM: 4.06		UNIDAD: M2

ÍTEM 4,07 CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M

ACTIVIDAD:	CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA A360 ANCHO DE 0,70 M	
ITEM: 4.07		UNIDAD: ML



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 4,08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"


ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"
ITEM: 4.08	UNIDAD: ML





ÍTEM 4,09 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS

ACTIVIDAD:	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS
ITEM: 4.09	UNIDAD: M2



 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




FRASCING S.A.S


NIT: 901.629.231-4




ÍTEM 4,10 SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR

ACTIVIDAD:	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR	
ITEM: 4.10		UNIDAD: M2

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





ÍTEM 4,11 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 18 (Incluye marco, bisagras y pintura)


ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 18 (Incluye marco, bisagras y pintura)	
ITEM: 4.11		UNIDAD: M2

ÍTEM 4,12 PAÑETE LISO MUROS 1:4

ACTIVIDAD:	PAÑETE LISO MUROS 1:4	
ITEM: 4.12		UNIDAD: M2

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





ÍTEM 4,13 ESTUCO MUROS


ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS
ITEM: 4.13	UNIDAD: M2
	

ÍTEM 4,14 PINTURA FACHADA EN VINOLO PARA EXTERIORES

ACTIVIDAD:	PINTURA FACHADA EN VINOLO PARA EXTERIORES
ITEM: 4.14	UNIDAD: M2
	

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





ÍTEM 4,15 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO


ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	
ITEM: 4.15	UNIDAD: M2	

ÍTEM 4,16 CIELO RAZO EN PVC

ACTIVIDAD:	CIELO RAZO EN PVC	
ITEM: 4.15	UNIDAD: M2	

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




ÍTEM 4,17 TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM


ACTIVIDAD:	TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM
ITEM: 4.17	UNIDAD: KG
	


5,00 SALA DE AUTOPSIAS

ÍTEM 5,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO
ITEM: 5,01	UNIDAD: M2
	

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





ÍTEM 5,02 ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS


ACTIVIDAD:	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	
ITEM: 5,02		UNIDAD: M2
		

ÍTEM 5,03 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS

ACTIVIDAD:	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	
ITEM: 5,03		UNIDAD: ML
		

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




ÍTEM 5,04 ESTUCO MUROS


ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS
ITEM: 5,04	UNIDAD: M2
	


6,00 HOSPITALIZACIÓN

ÍTEM 6,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO
ITEM: 6,01	UNIDAD: M2
	

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




FRASCING S.A.S


NIT: 901.629.231-4




ÍTEM 6,02 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES

ACTIVIDAD:	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	
ITEM: 6,02		UNIDAD: M2

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





ÍTEM 6,03 DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)


ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	
ITEM: 6,03		UNIDAD: M2
		

ÍTEM 6,04 CIELO RASO EN PVC

ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	
ITEM: 6,04		UNIDAD: M2
		

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S


NIT: 901.629.231-4





ÍTEM 6,05 ESTUCO MUROS

ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS
ITEM: 6,05	UNIDAD: M2

	
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

 322 7230347


 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




FRASCING S.A.S


NIT: 901.629.231-4

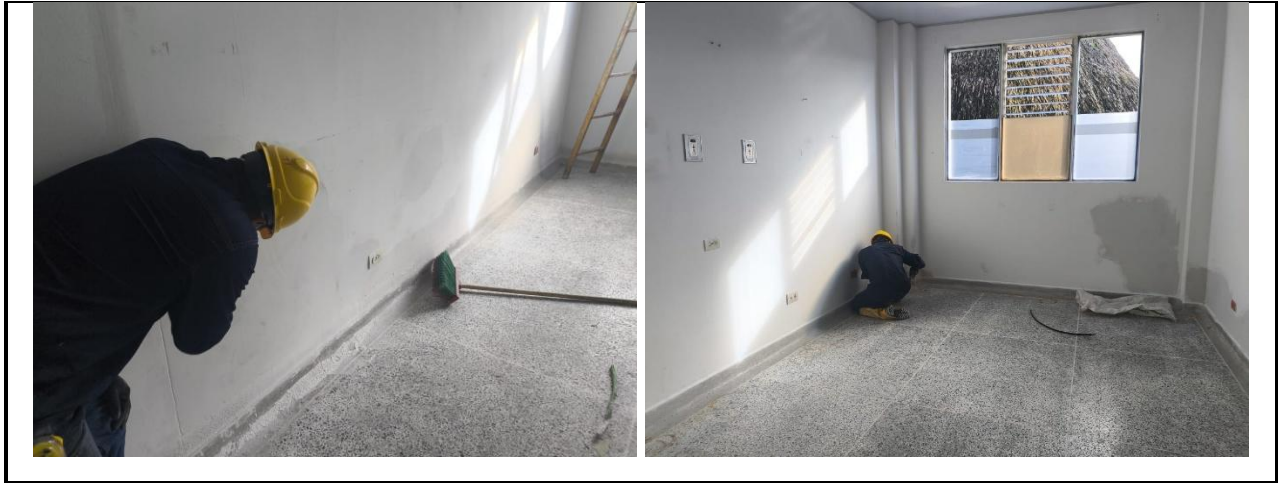


ÍTEM 6,06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W

ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W
ITEM: 6,06	UNIDAD: UND
	

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




ÍTEM 6,07 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS


ACTIVIDAD:	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	
ITEM: 6,07		UNIDAD: ML


7,00 PARTOS Y CIRUJIAS

ÍTEM 7,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	
ITEM: 7,01		UNIDAD: M2

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 7,02 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES

ACTIVIDAD:	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES
ITEM: 7,02	UNIDAD: M2





8,00 URGENCIAS


ÍTEM 8,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO
ITEM: 8,01	UNIDAD: M2



 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




FRASCING S.A.S


NIT: 901.629.231-4




ÍTEM 8,02 PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM

ACTIVIDAD:	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM
ITEM: 8,02	UNIDAD: UND

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





ÍTEM 8,03 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS


ACTIVIDAD:	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	
ITEM: 8,03		UNIDAD: ML

ÍTEM 8,04 ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS

ACTIVIDAD:	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	
ITEM: 8,04		UNIDAD: M2

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




ÍTEM 8,05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W


ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 36 W	
ITEM: 8,05	UNIDAD: UND	
		


9,00 CONSULTA EXTERNA

ÍTEM 9,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	
ITEM: 9,01	UNIDAD: M2	
		

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





ÍTEM 9,02 DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS


ACTIVIDAD:	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	
ITEM: 9,02	UNIDAD: M2	
		

ÍTEM 9,03 PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM

ACTIVIDAD:	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	
ITEM: 9,03	UNIDAD: UND	
		

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 9,04 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS


ACTIVIDAD:	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	
ITEM: 9,03		UNIDAD: ML
		


10,00 VACUNACIÓN

ÍTEM 10,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	
ITEM: 10,01		UNIDAD: M2
		

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 10,02 PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM

ACTIVIDAD:	PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	
ITEM: 10,02		UNIDAD: UND
		

11,00 SALA DE RAYOS X

ÍTEM 11,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	
ITEM: 10,01		UNIDAD: M2
		

12,00 CITAS

ÍTEM 12,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	
ITEM: 12,01		UNIDAD: M2



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S


NIT: 901.629.231-4





13,00 COCINA Y LAVANDERIA

ÍTEM 13,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO
ITEM: 13,01	UNIDAD: M2

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4


ÍTEM 13,02 ESTUCO MUROS


ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS
ITEM: 13,02	UNIDAD: M2
	


14,00 TERAPIA FISICA

ÍTEM 14,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO
ITEM: 14,01	UNIDAD: M2
	

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso





ÍTEM 14,02 ESTUCO MUROS


ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS
ITEM: 14,02	UNIDAD: M2
	

ÍTEM 14,03 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES

ACTIVIDAD:	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES
ITEM: 14,03	UNIDAD: M2
	

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso




15,00 PARQUEADERO AMBULANCIAS


ÍTEM 15,01 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO


ACTIVIDAD:	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO
ITEM: 15,01	UNIDAD: M2
	

ÍTEM 15,02 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS

ACTIVIDAD:	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS
ITEM: 14,03	UNIDAD: ML
	

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



ÍTEM 15,03 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS

ACTIVIDAD:	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS
ITEM: 15,03	UNIDAD: M2
	

ÍTEM 15,04 ESTUCO MUROS

ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS
ITEM: 15,04	UNIDAD: M2
	

16,00 AREA DE SECADO

ÍTEM 16,01 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES

ACTIVIDAD:	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES
-------------------	-------------------------------------------



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ITEM: 16,01

UNIDAD: M2



ÍTEM 16,02 ESTUCO MUROS

ACTIVIDAD:

ESTUCO MUROS

ITEM: 16,02


UNIDAD: M2





Elaboro y reviso:


HENRY FABIAN FRASCO
Residente de interventoría


FANNY KATHERIN BARRERA CORRÉA
R/L FRASCING SAS
NIT. 901.629.231-4

 322 7230347

 frascingsas@gmail.com

 Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ANEXO 15. acta de avance de
interventoría mensual.



FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCING S.A.S

NIT: 901.629.231-4

ANEXO 16. Factura

FRASCING S.A.S



322 7230347



frascingsas@gmail.com



Cra 6 No. 4-99 - B. el progreso



FRASCO SUMINISTROS, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.
 NIT 901.629.231-4
 CR 6 NRO 4 - 99 BRR EL PROGRESO
 Tel: (607) 3204010789
 Cubará - Colombia
 yadys.contador@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FI 34

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA		
NIT	826.002.304-1	Teléfono	(608) 313420494
Dirección	CL 3 4 47	Ciudad	Cubará - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2025, 21:22
Expedición	29/12/2025, 21:22
Vencimiento	29/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CONTRATO No 469-2025, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE SE ADJUDIQUE MEDIANTE LA CONVOCATORIA PUBLICA C.P. 002-2025	1.00	27,908,684.87	19 %	5,302.650.13	27,908,684.87	33,211,335.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Treinta y tres millones doscientos once mil trescientos treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 33,211,335.00

Observaciones:

Total Bruto	27,908,684.87
IVA 19%	5,302.650.13
Total a Pagar	33,211,335.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103866666 aprobado en 20251228 prefijo FI desde el número 32 al 50 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa
 CUFE: 34a864d5f2ba5a217597c0c1b30867f7ded0018ac1bc2139d79633ddd49e844c6d946a3e8bbdec6bf735fc4b7716e07
