


AVANCE DEL PROYECTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

AVANCE FISICO SEMANA No. 9

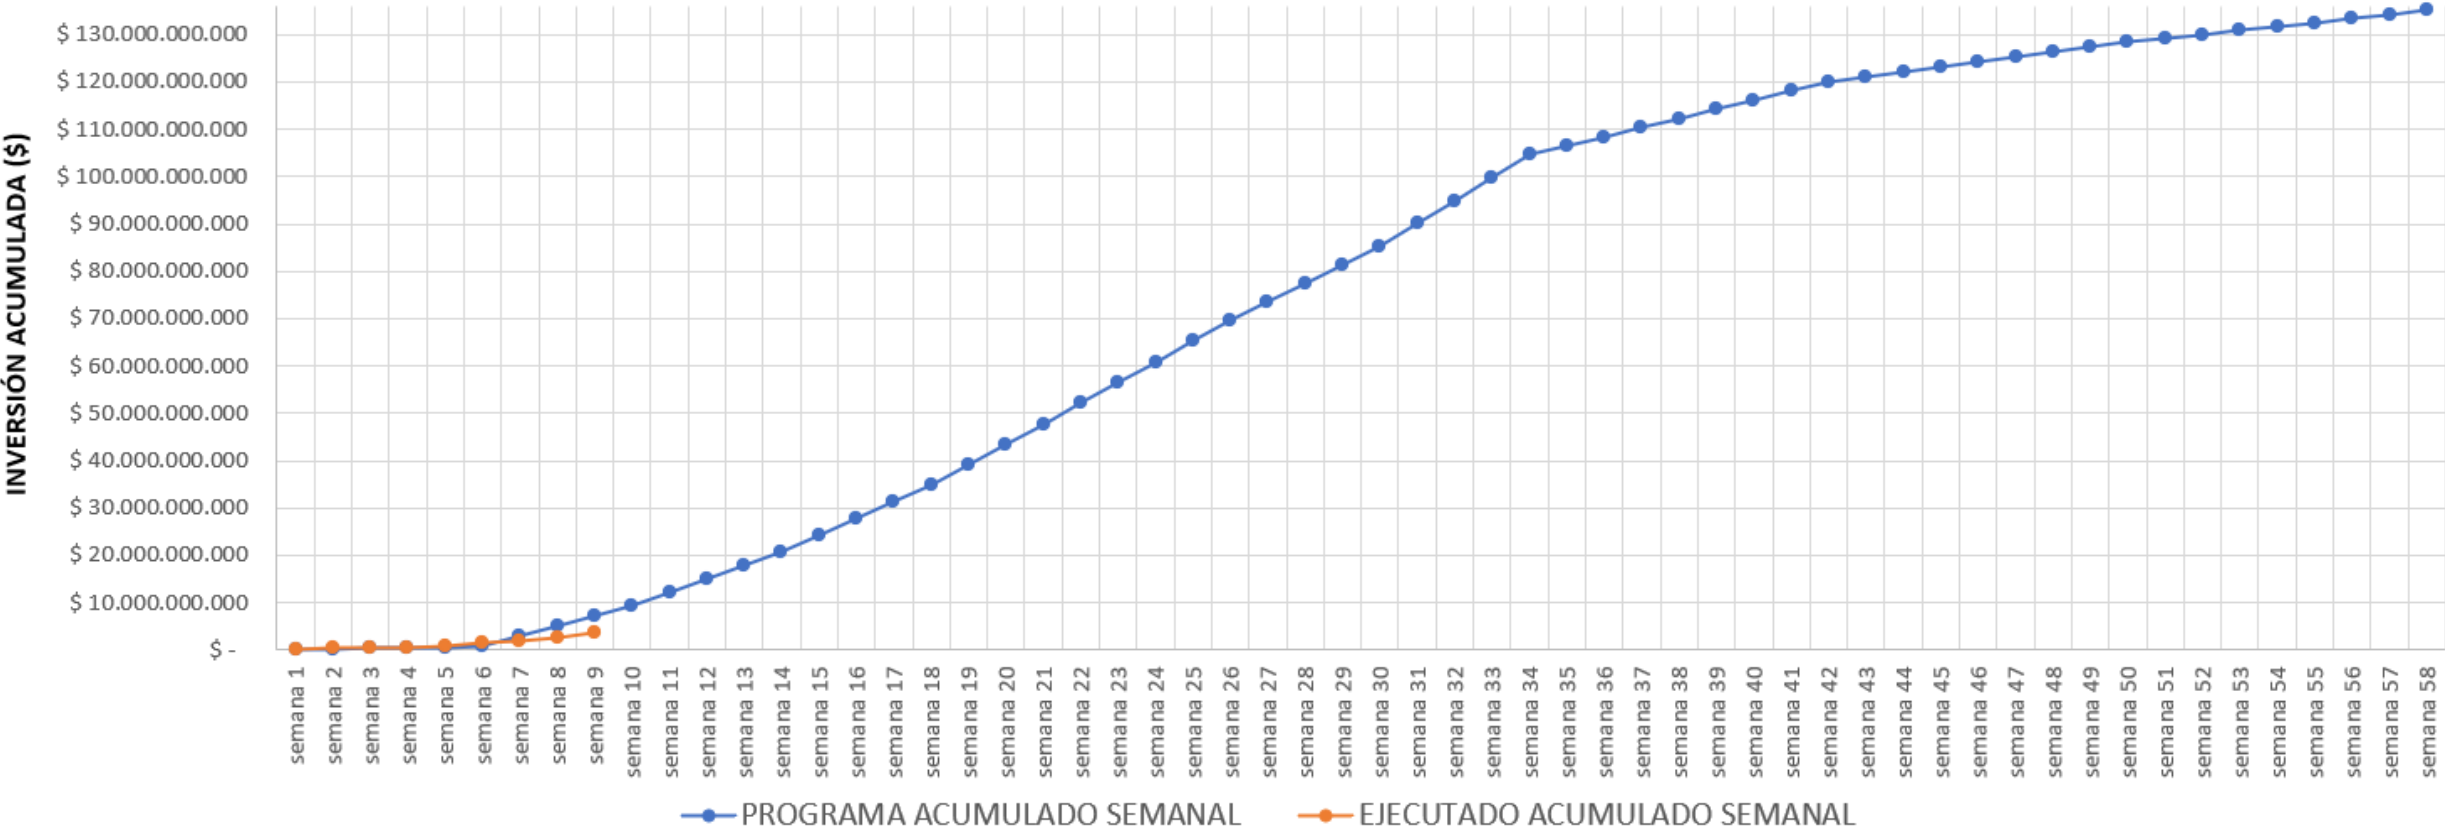

Programado
5,26 %
\$ 7.110.279.180,07

Ejecutado
2,67 %
\$ 3.610.209.246,89

Atraso
- 2,59 %
\$ 3.500.069.933,18
