


AVANCE DEL PROYECTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

AVANCE FISICO SEMANA No. 10

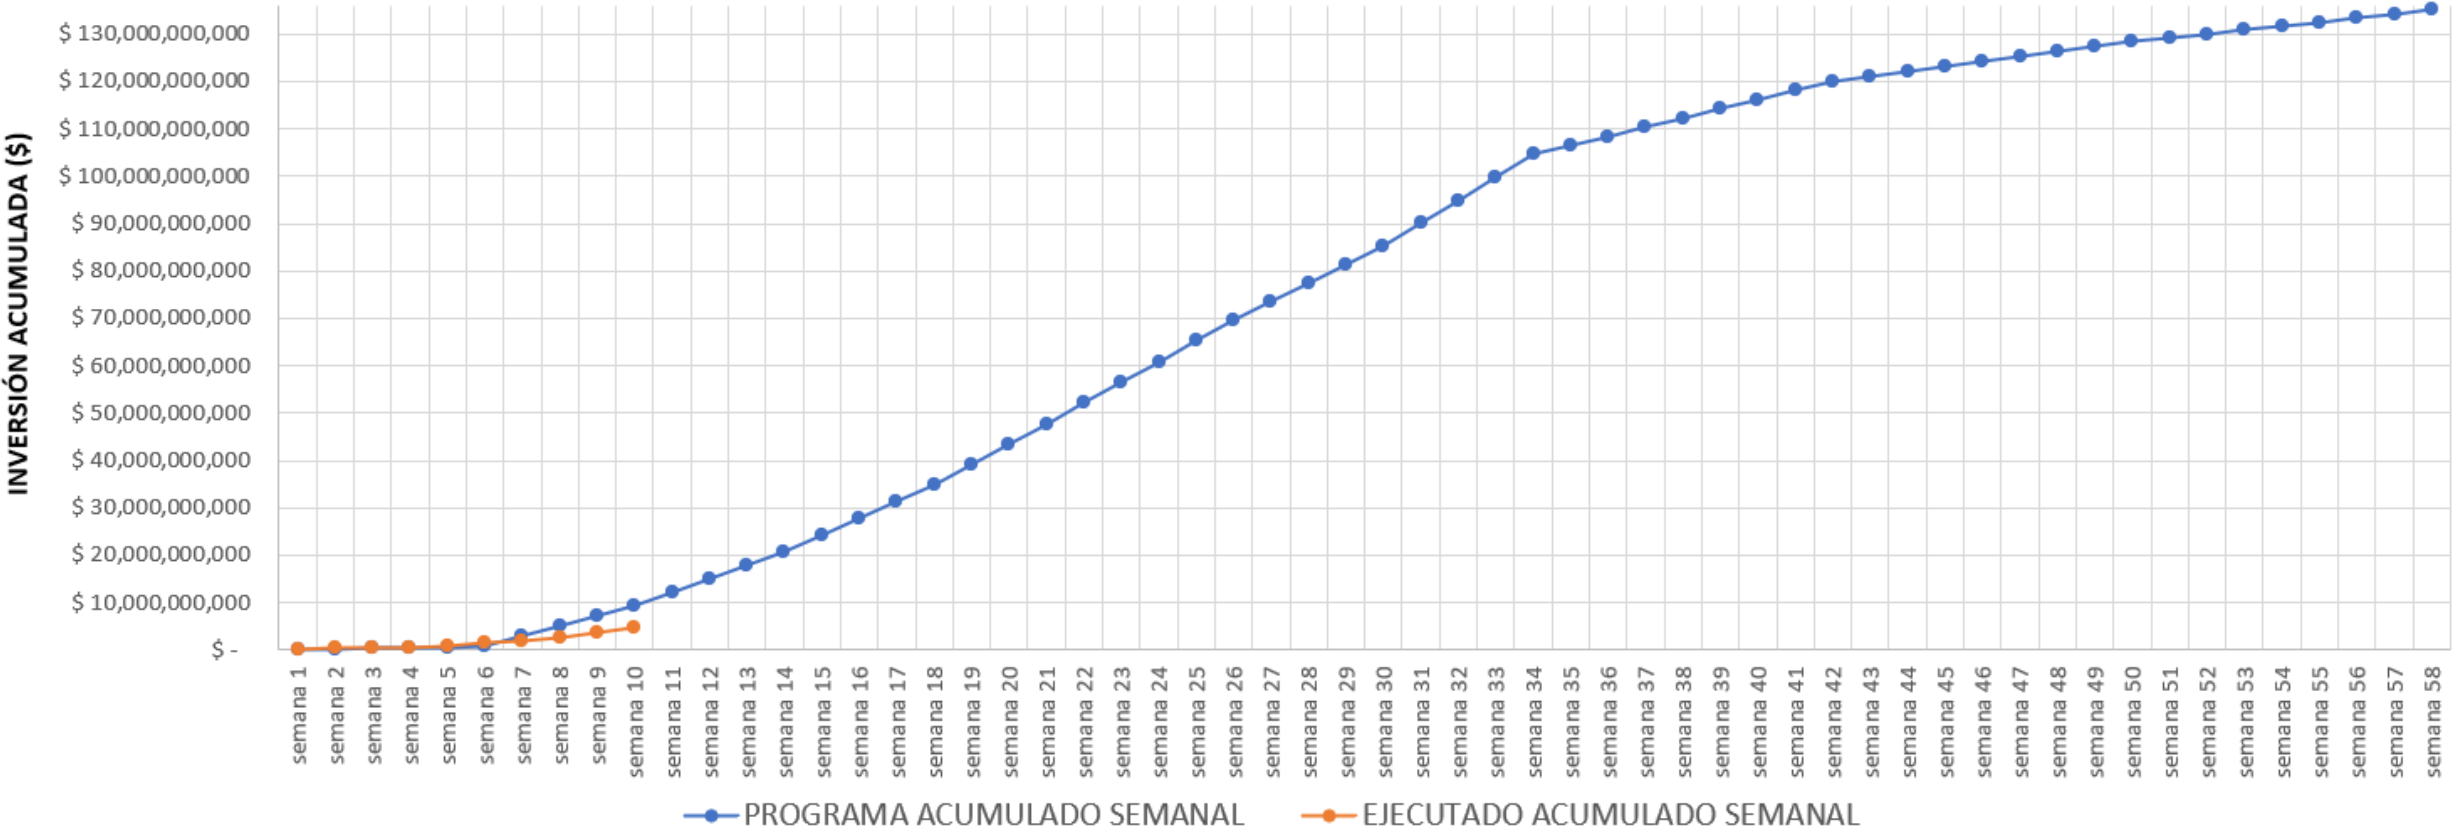

Programado
6,84 %
\$ 9,241,387,973.97

Ejecutado
3,47 %
\$ 4,692,211,371.08

Atraso
- 3,37 %
\$ 4,549,176,602.89
