


AVANCE DEL PROYECTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

AVANCE FISICO SEMANA No. 12

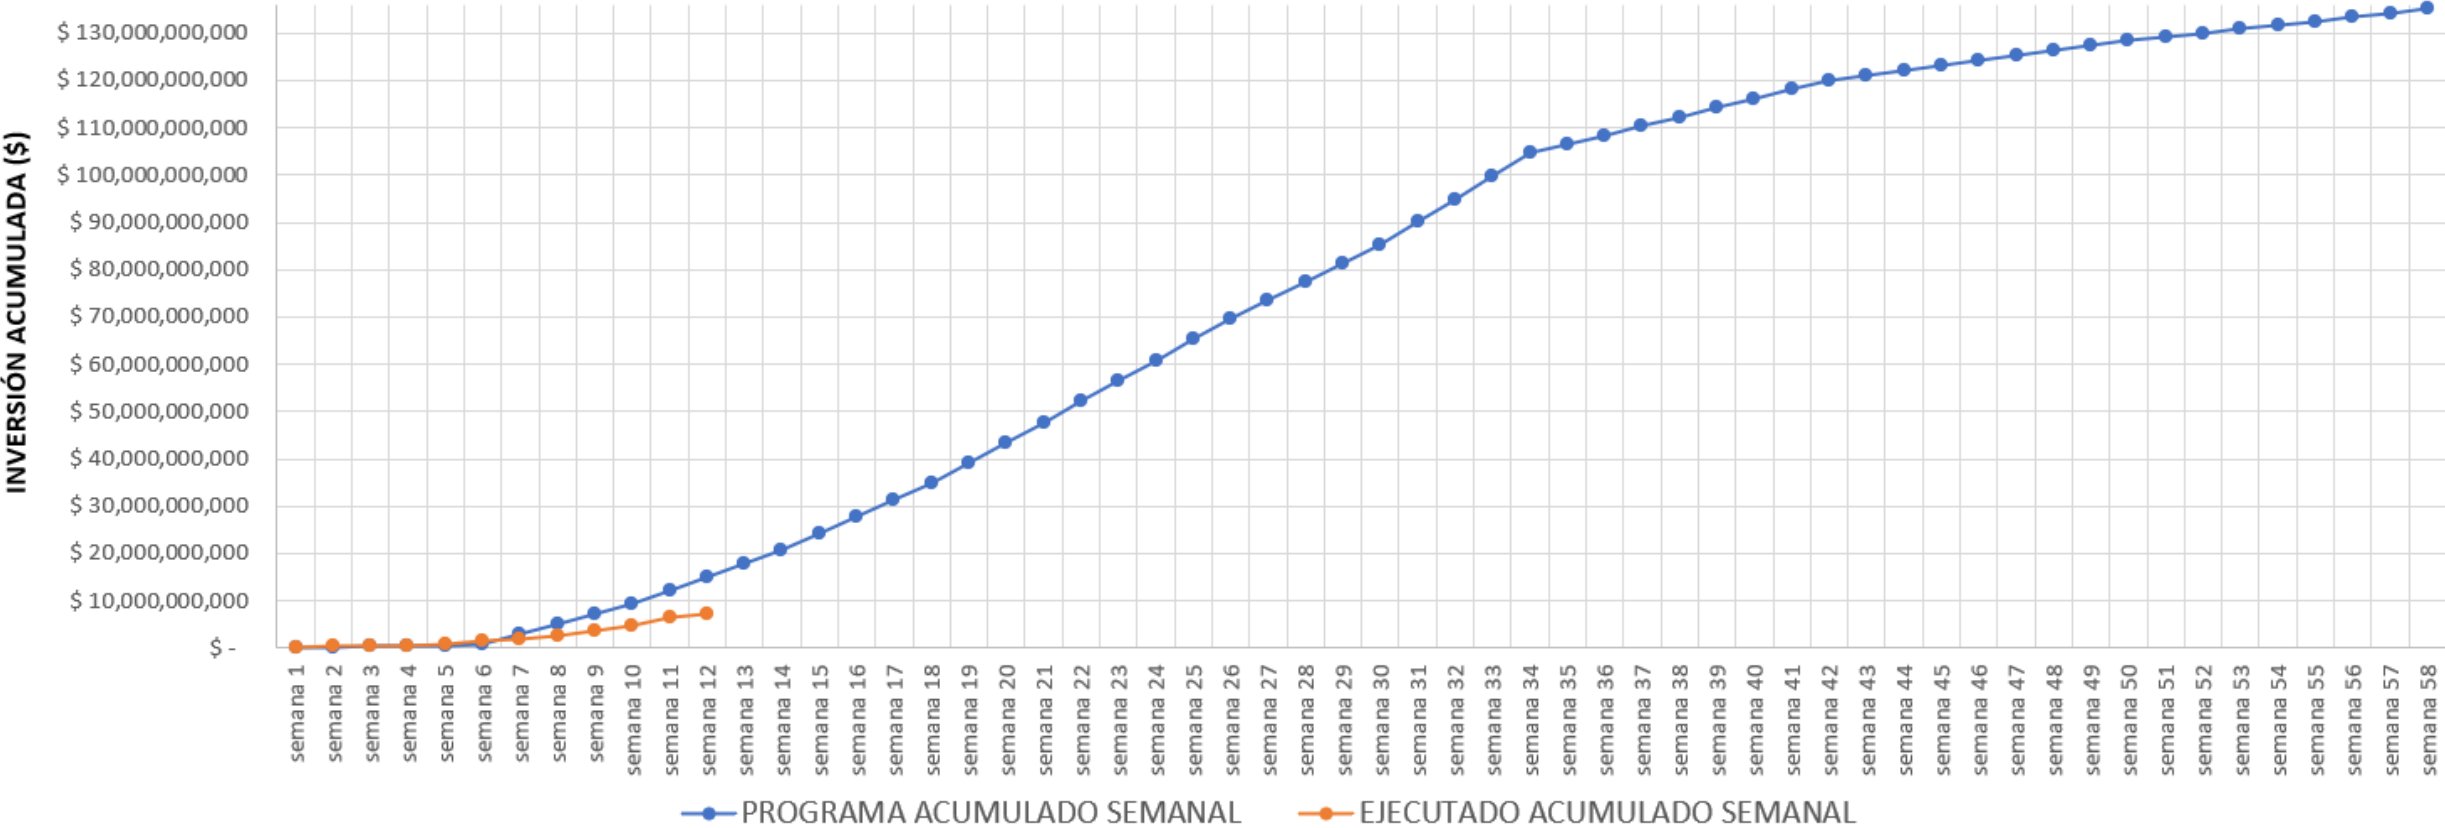

Programado
11,02 %
\$14,888,530,831.49

Ejecutado
5.36 %
\$ 7,235,929,001.31

Atraso
- 5,67 %
\$7,652,601,830.18
