


AVANCE DEL PROYECTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

AVANCE FISICO SEMANA No. 13

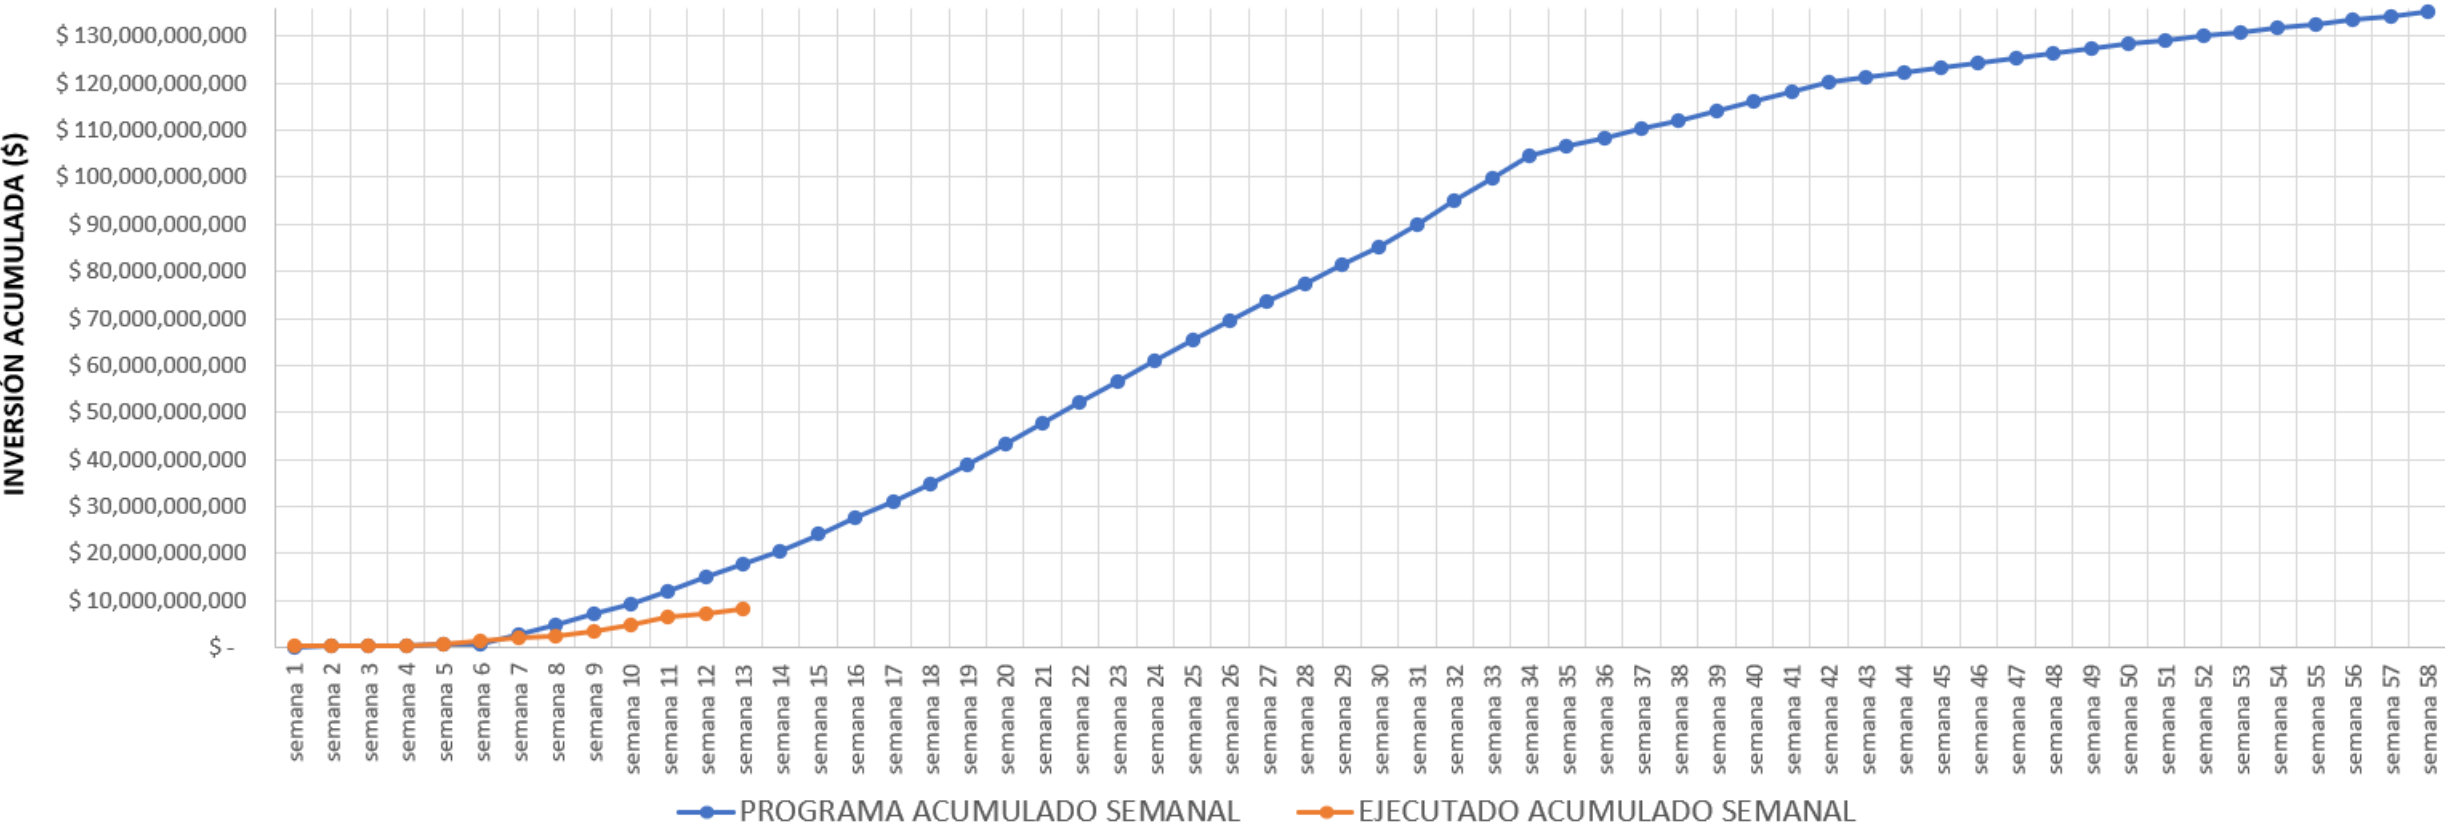

Programado
13,11 %
\$17,712,102,260.24

Ejecutado
6.21 %
\$8,393,101,833.46

Atraso
- 6,90 %
\$9,319,000,426.78
