


AVANCE DEL PROYECTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

AVANCE FISICO SEMANA No. 14

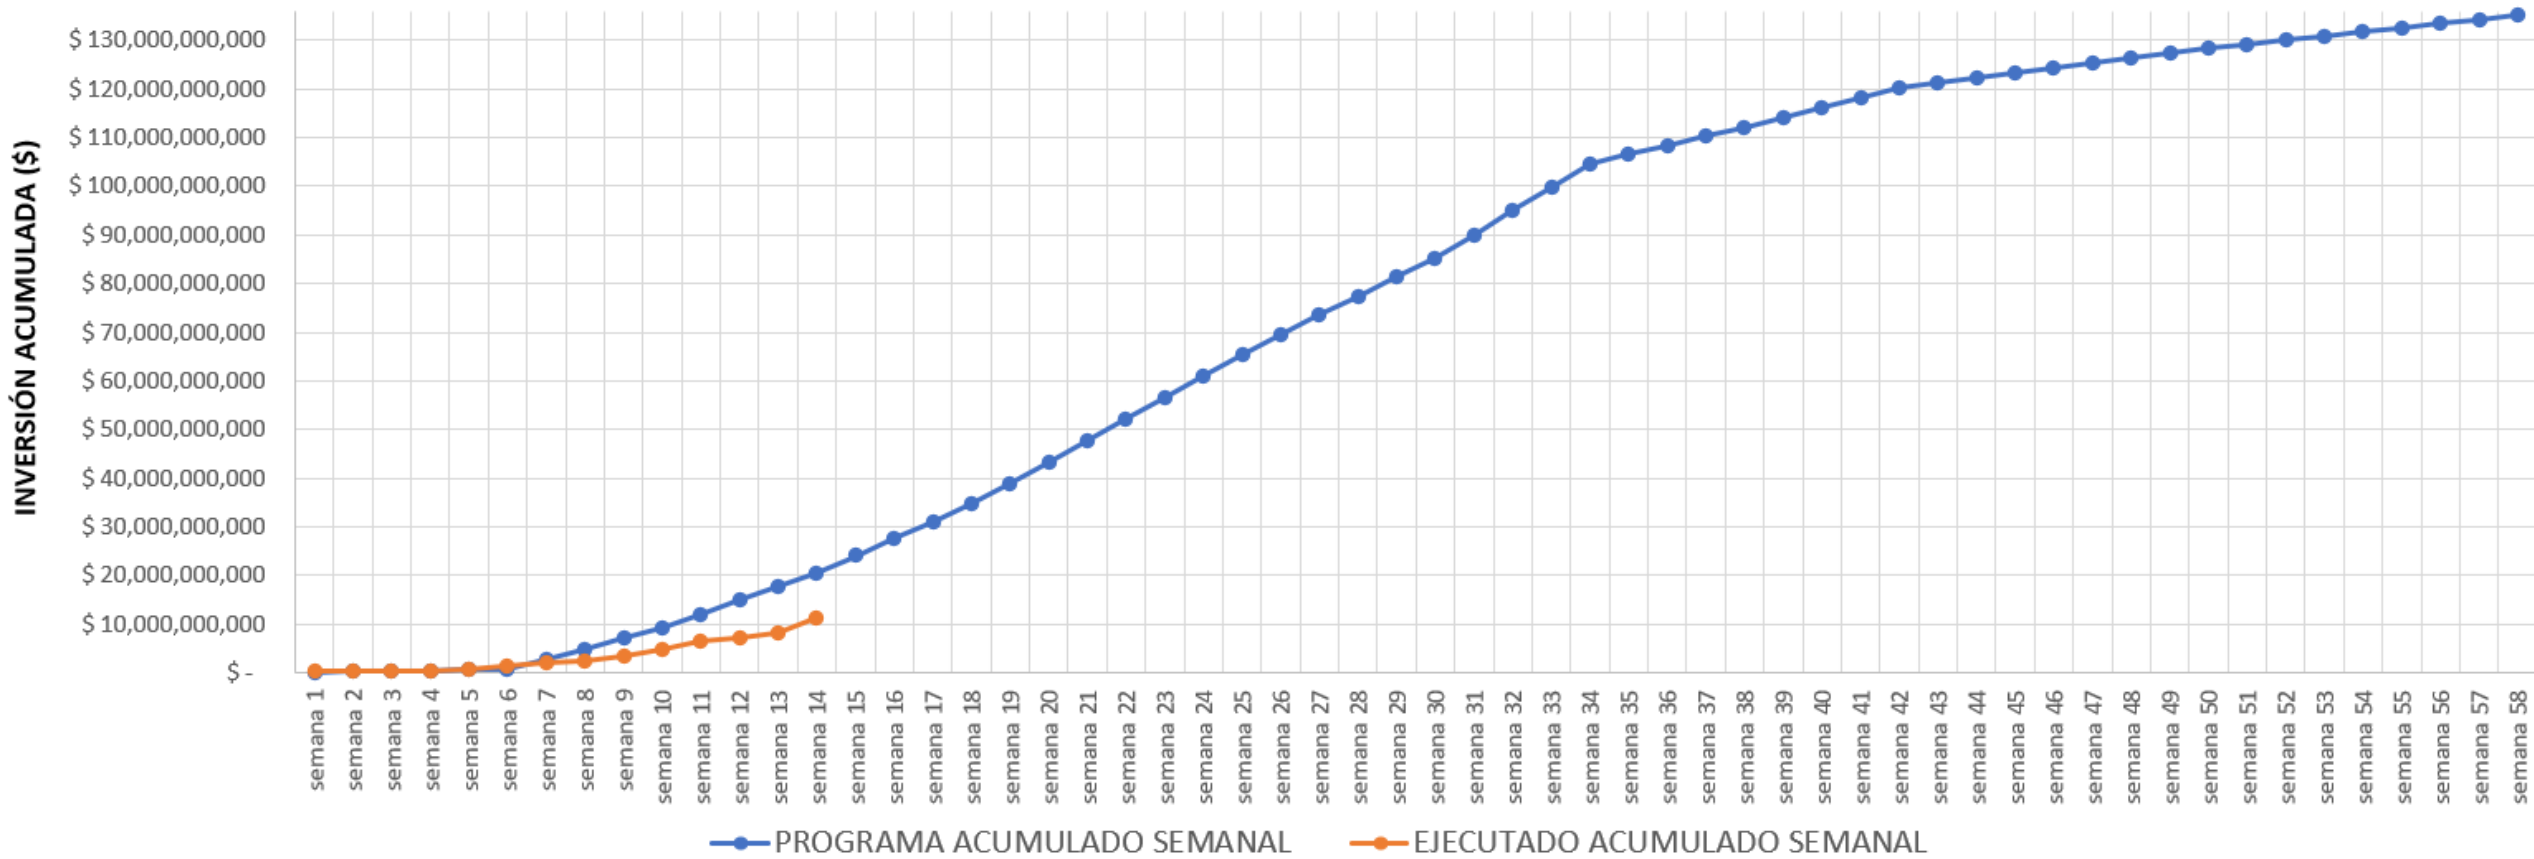

Programado
15,20 %
\$20,535,673,689

Ejecutado
8.38 %
\$ 11,322,329,314.64

Atraso
- 6,82 %
\$ 9,213,344,374.36
