

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA			
Principio de Procedencia: 6200.375		Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 08/MARZO/2020	Página: 1 de 6
UNIDAD EJECUTORA		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			FECHA: 29 de noviembre de 2027
Semana No. 42		Del : 22 de noviembre de 2027		al 28 de noviembre de 2027	
Plazo total		534 días			
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		1020 días		Tiempo restante 486 días	
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato		52,35%			
Nombre del Supervisor :		MIGUEL LEONARDO CASTELLANOS			
OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA					
REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)					
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN					
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO					
(%) Programado		Semanal 2,72%	Acumulado 33,93%		
Valor programado (\$)		\$103.906.671	\$1.296.656.856		
(%) Ejecutado		Semanal 0,56%	Acumulado 27,99%		
Valor ejecutado (\$)		\$21.262.921	\$1.069.715.609		
Evaluación		Porcentaje Adelanto/Atraso -5,94%			
		Valor Adelanto/Atraso -\$ 226.941.246,84			
OBSERVACIONES					
1) Se firma la bitácora semanal con los avances de obras ejecutados					
2) El personal cumple con los requisitos mínimos de seguridad, uso adecuado de EPPs, se evidencia que en la presente semana no se realizaron todas las charlas programadas					
3) Se esta a la espera de aprobación de modificatorio, para efectos de realizar reprogramación de actividades sobre plataforma, pista, zonas de seguridad y cabecera en el tema de latizales. Se proyecta atender dichas actividades con los Notam de consorcio ZETA, adicionalmente la limpieza de canal ya se ejecuto en su totalidad lo cual nos da su terminación de las cantidades contractuales ejecutadas.					
4) El día jueves 16 de octubre de 2025 se nos informo verbalmente el cambio definitivo de la supervisora por parte de la Aerocivil, hasta el 16 desempeño el cargo la INGENIERA ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ y de hay en adelante lo tomara la INGENIERA MARIA CONSUELO DURAN, el día 14 de noviembre de 2025 recibimos por parte de la supervicion del contrato dos oficios uno que es la Revocatoria de la Supervisión del contrato de Interventoría a la Ing. Alba Lucia Riapira Rodriguez y dos la Designación de la Supervisión del contrato de Interventoría a la Ing. María Consuelo Duran Caro. En los comites anteriores la supervicion nos informa que seria muy posible que se cambie nuevamente del supervisor del contrato y que seria el Ing Miguel Leonardo Castellanos, quedamos a la espera de la confirmacion del cambio del supervisor. A partir del 19 de noviembre toma posesión de su cargo como Supervisor del contrato de Interventoría					
DATOS CONTRACTUALES					
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista: CONSORCIO TARQUÍ			Contratista: CONSORCIO IMGA INGENIEROS		
Contrato No: 24001241 H4 de 2024			Contrato No: 24001242 H3 de 2024		
Valor Inicial: \$ 3.822.000.000,00			Valor Inicial: \$ 1.685.576.900		
Valor Anticipo: \$ 585.511.508			Valor Anticipo:		
Valor Actualizado al modificatorio :			Valor Actualizado al modificatorio :		
Valor actualizado 2:			Valor actualizado 2:		
Plazo inicial (MESES): 20,00			Plazo inicial: 20,00		
Plazo actualizado (MESES): 20,00			Plazo actualizado: 20,00		
Fecha de iniciación: 12-feb-25			Fecha de iniciación: 12-feb-25		
Fecha de vencimiento: 31-jul-26			Fecha de vencimiento: 31-jul-26		
Modificatorio No. Prórroga No.			Modificatorio No. Prórroga No.		
Fecha de Terminación Según Prórroga No.			Fecha de Terminación Según Prórroga No.		
Suspensión No.			Suspensión No.		
Periodo de Suspensión No.			Periodo de Suspensión No.		
Levantamiento de la suspensión No.			Levantamiento de la suspensión No.		
Nueva fecha de terminación			Nueva fecha de terminación		
Valor total actual del contrato \$ 3.822.000.000			Valor total actual del contrato \$ 1.685.576.900		


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
1) Se firma la bitácora semanal con los avances de obras ejecutados		
2) El personal cumple con los requisitos mínimos de seguridad, uso adecuado de EPPs, se evidencia que en la presente semana no se realizaron todas las charlas programadas		
3) Se esta a la espera de aprobación de modificatorio, para efectos de realizar reprogramación de actividades sobre plataforma, pista, zonas de seguridad y cabecera en el tema de latizales. Se proyecta atender dichas actividades con los Notam de consorcio ZETA, adicionalmente la limpieza de canal ya se ejecuto en su totalidad lo cual nos da su terminación de las cantidades contractuales ejecutadas.		
4) El día jueves 16 de octubre de 2025 se nos informo verbalmente el cambio definitivo de la supervisora por parte de la Aerocivil, hasta el 16 desempeño el cargo la INGENIERA ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ y de hay en adelante lo tomara la INGENIERA MARIA CONSUELO DURAN, el día 14 de noviembre de 2025 recibimos por parte de la supervicion del contrato dos oficios uno que es la Revocatoria de la Supervisión del contrato de Interventoría a la Ing. Alba Lucia Riapira Rodriguez y dos la Designación de la Supervisión del contrato de Interventoría a la Ing. Maria Consuelo Duran Caro. En los comites anteriores la supervicion nos informa que seria muy posible que se cambie nuevamente del supervisor del contrato y que seria el Ing Miguel Leonardo Castellanos, quedamos a la espera de la confirmacion del cambio del supervisor. A partir del 19 de noviembre toma posesión de su cargo como Supervisor del contrato de Interventoría		
5) En el periodo el CONSORCIO TARQUI no realizo labores de limpieza de encoles y desencoles, tampoco ha realizado las labores de limpieza de canales porque las cantidades contractuales ya se completaron desde finales del mes de agosto, el contratista queda a la espera de la aprobación del modificatorio ya que no podría realizar limpieza de canales por falta de cantidades contractuales		
6) En este periodo se reviso y se aprobo la 6 actas de pago de anticipo por parte de la interventoría, se esta a la espera que en esta próxima semana se evidencie su desembolso .		
7) En la semana 39 se radico y aprobó las actas números 3 y 4 del CONSORCIO TARQUI, estas actas ya se pidio factura final por parted de la supervicion, se esta a la espera de la aprobacion que se realizo el pago.		
8) A inicios de semana se realizo el pago del acta No. 2 de la interventoria, por parte de la supervicion ya se solicitaron facturas finales de las actas 3 y 4, se esta a la espera que se evidencie el pago de estas actas de interventoria.		
9) El día 7 de octubre se realizo mesa de trabajo para revisión de NPs, en esta mesa de trabajo se conciliaron los precios con el profesional de la aeronáutica donde nos dio aval a los precios establecidos en cada uno de los 6 NPs presentados, en esta semana se presento nuevamente el modificatorio con todos los anexos para ser radicado y aprobado por la supervisión la ingeniera MARIA CONSUELO DURAN CARO, segun lo informado por la supervicion el modificatorio esta en tramite de aprobacion por parte del comite tecnico		
10) En esta semana que transcurrió se realizo la revisión de la documentacion para la presentacion del acta de pago No 5 y 6 del Consorcio Tarqui, se radico a la supervicion y esta a la espera de su aprobacion		
11) En esta semana que transcurrió se realizo la entrega de las actas No 5 y 6 de la interventoria, se radico a la supervicion y esta a la espera de su aprobacion por parte de la supervicion		
12) Desde el 17 de octubre se envio a la supervicion para su aprobacion el plan de cargas y a la fecha no se ha tenido respuesta de este plan de cargas por parte de la supervicion, se espera que el día martes se radique muevamente el plan de cargas de este mes.		
13) El 30 de octubre se se iniciaron las actividades de instalacion y cambio de malla del cerramiento, las actividades continuan a un ritmo bajo por las lluvias constates en la zona		
OBRAS LADO AIRE		
POBLACION BENEFICIADA		
Según informes del DANE, la Ciudad de Leticia tiene una población de 55.000 habitantes y de acuerdo al Plan Maestro, el aeropuerto mueve alrededor de 280.000 personas al año, entre viajeros residentes de la ciudad y turistas, con una tasa de crecimiento del 3,43%. Las obras de mejoramiento y mantenimiento que se están ejecutando en el aeropuerto Vásquez Cobo permitirán potenciar el desarrollo del sector turístico y comercial de la región y del país, aportando así al desarrollo territorial.		
EMPLEOS A GENERAR DIRECTOS E INDIRECTOS		
De acuerdo al anexo técnico se debe generar empleo directo e indirecto con personal de la región. El PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, se prevé que durante la etapa de mantenimiento se contará con cinco (5) profesionales y tres (3) especialistas como empleos directos, de acuerdo a la dedicación contemplada en el anexo técnico, más las cuadrillas de rocería, limpieza de cerramientos y canales, que de acuerdo a los ciclos de intervención, pueden representar entre 15 y 20 empleos directos mensuales. Durante la presente semana se contó con la presencia del Ingeniero Director de obra, el Ingeniero Residente de obra, y la Profesional SISOMA . Los empleos indirectos que se generan, están representados por las personas y/o lugares comerciales que se benefician de los empleados del Consorcio, como restaurantes, lavanderías, personas de servicios generales, etc.		
BENEFICIOS TECNICOS		
El proyecto traerá los siguientes beneficios para el aeropuerto así: 1. Mantenimiento de las áreas del lado aire a fin de garantizar la seguridad aeroportuaria mediante l rocería de áreas verdes que pueden generar la aparición de fauna. 2. Mantenimiento de cerramientos que garantizaran la seguridad del aeropuerto y el ingreso de personal o animales al lado aire. 3. Mejoramiento del aterrizaje mediante la limpieza y retro de caucho. 4. Mejoramiento de la operación aérea mediante la señalización de las áreas de pista y plataforma. 5. Mejoramiento de descoles para garantizar el funcionamiento de los canales existentes.		
BENEFICIOS SOCIALES		
Al mejorar las condiciones del aeropuerto en cuanto a seguridad operacional se puede certificar como Aeropuerto Internacional lo que beneficiará al sector con turismo y mas frecuencias de vuelos lo que generará beneficios económicos para la región.		
Relación de Vehiculos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria Liviana	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
		
Se cuenta con camioneta desde el 21 de marzo de 2025 / el contratista no cumple con la aplicación del manual de identidad de la Aerocivil	MOTOSIERRA	GUADAÑAS
El contratista a hecho entrega del listado de equipo mínimo requerido para las actividades; se le ha insistido que no debe ser el mismo que este siendo usado por otra contratista en el aeropuerto de Leticia		

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA				
Personal de interventoria	Director de interventoria	1	HV aprobada	
	Residente de interventoria LA	1	HV aprobada	
	Residente de interventoria LT	1	HV aprobada	
	Especialista en pavimentos	1	HV aprobada	
	Especialista hidráulico	1	HV aprobada	
	Especialista aeroportuario	1	HV aprobada	
	Residente sisoma de interventoria	0	HV aprobada	
	Topógrafo interventoria	1	HV aprobada	
	Cadenero interventoria	1	HV aprobada	
	Personal Contratista	Director de obra	1	HV aprobada
		Residente de obra	1	HV aprobada
		Residente eléctrico	1	HV aprobada
		Inspector SISOMA	1	HV aprobada
		Especialista aeroportuario	1	HV aprobada
		Especialista de pavimentos	1	HV aprobada
		Especialista eléctrico	1	HV aprobada
		Técnico Eléctrico	3	HV aprobada
		Topógrafo contratista	1	HV aprobada
Cadenero contratista		1	HV aprobada	


CORRESPONDENCIA ENVIADA				
FECHA	ASUNTO	CODIGO/TIPO	DIRIGIDO A	
23/11/2025	INFORME SEMANAL No. 41 LADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	
24/11/2025	Respuesta oficio 271-25 oficina y 268-25- ITEM'S 1.2 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL) y 1.3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO – FUMIGACION	CIMGAIN-486-2025	CONSORCIO TARQUI	
24/11/2025	CIMGAIN-487-2025 - Respuesta comunicación 272-25 Oficina Entrega informe semanal No 041 Corresponde a la semana entre 15 y 21 de Noviembre de 2025	CIMGAIN-487-2025	CONSORCIO TARQUI	
24/11/2025	Solicitud Factura Acta Parcial de Obra No.5 - Contrato No.24001241 H4 de 2024 Lado Aire	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	
25/11/2025	SOLICITUD FACTURA ACTA No. 3 CONSORCIO IMGA	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA	
26/11/2025	oficio 275-25 MEDICIÓN DE LA FRICCIÓN DEL PAVIMENTO.	Correo electrónico	DISEÑOS GEOTECNICOS	
26/11/2025	CIMGAIN-484-2025 - Respuesta solicitud cobro Inventario latizales	CIMGAIN-484-2025	CONSORCIO TARQUI	
26/11/2025	CIMGAIN-489-2025 ACTA PARCIAL DE OBRA No 6 Lado Aire	CIMGAIN-489-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	
26/11/2025	CIMGAIN-485- 2025- Respuesta a oficio 267-25 Solicitud de pago No 7 con cargo al anticipo del contrato	CIMGAIN-485-2025	CONSORCIO TARQUI	
26/11/2025	SOLICITUD FACTURA ACTA No. 4 CONSORCIO IMGA	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA	
26/11/2025	CIMGAIN-491-2025 - CIERRE GESTIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2025 Y APERTURA DE LA VIGENCIA 2026	CIMGAIN-491-2025	CONSORCIO TARQUI	
26/11/2025	CIMGAIN-483-2025 - Acta de recibo parcial de interventoria No 6 del periodo del 01 al 31 de octubre de 2025	CIMGAIN-483-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	
27/11/2025	COMITE DE OBRA No. 39	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI	
27/11/2025	Solicitud Factura Acta Parcial de Interventoria No.3 - Contrato No.24001242 H3 de 2024	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	
27/11/2025	Solicitud Factura Acta Parcial de Interventoria No.4 - Contrato No.24001242 H3 de 2024	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	
28/11/2025	ACTA DE COMITE No. 39 LADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	
28/11/2025	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MES DE DICIEMBRE Y TEMPORADA DE FIN DE AÑO	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI	
28/11/2025	SOLICITUD VIAJE POR SEMANA DE DESCANSO TRIMESTRAL INGENIERO HERNAN VILLAMIL - PROYECTO AEROPUERTO LETICIA	Correo electrónico	CONSORCIO IMGA	

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA	CODIGO/TIPO	ASUNTO	ENVIADO POR	DIRIGIDO A
22/11/2025	Correo electrónico	oficio 268-25 ITEM'S 1.2 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL) y 1.3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
22/11/2025	Correo electrónico	Oficio 272-25 Oficina INFORME SEMANAL N.41	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
23/11/2025	Correo electrónico	Seguimiento Contrato de Obra No. 24001241 H4 de 2024 - MTO Lado Aire	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
24/11/2025	Correo electrónico	Ofico 273_25 Oficina Alcance oficio 266-25 Acta de recibo parcial Obra No. 6 Octubre 2025	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
24/11/2025	Correo electrónico	Oficio 274-25 Oficina FACTURA DE COBRO No. CTL 5 ACTA DE OBRA. No.5 ENTRE 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
24/11/2025	Correo electrónico	Mesa de trabajo - Observaciones Actas Parciales	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
25/11/2025	Correo electrónico	Solicitud Factura Acta Parcial de Interventoria No.3 - Contrato No.24001242 H3 de 2024	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
25/11/2025	Correo electrónico	SOLICITUD FACTURA ACTA No. 3 CONSORCIO IMGA	CONSORCIO IMGA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
25/11/2025	Correo electrónico	oficio 275-25 MEDICIÓN DE LA FRICCIÓN DEL PAVIMENTO	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
26/11/2025	Correo electrónico	INFORMACIÓN SOBRE FACTURACIÓN - CIERRE VIGENCIA 2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
26/11/2025	Correo electrónico	Solicitud Factura Acta Parcial de Interventoria No.4 - Contrato No.24001242 H3 de 2024	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
26/11/2025	Correo electrónico	SOLICITUD FACTURA ACTA No. 4 CONSORCIO IMGA	CONSORCIO IMGA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
26/11/2025	Correo electrónico	Remisión de Informes Mensuales – Aeropuerto de Leticia (Julio 14-30, Agosto, Septiembre y Octubre 2025)	CESAR LOSADA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
28/11/2025	Correo electrónico	ACTA DE COMITE No. 39 LADO AIRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
28/11/2025	Correo electrónico	Acta parcial de obra No 6	ISMAEL RESTREPO	CONSORCIO IMGA INGENIEROS


AVANCE FINANCIERO DE OBRA					
CONTRATISTA OBRA					
ACTAS	Valor Acta	AMORTIZACION	VALOR ACTA	PENDIENTE POR FACTURAR	VALOR CONTRACTUAÑ
No. 1	\$ 276.711.682,00	\$ 42.392.230,00	\$ 234.319.452,00	\$ 3.545.288.318,00	\$ 3.822.000.000,00
No. 2	\$ 173.373.959,00	\$ 26.560.891,00	\$ 146.813.068,00	\$ 3.371.914.359,00	
No. 3	\$ 163.712.529,00	\$ 25.080.759,00	\$ 138.631.770,00	\$ 3.208.201.830,00	
No. 4	\$ 100.080.821,00	\$ 15.322.382,00	\$ 84.758.439,00	\$ 3.108.121.009,00	
No. 5	\$ 170.365.538,00	\$ 26.100.000,00	\$ 144.265.538,00	\$ 2.937.755.471,00	
CONTRATISTA INTERVENTORÍA					
ACTA No. 1	Valor acta	AMORTIZACION	VALOR ACTA	PENDIENTE POR FACTURAR	VALOR CONTRACTUAL
No. 1	\$ 141.913.832,00		\$ 141.913.832,00	\$ 1.543.663.068,00	\$ 1.685.576.900,00
No. 2	\$ 42.847.431,00		\$ 42.847.431,00	\$ 1.500.815.637,00	
No. 3	\$ 39.480.155,00		\$ 39.480.155,00	\$ 1.461.335.482,00	
No. 4	\$ 18.855.753,00		\$ 18.855.753,00	\$ 1.442.479.729,00	
No. 5	\$ 80.420.427,00		\$ 80.420.427,00	\$ 1.362.059.302,00	
SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE OBRA					

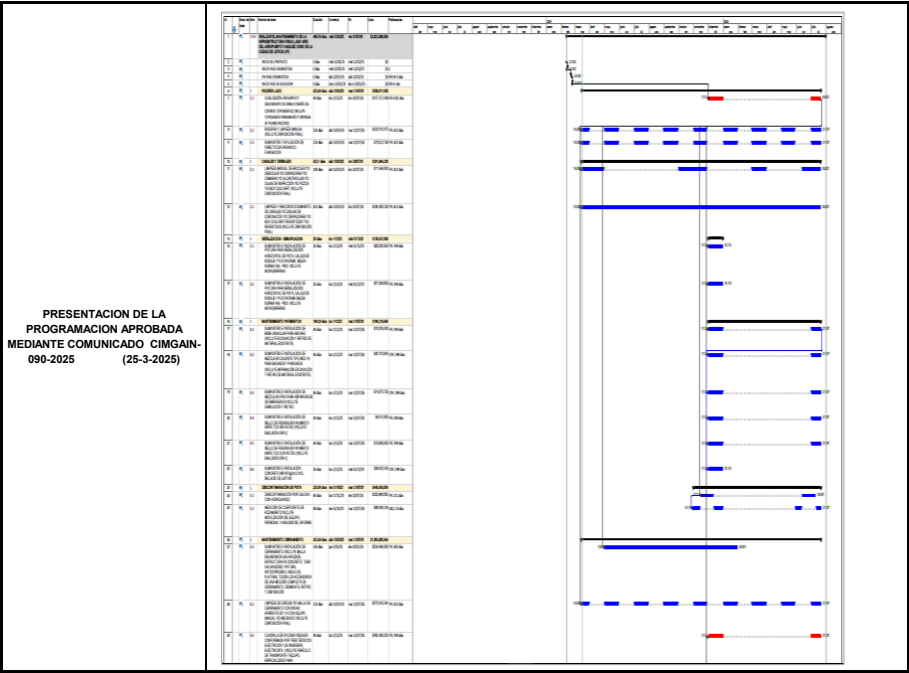

AVANCE FÍSICO SEMANAL						
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado	Ejecutado	Desviacion
12-feb	14-feb		1	0,00%	0,00%	0,00%
15-feb	21-feb		2	0,00%	0,00%	0,00%
22-feb	28-feb		3	0,00%	0,00%	0,00%
1-mar	7-mar	1	4	0,19%	0,00%	-0,19%
8-mar	14-mar		5	0,38%	0,02%	-0,36%
15-mar	21-mar		6	1,31%	0,09%	-1,23%
22-mar	28-mar		7	2,25%	0,30%	-1,95%
29-mar	4-abr	2	8	2,35%	0,48%	-1,87%
5-abr	11-abr		9	2,45%	1,05%	-1,40%
12-abr	18-abr		10	2,55%	1,69%	-0,86%
19-abr	25-abr		11	2,65%	2,67%	0,02%
26-abr	2-may	3	12	2,74%	3,29%	0,54%
3-may	9-may		13	4,11%	4,37%	0,26%
10-may	16-may		14	5,48%	5,28%	-0,20%
17-may	23-may		15	6,85%	6,61%	-0,24%
24-may	30-may	4	16	8,22%	7,19%	-1,03%
31-may	6-jun		17	8,75%	8,70%	-0,05%
7-jun	13-jun		18	9,29%	9,99%	0,70%
14-jun	20-jun		19	9,82%	11,20%	1,38%
21-jun	27-jun		20	10,35%	11,73%	1,37%
28-jun	4-jul	5	21	11,53%	12,29%	0,76%
5-jul	11-jul		22	12,70%	13,11%	0,41%
12-jul	18-jul		23	13,87%	14,23%	0,36%
19-jul	25-jul		24	15,05%	15,11%	0,06%
26-jul	1-ago	6	25	15,47%	16,21%	0,74%
2-ago	8-ago		26	15,90%	16,71%	0,81%
9-ago	15-ago		27	16,33%	17,49%	1,17%
16-ago	22-ago		28	16,75%	17,89%	1,14%
23-ago	29-ago		29	17,18%	18,53%	1,35%
30-ago	5-sep	7	30	18,54%	18,97%	0,43%
6-sep	12-sep		31	19,90%	19,71%	-0,20%
13-sep	19-sep		32	21,26%	20,49%	-0,77%
20-sep	26-sep		33	22,62%	21,75%	-0,87%
27-sep	3-oct	8	34	23,06%	23,65%	0,59%
4-oct	10-oct		35	23,49%	24,77%	1,28%
11-oct	17-oct		36	23,93%	25,76%	1,83%
18-oct	24-oct		37	24,37%	26,21%	1,84%
25-oct	31-oct	9	38	24,80%	26,21%	1,41%
1-nov	7-nov		39	26,65%	26,64%	-0,01%
8-nov	14-nov		40	28,49%	27,15%	-1,34%
15-nov	21-nov		41	31,21%	27,43%	-3,78%
22-nov	28-nov		42	33,93%	27,99%	-5,94%

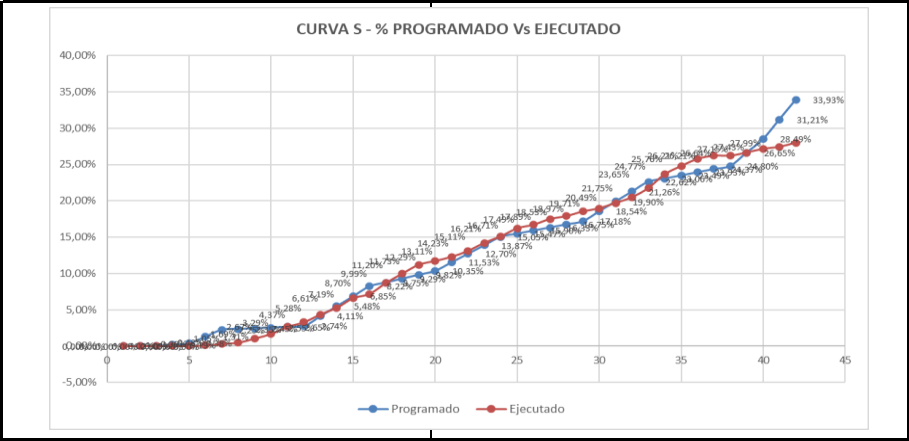

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMANAL						
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado (\$)	Ejecutado (\$)	Pagado (\$)
12-feb	14-feb		1	0	0	0
15-feb	21-feb		2	0	0	0
22-feb	28-feb		3	0	0	0
1-mar	7-mar	1	4	7.196.992	0	-7.196.992
8-mar	14-mar		5	14.397.984	699.958	-13.698.026
15-mar	21-mar		6	50.251.271	3.368.889	-46.882.382
22-mar	28-mar		7	86.104.558	11.636.671	-74.467.888
29-mar	4-abr	2	8	89.664.462	18.496.354	-71.368.108
5-abr	11-abr		9	93.624.366	40.237.107	-53.387.259
12-abr	18-abr		10	97.384.270	64.414.699	-32.969.571
19-abr	25-abr		11	101.144.174	101.870.734	726.560
26-abr	2-may	3	12	104.904.078	125.626.545	20.722.467
3-may	9-may		13	157.235.472	167.126.259	9.890.787
10-may	16-may		14	209.566.866	201.963.901	-7.582.965
17-may	23-may		15	261.898.260	252.568.855	-9.329.405
24-may	30-may	4	16	314.229.654	274.794.438	-39.435.216
31-may	6-jun		17	334.604.584	332.670.869	-1.933.725
7-jun	13-jun		18	354.979.514	381.738.878	26.769.364
14-jun	20-jun		19	375.354.444	427.946.564	52.592.121
21-jun	27-jun		20	396.729.374	448.191.173	52.461.799
28-jun	4-jul	5	21	440.560.768	469.791.583	29.230.815
5-jul	11-jul		22	485.392.162	501.048.297	15.656.135
12-jul	18-jul		23	530.223.556	543.806.264	13.581.709
19-jul	25-jul		24	575.054.950	577.316.258	2.261.308
26-jul	1-ago	6	25	591.354.894	619.696.077	28.341.184
2-ago	8-ago		26	607.654.838	638.636.769	30.981.931
9-ago	15-ago		27	623.954.782	668.606.286	44.651.504
16-ago	22-ago		28	640.254.726	683.848.846	43.594.121
23-ago	29-ago		29	656.554.669	708.216.752	51.662.083
30-ago	5-sep	7	30	708.585.055	725.056.842	16.471.787
6-sep	12-sep		31	760.615.441	753.131.660	-7.483.780
13-sep	19-sep		32	812.645.827	783.098.207	-29.547.620
20-sep	26-sep		33	864.676.212	831.244.143	-33.432.069
27-sep	3-oct	8	34	881.321.126	903.903.000	22.581.874
4-oct	10-oct		35	897.966.040	946.709.400	48.743.360
11-oct	17-oct		36	914.610.954	984.547.200	69.936.246
18-oct	24-oct		37	931.255.868	1.001.746.200	70.490.332
25-oct	31-oct	9	38	947.900.782	1.001.746.200	53.845.418
1-nov	7-nov		39	1.018.372.148	1.018.180.800	-191.348
8-nov	14-nov		40	1.088.843.513	1.037.673.000	-51.170.513
15-nov	21-nov		41	1.192.750.185	1.048.374.600	-144.375.585
22-nov	28-nov		42	1.296.656.856	1.069.777.800	-226.879.056

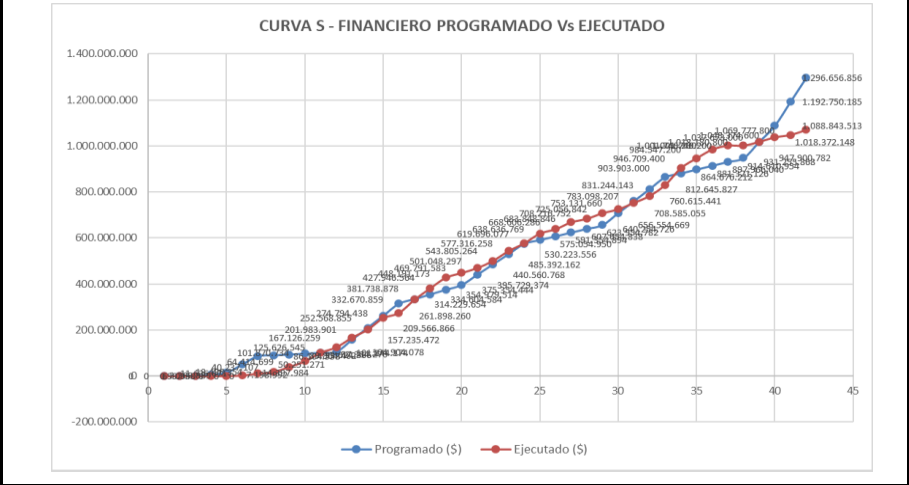

AVANCE TECNICO DE OBRA	
<p>Informe de Actividades Realizadas semana 42:</p> <p>Durante la semana comprendida entre el 22 de noviembre de 2025 al 28 de noviembre de 2025, se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejecución de labores de rocería en el costado occidental y oriental de pista, en 4,99 Ha • Aplicación de insecticida mediante fumigación en las áreas intervenidas con rocería en 4,99 Ha. • Limpieza de cerramiento en 0,0 ml • Instalacion de cerramiento 17,46 ml • Se hace recorrido de obra, por parte de los residentes sobre el cerramiento del aeropuerto, donde se pudo identificar causas principales de daño del cerramiento: corte de malla por los vivientes del sector, oxidación por presencia de agua, caída de árboles y cumplimiento de su vida útil 	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
<div>    </div> <p>Realizacion de Rocería</p> <div>    </div> <p>Aplicación de insecticida</p> <div>   </div> <div>   </div> <p>Registro fotográfico de instalacionde mallas de cerramiento</p>	
OBSERVACIONES	Ingeniero Residente de Interventoria
<p>- En la semana entre el 1 y el 5 de diciembre se nos informo que tendríamos visita de la supervision al proyecto en leticia, la cual se ratifica para la primera semana del mes de diciembre, en cabeza del nuevo supervisor Miguel Leonardo Castellanos.</p> <p>- Se aclara en el presente informe mensual que el atrazo que se da en esta semana del contratista esta supeditado a la entrega del modificadorio No. 1, en el cual se entrega balance de actividades en las cuales se retiran valores importantes de actividades que definitivamente no se ejecutarán y dan pie a otras que son urgentes y necesarias para la operación del aeropuerto, tales como bacheo en pista, reposición de losas en plataforma y disposición de latizales.</p>	<div>  <p>ING. HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS</p> </div>
