

**“FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTION”  
NIVEL ASESOR, PROFESIONAL, TÉCNICO, ASISTENCIAL Y CONTRATISTAS  
DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA  
GESTIÓN**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IDU-1927-2024-2024**

**OBJETO:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE TRANSMILENIO CONTRATADAS POR EL IDU Y A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE.

**DATOS GENERALES**

- 1.1 **NOMBRE:** YENNY ARDILA SOLER
- 1.2 **CARGO:** Contratista de Prestación de Servicios
- 1.3 **Instituto de Desarrollo Urbano – IDU**
- 1.4 **PLAZO INICIAL :** 3 meses 21 días
- 1.5 **PRÓRROGA 1:** 1 mes 20 días
- 1.6 **INICIO:** doce (12) de septiembre de 2024
- 1.7 **TERMINACION CONTRATO:** veinte (20) de febrero de 2025
- 1.8 **VALOR INICIAL:** \$23.125.000.00
- 1.9 **ADICIÓN:** \$10.416.667.00
- 1.10 **VALOR TOTAL:** \$ 31.250.000.00

**2 PRESENTACION DE LA GESTION:**

Se realiza el presente informe de gestión, a fin de hacer entrega con ocasión de la terminación suscrita entre el Instituto de Desarrollo Urbano y **YENNY ARDILA SOLER.**

Por lo anterior, durante el período comprendido entre el Doce (12) de septiembre de 2024 y (20) veinte de febrero de 2025, se dio cumplimiento a las obligaciones enmarcadas en la **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IDU-1927-**

**2024**, como apoyo técnico, administrativo y financiero a la supervisión del contrato de interventoría que fue asignado, como puede evidenciarse en los informes mensuales de ejecución de contratos de prestación de servicios.

Para el efecto del presente informe, se tendrán en cuenta las comunicaciones de asignación a apoyo técnico a la supervisión de contratos, así:

- STEST 202434601414671 del 06 de noviembre de 2024, IDU-1605 -2019 Interventoría a la construcción de la extensión troncal Caracas tramo 1 y obras complementarias en la ciudad de Bogotá D.C. Contrato de obra asociado IDU-1601-2019

### 3 INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LOS ASUNTOS, CONTRATOS Y DOCUMENTOS A SU CARGO:

Teniendo en cuenta el objeto del contrato 1605 de 2019 y las comunicaciones de asignación de proyectos anteriormente mencionada, se adjunta al presente informe de gestión, el informe de cada uno de los proyectos asignados, y el cual hace parte de la entrega de cargo que a la fecha se realiza.

#### 3.1 Contrato de interventoría IDU-1605-2019 (“INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”, al contrato de obra IDU-1601-2019)

Como Apoyo Técnico a la Supervisión del Contrato IDU-1605-2019, se realizaron las siguientes actividades:

- Reporte y Cargue semanal de los avances del Contrato de Obra IDU-1601-2019 e Interventoría IDU-1605-2019 a través de la Plataforma ZIPA desde la Semana: N° 239 (correspondiente a la semana del (08/27/2024 al 09/02/2024) de manera consecutiva hasta la Semana 257 (correspondiente 01/21/2025 al 01/27/2025).

<input type="checkbox"/> Estado	Autor	Fecha de Corte	Semana No	Proyecto	Contrato	Contrato	Contrato de Interventoría
<input type="checkbox"/> Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	01/27/2025	257	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/> Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	01/20/2025	256	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/> Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	01/06/2025	254	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/> Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	01/13/2025	255	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/> Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	12/30/2024	253	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/> Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	12/23/2024	252	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/> Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	12/16/2024	251	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION

<input type="checkbox"/>	Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	12/09/2024	250	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	12/02/2024	249	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Helver Fabian Casallas Romero - chcasall1	11/25/2024	249	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	11/18/2024	248	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	11/11/2024	248	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	11/04/2024	248	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	10/28/2024	247	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	10/21/2024	246	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	10/14/2024	245	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	10/07/2024	244	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	09/30/2024	243	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	09/23/2024	242	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	09/09/2024	240	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION
<input type="checkbox"/>	Publicado	Yenny Ardila Soler - cyardila1	09/02/2024	239	Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1601-2019 (Contrato de Obra) - EN EJECUCION	IDU-1605-2019 (Consultoría (Interventoría)) - EN EJECUCION

- Elaboración semanal de la presentación del proyecto para los Comités de Transmilenio.
- Apoyo en las presentaciones de solicitudes de maniobras ante Transmilenio.
- Revisión de los Informes Técnicos mensuales en sus diferentes versiones de Interventoría del Contrato IDU-1605-2019 desde el informe 55 del periodo del 27 de julio al 26 de agosto de 2024 y de manera consecutiva hasta el mes de febrero de 2025, apoyando en la proyección de los respectivos oficios de cada informe con las observaciones de cada especialidad o los oficios de aprobación según sea el caso. A la fecha se encuentra aprobado hasta el Informe 57 en versión 2.

INFORME NÚMERO	PERIODO	MES NÚMERO	OBSERVACIÓN
Informe 55	27 de julio 26 de agosto de 2024	48	Aprobado IDU - 202534600007671
Informe 56	27 de agosto 11 de septiembre de 2024	49	Aprobado IDU - 202534600154411

Informe 57	12 de septiembre 11 de octubre de 2024	50	Aprobado IDU - <u>202534600097611</u>
Informe 58	12 de octubre al 07 de noviembre de 2024, 26 al 27 de noviembre de 2024 y del 04 al 05 de diciembre de 2024	51	En atención de observaciones por parte de interventoría
Informe 59	06 de diciembre de 2024 al 05 de enero de 2025	52	En atención de observaciones por parte de interventoría
Informe 60	06 de enero al 19 de enero 2025	53	En revisión por parte de los especialistas del IDU

- Evaluación de las Hojas de Vida de las profesionales presentadas por el CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS, el cuál consistió desde la verificación de los requisitos de estudios y experiencia solicitada en el apéndice de personal, así como la respectiva solicitud de verificación de disponibilidad del personal en el aplicativo SIAC, hasta culminar el proceso con la elaboración del oficio de envío de observaciones y/o aprobación del personal según sea el caso.
- Consolidación de información para informes del Ministerio de Transporte del proyecto extensión Troncal Caracas Tramo I
- Elaboración y actualización de presentaciones para:
  - Comités semanales de Transmilenio
  - Estado actual de las Empresas de Servicios Públicos.
- Respuesta a las comunicaciones y tramites asignados mediante conecta

Tipo de Radicado	Número Radicado	Fecha Radicado	Usuario	Destinatario	Tipo Documental TRD	Estado Radicado
Salida	2024346012439 21	2024-09-25 15:12:41	YENNY ARDILA SOLER	PABLO DE LA RUA	DERECHOS DE PETICION	Despachado

Salida	2024346012438 41	2024-09-25 15:12:01	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346012881 61	2024-10-03 13:45:50	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346012716 51	2024-09-30 18:45:15	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346012786 21	2024-10-02 07:40:05	YENNY ARDILA SOLER	Edilma Ramírez de	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346012777 91	2024-10-01 18:28:54	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2024346012777 81	2024-10-01 18:28:11	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2024346012918 31	2024-10-03 18:06:49	YENNY ARDILA SOLER	DIEGO	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2024346012922 61	2024-10-03 19:39:42	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2024346012962 21	2024-10-04 16:36:11	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346014066 61	2024-11-05 06:12:26	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO CARACAS SUR	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346013180 61	2024-10-10 10:55:17	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346013270 71	2024-10-14 20:04:56	YENNY ARDILA SOLER	TRANSMILENIO SA	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Memorando	2024346003089 63	2024-10-08 20:37:46	YENNY ARDILA SOLER	USUARIO PARA SALIDA DE DOCUMENTOS	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2024346013254 21	2024-10-11 17:49:57	YENNY ARDILA SOLER	SANDRA PATRICIA AVELLANEDA AVENDAÑO	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2024346013571 81	2024-10-22 07:38:49	YENNY ARDILA SOLER	TRANSMILENIO SA	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346013309 01	2024-10-15 17:00:52	YENNY ARDILA SOLER	JOHNATAN ALEJANDRO GUANUMEN HUERTO	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2024346013464 91	2024-10-18 16:16:17	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346013445 31	2024-10-18 15:42:09	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346013491 31	2024-10-21 09:02:55	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado

Salida	2024346013491 21	2024-10-21 09:02:51	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2024346013543 21	2024-10-21 17:11:09	YENNY ARDILA SOLER	JAIME EDUARDO LOPEZ GARCIA	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2024346013614 61	2024-10-23 16:42:09	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346013614 01	2024-10-23 16:41:47	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2024346013636 11	2024-10-23 21:24:30	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2024346013613 81	2024-10-23 16:41:37	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2024346013769 81	2024-10-28 11:03:10	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346013785 01	2024-10-28 15:51:09	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346013814 51	2024-10-29 07:30:17	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2024346014172 21	2024-11-06 18:04:07	YENNY ARDILA SOLER	SANDRA PATRICIA AVELLANEDA AVENDAÑO	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2024346013827 31	2024-10-29 15:32:10	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Memora ndo	2024346003364 43	2024-11-05 06:50:01	YENNY ARDILA SOLER	USUARIO PARA SALIDA DE DOCUMENTOS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346014083 31	2024-11-05 13:59:53	YENNY ARDILA SOLER	KIMBERLY MACA GONZALEZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2024346014366 71	2024-11-12 12:13:02	YENNY ARDILA SOLER	VEEDURIA DISTRITAL	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2024346014325 21	2024-11-08 15:55:59	YENNY ARDILA SOLER	CARLOS GOMEZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2024346014320 11	2024-11-08 15:12:06	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO CARACAS SUR - MANTENIMIENTO	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346014320 01	2024-11-08 15:11:59	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO CARACAS SUR	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346014424 21	2024-11-12 18:09:12	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2024346014952 01	2024-11-25 06:59:16	YENNY ARDILA SOLER	DIANA CASTRO PATIÑO	DERECHOS DE PETICION	Despachado

Salida	2024346015058 71	2024-11-26 21:59:57	YENNY ARDILA SOLER	NELSON VELASCO	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2024346015259 91	2024-12-02 18:05:02	YENNY ARDILA SOLER	CARLOS GOMEZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2024346015230 91	2024-12-02 14:12:35	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346015230 81	2024-12-02 14:12:30	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO CARACAS SUR	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346015311 91	2024-12-03 22:44:01	YENNY ARDILA SOLER	Stella Garcia de Caviedes	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2024346015308 91	2024-12-03 22:18:02	YENNY ARDILA SOLER	POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Memora ndo	2024346003720 13	2024-12-04 09:36:46	YENNY ARDILA SOLER	USUARIO PARA SALIDA DE DOCUMENTOS	ADICIONES, PRORROGAS O MODIFICACIONES AL CONTRATO	Despachado
Salida	2024346015446 11	2024-12-05 17:38:01	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2024346015560 01	2024-12-09 11:10:17	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO CARACAS SUR	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346015538 71	2024-12-06 17:14:57	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Memora ndo	2024346003866 33	2024-12-13 18:09:44	YENNY ARDILA SOLER	HELVER FABIAN CASALLAS ROMERO	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Memora ndo	2024346003866 33	2024-12-13 18:09:44	YENNY ARDILA SOLER	HELVER FABIAN CASALLAS ROMERO	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346015592 41	2024-12-09 17:32:54	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346015589 21	2024-12-09 17:12:20	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2024346015626 41	2024-12-10 15:43:09	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2024346015704 81	2024-12-11 20:15:58	YENNY ARDILA SOLER	JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE USME	DERECHOS DE PETICION	
Salida	2024346015982 51	2024-12-16 19:51:52	YENNY ARDILA SOLER	MARÍA DEISY MOLANO GRANADOS	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2024346015982 41	2024-12-16 19:51:49	YENNY ARDILA SOLER	ADRIANA GUISELL GUTIERREZ HERRERA	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2024346016134 91	2024-12-18 16:30:42	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado

Salida	2024346016272 71	2024-12-23 07:45:43	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2024346016134 51	2024-12-18 16:30:35	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346016142 91	2024-12-18 22:38:33	YENNY ARDILA SOLER	Juan Vicente Sánchez R	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2024346016396 61	2024-12-25 23:29:04	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346016313 01	2024-12-23 13:04:02	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346016394 71	2024-12-25 23:18:55	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346016394 61	2024-12-25 23:18:51	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346016396 21	2024-12-25 23:23:06	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2024346016447 01	2024-12-26 14:44:54	YENNY ARDILA SOLER	ARTURO REINA VASQUEZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2024346016446 91	2024-12-26 14:44:46	YENNY ARDILA SOLER	CARLOS ALFONSO VANEGAS ALFONSO	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2024346016446 81	2024-12-26 14:44:42	YENNY ARDILA SOLER	ROGER SOLANO ACOSTA	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2024346016623 21	2024-12-27 16:03:31	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2024346016623 11	2024-12-27 16:03:28	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2024346016680 91	2024-12-31 15:46:23	YENNY ARDILA SOLER	CESAR AUGUSTO RIAÑO VELEZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2025346000018 81	2025-01-02 18:34:57	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2025346000014 91	2025-01-02 17:34:18	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2025346000051 31	2025-01-07 16:27:58	YENNY ARDILA SOLER	JOSE DAVID RODRIGUEZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2025346000058 81	2025-01-07 18:42:59	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	SOLICITUDES DE SANCION, INCUMPLIMIENTO Y/O MULTA	Despachado

Salida	2025346000076 21	2025-01-08 14:38:44	YENNY ARDILA SOLER	Luz Angela Pineda	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2025346000076 01	2025-01-08 14:36:46	YENNY ARDILA SOLER	Luz Angela Pineda	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2025346000075 91	2025-01-08 14:36:40	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2025346000075 11	2025-01-08 14:26:02	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2025346000074 81	2025-01-08 14:25:49	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2025346000076 71	2025-01-08 14:39:51	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2025346000170 41	2025-01-10 09:46:42	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2025346000212 61	2025-01-13 15:13:08	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2025346000212 31	2025-01-13 15:12:55	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2025346000219 31	2025-01-13 18:14:08	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2025346000289 61	2025-01-14 19:13:09	YENNY ARDILA SOLER	Carlos Emilio Gómez Maldonado	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2025346000287 11	2025-01-14 17:51:41	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2025346000652 11	2025-01-22 12:22:24	YENNY ARDILA SOLER	JONATHAN SMITH MALDONADO	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2025346000589 11	2025-01-21 06:08:27	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2025346000705 41	2025-01-22 22:05:51	YENNY ARDILA SOLER	JOSE DAVID RODRIGUEZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2025346000606 01	2025-01-21 15:18:13	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2025346000627 81	2025-01-21 21:44:57	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2025346000605 81	2025-01-21 15:18:00	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado

Salida	2025346000705 11	2025-01-22 22:05:35	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2025346000705 01	2025-01-22 22:05:29	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2025346000924 51	2025-01-27 19:31:59	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2025346000924 41	2025-01-27 19:31:53	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2025346000923 41	2025-01-27 19:30:35	YENNY ARDILA SOLER	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2025346000976 11	2025-01-28 22:42:18	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2025346001248 91	2025-01-31 23:28:12	YENNY ARDILA SOLER	DAVID RODRIGUEZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2025346001248 71	2025-01-31 23:28:02	YENNY ARDILA SOLER	ANONIMO	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2025346001288 41	2025-02-03 20:35:43	YENNY ARDILA SOLER	LINA MARITZA MONSALVE SUAREZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2025346001349 41	2025-02-04 16:43:51	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2025346001380 31	2025-02-05 14:43:20	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	
Salida	2025346001471 31	2025-02-07 08:24:03	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2025346001455 71	2025-02-06 16:03:08	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2025346001609 71	2025-02-11 12:06:41	YENNY ARDILA SOLER	HMV SERVICIOS SAS	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	Despachado
Salida	2025346001609 61	2025-02-11 12:06:37	YENNY ARDILA SOLER	HMV SERVICIOS SAS	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	Despachado
Salida	2025346001637 91	2025-02-11 20:14:51	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2025346001609 51	2025-02-11 12:06:33	YENNY ARDILA SOLER	HMV SERVICIOS SAS	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	Despachado

Salida	2025346001609 41	2025-02-11 12:06:29	YENNY ARDILA SOLER	HMV SERVICIOS SAS	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	Despachado
Salida	2025346001544 11	2025-02-10 15:51:29	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2025346001535 21	2025-02-10 14:45:48	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2025346001763 81	2025-02-14 15:10:06	YENNY ARDILA SOLER	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL COMANDO DE INGENIEROS	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2025346001763 71	2025-02-14 15:10:01	YENNY ARDILA SOLER	CARLOS EMILIO GOMEZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	2025346001668 91	2025-02-12 19:02:11	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2025346001863 41	2025-02-18 14:15:10	YENNY ARDILA SOLER	JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE TUNJUELITO	DERECHOS DE PETICION	
Salida	2025346001827 31	2025-02-17 18:21:12	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	Despachado
Salida	2025346001831 21	2025-02-17 18:41:31	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	COMUNICACIONES OFICIALES	Despachado
Salida	2025346001825 11	2025-02-17 18:14:32	YENNY ARDILA SOLER	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS	INFORMES TECNICOS	achado

- Apoyo en la respuesta y recopilación de información de los contratos IDU-1601-2019 e IDU-1605-2019 ante solicitudes de Concejo, Alcaldía Mayor, entre otros entes de control.
  - proposición 040 de 2025
  - proposición 008 de 2025
  - proposición 1045 de 2024
  - apoyo respuesta senadora Angelica Lozano
- Proyección de respuestas a Derechos de petición presentados.

Tipo de Radicado	Número Radicado	Fecha Radicado	Usuario	Destinatario	Tipo Documental TRD	Estado Radicado
Salida	202434601243921	2024-09-25 15:12:41	YENNY ARDILA SOLER	PABLO DE LA RUA	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601291831	2024-10-03 18:06:49	YENNY ARDILA SOLER	DIEGO	DERECHOS DE PETICION	Despachado

Memorando	202434600308963	2024-10-08 20:37:46	YENNY ARDILA SOLER	USUARIO PARA SALIDA DE DOCUMENTOS	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601325421	2024-10-11 17:49:57	YENNY ARDILA SOLER	SANDRA PATRICIA AVELLANEDA AVENDAÑO	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601330901	2024-10-15 17:00:52	YENNY ARDILA SOLER	JOHNATAN ALEJANDRO GUANUMEN HUERTO	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601354321	2024-10-21 17:11:09	YENNY ARDILA SOLER	JAIME EDUARDO LOPEZ GARCIA	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601417221	2024-11-06 18:04:07	YENNY ARDILA SOLER	SANDRA PATRICIA AVELLANEDA AVENDAÑO	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601408331	2024-11-05 13:59:53	YENNY ARDILA SOLER	KIMBERLY MACA GONZALEZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601436671	2024-11-12 12:13:02	YENNY ARDILA SOLER	VEEDURIA DISTRITAL	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601432521	2024-11-08 15:55:59	YENNY ARDILA SOLER	CARLOS GOMEZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601495201	2024-11-25 06:59:16	YENNY ARDILA SOLER	DIANA CASTRO PATIÑO	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601505871	2024-11-26 21:59:57	YENNY ARDILA SOLER	NELSON VELASCO	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601525991	2024-12-02 18:05:02	YENNY ARDILA SOLER	CARLOS GOMEZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601531191	2024-12-03 22:44:01	YENNY ARDILA SOLER	Stella Garcia de Caviedes	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601530891	2024-12-03 22:18:02	YENNY ARDILA SOLER	POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601570481	2024-12-11 20:15:58	YENNY ARDILA SOLER	JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE USME	DERECHOS DE PETICION	
Salida	202434601598251	2024-12-16 19:51:52	YENNY ARDILA SOLER	MARIA DEISY MOLANO GRANADOS	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601598241	2024-12-16 19:51:49	YENNY ARDILA SOLER	ADRIANA GUISELL GUTIERREZ HERRERA	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601614291	2024-12-18 22:38:33	YENNY ARDILA SOLER	Juan Vicente Sánchez R	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601644701	2024-12-26 14:44:54	YENNY ARDILA SOLER	ARTURO REINA VASQUEZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601644691	2024-12-26 14:44:46	YENNY ARDILA SOLER	CARLOS ALFONSO VANEGAS ALFONSO	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601644681	2024-12-26 14:44:42	YENNY ARDILA SOLER	ROGER SOLANO ACOSTA	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202434601668091	2024-12-31 15:46:23	YENNY ARDILA SOLER	CESAR AUGUSTO RIAÑO VELEZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado

Salida	202534600005131	2025-01-07 16:27:58	YENNY ARDILA SOLER	JOSE DAVID RODRIGUEZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202534600007621	2025-01-08 14:38:44	YENNY ARDILA SOLER	Luz Angela Pineda	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202534600007601	2025-01-08 14:36:46	YENNY ARDILA SOLER	Luz Angela Pineda	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202534600028961	2025-01-14 19:13:09	YENNY ARDILA SOLER	Carlos Emilio Gómez Maldonado	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202534600065211	2025-01-22 12:22:24	YENNY ARDILA SOLER	JONATHAN SMITH MALDONADO	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202534600070541	2025-01-22 22:05:51	YENNY ARDILA SOLER	JOSE DAVID RODRIGUEZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202534600092341	2025-01-27 19:30:35	YENNY ARDILA SOLER	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202534600124891	2025-01-31 23:28:12	YENNY ARDILA SOLER	DAVID RODRIGUEZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202534600124871	2025-01-31 23:28:02	YENNY ARDILA SOLER	ANONIMO	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202534600128841	2025-02-03 20:35:43	YENNY ARDILA SOLER	LINA MARITZA MONSALVE SUAREZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202534600176381	2025-02-14 15:10:06	YENNY ARDILA SOLER	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL COMANDO DE INGENIEROS	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202534600176371	2025-02-14 15:10:01	YENNY ARDILA SOLER	CARLOS EMILIO GOMEZ	DERECHOS DE PETICION	Despachado
Salida	202534600186341	2025-02-18 14:15:10	YENNY ARDILA SOLER	JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE TUNJUELITO	DERECHOS DE PETICION	Despachado

- Consolidación y apoyo en la respuesta del amigable componedor, Solicitud para dirimir una controversia suscitada entre el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO y CONSORCIO CARACAS SUR.

A. FUNDAMENTOS DE HECHO  
B. 67 SOLICITUDES .

- Asistencia a los comités de seguimiento del Contrato IDU-1601-2019 correspondientes la Construcción de la Extensión troncal Caracas Tramo

- 1, los cuales fueron coordinados por la interventoría semanal y recorrido de obra, con programación quincenal.
- Apoyo en la consolidación y expedición de 16 listas de chequeo de ítems no previstos y la coordinación para la expedición de la no objeción con los especialistas de análisis de precios unitarios.
  - Asistencia a los diferentes recorridos de Campo, con las diferentes entidades:
    - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en compañía de Contratista e Interventoría para toma de decisiones.
    - Recorridos con Transmilenio S.A y Recaudo Bogotá.
    - ETB
    - Recorridos Hallazgo arqueológico
  - Tramite de comunicaciones oficiales ante Transmilenio, contratista de obra, interventoría, respuestas informes, traslado de comunicaciones a empresas de servicios públicos, ante entidades oficiales, Etc., respuestas a los derechos de petición mediante conecta.





- Apoyo en la Tipificación, asignación de TRD, Inclusión en los expedientes respectivos de los oficios y Comunicaciones tanto del Contrato de Obra IDU1601-2019, así como en la del Contrato de Interventoría IDU1605-2019 a través del Sistema conecta desde el mes de abril de 2024 a septiembre de 2024.

#### 4 SITUACION DE INVENTARIOS

Al momento no tengo inventarios a mi cargo, así como que se hace entrega de igual manera del formato de entrega de cargo y formato de paz y salvos debidamente firmado por las diferentes dependencias del IDU, donde consta que no se tienen elementos a mi cargo.

#### 5 TRÁMITES Y ASUNTOS EN CURSO:

- Tramite acta de fijación, revisión de 83 precios No previstos al Contrato de Obra 1601-2019.

#### 6 SITUACIÓN DE CONTRATOS SEGUIMIENTO APOYO

Al igual que para el numeral 3, 5 y 6 del presente documento, teniendo en cuenta el objeto del contrato 1605 de 2019 y las comunicaciones de asignación de proyectos anteriormente mencionada, se adjunta al presente informe de gestión, el informe de cada uno de los proyectos asignados, y el cual hace parte de la entrega de cargo que a la fecha se realiza.

## **6.1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1605 DE 2019.**

Que como resultado del Concurso de Méritos Abierto realizado mediante el Proceso de Selección IDU-CMA-SGI-020 2019, el IDU el día 4 de diciembre de 2019, se suscribió entre EL IDU y el CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS, el Contrato de Interventoría IDU-1605-2019 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

El proyecto Urbano "Extensión Troncal Caracas Tramo 1 y Obras complementarias", por medio de la ejecución de los contratos IDU-1601-2019 y IDU-1605-2019, Obra e Interventoría respectivamente, se enfoca en la ampliación del perfil vial de la Av. Caracas, construcción de estaciones BRT y alimentadores para el acceso al sistema Transmilenio y el mejoramiento del espacio público y vehicular. Con este proyecto, se mejorará de manera importante la prestación del servicio de transporte público en las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Usme beneficiando a una población aproximada de 500.000 habitantes.

El proyecto "Construcción de la extensión Caracas tramo 1 y obras complementarias en la ciudad de Bogotá". Se ubica en las localidades de Usme (No. 05), Tunjuelito (No. 06), Rafael Uribe Uribe (No.18), con área de influencia social indirecta en las UPZ 62 Tunjuelito, UPZ 54 Marruecos, UPZ 56 Danubio y UPZ 57 Gran Yomasa.

El tramo 1 se extiende desde la carrera 10 hasta la calle 68 sur al finalizar el Portal de Usme (Incluyendo par vial alrededor del portal), en una longitud aproximada de 4.2 Km.

La ampliación de la Caracas Sur va desde la estación Molinos en la Calle 51 sur entre carreras 7 y 9, pasa por un lado de la Escuela de Artillería del Ejército y la penitenciaría de la Picota para conectarse luego con el Portal de Usme.

El proyecto tiene previsto construir y ampliar los 2.75 km del corredor a los que se suman las vías del área de influencia del Portal de Usme, así mismo la realización del espacio público asociado de 63.404m<sup>2</sup>, zona verde de 20.990m<sup>2</sup> y una ciclorruta de 3.5km



## LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO


El plazo total del Contrato IDU-1601-2019 es de ciento nueve (109) meses, el cual se ejecutará en tres (3) etapas: Preconstrucción, Construcción y Mantenimiento. Actualmente, el contrato se encuentra en Etapa de construcción con un avance de:

### 1. Características del Proyecto

El corredor estará conformado por dos calzadas, de 4 carriles cada una, duplicando así la capacidad de la vía, que tendrá carriles de uso exclusivo para Transmilenio, adicionalmente se construirá en el costado oriental del corredor una ciclorruta de 3.5 kilómetros y el proyecto contará con un espacio público y andenes con un área aproximada de 63.401m<sup>2</sup>, zona verde de 20.990m<sup>2</sup>.



También Se construirán 2 estaciones BRT (Molinos Y Danubio) y una estación alimentadora (Molinos), Puentes: 2 unidades, 1 Puente Peatonal Molinos, 1 Puente Vehicular Quebrada Chiguaza.

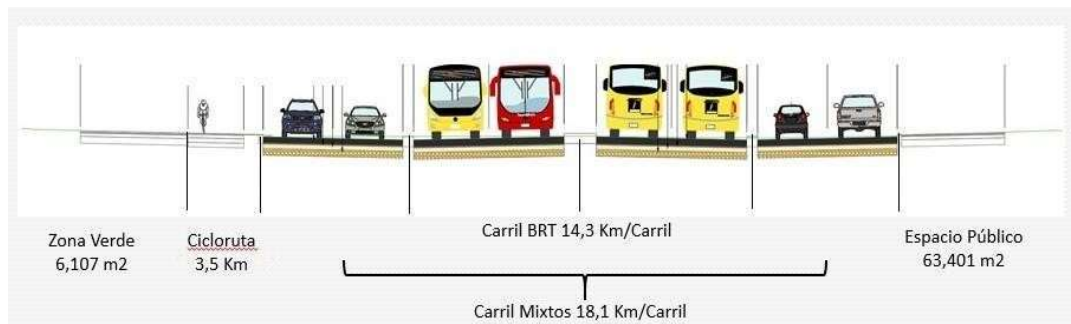

## 6.2. SEGUIMIENTO LEGAL:

### CUADRO DE CONTROL LEGAL CONTRATO IDU-1605-2019.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° IDU-1605 de 2019			
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>		INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	
<b>CONTRATISTA</b>		<b>CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS,</b> identificado con NIT No. 901.344.645-5 integrado por <b>GRUPO INTERDISEÑOS SAS</b> con NIT 901.184.484-9 (60%) de participación.  <b>INTERVENTORIAS Y DISEÑOS SA</b> con NIT. 860.027.091-8 (40%) de participación.	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>		25 de noviembre de 2019	
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Preconstrucción	Seis (6) meses	
	Construcción	Cuarenta y Tres (43) meses	
	Mantenimiento	Sesenta (60) meses	
	TOTAL	Ciento Nueve (119) meses	
<b>FECHAS DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN INICIAL</b>		Preconstrucción	26 de diciembre de 2019 - 26 de agosto 2020
		Construcción	27 de agosto de 2020 - 11 de marzo de 2024
		Mantenimiento	12 de marzo de 2023 - 11 de marzo de 2028
<b>FECHAS DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN ACTUALIZADAS</b>		Construcción	27 de agosto de 2020 - 11 de septiembre de 2024
		Mantenimiento	12 de marzo de 2023 - 11 de septiembre de 2029

<b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° IDU-1605 de 2019</b>	
<b>VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$21.218.407.533</b>
Adición No 1	\$50.730.291
Adición No 2	\$455.633.848
Adición No 3	\$89.923.009
Adición No. 4	\$1.953.679.905
Adición No. 5	\$2.628.485.982
Adición No. 6	\$543.326.868,00
Adición No. 7	\$383.290.551
<b>VALOR TOTAL ACTUAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 27.323.477.987</b>

<b>CONTRATO DE OBRA</b>			
<b>CONTRATO</b>	<b>MOD.</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 1605 -2019</b>	<b>1</b>	27 ago 2021	- Apéndice de bioseguridad. Incluir en el contrato de interventoría no. Idu 1605-2019 el apéndice de bioseguridad covid-19 versión 2 "medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus covid-19"
	<b>2 y ADICIÓN No 1</b>	5 oct 2021	Interventoría a la elaboración de E y D para nuevo cerramiento complejo penitenciario y carcelario COMEB – La Picota.
	<b>3 y ADICIÓN No 2</b>	26 ene 2022	IDU 1605 DE 2019. Interventoría a la construcción de las obras del nuevo cerramiento en el predio del complejo penitenciario y carcelario de Bogotá – COMEB la Picota, en el frente que colinda con la Troncal Caracas, que incluye el cerramiento tipo Colegio localizado entre las abscisas K0+000 al K0+198.54, y el cerramiento de seguridad localizado entre las abscisas K0+140 al K0+783.97, con sus respectivos accesos (puerta peatonal (2) y puerta vehicular (2)), obras éstas conforme a los productos de los estudios y diseños elaborados por el Consorcio Caracas Sur, aprobados por la Interventoría Consorcio ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto DE DESARROLLO URBANO MODIFICACIÓN NO 3 ADICIÓN NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. IDU-1605-2019 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU Y CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS Interdiseños Troncal Caracas y recibidos por el IDU.

	<b>4 y ADICIÓN No 3</b>	12 ago 2022	Modificación No. 4 Adición No. 3 Al Contrato De Interventoría No. IDU-1605-2019 suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y Consorcio Interdiseños Troncal Caracas.
	<b>5 y PRÓRROGA No 1 y ADICIÓN No. 4</b>	26 dic 2023	Prórroga catorce (14) meses adición \$1.953.679.905
	<b>6 y PRÓRROGA No 2 y ADICIÓN No. 5</b>	28 dic 2024	Prórroga seis (6) meses adición \$ 2.628.485.982

<b>SUPERVISIÓN</b>	ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
<b>APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN</b>	ING. HELVER FABIAN CASALLAS

## 6.2 SEGUIMIENTO LEGAL:

### CUADRO DE CONTROL LEGAL OBRA CONTRATO IDU-1601-2019.

<b>CONTRATO DE OBRA N° IDU-1601 de 2019</b>	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO CARACAS SUR</b> identificado con NIT 901341140-4, integrado por <b>MARIO ALBERTO HUERTAS COTES</b> , identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.146.113 con una participación del 65% y la sociedad <b>INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS</b> identificada con NIT 860.025.054-6 con una participación del 35%
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	25 de noviembre de 2019
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Preconstrucción Seis (6) meses

<b>CONTRATO DE OBRA N° IDU-1601 de 2019</b>		
	Construcción	Cuarenta y Tres (43) meses
	Mantenimiento	Sesenta (60) meses
	<b>TOTAL</b>	<b>Ciento quince (115) meses</b>
<b>FECHAS DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN INICIAL</b>	Preconstrucción	26 de diciembre de 2019 - 26 de agosto 2020
	Construcción	27 de agosto de 2020 - 11 de marzo de 2024
	Mantenimiento	12 de marzo de 2023 - 11 de marzo de 2028
<b>FECHAS DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN ACTUALIZADAS</b>	Construcción	27 de agosto de 2020 - 11 de septiembre de 2024
	Mantenimiento	12 de marzo de 2023 - 11 de septiembre de 2029
<b>VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA</b>		<b>\$256.554.412.806</b>
<b>VALOR TOTAL ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA</b>		<b>\$ 281.009.395.610</b>

<b>PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA</b>	IDU-LP-SGI-014-2019.
<b>CONTRATO 1601 DE 2019</b>	25/11/2019
<b>VALOR INICIAL</b>	CDP 2999 del 10/12/2019 Doscientos Cincuenta Y Seis Mil Quinientos Cincuenta Y Cuatro Millones Cuatrocientos Doce Mil Ochocientos Seis pesos M/CTE (\$ 256.554.412.806,00)
<b>MODIFICATORIO NO. 5 y ADICIÓN NO. 1. AL CONTRATO DE OBRA IDU-1601-2019. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL CERRAMIENTO, ADECUACIÓN DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PREDIO DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTÁ</b>	CDP 3719 del 05/10/2021 (suscrita el día 05 de octubre de 2021), por un valor de Doscientos Sesenta Y Nueve Millones Ochocientos Setenta Y Cuatro Mil Ochocientos Treinta Y Dos (\$ 269.874.832) M/cte.
<b>MODIFICATORIO NO. 7 y ADICIÓN NO.2 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CERRAMIENTO EN EL PREDIO DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTÁ – COMEB LA PICOTA; INCLUYENDO EL CERRAMIENTO TIPO COLEGIO Y EL CERRAMIENTO DE SEGURIDAD, CON SU RESPECTIVO ACCESO (PUERTA PEATONAL Y PUERTA VEHICULAR)</b>	CDP 716 del 27/01/2022 (suscrita el día 26 de enero de 2022), por un valor de Cuatro Mil Ochocientos Treinta Y Un Millones Setecientos Setenta Y Siete Mil Quinientos Setenta Y Cuatro (\$ 4.831.777.574) M/cte
<b>MODIFICATORIO No. 17 y ADICIÓN NO. 3. AL CONTRATO DE OBRA IDU-1601-2019.</b>	CDP 7832 del 17/09/2024 (suscrita el día 11 de septiembre de 2024), por un valor de Diecinueve Mil Trescientos Cincuenta Y Tres Millones Trescientos Treinta Mil Trescientos Noventa Y Ocho (\$ 19.353.330.398) M/cte
<b>VALOR CONTRACTUAL</b>	Doscientos Ochenta Y Un Mil Nueve Millones Trescientos Noventa Y Cinco Mil Seiscientos Diez pesos M/CTE (\$ 281.009.395.610,00).

<b>PLAZOS INICIALES (PRECONSTRUCCIÓN – CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO)</b>	Fecha de Inicio: 26/12/2019 Fecha de Terminación: 25/11/2027 Duración En Tiempo: Noventa y Cinco (95) Meses
<b>PLAZO ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN</b>	Fecha de Inicio: 26/12/2019 Fecha de Terminación: 25/06/2020 Duración En Tiempo: Seis (6) Meses
<b>PLAZO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN</b>	Fecha de Inicio: 26/06/2020 Fecha de Terminación: 25/11/2022 Duración En Tiempo: Veintinueve (29) Meses
<b>PLAZO ETAPA DE MANTENIMIENTO</b>	Fecha de Inicio: 26/11/2022 Fecha de Terminación: 25/11/2027 Duración En Tiempo: Sesenta (60) Meses
<b>SUSPENSIÓN (EMERGENCIA SANITARIA COVID-19)</b>	Acta No 4 25/03/2020 (Por (20) veinte días calendario)
<b>AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN (EMERGENCIA SANITARIA COVID-19)</b>	Acta No 7 27/04/2020 (Por (14) catorce días calendario)
<b>REINICIO CONTRATO</b>	Acta No 8 11/05/2020
<b>FECHA ACTA CAMBIO DE ETAPA PRECONSTRUCCIÓN A CONSTRUCCIÓN</b>	Acta No 12 27/08/2020
<b>FECHA ACTA CAMBIO DE ETAPA CONSTRUCCIÓN A MANTENIMIENTO</b>	Acta No 312 12/09/2024
<b>FECHA CONTRACTUAL FINALIZACIÓN ETAPA DE MANTENIMIENTO</b>	11/09/2029
<b>PLAZO ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN (CONTRACTUAL)</b>	Fecha de Inicio: 26/12/2019 Fecha de Terminación: 26/08/2020 Duración En Tiempo: Seis Meses y Quince Días (6.5)
<b>PLAZO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (CONTRACTUAL)</b>	Fecha de Inicio: 27/08/2020 Fecha de Terminación: 11/09/2024 Duración En Tiempo: Cuarenta y Nueve (49) Meses
<b>PLAZO ETAPA DE MANTENIMIENTO (CONTRACTUAL)</b>	Fecha de Inicio: 12/09/2024 Fecha de Terminación: 11/09/2027 Duración En Tiempo: Sesenta (60) Meses
<b>FECHA TERMINACIÓN (ACTUALIZADA) CONTRATO</b>	11/09/2029
<b>ACLARATORIO NO 1 ACLARACIÓN DE LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.</b>	06/12/2019
<b>MODIFICATORIO NO 1 POR RENUNCIA AL ANTICIPO DEL CONTRATISTA, Y REMUNERACIÓN AMIGABLE COMPONEDOR</b>	26/05/2020
<b>MODIFICATORIO NO 2 MODIFICACIÓN ANEXO DE PERSONAL PERFIL RESIDENTE DE ARQUITECTURA.</b>	11/09/2020
<b>MODIFICATORIO NO 3 INCORPORACIÓN DE PRECIO NO PREVISTO NP 001</b>	27/05/2021

<b>MODIFICATORIO NO 4 MODIFICATORIO NO 4 INCORPORACIÓN DE LOS PRECIOS NO PREVISTO NP 002 AL NP 055 E INCORPORACIÓN DE APÉNDICE DE BIOSEGURIDAD.</b>	31/08/2021
<b>MODIFICATORIO NO. 5 y ADICIÓN NO. 1. AL CONTRATO DE OBRA IDU-1601-2019. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL CERRAMIENTO, ADECUACIÓN DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PREDIO DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTÁ</b>	05/10/2021
<b>MODIFICATORIO NO.6 y ACLARACIÓN NO.2 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CERRAMIENTO EN EL PREDIO DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTÁ – COMEB LA PICOTA; INCLUYENDO EL CERRAMIENTO TIPO COLEGIO Y EL CERRAMIENTO DE SEGURIDAD, CON SU RESPECTIVO ACCESO (PUERTA PEATONAL Y PUERTA VEHICULAR)</b>	28/12/2021
<b>MODIFICATORIO NO.7 y ADICIÓN NO.2 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CERRAMIENTO EN EL PREDIO DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTÁ – COMEB LA PICOTA; INCLUYENDO EL CERRAMIENTO TIPO COLEGIO Y EL CERRAMIENTO DE SEGURIDAD, CON SU RESPECTIVO ACCESO (PUERTA PEATONAL Y PUERTA VEHICULAR)</b>	26/01/2022
<b>MODIFICATORIO NO.8 MODIFICACIÓN. - Del apéndice G: Anexo 1 (Nuevo cronograma de Obra-PDT) y Anexo 2 (Tabla de Hitos).</b>	19/03/2022
<b>MODIFICATORIO NO. 9 PARA INCORPORACIÓN DE PRECIO NO PREVISTOS NP 066 AL NP 077.</b>	13/05/2022
<b>MODIFICATORIO NO. 10 INCORPORACIÓN DE PRECIO NO PREVISTOS NP 078 AL NP 087</b>	21/07/2022
<b>MODIFICATORIO NO. 11 AMPLIACIÓN DE PLAZO CONVENIO USPEC</b>	12/08/2022
<b>MODIFICATORIO NO. 12 Y PRÓRROGA NO. 1, EN LA CUAL SE PRESENTA NUEVO CRONOGRAMA DE OBRA-PDT Y TABLA DE HITOS, SE PRORROGA 14 MESES EL CONTRATO DE OBRA</b>	22/12/2022 Prorroga por catorce (14) Meses.
<b>MODIFICATORIO NO. 13 INCORPORACIÓN DE PRECIO NO PREVISTOS NP 088 AL NP 120.</b>	08/05/2023
<b>MODIFICATORIO NO. 14 INCORPORACIÓN DE PRECIO NO PREVISTOS NP 121 AL NP 138.</b>	30/08/2023. Prorroga por Seis (06) Meses.
<b>MODIFICATORIO NO. 15, PRÓRROGA NO. 2 E INCORPORACIÓN DE PRECIO NO PREVISTOS NP 139 AL NP 169.</b>	28/12/2023
<b>MODIFICATORIO NO. 16 EN LA CUAL SE INCLUYEN LOS MAYORES VALORES DE LOS SUB HITOS 15.1 (ESTACIÓN BRT MOLINOS) Y 15.2 (ESTACIÓN BRT DANUBIO)</b>	24/05/2024
<b>MODIFICATORIO No. 17 y ADICIÓN No. 3</b>	11/09/2024

<b>MODIFICATORIO No. 18 INCLUSIÓN NPS DEL 170 AL 193.</b>	07/11/2024
<b>ACTA DE SUSPENSIÓN PARCIAL No. 329</b>	08/11/2024
<b>ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PARCIAL No. 332</b>	18/11/2024
<b>ACTA DE REINICIO No. 333</b>	26/11/2024
<b>ACTA DE SUSPENSIÓN PARCIAL No. 334</b>	28/11/2024
<b>ACTA DE REINICIO No. 335</b>	04/12/2024
<b>MODIFICATORIO No. 19 MAYOR TIEMPO ACTIVIDADES DE TRASLADO</b>	05/12/2024
<b>MODIFICATORIO No. 20 DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	20/12/2024

### 6.3. SEGUIMIENTO FÍSICO:

ETAPA	INICIO	FIN	PLAZO	% EJEC
<b>PRECONSTRUCCIÓN</b>	26/12/2019	26/08/2020	6 MESES	100%
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	27/08/2020	11/09/2024	49 MESES	100%
<b>MANTENIMIENTO</b>	12/03/2023	11/09/2029	60 MESES	0%

#### 6.3.1 Metas Físicas del Proyecto

**Las metas físicas mínimas a alcanzar mediante el Contrato N° IDU-1601-2019, a la cual el Contrato IDU-1605-2019 realiza la interventoría se relacionan a continuación:**

CONSTRUCCIÓN								
*Longitud total del tramo (Incluido par vial y empalmes) en Km	km	4,2	4,20	4,20	0,21%	100,00%	0,06%	100,00%
Longitud de carriles de Transmilenio (Incluido estación transferencia) en Km / carril	km/ carril	14,3	14,30	14,30	0,10%	100,00%	0,11%	100,00%
Longitud de carriles mixtos (incluido acceso e intersecciones) en Km / carril	km/ carril	18,1	18,10	18,10	0,26%	100,00%	0,03%	100,00%
Ciclo ruta en Km	km	3,5	3,50	3,50	0,00%	100,00%	0,50%	100,00%
Área de Espacio público en m2	m2	63.401	63401,30	63394,96	0,00%	100,00%	0,00%	99,99%
Área de zonas verdes nueva en m2	m2	20.990	20990,00	20990,00	2,00%	100,00%	1,00%	97,00%
Número de Puentes Peatonales	UNIDAD	1	1,00	1,00	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Número de Puentes Vehiculares (La cantidad hace referencia a un único cruce)	UNIDAD	2	2,00	2,00	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Estación alimentadora Molinos	UNIDAD	1	1,00	1,00	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Estación Transmilenio Molinos	UNIDAD	1	0,10	1,00	0,50%	100,00%	0,00%	100,00%
Estación Transmilenio Danubio	UNIDAD	1	1,00	1,00	0,50%	100,00%	0,00%	100,00%
Box Coulvert	UNIDAD	1	1,00	1,00	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

#### 6.4. **SEGUIMIENTO FINANCIERO**

##### 1. Estado

<b>Plazo Inicial</b>	Ciento Nueve (109) meses
<b>Fecha de Iniciación</b>	26 de diciembre de 2019
<b>Valor actual</b>	<b>\$27.323.477.987</b>
<b>Modificaciones</b>	9
<b>Procesos Administrativos Sancionatorios</b>	Ninguno

##### 2. Modificaciones Realizadas- Adiciones

##### 3.

<b>CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO</b>	IDU-CMA-SGI-020-2019.
<b>CONTRATO 1605 DE 2019</b>	4/12/2019
<b>VALOR</b>	Veintiún Mil Doscientos Dieciocho Millones Cuatrocientos Siete Mil Quinientos Treinta y Tres pesos M/CTE (\$ 21.218.407.533,00)
<b>MODIFICACIÓN No. 1 - APÉNDICE DE BIOSEGURIDAD. Incluir en el Contrato de Interventoría No. IDU 1605-2019 el Apéndice de Bioseguridad COVID-19 versión 2 "MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19"</b>	27/08/2021
<b>MODIFICACIÓN NO 2 ADICIÓN NO 1 – AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, IDU 1605 DE 2019. Interventoría a la elaboración de E y D para nuevo cerramiento complejo penitenciario y carcelario COMEB – La Picota.</b>	5/10/2021 CDP 4144 del 16/09/2021 (suscrita el día 05 de octubre de 2021), por un valor de Cincuenta Millones Setecientos Treinta Mil Doscientos Noventa Y Un (\$ 50.730.291) M/cte

<p><b>MODIFICACIÓN NO 3 ADICIÓN NO 2 – AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, IDU 1605 DE 2019. Interventoría a la construcción de las obras del nuevo cerramiento en el predio del complejo penitenciario y carcelario de Bogotá – COMEB la Picota, en el frente que colinda con la Troncal Caracas, que incluye el cerramiento tipo Colegio localizado entre las abscisas K0+000 al K0+198.54, y el cerramiento de seguridad localizado entre las abscisas K0+140 al K0+783.97, con sus respectivos accesos (puerta peatonal (2) y puerta vehicular (2)), obras éstas conforme a los productos de los estudios y diseños elaborados por el Consorcio Caracas Sur, aprobados por la Interventoría Consorcio ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto DE DESARROLLO URBANO MODIFICACIÓN NO 3 ADICIÓN NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. IDU- 1605-2019 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU Y CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS Interdiseños Troncal Caracas y recibidos por el IDU.</b></p>	<p>26/01/2022</p> <p>CDP 857 del 18/01/2022 (suscrita el día 26 de enero de 2022), por un valor de Quinientos Ocho Millones Cuatrocientos Treinta Y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Dos (\$ 508.436.862) M/cte</p>
<p><b>MODIFICACIÓN NO 4 ADICIÓN NO 3 – AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, IDU 1605 DE 2019. AMPLIACIÓN DE PLAZO CONVENIO USPEC</b></p>	<p>12/08/2022</p> <p>CDP 4075 del 02708/2022 (suscrita el día 15 de agosto de 2022), por un valor de Noventa Millones (\$ 90.000.000) M/cte</p>
<p><b>MODIFICACIÓN NO. 5, PRÓRROGA No 1 Y ADICIÓN NO. 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b></p>	<p>26/12/2022</p> <p>CDP 7391 del 13/12/2022 (suscrita en diciembre de 2022), por un valor de Mil Novecientos Cincuenta Y Tres Millones Seiscientos Setenta Y Nueve Mil Novecientos Cinco (\$ 1.953.679.905) M/cte</p>
<p><b>MODIFICACIÓN NO. 6, PRÓRROGA No 2 Y ADICIÓN NO. 5 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b></p>	<p>28/12/2023</p> <p>CDP 8864 del 29712/2023 (suscrita en diciembre de 2023), por un valor de Dos Mil Seiscientos Veintiocho Millones Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Mil Novecientos Ochenta Y Dos (\$ 2.628.485.982) M/cte</p>
<p><b>MODIFICACIÓN NO. 7, Y ADICIÓN NO. 6 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b></p>	<p>11/09/2024</p> <p>CDP 7833 del 17/09/2023 (suscrita en septiembre de 2024), por un valor de Quinientos Cuarenta y Tres Millones Trescientos Veintiséis Mil Ochocientos Sesenta y Ocho (\$ 543.326.868) M/cte</p>
<p><b>VALOR CON ADICIÓN</b></p>	<p>Veintiséis Mil Novecientos Cuarenta Millones Ciento Ochenta Y Siete Mil Cuatrocientos Treinta Y Seis (\$ 26.940.187.436,00) M/cte</p>
<p><b>PLAZOS INICIALES (PRECONSTRUCCIÓN – CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO)</b></p>	<p>Fecha de Inicio: 26/12/2019 Fecha de Terminación: 25/11/2027</p>

	Duración En Tiempo: Noventa y Cinco (95) Meses
<b>PLAZO ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN</b>	Fecha de Inicio: 26/12/2019 Fecha de Terminación: 25/06/2020 Duración En Tiempo: Seis (6) Meses
<b>PLAZO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN</b>	Fecha de Inicio: 26/06/2020 Fecha de Terminación: 25/11/2022 Duración En Tiempo: Veintinueve (29) Meses
<b>PLAZO ETAPA DE MANTENIMIENTO</b>	Fecha de Inicio: 26/11/2022 Fecha de Terminación: 25/11/2027 Duración En Tiempo: Sesenta (60) Meses
<b>SUSPENSIÓN (EMERGENCIA SANITARIA COVID-19)</b>	Acta No 3 25 de marzo de 2020, por (20) veinte días calendario
<b>AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN (EMERGENCIA SANITARIA COVID-19)</b>	Acta No 4 13 de abril de 2020, por (13) trece días calendario
<b>AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN (EMERGENCIA SANITARIA COVID-19)</b>	Acta No 6 27 de abril de 2020, por (14) catorce días calendario
<b>REINICIO CONTRATO</b>	Acta No 7 11 de mayo de 2020
<b>FECHA ACTA CAMBIO DE ETAPA PRECONSTRUCCIÓN A CONSTRUCCIÓN</b>	Acta No 12 27/08/2020
<b>FECHA ACTA CAMBIO DE ETAPA CONSTRUCCIÓN A MANTENIMIENTO</b>	Acta No 312 12/09/2024
<b>FECHA CONTRACTUAL FINALIZACIÓN ETAPA DE MANTENIMIENTO</b>	11/09/2029
<b>PLAZO ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN (CONTRACTUAL)</b>	Fecha de Inicio: 26/12/2019 Fecha de Terminación: 26/08/2020 Duración En Tiempo: Seis Meses y Quince Días (6.5)
<b>PLAZO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (CONTRACTUAL)</b>	Fecha de Inicio: 27/08/2020 Fecha de Terminación: 11/09/2024 Duración En Tiempo: Cuarenta y Nueve (49) Meses
<b>PLAZO ETAPA DE MANTENIMIENTO (CONTRACTUAL)</b>	Fecha de Inicio: 12/09/2024 Fecha de Terminación: 11/09/2027 Duración En Tiempo: Sesenta (60) Meses
<b>FECHA TERMINACIÓN (ACTUALIZADA) CONTRATO</b>	11/09/2029
<b>ACTA DE SUSPENSIÓN PARCIAL No. 149</b>	08/11/2024
<b>ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PARCIAL No. 150</b>	18/11/2024
<b>ACTA DE REINICIO No. 151</b>	26/11/2024
<b>ACTA DE SUSPENSIÓN PARCIAL No. 152</b>	28/11/2024
<b>ACTA DE REINICIO No. 153</b>	04/12/2024
<b>MODIFICATORÍO No. 8 Y ADICIÓN No. 07</b>	05/12/2024

<b>MODIFICATORIO No. 9 DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	20/12/024
--	-----------

En virtud de lo anterior, el contrato actualmente se encuentra en la Etapa de construcción.

Entidad actualmente NO adelanta procesos administrativos sancionatorios contra el contratista de Interventoría.

### **Relación de Actas de pago de Obra N° IDU – 1601 – 2019**

<b>No FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)</b>	<b>CRP No.</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Acta No. 2 de Pago No. 1 de Preconstrucción	202001 1885	\$ 122.218.475
Acta No. 3 de Pago No. 2 de Preconstrucción	202001 1885	\$ 122.218.475
Acta No. 9 de Pago No. 3 de Preconstrucción	202001 1885	\$ 113.779.117
Acta No. 10 de Pago No. 4 de Preconstrucción	202001 1885	\$ 126.292.423
Acta No. 11 de Pago No. 5 de Preconstrucción	202001 1885	\$ 122.218.475
Acta No, 13 de Pago 6 de Preconstrucción	202001 1885	\$ 120.614.476
Acta No, 15 de Pago 2 de Construcción	202001 1885	\$ 86.419.851
Actas de ajuste No. 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de Preconstrucción	202101 311	\$ 17.522.130
Acta No, 22 de Pago 3 de Construcción	202101 311	\$ 393.691.574
Acta No, 23 de Pago 4 de Construcción	202101 311	\$ 296.685.619
Acta No, 24 de Pago 5 de Construcción	202101 311	\$ 183.091.939
Acta de ajuste No. 25 al acta No 15 de pago 2 de la etapa de Construcción	202101 311	\$ 1.042.097
Acta de ajuste No. 26 al acta No 22 de pago 3 de la etapa de Construcción	202101 311	\$ 17.265.222
Acta de ajuste No. 27 al acta No 23 de pago 4 de la etapa de Construcción	202101 311	\$ 14.620.287
Acta No, 28 de Pago 6 de Construcción	202101 311	\$ 319.669.489
Acta No, 29 de Pago 7 de Construcción	202101 311	\$ 235.815.894
Acta No, 30 de Pago 8 de Construcción	202101 311	\$ 240.372.605

<b>No FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)</b>	<b>CRP No.</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Acta No, 31 de Pago 9 de Construcción	202101 311	\$ 1.770.531.588
Acta No, 32 de Pago 10 de Construcción	202101 311	\$ 867.239.444
Acta No, 33 de Pago 11 de Construcción	202101 311	\$ 348.497.670
Acta de ajuste No. 34 al acta No 24 de pago 5 de la etapa de Construcción	202101 311	\$ 8.249.314
Acta de ajuste No. 35 al acta No 28 de pago 6 de la etapa de Construcción	202101 311	\$ 11.867.194
Acta de ajuste No. 36 al acta No 29 de pago 7 de la etapa de Construcción	202101 311	\$ 23.554.749
Acta de ajuste No. 37 al acta No 30 de pago 8 de la etapa de Construcción	202101 311	\$ 15.936.054
Acta de ajuste No. 38 al acta No 31 de pago 9 de la etapa de Construcción	202101 311	\$ 125.921.714
Acta de ajuste No. 39 al acta No 32 de pago 10 de la etapa de Construcción	202101 311	\$ 46.618.093
Acta de ajuste No. 40 al acta No 33 de pago 11 de la etapa de Construcción	202101 311	\$ 24.112.797
Acta No, 41 de Pago 12 de Construcción	202101 311	\$ 462.762.654
Acta de ajuste No. 42 al acta No 41 de pago 12 de la etapa de Construcción	202101 311	\$ 30.844.534
Acta No, 43 de Pago 13 de Construcción	202101 311	\$ 5.906.487.212
Acta de ajuste No. 43 al acta No 43 de pago 13 de la etapa de Construcción	202101 311	\$ 389.455.001
Acta No, 46 de Pago 14 de Construcción	202101 311	\$ 402.928.953
Acta de ajuste No. 47 al acta No 45 de pago 14 de la etapa de Construcción	202101 311	\$ 29.955.820
Acta No, 48 de Pago 15 de Construcción	202101 311	\$ 6.068.110.504
Acta de ajuste No. 49 al acta No 48 de pago 15 de la etapa de Construcción	202101 311	\$ 493.235.722
Acta No, 50 de Pago 16 de Construcción	202101 311	\$ 334.748.861
Acta de ajuste No. 51 al acta No 50 de pago 16 de la etapa de Construcción	202101 311	\$ 24.651.843
Acta No, 52 de Pago 17 de Construcción	202201 913	\$ 304.760.050
Acta de ajuste No. 53 al acta No 52 de pago 17 de la etapa de Construcción	202201 913	\$ 21.121.866
Acta No, 54 de Pago 18 de Construcción	202201 913	\$ 2.295.669.450

<b>No FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)</b>	<b>CRP No.</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Acta de ajuste No. 55 al acta No 54 de pago 18 de la etapa de Construcción	202201 913	\$ 198.436.594
Acta No, 56 de Pago 19 de Construcción	202201 913	\$ 145.232.323
Acta No, 57 de Pago 20 de Construcción	202201 913	\$ 12.626.965
Acta No, 63 de Pago 21 de Construcción	202201 913	\$ 559.706
Acta No, 67 de Pago 22 de Construcción	202201 913	\$ 317.741.030
Acta No, 68 de Pago 23 de Construcción	202201 913	\$ 15.937.947
Acta No, 69 de Pago 24 de Construcción	202201 913	\$ 6.512.121
Acta No, 73 de Pago 25 de Construcción	202201 913	\$ 1.483.621.617
Acta No, 74 de Pago 26 de Construcción	202201 913	\$ 1.633.501.155
Acta No, 75 de Pago 27 de Construcción	202201 913	\$ 80.410.757
Acta No, 76 de Pago 27 de Construcción	202201 913	\$ 22.724.503
Acta No, 77 de Pago 27 de Construcción	202201 913	\$ 97.826.633
Acta No, 78 de Pago 27 de Construcción	202201 913	\$ 741.508.163
Acta No, 79 de Pago 27 de Construcción	202201 913	\$ 2.823.933.611
Acta No, 80 de Pago 28 de Construcción	202201 913	\$ 1.529.014.523
Acta No, 81 de Pago 28 de Construcción	202201 913	\$ 114.033.643
Acta No, 82 de Pago 28 de Construcción	202201 913	\$ 59.552.787
Acta No, 83 de Pago 28 de Construcción	202201 913	\$ 4.764.104
Acta No, 84 de Pago 28 de Construcción	202201 913	\$ 1.440.031.875
Acta No, 85 de Pago 29 de Construcción	202201 913	\$ 2.488.031.883
Acta No, 86 de Pago 29 de Construcción	202201 913	\$ 39.556.487
Acta No, 87 de Pago 29 de Construcción	202201 913	\$ 151.277.420
Acta No, 88 de Pago 29 de Construcción	202201 913	\$ 2.040.384

<b>No FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)</b>	<b>CRP No.</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Acta No, 89 de Pago 30 de Construcción	202201 913	\$ 216.116.005
Acta No, 90 de Pago 30 de Construcción	202201 913	\$ 93.855.214
Acta No, 91 de Pago 30 de Construcción	202201 913	\$ 2.440.076.523
Factura No. 70 - Acta No, 93 de Pago 27 Adición 2 de Construcción	716 (RECURSOS IDU)	\$ 5.005.903
Factura No, 71 - Acta No, 94 de Pago 28 Adición 2 de Construcción	716 (RECURSOS IDU)	\$ 7.165.186
Factura No. 72 - Acta No, 95 de Pago 29 Adición 2 de Construcción	716 (RECURSOS IDU)	\$ 398.200.847
Factura No, 73 - Acta No, 96 de Pago 30 Adición 2 de Construcción	716 (RECURSOS IDU)	\$ 1.039.569.834
Acta No, 97 de Pago 31 de Construcción	202201 913	\$ 626.037.577
Acta No, 98 de Pago 31 de Construcción	202201 913	\$ 149.896.621
Acta No, 99 de Pago 31 de Construcción	202201 913	\$ 1.241.474.797
Acta No, 100 de Pago 32 de Construcción	202201 913	\$ 389.259.381
Acta No, 101 de Pago 32 de Construcción	202201 913	\$ 159.031.890
Acta No, 102 de Pago 32 de Construcción	202201 913	\$ 76.420.795
Acta No, 103 de Pago 32 de Construcción	202201 913	\$ 1.048.602.181
Factura No. 80 - Acta No, 108 de Pago 31 Adición 2 de Construcción	716 (RECURSOS IDU)	\$ 616.484.579
Factura No.81 - Acta No, 109 de Pago 32 Adición 2 de Construcción	716 (RECURSOS IDU)	\$ 823.894.819
Acta No, 104 de Pago 33 de Construcción	202201 913	\$ 518.942.363
Acta No, 105 de Pago 33 de Construcción	202201 913	\$ 136.521.093
Acta No, 106 de Pago 33 de Construcción	202201 913	\$ 44.696.171
Acta No, 107 de Pago 33 de Construcción	202201 913	\$ 2.873.693.760
Acta No, 110 de Pago 34 de Construcción	202201 913	\$ 371.630.768
Acta No, 111 de Pago 34 de Construcción	202201 913	\$ 210.419.552
Acta No, 112 de Pago 34 de Construcción	202201 913	\$ 100.239.598

<b>No FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)</b>	<b>CRP No.</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Acta No, 113 de Pago 34 de Construcción	202201 913	\$ 1.816.314.426
Acta No, 114 de Pago 35 de Construcción	202201 913	\$ 540.161.876
Acta No, 115 de Pago 35 de Construcción	202201 913	\$ 214.396.463
Acta No, 116 de Pago 35 de Construcción	202201 913	\$ 69.098.055
Acta No, 117 de Pago 35 de Construcción	202201 913	\$ 7.281.156.710
Acta No, 118 de Pago 36 de Construcción	202301 1500	\$ 369.337.445
Acta No, 119 de Pago 36 de Construcción	202301 1500	\$ 126.471.499
Acta No, 120 de Pago 36 de Construcción	202301 1500	\$ 67.680.879
Acta No, 121 de Pago 36 de Construcción	202301 1500	\$ 3.597.917.788
Factura No. 86 - Acta No, 122 de Pago 33 Adición 2 de Construcción	716 (RECURSOS IDU)	\$ 461.636.825
Factura No. 87 - Acta No, 123 de Pago 34 Adición 2 de Construcción	716 (RECURSOS IDU)	\$ 333.036.334
Factura No. 88 - Acta No, 124 de Pago 35 Adición 2 de Construcción	716 (RECURSOS IDU)	\$ 269.104.706
Factura No. 89 - Acta No, 125 de Pago 36 Adición 2 de Construcción	716 (RECURSOS IDU)	\$ 119.553.750
Factura No. 90 - Acta No, 126 de Pago 37 Adición 2 de Construcción	716 (RECURSOS IDU)	\$ 157.725.097
Acta No, 127 de Pago 37 de Construcción	202301 1500	\$ 211.290.511
Acta No, 128 de Pago 37 de Construcción	202301 1500	\$ 152.753.419
Acta No, 129 de Pago 37 de Construcción	202301 1500	\$ 98.644.619
Acta No, 130 de Pago 37 de Construcción	202301 1500	\$ 10.023.123.218
Acta No, 144 de Pago 38 de Construcción	202301 1500	\$ 333.420.788
Acta No, 145 de Pago 38 de Construcción	202301 1500	\$ 98.535.813
Acta No, 146 de Pago 38 de Construcción	202301 1500	\$ 486.493.655
	202301 1444	\$ 3.705.225.002
Acta No, 184 de Pago 39 de Construcción	202301 1444	\$ 3.089.338.728

<b>No FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)</b>	<b>CRP No.</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Acta No, 185 de Pago 39 de Construcción	202301 1444	\$ 237.322.095
Acta No, 186 de Pago 39 de Construcción	202301 1444	\$ 134.497.332
Acta No, 187 de Pago 39 de Construcción	202301 1444	\$ 6.390.887.476
Acta No, 192 de Pago 40 de Construcción	202301 1444	\$ 5.134.784.850
Acta No, 193 de Pago 40 de Construcción	202301 1444	\$ 114.799.620
Acta No, 194 de Pago 40 de Construcción	202301 1444	\$ 56.965.366
Acta No, 195 de Pago 40 de Construcción	202301 1444	\$ 4.139.483.206
Acta No, 202 de Pago 41 de Construcción	202301 1444	\$ 2.158.004.331
Acta No, 203 de Pago 41 de Construcción	202301 1444	\$ 106.591.032
Acta No, 204 de Pago 41 de Construcción	202301 1444	\$ 38.180.665
Acta No, 205 de Pago 41 de Construcción	202301 1444	\$ 4.475.776.196
Acta No, 210 de Pago 42 de Construcción	202301 1444	\$ 2.743.984.504
Acta No, 211 de Pago 42 de Construcción	202301 1444	\$ 71.365.153
Acta No, 212 de Pago 42 de Construcción	202301 1444	\$ 21.684.084
Acta No, 213 de Pago 42 de Construcción	202301 1444	\$ 2.299.537.479
Acta No, 218 de Pago 43 de Construcción	202301 1444	\$ 4.741.450.039
Acta No, 219 de Pago 43 de Construcción	202301 1444	\$ 53.195.742
Acta No, 220 de Pago 43 de Construcción	202301 1444	\$ 20.389.475
Acta No, 221 de Pago 43 de Construcción	202301 1444	\$ 2.189.021.954
Acta No, 226 de Pago 44 de Construcción	202301 1444	\$ 3.906.380.001
Acta No, 227 de Pago 44 de Construcción	202301 1444	\$ 232.203.825
Acta No, 228 de Pago 44 de Construcción	202301 1444	\$ 78.061.021
Acta No, 229 de Pago 44 de Construcción	202301 1444	\$ 5.636.704.490

<b>No FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)</b>	<b>CRP No.</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Acta No, 234 de Pago 45 de Construcción	202301 1444	\$ 2.100.900.772
Acta No, 235 de Pago 45 de Construcción	202301 1444	\$ 149.534.033
Acta No, 236 de Pago 45 de Construcción	202301 1444	\$ 88.335.486
Acta No, 237 de Pago 45 de Construcción	202301 1444	\$ 3.941.923.668
Acta No, 242 de Pago 46 de Construcción	202301 1444	\$ 2.054.628.140
	202301 788	\$ 1.617.244.627
Acta No, 243 de Pago 46 de Construcción	202301 788	\$ 85.817.808
Acta No, 244 de Pago 46 de Construcción	202301 788	\$ 24.068.393
Acta No, 245 de Pago 46 de Construcción	202301 788	\$ 9.486.761.818
Factura No. 102- Acta No, 246 de Adición 1 de Estudios y Diseños	202312 5157 (RECURSOS IDU)	\$ 202.613.187
Cuenta de Cobro 1- Acta No, 247 de Recibo Final de Obra Modificadorio No 7 Adición 2 de Construcción- Devolución (Rete garantía 6%)	716 (RECURSOS IDU)	\$ 270.087.948
Acta No, 252 de Pago 47 de Construcción	202401 1356	\$ 1.430.976.959
Acta No, 253 de Pago 47 de Construcción	202401 1356	\$ 183.397.792
Acta No, 254 de Pago 47 de Construcción	202401 1356	\$ 31.929.121
Acta No, 255 de Pago 47 de Construcción	202401 1356	\$ 5.503.890.480
Acta No, 259 de Pago 48 de Construcción	202401 1356	\$ 1.154.059.048
Acta No, 260 de Pago 48 de Construcción	202401 1356	\$ 43.126.144
Acta No, 261 de Pago 48 de Construcción	202401 1356	\$ 21.044.429
Acta No, 262 de Pago 48 de Construcción	202401 1356	\$ 6.004.066.487
Acta No, 267 de Pago 49 de Construcción	202401 1356	\$ 1.061.888.974
Acta No, 268 de Pago 49 de Construcción	202401 1356	\$ 325.331.238
Acta No, 269 de Pago 49 de Construcción	202401 1356	\$ 25.787.697

<b>No FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)</b>	<b>CRP No.</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Acta No, 270 de Pago 49 de Construcción	202401 1356	\$ 6.298.431.564
Acta No, 275 de Pago 50 de Construcción	202401 1356	\$ 3.635.449.664
Acta No, 276 de Pago 50 de Construcción	202401 1356	\$ 438.141.384
Acta No, 277 de Pago 50 de Construcción	202401 1356	\$ 134.739.777
Acta No, 278 de Pago 50 de Construcción	202401 1356	\$ 3.294.792.030
Acta No, 283 de Pago 51 de Construcción	202401 1356	\$ 2.405.002.760
Acta No, 284 de Pago 51 de Construcción	202401 1356	\$ 367.973.031
Acta No, 285 de Pago 51 de Construcción	202401 1356	\$ 75.790.678
Acta No, 286 de Pago 51 de Construcción	202401 1356	\$ 4.771.156.460
Acta No, 291 de Pago 52 de Construcción	202401 1356	\$ 1.272.897.620
Acta No, 292 de Pago 52 de Construcción	202401 1356	\$ 246.975.160
Acta No, 293 de Pago 52 de Construcción	202401 1356	\$ 80.877.618
Acta No, 294 de Pago 52 de Construcción	202401 1356	\$ 9.071.156.262
Acta No, 299 de Pago 53 de Construcción	202401 1356	\$ 1.408.523.902
Acta No, 300 de Pago 53 de Construcción	202401 1356	\$ 234.594.637
Acta No, 301 de Pago 53 de Construcción	202401 1356	\$ 479.754.836
Acta No, 302 de Pago 53 de Construcción	202401 1356	\$ 13.101.116
Acta No, 303 de Pago 53 de Construcción	202401 1356	\$ 9.005.605.235
Acta No. 308 de Pago 54 de Construcción 27/04/2024 - 26/05/2024	202401 1356	\$ 1.156.855.855
Acta No. 309 de Pago 54 de Construcción 27/04/2024 - 26/05/2024	202401 1356	\$ 282.249.490
Acta No. 310 de Pago 54 de Construcción 27/04/2024 - 26/05/2024	202401 1356	\$ 259.632.252
Acta No. 311 de Pago 54 de Construcción 27/04/2024 - 26/05/2024	202401 1356	\$ 5.552.340.467
Acta No. 320 de Pago 55 de Construcción 27/05/2024 - 26/06/2024	202401 1356	\$ 745.132.797

<b>No FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)</b>	<b>CRP No.</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Acta No. 321 de Pago 55 de Construcción 27/05/2024 - 26/06/2024	202401 1356	\$ 181.913.796
Acta No. 322 de Pago 55 de Construcción 27/05/2024 - 26/06/2024	202401 1356	\$ 104.109.459
Acta No. 323 de Pago 55 de Construcción 27/05/2024 - 26/06/2024	202401 1356	\$ 5.729.219.316
Acta de ajuste No. 318 que corresponde al acta No 261 de pago 48 de la etapa de Construcción 27/10/2023 - 26/11/2023	202401 1356	\$ 1.642.456
Acta de ajuste No. 319 que corresponde al acta No 302 de pago 53 de la etapa de Construcción 27/03/2024 - 26/04/2024	202401 1356	\$ 1.054.771
Acta No. 328 de Pago 56 de construcción 27/06/2024 - 26/07/2024	202401 1356	\$ 1.222.667.780
Acta No. 329 de Pago 56 de construcción 27/06/2024 - 26/07/2024	202401 1356	\$ 85.989.089
Acta No. 330 de Pago 56 de construcción 27/06/2024 - 26/07/2024	202401 1356	\$ 25.366.374
Acta No. 331 de Pago 56 de construcción 27/06/2024 - 26/07/2024	202401 1356	\$ 3.373.307.193
Acta No. 340 de Pago 57 de construcción 27/07/2024 - 26/08/2024	202401 1356	\$ 3.211.890.119
Acta No. 341 de Pago 57 de construcción 27/07/2024 - 26/08/2024	202401 1356	\$ 687.691.454
Acta No. 342 de Pago 57 de construcción 27/07/2024 - 26/08/2024	202401 1356	\$ 373.933.866
Acta No. 343 de Pago 57 de construcción 27/07/2024 - 26/08/2024	202401 1356	\$ 5.391.590.216
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 235.569.563.198</b>

### **Relación de Actas de pago de Interventoría N° IDU – 1605 – 2019**

<b>No. FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)</b>	<b>CRP No.</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Acta No. 2 Pago No. 1	202001 1886	\$ 118.293.599
Acta No. 5 Pago No. 2	202001 1886	\$ 118.293.599
Acta No. 9 Pago No. 3	202001 1886	\$ 122.236.719
Acta No. 8 Pago No. 4	202001 1886	\$ 114.350.480
Acta No. 10 Pago No. 5	202001 1886	\$ 118.293.599
Acta No. 11 Pago No. 6	202001 1886	\$ 118.293.596
Acta No. 12 Pago No. 7	202101 312	\$ 178.661.754
Acta No. 13 Pago No. 8	202101 312	\$ 181.252.350
Acta No. 14 Pago No. 9	202101 312	\$ 1.064.642.389
Acta No. 15 Pago No. 10	202101 312	\$ 189.671.785
Acta No. 16 Pago No. 11	202101 312	\$ 8.419.436

<b>No. FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)</b>	<b>CRP No.</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Acta No. 17 Pago No. 12	202101 312	\$ 5.181.191
Acta No. 18 Pago No. 13	202101 312	\$ 9.067.084
Acta No. 19 Pago No. 14	202101 312	\$ 6.476.488
Acta No. 20 Pago No. 15	202101 312	\$ 178.661.754
Acta No. 21 Pago No. 16	202101 312	\$ 6.476.488
Acta No. 22 Pago No. 17	202101 312	\$ 178.661.754
Acta No. 24 Pago No. 19	202101 312	\$ 178.661.754
Acta No. 23 Pago No. 18	202101 312	\$ 49.221.313
Acta No. 25 Pago No. 20	202101 312	\$ 178.661.754
Acta No. 26 Pago No. 21	202101 312	\$ 178.661.754
Acta No. 27 Pago No. 22	202101 312	\$ 3.238.245
Acta No. 28 Pago No. 23	202101 312	\$ 178.661.754
Acta No. 29 Pago No. 24	202201 914	\$ 23.963.007
Acta No. 30 Pago No. 25	202201 914	\$ 9.714.733
Acta No. 31 Pago No. 26	202201 914	\$ 12.952.977
Acta No. 32 Pago No. 27	202201 914	\$ 163.207.513
Acta No. 33 Pago No. 28	202201 914	\$ 11.010.030
Acta No. 34 Pago No. 29	202201 914	\$ 167.741.055
Acta No. 35 Pago No. 30	202201 914	\$ 9.067.084
Acta No. 36 Pago No. 31	202201 914	\$ 647.649
Acta No. 37 Pago No. 32	202201 914	\$ 647.649
Acta No. 38 Pago No. 33	202201 914	\$ 647.649
Acta No. 39 Pago No. 34	202201 914	\$ 647.649
Acta No. 40 Pago No. 35	202201 914	\$ 647.649
Acta No. 41 Pago No. 36	202201 914	\$ 1.295.298
Acta No. 42 Pago No. 37	202201 914	\$ 647.649
Acta No. 43 Pago No. 38	202201 914	\$ 647.649
Acta No. 44 Pago No. 39	202201 914	\$ 11.010.030
Acta No. 45 Pago No. 40	202201 914	\$ 647.649
Acta No. 46 Pago No. 41	202201 914	\$ 13.600.627
Acta No. 47 Pago No. 42	202201 914	\$ 647.649
Acta No. 48 Pago No. 43	202201 914	\$ 178.661.754
Acta No. 49 Pago No. 44	202201 914	\$ 8.419.436
Acta No. 50 Pago No. 45	202201 914	\$ 647.649
Acta No. 51 Pago No. 46	202201 914	\$ 63.469.589
Acta No. 52 Pago No. 47	202201 914	\$ 5.181.191
Acta No. 53 Pago No. 48	202201 914	\$ 3.885.893
Acta No. 54 Pago No. 49	202201 914	\$ 647.649
Acta No. 55 Pago No. 50	202201 914	\$ 9.067.084
Acta No. 56 Pago No. 51	202201 914	\$ 647.649

<b>No. FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)</b>	<b>CRP No.</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Acta No. 57 Pago No. 52	202201 914	\$ 40.801.879
Acta No. 58 Pago No. 53	202201 914	\$ 45.335.420
Acta No. 59 Pago No. 54	202201 914	\$ 178.661.754
Acta No. 60 Pago No. 55	202201 914	\$ 104.271.466
Acta No. 61 Pago No. 56	202201 914	\$ 178.661.754
Acta No. 62 Pago No. 57	202201 914	\$ 178.661.754
Acta No. 63 Pago No. 58	202201 914	\$ 87.432.596
Acta No. 64 Pago No. 59	202201 914	\$ 178.661.754
Acta No. 65 Pago No. 60	202201 914	\$ 74.479.619
Acta No. 66 Pago No. 61	202201 914	\$ 76.422.565
Acta No. 67 Pago No. 62	202201 914	\$ 55.697.802
Acta No. 68 Pago No. 63	202201 914	\$ 178.661.754
Acta No. 69 Pago No. 64	202201 914	\$ 178.661.754
Acta No. 70 Pago No. 65	202201 914	\$ 162.792.878
Acta No. 70 Pago No. 65	202201 707	\$ 15.868.876
Acta No. 71 Pago No. 66	202201 707	\$ 178.661.754
FETC46 - Acta No. 72 Pago No. 67	717 (RECURSOS IDU)	\$ 20.298.488
Acta No. 73 Pago No. 68	202201 707	\$ 46.630.718
FETC48 - Acta No. 74 Pago No. 69	717 (RECURSOS IDU)	\$ 33.777.655
FETC49 - Acta No. 75 Pago No. 70	717 (RECURSOS IDU)	\$ 53.506.601
Acta No. 76 Pago No. 71	202201 707	\$ 178.661.754
Acta No. 77 Pago No. 72	202201 707	\$ 99.090.275
Acta No. 78 Pago No. 73	202201 707	\$ 178.661.754
Acta No. 79 Pago No. 74	202201 707	\$ 69.298.428
FETC53 - Acta No. 80 Pago No. 75	717 (RECURSOS IDU)	\$ 85.902.168
FETC54 - Acta No. 81 Pago No. 76	717 (RECURSOS IDU)	\$ 64.555.722
Acta No. 82 Pago No. 77	202301 1445	\$ 178.661.754
Acta No. 83 Pago No. 78	202301 1445	\$ 178.661.754
Acta No. 84 Pago No. 79	202301 1445	\$ 224.086.506
Acta No. 85 Pago No. 80	202301 1445	\$ 115.281.498
FETC62 - Acta No. 86 Pago No. 81	717 (RECURSOS IDU)	\$ 75.012.519
FETC63 - Acta No. 90 Pago No. 85	717 (RECURSOS IDU)	\$ 13.365.260
FETC63 - Acta No. 90 Pago No. 85	3525 (RECURSOS IDU)	\$ 5.934.919
FETC64 - Acta No. 91 Pago No. 86	3525 (RECURSOS IDU)	\$ 9.891.531
FETC65 - Acta No. 92 Pago No. 87	3525 (RECURSOS IDU)	\$ 9.891.531
FETC66 - Acta No. 93 Pago No. 88	3525 (RECURSOS IDU)	\$ 9.891.531
Acta No. 87 Pago No. 82	202301 1445	\$ 178.661.754
Acta No. 88 Pago No. 83	202301 1445	\$ 178.661.754
Acta No. 89 Pago No. 84	202301 1445	\$ 290.146.689
FETC68 - Acta No. 94 Pago No. 89	3525 (RECURSOS IDU)	\$ 3.956.612

<b>No. FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)</b>	<b>CRP No.</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Acta No. 95 Pago No. 90	202301 1445	\$ 178.661.754
Acta No. 96 Pago No. 91	202301 1445	\$ 178.661.754
Acta No. 97 Pago No. 92	202301 1445	\$ 128.234.475
FETC69 - Acta No. 98 Pago No. 93	717 (RECURSOS IDU)	\$ 23.305.672
FETC70 - Acta No. 99 Pago No. 94	717 (RECURSOS IDU)	\$ 16.812.889
FETC71 - Acta No. 100 Pago No. 95	717 (RECURSOS IDU)	\$ 12.074.297
FETC71 - Acta No. 100 Pago No. 95	3525 (RECURSOS IDU)	\$ 3.614.905
FETC72 - Acta No. 101 Pago No. 96	3525 (RECURSOS IDU)	\$ 14.504.582
Acta No. 102 Pago No. 97	ANULADA	
Acta No. 103 Pago No. 98	202301 1445	\$ 178.661.754
Acta No. 104 Pago No. 99	202301 1445	\$ 178.661.754
Acta No. 105 Pago No. 100	202301 1445	\$ 178.661.754
Acta No. 106 Pago No. 101	202301 1445	\$ 272.660.171
Acta No. 106 Pago No. 101	202301 3934	\$ 144.756.396
Acta No. 107 Pago No. 102	202301 1445	\$ 261.650.140
Acta No. 107 Pago No. 102	202301 3934	\$ 138.919.444
Acta No. 108 Pago No. 103	202301 1445	\$ 187.818.170
Acta No. 108 Pago No. 103	202301 3934	\$ 99.695.130
Acta No. 109 Pago No. 104	202301 3934	\$ 133.416.032
Acta No. 110 Pago No. 105	202301 1445	\$ 142.482.750
Acta No. 110 Pago No. 105	202301 3934	\$ 75.413.413
Acta No. 111 Pago No. 106	202301 3934	\$ 133.416.032
Acta No. 112 Pago No. 107	202301 1445	\$ 193.647.009
Acta No. 112 Pago No. 107	202301 3934	\$ 102.963.823
Acta No. 113 Pago No. 108	202301 3934	\$ 133.416.032
Acta No. 114 Pago No. 109	202301 1445	\$ 272.660.171
Acta No. 114 Pago No. 109	202301 3934	\$ 144.756.396
Acta No. 115 Pago No. 110	202301 3934	\$ 133.416.032
Acta No. 116 Pago No. 111	202301 1445	\$ 173.569.894
Acta No. 116 Pago No. 111	202301 3934	\$ 92.223.833
Acta No. 117 Pago No. 112	202301 3934	\$ 133.416.032
FETC96 - Acta No. 118 Pago No. 113	3525 (RECURSOS IDU)	\$ 18.677.010
FETC97 - Acta No. 119 Pago No. 114	717 (RECURSOS IDU)	\$ 13.669.016
FETC98 - Acta No. 120 Pago No. 115	5388 (RECURSOS IDU)	\$ 40.492.928
Acta No. 121 Pago No. 116	202401 1003	\$ 133.416.032
Acta No. 122 Pago No. 117	202401 1003	\$ 133.416.032
Acta No. 123 Pago No. 118	202401 170	\$ 282.320.247
Acta No. 123 Pago No. 118	202401 1350	\$ 84.896.657
Acta No. 123 Pago No. 118	202401 1003	\$ 194.954.178
Acta No. 124 Pago No. 119	202401 1350	\$ 277.160.609

<b>No. FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)</b>	<b>CRP No.</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Acta No. 124 Pago No. 119	202401 1003	\$ 26.085.068
Acta No. 125 Pago No. 120	202401 1350	\$ 133.416.032
Acta No. 126 Pago No. 121	202401 5314	\$ 77,549,555
Acta No. 127 Pago No. 122	202401 1350	\$ 306,356,015
Acta No. 128 Pago No. 123	202401 1350	\$ 133,416,032
Acta No. 129 Pago No. 124	202401 1350	\$ 327,194,459
Acta No. 130 Pago No. 125	202401 1350	\$ 133,416,032
Acta No. 131 Pago No. 126	202401 1350	\$ 133,416,032
Acta No. 132 Pago No. 127	202401 1350	\$ 318,096,928
Acta No. 133 Pago No. 128	202401 1350	\$ 133,416,032
Acta No. 134 Pago No. 129	202401 1350	\$ 323,202,996
Acta No. 135 Pago No. 130	202401 1350	\$ 133,416,032
Acta No. 136 Pago No. 131	202401 1350	\$ 133,416,032
Acta No. 137 Pago No. 132	202401 1350	\$ 452,225,134
Acta No. 138 Pago No. 133	202401 5314	\$ 170,060,544
Acta No. 139 Pago No. 134	202401 1350	\$ 471,948,976
Acta No. 139 Pago No. 134	202401 5314	\$ 327,919,244
FETC119 - Acta No. 140 Pago No. 135	3486 (RECURSOS IDU)	\$ 43,353,561
FETC120 - Acta No. 141 Pago No. 136	3485 (RECURSOS IDU)	\$ 13,560,388
Acta No. 142 Pago No. 137	202401 1350	\$ 307,470,619
Acta No. 142 Pago No. 137	202401 5314	\$ 213,383,467
Acta No. 143 Pago No. 138	202401 5314	\$ 170,060,544
Acta No. 144 Pago No. 139	202401 1350	\$ 286,632,172
Acta No. 144 Pago No. 139	202401 5314	\$ 369,031,381
Acta No. 145 Pago No. 140	202401 5314	\$ 170,060,544
Acta No. 146 Pago No. 141	202401 1350	\$ 199,286,926
Acta No. 146 Pago No. 141	202401 5314	\$ 138,514,313
Acta No. 148 Pago No. 142	202501 1646	\$ 170,060,544
Acta No. 154 Pago No. 143	202501 1646	\$ 170,060,544
Acta No. 155 Pago No. 144	202501 3289	\$ 108,665,374
Acta No. 156 Pago No. 145	202501 237	\$ 191,088,742
Acta No. 156 Pago No. 145	202501 1646	\$ 341,821,693
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 20,269,041,436</b>

## **7. PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS**

Por el momento no se está llevando ningún proceso administrativo sancionatorio para ninguno de los dos contratos 1601-2019 y 1605-2019

**8. Equipo de apoyo a la supervisión para el Contrato de Interventoría IDU-1605- 2020.**

ASIGNACION	NOMBRE COMPLETO	DEPENDENCIA
Apoyo técnico principal:	Fabián Casallas	STEST
Apoyo técnico:	Yenny Ardila solar	STEST
Ambiental:	Mónica Alejandra Granados	OGA
SST:	Sandra Vivian Salazar	OGA
Forestal:	Daniel Buitrago	OGA
Bióloga:	Adriana Sepúlveda	OGA
Tránsito y Transporte	Marlon Alexander Contreras Sanchez	STEST
Social:	Laura Rodríguez	ORSC
Arqueología:	Maryori Natalia Arias Herrera	OGA

**9. Registro fotográfico a 20 de febrero de 2025**

**REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRA**

FRENTE MOLINOS:	FRENTE MOLINOS
 <p><i>Trabajos finales en puente peatonal Molinos</i></p>	 <p><i>Instalación de sub base reciclada tipo PEA y bordillo A80 para continuación espacio público costado occidental</i></p>
Sector 2 (Picota):	Sector 2 (Picota):
 <p><i>Instalación de MR-45 a 3 días para conformación calzada BRT costado occidental carril izquierdo</i></p>	 <p><i>conformación paños de adoquín espacio público occidental</i></p>

<b>Sector 3 (Santafé):</b>	<b>Sector 3 (Santafé):</b>
 <p>13 jun 2024 10:12:44 a. m.  4°32'9.348"N -74°7'14.748"W ±1.50m  185° S  13-50 Calle 65 Sur  Usme  Bogotá  SECTOR 3 K1+570 a K2+750</p>	 <p>7 jun 2024 9:56:19 a. m.  4°32'9.78"N -74°7'13.404"W ±1.60m  28° NE  63 Sur65 Carrera 1  Bogotá  SECTOR 3 K1+570 a K2+750</p>
<p><i>Instalación de concreto reforzado 4000 psi para conformación muro de cerramiento Cemex ubicado en el espacio publico costado occidental.</i></p>	<p><i>Instalación paños de adoquín para conformación espacio público costado occidental</i></p>

<p><b>FRENTE MOLINOS</b> Instalación de estructura metálica rampa central entre ejes # 18 al 16 del puente peatonal Molinos</p>	<p><b>FRENTE MOLINOS</b> Instalación de concreto MR-45 para conformación pompeyano carril de incorporación E.A Molinos costado oriental</p>
 <p>11 jul 2024 4:06:16 p. m.  4°33'19.799"N -74°7'16.772"W  332° NW  9 Avenida Calle 51 Sur  Tunjuetito  Bogotá  Altitud:2597.4m  Velocidad:0.0km/h  tramo 1 sector molinos k0-090 a k0+300</p>	 <p>11 jul 2024 11:55:45 a. m.  4°33'19.024"N -74°7'15.948"W  153° SE  5e30 Calle 51 Sur  Rafael Uribe Uribe  Bogotá  Altitud:2593.8m  Velocidad:0.0km/h  tramo 1 sector molinos k0-090 a k0+300</p>
<p><b>FRENTE MOLINOS</b> Conformación espacio público oriental</p>	<p><b>FRENTE MOLINOS</b> Demolición losas existentes para conformación calzada BRT costado oriental</p>
 <p>11 jul 2024 9:46:11 a. m.  4°33'24.124"N -74°7'16.674"W  344° N  740 Calle 51 Sur  Rafael Uribe Uribe  Bogotá  Altitud:2597.6m  Velocidad:0.0km/h  tramo 1 sector molinos k0-090 a k0+300</p>	 <p>11 jul 2024 9:52:07 a. m.  4°33'18.209"N -74°7'16.437"W  352° N  Rafael Uribe Uribe  Bogotá  Altitud:2598.6m  Velocidad:0.0km/h  tramo 1 sector molinos k0-090 a k0+300</p>

**FRENTE 1. PUENTE VEHICULAR CHIGUAZA.** Instalación mezcla asfáltica tipo MD-12 para conformación cicloruta



**FRENTE 1. PUENTE VEHICULAR CHIGUAZA.** Instalación acero de refuerzo y concreto 4000 psi para conformación placa superior box culvert existente costado occidental



**FRENTE LADRILLERA SANTAFE**  
Instalación de concreto 4000 psi a 28 días para conformación muro de cerramiento Cemex costado occidental



**FRENTE LADRILLERA SANTAFE**  
Instalación de mezcla asfáltica tipo MD-20 para conformación capa intermedia calzada mixta occidental



# FRENTE PAR VÍAL





# FRENTE LADRILLERA SANTAFÉ






**FRENTE PICOTA**



# FRENTE MOLINOS

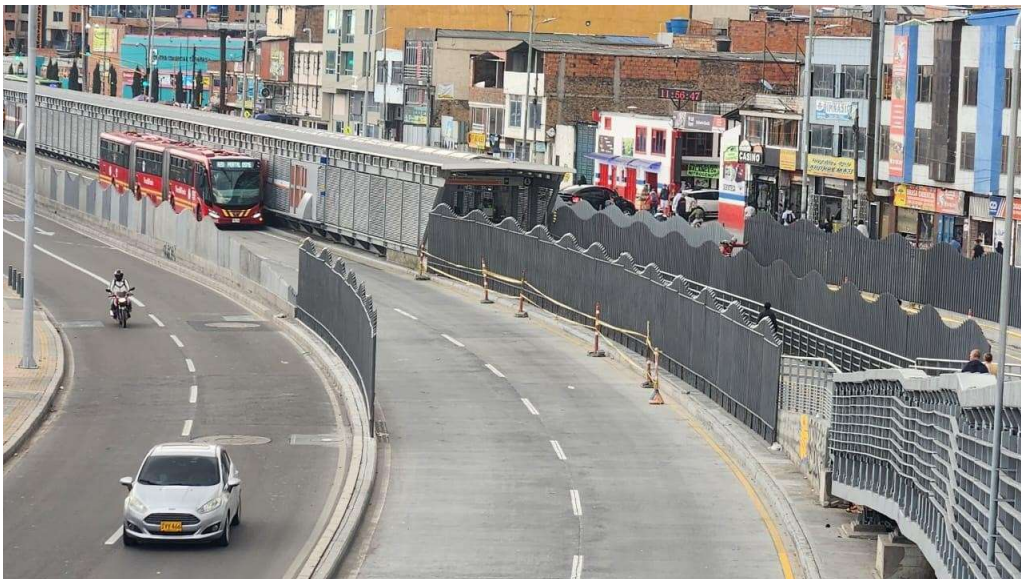



## 9. CORRESPONDENCIA

A la fecha no existe correspondencia pendiente de trámite, ver paz y salvo y CONECTA.

Fecha: 20 de febrero de 2025

*Yenny*


---

**YENNY ARDILA SOLER**  
**NOMBRE CONTRATISTA**

*Edwin Oswaldo Santisteban Balaguera*

---

**EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA**  
Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte

<b>FORMATO</b> ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL CARGO PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA Y/O CESIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS NATURALES			
<b>CÓDIGO</b> FO-TH-40	<b>PROCESO</b> GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		<b>VERSIÓN</b> 1.0

INFORMACIÓN PERSONAL								
Fecha de Entrega (dd/mm/aaaa)			NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	CARGO	DEPENDENCIA	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Tipo Documento (C.C-T.I-C.E-P.A)	
20	2	2025	YENNY ARDILA SOLER	APOYO TÉCNICO	Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte	52.738.496	C.C. : Cédula de Ciudadanía	
NOMBRE JEFE INMEDIATO O COORDINADOR			CARGO	DEPENDENCIA	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Tipo Doc. de Ident. (C.C - T.I - C.E - P.A)		
EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA			Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte	Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte	7.178.941	C.C. : Cédula de Ciudadanía		
Marque con un X si tuvo a cargo el manejo de recursos financieros y/o fue Ordenador del Gasto						Si	No	<b>X</b>
En caso afirmativo debe adjuntar a este formato la copia de la última Declaración Juramentada de Bienes y Rentas								

INVENTARIO DE BIENES A REINTEGRAR				
PLACA	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	ESTADO	FIRMAS DE QUIENES RECIBEN
				No se hace efectiva la entrega de elementos , teniendo en cuenta que no tengo elementos a cargo, de acuerdo con lo verificado en el sistema integrado de gestión de recursos físicos de IDU

INVENTARIO DE ARCHIVO DOCUMENTAL A CARGO PARA REINTEGRO						
CANTIDAD DE CARPETAS	UNIDAD DE CONSERVACIÓN	SERIE DOCUMENTAL	No. FOLIOS	FECHAS EXTREMAS (DD/MM/AA)	DOCUMENTO ORIGINAL O COPIA	FIRMAS DE QUIENES RECIBEN
						Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____
						Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____
						Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____
						Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____

INVENTARIO REGISTRO BACKUP DE ARCHIVOS					
DISPOSITIVO	NOMBRE DE CARPETAS	NUMERO ARCHIVOS	FECHAS EXTREMAS ARCHIVOS (DD/MM/AA)	UBICACIÓN	FIRMAS DE QUIENES RECIBEN
Drive	1. RELACIÓN CONECTA TRAMITADOS	1		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1gGMm7qPvt0gNRI8NMAa94HaQ_YLQJ3">https://drive.google.com/drive/folders/1gGMm7qPvt0gNRI8NMAa94HaQ_YLQJ3</a>	Firma:  Nombre: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA Cargo: Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte
Drive	2. INFORMES SEMANALES	32			
Drive	3. INFORMES MENSUALES	10			
Drive	4. AMIGABLE COMPONEDOR	3			
Drive	5. LISTAS DE CHEQUEO NO PREVISTOS	15			
Drive	6. ACTA DE TERMINACIÓN DE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	1			
					Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____

**INFORME DE GESTIÓN FINAL**

Se adjunta el Informe de Gestión Final del Contrato IDU-1927-2024 en 49 Folios, el cual contiene el resumen Ejecutivo de la gestión realizada en los proyectos asignados como apoyo técnico a la Supervisión.

**COMPROMISOS U OBLIGACIONES, PLANES, OBJETIVOS, METAS Y LOGROS OBTENIDOS (espacio en donde el jefe o coordinador del contrato debe describir en forma resumida)**


**Observaciones de quien entrega (espacio para el funcionario o contratista)**


**Observaciones de quien recibe (espacio para quien recibe el cargo)**


  
Firma  
**EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA**  
Nombre del Jefe o Coordinador

7.178.941  
Número de documento de identidad

  
Firma  
**YENNY ARDILA SOLER**  
Nombre del Contratista

52.738.496  
Número de documento de identidad:
