

Presupuesto Detallado - Reposición de Cubierta y Sistema Pluvial en Área Comedor Pasillo

Hospital Departamental
Psiquiátrico Universitario
Del Valle S.E.

CORTE #1

FECHA: NOV 28 - DIC 30 - 2025

20/12/2025 \$ 604 362 702,98

AVANCE DE OBRA 90,0%

ACUMULADO

FECHA: NOV 28 - DIC 30 - 2025

20/12/2025 \$ 67 151 412

AVANCE DE OBRA 10,0%

ITEMS	Descripción y Alcance del Proyecto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Total	%	Cent.	Vir Parcial	%	Cent.	Vir Parcial
1.00	OBRAS PRELIMINARES										
1.01	PROTECCION CERRAMIENTO BOARD DE 6 MM	M2	199	\$ 116 158	\$ 23 057 399	98%	195,00	\$ 22 650 845	2%	3,50	\$ 406 554
1.02	CINTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA	UNIDAD	4	\$ 206 932	\$ 827 727	100%	4,00	\$ 827 727	0%	0,00	\$ 0
1.03	MODULO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS	DA	60	\$ 187 865	\$ 11 271 927	100%	60,00	\$ 11 271 927	0%	0,00	\$ 0
1.04	DESMONTE DE CUBIERTAS DE FIBRO-CEMENTO	M2	318	\$ 77 178	\$ 24 542 579	84%	268,16	\$ 20 695 863	16%	49,84	\$ 3 846 716
1.05	DESMONTE DE CABELLETES	ML	45	\$ 21 199	\$ 953 954	100%	45,00	\$ 953 954	0%	0,00	\$ 0
1.06	DESMONTE DE LIMATESAS	ML	10	\$ 21 199	\$ 211 090	92%	9,16	\$ 194 183	8%	0,84	\$ 17 807
1.07	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	83	\$ 26 904	\$ 2 233 023	100%	83,00	\$ 2 233 023	0%	0,00	\$ 0
1.08	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE MADERA	ML	8	\$ 77 963	\$ 623 706	0%	0,00	\$ 0	100%	8,00	\$ 623 706
1.09	DEMOL DE ANDEN	ML	13	\$ 27 166	\$ 339 575	0%	0,00	\$ 0	100%	12,50	\$ 339 575
1.10	EXCAVACIONES DE TIERRA A MANO	M3	8	\$ 19 333	\$ 154 664	100%	8,00	\$ 154 664	0%	0,00	\$ 0
	Sub Total de Preliminares				\$ 64 216 542						
2.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y										
2.01	SUMINISTRO TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100x100x3mm	ML	131	\$ 147 909	\$ 19 376 108	100%	131,00	\$ 19 376 108	0%	0,00	\$ 0
2.02	SUMINISTRO TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 120x50x3mm	ML	81	\$ 153 648	\$ 12 445 494	100%	81,00	\$ 12 445 494	0%	0,00	\$ 0
2.03	SUMINISTRO TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100x50x3mm	ML	81	\$ 120 615	\$ 9 769 821	0%	0,00	\$ 0	100%	81,00	\$ 9 769 821
2.04	SUMINISTRO TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100x50x3mm	ML	113	\$ 132 812	\$ 15 007 741	100%	113,00	\$ 15 007 741	0%	0,00	\$ 0
2.05	PLACA BASE 350 MM X 240 MM X 19 MM CON HASTAS 6 ANCLAJES	UNIDAD	36	\$ 533 730	\$ 19 214 268	61%	22,00	\$ 11 742 053	39%	14,00	\$ 7 472 216
2.06	SUMINISTRO Y BASEADO DE GROUTING EN PLACABASE	KLS	8	\$ 95 598	\$ 764 786	100%	8,00	\$ 764 786	0%	0,00	\$ 0
2.07	SUMINISTRO DE CORREAS PERFIL ESTRUCTURAL TPO C 100 X 50 X 2 MM	ML	349	\$ 110 570	\$ 38 588 874	100%	349,00	\$ 38 588 874	0%	0,00	\$ 0
2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA CORREAS	PUNTO	20	\$ 89 473	\$ 1 789 465	100%	20,00	\$ 1 789 465	0%	0,00	\$ 0
2.09	SUMINISTRO DE TEJA TERMOACUSTICA TIPO SANDWICH DE 30 MM	M2	374	\$ 297 008	\$ 111 081 097	100%	374,00	\$ 111 081 097	0%	0,00	\$ 0
2.10	INSTALACION DE TEJAS TERMO ACUSTICA	M2	374	\$ 68 399	\$ 25 581 103	72%	270,50	\$ 18 501 840	28%	103,50	\$ 7 079 262
2.11	INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA	ML	598	\$ 88 376	\$ 52 848 057	82%	560,00	\$ 46 806 993	8%	48,00	\$ 4 242 065
2.12	SUMINISTRO TORNILLERIA TEJA SANDWICH	UNIDAD	400	\$ 22 699	\$ 11 079 612	88%	350,00	\$ 9 894 861	13%	50,00	\$ 1 384 952
2.13	SUMINISTRO E INSTALACION CABELLETE	ML	45	\$ 119 620	\$ 5 382 881	67%	30,22	\$ 3 614 903	33%	14,78	\$ 1 767 977
2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE GOTEROS	ML	100	\$ 89 394	\$ 8 939 370	40%	39,50	\$ 3 531 051	61%	60,50	\$ 5 408 319
2.15	SUMINISTRO E INSTALACION LIMATESA O LIMAHOYA	ML	10	\$ 139 708	\$ 1 397 076	0%	0,00	\$ 0	100%	10,00	\$ 1 397 076
	Sub Total Cubierta				\$ 333 266 752						
3.00	SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS										
3.01	SUMINISTRO E INSTALACION CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE 25 CM CAL 20	ML	100	\$ 333 918	\$ 33 391 758	94%	94,00	\$ 31 388 253	6%	6,00	\$ 2 003 505
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE CAVAL	UNIDAD	20	\$ 34 739	\$ 694 789	75%	15,00	\$ 521 092	25%	5,00	\$ 173 697
3.03	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	8	\$ 73 133	\$ 585 065	100%	8,00	\$ 585 065	0%	0,00	\$ 0
3.04	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 45 GRADOS CC DE 4"	UNIDAD	36	\$ 67 696	\$ 2 434 884	100%	36,00	\$ 2 434 884	0%	0,00	\$ 0
3.05	SUMINISTRO E INSTALACION UNION DE 4"	UNIDAD	18	\$ 19 969	\$ 359 438	100%	18,00	\$ 359 438	0%	0,00	\$ 0
3.06	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS DE 4"	UNIDAD	54	\$ 82 382	\$ 4 448 616	100%	54,00	\$ 4 448 616	0%	0,00	\$ 0
3.07	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE DRENAJE FLEXIBLE DE 4"	ML	225	\$ 78 586	\$ 17 681 934	100%	225,00	\$ 17 681 934	0%	0,00	\$ 0
3.08	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA DINTEL BOARD	ML	54	\$ 78 865	\$ 4 258 692	70%	38,00	\$ 2 996 858	30%	16,00	\$ 1 261 835
3.09	SUMINISTRO E INSTALACION DINTEL BOARD	ML	54	\$ 137 351	\$ 7 416 955	70%	38,00	\$ 5 219 338	30%	16,00	\$ 2 197 616
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION BUITRONES	UNIDAD	18	\$ 493 194	\$ 8 877 498	83%	15,00	\$ 7 397 915	17%	3,00	\$ 1 479 583
	Sub Total Cubierta				\$ 80 148 629						
4.00	LIMPIEZA GENERAL Y MANEJO DE ESCOMBROS										
4.01	PROTECCION PLASTICO	M2	300	\$ 3 477	\$ 1 043 136	100%	300,00	\$ 1 043 136	0%	0,00	\$ 0
4.02	LIMPIEZA PERMANENTE	MES	2	\$ 4 626 920	\$ 9 653 840	100%	2,00	\$ 9 653 840	0%	0,00	\$ 0
4.03	CARGUE MANUAL DE ESCOMBROS	M3	5	\$ 157 481	\$ 787 306	100%	5,00	\$ 787 306	0%	0,00	\$ 0
4.04	TRANSPORTE CAMION URBANO DE 5 TON	VIAJE	1	\$ 774 542	\$ 774 542	100%	1,00	\$ 774 542	0%	0,00	\$ 0
4.05	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRIANTE INCLUYE CERTIFICADO	M3	5	\$ 136 434	\$ 682 170	100%	5,00	\$ 682 170	0%	0,00	\$ 0
4.06	DISPOSICION FINAL DE TEJA DE FIBRO-CEMENTO	KLS	3 600	\$ 5 041	\$ 18 148 896	100%	3 600,00	\$ 18 148 896	0%	0,00	\$ 0
	Sub Total				\$ 508 722 814	90%		\$ 457 850 533	10%		\$ 50 872 282
	COSTOS DIRECTOS				\$ 508 722 814			\$ 457 850 533			\$ 50 872 282
5.00	ACTIVIDADES NUEVAS				\$ 457 850 533,00			\$ 457 850 533			\$ 50 872 282
5.10	CERRAMIENTO EN LONA	M2	185,3	\$ 1 995	\$ 369 662	0,00		\$ 0	0%	0,00	\$ 0
5.20	CAJA DE INSPECCION DRENAJE EN CONCRETO 70X70	UNI	1	\$ 806 699	\$ 806 699	0,00		\$ 0	0%	0,00	\$ 0
5.30	IMPERMEABILIZACION LOSA CON EMULSION ACRILICA	M2	202,82	\$ 47 444	\$ 9 622 570	0,00		\$ 0	0%	0,00	\$ 0
5.40	RELLENO GRAVA TRITURADA E=0,05	M3	2,08	\$ 395 624	\$ 826 854	0,00		\$ 0	0%	0,00	\$ 0
5.50	RELLENO ARENA MEDIANA E=0,05	M3	2,08	\$ 262 730	\$ 549 105	0,00		\$ 0	0%	0,00	\$ 0
	Sub Total				\$ 12 174 890			\$ 0			\$ 0
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 508 722 814			\$ 457 850 533			\$ 50 872 282
					\$ 137 355 160	27%		\$ 123 619 644	27%		\$ 13 735 516
					\$ 0	0%		\$ 0	0%		\$ 0
					\$ 25 436 141	5%		\$ 22 892 527	5%		\$ 2 543 614
	COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				\$ 162 791 301			\$ 146 512 170			\$ 16 279 130
	COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				\$ 671 514 115	90%		\$ 604 362 703	10%		\$ 67 151 412

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	1.1	PROTECCION CERRAMIENTO BOARD DE 6 MM	UNIDAD:	M2
			CANTIDAD:	195,00


AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							M2	
CORREDORES	81,25		2,40				M2	195,00
					-			
Aproxima Resultado a :					Decimales		TOTAL	195,00



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	1.2	CINTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA	UNIDAD:	UNIDAD
			CANTIDAD:	4,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							UNIDAD	
CORREDORES	4,00				1,00		UNIDAD	4,00
					-			
Aproxima Resultado a :					Decimales		TOTAL	4,00

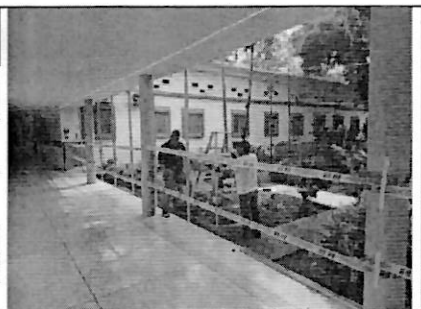

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	1.3	MODULO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UNIDAD:	DIA
			CANTIDAD:	60,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							DIA	
CORREDORES	60,00					1,00	DIA	60,00
					-			
Aproxima Resultado a :					Decimales		TOTAL	60,00



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	1.4	DESMONTE DE CUBIERTAS DE FIBRO-CEENTO	UNIDAD:	M2
			CANTIDAD:	268,16

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							M2	
CORREDORES	268,16					1,00	M2	268,16
					-			
Aproxima Resultado a :					Decimales		TOTAL	268,16




Handwritten signature

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	1,5	DESMONTE DE CABALLETES	UNIDAD:	ML
			CANTIDAD:	45,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							ML	
CORREDOR ES	45,00					1,00	ML	45,00
Aproxima Resultado a :					Decimales	TOTAL		45,00



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	1,6	DESMONTE DE LIMATESAS	UNIDAD:	ML
			CANTIDAD:	9,16

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							ML	
CORREDOR ES	9,16					1,00	ML	9,16
Aproxima Resultado a :					Decimales	TOTAL		9,16



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	1,7	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	UNIDAD:	ML
			CANTIDAD:	83,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							ML	
CORREDOR ES	83,00					1,00	ML	83,00
Aproxima Resultado a :					Decimales	TOTAL		83,00



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ITEM	1,10	EXCAVACIONES DE TIERRA A MANO	UNIDAD:	M3
			CANTIDAD:	8,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							M3	
CORREDOR ES	33,33	0,40	0,60			1,00	M3	8,00



Handwritten signature

ES	1,00	1,00	1,00			22,00	UNIDAD	22,00
Aproxima Resultado a :						Decimales	TOTAL	22,00



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

			UNIDAD:	KILOS
ITEM	2,06	SUMINISTRO Y BASEADO DE GROUTING EN PLACABASE	CANTIDAD:	8,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							KILOS	
CORREDOR ES	1,00	1,00	1,00			8,00	KILOS	8,00
Aproxima Resultado a :						Decimales	TOTAL	8,00



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

			UNIDAD:	ML
ITEM	2,07	SUMINISTRO DE CORREAS PERFIL ESTRUCTURAL TIPO C 100 X 50 X 2 MM	CANTIDAD:	271,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							ML	
CORREDOR ES	271,00	1,00	1,00		1,00	45,17	ML	271,00
Aproxima Resultado a :						Decimales	TOTAL	271,00



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

			UNIDAD:	PUNTO
ITEM	2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA CORREAS	CANTIDAD:	20,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							PUNTO	
CORREDOR ES	1,00	1,00	1,00			20,00	PUNTO	20,00
Aproxima Resultado a :						Decimales	TOTAL	20,00



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

			UNIDAD:	M2
ITEM	2,09	SUMINISTRO DE TEJA TERMOACUSTICA TIPO SANDWICH DE 30 MM	CANTIDAD:	374,85

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							M2	



Handwritten signature

CORREDOR ES	11,90	1,00	1,00			31,50	M2	374,85
Aproxima Resultado a :						Decimales	TOTAL	374,85




MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
ITEM	2,10	INSTALACION DE TEJAS TERMO ACUSTICA	UNIDAD: M2
			CANTIDAD: 270,50

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							M2	
CORREDOR ES	11,90	1,00	1,00			22,73	M2	270,50
Aproxima Resultado a :						Decimales	TOTAL	270,50



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
ITEM	2,11	INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA	UNIDAD: ML
			CANTIDAD: 550,00

AREA O LUGAR	DIMENSI	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD				
SUMINISTRO TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100x100x3mm	113,00		18,83	ML	113,00
SUMINISTRO TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 120x50x3mm	65,00		10,83	ML	65,00
SUMINISTRO TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100x50x3mm	101,00		16,83	ML	101,00
SUMINISTRO DE CORREAS PERFIL ESTRUCTURAL TIPO C 100 X 50 X 2 MM	271,00		45,17	ML	271,00
			91,67	ML	550,00
Aproxima Resultado a :		Decimales		TOTAL	550,00

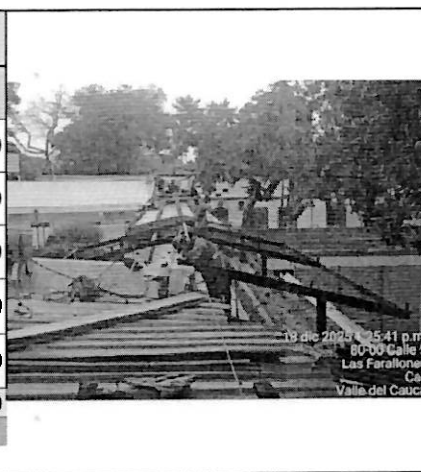

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
ITEM	2,12	SUMINISTRO TORNILLERIA TEJA SANDWICH	UNIDAD: UNIDAD
			CANTIDAD: 350,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							UNIDAD	
CORREDOR ES	350,00	1,00	1,00			1,00	UNIDAD	350,00
Aproxima Resultado a :						Decimales	TOTAL	350,00



Handwritten signature

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	2,13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE	UNIDAD:	UNIDAD
		CANTIDAD:	30,22

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
CORREDOR ES	30,22	1,00	1,00			1,00	UNIDAD	30,22
Aproxima Resultado a :				Decimales		TOTAL		30,22



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	3,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS	UNIDAD:	ML
		CANTIDAD:	94,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
CORREDOR ES	94,00	1,00	1,00			1,00	ML	94,00
Aproxima Resultado a :				Decimales		TOTAL		94,00



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	3,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	UNIDAD:	ML
		CANTIDAD:	36,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
CORREDOR ES	36,00	1,00	1,00			1,00	ML	36,00
Aproxima Resultado a :				Decimales		TOTAL		36,00



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	3,05 SUMINISTRO E INSTALACION UNION DE 4"	UNIDAD:	ML
		CANTIDAD:	18,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
CORREDOR ES	18,00	1,00	1,00			1,00	ML	18,00
Aproxima Resultado a :				Decimales		TOTAL		18,00



Handwritten signature or mark.

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	3,06	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA DE 4"	UNIDAD:	ML
			CANTIDAD:	54,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							ML	
CORREDORES	54,00	1,00	1,00			1,00	ML	54,00
					-			
Aproxima Resultado a :					Decimales	TOTAL		54,00



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	3,07	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE DRENAJE FLEXIBLE DE 4"	UNIDAD:	ML
			CANTIDAD:	225,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							ML	
CORREDORES	225,00	1,00	1,00			1,00	ML	225,00
					-			
Aproxima Resultado a :					Decimales	TOTAL		225,00



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	3,08	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA DINTEL BOARD	UNIDAD:	ML
			CANTIDAD:	38,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							ML	
CORREDORES	38,00	1,00	1,00			1,00	ML	38,00
					-			
Aproxima Resultado a :					Decimales	TOTAL		38,00



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	3,09	SUMINISTRO E INSTALACION DINTEL BOARD	UNIDAD:	ML
			CANTIDAD:	38,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							ML	
CORREDORES	38,00	1,00	1,00			1,00	ML	38,00
					-			



Handwritten signature

Aproxima Resultado a :	Decimales	TOTAL	38,00



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	3,10	SUMINISTRO E INSTALACION BUITRONES	UNIDAD:	ML
			CANTIDAD:	15,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							ML	
CORREDOR ES	15,00	1,00	1,00			1,00	ML	15,00
Aproxima Resultado a :		Decimales		TOTAL		15,00		



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	4,01	PROTECCION PLASTICO	UNIDAD:	M2
			CANTIDAD:	300,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							M2	
CORREDOR ES	100,00	3,00	1,00			1,00	M2	300,00
Aproxima Resultado a :		Decimales		TOTAL		300,00		



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	4,03	CARGUE MANUAL DE ESCOMBROS	UNIDAD:	M3
			CANTIDAD:	5,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							M3	
CORREDOR ES	3,00	2,00	0,83			1,00	M3	5,00
Aproxima Resultado a :		Decimales		TOTAL		5,00		



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	4,04	TRANSPORTE CAMION URBANO DE 5 TON	UNIDAD:	VIAJE
			CANTIDAD:	1,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
							VIAJE	
CORREDOR ES	1,00	1,00	1,00			1,00	VIAJE	1,00



Handwritten signature or mark.

					-			
Aproxima Resultado a :					Decimales	TOTAL	1,00	



Seed

[Handwritten signature]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
NIT 900515527	5	VISUALSTOCK SAS	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	VISUALSTOCK	CALLE 3 40-60	CAJAVALLE	3905314	SI			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora			
2025-12	2024-01		E		2026/01/08						

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No	Identificación	Nombre	g	i	n	e	a	p	p	a	t	a	c	p	s	Codig	Días	Codig	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: VISUALSTOCK (27 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)																						
Guadalupe: CALL Dpto: VALLE (1 Afiliados)																						
1	EC 67030125	VELA BENAVIDES X NATHALIA ANDREA														230301	13	EP50002	13	CCF37	13	14-11 13 0.5226 13 SI

Centro de Trabajo: CONSTRUCTORES (26 Afiliados)												
Ciudad: CALI Depto: VALLE (26 Afiliados)												
2	CC	14543184	AGUIRRE ORTEGA X X	23030	5	ESSC1	5	CCF57	5	14-11	5	SI
			ERWIN									
3	CC	11981549	BENAYDES X X	25-14	30	EP501	30	CCF57	30	14-11	30	SI
			RODZCO ZANDRA									
4	CC	14297784	BONILLA MORALES X X	23030	8	ESSC1	8	CCF57	8	14-11	8	SI
			HAROLD ALEXANDER									
5	CC	14542258	CASTILLO X X	23030	5	EP501	5	CCF57	5	14-11	5	SI
			ALBERTO									
6	CC	144830011	CHU ANGLAD X X	21020	8	ESSC1	8	CCF57	8	14-11	8	SI
			ESCARBIA ALCIBES EDUARDO									
7	CC	14377445	DURANGO X X	25-14	30	EP503	30	CCF57	30	14-11	30	SI
			POLANCO RAMIRO AGUILO									
8	CC	113041935	GARCIA TULETA X X	21100	30	ESSC1	30	CCF57	30	14-11	30	SI
			YERFERNON									
9	CC	106483871	NIERTAS X X	23030	5	EP500	5	CCF57	5	14-11	5	SI
			NAVABRO JOHANNA ANDREA									
10	CC	139634557	BARQUEN X X	25-14	30	EP501	30	CCF57	30	14-11	30	SI
			QUINONES DIEGO FERNANDO									
11	CC	1144071209	LOBON RIVAS X X	23020	30	EP501	30	CCF57	30	14-11	30	SI
			MAYURI									
12	CC	1143953312	LOPEZ PICHANA X X	23030	6	EP501	6	CCF57	6	14-11	6	SI
			JORDY FABIAN									
13	CC	14289092	MARIN HERRERA X X	23030	6	EP500	6	CCF57	6	14-11	6	SI
			KRISTIAN HARRY									
14	CC	16751898	MORADON X X	23030	30	ESSC1	30	CCF57	30	14-11	30	SI
			CRISTALES CARLOS ALBERTO									
15	PT	15283346	MUJICA SANCHEZ X		0	ESSC1	28	CCF57	28	14-11	28	SI
			HOMERO DE JESUS									
16	CC	14405487	ORDZCO CARO X	23100	29	EP501	29	CCF57	29	14-11	29	SI
			NELSON									
17	CC	130443500	PECHENE TOVAR X	23030	29	EP501	29	CCF57	29	14-11	29	SI
			ANGEL									
18	CC	151947492	RUIZ VARGAS X	23030	13	ESSC2	13	CCF57	13	14-11	13	SI
			DIEGO FABIAN									
19	CC	1107037807	RUIZ QUINTERO X X	23030	6	ESSC1	6	CCF57	6	14-11	6	SI
			JOHAN ANDRES									
20	CC	143393316	SALAMANCA X X	23100	4	ESSC2	4	CCF57	4	14-11	4	SI
			BOTINA ISMAEL									
21	CC	111025282	VALDERAMA X	23030	28	ESSC1	28	CCF57	28	14-11	28	SI
			MARTINEZ ANGEL ARMANDO									
22	CC	16936618	VALDERAMA X X	23020	30	ESSC1	30	CCF57	30	14-11	30	SI
			HURTADO LEON ARMANDO									
23	CC	16511796	VALENCIA POSEO X X	23100	5	EP504	5	CCF57	5	14-11	5	SI
			PELEY									
24	CC	16497490	VELEZ GUTIERREZ X X	25-14	30	EP501	30	CCF57	30	14-11	30	SI
			JULIO CESAR									
25	CC	14642776	VELEZ MARTINEZ X X	23020	6	EP501	6	CCF57	6	14-11	6	SI
			OSCAR FERNANDO									
26	CC	114736029	VELEZ MADRID X X	23030	6	EP500	6	CCF57	6	14-11	6	SI
			SANTIAGO									
27	CC	13845022	VERONA X X	25-14	6	EP504	6	CCF57	6	14-11	6	SI
			MONTAÑA SANTIAGO									
Total Afiliados (27)												

RESUMEN DE PAGO							VALOR A PAGAR	
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	26	\$3,250,400	\$0	\$0	\$3,250,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$516,400	\$0	\$0	\$516,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$956,800	\$0	\$0	\$956,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$1,215,200	\$0	\$0	\$1,215,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$562,000	\$0	\$0	\$562,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	27	\$1,467,800	\$0	\$0	\$1,467,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)								
COOSALUD EPS	EP5042	900,226,715	3	27	\$866,400	\$0	\$0	\$866,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$9,500	\$0	\$0	\$9,500
EMESANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$32,300	\$0	\$0	\$32,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	9	\$328,700	\$0	\$0	\$328,700
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	4	\$182,400	\$0	\$0	\$182,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	1	\$37,000	\$0	\$0	\$37,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EP5018	805,001,157	2	1	\$11,400	\$0	\$0	\$11,400
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	5	\$188,100	\$0	\$0	\$188,100
SANITAS	EP5005	800,231,440	6	3	\$47,500	\$0	\$0	\$47,500
TOTAL				27	\$6,451,000	\$0	\$0	\$6,451,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900515527	5	VISUALSTOCK SAS	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				
Periodo		Clave		Pago
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Valor
2025-11	2025-12	1999207217	9466293565	55,480,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTE									
NOVEDADES									
EMPLEADO									
No	Identificación	Nombre	Integración	Salud	Planilla	Planilla	Clave	Periodo	Valor
SUCURSAL: VISUALSTOCK (17 Afiliados)									
Centro de Trabajo: CONSTRUCTORES (17 Afiliados)									
Ciudad: CALI Depto: VALLE (17 Afiliados)									
1	CC 14839301	AGREDO JOSE	X	X					
2	CC 1697868	ARIAS MANUEL	X						
3	CC 87513538	BUARAL RODRIGO	X	X					
4	CC 94377445	DURANGO RAMIRO	X						
5	CC 113041935	GARCIA YEFERSON	X						
6	CC 16732549	GOMEZ HECTOR	X	X					
7	CC 1130634557	IBARRIEN DIEGO	X						
8	CC 16645774	LAVEDE LUIS	X						
9	CC 114407209	LOSON MARTURI	X						
10	CC 16733322	MALAYER DILIO	X						
11	CC 94497310	MARTINEZ JHON	X	X					
12	CC 16751898	MONIBASON CARLOS	X						
13	CC 14836674	OSIA YONNY	X	X					
14	CC 16667523	PECHENE HECTOR	X						
15	CC 16838875	SANCHEZ WILFREDO	X						
16	CC 16936618	VALDERAMA LENIN	X						
17	CC 16313655	VALENCIA CARLOS	X	X					
Total Afiliados(17)									

RESUMEN DE PAGO							VALOR A PAGAR
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	
				16	\$2,825,000	\$0	\$0
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)	231001	800,227,940	6	4	\$767,000	\$0	\$767,000
COLFONDOS	25-14	900,336,004	7	4	\$799,400	\$0	\$799,400
COLPENSIONES	230301	800,224,808	8	5	\$615,200	\$0	\$615,200
POIVENIR	230201	800,229,739	0	3	\$683,400	\$0	\$683,400
PROTECCION				17	\$1,328,300	\$0	\$1,328,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-11	890,903,790	5	17	\$1,328,300	\$0	\$1,328,300
ARL SURA				17	\$763,800	\$0	\$763,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF37	890,303,208	5	17	\$763,800	\$0	\$763,800
CONFANDI				17	\$763,800	\$0	\$763,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				1	\$57,000	\$0	\$57,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$0	\$57,000
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	\$85,500	\$0	\$85,500
ENSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	\$305,900	\$0	\$305,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$57,000	\$0	\$57,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$19,000	\$0	\$19,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$57,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$85,500	\$0	\$85,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$77,900	\$0	\$77,900
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$19,000	\$0	\$19,000
TOTAL				17	\$5,680,900	\$0	\$5,680,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900515527	5	VISUALSTOCK SAS	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES		VISUALSTOCK	CALLE 3 40-50	CALI-VALLE	3905514	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-12	1999121834	94632542	E		2025/12/05	2025/12/11	BANCOLOMBIA	\$4,093,700
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO		NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF	
No	Identificación	Nombre	In re	ta	ta	ta	ta	ta	ta
SUCURSAL - VISUALSTOCK (15 Afiliados)									
Centro de Trabajo: CONSTRUCTORES (15 Afiliados)									
Ciudad: CALI Depto: VALLE (15 Afiliados)									
1	CC 1210971093	ARNACHE INCO GERLEN JOSE	X						
2	CC 31981549	BERNABE DROZCO ZANDRA							
3	CC 9636189	BOLIVAR LEJUS CARLOS JULIO							
4	CC 7179510	CARDENAS ROBERTO YIMER	X						
5	CC 1017239363	CUADRADO MUÑOZ BRION	X						
6	CC 79621882	DEDEGO ARIAGA FABIO	X						
7	CC 12627793	EGUIS PEREZ CARLOS ALBERTO	X						
8	CC 1002323464	GOMEZ HENANDEZ CRISTIAN JAVID	X						
9	CC 1019784343	HENAO NORALES ERICSON DAVID	X						
10	CC 1019932709	HUIBADO PEREZ STEPHANIE	X						
11	CC 1080099353	MIRANDA CARO HERNADES ANTONIO							
12	CC 79217056	RIVERO RINCON ELESANDER							
13	CC 80426802	SANCHEZ VASQUEZ LUIS FELIPE							
14	CC 71986035	SOTELINO FERNANDO							
15	CC 16497490	VELEZ GUTIERREZ JULIO CESAR							
Total		Afiliados(15)							

RESUMEN DE PAGO							SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA		
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	\$2,081,000	\$8,000	\$0	\$2,089,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$683,400	\$2,600	\$0	\$686,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$1,078,600	\$4,100	\$0	\$1,082,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$319,000	\$1,300	\$0	\$320,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$928,800	\$3,600	\$0	\$932,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$928,800	\$3,600	\$0	\$932,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$533,900	\$2,100	\$0	\$536,000
COMPANDI	CCF57	890,303,208	5	15	\$533,900	\$2,100	\$0	\$536,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	\$533,900	\$2,400	\$0	\$536,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$159,600	\$700	\$0	\$160,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$127,300	\$500	\$0	\$127,800
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$36,100	\$200	\$0	\$36,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$140,600	\$600	\$0	\$141,200
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$13,300	\$100	\$0	\$13,400
TOTAL				15	\$4,077,600	\$16,100	\$0	\$4,093,700

CONTRATO GJ-034-2025
REPOSICIÓN DE CUBIERTA Y SISTEMA PLUVIAL EN ÁREA
COMEDOR PASILLO

INFORME DE OBRA

El desarrollo de las actividades de obra se llevó a cabo conforme a la disponibilidad de técnica del lugar, dado que en el primer mes se presentaron lluvias frecuentes imposibilitando la ejecución de las actividades contratadas.





Para el inicio de las actividades se realizó el registro previo de las condiciones en las cuales recibíamos las áreas de intervención.






Las actividades de obra contratadas para este contrato fueron:


1,00	OBRAS PRELIMINARES
1,01	PROTECCION CERRAMIENTO BOARD DE 6 MM
1,02	CINTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA
1,03	MODULO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS
1,04	DESMONTE DE CUBIERTAS DE FIBRO-CEENTO
1,05	DESMONTE DE CABALLETES
1,06	DESMONTE DE LIMATESAS
1,07	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES
1,08	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE MADERA
1,09	DEMOL DE ANDEN
1,10	EXCAVACIONES DE TIERRA A MANO

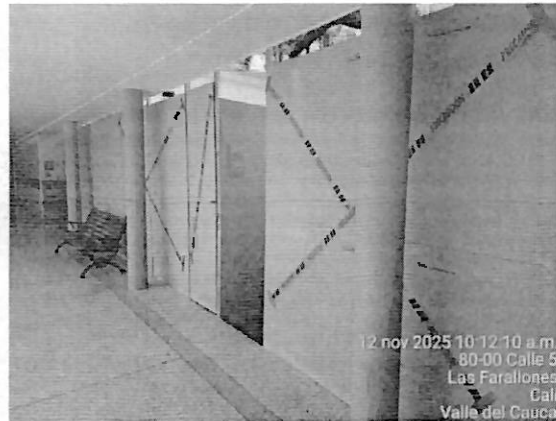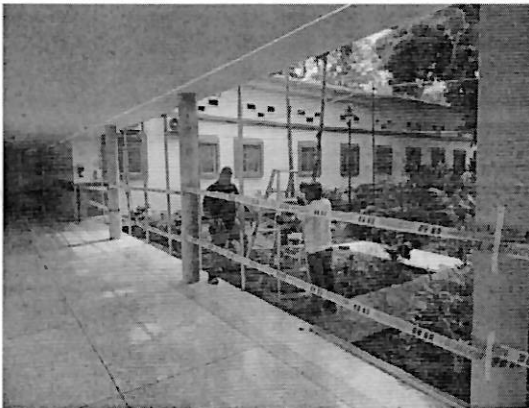

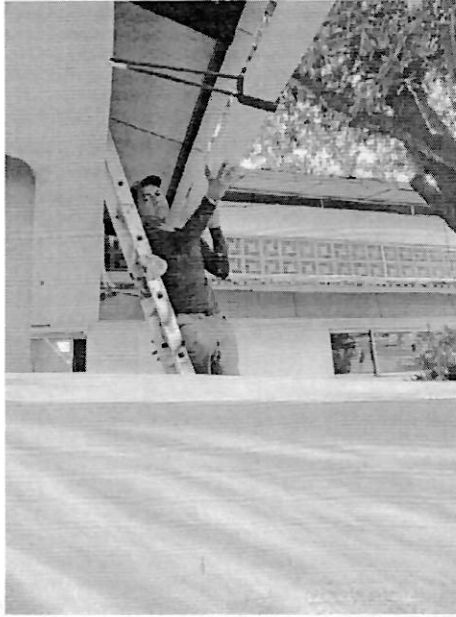

2.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTAS
2.01	SUMINISTRO TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100x100x3mm
2.02	SUMINISTRO TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 120x50x3mm
2.03	SUMINISTRO TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100x50x2mm
2.04	SUMINISTRO TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100x50x3mm
2.05	PLACA BASE 350 MM X 240 MM X 19 MM CON HASTAS 6 ANCLAJES
2.06	SUMINISTRO Y BASEADO DE GROUTING EN PLACABASE


2.07	SUMINISTRO DE CORREAS PERFIL ESTRUCTURAL TIPO C 100 X 50 X 2 MM
2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA CORREAS
2.09	SUMINISTRO DE TEJA TERMOACUSTICA TIPO SANDWICH DE 30 MM
2.10	INSTALACION DE TEJAS TERMO ACUSTICA
2.11	INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA
2.12	SUMINISTRO TORNILLERIA TEJA SANDWICH
2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE
2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE GOTEROS
2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LIMATESA O LIMAHOYA

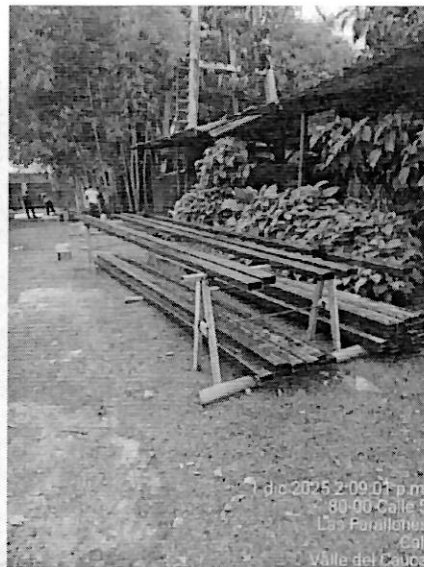



3,00	SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE 25 CM CAL 20
3,02	SUMINISTRO E INSTA SOPORTE CANAL
3,03	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 4"
3,04	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 45 GRADOS CC DE 4"
3,05	SUMINISTRO E INSTALACION UNION DE 4"
3,06	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS DE 4"

3,07	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE DRENAJE FLEXIBLE DE 4"
3,08	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA DINTEL BOARD
3,09	SUMINISTRO E INSTALACION DINTEL BOARD
3,10	SUMINISTRO E INSTALACION BUITRONES

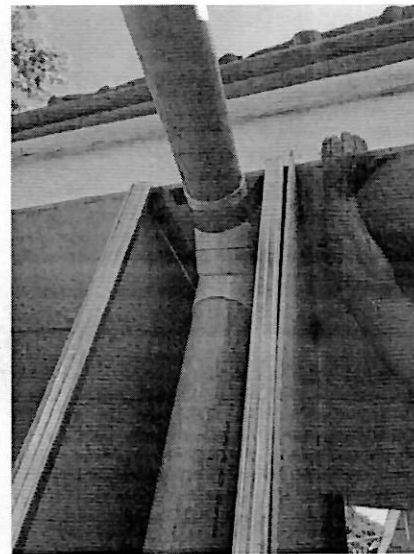

4,00	LIMPIEZA GENERAL Y MANEJO DE ESCOMBROS
4,01	PROTECCION PLASTICO
4,02	LIMPIEZA PERMANENTE
4,03	CARGUE MANUAL DE ESCOMBROS
4,04	TRANSPORTE CAMION URBANO DE 5 TON
4,05	DISPOSICION FINAL DE MATERIAIL SOBRANTE INCLUYE CERTIFICADO
4,06	DISPOSICION FINAL DE TEJA DE FIBRO-CEMENTO



Es de anotar que el desarrollo de las actividades de obra se han llevado acabo sin mayores alteraciones técnicas, considerando que la información planimétrica no es fidedigna y parcial en cuanto a las redes secas y hú

El Grupo de trabajo utilizado durante el periodo de las obras se relaciona a continuación :



VISUAL STOCK SAS	
1	EREIC PEREA
2	ALEXANDER INESTROSA
3	LUIS ALFREDO PAREDES
4	LUIS M PAREDES
5	DIEGO IBARGUEN
6	NELSON OROZCO
7	JEFERSON GARCIA
8	MIGUEL ANGEL PECHENE
9	DIEGO RUIZ
10	CARLOS ALBERTO MONDRAGON
11	LENIN VALDERRAMA
12	HOMERO MOJICA
13	ANGEL VALDERRAMA
14	MARYURI LOBON
15	RAMIRO A DUERANGO

Nota: Todo el personal cuenta con afiliación a seguridad social y ARL riesgo 5
Maryuri Lobon Rivas-Técnico Laboral en Seguridad y Salud en el trabajo
SISO-VISUALSTOCK

1. Accidentalidad: En la semana 02 no se presentaron accidentes de trabajo incapacitantes ni incidentes que dieran suspensión de la obra.
2. Ausentismo: No se generaron incapacidades que dieran suspensión a las actividades en obra.
3. Charlas de seguridad: Se realizaron charlas de seguridad semanales para prevenir y mejorar todo tipo de actitudes, comportamientos y actividades inseguras que puedan dar pie a accidentes o incidentes dentro de la obra. NOTA: se realiza charla de seguridad en base el bueno uso de EPCC por recordaciones del personal de seguridad del hospital.
4. Dotación: Se hizo entrega de dotación personal a todos los trabajadores en obra para evitar incidentes y accidentes de trabajo. Elementos que se entregaron (Casco con barboquejo, guantes, gafas, protección auditiva).
5. Trabajo en equipo: Las actividades que requieren fuerza o realizar algún sobre esfuerzo se hacen de manera conjunta para evitar lesiones y accidentes, se realiza encierro del área a trabajar.


6. Pausas activas: Se realizaron pausas activas al inicio de la obra después de cada charla de seguridad.
7. Actividades de alto riesgo: Se hacen uso de arnés, eslingas
8. , línea de vida y puntos de anclaje que dispone el hospital en sus cubiertas para estas actividades de alto riesgo.

CERRAMIENTO DE AREAS

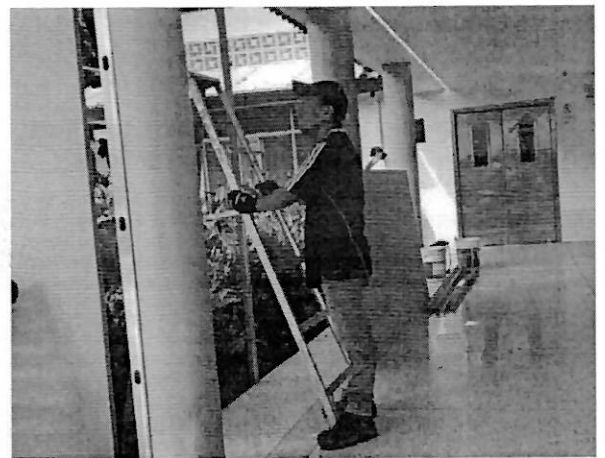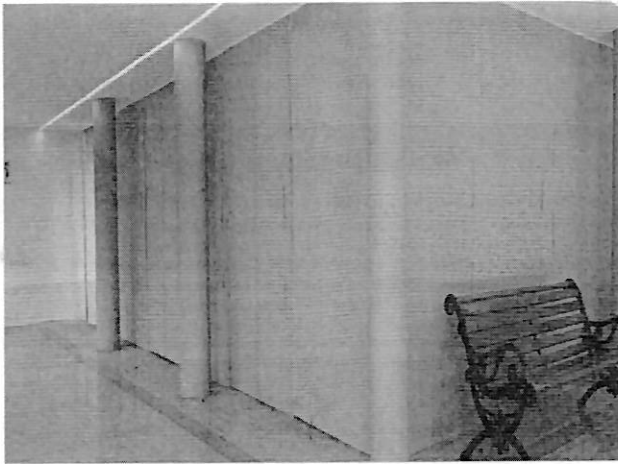

Realización actividades de alto riesgo como trabajo en alturas haciendo uso de todos los EPPCC como lo son casco, guantes, arnés, eslinga, línea de vida y puntos de anclaje de cubierta.

TRABAO EN CUBIERTAS

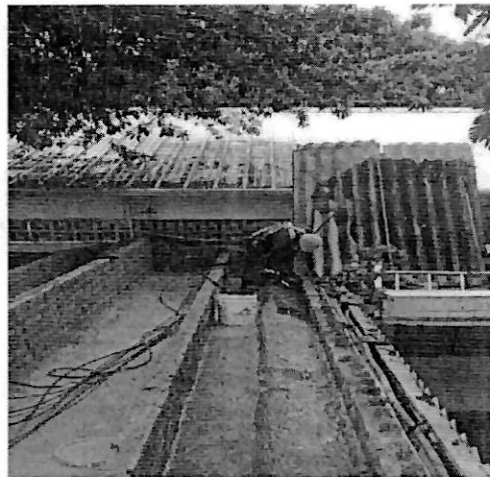

TRABAJO EN PUNTO DE ACOPIO

