

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA (Avance parcial de Obra Contrato de obra 24 de 2025) (Contrato de interventoría 23 de 2025)

OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA I.E. JORGE ELIECER GAITAN, MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO E INTERVENCIÓN DE ZONA VERDE EN LA I.E. JORGE ELIECER GAITÁN DE BUCARAMANGA SANTANDER”.



**PERIODO DE EJECUCIÓN:
17 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA 21 DE ENERO DE 2026**

**CONTRATISTA
WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
NIT 13929695-4
CONTRATO No. 24 de 2025**

**INTERVENTORÍA
ARQ.MAYRA ALEJANDRA CAMARGO BOADA
CC: 1.095.836.429 DE FLORIDABLANCA
CONTRATO No. 23 de 2025**

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

Índice

1. INTRODUCCION.....	3
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.....	4
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:.....	5
CONTRATO DE OBRA No. 24 DE 2025	5
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.....	5
RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA.....	6
CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE OBRA.	7
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA.....	7
ACTIVIDADES TECNICAS:.....	7
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.....	15
ACTIVIDADES FINANCIERAS DEL CONTRATO DE OBRA	15
ACTIVIDADES AMBIENTALES.....	15
ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	16
PRUEBAS Y ENSAYOS.....	16
PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.....	16
RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA.....	16
RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA	17
INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO	18
CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA DE OBRA	18
REUNIONES.....	19
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.....	19
5. ANEXOS	20

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

1. INTRODUCCION

El presente documento contiene el informe de Interventoría correspondiente al periodo comprendido entre el día 17 de Diciembre de 2025 al día 21 de Enero de 2026, la cual es ejercida al contrato de obra No.24 de 2025 suscrito entre la I.E. JORGE ELIECER GAITÁN en representación como rector ALFREDO ORDUZ ARDILA y WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO identificado con NIT 13929695-4, dicho contrato tiene por objeto el “MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA FISICA E LA I.E. JORGE ELIECER GAITÁN, MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO E INTERVENCIÓN DE ZONA VERDE”.

El propósito del informe de interventoría es documentar, verificar y evaluar la correcta ejecución de las actividades desarrolladas por el contratista, conforme a los términos contractuales, especificaciones técnicas y normativa vigente, la interventoría ha realizado el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de garantizar que las obras ejecutadas cumplan con los criterios de calidad, funcionalidad, seguridad y durabilidad establecidos.


Este informe presenta una síntesis de los avances, controles realizados, cumplimiento de obligaciones del contratista y resultados finales del proyecto, evidenciando el estado de ejecución de las obras y su correspondencia con el objeto contractual, en beneficio de la comunidad educativa de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolló en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, que se encuentra ubicada en el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander, en un sector urbano consolidado y dirección Calle 16 N° 9-54. El predio donde se emplaza la institución colinda principalmente con áreas residenciales y equipamientos urbanos, manteniendo una relación directa con la comunidad del sector.

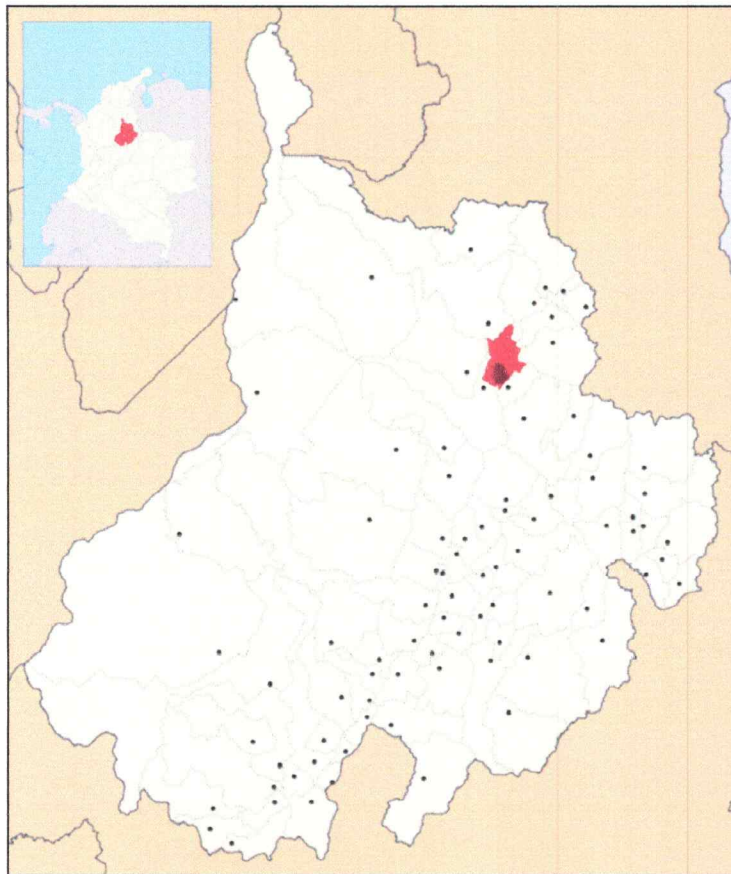

Localización del Municipio de Bucaramanga

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026



Localización de la institución dentro del Municipio de Bucaramanga

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA No. 24 DE 2025

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO NO. Y FECHA:	024 17 DE DICIEMBRE DE 2025.
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN.
NIT:	840.003.930-5
REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ORDUZ ARDILA
IDENTIFICACIÓN	91.247.738
CONTRATISTA	WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
IDENTIFICACIÓN	13.929.695 DE MÁLAGA
OBJETO	“CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA FISICA E LA I.E. JORGE ELIECER GAITÁN, MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO E INTERVENCIÓN DE ZONA VERDE”.
CDP	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 28 del 21 de noviembre de 2025; Código de presupuesto: 2.1.2.02.02.005-19.3 Denominado: SERVICIOS DE LA

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

	CONSTRUCCIÓN (19.3)-MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA. FUENTE: 3 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE (\$160.481.653,00), el cual incluye todos los costos directos e indirectos, incluido el IVA (si aplica).
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y TRES PESOS MCTE (\$4.831.063,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE (\$165.312.716,00), el cual incluye todos los costos directos e indirectos, incluido el IVA (si aplica).
INTERVENTORÍA EXTERNA	MAYRA ALEJANDRA CAMARGO BOADA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.095.836.429 de Floridablanca Santander
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL	CINCO (05) DIAS
PLAZO TOTAL	UN (01) MES Y CINCO (05) DIAS
FECHA DE INICIO	17 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE ENERO DEL 2026

A la fecha de emisión del presente informe, los contratos de obra y de interventoría se encuentran vigentes, con sus garantías actualizadas, en las fechas que comprende el presente informe el contratista ha intervenido las actividades totales contempladas dentro del contrato de obra, de los cual como interventoría se da fe del cumplimiento.

RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACIONES
Acta de inicio	17 de diciembre de 2025	Ninguna
Acta de comité de obra No. 1.	Cinco (05) de enero de 2026	Hallazgos de variación de cantidades e inclusión de nuevos ítems.
Acta de modificación de cantidades No. 1.	Trece (13) de enero de 2026	Modificación de cantidades e inclusión de nuevos ítems. Generando una adición al contrato de obra en valor y tiempo.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE OBRA.

La Interventoría realizó el seguimiento permanente al desarrollo del contrato de obra, se identificando la necesidad de efectuar ajustes frente a las cantidades inicialmente previstas en el Comité de Obra N° 01, que se documentó 5 de enero, más sin embargo, en obra constantemente surgieron reuniones para toma de decisiones en la intervención, con las verificaciones técnicas en campo y las mediciones que se realizaban a diario, se evidenció la existencia de una franja de terreno ubicada entre la cancha y el muro de contención que no se encontraba incluida dentro del alcance contractual inicial, presentando un alto grado de deterioro y constituyéndose en un riesgo para la comunidad educativa. Ante esta situación, previa revisión técnica y validación de nuestra parte como interventoría, se presentó y analizó el balance de mayores y menores cantidades de obra, así como la inclusión de ítems no previstos, derivados de variaciones en las cantidades originalmente contempladas y de las condiciones reales encontradas en sitio durante la ejecución del proyecto, con el fin de garantizar la seguridad, funcionalidad y continuidad de la obra, así como el cumplimiento del objeto contractual.

El balance de mayores y menores cantidades, junto con la inclusión de los ítems adicionales, fue debidamente estructurado, revisado y avalado por la Interventoría, se determina que se puede dar mayor alcance al área intervenido y dejar los elementos y sitios que se intervienen completamente terminados, incluido el jardín con recubrimiento vegetal, es así que del balance se evidencio que se requería de una adición presupuestal, presentando a la entidad la cual aprobó un mayor recurso por el valor disponible con el que contaba, se legalizó el acta de modificación el día 13 de enero, mediante la correspondiente modificación contractual, la cual implicó adición en valor que y ampliación del plazo para la ejecución de las actividades nuevas incluidas, permitiendo dar continuidad a la ejecución de la obra conforme a las condiciones técnicas requeridas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

A continuación, se describen las actividades realizadas por parte del contratista, entre el día 17 de diciembre de 2025 y el día 21 de enero de 2026, periodo de ejecución en el cual se toma evidencia del plazo total otorgado por la entidad, dichas actividades corresponden a:

ACTIVIDADES TECNICAS:

En el periodo de ejecución de la obra, el contratista adelanto las siguientes actividades:

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

Localización y replanteo manual para el proyecto: La interventoría verificó la correcta ejecución de la localización y el replanteo manual del área total intervenida, correspondiente a la reconstrucción de la cancha de concreto, la remodelación de la gradería y escalera existente y la construcción del muro de contención. Se constató el control de niveles, ejes, alineamientos, pendientes y cotas conforme a planos, para un área total de 245,93 m², encontrándose la actividad ejecutada en su totalidad y conforme a lo proyectado.

Demolición de enchapes de pisos y muros, incluye cargue, retiro y disposición final: Se verificó la demolición de los enchapes existentes en pisos y muros, incluyendo el cargue, retiro y disposición final del material en sitios autorizados. El área intervenida fue de 141,0465 m², dejando las superficies en condiciones adecuadas para la ejecución de las actividades posteriores.

Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado): La interventoría evidenció la demolición de pisos, rampas, losas, adoquines y demás acabados mediante compresor diésel y martillo neumático, incluyendo el retiro y disposición final de los residuos. El volumen ejecutado fue de 22.51 m³, cumpliendo con las especificaciones contractuales.

Demolición de escaleras y/o graderías sobre terreno en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final: Se constató la demolición de escaleras y graderías existentes en concreto mediante martillo eléctrico, incluyendo cargue y disposición final de los residuos. El volumen ejecutado fue de 3,67 m³, dejando el área en condiciones aptas para la nueva obra.

Corte y demolición de muros en mampostería e=20 cm, con acabado, incluye andamios cargue, retiro y disposición final: La interventoría verificó el corte y demolición de muros de mampostería de 20 cm de espesor, con sus respectivos acabados, incluyendo uso de andamios, cargue, retiro y disposición final. El área demolida fue de 26,625 m².

Corte y demolición de muros en mampostería e=10 cm, con acabado, incluye andamios cargue, retiro y disposición final: Se constató la demolición de muros de mampostería de 10 cm de espesor, con sus acabados, incluyendo andamios, cargue, retiro y disposición final. El área ejecutada fue de 7,28 m².

Excavación manual en material común en seco: La interventoría verificó la excavación manual conforme a planos y cotas, con perfilado y conformación adecuada. El volumen excavado fue de 30,52 m³.

Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador: Se constató el relleno con material seleccionado proveniente de las excavaciones, compactado por capas con apisonador mecánico. El volumen ejecutado fue de 23,82 m³, cumpliendo las especificaciones de densidad y nivelación.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

Carque, retiro y disposición final de escombros y materiales de excavación: Se comprobó el cargue, transporte y disposición final de los residuos de demolición y excavación, para un volumen total de 24 m³, en sitios debidamente autorizados.

Construcción de solado de limpieza en concreto 1500 PSI mezclado en sitio: La interventoría verificó la construcción del solado de limpieza en concreto de 1.500 PSI, correctamente nivelado y terminado, con un volumen de 3,90 m³.

Construcción de concreto ciclópeo 60% concreto 2500 PSI mezclado en sitio y 40% piedra rajón: Se constató la ejecución del concreto ciclópeo compuesto por 60 % concreto de 2.500 PSI y 40 % piedra rajón, con adecuado acomodo y curado. El volumen ejecutado fue de 2,25m³.

Construcción de zarpa de muro en concreto 3000 PSI mezclado en sitio: La interventoría verificó la construcción de la zarpa del muro conforme a planos estructurales, con concreto de 3.000 PSI, para un volumen de 4,53 m³.

Construcción de viga de cimentación en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal de 625 a 1600 cm²: Se constató la ejecución de vigas de cimentación con áreas transversales entre 625 y 1.600 cm² y un volumen de 0,43 m³, cumpliendo especificaciones técnicas.

Construcción de rampa en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado con llana de madera: La interventoría verificó la construcción de la rampa con acabado en llana de madera, pendiente y niveles correctos, para un volumen de 24,68 m³.

Construcción de escalera y/o gradería, sobre terreno, en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado escobillado o cepillado y ratoneado: Se constató la ejecución de escaleras y graderías en concreto de 3.000 PSI, con acabado escobillado y ratoneado. El volumen ejecutado fue de 7,90 m³.

Construcción de muro en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, espesor de 10 a 20 cm, altura máxima 3.00 m: La interventoría verificó la construcción de muros de concreto de 3.000 PSI, con espesores entre 10 y 20 cm y altura máxima de 3,00 m, para un volumen de 4,31 m³.

Construcción de columna en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal hasta 400 cm²: Se constató la ejecución de columnas de concreto de 3.000 PSI con área transversal hasta 400 cm², con un volumen de 0,16 m³.

Construcción de viga aérea en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal de 625 a 1600 cm²: La interventoría verificó la construcción de vigas aéreas de concreto 3.000 PSI, con un volumen ejecutado de 0,08 m³.

Construcción de bordillo recto remate biselado en concreto 3000 PSI mezclado en sitio (10 cm x 40 cm) tipo BRS.011 o similar, incluye soldado y acero de refuerzo: Se constató la ejecución del bordillo recto tipo BRS.011 o similar, con acero de refuerzo y remate biselado, para una longitud de 21,04 m.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

"Suministro y colocación de acero de refuerzo (figurado en sitio y/o armado)":

La interventoría verificó el suministro, figurado, armado y colocación de acero de refuerzo conforme a planos estructurales, para un total de 1690.07kg.

Construcción de muro en mampostería H-10 ladrillo cocido: Se constató la construcción de muros en ladrillo cocido tipo H-10, con un área de 6,11 m².

Aplicación de friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm: La interventoría verificó la aplicación de friso liso con mortero 1:4 impermeabilizado, para un área de 14,84 m².

Aplicación de estuco plástico pared interior y/o exterior: Se constató la aplicación de estuco plástico en superficies interiores y exteriores, para un área de 14,84 m².

Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior pared, sobre estuco, dos manos: La interventoría verificó la aplicación de dos manos de pintura acrílica exterior sobre estuco, para un área de 14,84 m².

Alistado de piso en mortero 1:3 e=6cm con endurecedor superficial Master Top: Se constató el alistado de piso con mortero 1:3, espesor de 6 cm y endurecedor superficial tipo Master Top, para un área de 100,32 m².

Suministro e instalación de barandilla pasamanos doble y apoyos verticales en tubería circular 2 1/2" x 1.9, anclada a piso, acabado en anticorrosivo y pintura epóxica, tipo BRP.003 o similar: La interventoría verificó el suministro e instalación de barandillas con pasamanos doble en tubería circular, con acabado anticorrosivo y pintura epóxica, para una longitud de 47,47 m.

Aseo y limpieza de las áreas del proyecto: Se verificó la limpieza general de las áreas intervenidas, para un área total de 524.85m².

Lavado y desmanche de superficie con hidrolavadora: La interventoría constató el lavado y desmanche de superficies mediante hidrolavadora, dejando el área en condiciones óptimas de entrega, para un área de 342.69 m².

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Salida Tomacorriente GFCI (incluye aparato GFCI tipo intemperie): La Interventoría verificó el suministro e instalación de salidas eléctricas tipo tomacorriente GFCI, aptas para intemperie, se comprobó la correcta instalación, fijación, conexión y funcionamiento. La cantidad ejecutada y verificada corresponde a 2 unidades, las cuales quedaron en correcto funcionamiento y debidamente probadas.

Pintura de arcos metálicos de la cancha (incluye lijado, anticorrosivo y esmalte): La Interventoría realizó la verificación de pintura de los arcos metálicos de la cancha, constatando la correcta ejecución del lijado para la eliminación de óxido, suciedad y recubrimientos deteriorados. Así mismo, se verificó la aplicación de una mano de anticorrosivo y el acabado final con pintura tipo esmalte, garantizando la adecuada

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

protección y durabilidad de los elementos frente a las condiciones ambientales. La cantidad verificada corresponde a 2 unidades.

Instalación de prado japonés (incluye relleno y replanteo del terreno): La Interventoría realizó la verificación del suministro e instalación del prado japonés en las áreas definidas del proyecto, la previa adecuación, relleno, nivelación y replanteo del terreno. El área total ejecutada y verificada corresponde a 52,00 m², cumpliendo con las especificaciones técnicas.

Instalación de malla gallinero 1 1/4" para refuerzo de mortero: La Interventoría realizó la verificación del suministro e instalación de la malla gallinero de 1 1/4 pulgadas como refuerzo para morteros aplicados. Se evidenció el adecuado corte, ajuste, fijación y anclaje de la malla sobre las superficies. El área total ejecutada y verificada corresponde a 53,00 m².

Corte de dilatación con pulidora en placa de concreto/mortero hasta 5 cm: La Interventoría realizó la verificación del corte de juntas de dilatación ejecutado en placas de concreto o mortero mediante el uso de pulidora, conforme a la modulación, alineamientos y distancias establecidas en los planos del proyecto. La longitud total ejecutada y verificada corresponde a 286,699 m lineales.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES N° 1		CANTIDADES EJECTADAS	
			UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT-	VALOR TOTAL ACUMULADO
	1	PRELIMINARES				\$ 3,922,377.00		\$ 866,903.25		\$ 866,903.25
	1.1	MEDICIONES								
1	1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	M2	182.16	\$ 3,525.00	\$ 642,114.00	245.93	\$ 866,903.25	245.93	\$ 866,903.25
2	1.1.5	Cerramiento en Madera Rolliza y Tela de Polipropileno. Altura 2 m	M	87.32	\$ 37,566.00	\$ 3,280,263.00	0.00	\$ 0.00	0.00	
	1.3	DEMOLICIONES				\$ 7,891,951.00		\$ 12,392,091.44		\$ 12,392,091.44
3	1.3.2	Demolición de enchapes de pisos y muros, incluye cargue, retiro y disposición final	M2	141.05	\$ 23,263.00	\$ 3,281,246.00	141.0465	\$ 3,281,164.73	141.0465	\$ 3,281,164.73
4	1.3.11	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	M3	7	\$ 294,018.00	\$ 2,058,126.00	22.51	\$ 6,618,345.18	22.51	\$ 6,618,345.18
5	1.3.14	Demolición de escaleras y/o graderías sobre terreno en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	3.67	\$ 253,952.00	\$ 932,004.00	3.67	\$ 932,003.84	3.67	\$ 932,003.84
6	1.3.32	Corte y demolición de muros en mampostería e=20 cm, con acabado, incluye andamios cargue, retiro y disposición final	M2	27.82	\$ 50,207.00	\$ 1,396,759.00	26.63	\$ 1,336,761.38	26.625	\$ 1,336,761.38
7	1.3.52	Corte y demolición de muros en mampostería e=10 cm, con acabado, incluye andamios cargue, retiro y disposición final	M2	7.28	\$ 30,744.00	\$ 223,816.00	7.28	\$ 223,816.32	7.28	\$ 223,816.32
	1.4	EXCAVACIONES				\$ 2,177,870.00		\$ 1,725,361.19		\$ 1,725,361.19
8	1.4.5	Excavación manual en material común en seco	M3	38.53	\$ 56,524.00	\$ 2,177,870.00	30.52	\$ 1,725,361.19	30.52	\$ 1,725,361.19
	1.5	RELLENOS				\$ 2,006,136.00		\$ 2,105,834.43		\$ 2,105,834.43
9	1.5.8	Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador	M3	22.69	\$ 88,415.00	\$ 2,006,136.00	23.82	\$ 2,105,834.43	23.82	\$ 2,105,834.43
	1.6	CAMPAMENTOS Y CERRAMIENTOS DE OBRA				\$ 3,551,871.00		\$ 0.00		\$ 0.00
10	1.6.1	Suministro, instalación y desmonte de campamento de 18 m2	UND	1	\$ 3,551,871.00	\$ 3,551,871.00	0.00	\$ 1,748,616.00	0.00	\$ 1,748,616.00
	1.7	ACARREO DE MATERIAL				\$ 1,154,087.00				
11	ACA.001	Cargue, retiro y disposición final de escombros y materiales de obra	M3	15.84	\$ 72,859.00	\$ 1,154,087.00	24.00	\$ 1,748,616.00	24.00	\$ 1,748,616.00
	2	CONCRETOS				\$ 24,962,067.00		\$ 10,609,725.31		\$ 10,609,725.31
	2.1	CIMENTACION								
12	2.1.1	Construcción de solado de limpieza en concreto 1500 PSI mezclado en sitio	M3	3.19	\$ 847,715.00	\$ 2,704,211.00	3.90	\$ 3,305,537.49	3.90	\$ 3,305,537.49
13	2.1.2	Construcción de concreto ciclópeo 60% concreto 2500 PSI mezclado en sitio y 40% piedra rajón	M3	4.67	\$ 706,743.00	\$ 3,300,490.00	2.25	\$ 1,586,991.41	2.25	\$ 1,586,991.41
14	2.1.4	Construcción de zarpa de muro en concreto 3000 PSI mezclado en sitio	M3	12.58	\$ 1,150,052.00	\$ 14,467,654.00	4.53	\$ 5,213,415.73	4.53	\$ 5,213,415.73
15	2.1.6	Construcción de viga de cimentación en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal de 625 a 1600 cm2	M3	3.85	\$ 1,166,159.00	\$ 4,489,712.00	0.43	\$ 503,780.69	0.43	\$ 503,780.69
	2.2	PLACA DE PISO				\$ 15,571,225.00		\$ 39,135,261.61		\$ 39,135,261.61
16	2.2.6	Construcción de rampa en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado con llana de madera	M3	3.24	\$ 1,168,606.00	\$ 3,786,283.00	24.68	\$ 28,842,992.23	24.68	\$ 28,842,992.23

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

17	2.2.28	Construcción de escalera y/o gradería sobre terreno, en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado escobillado o cepillado y ratonado.	M3	9.04	\$ 1,303,644.00	\$ 11,784,942.00	7.90	\$ 10,292,269.38	\$ 10,292,269.38
	2.3	COLUMNAS Y MUROS				\$ 11,390,129.00		\$ 5,881,354.58	\$ 5,881,354.58
18	2.3.4	Construcción de muro en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, espesor de 10 a 20 cm, altura máxima 3.00 m	M3	8.51	\$ 1,312,238.00	\$ 11,167,145.00	4.31	\$ 5,658,370.26	\$ 5,658,370.26
19	2.3.13	Construcción de columna en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal hasta 400 cm2	M3	0.16	\$ 1,393,652.00	\$ 222,984.00	0.16	\$ 222,984.32	\$ 222,984.32
	2.4	VIGAS Y PLACAS AERÉAS				\$ 107,202.00		\$ 107,201.52	\$ 107,201.52
20	2.4.3	Construcción de viga aérea en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal de 625 a 1600 cm2	M3	0.08	\$ 1,340,019.00	\$ 107,202.00	0.08	\$ 107,201.52	\$ 107,201.52
	2.5	BORDILLOS Y SARDINELES				\$ 138,708.00		\$ 2,372,701.84	\$ 2,372,701.84
21	2.5.11	Construcción de bordillo recto remate biselado en concreto 3000 PSI mezclado en sitio (10 cm x 40 cm) tipo BRS.011 o similar, incluye soldado y acero de refuerzo	M	1.23	\$ 112,771.00	\$ 138,708.00	21.04	\$ 2,372,701.84	\$ 2,372,701.84
	3	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							
	3.1	ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS				\$ 22,566,323.00		\$ 17,335,064.40	\$ 17,335,064.40
22	3.1.1	Suministro y colocación de acero de refuerzo (figurado en sitio y/o	KG	2,200.09	\$ 10,257.00	\$ 22,566,323.00	1690.07	\$ 17,335,064.40	\$ 17,335,064.40
	5	MUROS DIVISORIOS							
	5.1	MAMPOSTERÍA				\$ 760,548.00		\$ 760,548.36	\$ 760,548.36
23	5.1.1	Construcción de muro en mampostería H-10 ladrillo cocido	M2	6.11	\$ 124,476.00	\$ 760,548.00	6.11	\$ 760,548.36	\$ 760,548.36
	16	ACABADOS DE PARED							
	16.1	FRISOS Y ESTUCOS PARED				\$ 817,335.00		\$ 992,573.40	\$ 992,573.40
24	16.1.1	Aplicación de friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm,	M2	12.22	\$ 44,546.00	\$ 544,352.00	14.84	\$ 661,062.64	\$ 661,062.64
25	16.1.6	Aplicación de estuco plástico pared interior y/o exterior	M2	12.22	\$ 22,339.00	\$ 272,983.00	14.84	\$ 331,510.76	\$ 331,510.76
	16.2	PINTURA PARED				\$ 379,455.00		\$ 460,811.68	\$ 460,811.68
26	16.2.4	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior pared, sobre estuco, dos manos	M2	12.22	\$ 31,052.00	\$ 379,455.00	14.84	\$ 460,811.68	\$ 460,811.68
	17	ACABADOS DE PISOS							
	17.1	MORTEROS DE NIVELACIÓN				\$ 20,057,028.00		\$ 14,265,303.36	\$ 14,265,303.36
27	17.1.4	Alistado de piso en mortero 1:3 e=6cm con endurecedor superficial Master Top	M2	141.05	\$ 142,198.00	\$ 20,057,028.00	100.32	\$ 14,265,303.36	\$ 14,265,303.36
	19	BARRAS, BARANDAS Y PASAMANOS							
	19.2	BARANDAS Y PASAMANOS				\$ 39,798,373.00		\$ 39,798,373.30	\$ 39,798,373.30
28	19.2.3	Suministro e instalación de barandilla pasamanos doble y apoyos verticales en tubería circular 2 1/2" x 1.9, anclada a piso, acabado en anticorrosivo y pintura epóxica, tipo BRP.003 o similar	M	47.47	\$ 838,390.00	\$ 39,798,373.00	47.47	\$ 39,798,373.30	\$ 39,798,373.30
	29	ASEO Y LIMPIEZA				\$ 3,228,968.00		\$ 7,369,204.96	\$ 7,369,204.96
29	29.1.1	Aseo y limpieza de las áreas del proyecto	M2	182.16	\$ 7,107.00	\$ 1,294,611.00	524.85	\$ 3,730,137.38	\$ 3,730,137.38
30	29.1.3	Lavado y desmanche de superficie con hidrolavadora	M2	182.16	\$ 10,619.00	\$ 1,934,357.00	342.69	\$ 3,639,067.59	\$ 3,639,067.59
	30	ADICIONALES O NO PREVISTOS						\$ 7,385,785.22	\$ 7,385,785.22

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

31	30.1	Salida Tomacorriente GFCI (incluye aparato GFCI tipo Intemperie)	UND		\$ 327,403.86		2.00	\$ 654,807.72	2.00	\$ 654,807.72
32	30.2	Pintura arcos metálicos cancha, incluye lijado, anticorrosivo y esmalte.	UND		\$ 1,144,000.00		2.00	\$ 2,288,000.00	2.00	\$ 2,288,000.00
33	30.3	Instalación de prado japones (incluye relleno y replanteo del terreno)	M2		\$ 42,900.00		52.00	\$ 2,230,800.00	52.00	\$ 2,230,800.00
34	30.4	Instalación Malla Gallinero 1 1/4Pulgadas para refuerzo mortero	M2		\$ 6,578.00		53.00	\$ 348,634.00	53.00	\$ 348,634.00
35	30.5	Corte dilatación con pulidora en placa en concreto/mortero hasta 5 cm	ML		\$ 6,500.00		286.70	\$ 1,863,543.50	286.699	\$ 1,863,543.50
		SUBTOTAL OBRA (Redondeado al peso)				\$ 160,481,653.00		\$ 165,312,716.00		\$ 165,312,716.00

Se toma el cuadro anterior, de la sabana o anexo del acta de balance de obra y del anexo al acta de recibo final, según esto, resultado del seguimiento y cuantificación de las actividades desarrolladas, iniciales y actualizadas, la obra tiene un porcentaje de avance a la fecha del 100%, para un periodo transcurrido de 1 mes y 5 días, que es el 100% igual del plazo finalmente otorgado. Basados en estos datos de ejecución-inversión y tiempo o plazo de ejecución, no se presentó atraso durante la ejecución de la obra, y se tiene un cumplimiento del alcance y objeto del contrato.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

La interventoría realizó la verificación de la seguridad social, riesgos, caja de compensación y demás de ley del personal encontrado en obra y que inició cada una de las actividades contratadas.

Por otra parte, se observó el cumplimiento de parte del contratista de la entrega los elementos de protección personal como cascos, guantes, gafas, protección auditiva y demás necesarios para cada actividad, la interventoría evidencia personal del contratista haciendo entrega de los mismos.

Se mantiene comunicación continua con la institución educativa, entidad contratante, manteniéndolos informados de lo acontecido en la obra, de igual manera consultando constantemente de las vinculaciones laborales a que haya lugar, las condiciones de orden acontecidas, el estado del clima y demás situaciones que se presente que afecten directamente a la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES FINANCIERAS DEL CONTRATO DE OBRA

Para la ejecución del contrato, la entidad no contempló el pago de anticipo, el contratista de obra y la interventoría mantuvieron las nóminas al día, así como el pago de los aportes a seguridad social, hasta la fecha no han realizado cobros.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALORES	VALORES AMORTIZACIONES
Valor Inicial Contrato	\$160.481.653,00	
Valor Adicionado	\$4.831.063,00	
Valor Anticipo	\$0,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$165.312.716,00	
Valor total ejecutado hasta la fecha	\$165.312.716,00	

Por parte del contratista de obra e interventoría, se tuvo especial cuidado en la ejecución de las actividades de cada ítem, procurando no exceder el presupuesto y dar cumplimiento al objeto contractual, se mantiene siempre presente el cumplimiento del objeto dentro de las condiciones de valor y técnicas propias del proyecto.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se tuvo control sobre el manejo de sustancias como combustibles, sobrantes líquidos y disolventes, para no verterlos por cañerías, ductos o cañadas que se pudieran obstruir o contaminar afluentes, de igual manera se clasificaron los residuos como empaques, material retirado de excavaciones, otros derivados de papel, cartón, plástico, vidrio etc., para disponer en el sitio contemplado en el proyecto.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

Se retiraron de la obra los escombros, residuos y sobrantes, asegurando su correcta disposición, o reutilización, las áreas intervenidas y alrededores de la obra se dejaron limpias y libres.

ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Se implementó en la obra de parte del contratista, el SG-SST, se evidencia la realización de charlas diarias, en las cuales se recuerda el correcto uso de los EPP y, manejo de sustancias peligrosa entre otras.

Se tuvo precaución que los materiales allegados y utilizados en la ejecución del contrato fueran de primera calidad, de marcas reconocidas y en óptimas condiciones de uso y de almacenamiento, uno a uno se comprobó fechas de fabricación y de vencimiento para algunos de los productos recibidos, el transporte se realizó en vehículos especializados y con el mayor de los cuidados para que los elementos llegaran sanos para su instalación, en el caso de los cementos y aceros, el almacenamiento de los elementos se realizó bajo cubierta, en el lugar indicado, a fin de no generar un desgaste prematuro o corrosión que interfieran en la calidad de la obra.

PRUEBAS Y ENSAYOS

En el periodo de ejecución de obra, no se realizaron ensayos, se solicita al contratista que, de parte de los proveedores de materiales pétreos, hagan llegar el RUCOM en caso de que cuenten con ellos, o los respectivos documentos o permisos para aprovechamiento, también se solicita los certificados o protocolos de la calidad, cemento y acero que llegue a obra.

PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

Se ha entregado cronograma de trabajo para un tiempo de ejecución de 1 mes, a la fecha del presente informe, se tiene un tiempo transcurrido de 1 mes y 5 días y un avance de obra del 100%, se ha incumplido con el mismo y presenta no se presentó atraso.

RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado por el contratista de obra en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

Ítem	Nombre	Cedula	Ocupación en obra
1	Winston Javier Niño Guerrero	13.929.695	Ingeniero director
2	Karen Rocio Manrique Baez	1.007.536.696	Auxiliar administrativo
3	Yolmer Arley Romero Pimiento	1.057.547.118	Ingeniero residente
4	Monica Paola Florez Duarte	1.096.954.961	Profesional SST o SISO
5	Mauricio Leon Rivero	91.286.044	Maestro de obra
Personal sub contratista de mano de obra			
6	Rafael Reyes	2.1127.08	Ayudante de obra
7	Geovanny Orozco Cervantes	12.495.349	Ayudante de obra
8	Luis Javier Cobos Ferreira	13.537.369	Ayudante de obra
9	Agustín Alvarado Guillen	85.271.926	Ayudante de obra
10	Daniel Cobos Ferreira	1.005.345.455	Ayudante de obra
11	Luis Guevara Hernández	1.123.114.284	Oficial de obra

Como se ve en el cuadro anterior, el contratista suscribió subcontrato de la mano de obra con la empresa ARDIPE CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901.657.721-0, el personal a cargo o empleado por la empresa subcontratista, prácticamente es la mano de obra no calificada como oficial y obreros, el contratista presenta la seguridad social del personal utilizado en la mano de obra, de parte de la interventoría se revisa que en la planilla estén relacionado para lo cual se anexan planillas de seguridad social de los trabajadores utilizados en la obra por parte de ARDIPE CONSTRUCCIONES SAS.

RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Volqueta	1	8 m3 retiro escombros, arribo piedra rajón y arribo área mortero
Camiones mixer con bomba	4	El día de mayor concurrencia arribaron 3 mixer y un camión bomba
Camión tipo turbo	1	6 toneladas
Formaletas varias	50	Metálica para muro, bordillo, gradería, de madera para escaleras, alineadores, parales y cerchas para retranque
Andamios	2	Secciones de 2 metros de altura
Hidrolavadora	1	Ubermann 1800 PSI, 6.5 L/min

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

Equipo soldadura	2	Un equipo tipo soldadura MIG y un equipo de soldadura eléctrica
Herramienta menor	2	Picos y palas, carretas, codales, taladros, sierras, pulidoras varios tamaños

INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el periodo que comprende este informe, se presentaron lluvias, pero no interfirieron en las actividades programadas, el contratista receso las labores desde el 25 de diciembre del 2025 al 5 de enero del 2026 por temporada de fin de año, durante estos días se presentaron dos días de lluvia, pero no afectó ni las obras ya realizadas, tampoco entorpeció las actividades faltantes, también implemento plan de choque para la terminación dentro del plazo, trabajando jornadas extendidas y fines de semana.

CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA DE OBRA

El contratista presenta las pólizas iniciales para ser aprobadas por la entidad, luego con la adición presupuestal y la prórroga del plazo, debe actualizar los montos y las vigencias.

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA de Colombia
Nit: 860.524.654-6

No. DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
400-47-994000111832 Anexo 0	Cumplimiento	17/12/2025	16/05/2026
	Salarios y Prestaciones Sociales	17/12/2025	16/01/2029
400-74-994000028658 Anexo 0	Predios, labores y operaciones	Por el término de duración del contrato.	

Pólizas actualizadas con adición y prórroga del contrato de obra.

No. DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

400-47-994000111832 Anexo 1	Cumplimiento	17/12/2025	22/05/2026
	Salarios y Prestaciones Sociales	17/12/2025	22/01/2029
400-74-994000028658 Anexo 1	Predios, labores y operaciones	Por el término de duración del contrato.	

REUNIONES

Durante el presente periodo se realiza reunión en obra de manera informal cada 8 días, en presencia de contratista, interventoría y en lo posible representante de la entidad contratante, a fin de definir en sitio inconvenientes que se presenten, así como situaciones cotidianas que son impredecibles en la formulación del proyecto.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se proyectó y tramito un acta de modificación de mayores y menores cantidades de obra, mediante la cual se formalizó la adición en valor y la ampliación del plazo contractual, garantizando la adecuada ejecución del proyecto, así como la ampliación clara del alcance, llegando a mejorar mayor área, la continuidad de las actividades y el cumplimiento integral del objeto contractual.
- La obra presento un rendimiento óptimo, el tiempo previsto fue suficiente para la ejecución del contrato, a pesar del receso mencionado por fin de año.
- Se da visto bueno y se aprueba pago de parte de esta interventoría para el cobro del contratista de obra por el valor de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE (\$165.312.716,00), ya que se evidencia y verifica el total del contrato.
- A la fecha del presente informe se finalizaron las actividades contempladas dentro del contrato y se hace entrega formal del mejoramiento de las condiciones de infraestructura física de la institución JORGE ELIECER GAITÁN.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

5. ANEXOS

1. Registro fotográfico
2. Seguridad social contratista entregada a interventoría para revisión
3. Remisiones concreto en obra desde planta de Cemex


MAYRA ALEJANDRA CAMARGO BOADA
Interventoría

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026



Verificacion de correcto Transporte y disposicion de Materiales.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA


Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026



Verificacion de correcto Transporte y disposicion de Materiales.


INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

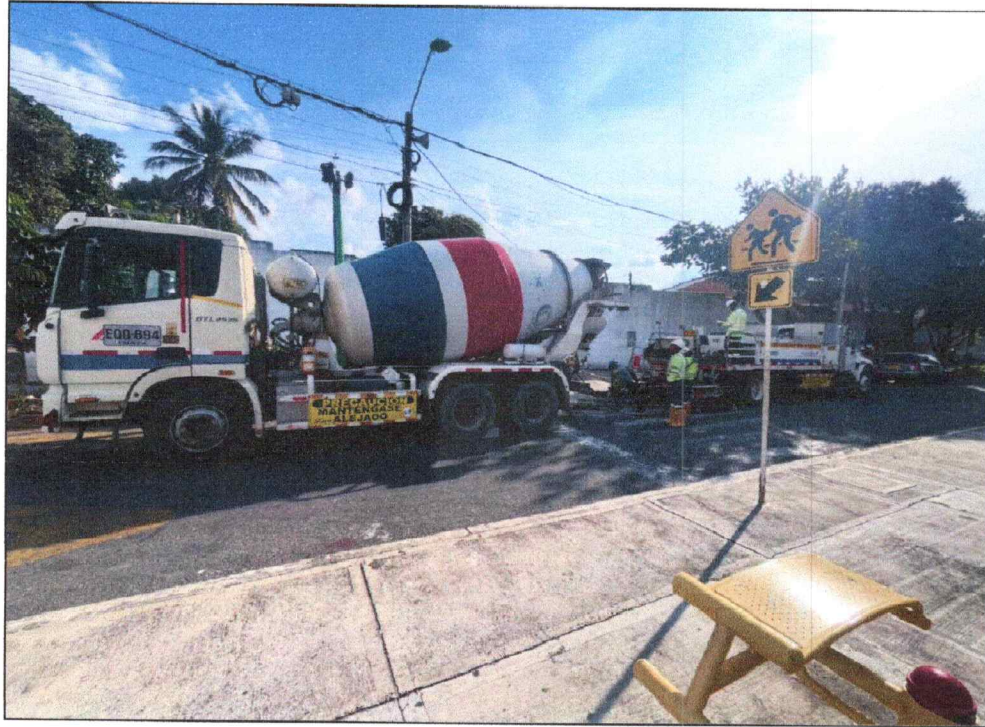

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

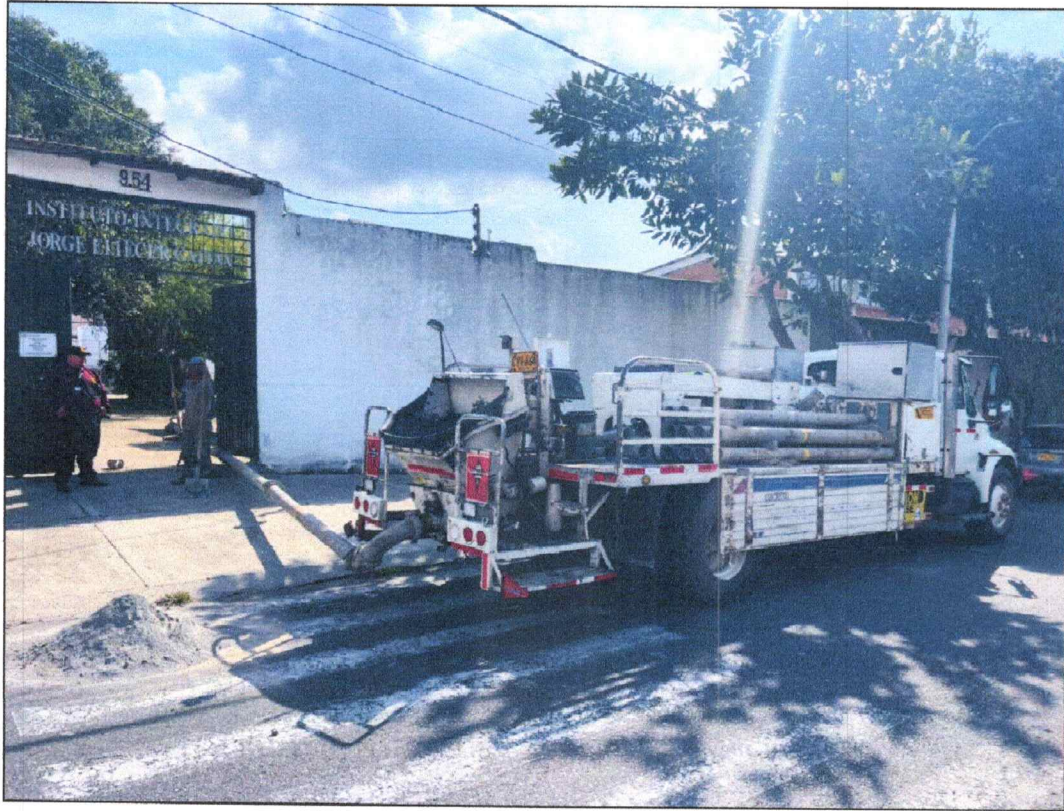


Verificación de correcta ejecución de actividades y verificación de cantidades de obra.



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

Verificación de correcta ejecución de actividades y verificación de cantidades de obra.

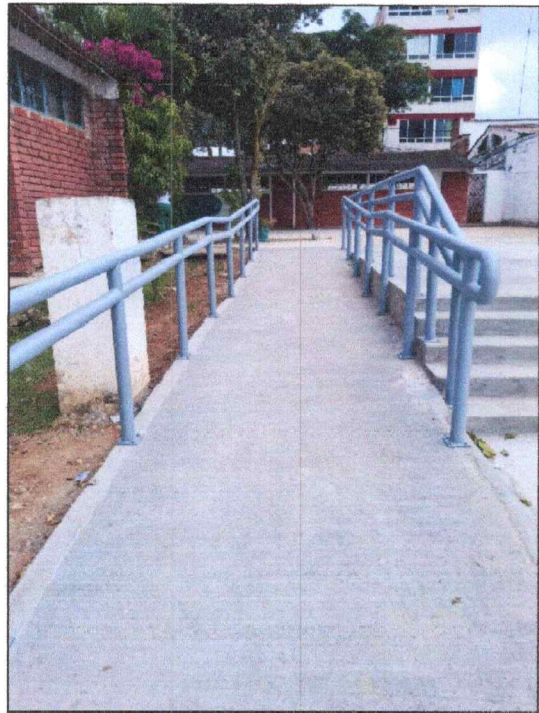

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026



Verificacion de correcta ejecucion de actividades y verificacion de cantidades de obra.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026



Verificación de la correcta implementación de EPP en obra



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026



Verificación de la correcta disposición de materiales sobrantes y escombros

NOTA: El registro fotografico por cada actividad ejecutada de acuerdo al cuadro actualizado de las cantidades de obra, reposa en la memoria de las mismas

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

2. SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA ENTREGADA A INTERVENTORÍA PARA REVISIÓN

DATOS GENERALES DEL APOYANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA														
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: TIPO APOYANTE:					CÉDULA DE CIUDADANÍA: MAYAJAG CALLE: 33-INDEPENDIENTE PRIVADA: FORMA DE IDENTIFICACIÓN: APORTANTE CONVENIENDO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBSF (REFORMA TRIBUTARIA):					NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: DÍAS DE VACACIONES: FECHA TAGO (aaaa/mm/aa):					MAYAJAG PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2024/12/30 NÚMERO AUTORIZACIÓN:					MAYAJAG MAYAJAG MAYAJAG				
ADMINISTRADORA										ADMINISTRADORA														
NOMBRE										NOMBRE														
CÓDIGO										CÓDIGO														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTAL APORTES A PENSIÓN														
EMPLEADOR										EMPLEADOR														
COTIZANTE										COTIZANTE														
COTIZACIÓN										COTIZACIÓN														
NÚM. COTIZANTES										NÚM. COTIZANTES														
1										1														
TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTAL APORTES A PENSIÓN														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A SALUD										TOTAL APORTES A SALUD														
LICENCIA WATERBURY										LICENCIA WATERBURY														
NÚM. COTIZANTES										NÚM. COTIZANTES														
1										1														
TOTAL APORTES A SALUD										TOTAL APORTES A SALUD														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
INCAPACITACIÓN RP										INCAPACITACIÓN RP														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR										VALOR														
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:														
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
VALOR																								

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			E-EMP/EDOS
0000239551	TIPO DE PLANILLA:	MES	2005
19 AÑO:	PERIODO CONTINUACION SALUD:	enero AÑO	200402553095
20250120	NÚMERO AUTORIZACION:		

ADMINISTRADORA			TOTAL APORTEES A SALUD										
CODIGO	NOMBRE	No. CONTANTES	INGAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTAL	
				VALOR AUTORIZACION	MONEDA AUTORIZACION	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADJES	COTIZACION	VALOR ADJES	DESCUENTO	MORA
EPS-005	EPISOD-SANTITAS S.A.	2		50		50			\$ 145.700	50		\$ 145.700	\$ 145.700
MIN-002	MINIO-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		50		50			\$ 26.500	50		\$ 26.500	\$ 26.500
EPS-006	NEUTRO EPS S.A.	1		50		50			\$ 34.500	50		\$ 34.500	\$ 34.500
EPS-007	PSUD-NEUTRO EPS	1		50		50			\$ 376.200	50		\$ 376.200	\$ 376.200
SUB-TOTALES:				50		50				50			

TOTAL APORTE A CABA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
	CÓRPOSO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES
CCF40			COFINACOMF ENAL CO SANT'ANDER	4	MORA \$ 283.490 VALOR PAGADO \$ 299.500
CCF10			COFINACOMF ABOT	1	\$ 188.700 \$ 188.700
SUBTOTALES:					\$ 372.190 \$ 372.190

[illegible]

20260120 12:45 AM USUARIO:SOI CC13929396

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 901667721	0	ARIDE CONSTRUCCIONES S.A.S	B	0	SEGUROS COLOMBIA S.A.	01-14-1	4290	Jurídica	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
68-1		CRA 20 28-71	907/644362		ARIDECONSTRUCCIONES@GMAIL.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO	PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INTERÉS X MORA
2025-12		2025-01	38014700	E	2025-01-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.700
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ENTIDAD RECAUDO						
6	36014700	2025-01-07	BANCOLOMBIA						

EMPLEADO			NOVEDADES										DÍAS			PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA		PARAF		SEVA		ICBF		ESAP		Tide		Eventos de Penalización		Adj. Adic. Económicos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	REF	TOR	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 90166721	0	ARPE CONTRACCIONES S.A.S	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Jurídica	
MUNICIPIO		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
66-1		CRA 20 26-71		6076544362		ARPECONSTRUCCIONES@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA
2025-12	2026-01	39014700	E	2026-01-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	992.300	7.700
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
6	39014700	2026-01-07	Pagada						

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	3.131.700	IBC SALUD	3.226.600
		IBC RIESGOS	3.226.600
		IBC CAJAS	3.226.600
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	501.200	0	3.800	0	505.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	1.700	0	229.500
PORVENIR	230301	800224808	8	4	273.400	0	2.100	0	275.500
EPS(Administradoras: 4)				6	129.200	0	1.200	0	130.400
SANTITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	500	0	57.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	60.800	0	500	0	61.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	7.600	0	100	0	7.700
EPS CAJACOP	CCFC55	901543211	6	1	3.800	0	100	0	3.900
ARP(Administradoras: 1)				6	225.000	0	1.700	0	226.700
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	6	225.000	0	1.700	0	226.700
CCF(Administradoras: 1)				6	129.200	0	1.000	0	130.200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	6	129.200	0	1.000	0	130.200
Gran Total					984.600	0	7.700	0	992.300

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Del 17 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026

3. REMISIONES CONCRETO EN OBRA DESDE PLANTA DE CEMEX




3:40. #02

Planta
F066

FECHA
18/12/2025


No. Despacho
504203058
F0660000093323



PLANTA CONCRETO CEMEX FLORIDABLANCA

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50118202	67195314	DEPOSITO DE MATERIALES SILVA EU	
PEDIDO		DIRECCION OBRA	
8015325559		CL 16 9 54	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
6,000		1-210-2-28-15	
SELLOS	CODIGO	TOTAL PEDIDO	
62239	20017948	17,000	
VEHICULO		ASENTAMIENTO	
CR-1835		15 (6")	
HRC		NOMBRE CONDUCTOR	
14:40:00		FRANKY CASTRO	
OBSERVACIONES		ADICIONALES	
15:2x			
H			
CONCRETO DEVUELTO			
NO		SI	
Nombre y firma del Cliente			
JEFE DE PLANTA			
DESPACHADOR			
RECIBIDO OBRA			

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + 0 - 2,5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + 0 - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o sus(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubilación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.



No. Despacho


504206201

F066000093328

FECHA

18/12/2025

PLANTA CONCRETO CEMEX FLORIDABLANCA



JEFE DE PLANTA

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA




Planta
F066

FECHA
18/12/2025

No. Despacho
504205789
F06600000093330

PLANTA CONCRETO CEMEX FLORIDABLANCA



S: 40 # 3

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50118202	67195314	DEPOSITO DE MATERIALES SILVA EU	
PEDIDO		DIRECCION OBRA	
8015325559		CL 16 9 54	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
5,000		TOTAL PEDIDO	
SELLOS	CODIGO	ASENTAMIENTO	
62216	20017948	15 (6")	
VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR	
CR-2325	35046858	SERGIO FLOREZ	
HRC	HPE	HLLD	ADICIONALES
15:51:00	14:00:00	16.51	
OBSERVACIONES			
//			
CONCRETO DEVUELTO			
NO		SI	
Nombre y firma del Cliente			

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o sus(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

JEFE DE PLANTA

DESPACHADOR


RECIBIDO OBRA



Planta
F066

FECHA
22/12/2025

No. Despacho
504229618
F06600000093502



PLANTA CONCRETO CEMEX FLORIDABLANCA

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50118202	67195314	DEPOSITO DE MATERIALES SILVA EU	
PEDIDO		DIRECCION OBRA	
8015326793		CL 16 9 54	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
6,000		1-210-2-28-15	
SELLOS	CODIGO	TOTAL PEDIDO	
60748	20017948	17.000	
VEHICULO	COD. CONDUCTOR	ASENTAMIENTO	
CR-1521	1351242	15 (6")	
HRC	HPE	NOMBRE CONDUCTOR	
06:52:00	08:00:00	GONZALO CAPACHO	
OBSERVACIONES		ADICIONALES	
0 430			
//			
CONCRETO DEVUELTO			
NO		SI	
		Nombre y firma del Cliente	

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2.5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

JEFE DE PLANTA

DESPACHADOR


RECIBIDO OBRA



Planta
F066

FECHA
22/12/2025

No. Despacho
504229988
F06600000093509



#3 = 11.00

PLANTA CONCRETO CEMEX FLORIDABLANCA

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50118202	67195314	DEPOSITO DE MATERIALES SILVA EU	
PEDIDO		DIRECCION OBRA	
8015326793		CL 16 9 54	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
5,000		TOTAL PEDIDO	
SELLOS	CODIGO	ASENTAMIENTO	
60767	20017948	15 (6")	
VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR	
CR-1542	1418012	JOSE LUIS PINTO	
HRC	HPE	HLLD	ADICIONALES
08:23:00	09:00:00	HLLP	
OBSERVACIONES			
CONCRETO DEVUELTO			
NO		SI	
		Nombre y firma del Cliente	

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2.5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

JEFE DE PLANTA


DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

Planta	F066
--------	------

FECHA	22/12/2025
-------	------------

No. Despacho
504229763
F0660000093507



#02



COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50118202	67195314	COLEGIO JORGE GAITAN	
DEPOSITO DE MATERIALES SILVA EU		DIRECCION OBRA	
PEDIDO		TELEFONO	
8015326793			
M3		TOTAL PEDIDO	
6.000		17.000	
SELLOS	CODIGO	ASENTAMIENTO	
60723	20017948	15 (6")	
VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR	
CR-1535	1403490	JUAN MANUEL FERREIRA	
HRC	HPE	ADICIONALES	
08:00:00	08:30:00		
OBSERVACIONES			
//			
CONCRETO DEVUELTO			
NO		SÍ	
Nombre y firma del Cliente			

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2.5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

JEFE DE PLANTA

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA



COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50118202	67195314	DEPOSITO DE MATERIALES SILVA EU	
PEDIDO		DIRECCION OBRA	
8015329125		CL 16 9 54	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
7,000		TOTAL PEDIDO	
SELLOS	CODIGO	7,000	
52664	20017948	ASENTAMIENTO	
VEHICULO	COD. CONDUCTOR	15 (5)	
CR-1935	1445759	NOMBRE CONDUCTOR	
HRC	HPE	EYNER SMITH SAENZ	
06:18:00	07:00:00	ADICIONALES	
OBSERVACIONES			
//			
CONCRETO DEVUELTO			
NO		SI	
		Nombre y firma del Cliente	

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2.5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

RECIBIDO OBRA
