



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



**ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN**

CONTRATO 883201 DE 2019

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.”

INFORME FINAL

DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCIÓN, E INTERVENTORÍA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELÉCTRICOS.*



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

INTRODUCCIÓN:

La Secretaría de Educación Distrital por medio del concurso DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-014-2019, adjudicó el contrato de interventoría para **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO** a cargo de la SED, a la firma **DACAX I S.A.S**

Con el fin de cumplir con los compromisos contractuales adquiridos por medio del contrato SED 883201, se realiza la presentación del informe final, en donde se relacionan las acciones mensuales realizadas por esta interventoría, como revisiones, análisis, acompañamientos y verificaciones para iniciales al contratista de obra, a fin de dar a la SED para gestionar la aprobación de actividades y actas de costos para el contratista.

Por lo anterior, por medio del presente documento se hace entrega el resumen de las gestiones técnica administrativas, jurídica financiera y ambiental y las verificaciones realizadas a la documentación, visitas y comités realizados para cada uno de los colegios que serán intervenidos de acuerdo con la verificación de las condiciones del sitio, las cuales se desarrollaron en el marco contractual que tuvo inicio para la interventoría el 9 de mayo de 2019 y para el contratista de obra el 28 de mayo de 2019.



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

1. OBRA

1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

1.1.1 INFORME CONTRACTUAL

1.1.2 FICHA TÉCNICA DE LA OBRA

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA	
OBJETO:	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.
CONTRATO DE OBRA No:	881434 DE 2019
VALOR INICIAL:	\$ 862.070.407
CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL-BOGOTÁ D.C
INTERVENTORIA:	DACAX S.A.S Gerencia, construcción e interventoría de proyectos civiles y eléctricos
NIT:	804.010.094-1
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENIERÍA JG
NIT:	900.281.661-8
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	28 DE MAYO DE 2019
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 2019
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	
ACTA DE INICIO:	28 DE MAYO DE 2019
ACTAS DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
ACTAS DE PRORROGA:	N.A.
OTRO SÍ No.1:	19/07/2019
OTRO SÍ No.2:	22/11/2019
OTRO SÍ No.3:	24/01/2020
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE ENERO DE 2020
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 1.291.564.766
ACTAS DE MODIFICACIÓN	
ACTA DE MODIFICACIÓN No 1:	ADICIÓN \$307.977.143 - PRÓRROGA 1 MES
ACTA DE MODIFICACIÓN No 2:	ADICIÓN \$103.744.611 - PRÓRROGA 1 MES
ACTA DE MODIFICACIÓN No 3:	ADICIÓN \$17.772.605
ASPECTOS FINANCIEROS	
CRP:	2596 DEL 28 DE MARZO DE 2019
VALOR ANTICIPO:	N.A.
VALOR FACTURADO:	N.A.
NÚMERO DE ACTAS PRESENTADAS:	
VALOR AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	N.A.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.

1.1.4 ALCANCE

Ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios, con el fin de facilitar las actividades se ha dividido la atención a las plantas físicas de los establecimientos en 10 GRUPOS como aparece en el cuadro que presentamos a continuación:

Dentro de estos grupos encontramos que la supervisión por parte de la interventoría es sobre el grupo 2, el cual se determina de la siguiente manera:

Grupo 2: USAQUÉN Y SUBA.

GRUPO	SEDES	LOCALIDADES
1	2	BOSA - KENNEDY
2	14	USAQUÉN - SUBA
3	8	ENGATIVÁ
4	7	CHAPINERO- BARRIOS UNIDOS- TEUSAQUILLO
5	10	BOSA - KENNEDY
6	13	BOSA -FONTIBÓN – PUENTE ARANDA
7	9	RAFAEL URIBE URIBE-LOS MÁRTIRES-ANTONIO NARIÑO
8	9	SANTAFE-SAN CRISTÓBAL-CANDELARIA
9	8	CIUDAD BOLÍVAR
10	10	USME - TUNJUELITO
TOTAL	90	



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

Las IED intervenidas en este grupo 2. Son:

#	COLEGIO	SEDE
1	COLEGIO JULIO FLOREZ	B
2	COLEGIO JULIO FLOREZ	A
3	COLEGIO GUSTAVO MORALES	A
4	COLEGIO GUSTAVO MORALES	B
5	COLEGIO GERARDO MOLINA	ÚNICA
6	COLEGIO LA GAITANA	B
7	COLEGIO FREDERICK NEUMANN	A
8	COLEGIO FREDERICK NEUMANN	B
9	COLEGIO NUEVO HORIZONTE	C
10	COLEGIO CRISTOBAL COLÓN	A
11	COLEGIO USAQUÉN	ÚNICA
12	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ	ÚNICA
13	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA	A
14	RAMÓN DE ZUBIRÍA	A

1.1.5 LOCALIZACIÓN DE LAS IED A INTERVENIR


LOCALIZACION FRENTE DE OBRA				
#	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	DIRECCION
1	COLEGIO JULIO FLOREZ	B	SUBA	Cra 68b #94-12
2	COLEGIO JULIO FLOREZ	A	SUBA	Calle 102a#70-40
3	COLEGIO GUSTAVO MORALES	A	SUBA	Calle 129 #55-55
4	COLEGIO GUSTAVO MORALES	A	SUBA	Calle 128c#55b-01
5	COLEGIO GERARDO MOLINA	UNICA	SUBA	Cra 143 #142a-62
6	COLEGIO LA GAITANA	B	SUBA	Calle 132d#123b-65
7	COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN	A	USAQUEN	Calle 171b#6b-19
8	COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN	B	USAQUEN	Cra 7#181a-96
9	COLEGIO NUEVO HORIZONTE	C	USAQUEN	Calle 190#04-2
10	COLEGIO CRISTOBAL COLON	A	USAQUEN	Calle 165#8a-03
11	COLEGIO USAQUEN	UNICA	USAQUEN	Calle 127 #9
12	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ	UNICA	USAQUEN	Calle 131b#94f-31
13	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA	A	SUBA	Calle #114-43
14	RAMÓN DE ZUBIRIA	A	SUBA	Dg. 129b Bis #93c57
15	COLEGIO ALFONSO JARAMILLO	UNICA	SUBA	Cra 58 #167
16	COLEGIO PRADO VERANIEGO	UNICA	SUBA	Cra. 46 #65
17	COLEGIO VILLA ELISA SEDE A	A	SUBA	Calle 132c #92a-71
18	COLEGIO VILLA ELISA SEDE D	D	SUBA	Cra 98 #128



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

1.1.6 GRÁFICA RELACIÓN DE COLEGIOS A INTERVENIR.

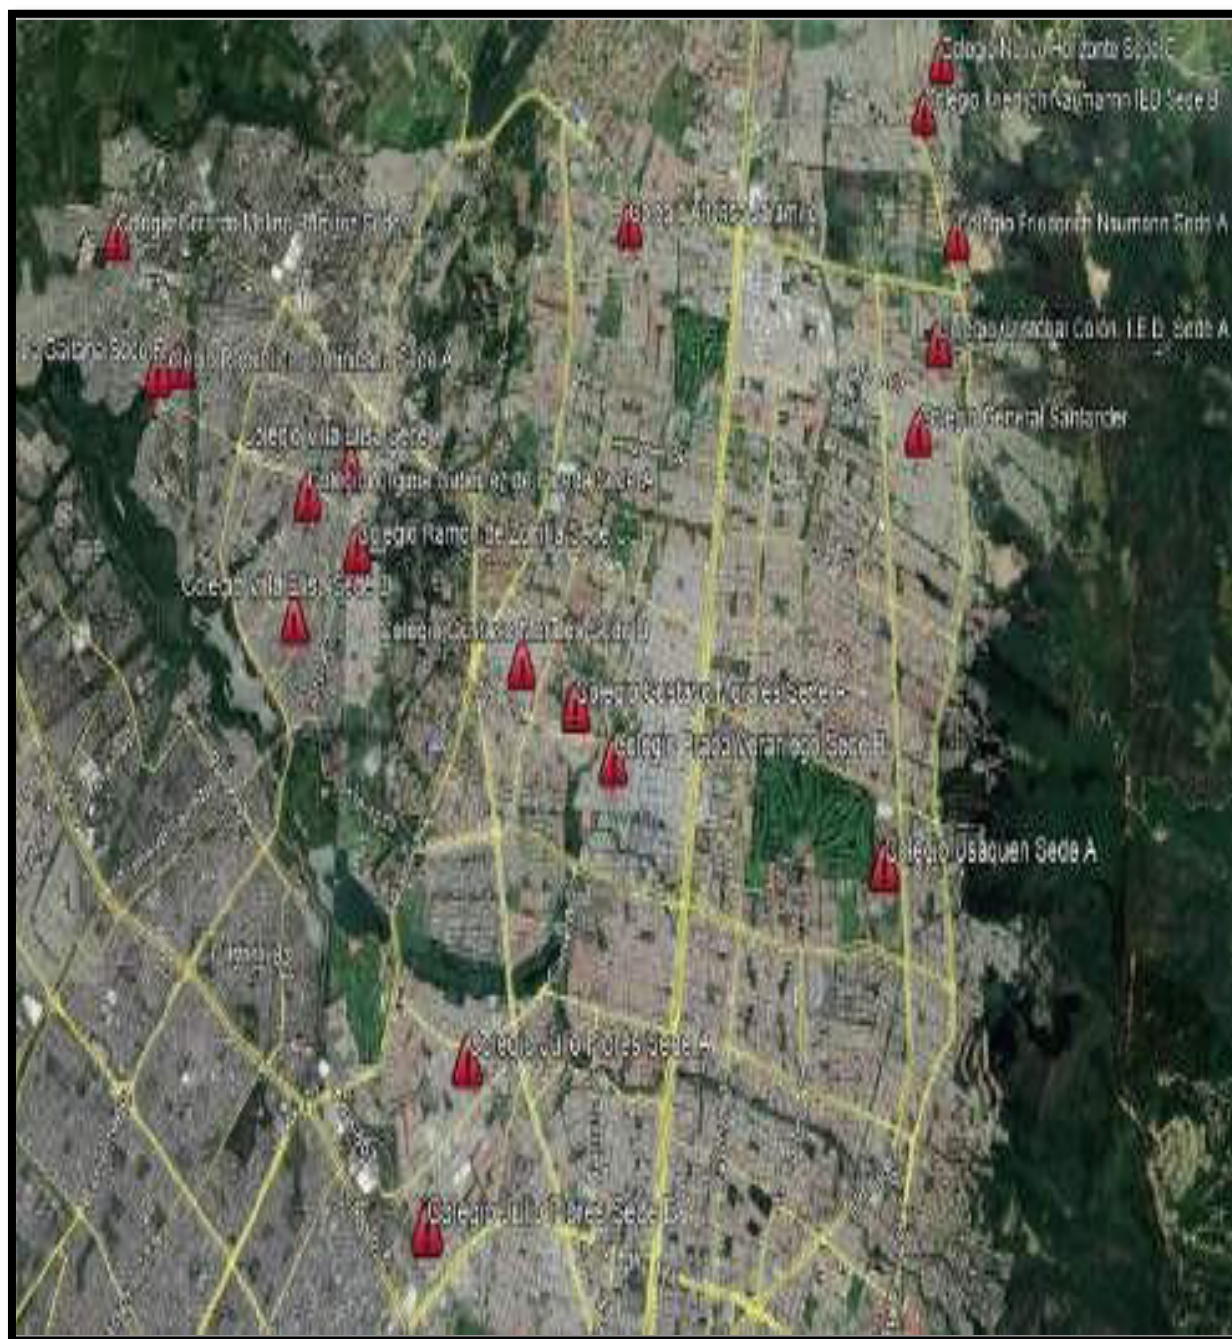



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2.1 ESTADO Y AVANCE DE OBRA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

2.1.1 COLEGIO GUSTAVO MORALES - SEDE A:

Dirección: Calle 129 No 55-55

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Cerramiento perimetral de las áreas intervenidas
- Localización de las áreas de trabajo con herramientas manuales
- Retiro de las cerchas de manera manual
- Retiro del acabado de muro de manera manual
- Retiro de teja en asbesto cemento
- Aplicación de mortero de nivelación impermeabilizado
- Movilización de materiales de ingreso
- Finaliza aplicación de mortero de nivelación impermeabilizado
- Finaliza instalación de media caña perimetral
- Levantamiento de muro en mampostería lateral
- Traslado de bajante ALL 4"
- Instalación de estructura metálica de soporte de cubierta.
- Modificación del sistema de bajante de aguas lluvias.
- Finaliza instalación de estructura metálica de soporte de cubierta
- Instalación de cubierta tipo sandwich
- Finaliza instalación de cubierta
- Inicia instalación de remates
- Finaliza actividades de obra



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la



APLICACIÓN DE MORTERO DE
NIVELACIÓN
IMPERMEABILIZADO



ADECUACIÓN DE MURO
LATERAL



CERRAMIENTO DE ÁREA
AUTORIZADO POR EL
COLEGIO



DESMONTE DE CUBIERTA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACIÓN DE MEDIA
CAÑA
PERIMETRAL



RETIRO DE ESCOMBRO Y CERCHAS
SOBRE PLACA



TRASLADO DE BAJANTE ALL 4"



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA
METÁLICA DE SOPORTE DE
CUBIERTA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



FINALIZACION DE
INSTALACION DE
CUBIERTA



FINALIZA INSTALACION DE
BAJANTE DE ALL



INSTALACION DE FLANCHE



REMATES LATERALES DE
TEJAS TIPO
SANDWICH



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



RETIRO DE ESCOMBROS Y
MATERIAL DE
OBRA



VISTA FRONTAL DE CUBIERTA



VISTA SUPERIOR DE CUBIERTA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2.1.2 COLEGIO RAMÓN DE ZUBIRÍA - SEDE C:

Dirección: Calle 130 D No 88B -49

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Demolición de acabado de piso en área de lavado, pocetas y cárcamos
- Retiro de escombros
- Alistado de superficie en área de lavado
- Perforaciones verticales en cárcamos para adecuar sifones
- Adecuación de puntos de desagüe
- Impermeabilización de tubería sanitaria
- Aplicación puente de adherencia entre placa e impermeabilizante
- Aplicación de impermeabilizante
- Instalación de tubería hidráulica
- Instalación de piso Alfa
- Adecuación de cárcamos.
- Perforaciones verticales en placa para pasos de tubería.
- Fundida de cárcamos y sellos hidráulicos.
- Instalación de tubería, empates y accesorios.
- Finaliza pulida de cárcamos
- Finalización y remate de media caña
- Aseo de áreas
- Relleno y nivelación de zona para instalación de media caña en PVC entre placa y muro.
- Alistado de remate superior entre muro y placa de techo
- Instalación de media caña superior entre muro y techo



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.



DEMOLICIÓN DE BALDOSA



DEMOLICIÓN DE CÁRCAMOS



DEMOLICIÓN DE AFINADO DE
PISO



RETIRO DE ESCOMBRO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



LIMPIEZA DE CÁRCAMO



ADECUACIÓN PUNTO DE
DESAGUE



PERFORACIÓN CON
TALADRO
SACANUCLEO



ADECUACIÓN REGISTRO Y
PUNTO
HIDRÁULICOS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ADECUACIÓN PUNTO DE
DESAGUE



APLICACIÓN PUENTE DE
ADHERENCIA ENTRE PLACA E
IMPERMEABILIZANTE



APLICACIÓN PUENTE DE
ADHERENCIA ENTRE PLACA E
IMPERMEABILIZANTE



APLICACIÓN DE SELLO EN
TUBERÍAS
SANITARIAS




DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



APLICACIÓN DE SELLO EN
TUBERÍAS
HIDRÁULICAS

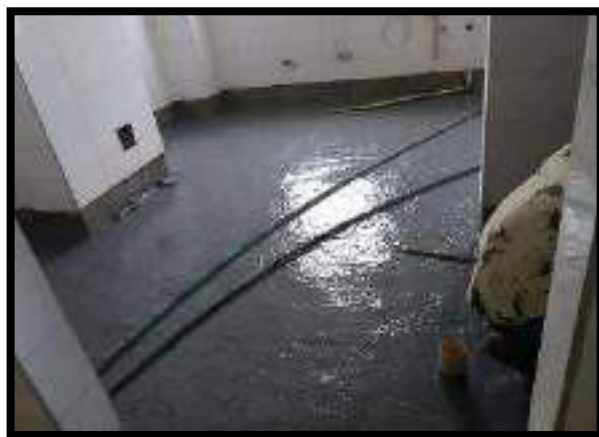

APLICACIÓN DE
IMPERMEABILIZANTE



SELLO DE IMPERMEABILIZANTE



LIMPIEZA DE PLACA
ALIGERADA PARTE
INFERIOR



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



REPOSICION DE RED DE
SUMINISTRO



FUNDIDA DE CARCAMOS Y
SELLOS
HIDRAULICOS



FINALIZACION DE
INSTALACION DE
BALDOSA



ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACION DE REJILLAS
EXISTENTES



ACABADO DE PISO GRANITO Y
MEDIA CAÑA PULIDA



RESANE
E IMPERMEABILIZACION DE
POCETA



FINALIZACION DE ACTIVIDADES
AREA DE LAVADO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



RELLENO Y NIVELACION
PARA INSTALACIÓN DE MEDIA
CAÑA EN PVC



RELLENO Y NIVELACION
PARA INSTALACIÓN DE MEDIA
CAÑA EN PVC



ALISTADO DE REMATE
SUPERIOR DE
MURO




RETOQUE Y ALINEACIÓN DE
PINTURA KORAZA




DACAX S.A.S.


*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

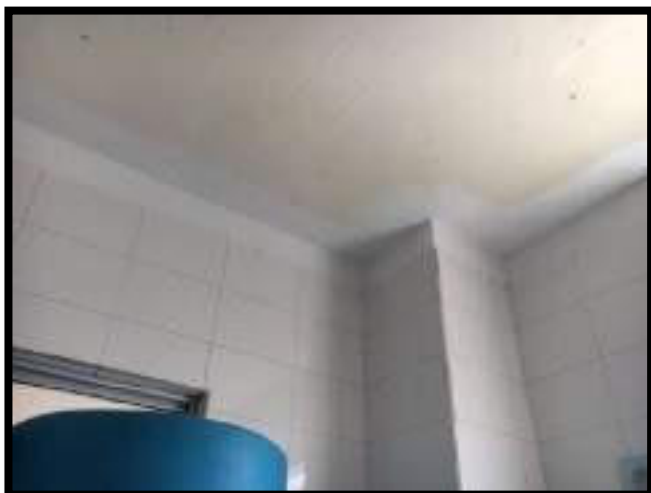

REMATE Y ADECUACIÓN DE
FILOS

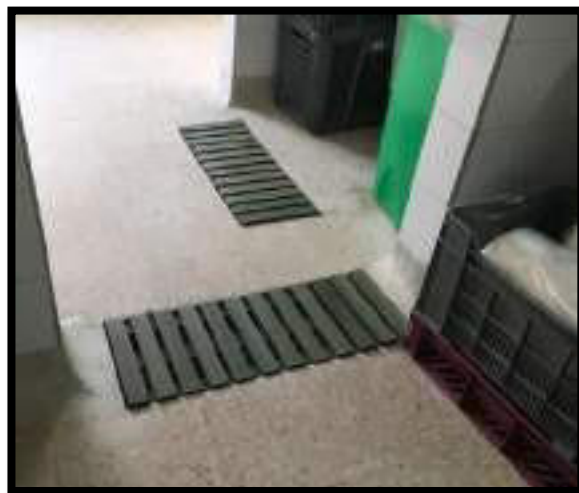

INGRESO DE REJILAS
PLÁSTICAS

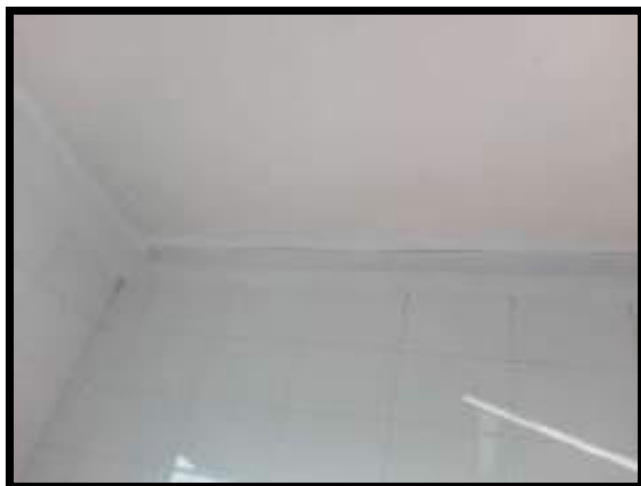

INSTALACIÓN DE MEDIAS
CAÑAS



INSTALACIÓN DE MEDIAS
CAÑAS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2.1.3. COLEGIO LA GAITANA SEDE B:

Dirección: Calle 132 D No 123 B

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Cerramiento perimetral de las áreas intervenidas
- Localización de las áreas de trabajo con herramientas manuales
- Demolición de vigas de amarre de manera manual.
- Retiro del acabado de muro de manera manual
- Movilización de materiales de ingreso y retiro de escombros
- Excavación manual para alcanzar niveles requeridos
- Compactación de cimentación
- Fundición de solado
- Figurar aceros y armado de estos
- Vaciado de viga de amarre
- Desencofrado de vigas de amarre
- Relleno de material recebo seleccionado y compactado
- Adecuación de redes hidrosanitarias
- Retiro de sobrantes y escombros seleccionados de las áreas de trabajo
- Vaciado de placa de contrapiso
- Instalación de platinas
- Levantamiento de muro en Mampostería para confinamiento jardinera



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

- Instalación de alfajía
- Reubicación de plantas
- Retiro de adoquín en concreto y mejoramiento de la base
- Instalación de adoquín en concreto
- Instalación de estructura metálica
- instalación de estructura metálica de soporte de la caseta
- Inicia instalación de muros en SuperBoard del cerramiento de la caseta
- Inicia instalación de enchapes al interior de la caseta
- Instalación de cubiertas tipo sandwich
- Finaliza instalación de enchapes al interior de la caseta
- Finaliza instalación de medias cañas en
- PVC Remates y filos
- Instalación de carpintería metálica
- Finalizan actividades de enchapes
- Instalación de carpintería metálica
- Siembra de plántulas
- Aseo y limpieza
- Instalación de ventana en policarbonato
- Retoque de pintura



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.



EXCAVACIÓN MANUAL



ACOPIO DE MATERIAL DE OBRA



DEMOLICIÓN DE VIGAS DE
AMARRE



TRASEGO DE MATERIAL
ESCOMBRO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



TRASIEGO DE MATERIAL
ESCOMBRO Y



CUBRIMIENTO DE MATERIAL
ESCOMBRO Y



CARGUE MANUAL DE
MATERIAL DE
TIERRA



FUNDICIÓN DE SOLADO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



TRASIEGO DE MATERIAL



ADECUACIÓN DE JARDINERÍA



FIGURADO DE ACEROS PARA
VIGAS DE AMARRE



ENCOFRADO DE VIGAS DE
AMARRE



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



PLATINA DE SOPORTE PARA
COLUMNAS



INSTALACIÓN DE PLATINAS EN
VIGAS DE AMARRE



FUNDICIÓN DE VIGAS DE
AMARRE



DESENCOFRAO DE VIGAS DE
AMARRE



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



COMPACTACIÓN DE MATERIAL
RECEBO



PRUEBAS DE DENSIDADES EN
MATERIAL RECEBO



INSTALACIÓN DE
REDES



PREPARACIÓN DE MEZCLA DE
CONCRETO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



FUNDICIÓN DE PLACA EN
CONCRETO



INSTALACIÓN DE MURO EN
BLOQUE MACIZO



FUNDICIÓN DE COLUMNETAS Y
ALFAJÍA



PAÑETE DE MORTERO
IMPERMEABLE



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



RETIRO DE ADOQUÍN EN
CONCRETO



MEJORAMIENTO DE MATERIAL
BASE ANTES DE SENTAR
ADOQUÍN



EXCAVACIÓN MANUAL
PARA RED
SANITARIA



INSTALACIÓN DE RED
SANITARÍA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



CORTES DE MURO Y PLACA –
INSTALACIÓN DE RED



PAÑETE SOBRE RED
HIDRAULICA



RETIRO DE SOBRANTES



INSTALACION DE
ESTRUCTURA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACION DE SUPERBOARD



INSTALACION DE ENCHAPE
PARED



INSTALACION DE
CUBIERTA TIPO
SANDWICH



PINTURA DE MUROS EN
SUPERBOARD



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*




INSTALACION DE ENCHAFE
PARED



INSTALACION DE CIELO
RASO EN
SUPERBOARD



INSTALACION DE ENCHAFE
MUROS

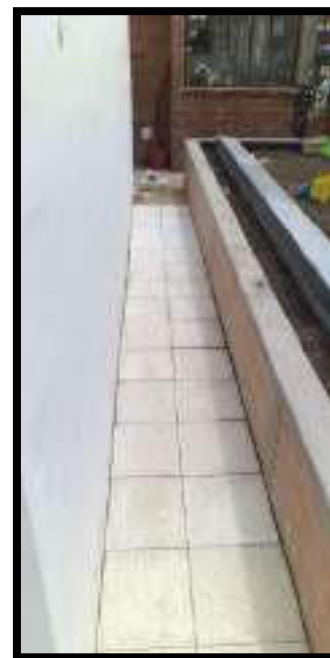

INSTALACION DE
ENCHAFE PISO



DACAX S.A.S.


*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*




REMATE Y FILOS



RESANES GENERALES

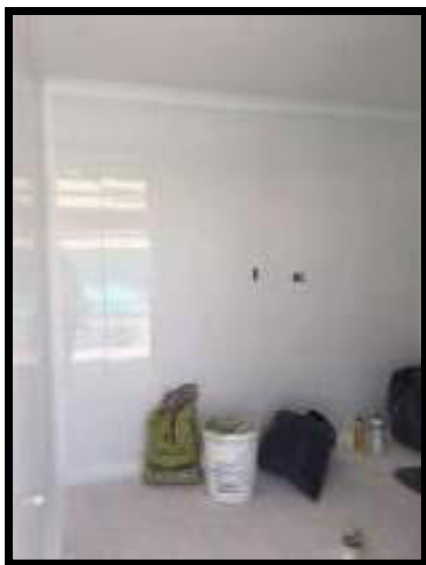

INSTALACION DE MEDIA CAÑAS EN
PVC

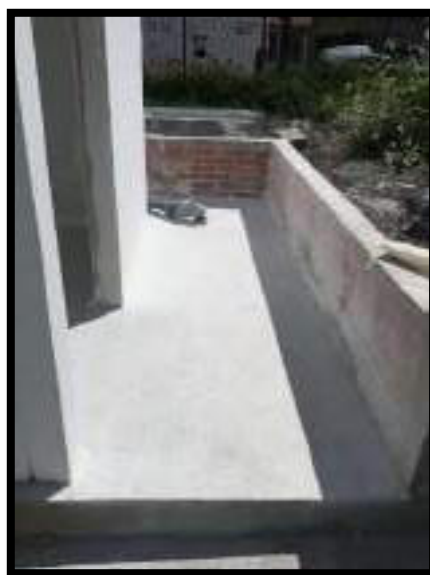


INSTALACION DE BALDOSA
EXTERIOR



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

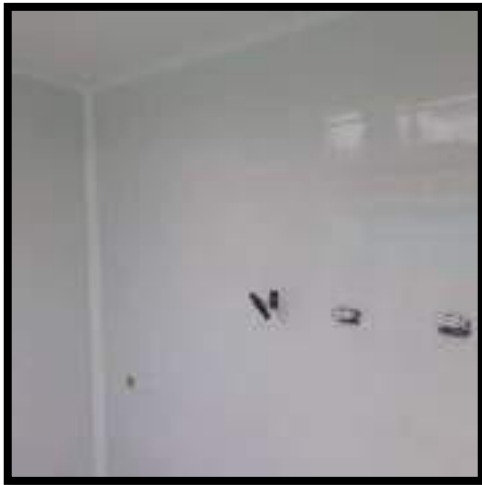


PUNTOS ELÉCTRICOS



FILOS Y REMATES DE VANO
VENTANA



PINTURA Y RESANES
EXTERIORES

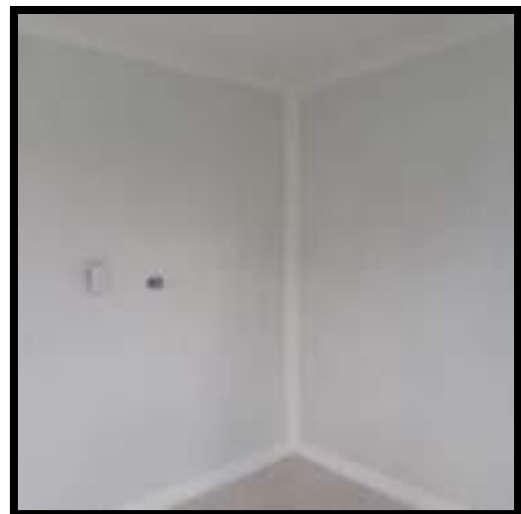

MEDIAS CAÑAS EN PVC



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACION PUERTA- TIENDA
ESCOLAR



INSTALACION DE PUERTA-
CUARTO DE
REFRIGERIOS



MESON METALICO PARA
TIENDA ESCOLAR



REJA PARA CIRCULACION
EXTERIOR



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



REPOSICION DE MEDIAS
CAÑAS



CORTE Y PINTURA DE CANAL



PINTURA DE PUERTA



CORTE Y PINTURA DE PUERTA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



SIEMBRA DE PLÁNTULAS



ASEO Y LIMPIEZA



INSTALACIÓN DE
VENTANA EN
POLICARBONATO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACION DE MANIJA PARA
PUERTA CUARTO DE
REFRIGERIOS



INSTALACION DE MANIJA PARA
PUERTA TIENDA
ESCOLAR



ENTREGA DE OBRA AL COLEGIO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2.1.4. COLEGIO USAQUÉN:

Dirección: Calle 127 No 9ª -03

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Cerramiento perimetral de las áreas intervenidas.
- Localización y replanteo de las áreas de trabajo con herramientas manuales.
- Retiro del acabado de piso de manera manual.
- Movilización de materiales de ingreso y retiro de escombros y material común.
- Excavación manual para alcanzar niveles requeridos para la compactación y cimentación.
- Reposición de material común por recebo seleccionado tipo B400.
- Instalación de malla electro soldada
- Instalación de tubería para conexión de aguas lluvias a caja de paso.
- Vaciado de viga de confinamiento y placa de contrapiso
- Retiro de sobrantes y escombros seleccionados de las áreas de trabajo.
- Fundición de rampas para placa
- Montaje de bordillo para jardinera
- Fundición de Escalón para ingreso a salones
- Retiro de acabado de muro salones
- Pañete y pintura de muro de salones
- Reposición de material común para jardinera
- Finalización de acabado de piso para corredor de salones
- Instalación de media caña para corredor de salones
- Se instala guarda escobas en el área de pasillo aulas



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

- Avanza el retiro de escombros y sobrantes
- Pendiente instalación de bancas en concreto y materas con plantas
- Instalación de materas y soportes en concreto
- Aseo y limpieza
- Extendido de grava

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.



EXCAVACIÓN MANUAL



FIGURADO DE ACERO Y
ENCOFRADO DE
VIGAS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



DEMOLICIÓN DE PISO



CUBRIMIENTO CON PLÁSTICO
SOBRE MATERIAL



RELLENO DE MATERIAL
RECEBO



RELLENO DE MATERIAL
RECEBO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



CERRAMIENTO PROVISIONAL



RELLENO DE MATERIAL
RECEBO



FUNDICIÓN DE PLACA



FUNDICIÓN DE ANDENES



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ACABADO DE ANDENES



ACABADO DE ANDENES



INSTALACION DE MATERAS Y
BANCAS EN
CONCRETO



INSTALACION DE MATERAS Y
BANCAS EN
CONCRETO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*




SIEMBRA DE MATERAS



SIEMBRA DE MATERAS



EXTENDIDO DE GRAVA

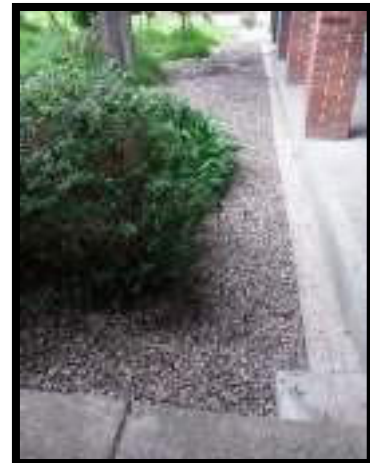

EXTENDIDO DE GRAVA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2.1.5. COLEGIO GERARDO MOLINA:

Dirección: Carrera 143 No 142ª -62

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Se realizará la Demolición de acabado de piso en área de cuartos fríos.
- Retiro de escombros.
- Fundición de placa de cuarto frío.
- Demolición de piso de poceta.
- Demolición de enchape de muro (puntos hidráulicos)
- Perforaciones verticales en cárcamos para adecuar sifones
- Adecuación de puntos de desagüe
- Impermeabilización de tubería sanitaria
- Aplicación de piso FlowFresh
- Aplicación de impermeabilizante en cárcamos, pocetas y áreas de piso a intervenir
- Instalación de tubería hidráulica
- Instalación de piso Alfa
- Adecuación de cárcamos
- Impermeabilización de superficie en área de lavado
- Curado de placas fundidas en cuartos fríos
- Instalación de tubería de la red hidrosanitaria
- Aplicación de acabado de piso en cuartos fríos
- Instalación de tapas en drywall en zona de biblioteca
- Finaliza aplicación de material impermeabilizante en cuartos fríos y zona marmita
- Ajustes y acabado de pisos
- Arreglo de acabado en medias cañas porosas



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

- Aplicación de pintura epóxica en medias cañas para cuartos fríos y zona de marmita
- Instalación de cinta de seguridad 5cm amarilla
- Se arregla punto pendiente que presentaba filtración en cocina
- Finalizan actividades de obra (arreglo de filtración en cocina)

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.



ACOPIO DE MATERIAL DE OBRA



ESTADO ACTUAL DE CÁRCAMO
ANTES DE DEMOLER



ESTADO ACTUAL DE PLACA
CUARTO FRIO



ESTADO ACTUAL DE PLACA
CUARTO FRIO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



DEMOLICIÓN MANUAL DE
BALDOSA CUARTOS
FRIOS



ACOPIO DE MATERIAL
ESCOMBRO



FUNDICIÓN DE PLACA EN CUARTO
FRIO



MUESTRAS DE LA FUNDICIÓN DE
PLACA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



AFINADO DE PLACA



DEMOLICIÓN DE CÁRCAMOS



PERFORACIÓN CON
TALADRO
SACANUCLEOS




IMPERMEABILIZACIÓN DE
CÁRCAMO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

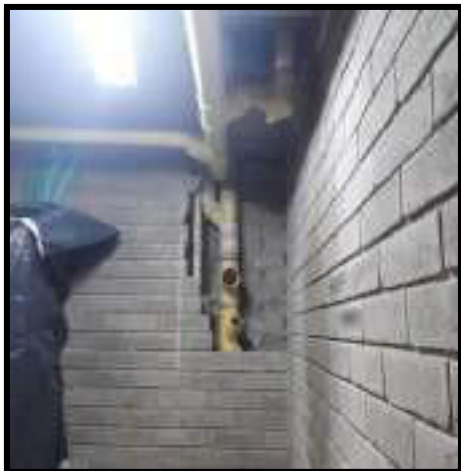

DEMOLICION DE BLOQUE EN
CUARTO ELECTRICO



REPOSICION DE TUBERIA
SANITARIA



CERRAMIENTO BIBLIOTECA



REPOSICION DE TUBERIA
SANITARIA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACION DE BALDOSA Y
CARCAMO



DEMOLICION DE BLOQUE EN
CUARTO ELECTRICO



INSTALACION DE TAPAS EN
DRYWALL



CUARTO FRIO-
IMPERMEABILIZACION



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



IMPERMEABILIZACION CUARTOS
FRIOS



INSTALACION DE PISO
IMPERMEABILIZANTE EN
ZONA DE MARMITA



APLICACIÓN DE MATERIAL
IMPERMEABILIZANTE-ARREGLOS-
CUARTOS FRIOS



APLICACIÓN DE MATERIAL
IMPERMEABILIZANTE- ARREGLOS
ZONA DE MARMITA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



PINTURA PARA TAPAS EN
DRYWALL-



ACABADO FINAL CUARTOS
FRIOS



PINTURA MEDIAS CAÑAS Y
CINTA DE
SEGURIDAD



ARREGLO DE ENCHAPE
DAÑADO- EXTERIOR



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*




TUBERIA NUEVA
HIDROSANITARIA A LA
VISTA-BIBLIOTECA



TUBERIA NUEVA
HIDROSANITARIA A LA
VISTA-BIBLIOTECA



REPOSICION DE TUBERIA
HIDROSANITARIA

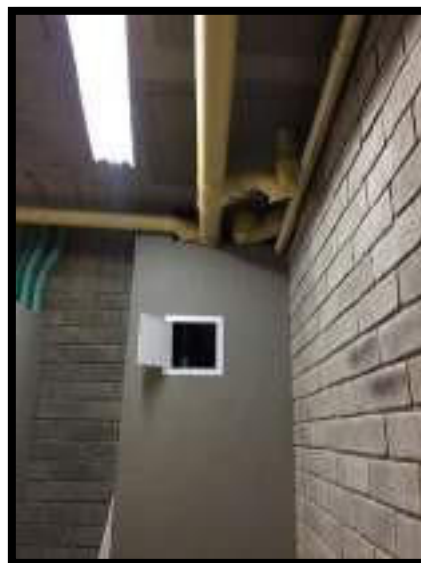

REGISTRO PARA TUBERIA NUEVA-
CUARTO ELECTRICO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2.1.6. COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN – SEDE A

Dirección: AK 7 No 171 B – 26

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Demolición de mampostería (muro y poceta)
- Demolición de acabado de piso(enchape)
- Montaje de muro en mampostería
- Pañete sobre mampostería
- Instalación y reubicación de puntos eléctricos (incluye cortes, tuberías y cableado)
- Instalación de puntos hidráulicos (incluye cortes, tubería y accesorios)
- Instalación de enchape de piso
- Construcción de cárcamo en granito pulido
- Instalación de redes eléctricas a 110 y 220 VW.
- Enchape piso/baldosa
- Puntos eléctricos e hidráulicos
- Fabricación de rejillas y campana extractora
- Instalación de rejillas y campana extractora
- Detallado de cárcamos y medias cañas
- Marquillado de aparatos eléctricos
- Instalación de regulador de gas y rejilla de protección exterior



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.



CORTE Y DEMOLICIÓN DE PISO Y MUROS



REPOSICION DE ENCHAPE
PARED Y BALDOSA



DEMOLICIÓN DE POCETA



DEMOLICIÓN DE MURO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



SUSPENSIÓN DE TUBERÍA



FUNDICIÓN DE CÁRCAMO



INSTALACIÓN DE TUBERÍA
ELECTRICA



REPOSICION DE ENCHAPE
PARED Y BALDOSA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



SALIDAS ELECTRICAS Y TUBERIA
EMT



PISO POCETA DE LAVADO



REPOSICION DE ENCHAPE PARED



ADECUACIÓN DE RED SANITARIA
POCETA DE LAVADO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



REPOSICION DE ENCHAPE
PARED Y SALIDAS



MARQUILLADO DE SALIDAS
ELECTRICAS



INSTALACION DE CAMPANA



INSTALACION DE REJILLA PARA
CÀRCAMO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACION DE MARCO PARA
REJILLA DE CARCAMO



INSTALACION DE MARCO PARA
REJILLA DE CARCAMO



INSTALACION DE REGULADOR Y
REJILLA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2.1.7. COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ


Dirección: Calle 131 b # 94 f-31

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Dentro del consolidado de las actividades adelantadas en el periodo tenemos:

- Fijación de platinas superiores e inferiores sobre muro y placa superior.
- Trasiego de tubería al sitio de instalación.
- Instalación de tubería vertical mediante soldadura
- Acabados de pintura
- Finaliza instalación de tubería vertical

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la

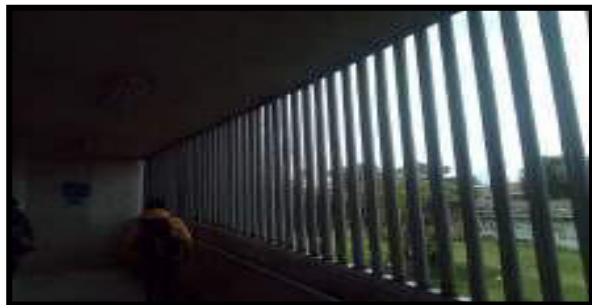

PINTURA DE TUBERIA Y
PLATINAS



INSTALACION DE TUBERIA EN
VANO



PINTURA DE PLATINAS



INSTALACION DE TUBERIA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*




INSTALACION DE TUBERIA



DETALLES A CORREGIR POR
PARTE DE
CONTRATISTA



DETALLES DE PINTURA

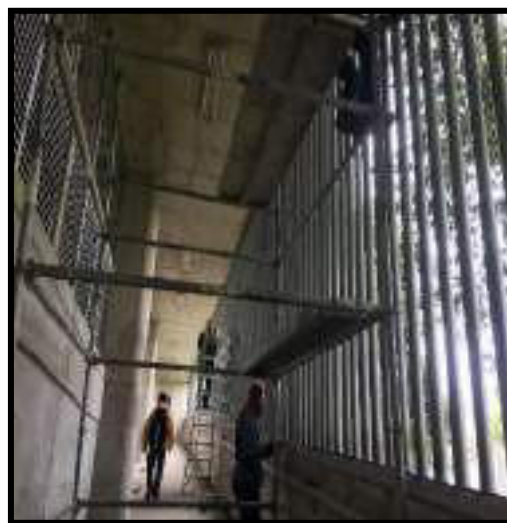

PINTURA Y RETOQUES DE
SOLDADURA EN
TUBERIA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



FINALIZA RASPAJE DE
MUROS



FINALIZA PINTURA DE TUBERIA



VISTA EXTERIOR DE
CERRAMIENTO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2.1.8. COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE - A

Dirección: Calle 102 A No 70 - 4

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Desmonte de cubierta asbesto cemento.
- Retiro de cubierta asbesto cemento.
- Instalación de estructura metálica en el área de biblioteca y corredor.
- Inician desmonte de cubierta en asbesto cemento.
- Inicio de aplicación de cordones de soldadura en estructural para cubierta
- Finaliza aplicación de soldadura en lo estructural
- Pintura de la estructura nueva y existente
- Cubrimiento en plástico de zonas en intervención para evitar ingreso de agua
- Montaje de cubierta tipo sándwich
- Se realiza aseo y limpieza de canales por taponamiento y filtración al interior de los salones
- Ingreso de material PTR y platinas
- Aplicación de pintura en sitio de perfiles metálicos
- Montaje de cerchas para salón múltiple
- Conexión de correas metálicas
- Inicia montaje de paneles de cubierta tipo sándwich para zona de biblioteca
- Finaliza montaje de cubierta tipo sándwich
- Finaliza instalación de perfiles estructurales
- Montaje de canal perimetral
- Demolición de pedestales de pórticos existentes
- Desmonte de tubería eléctrica existente en PVC
- Desmontes de puntos eléctricos existentes
- Pintura de estructura metálica
- Instalación de puntos eléctricos, salidas y tubería



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

- Instalación de lámparas
- Desmonte de tapete de colores en biblioteca
- Resane de muros en baños
- Instalación de brazo para montaje de video beam en salón múltiple
- Instalación de access point para salón múltiple
- Desmonte de tapete
- Aseo general de las áreas intervenidas y muros
- Instalación de tapete didáctico para biblioteca
- Reposición de listón de madera de la tarima
- Reposición de tapa de sanitario
- Instalación de lámparas para tarima (incluye red en EMT)
- Instalación de pirlan metálico perimetral para tapete didáctico.
- Adecuación eléctrica para reflector exterior
- Instalación de reflector exterior
- Reposición de listón de madera para tarima
- Abertura de bajante en la canal

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



CERRAMIENTO PERIMETRAL



INSTALACIÓN DE MAMPARA



DESMONTE DE CUBIERTA



DESMONTE DE CUBIERTA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



DESMONTE DE CUBIERTA



RETIRO DE ILUMINARIA



DESMONTE DE CUBIERTA



ACOPIO DE MATERIAL
ASBESTO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



DESMONTE CUBIERTA EN
ASBESTO CEMENTO-



DESMONTE CUBIERTA EN
ASBESTO CEMENTO-
BIBLIOTECA



MONTAJE DE ESTRUCTURA



MONTAJE DE ESTRUCTURA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



FINALIZA INSTALACIÓN
ESTRUCUTURAL



CUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA
CON PLASTICO



FINALIZA MONTAJE DE
CUBIERTA TIPO
SANDWICH



FINALIZA MONTAJE DE
CUBIERTA TIPO
SANDWICH




DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



REVISION DE FILTRACIONES EN
SALONES INFERIORES

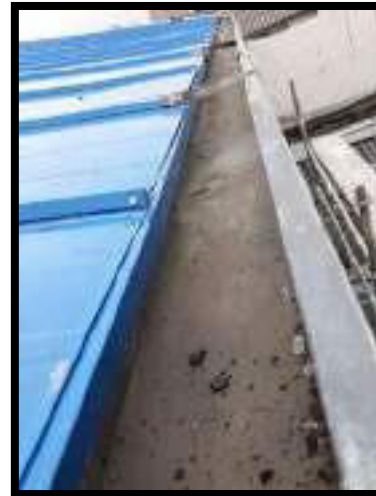

LIMPIEZA DE CANALES
POR
TAPONAMIENTO



LLEGADA DE MAQUINARIA



INGRESO DE MATERIAL
PARA INSTALACIÓN DE
CUBIERTA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



APLICACIÓN DE PINTURA DE
PERFILES



PERFILES PARA CORREAS Y
CERCHAS



MONTAJE DE CERCHAS
METALICAS



CONEXION DE CORREAS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



MONTAJE DE PANELES DE
CUBIERTA TIPO
SANDWICH



INSTALACION DE CUMBRERA
INTERIOR



REPOSICION DE
MAMPOSTERIA



DEMOLICION DE
PEDESTALES DE



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



CANAL PERIMETRAL
(MEJORAMIENTO DE



INSTALACIÓN DE TUBERIA
EMT PARA
ILUMINACION



INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT
PARA RED ELECTRICA



INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT
PARA RED ELECTRICA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACION DE SALIDAS
ELECTRICAS NUEVAS EN
SALON MULTIPLE



INSTALACION DE CAJAS DE
PASO PARA
LUMINARIAS



TAPAS PARA PUNTOS
ELECTRICOS



INSTALACIÓN DE CANALETA
METALICA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACION DE TUBO
PARA REFLECTORES Y
PARLANTES DE TARIMA



DESMONTE DE TAPETE DE
BIBLIOTECA



LIMPIEZA DE MUROS



LIMPIEZA DE ENTABLADO
(TARIMA SALÓN
MULTIPLE)



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACIÓN DE BRAZO PARA
SOPORTE DE VIDEO
BEAM



LIMPIEZA GENERAL DE SALÓN
MÚLTIPLE



LIMPIEZA DE
ÁREAS
INTERVENIDAS
(BAÑOS)



LIMPIEZA GENERAL DE
BIBLIOTECA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*




INSTALACIÓN DE TAPETE
LUDICO EN
BIBLIOTECA



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
EN ZONA DE TARIMA



INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT Y
SALIDAS ELÉCTRICAS

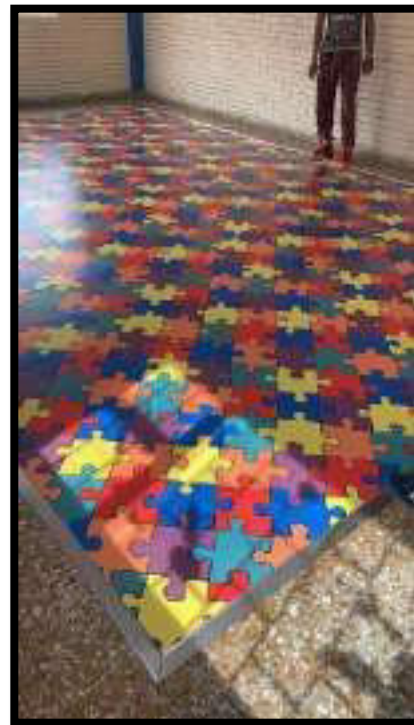

INSTALACIÓN DE PIRLAN DE
ALUMINIO PARA TAPETE
DIDÁCTICO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



CANAL PERIMETRAL



CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE
REFLECTOR



REPOSICIÓN DE LISTÓN DE
MADERA PARA
TARIMA



MARQUILLADO EN TABLERO
ELÉCTRICO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



VISTA SUPERIOR CUBIERTA



VISTA LATERAL



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2.1.9. COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN SEDE - B

Dirección: Calle 182 No 6 - 30

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Inician desmonte de luminarias existentes
- Desocupan áreas de intervención
- Ingreso de material de refuerzo estructural
- Des monte de cubierta asbesto cemento.
- Retiro de cubierta asbesto cemento.
- Instalación de estructura en el área de biblioteca y corredor.
- Desmonte de redes eléctricas para reposición
- Pintura de estructura de reforzamiento
- Instalación de platinas
- Instalación de estructura de PTR
- Pintura de estructura de PTR
- Arreglo de cerramiento en lona y señalización caída
- Llegada de material de Perfilería metálica y corte de estos para su instalación
- Instalación de perfiles PTR sobre estructura existente
- Pintura en sitio de perfilería metálica
- Inicio de montaje de paneles de cubierta tipo sándwich
- Finaliza montaje de cubierta tipo sándwich
- Desmonte de tubería eléctrica existente en pvc
- Desmontes de puntos eléctricos existentes
- Pintura de estructura metálica
- Instalación de puntos eléctricos, salidas y tubería emt



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

- Instalación de router
- Instalación de lámparas
- Instalación de parlantes
- Encorizada de remates de muros/cubierta
- Instalación de tapas en superboard para remates de muro.
- Desmonte de cerramiento
- Aseo y limpieza de las áreas intervenidas
- Montaje de perfilería para cubierta
- Instalación de cubierta tipo Sandwich
- Desmonte de cubierta tipo canaleta 90
- Instalación de tablero existente
- Arreglo de luminarias a un mismo nivel
- Construcción de pedestales para columnas

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



DESCARGUE DE TEJAS



DESMONTE DE CUBIERTA



RETIRO DE CUBIERTA



RETIRO DE CUBIERTA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



RETIRO DE CUBIERTA



RETIRO DE CUBIERTA



CERRAMIENTO Y ACOPIO DE
MATERIAL



DESMONTE CIELO RASO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



DESMONTE CUBIERTA DE
ASBESTO



ZONA DE ACOPIO



DESMONTE CUBIERTA DE
ASBESTO



PINTURA DE PERFILERIA
METALICA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



MEJORAMIENTO
ESTRUCTURAL DE
CERCHAS EXISTENTES



INSTALACION DE PLATINAS Y
PERFILES



PINTURA DE PERFILERIA
METALICA



PINTURA DE PERFILERIA
METALICA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



REFUERZO DE
CERRAMIENTO CON
PARALES METALICOS



REFUERZO DE
CERRAMIENTO CON
PARALES METALICOS



INSTALACION DE
CERRAMIENTO
SEGUNDO PISO



RECUBRIMIENTO DE
CUBIERTA CON
PLASTICO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ELEMENTOS ADICIONALES
DE ESTRUCTURA



APLICACIÓN DE PINTURA
PARA
ESTRUCTURA



FINALIZA REFUERZO DE
PERFILERÍA
METÁLICA



MONTAJE DE PANELES DE
CUBIERTA TIPO
SANDWICH



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



MONTAJE DE PANELES DE
CUBIERTA TIPO
SANDWICH



MONTAJE DE PANELES DE
CUBIERTA TIPO
SANDWICH



CORTES EN SITIO DE PANEL DE
CUBIERTA



ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL



DACAX S.A.S.


*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



DESMONTE DE RED ELECTRICA
EXISTENTE



INSTALACION DE LUMINARIAS Y
PUNTOS PARA
PARLANTES

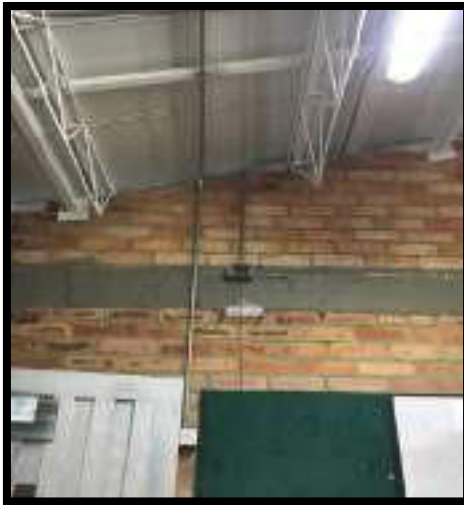

SALIDAS ELECTRICAS Y TUBERIA
EMT



SALIDAS ELECTRICAS Y TUBERIA
EMT



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ENCORAZADA DE
REMATES DE
MUROS/CUBIERTA



INSTALACIÓN DE LÁMINA DE
SUPERBOARD EN LOS
REMATES DE MURO CON
CUBIERTA



PRUEBA DE ILUMINACIÓN Y
SONIDO EN
SALONES



INSTALACIÓN DE SUPERBOARD
EN VENTANA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ASEO Y LIMPIEZA DEL ÁREA Y
RETIRO DE
CERRAMIENTOS



ASEO Y LIMPIEZA DEL ÁREA Y
RETIRO DE
CERRAMIENTOS



INICIA MONTAJE DE
CUBIERTA
(PERFILERÍA)



INICIA MONTAJE DE CUBIERTA
(TEJA TIPO
SANDWICH)



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



MONTAJE DE CUBIERTA TIPO
SANDWICH



MONTAJE DE CUBIERTA TIPO
SANDWICH



MONTAJE DE CUBIERTA TIPO
SANDWICH Y DESMONTE DE
CUBIERTA CANALETA 90



ENCOROZADO EN SUPERBOARD
PARA REMATE ENTRE
CUBIERTA Y MURO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



MODIFICACIÓN DE
ALTURA DE
LAMPARAS



CONSTRUCCIÓN DE
PEDESTALES PARA PORTICOS



MONTAJE DE TABLERO PARA
SALÓN SEGUNDO
PISO



RETIRO DE ESCOMBROS Y
SOBRANTES DE LA ZONA
DE ACOPIO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



SALÓN ISLA EXTERIOR



SALÓN ISLA INTERIOR



CUBIERTA SALÓN N°01



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ACABADO FINAL DE SALONES
SEGUNDO PISO



ACABADO FINAL DE SALONES
SEGUNDO PISO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ACABADO FINAL CUBIERTA SALONES



ACABADO FINAL CUBIERTA
ISLA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2.1.10. COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

Dirección: Calle 165 No 8ª - 05

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Desmonte de aparatos sanitarios.
 - Retiro de tubería hidrosanitaria.
 - Perforación con equipo Saca núcleo.
 - Instalación de nueva red hidrosanitaria.
 - Instalación de aparatos sanitarios.
 - Adecuación de obra civil, enchape de pisos y muros.
 - Demolición de enchape pared
 - Demolición de piso
 - Desmonte de tuberías existentes
 - Instalación de redes nuevas en PVC
 - Demolición de enchapes zona de cuartos de aseo
 - Demolición de enchapes zona de cuartos de aseo
 - Reposición de accesorios dañados
 - Instalación de cielo rasos en superboard
 - Retoque de pintura en muros y cielo rasos manchados por filtraciones presentadas durante la semana.
 - Inician arreglos en cocina, cambio de piezas dañadas de enchape pared, arreglo de boquillas muro, resanes, instalación de muro 1 cara de superboard y pintura de las zonas
 - Retiro de manto impermeabilizante existente en cubierta de almacenamiento
 - Pañete de muro perimetral en zona de tanques de almacenamiento
- Aplicación de material impermeabilizante para cubierta de tanques de almacenamiento
- Finalizan actividades de obra
 - Prueba de llenado de tanques y tubería de suministro
 - Finalizan trabajos en baterías sanitarias



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.




DEMOLICIÓN DE PISO



PERFORACIÓN CON SACA
NUCLEOS



DESMONTE DE APARATOS
SANITARIO

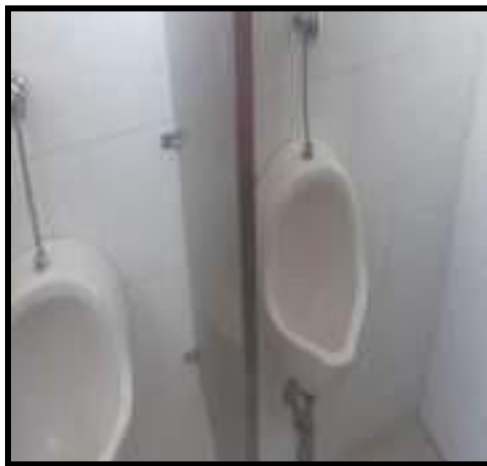

DESMONTE DE APARATOS
SANITARIO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



DEMOLICION EN PLACA



DEMOLICIÓN DE ENCHAPE



DESMONTE DE TUBERIA
HIDROSANITARIA
GALVANIZADA



DEMOLICION DE ENCHAPE PARED



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



DESMONTE DE TUBERIA DE
SUMINISTRO



REPOSICION DE
TUBERIA
HIDROSANITARIA EN
PVC



REPOSICION DE
TUBERIA



DEMOLICION DE ENCHAFE PISO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*




TUBERIA HIDROSANITARIA A LA
VISTA- 2DO PISO



TUBERIA HIDROSANITARIA A LA
VISTA- 2DO PISO



INSTALACION DE
TUBERIA
HIDROSANITARIA EN
PVC

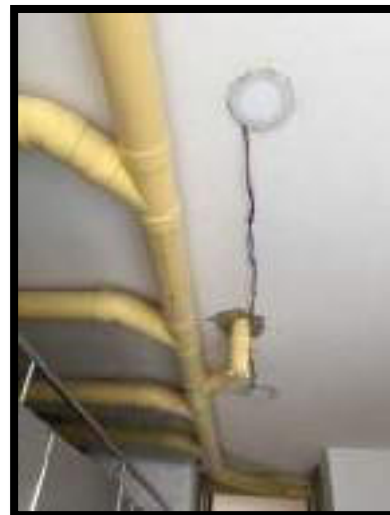


INSTALACION DE
TUBERIA
HIDROSANITARIA EN
PVC



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

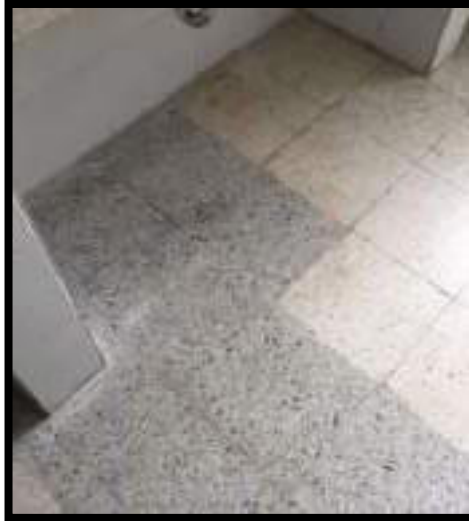

REPOSICION DE BALDOSA



INSTALACION DE
TUBERIA
HIDROSANITARIA EN
PVC



FUNDICION DE PLACA DE
CONTRAPISO



INSTALACION DE
TUBERIA
HIDROSANITARIA EN
PVC



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACION DE CIELO RASO
EN PVC E
ILUMINACION



REPARACIÓN Y PINTURA EN
FILTRACION DE MUROS
DE BAÑOS



ARREGLOS DE CIELO RASO EN
COCINA



ARREGLOS DE ENCHAPE EN
COCINA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



LIMPIEZA DE CUBIERTA



INSTALACION DE
FLANCHE EN DILATACION
DE MURO LATERAL



RETIRO DE TANQUES



RETIRO DE MANTO
IMPERMEABILIZANTE



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



AREGLO DE CARCAMO ROTO EN
COCINA



PINTURA DE TECHO EN COCINA



DESMONTE TOTAL DE MANTO
IMPERMEABILIZANTE DE
CUBIERTA



INSTALACION DE BYPASS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



FINALIZA ARREGLO DE
CARCAMO DE
COCINA



FINALIZA OBRA EN BAÑOS



LIMPIEZA DE CUBIERTA



APLICACIÓN DE
IMPERMEABILIZANTE



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



APLICACIÓN DE
IMPERMEABILIZANTE



CONEXIÓN DE TUBERIA A
TANQUE



TUBERIA Y ACESORIOS



PRUEBA Y LLENADO DE
TANQUES DE
ALMACENAMIENTO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



REPOSICIÓN DE ESPEJOS



REPOSICIÓN DE ESPEJOS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACIÓN REDES TANQUES



INSTALACIÓN REDES TANQUES



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2.1.11. COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C

Dirección: Carrera 3 No 186B - 04

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Dentro del consolidado de las actividades adelantadas en el periodo tenemos:

- Aseo y retiro de escombros
- Retiro de tubería hidrosanitaria
- Demolición de enchape pared, de piso y enchapes
- Instalación de cerramiento en zona de ingreso y hall de ingreso
- Demolición de enchape muros y de mesón de lavamanos
- Desmonte de ventanería metálica y puerta
- Aseo y limpieza de la zona
- Regatas para tubería hidrosanitaria
- Instalación de puntos sanitarios
- Instalación de tubería de suministro para baterías sanitarias
- Construcción de divisiones sanitarias en mampostería
- Conexión de redes a caja de inspección
- Construcción de divisiones sanitarias en mampostería en baño de niñas
- Conexión de redes a caja de inspección interior
- Nivelación de puntos de suministro para lavamanos
- Instalación de puntos de suministro y desagüe para orinales baño de niños
- Instalación de enchape piso interior del baño infantil



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

- Conexión de redes exteriores a caja de inspección exterior
- Instalación de tubería hidrosanitaria a la vista
- Instalación de enchapes muro y piso
- Instalación de tubería sanitaria
- Conexión de tubería a cajas de inspección
- Reposición de piezas de ladrillo dañadas en muro
- Emboquillado de muros
- Construcción de mesón de lavamanos en granito
- Armado de zapata y columna para tanque elevado
- Finaliza instalación de enchape de muros
- Aplicación de estuco y pintura de muros superiores
- Instalación de cubierta UPVC
- Fundición de tapa para caja de inspección
- Estuco y pintura de muros superiores
- Instalación de tubería emt, red eléctrica y de luminarias (2) tubulares
- Instalación de puertas metálicas
- Aplicación de pintura coraza azul para muro exterior del baño
- Instalación de puertas metálicas para sanitarios
- Finaliza aplicación de estuco y pintura de muros superiores
- Instalación de vidrios de ventanería
- Instalación de tanque elevado con sus accesorios
- Instalación de estructura y cubierta en policarbonato en el corredor al baño
- Instalación de aparatos sanitarios y accesorios
- Aseo y limpieza del área

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ASEO Y RETIRO DE ESCOMBRO



INSTALACION DE
CERRAMIENTO



DEMOLICION DE ENCHAFE
PARED



RED DE SUMINISTRO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



DESMONTE DE VENTANERÍA
METÁLICA



INGRESO MATERIAL



DEMOLICION DE ENCHAPE
PARED



CORTE DE PLACA PARA
TUBERIA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INGRESO DE MATERIAL



REPOSICION DE MAMPOSTERIA
SUELTA



INICIO DE INSTALACION DE
MAMPOSTERIA PARA MUROS



REGATAS E INSTALACION DE
TUBERIA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



CONEXIÓN DE TUBERIAS A
CAJA DE
INSPECCION



FILOS EN VENTANA/REJILLA DE
FACHADA



INSTALACION DE PUNTOS
SANITARIOS PARA
ORINALES BAÑO NIÑOS



NIVELACION DE PUNTOS
PARA
LAVAMANOS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



RED DE SUMINISTRO



INSTALACION DE BALDOSA
PISO AL INTERIOR DEL
BAÑO INFANTIL



INSTALACION DE BALDOSA
PISO AL INTERIOR DEL
BAÑO INFANTIL



CAJA DE INSPECCION



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



TUBERIA HIDROSANITARIA Y
CAJA DE
INSPECCIÓN



TUBERIA SANITARIA



REPOSICIÓN DE PIEZA
DAÑADAS EN
MURO



RE EMBOQUILLADA DE MURO
EXTERIOR



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ARMADO DE ZAPATA



FUNDICIÓN DE ZAPATA



CONSTRUCCIÓN DE MESÓN
PARA LAVAMANOS EN
GRANITO



INSTALACIÓN DE ENCHAPE
MUROS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



EMBOQUILLADO DE ENCHAPES
PARA MUROS



CAJA DE INSPECCIÓN



MESÓN EN MAMPOSTERIA Y
GRANITO



INSTALACIÓN DE PUERTA
CORREDIZA METALICA Y
VENTANERÍA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



FINALIZA INSTALACIÓN DE
CUBIERTA Y PLACA DE
SOPORTE DE TANQUE



ESTUCO DE MURO SUPERIOR



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
Y RED ELECTRICA EN
EMT



FUNDICIÓN DE TAPA PARA
CAJA DE
INSPECCIÓN



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



PUERTAS METALICAS PARA
BAÑO



INSTALACIÓN DE PUERTAS
METALICAS PARA
SANITARIOS



PUERTA METALICA PARA
INGRESO A BAÑO



CERRAMIENTO PERIMETRAL EN
LONA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACIÓN DE REGADERA
PARA DUCHA



CONEXIÓN DE APARATOS
SANITARIOS



DESMONTE DE
CERRAMIENTO
PERIMETRAL EN LONA



INSTALACIÓN DE VIDRIOS
PARA VENTANEÍA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACIÓN DE LAVAMANOS Y
PUSH



CONEXIÓN DE ORINALES



ENCOROZADA DE REMATES DE
MURO



CONEXIÓN PARA BAJANTE DE
AGUAS LLUVIAS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACIÓN DE TANQUE
ELEVADO



INSTALACIÓN DE TRAMO DE
CUBIERTA EN
POLICARBONATO



ACABADO FINAL



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ACABADO FINAL



ACABADO FINAL



ACABADO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ACABADO FINAL



ACABADO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2.1.12. COLEGIO ALFONSO JARAMILLO

Dirección: Carrera 58 No 167 - 30

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Se realizará los resanes de los muros internos de las aulas
- Se dilatan los muros
- Desmonte e instalación de las tejas rotas asbestos cemento y translucida
- Resane y pintura de fisuras superficiales de muros
- Dilatación de fisuras profundas estructurales
- Aplicación de estuco tradicional
- Muestra de pintura para muros
- Relleno de zonas vacías en muros
- Encorazada de remates de muro con teja
- Inicio de actividad de pintura en muros y cubierta
- Aplicación de estuco tradicional acronal
- Pintura de muros/acabado
- Resanes y pintura de muros con fisuras
- Encorazada de remate de muros con teja
- Dilatación en muros por fisuras profundas estructurales
- Pintura de muros y tejas
- Aplicación de estuco tradicional para muros



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

- Aplicación de pintura blanca 3 manos para muro
- Aseo y limpieza de áreas
- Trazado de acometida para suministro de tanques
- Excavación de zanjas para instalación de red de suministro de tanques
- Instalación y conexión de red de suministro
- Limpieza de área de cerramiento perimetral del colegio
- Cerramiento en lona verde exterior
- Conexión de acometida hidráulica a tanques de suministro
- Relleno de zanja de acometida
- Limpieza de área de estructura de cerramiento existente
- Construcción de cajas de inspección de acometida hidráulica
- Desmonte de cerramiento existente
- Instalación de cerramiento nuevo
- Finaliza instalación de cerramiento
- Instalación de tapas para cajas de inspección
- Aseo y limpieza

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



RESANE Y DILATACIONES DE
FISURAS EN MUROS



RESANE Y DILATACIONES DE
FISURAS EN MUROS



CAMBIO DE TEJAS



RESANE DE FISURAS EN MUROS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



DESCARIFICACION DE MUROS



RESANES EN ZONA DE
FISURAS



RESANES EN ZONA DE
FISURAS



DILATACION Y RESANE DE
FISURAS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



CAMBIO DE TEJAS DAÑADAS



ENCORAZADA DE
REMATES EN
MURO/TEJA



APLICACIÓN DE ESTUCO
TRADICIONAL



APLICACIÓN DE ESTUCO
TRADICIONAL



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



PRIMERA CAPA DE PINTURA EN MURO



SEGUNDA CAPA DE PINTURA EN MURO



INICIO DE PINTURA EN MURO



APLICACIÓN DE UNA MANO DE PINTURA EN MUROS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



CAMBIO DE TEJAS DAÑADAS



APLICACIÓN DE UNA MANO DE
PINTURA EN MUROS



PINTURA EN TEJAS



APLICACIÓN DE ULTIMA
CAPA DE PINTURA EN
MUROS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ACABADO FINAL DE MUROS (3
MANOS DE PINTURA)



APLICACIÓN DE PINTURA PARA
CUBIERTA



CAMBIO DE VIDRIOS DAÑADOS



CAMBIO DE TEJAS DE ASBESTO
CEMENTO DAÑADAS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



APLICACIÓN DE ESTUCO
TRADICIONAL PARA
MURO



APLICACIÓN DE PINTURA PARA
TEJAS EN CEMENTO



CONEXIÓN PARA ACOMETIDA



CONEXIÓN DE ACOMETIDA A
TANQUE DE
ALMACENAMIENTO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INICIO DE EXCAVACIÓN
PARA
ACOMETIDA



EXCAVACIÓN DE ACOMETIDA



INSTALACIÓN DE RED DE
SUMINISTRO PARA
CONEXIÓN DE TANQUES



CERRAMIENTO Y LIMPIEZA DE
ÁREA DE
INTERVENCIÓN



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



RELLENO DE ZANJA DE
ACOMETIDA



FUNDICION DE CAJA DE PASO



FUNDICION DE CAJA DE PASO



INGRESO DE MATERIAL DE
CERRAMIENTO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACIÓN DE
CERRAMIENTO
PERIMETRAL



INSTALACIÓN DE
CERRAMIENTO



CERRAMIENTO PERIMETRAL



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2.1.13. COLEGIO VILLA ELISA SEDE D

Dirección: Calle 128 Bis No 93 - 07

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Desmonte de divisiones metálicas
- Desmonte de aparatos sanitarios
- Demolición de muro divisorio
- Demolición de enchape piso y pared
- Construcción de muro en mampostería
- Pañete de muros divisorios
-
- Instalación de tubería sanitaria y de suministro
- Instalación de puntos sanitarios
-
- Instalación de enchape para muro
- Pañete de muros
-
- Construcción de mesón de lavamanos dos niveles
- Finaliza instalación y emboquillado de enchapes de muro en baños
- Aseo y limpieza de áreas



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

- Finaliza instalación de estructura para cielo raso en superboard en salones segundo piso
- Instalación de red eléctrica en salones
- Instalación de red de iluminación
- Instalación de estructura de cielo raso para superboard en baños primer piso
- Finaliza montaje de cielo raso en superboard
- Instalación de salidas eléctricas para iluminación
- Empastado de juntas de láminas de superboard
- Instalación de aparatos sanitarios
- Instalación de lámparas
- Arreglo de boquilla
- Pulida de mesones en granito para lavamanos
- Instalación de divisiones metálicas
- Instalación de puertas metálicas
- Instalación de luminarias en salones y baños
- Instalación de accesorios de baño
- Instalación aparatos sanitarios
- Pintura de muro exterior
- Arreglo de puntos sanitarios para orinales
- Pintura de muro exterior
- Aseo y limpieza

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS-
SST



INGRESO DE
MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN



DESMONTE DE DIVISIONES
METALICAS DE
BAÑOS



DESMONTE DE APARATOS
SANITARIOS Y DEMOLICION DE
ENCHAPE MURO/PISO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



CONSTRUCCION DE
MUROS EN
MAMPOSTERIA



CONSTRUCCION DE
MUROS EN
MAMPOSTERIA



REGATAS PARA INSTALACION DE
TUBERIA SANITARIA Y
SUMINISTRO



INSTALACION DE TUBERIA
SANITARIA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



PAÑETE DE MUROS



FUNDICIÓN DE MESÓN
PARA
LAVAMANOS



ALISTADO DE PISO



FUNDICION DE SOBRE PLACA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



FINALIZA PAÑETE DE MURO
EXTERIOR



INSTALACIÓN DE ENCHAFE PARA
MURO Y PISO



INSTALACIÓN DE ENCHAFE PARA
MURO



CONSTRUCCIÓN DE
LAVAMANOS DOS
NIVELES



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



BOQUILLA DE MUROS Y PISOS



INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA
MURO Y PISO



INSTALACION DE ESTRUCTURA
CIELO RASO EN SUPERBOARD EN
SALONES



INSTALACION DE ESTRUCTURA
CIELO RASO EN SUPERBOARD
EN BAÑO




DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ACTIVIDADES ELECTRICAS EN
BAÑOS

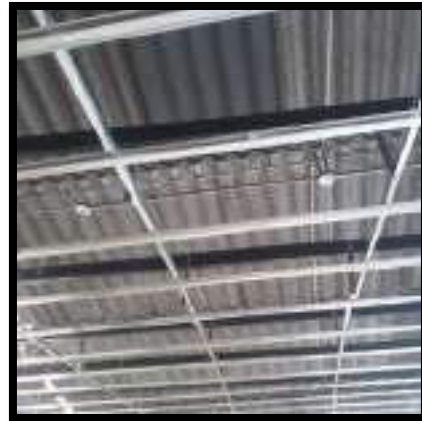

INSTALACION DE RED
ELECTRICA



INSTALACION DE
ESTRUCTURA PARA CIELO
RASO EN SUPERBOARD



INSTALACION DE
ESTRUCTURA PARA CIELO
RASO EN SUPERBOARD



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACIÓN DE
LAMINAS DE
SUPERBOARD EN LOS
SALONES



EMPASTADO DE JUNTAS
LAMINAS DE
SUPERBOARD



PINTURA DE CIELO
RASO EN SUPERBOARD



PINTURA DE CIELO RASO EN
SALONES SEGUNDO PISO,
ACABADO FINAL



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACIÓN DE LAMINAS
DE SUPERBOARD EN BAÑOS



INSTALACIÓN DE APARATOS
SANITARIOS



INSTALACIÓN DE APARATOS
SANITARIOS



PULIDA DE MESÓN DE
LAVAMANOS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*




INSTALACIÓN DE LAMPARAS
PARA SALONES



INSTALACIÓN DE LAMPARAS
PARA SALONES



FINALIZA TRABAJO DE
PINTURA E ILUMINACIÓN DE
SALONES 2° PISO

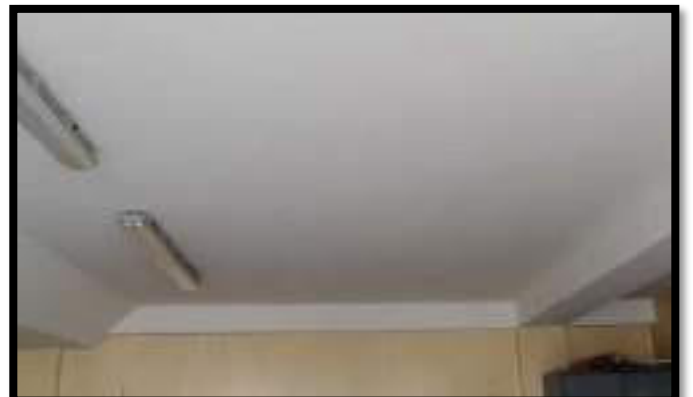

ACABADO FINAL DE CIELO
RASOS DE SALONES



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACIÓN DE DIVISIONES
PARA BAÑOS Y REPOSICIÓN
DE TABLETAS



INSTALACIÓN DE PAPELERA Y
JABONERA



APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE
PAÑETE COLOR AMARILLO
(ZONA BAÑOS)



BAÑO INFANTIL NIÑAS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



BAÑO INFANTIL NIÑAS



BAÑO INFANTIL NIÑOS



BAÑO INFANTIL NIÑOS



ACABADO FINAL DE CIELO
RASO DE SALONES



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2.1.14. COLEGIO PRADO VERANIEGO SEDE B

Dirección: Cra 53 No 128 53

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Ingreso de material
- Demolición de jardinera existente
- Desembrado de plántulas existentes
- Excavación de área de jardinera
- Construcción de jardinera en zona de cancha
- Excavación de zona de jardinera existente
- Relleno con recebo en zona de jardinera existente
- Nivelación de piso para construcción de placa
- Demolición de pañete existente de muros
- Aplicación de pañete y nivelación de muros
- Fundición de placa y nivelación de piso
- Siembra de plántulas en jardinera
- Demolición de pañete existente de muros
- Aplicación de pañete y nivelación de muros
- Fundición de placa y nivelación de piso
- Siembra de plántulas en jardinera
- Finaliza pintura general de la zona de niños
- Arreglo de jardinera
- Finalizan actividades de pintura
- Instalación de piso PVC Forza



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.



INGRESO DE MATERIAL DE OBRA



ÁREA DE INTERVENCIÓN



RETIRO DE SIEMBRA, Y
DEMOLICIÓN DE JARDINERA



PLANTULAS PARA RESEMBRAR



EXCAVACIÓN ÁREA DE
JARDINERA PARA
CONSTRUCCIÓN POSTERIOR DE
PLACA



MATERIAL PARA JARDINERA
NUEVA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA
NUEVA



DEMOLICIÓN DE ENCHAPE
MURO



LIMPIEZA DE ZANJA PARA PLACA
NUEVA



RELLENO DE ZANJA PARA PLACA
NUEVA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



FUNDICIÓN DE PLACA Y
NIVELACIÓN DE
PISO



ECO PUNTO



SIEMBRA DE PLANTULAS EN
JARDINERA NUEVA



REPOSICIÓN DE PAÑETE EN
MUROS



DACAX S.A.S.


*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



PAÑETE DE MUROS LISO



CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE
AMARRE

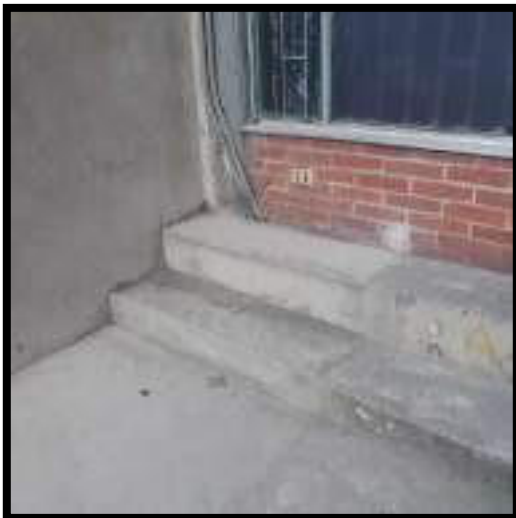

CONSTRUCCIÒN DE ESCALONES



APLICACIÓN DE PINTURA EN
MURO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*




APLICACIÓN DE PINTURA EN
GRADAS



APLICACIÓN DE PINTURA DE
GRADA EN ZONA DE
CANCHAS



AUMENTO DE ALTURA
PARA MAMPOSTERIA DE
JARDINERA NUEVA

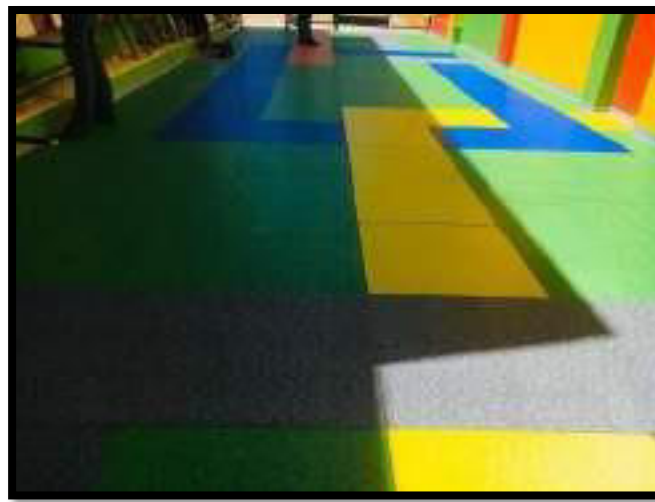

ZONA NIÑOS-INSTALACIÓN DE PISO
PVC



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ZONA NIÑOS-INSTALACIÓN DE PISO
PVC



ZONA NIÑOS-INSTALACIÓN DE PISO
PVC



ACABADO FINAL ZONA
NIÑOS INSTALACIÓN



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2.1.15. COLEGIO GENERAL SANTANDER

Dirección: Calle 159 No 08 - 56

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Desmonte de adoquín en salones
- Nivelación de piso
- Nivelación de piso
- Relleno con recebo b600
-
- Instalación de enchape para piso
- Demolición de placa para instalación de pedestales en zona de canchas
- Instalación de enchape de piso en salones
-
- Excavación para instalación de postes para malla contragolpe en zona de cancha
- Armado de pedestal para instalación de postes
-
- Montaje de postes
-
- Instalación de enchape de piso en salones
-
- Montaje de postes
- Instalación de (2) platinas para montaje de postes en zona exterior a baños
- Finalizan actividades en salones



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

- Instalación de postes para malla de cancha
- Instalación de malla tipo cancha
- Aseo y limpieza

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.



DESMONTE DE ADOQUIN EN
SALONES



ZONA DE ACOPIO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



DESMONTE DE ADOQUIN EN
SALONES



INGRESO DE MATERIAL



RELLENO, COMPACTACIÓN Y
ALISTADO DE PISO



RELLENO, COMPACTACIÓN Y
ALISTADO DE PISO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO



INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO



EXCAVACIÓN PARA PEDESTALES
(ZONA DE CANCHA)



EXCAVACIÓN EN ZONA
VERDE PARA INSTALACIÓN



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ARMADO DE PEDESTALES
PARA FUNDICIÓN DE
POSTES



INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE
PISO



INSTALACIÓN DE MEDIAS
CAÑAS PERIMETRALES



EMBOQUILLADO DE ENCHAPE DE
PISO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



FINALIZA INSTALACIÓN DE
ENCHAPE DE PISO EN
SALONES




INSTALACIÓN DE
PLATINAS PARA
MONTAJE DE POSTES





DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

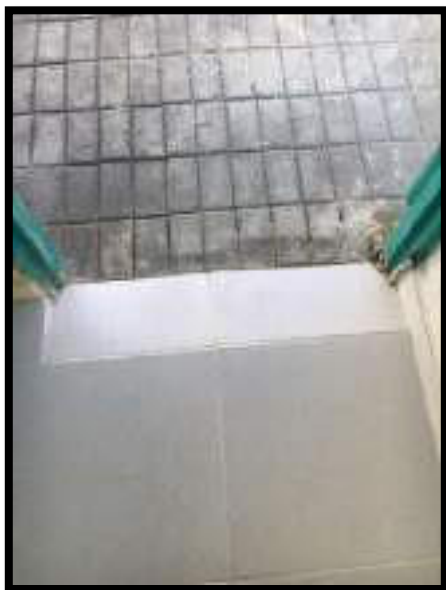

RAMPA DE ACCESO A SALONES



ACABADO FINAL EN SALONES



INGRESO DE MOBILIARIO A
SALONES



MONTAJE DE POSTES Y
CONSTRUCCIÓN DE
PEDESTALES



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACIÓN DE MALLA PARA
CANCHA



INSTALACIÓN DE MALLA PARA
CANCHA



INSTALACIÓN DE MALLA PARA
CANCHA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2.1.16. COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA

Dirección: Diagonal 132a No 114 - 43

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Desmonte de tabletas fisuradas de muro
- Reposición de tabletas del mismo formato
- Demolición de enchapes fisurados en muro
- Instalación de enchapes en muros Adecuación
- de muro parte superior
-
- Arreglo de fisuras en muros
- Instalación de media caña en Pvc
-

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.



RESANE DE FISURA EN MURO



DESMONTE DE ENCHAPES FISURADOS



**DESMONTE DE ENCHAPES FISURADOS
DE MURO**



**DESMONTE DE ENCHAPES FISURADOS
DE MURO**



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



DESMONTE DE ENCHAPES
FISURADOS DE
MURO



DEMOLICIÓN DE ENCHAPES
FISURADOS EN
MURO



DEMOLICIÓN DE ENCHAPES
FISURADOS EN
MURO



DILATACIÓN DE FISURA EN
MURO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



MONTAJE DE ENCHAPES DE MURO



ACABADO FINAL DE ENCHAPE DE MURO



MEJORAMIENTO DE ACABADO PARA MEDIAS CAÑAS



INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACIÓN PUERTA TIPO
PERSIANA



INSTALACIÓN PUERTA
TIPO ENTAMBORADA



INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA
EN PVC Y APLICACIÓN DE



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

2.1.17. COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE B

Dirección: Cra 68B No 94 - 12

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Inician actividades de sellamiento de fisuras en la totalidad de la cancha
- Demolición manual de pavimento asfaltico en fallos
- Excavación manual de material recebo
- Apiques en tres puntos dentro de la cancha
- Excavación mecánica del suelo
- Relleno con material existente
- Aplanado y compactación de material reutilizado
- Relleno y compactación de material Recebo común
- Relleno y compactación de material B400
- Relleno y compactación de material B600 mejorado con cemento al 5%
- Levantamiento topográfico
- Aplicación de emulsión asfáltica
- Aplicación de asfalto MDCI 1350
- Demarcación pintura
- Instalación de juegos



APIQUE ESTUDIO SUELO



APIQUE ESTUDIO SUELO



DEMOLICIÓN MANUAL DE
PAVIMENTO ASFALTICO



DEMOLICIÓN MANUAL DE
PAVIMENTO ASFALTICO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



APIQUE A 0,40 CM REVISIÓN DEL
SUELO



APIQUE A 0,40 CM REVISIÓN DEL
SUELO



VERIFICACIÓN DEL RECEBO
HUMEDO



VERIFICACIÓN DEL RECEBO
HUMEDO EN
FALLOS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



SUMIDERO Y CAJA DE
INSPECCIÓN CON
FILTRACIÓN DE AGUA



RETIRO Y DEMOLICIÓN DE
PAVIMENTO



EXCAVACIÓN MECANICA EN ZONA
1 Y 2



RELLENO CON MATERIAL
SOBRANTE PARA INICIAR



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



COMPACTACIÓN DE
RELLENO DE
TRITURADO



RETIRO DE MATERIAL DE
RELLENO



INGRESO DE MATERIAL B400



REPARACIÓN DE FALLOS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



COMPACTACIÓN DE SUELO ZONA 1
Y 2



COMPACTACIÓN DE SUELO ZONA 1
Y 2



COMPACTACIÓN DE SUELO
ZONA LATERAL



NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN DE
MATERIAL B400



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



NIVELACIÓN DE MATERIAL B600



HUMECTACIÓN DE MATERIAL B600



REPARACIÓN CAJA DE
INSPECCIÓN POR FILTRACIÓN



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



EXCAVACIÓN DE FALLO



NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL
B600



IMPRIMACIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



TOMA DE DENSIDADES EN
MATERIAL BASE



TOMA DE DENSIDADES EN
MATERIAL BASE



RELLENO DE MATERIAL PIEDRA
RAJÓN (REPARACIÓN)



COMPACTACIÓN DE ASFALTO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INGRESO DE MATERIAL ASFALTO



EXTENDIDO DE ASFALTO



COMPACTACIÓN DE ASFALTO ZONA LATERAL



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ACABADO FINAL DEL ASFALTO




DEMARCACIÓN CANCHA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

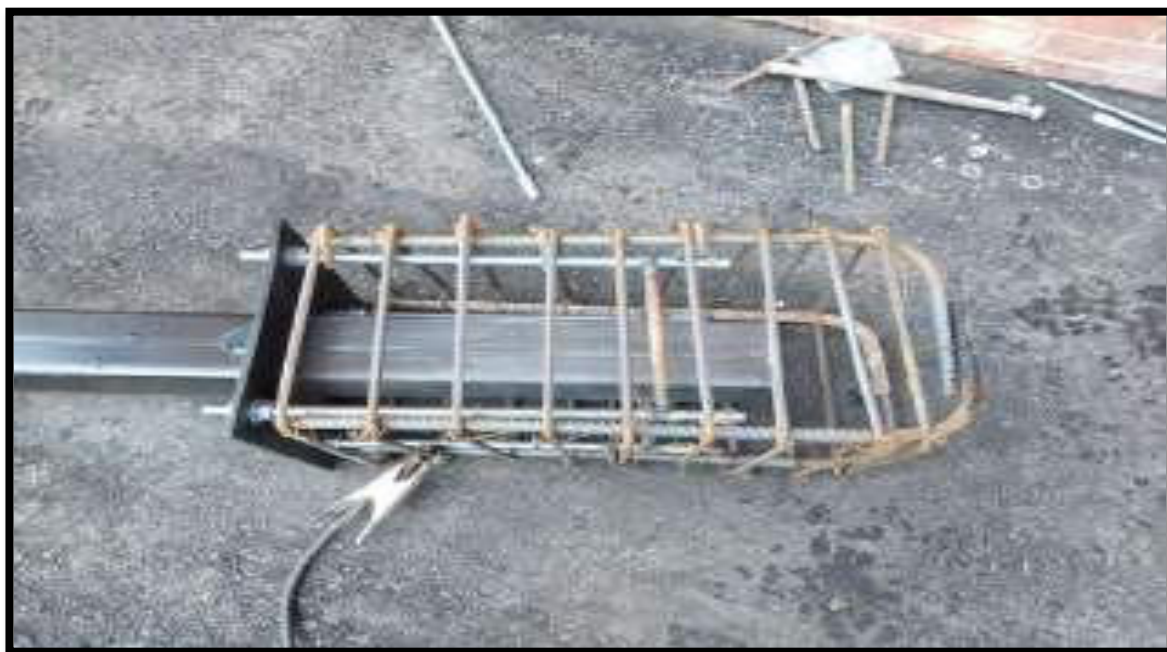

ESTRUCTURA DE ANCLAJE
PEDESTAL BALONCESTO




MONTAJE PEDESTAL BALONCESTTO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

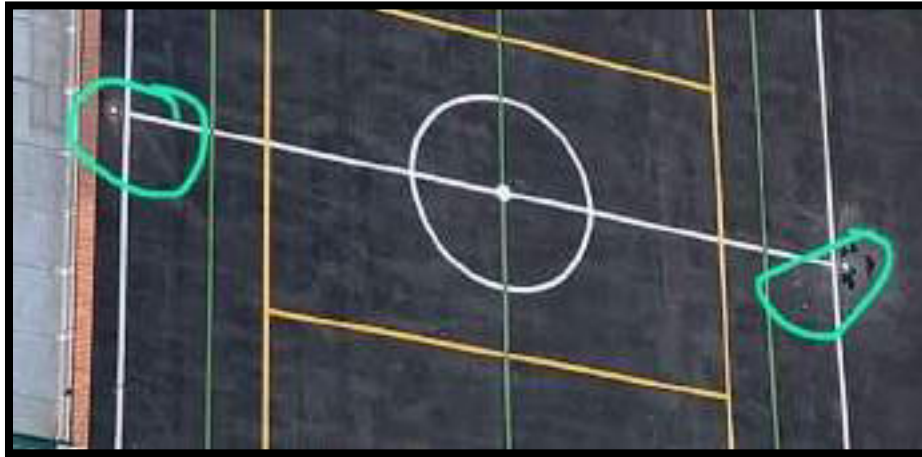

ESTRUCTURA DE
ANCLAJE



ACABADO FINAL CANCHA
MULTIPLE



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ACABADO FINAL CANCHA
MULTIPLE



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2.1.18. COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE B

Dirección: Calle 129B No 58B - 45

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Dentro del consolidado de las actividades adelantadas en el periodo tenemos:

- Aplicación de Slurry para sellamiento de fisuras en la totalidad de la cancha
- Ingreso de maquinaria a la cancha
- Aplicación de pavimento asfaltico en la totalidad de la cancha
- Aseo en pareo de cancha y pasillo.
- Adecuación de sifones en la cancha.

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



AGRIETAMIENTO EN LA
TOTALIDAD DEL
ÁREA



APLICACIÓN DE SLURRING
PARA SELLAMIENTO DE
FISURAS



APLICACIÓN DE SLURRING
PARA SELLAMIENTO DE
FISURAS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INGRESO DE MAQUINARIA
PARA COMPACTACIÓN



APLICACIÓN DE
ASFALTO Y
COMPACTACIÓN DE
SUELO



ACABADO FINAL PARA CANCHA



ACABADO FINAL PARA CANCHA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ESTADO INICIAL DE REJILLAS



RETIRO DE REJILLAS
DETERIORADAS



ADECUACIÓN DE SIFÓN PARA
REJILLAS NUEVAS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACIÓN DE REJILLAS



INSTALACIÓN DE REJILLAS



ACABADO FINAL REJILLAS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ACABADO FINAL PATIO LÚDICO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2.1.19. COLEGIO VILLA ELISA SEDE A

Dirección: Calle 132 No 92 - 15

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Ingreso de material al punto de acopio
- Aplicación de pintura en sitio de perfilería de soporte adicional para instalación de cubierta
- Desmonte de cubierta asbesto cemento
- Desmonte de perfilería metálica
- Instalación de platinas
- Instalación de perfilería estructural para a cubierta
- Retoques de pinturas
- Montaje de cubierta tipo
- UPVC Instalación de flanches
- Instalación de canal galvanizada y pintada

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INGRESO DE PERFILERIA DE
SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE
CUBIERTA NUEVA



PINTURA EN SITIO DE PERFILERIA
DE SOPORTE



DESMONTE DE CUBIERTA Y
PERFILERÍA EXISTENTE EN
ZONA DE ESCALERAS



DESMONTE DE CUBIERTA
EXISTENTE EN ZONA DE
CORREDOR



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*




INSTALACIÓN DE PLATINAS



MONTAJE DE ESTRUCTURA
PARA EL SOPORTE DE
CUBIERTA



MONTAJE DE ESTRUCTURA
PARA EL SOPORTE DE
CUBIERTA

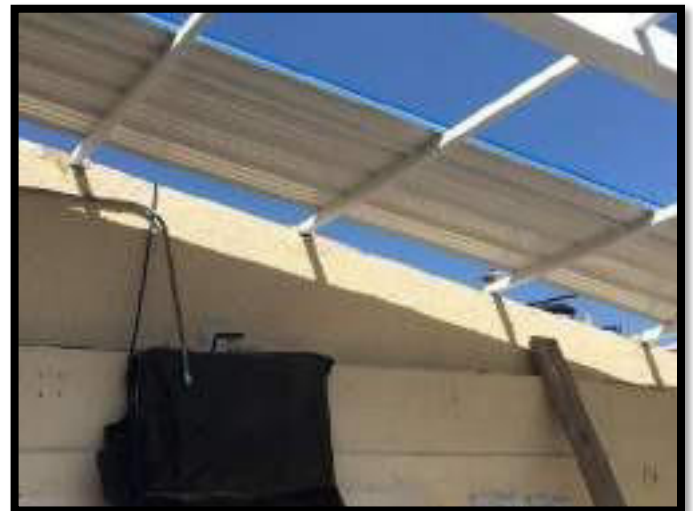

MONTAJE DE CUBIERTA TIPO
UPVC



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



MONTAJE DE CUBIERTA TIPO
UPVC EN ZONA DE
ESCALERAS



DESMONTE DE MALLA DE
CIELO RASO (RETIRO
PROVISIONAL)



MONTAJE DE PERFILERIA DE
SOPORTE PARA TEJA



DETALLE DE ANCLAJE DE
PLATINAS EN
MURO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACIÓN DE TEJA TIPO
UPVC EN SALÓN DE
SISTEMAS



INSTALACIÓN DE TEJA TIPO
UPVC EN SALÓN DE
SISTEMAS



INSTALACIÓN DE TEJA TIPO
UPVC EN SALÓN
CENTRAL



ASEO Y RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



INSTALACIÓN DE FLANCHES



INSTALACIÓN DE FLANCHES



INSTALACIÓN DE CANAL



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCIÓN, E INTERVENTORÍA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELÉCTRICOS.




ACABADO FINAL DE
CUBIERTA DE
SALONES



ACABADO FINAL DE
CUBIERTA DE
SALONES



3. CURVA DE AVANCE

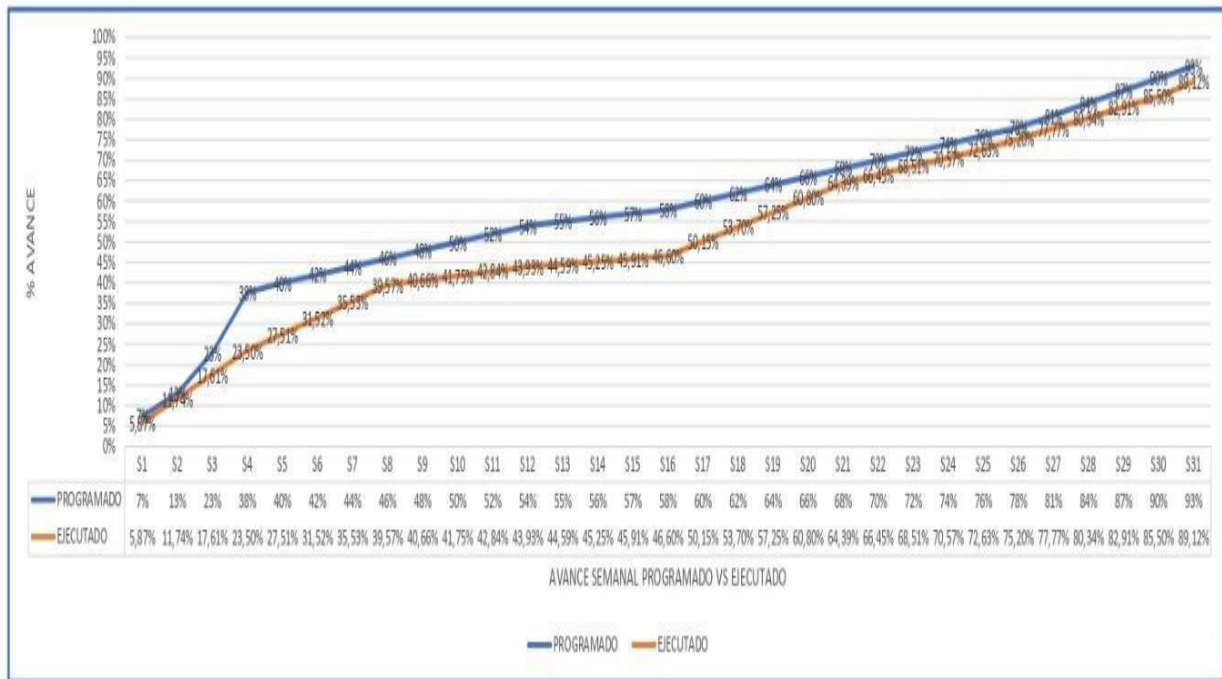

NOTA: Según lo anterior, se presenta un porcentaje de **ejecución acumulado general al mes de enero del 100,00% correspondiente al ejecutado de acuerdo al Acta parcial Final**, Así mismo se refleja en gráfica la programación de actividades de los colegios.

4. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

4.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales utilizados cumplen con los estándares de calidad, el contratista debe realizar entrega de certificados de calidad y fichas técnicas.

En cuanto al material de concreto asfáltico utilizado para los colegios Gustavo Morales Morales sede B y Julio Flórez sede A, no se presentó el diseño de mezclas correspondiente a la interventoría, por lo tanto, se le solicita por medio de comunicados al contratista el procedimiento constructivo, certificados de materiales y maquinaria.

4.2. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados a la fecha no presentan deficiencias en cuanto a los acabados finales en cada frente de obra.

Cabe recalcar que, durante la ejecución de los trabajos, la interventoría realiza los acompañamientos necesarios para la verificación de las obras, se reitera que los trabajos deben tener funcionalidad y



estética a la hora de su entrega, la interventoría no recibirá trabajos con pendientes tipo A y tipo B, estos deben subsanarse previamente a la entrega a la interventoría/supervisión/colegio.

5. REGISTRO DE PERSONAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA DE OBRA

Personal – Contactos:

- Representante Legal: Ingeniero Javier García Cabezas – Cel: 3003470647
- Coordinador de proyectos: Ing. Germán Villalba Clavijo – Cel: 3183796224
- Residente de obra: Arq. Cesar Montaña Muñoz – Cel: 3123381484
- SISOMA: Ing. Lady Uribe Barón – Cel: 3133135707
- Correos electrónicos: Javier.garcía@prodein.com.co german.villalba@prodein.com.co

5.1. CANTIDAD DE PERSONAL EN OBRA

4. PERSONAL EN LA OBRA			
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
TOPÓGRAFO	0	PINTORES	4
MAESTRO	3	OFICIALES	6
ELECTRICISTA	1	AYUDANTES	5
AYU. DE ELECTRICIDAD	2	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	4	OP. CILINDRO	0
SISOMA	1	OP. RETRO EXCAVADORA	0
HIDRÁULICOS	2	INGENIERO RESIDENTE	2

5.2. CANTIDAD DE MAQUINARIA EN OBRA: Según las inspecciones y visitas realizadas a cada uno de los frentes de obra, la presente interventoría evidenció, que se requirió la utilización de vibro compactadores, mini cargadores y equipos de soldadura para actividades de mayor complejidad.

5.3. CLIMATOLOGÍA

Durante el periodo de trabajo no se reportó ninguna novedad o inconveniente por acción del clima, lo que permitió llevar a cabo todas las actividades programadas.

5.4. MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

La presente interventoría realizó la respectiva revisión del Informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo entregado por el contratista de obra, lo cual concluye que se aprueba y se entrega para la radicación del mismo



Durante el contrato, se supervisaron las acciones de control de SG-SST, se revisó la documentación del contratista: afiliaciones y pago de seguridad social del personal operativo de obra, exámenes médicos de ingreso y certificados de trabajo en altura. Esto con el fin de avalar el desarrollo de las actividades en las Instituciones Educativas Intervenidas.

5.5. ANÁLISIS GESTIÓN SISO EN OBRA

Durante el periodo se realizaron actividades de obra, en los siguientes colegios:

Actividades y permisos de trabajo en los frentes de obra

No	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	TIPO DE ACTIVIDAD	PERMISOS DE TRABAJO	PERSONAL Y AFILIACIONES APROBADAS	SEÑALIZACION IMPLEMENTADA
1	Newmann B	-Arreglo de cerramientos -Señalización -Reforzamiento estructural	Trabajo en alturas	SI	CUMPLE
2	Alfonso Jaramillo	-Retiro de pintura despegada -Resanes y pintura de fisuras superficiales en muros -Encorazada de remates de muro superior -Dilatación de fisuras profundas estructurales en muros -Relleno de vacíos en muros	No Aplica	SI	CUMPLE
3	Nuevo Horizonte	-Cerramientos -Demolición de enchapes -Desmonte de ventanearía metálica -Aseo y limpieza de la zona de intervención	No Aplica	SI	CUMPLE
4	Cristobal Colón	-Reparaciones en la cocina -Impermeabilización de cielo raso de baños por infiltración de aguas -Colocación de flanche en muro con dilatación.	No Aplica	SI	CUMPLE
5	Julio Flores	-Limpieza de canales -Montaje de estructura de cubiertas	Trabajo en alturas	SI	CUMPLE



5.6. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el contrato, se realizó la revisión del Informe de Gestión Ambiental entregado por el contratista. De esta revisión se generaron las respectivas observaciones que a la fecha ya fueron subsanadas y entregadas a la interventoría. Con base en esto, la firma contratista se encuentra al día con la Gestión Ambiental del Proyecto, y el documento se encuentra aprobado para ser remitido a la Secretaria Distrital de Educación.

6. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Generalidades

La ejecución del objeto del contrato comprende: Ejercer control y vigilancia al cumplimiento de las obligaciones del contratista, frente al desarrollo del contrato de Interventoría el cual debe realizar la inspección apropiada a las adecuaciones, mejoramientos y/o mantenimientos correctivos, exigiendo calidad y oportunidad al contratista, como también prestando colaboración y apoyo permanente para el buen desarrollo de cada sede a intervenir, todo esto en concordancia con los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros establecidos en los compromisos contractuales; incluyendo entre otros la elaboración de los documentos necesarios para la liquidación de los contratos tanto de obra como de Interventoría.

Visitas de postventa de acuerdo con la Ley 80 y apoyo en gestiones del siniestro de los amparos previstos en la garantía única especialmente el de calidad servicio realizado.

Adicionalmente, el alcance del contrato de Interventoría incluye la radicación de la liquidación del contrato de obra en la Oficina de Contratos de la SED y su responsabilidad para resolver todas las observaciones posteriores que surjan en razón de la liquidación del contrato de obra. Lo anterior no incrementará, en ningún caso, el valor ni el plazo del contrato de interventoría.

Aspectos y procesos metodológicos de interventoría establecidos por la sed.

ASPECTO / PROCESO	TÉCNICO	ADMINISTRATIVO	JURÍDICO	FINANCIERO	AMBIENTAL
Control de los procesos constructivos y operativos de la obra	X	X	X		X
Control y acompañamiento en la gestión con las empresas de servicios públicos y demás entidades relacionadas con el proyecto	X	X	X		X
Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista	X	X	X	X	X
Control de la ejecución presupuestal	X		X	X	X
Control de la programación y cronograma de ejecución	X	X	X	X	X
Recibo de los productos derivados de la ejecución del contrato	X	X	X	X	X



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCIÓN, E INTERVENTORÍA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELÉCTRICOS.


El plazo para la ejecución del contrato para cada uno de los grupos involucrados en el presente contrato de interventoría es de 7 meses para ser desarrollados en las localidades de Usaquén y Suba.

DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"
CONTRATO DE OBRA No:	883201 DE 2019
VALOR INICIAL:	\$ 138.152.217
CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL-BOGOTÁ D.C
INTERVENTORIA:	DACAX S.A.S Gerencia, construcción e interventoría de proyectos civiles y eléctricos
NIT:	804.010.094-1
PLAZO DE EJECUCIÓN:	7 MESES
FECHA DE INICIO:	9 DE MAYO DE 2019
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	8 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENIERÍA JG
NIT:	900.281.661-8
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	
ACTA DE INICIO:	9 DE MAYO DE 2019
ACTAS DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
ACTAS DE PRORROGA:	N.A.
OTRO SÍ No.1:	19/07/2019
OTRO SÍ No.2:	28/11/2019
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	8 DE FEBRERO DE 2020
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 189.425.033
ACTAS DE MODIFICACIÓN	
ACTA DE MODIFICACIÓN No 1:	ADICIÓN \$41.557.775 - PRÓRROGA UN MES
ACTA DE MODIFICACIÓN No 2:	ADICIÓN \$9.715.041 - PRÓRROGA UN MES
ASPECTOS FINANCIEROS	
CRP:	2611 DE 29 DE MARZO DE 2019
VALOR ANTICIPO:	N.A.
VALOR FACTURADO:	
NÚMERO DE ACTAS PRESENTADAS:	
VALOR AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	N.A.



6..1 RELACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA

Para el desarrollo del contrato de interventoría, la empresa DACAX conto con el siguiente personal, en cumplimiento a las estipulaciones contractuales:

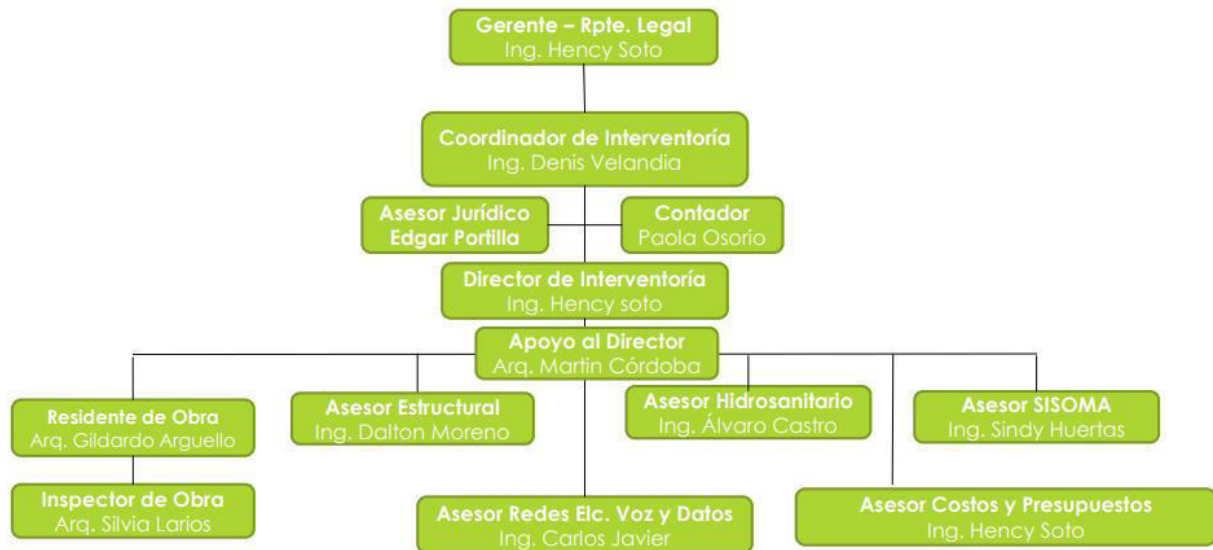

DIRECTORIO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Personal – Contactos:

- Representante Legal: Ingeniero Hency Soto Galvan – Cel: 3173636588
- Coordinador de interventoría: Ingeniero – Cel: 3173636588
- Director de Interventoría: Ingeniero Hency Soto Galvan – Cel: 3173636588
- Residente de obra: Arq. Gildardo Arguello – Cel: 3134689608
- Inspector de obra: Arq. Silvia Juliana Larios – Cel: 3138342496
- Asesor estructural: Ing. Dalton Moreno
- Asesor de Redes Eléctricas Voz y Datos . Ing. Carlos Moreno – Cel: 3124473102
- Asesor Hidrosanitario Ing. Alvaro Castro
- Asesor SISOMA: Syndy Johana Huertas Bejarano
- Asesor de costos y presupuestos: Ing Hency Soto



7. GESTIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Se realizó por parte de esta interventoría, la revisión de cada uno de los ítems que conforman los presupuestos de cada colegio, con el fin de dar las recomendaciones, observaciones y aval a los mismos llevando el control detallado en el avance de las actividades y presupuestos.

Cabe recalcar que los presupuestos son estimados con un porcentaje alto de certidumbre, a los cuales se les fueron realizando el seguimiento y control permanente en obra a fin de garantizar a la SED el cubrimiento de actividades con el presupuesto inicialmente asignado.

- **GESTIÓN SOCIAL**

Para el desarrollo de la gestión social de la interventoría, se realiza el permanente acompañamiento al contratista de obra en todas las actividades concernientes al desarrollo contractual, es así como se participa en recorridos a los colegios y se interactúa con los rectores de cada uno de ellos, con el fin de aportar en la socialización de las labores de obra relacionadas en cada uno de ellos.

Se realiza seguimiento a las comunicaciones que se generan respecto a las obras a realizarse y el cumplimiento de las programaciones ya anunciadas a los rectores, que, en caso de no poderse cumplir con dichas programaciones, se solicita gestión de nueva comunicación, la cual debe ser desarrollada por el contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría y supervisión de la SED.

Se ha realizado también el acompañamiento en cada uno de los colegios con el fin de socializar con personal presente en las inmediaciones de la obra, con el fin de que estén enterados de la seguridad y el respeto por los elementos y cerramientos realizados.

Como resultado no se generó inconvenientes en este aspecto, se cumplieron con las observaciones dadas por la interventoría en el sitio o por medio de las comunicaciones vía email.



8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se indica que a la fecha de este informe final se intervino el total de todos los diecinueve (19) colegios, con apoyo de la supervisión de la SED; cumpliendo a satisfacción con el objetivo del contrato.
2. Se realizaron mesas de trabajo y comités de seguimiento semanalmente junto con el contratista y apoyo a la supervisión de la SED para aclarar los alcances y definir los lineamientos para ejecución de obras en cada uno de los colegios a cargo del grupo 2, para dar un mejor manejo durante y después de la intervención.
2. Los valores presentados como costos unitarios del contratista y aprobados por la SED mediante la adjudicación del contrato fueron la base para la elaboración presupuestal de cada colegio tomando como base los informes de necesidades evaluadas por el gestor asignado y las visitas realizadas de manera conjunta entre contratista e interventoría previas a la ejecución de cada frente de obra.
3. Se contó con el permanente apoyo de la SED para el desarrollo de todas las actividades, como lo son visitas de obras, comités, reuniones con la dirección de cada uno de los colegios, se realizó un trabajo en conjunto con todos los entes y se mantuvo una comunicación conjunta diariamente para mantener una misma sintonía.
4. Se realizó actividades de acompañamiento de parte de la interventoría a las diferentes actividades desarrolladas para el cumplimiento del objeto del contrato, en donde fue requerido realizar ajustes por parte del contratista, para estabilizar los procedimientos de logística, entrega de información para aval, entrada de personal, requerimientos de acabados y calidad de la obra final.
5. La interventoría ha realizado las correspondientes recomendaciones al contratista en cada una de las visitas realizadas a los colegios, manteniendo un registro en bitácoras para su seguimiento y en cada uno de los comités realizados, correspondencia enviada y en los seguimientos ambientales y sociales, también la interventoría hace envío de oficios semanales con recomendaciones, observaciones y solicitudes al contratista con respecto a su avance semanal.
6. Como cumplimiento a las obligaciones contractuales, la interventoría realizó las solicitudes de cumplimiento de normatividad de seguridad y de índole ambiental.
7. Se realizó por parte de la interventoría la revisión previa de las actividades terminadas de obra, para verificar su calidad y proceder a una entrega final al cliente (SED-COLEGIO)



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCIÓN, E INTERVENTORÍA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELÉCTRICOS.*

ANEXOS

Anexo 1. Actas de comité y visitas de obra

Anexo 2. Aportes parafiscales DACAX SAS

Anexo 3. Bitacoras.



MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

COMITÉ de obra No. 01

CÓDIGO:
F-GER001-05

FECHA:
2019

Pag. 1 de ____

LUGAR: Colegio Gustavo Morales Sede A Hora inicio: 9:00
CIUDAD: Bogotá DC Fecha: 12/05/19 Hora Fin: 4:00

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
CESAR MONTANA	RESIDENTE	
KAREN ESQUERRA	RESIDENTE HSE	
ANDRES PINZOL H.	INTERVENCIÓN DACAX	
German Villalba Clavijo	Coord. Proyectos	
JAMES GARCIA C	DIRECTOR PRODEIN	
Silvia Juliana Larios M.	INSP. Intervención	

OBJETO DE LA REUNION

Se realiza recorrido de obra a los frentes en intervención (Colegio Gustavo Morales, Colegio Usaquen, Colegio la Gaitana y Colegio Julio Florez) en compañía de supervisor de la SED Arq. Carol Nieto, PRODEIN J6 SAS y DACAX SAS. Para revisión de Avance y Definición de Actividades.

1. Colegio Gustavo Morales Sede A:

La Secretaria da el aval a la decisión de instalación del Mortero impermeabilizado para placa de cubierta (Biblioteca) y así sellar las grietas identificadas y evitar filtraciones de agua al interior de la biblioteca.

2. Colegio USAQUEN:

Se hace revisión de las 2 Áreas en ejecución por Actividades de compactación del relleno y la Toma de Muestra de densidades. Los niveles y el tipo de Material ingresado.

El Equipo Ambiental de Intervención da recomendaciones para el cerramiento de ambas zonas y los EPPs del personal, al igual de la solicitud de listado de ingreso del personal.

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
3.	colegio Julio Flores: Se realiza reunión con el sector y almacenista para aclarar Actividades a realizar, Procedimientos y tiempos de ejecución.				
	Nota: El acta de dicha reunión esta en otro Anexo.				

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

4. colegio La Garrafa:

- Se define ampliación (1,00m) de placa en zona de Jardinera para Tener un Aislamiento mayor y circulación Perimetral de las casetas.
- El contratista hace reunión en situ del Despiece estructural y Armado de vigas de Borde de la placa.
- La interventoria da recomendaciones con respecto al componente Ambiental, en cuanto al cerramiento en Lona, y al retiro del Material Sobrante (se solicita el pin. ambiental, certificados de volquetas y certificados de escombreras)



MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO: F-GER001-05	FECHA: 2019
Pag. 1 de ____	

LUGAR: Gran Estación	Hora inicio: 9:30
CIUDAD: Bogotá DC.	Fecha: 28/06/19. Hora Fin:

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carli Nieto Garmen	Apoyo Supervisión SED	
ANDRES PINZON H.	INTERVENTORIA.	
Karen Esquiverra	SJT	
German Villalón C.	Coord. PRODEIN SG	
CESAR MONTAÑA	RESIDENTE	
Lidia Diaz P.	SISOMA	Lidia Diaz P.
JAVIER GARCIA C	R/L PRODEIN	

OBJETO DE LA REUNION

→ Hacer reunión sobre el pago de los estudios realizados por el Contratista. (Estudios y tramites).

Colegio Friedrich Naumann:

- Se define Tablero y posición de estas para Muro (Formato y color).
- " Se solicita hacer una Actualización de presupuesto y cantidades de los Colegios de la Fase 1 y Fase 2 "
- Interventoria Trabaja en conjunto para la medición y revisión de Cantidades de los colegios intervenidos, Esto se le radicará a Interventoria para una ultima revisión.
- Los APOS no es necesario su entrega para la radicación de Acta No. 01 del Contratista.

→ Se propone intervenir al Colegio Julio Florez Sede B para la última Fase del contrato.

Para la definición presupuestal del colegio Julio Florez se debe hacer un Balance General del contrato.

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
1.	• Se solicita Ajuste de perfiles y	CONTABILISTA.			
	ubicacion de pto. de la Toma de				
	Muestra en el Informe del estudio				
2.	de suelos.				
	se solicita definir Alcanje del c. casobal	SED			
3.	colón por parte de la SED.	CAROL.			
	Definir Actividad y alcance sobre	SED.			
	el colegio Rep. Dominicana.				

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

4. Se realizó visita con Asesor Estructural de la SED, No se ha definido el Alcanje real para el Col. Nuevo Horizonte. SED.
- Se debe evaluar el reforzamiento estructural.



MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

Comité 3

CÓDIGO:
F-GER001-05

FECHA:
2019

Pag. 1 de 2

LUGAR: Gran Estación / Secretaría de Educación.
CIUDAD: Bogotá DC.
Fecha: 12/07/19.
Hora inicio:
Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Javier García Cabellos	Director Prodein	
Carol Nieto Carmona	Apoyo a la Supervisión	
Silvia Juliana Larios	INTERVENIENTE DACAX	

OBJETO DE LA REUNION

- Friederich Naumann: Fecha de Entrega Lunes 15/07/2019 (Bienestar)
 - Queda pendiente la instalación de cáncamos (5 días hábiles)
 - Queda pendiente el suministro e instalación de campana.
 - El contratista está en el proceso del Gas Natural (30-40 días)
 - (Programar la actividad un fin de semana desde el viernes para no interferir con las actividades escolares.) "Definir fecha"
- Gustavo Morales: Ya se dió inicio en montaje de cubierta, la entrega se proyecta para el 22 de Julio
- Ramon Zebina: Se programa entrega Aproximada para el 25 de Julio
- La Barranca: Se debe definir Tipo de puerta de ingreso en Ambas Areas y la Ventanilla. (Ver especificaciones enviadas por Carol)
 - Dentro de las especificaciones las puertas deben tener rejilla superior e inferior con Anjes (Lisa).
 - Se proyecta la entrega de la Barranca para Aproximado al 31 de Julio.
 - (Pendiente puerta y Ventanilla).
- Como solicitud de la rectora Se hará el montaje de muro de cerramiento en zona de Baño.
- Virginia Gutierrez: la Fecha estimada de entrega esta entre (22/25 Julio) se realizara visita previa de entrega.

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
1.	El Contratista se compromete a hacer entrega de "APUS" el 19 de Julio a Interventoria para revision y radicación (22 Julio) a la SED.	Contratista. Prodein J6 SAS.			
2.	• Gerardo Molina - Se estima una entrega para el día (25 Julio).				
3.	Se realizará visita a Ramon de Zubira miercoles 17 Julio//.				

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

- **NOTA:**
 - Se programa recorrido de obra para el 19 de Julio para revisión previa de entrega.
 - ~~Gerardo Molina~~ ~~Person de Zubira~~: Cambio de piso deteriorado y reposición de bochillo en zona de Marmita.
 - "FASE 3"
 - Cristobal Colon
 - Julio Florez A
 - Naumann B.
 - Nuevo Horizonte (pendiente inicio según visita de estructural de la SED)
- Se debe programar visita con rectores. (Miercoles 17 Julio)
- Se debe programar visitas previas en los cuatro colegios de la adición. (Después de entregas Fase 1 y 2), primera semana de Agosto.



MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO:
F-GER001-05

FECHA:
2019

Pag. 1 de ____

LUGAR: Secretaría de Educación
CIUDAD: Bogotá DC

Fecha: 26/07/19

Hora inicio:

Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Silvia Juliana Canes	Inspector	
Janolyn Valencia	Directora Int.	
Andrés Pinzón	Residente	
Germán Villalba Clavijo	Coordinador	
Janier Barco (abst.)	Director Contratación	
Carl Nieto Carmona	Apoyo Operación SED	

OBJETO DE LA REUNION

Comité N° 4.

- Friedrich Naumann: No se ha realizado entrega final de la cocina por observaciones en la rejilla del carbón, se debe subsanar esto y proceder a la entrega a compensar, se estima una entrega el día 29/07/19. (Pendiente Trámite y obra civil de Gas Natural). **Entrega PARCIAL Lunes.**
- El contratista de suministrar e instalar 6 reguladores, esta instalación se hará cuando se haga el cambio de medidor.
- Colegio Obispo: Se estima entrega final de la obra el día lunes 05 de Agosto a interventoría y se cuada entrega al rector.
- Colegio Gustavo Morciles: Se estima la entrega el día lunes 29 de julio a las 9:00 am.
- Colegio Virginia Gutierrez: Entrega final Lunes 29 de julio al rector.
- Ramon de Zubira: Los pendientes observados ya han sido subsanados para generar la entrega al rector. (se hará revisión el día lunes 29)
- Gerardo Molina: Se proyecta entregar el lunes la cocina y el miércoles se revisará la biblioteca para verificar el estado.

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
1	Se debe radicar el "no preuso" con Fecha de 26 de julio.	Contratista.		X	
2	Se solicita balance General de presupuesto	Contratista.		X	
3	La Secretaria solicita dar inicio del Colegio Julio Jaramillo a mas tarde en 15 días.	Contratista.		X	
	"Pendiente revisión de Trámites electrónicos por parte de la SED"	SED.		X	

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

- La Canara: se realizará recorrido de revisión el día 5 de Agosto para programación de entrega con Directivos.

FASE 3.

- **Cristobal Colón**: se dió inicio de Actividades el día 25 de Julio.
- **Naumann B**: Se realizarán levantamientos previos para iniciar diseño y fabricación de cubierta.
- **Julio Fbriez A**: se dará inicio de Actividades preliminares el día 27 de Julio.



MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

Comité N° 05 / parte 1
Reunión comité.

CÓDIGO: F-GER001-05	FECHA: 2019
Pag. 1 de 4	

LUGAR: <u>Secretaría de Educación</u>	Hora inicio:
CIUDAD: <u>Bogotá</u>	Fecha: <u>8/08/19</u> Hora Fin:

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carl Nieto Garmen	Apoyo Supervisión SED	<i>[Firma]</i>
CEGAR MONIANT	RESIDENTE USAGET	<i>[Firma]</i>
JUVIER BORRERO C	PRODEIN J.G. E/L	<i>[Firma]</i>
German Villalba c.	Coord. Proyectos	<i>[Firma]</i>
ANDRES DIAZ	RECUP. Intervent.	<i>[Firma]</i>
Jaudine Velez	Directora Cut	<i>[Firma]</i>
Silvia Juliana Larios	INS. INTERVENTORIA	<i>[Firma]</i>

OBJETO DE LA REUNION

1. COCINAS:

• La Supervisión de la Sed expone las observaciones por parte de Compensar en cuanto a acabados, esto se debe subsanar de manera Total, sin embargo la Actividad de las cocinas no se va a frenar. Las Actividades a subsanar dependen del informe de compensar y así el contratista genera su plan de trabajo y si es viable iniciar actividad.

• El contratista al realizar las obras definió atacar el problema de Filtraciones de agua, teniendo en cuenta la parte estética en un Segundo plano.

Se solicita revisión por parte de SED, Interventoria y Contratista para Verificación de Acabados Arquitectónicos para una entrega Final sin observaciones posteriores.

Jueves 08 Agosto

• Friedrich Naumann: se debe verificar el regulador de Gas, el contratista realizara visita el día Viernes 9 Agosto para regulación de Gas, se solicita visita en conjunto con compensar y Almacenista. "Cambio de medidor, regulador, y cambio de reguladores en cocina # de todos los pto. de Gas"

"La casilla se instalará el Lunes 12 de Agosto"

• Se realizara Protección Provisional al día de hoy 8 de Agosto.

PRODEIN comunicará a la Interventoria la Fecha de instalación de reguladores.

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
01	COL Gerardo Molina, se hará entrega	Contratista			
	Final el día viernes 16 de Agosto.	PRODEIN.			
02	SE incluye reparación de baldosas	PRODEIN			
	DE VENTANA DE CUBIERTA DE BANDEJAS				

- **COL. USACQUEN**: Están pendientes el suministro de las Materas y bancos para realizar entrega final. (Se programa entrega final) a interventoría el día miércoles 1/0 viernes, pendiente confirmación por parte de PRODEIN.
- Se solicita Definición de TIPO de Vegetación por parte de Asesores Ambientales.
- **La Gaitana**: queda pendiente parte eléctrica, instalación de lámparas, ornamentación, falta instalación de puntos hidráulicos. (el contratista manifiesta que se subcontrató 10 días hábiles) se estima finalización de obra el día 23 de Agosto.
- La observación por parte de la interventoría en cuanto a la instalación de las puertas, se debe cortar la cerámica en Área de Perfiles y Marco de las puertas para evitar daños futuros.
→ se solicita fabricación de cerca para Jardinera.
- **Virginia Gutierrez**:
El rector debe recaudar la póliza de la SED para el daño de computadores por un corto eléctrico.
El día Jueves 15 de Agosto se realizará reposición de VIDRIO ROTO.
- **Gustavo Morales A**: queda pendiente reposición de libros, el contratista hará entrega de libros al colegio el día Jueves 15 Agosto.
se programa intervención de Placa / cubierta en interior de Biblioteca para semana de receso. ó para el fin de semana. (19 de Agosto)
La Actividad se realizará entre el 16 y 19 de Agosto "raspaje y pintura"



MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

Comite No 05 / Parte 2.

CÓDIGO:
F-GER001-05

FECHA:
2019

Pag. 4 de 4

LUGAR: Secretaría de Educación Hora inicio: 3:00
CIUDAD: Bogotá DC Fecha: 8/08/19 Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carl Nieto Garmora	Apoyo Operativo SED	C.N.T.
CEAR MONTAÑA	RESIDENTE PRODEIN	
Javier Garzón C.	PRODEIN J.6 R/L	
Germán Villalba C.	Coord. Proyectos	
ANDRES PUNZAL H	RESIDENTE Intervent	
Paolino Valencia	Directorio Cuf.	
Olivia Juliana Larios M.	INS. INTERVENCIÓN	

OBJETO DE LA REUNION

Se realiza comité de obra en conjunto con contratista PRODEIN J.6 SAS, la Supervisión de la SED y DACAX SAS.

Friedrich Naumann Sede B (Cubierta) y Julio Flores A

Se solicita cubrimiento de placa para evitar filtraciones a la Placa del Salón Inferior. Tan pronto se realice reforzamiento estructural, se hará cubrimiento de la cubierta con plástico.

Cristóbal Colón: El contratista expone que se hará entrega de toda la tubería desmontada a la SED, soportando el cambio total de las redes. (se debe hacer entrega como activo al colegio).

Nota: Si el día lunes 12 de Agosto no se realiza la entrega de la primera Barrera Sanitaria, se deben suministrar 12 Baños portátiles (El día sábado se quitaron 6 Baños portátiles).

Nuevo Horizonte: Se solicita inicio de intervención los días sábado y domingo (10 y 11 Agosto) para Aseo y limpieza. Se programa inicio de obra el día 20 de Agosto.

Se programa reunión Miércoles 14 de Agosto para revisión de Balance de Pase General del contrato.

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
01	Queda pendiente reunion con	PRODEIN.			
	Asesores electricos al colegio	DACA X			
	Alfonso Jaramillo para definir	SED.			
	Alcance. (confirmacion carol)				



MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

Comité G.

CÓDIGO: F-GER001-05	FECHA: 2019
Pag. 1 de ____	

LUGAR: <u>Secretaría de educación</u>	Hora inicio:
CIUDAD: <u>Bogotá DC.</u>	Fecha: <u>22/08/19</u> Hora Fin:

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Silvia Fulciana Rarios	Inspector	<i>[Firma]</i>
Jaqueline Valencia	Directora	<i>[Firma]</i>
Carol Nieto Carmona	Apoyo Supervisión SED	<i>[Firma]</i>
CESAR MONTAÑA	RESIDENTE	<i>[Firma]</i>
Sanjaico Sanchez R	Director de Proyectos	<i>[Firma]</i>
Jaime Garcia Cabezas	PRODEIN S.A	<i>[Firma]</i>

OBJETO DE LA REUNION

- Se revisan los pendientes que se habían identificado en el comité anterior para aclarar fechas.
- Gerardo Molina - los pendientes quedaron subsanados y entregada la Cocina a compensar, sin embargo hay una zona con problemas de filtración en un Área que no se interviene por estar sellada, se debe programar arreglo de esto por parte de PRODEIN. (Queda pendiente entrega final al colegio).
 - Virginia Gutierrez: Quedó subsanado la reposición del vidrio, el día Martes 20 de Agosto, falta programar entrega final.
 - Friedrich Naumann A. - los pendientes de instalación de rejilla y regulador quedaron subsanados el día 14 de Agosto, el rector solicita arreglo de rejilla de regulador antiguo (Pendiente verificación por parte de PRODEIN) día 27 de Agosto.
 - COL. USACUÉN: las Materas ya fueron instaladas, falta definición tipo de Vegetación. (Queda pendiente fecha de entrega de vegetación "NOVIOS MARIYA, ROSY BLANCA")
 - La Gaitana: Al día de hoy 22 de agosto, se termina la instalación de la ornamentación y aseo del área, para el día Lunes 26 de Agosto se realizará pre entrega con la rectora.
 - Se realizó corre de enchufe en los vanos de Puertas, como recomendación de intervención.

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

• Ramón de Zubira: Se programará visita con compensar para definición de actividades pendientes y definición de prodein de ejecución. (Falta fecha de visita por parte de la arquitectura coral).

• Gustavo Morales: se hizo entrega de libros de reposición (queda pendiente la Solicitud de Almacenista de facturas de compra de libros) (queda pendiente entrega final al colegio).

FASE 3:

• Cristóbal Colón: se Finaliza obra de Baños de segundo piso, la entrega parcial se programa para el día 23 de Agosto.
el vidrio se instalará en jornada sin estudiantes (pendiente).

• Falta definición del tipo de ejecución en zonas de pasetas.
• la instalación del cielo raso en superboard (con cajilla de inspección).
" Esta actividad se realizará al momento de Terminación de Baterías)
Las Baterías del primer piso se entregan el 06 de Septiembre, y la entrega final a inventaria y Supervisión SED el día 13 de Septiembre.
→ la Terminación de las pocetas y cielo raso Aprox el 10 de Septiembre.
→ El push que estaba sin funcionamiento, se le hizo mantenimiento evitando Cambio de Aparato.



MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

Comité 6

CÓDIGO:
F-GER001-05

FECHA:
2019

Pag. 1 de ____

LUGAR: Secretaría de Educación
CIUDAD: Bogotá DC

Fecha: 22/08/19

Hora inicio:

Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Silvia Juliana Larios	Inspector	<i>[Firma]</i>
Sandra Valencia	Directora	<i>[Firma]</i>
CESAR MONTAÑA	RESIDENTE PRODEIN	<i>[Firma]</i>
Carlos Sánchez R	Prodein SAS	<i>[Firma]</i>
Carol Nieto Camacho	Apoio Supervisión SED	<i>[Firma]</i>

OBJETO DE LA REUNION

- Friedrich Naumann B : queda pendiente desmonte por parte de PRODEIN y entrega de activos a almacenista.
- la llegada de cubierta esta programada para el día 23 de Agosto y se le dará aviso de esto al colegio previamente.
- El montaje de la cubierta iniciará el día sábado 24 de Agosto.
- No se han podido realizar trabajos con el horario predeterminado para el rendimiento y poder adelantar el cronograma debido a las restricciones de horarios de trabajo que informó la rectora de este colegio. Se elevará consulta por parte de la Secretaría para poder gestionar amplitud de permisos.
- Nuevo Horizonte : Se realizó limpieza del área.
- Se entregará diseño el día Martes 27 de Agosto.
- Se estima inicio de obra el 02 de septiembre.

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
	Se debe enviar documentación de estudio de suelos "APIQUES" a la interventoría del colegio Julio Fbraz B.	PRODEIN.			

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

• Julio Fbraz A: se inicia con instalación de cubierta el día de hoy 22 de Agosto con finalización de montaje el día 28 de Agosto, Apenas se termine montaje se inicia actividad eléctrica y se realizará entrega final el 06 de Septiembre.

• PRODEIN evaluará los daños provocados por la ejecución de la obra, para subsanar dichos daños.

• Alfonso Jaramillo : Se inician levantamientos.

• Villa Elisa sede : se iniciaron levantamientos

FASE 4:

• Queda pendiente programación de colegios "Nuevo horizonte, Julio Fbraz B, Republica Dominicana y Gustavo Morales B)"

→ Se debe programar visita a los colegios de ultima fase para verificación de Alcance de obra

NOTA:

• la Fase 4 consta de "(Nuevo horizonte, villa elisa A, Pado Veranego y villa Elisa D")



MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO:
F-GER001-05

FECHA:
2019

Pag. 1 de ____

LUGAR: Secretaría de Educación / Reunión solicitud. Hora inicio: _____
CIUDAD: Bogotá DC. Fecha: 27/08/19 Hora Fin: _____

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jaime García C	D/L PRODELIN JBSA	
Silvia Larios N	Inspector	
Gildardo Argüello	Presid. Interventoría	
Carli Nieto Camacho	Apoy. Supervisión SED	
Sandra Valencia	Directora Int.	

OBJETO DE LA REUNION

Se realiza reunión con el contratista y la supervisión de la SED, para dar reporte de pendientes y hacer los debidos requerimientos de calidad de las obras.

Se le entrega OFICIO por parte de la Interventoría, donde presentamos el reporte general evidenciado en las visitas de obra, los cuales se deben subsanar para evitar futuros inconvenientes en las entregas de cada frente.

Se le da aviso al contratista que no se hará cobro de la cobertura del Colegio Julio Flores A, por tener imperfecciones en su instalación.

En cuenta a los Bitacoreros, se les reitera Tener Bitacora de obra en cada una de las frentes de obra, para que las observaciones de interventoría y supervisión de la SED queden evidenciadas en el libro.

De igual manera se envían los pendientes a subsanar de cada frente de obra, para poder concluir y cerrar Fase 1 y 2.

También se solicita retomar la entrega de la programación semanal de las obras, los días Lunes a primera hora, para que la supervisión esté al tanto y organice recolección con base a eso.



MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

Fecha:

Pag. ____ de ____

ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
01	En el colegio se evidencia un problema estructural grave, en muros portantes, Talud y zona de parque, se revisará con el estructural de interventoría para definir el tipo de estructura de refuerzo que se hará.	DACAX.			
02	Gustavo Morales: Prodein debe hablar con Almacén para la entrega de los Frascos (19 de septiembre).	PRODEIN.			
03	Colegio USACUEN: se evalúa la intervención para la dirección local, la SED no da aval para dicha intervención.	SED.			
04	Gerardo Molina: se define que las actividades pendientes se realizarán en la Semana de receso escolar.	PRODEIN.			
06	República Dominicana: Definir alcance de la ejecución de la obra.				
	→ Pendiente reunión con representante legal y los demás partes del contrato.				
07	Nota = NO se hará ningún desmonte de estructura/cubierta de reforzamiento hasta que el material este en el sitio. Para el día lunes 16 septiembre se deben suministrar 2 baños portátiles y arreglo de Cerramientos. Para el día de hoy 13 de septiembre la interventoría presentará respuesta con respecto a la estructura.	PRODEIN.			
		DACAX			
09	PRODEIN debe presentar programación previa el día lunes.				

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

PRODEIN hace entrega de los bitácoras de (Usaquen, Gustavo M sede A, Ramon de Abinca, Friedrich Abumain Sede A, La Gaitana Sede B)

NOTA: El contratista está a espera de la Aprobación de los MP enviados al Ing. Henry Soto.



MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO:
F-GER001-05

FECHA:
2019

Pag. 1 de ____

LUGAR: Secretaría de Educación

Hora inicio: 1:50

CIUDAD: Bogotá DC

Fecha: 18/09/19

Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Henry Soto	Rpta Intern	
Germán Villalba C.	Coord. PRODEIN	
CESAR MONIANA	RESIDENTE PRODEIN	
Silvia Larios	DACAX SAS	
Daniel Barua L	Prodein 36 SAS	
Antonio Sanchez	PRODEIN SAS	
Gildardo Arquiello	Resid. Interventoria	
Carl Nieto Gamero	Apoy Supervisor SED	

OBJETO DE LA REUNION

- Reunion con Representantes locales:
- la Supervisión de la secretaria expone la problemática con respecto a los Colegios Julio Florez A, Friedrich Naumann Sede B y Nuevo horizonte.
 - la Interventoria expone los conceptos recomendados por el Asesor estructural de DACAX.
 - Se evidencia que el planteamiento de DACAX para dar solución a las estructuras de Friedrich Naumann B y Nuevo horizonte. Sede C para dar inicio inmediato (estos frentes ya pueden ser retomados)
 - Se debe buscar la solución mas eficiente con respecto a la estructura y cubierta en el Colegio Julio Florez Sede A.
 - Se revisan los planteamientos de solución estructural del colegio Julio Florez Sede A con PRODEIN, llegando a un acuerdo mutuo, el cual será enviado el día de Martes 19/09/2019.
- Nuevo Horizonte: se debe continuar la mampostería existente, andándose con la viga de cimentación y la corona existentes con sus respectivos apoyos para la unión del concreto existente. (refuerzo metálico) así se evita demolición de Muro de mampostería existente.
- la cubierta debe tener mas algarave en los remates.
 - PRODEIN expone otro tipo de solución de confinamiento exterior del muro con malla vena.
- Julio Florez A: Interventoria expone la recomendación de Reforzamiento estructural con cerchas metálicas, eliminando los pilares existentes y los Apoyos sobre las vigas de borde. (readando las correas existentes) que no estén torsionados, la Interventoria avala esta propuesta.

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
01	Se debe calcular que tipos de perfiles				
	y cerchas se deben utilizar. y revisor	PRODEIN.			
02	Presupuestal.	DACAX.			
	Hacer cronograma de Trabajo para				
03	retomar colegios (Neumann B, Nuevo	DACAX			
	Horizonte y Julio Florez (en revision))	PRODEIN.			
	Se realizará replanteo y alcance de				
	Actividad el día de mañana 19 de	DACAX			
	Septiembre en el colegio ALONSO J	PRODEIN.			
	Jaramillo y Nuevo Horizonte (9:00 am)				

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

• Colegio Alonso Jaramillo: Interventoria reviva presupuesto con el Alcançe principal de resacas, pinturas y cambio de Tegs derriadas.
Se recomienda hacer vibración interna y externa de las zonas con fisuras. Se estima inicio de obra Viernes 20 Septiembre.

PRODEIN se encargará de hacer revisión presupuestal y definicion con respecto a las recomendaciones dadas por interventoria con respecto a los colegios (Julio Florez) Lunes 23 de Septiembre.

Lunes 23 de septiembre 2:00 pm reunión con los Asesores estructurales en sitio Col. Julio Florez y Friedrich Neumann B.



MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO:
F-GER001-05

FECHA:
2019

Pag. 1 de ____

LUGAR: OFICINA DACAX SAS.
CIUDAD: Bogotá DC.

Fecha: 03/10/2019

Hora inicio:

Hora Fin:

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Javier Barua C	RL PRODEM J6 SAC	
Germán Villalba C.	Coord. PRODEM J6	
CESAR MONTANA	RESIDENTE	
Gildardo Arqueño	Residente Interventor	
Carl Nieto Carmona	Apoyo Supervisión SED	
Silvia Larios M	INSPECTORA DACAX	
Antonio Sanchez	PRODEM J6	

OBJETO DE LA REUNION

Comite No. 08.

Se realiza comité de obra y seguimiento de todos los frentes en ejecución en conjunto con PRODEM, Secretaria y DACAX.

Col. ALFONSO Jaramillo: Prodem expone una propuesta de Acabado para los muros para mejorar el aspecto de cada uno de las áreas, dándole una terminación de muros lisos evitando así las fisuras y zonas sueltas de pintura.

El producto se basa en una mezcla hecha en sitio (imprimante acional textuco Tradicional) y para las dilataciones usar una malla cinta para darle mayor eficiencia.

- Se tiene en ejecución las 13 Aulas.

- Rescos en 8 Aulas.

- Cambio de tejas en 13 Salones.

PRODEM evaluará esta propuesta con respecto al presupuesto / balance. para dar inicio a las actividades de Acabados.

- En el salón No 2 NO se realizará cambio de Telas con Tomillera, ya que NO presenta Filtración en las 56 Tejas de Asbesto.

- Dentro del presupuesto se debe incluir la pintura del tejado interior.

- Prodem presenta propuesta esquemático del cerramiento, se debe evaluar la propuesta con respecto al balance y definir el Alcance en la cantidad.

Nuevo Horizonte:

- Se evidencia el Muro en Nampostería reforzado.
- Se hará reforzamiento en Vano de Ventana. (se da inicio el 02 de octubre).
- Se replantea Diseño arquitectónico en sitio.
- Se plantea red paralela únicamente para batería de baños conectando a la red existente. (avalado por inventaria y la sed).
- Prodein plantea propuesta de ubicación de tanque de Almacenamiento (columna y plancha) sin interferencia con la cubierta.
- Prodein evaluará flanche para cubrimiento de espacio lateral al baño.
- Se debe sentar presupuesto real con los cambios realizados (Diseño y estructura).

Naumann B.:

- Se inicia montaje de estructura de zona oriental (sura norte). Salón y medio.
- Todos los perfiles se encuentran cortados y pintados listos para montaje.
- Se debe verificar nivelación.
- 5 Trabajadores en sitio.
- para el montaje de Teja se realizó cambio de cuadrilla.
- Dependiendo del clima se realizará montaje de Teja con revisión previa de inventaria.
- Prodein manifiesta que se debe hacer cambio de canal para funcionamiento del NUEVO tipo de Teja.
- Se hará revisión de estructura de Apoyo en el salón aislado, para evaluar el tipo de estructura para soportar la cubierta nueva tipo Sandwich.
- SE Estima finalización de instalación de cubierta el Martes 08 de octubre, dependiendo el clima y así dar inicio a la parte eléctrica. (2 semanas).
- presentar contingencia para recubrimiento de la placa en horas nocturnas para evitar filtraciones a los salones inferiores.

CRISTOBAL COLÓN:

El compromiso con el colegio es de entrega el día Martes 15 de octubre.

- la red de los Tanques se hará arbolada en el muro y no por piso. (para garantizar la impermeabilización).
- la tubería de los Tanques está acoplada al piso.
- Prodein debe presentar el NP de las estibas plásticas.
- dejar colchon en el presupuesto.
- la tubería de los tanques será totalmente nueva desde el bypass.
- Haciendo el cambio en cubierta, Prodein tendrá la garantía total desde cubierta

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica
primer piso. (Baños):

- Impermeabilización de 3 capas, son transitables. (en FII) SIKAFI power 12 años. (Si esta actividad no esta contractual debería hacerse NP), (Si el acabado es similar a la impermeabilización se podría evaluar)
- Se debe verificar que la filtración no intervenga con la red de enfriamiento porque contractualmente esa red no se debe intervenir. (estas actividades se estiman entre el día 15 de OCT). (Cocina)

Nota: Prodein presentara programación de actividades para la Semana de receso. (04 de Octubre). (col. Ramon de Zubiria, Gerardo Molina, Gustavo Morales B)

- revisar NP de destronque. (Incluir estas Actividades de receso en el balance General)
- revisar filtración de sótano nueva. en sótano (Ramon de Zubiria).

Julio Flores Sede A:

- Se iniciaran Actividades de replanteo.
- Ingreso de Material y equipos.
- Se debe revisar Tonalidades en cada zona. (2 colores).
- se va a desmontar cubierta en el momento que la estructura nueva de reforzamiento ya este instalada. (se estima que los Trabajos se realizan en horas del día). Teniendo en cuenta la contingencia de recubrimiento de cubierta por lluvias.

Naumann A.

- pendiente cambio de reguladores (se espera razon por parte de la sed).
- pendiente entrega por parte de la sed del recibo de Gas.

Gustavo Morales B se debe entregar el 01 de diciembre, para aprovechar el suministro e instalación de parque infantil.

- Acabado en piso caucho, Mejoramiento de piso con Acabado rustico.

Julio Flores B:

- Se realiza visita con especialista, recomendando levantar capa de Asfalto, hacer reparación en la subbase y Fundida, dando un Acabado en concreto.
- Prodein esta evaluando el tipo de concreto para saber el tipo de Macrofibra o microfibra. se utilizará.
- Acabado esmaltado + pintura de demarcación.

[illegible]



MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO:
F-GER001-05

FECHA:
2019

Pag. 1 de ____

LUGAR: OFICINA DACAX

CIUDAD: Bogotá DC.

Fecha: 24/10/2019.

Hora Inicio: 9:30

Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JANER GARCIA C	RIC PRODEIN J6 SAJ	
Gertrudis Sanchez	Prodein J6	
Germin Villalba C.	Coord. PRODEIN J6	
CESAR MONTAÑA	PES. PRODEIN:	
Silvia Larios	INSPECTORA INTERVENTORIA	
MARTIN RAFAEL GONZALEZ B	APOYO INTERVENTORIA	
Cap. Nidia Garmora	Apojo Supervisión SED	
Filidardo Argüello	Resid. Interventoria	

OBJETO DE LA REUNION

Comite N° 03.

- la interventoria recomienda al contratista socializar cortes semanales del avance de obra.
- Nuevo Horizonte: la propuesta de Acabados fue aceptada por la SED, el compromiso es entregar 6 salones terminado (3 muros) el día 28 de octubre para ingreso de contrato de la parte eléctrica, cada salón terminado se debe entregar parcialmente a la SED.
- Interventoria evidencia en sitio el acabado del estuco tradicional, sin problema en los salones intervenidos, el Acabado de pintura de cubierta se implementa los materiales enser.
- Prodein presenta propuesta de cerramiento para la parte perimetral del colegio, se debe evaluar con respecto al balance.
- Se recomienda a Prodein incrementar cuadrilla para avanzar en la entrega de los 13 salones.
- Se debe realizar una acometida para conexión de Tanques aboños, evaluar esto con respecto al balance, ruta de Acometida llevar por zona Verde. (150 m Aprox)
- Nuevo Horizonte: La Tubería Sanitaria Externa se debe evaluar para cerramiento de esta, para evitar que quede a la vista. (Se propone realizar visita para definición de dicha actividad)
- Muestra de Mesón en Bronce (Rojo y Azul) Día Lunes 28 de octubre.
- Villa Eliza A. Adelanto de demolición de muros, replanteo del dueño de Bomas, se encontró red Sanitaria doblada, se de evaluar la Nueva red Sanitaria, esta Actividad se debe incluir al presupuesto y evaluar en el balance, se definió diseño Arquitectónico inicial avalado por la SED.

Prodein expone un desfase de 50 millones en el balance General, en las siguientes Actividades:

- Julio Florez A: Aterrizajes eléctricos y reubicación de puntos/red de datos. (5' mil)
- Julio Florez B: Tipo de recubrimiento y mepramiento de la cancha; incrementándose el Presupuesto inicial.

Nota: Se identifica que el derroche de la subra de presupuesto se da por el Punte de Adherencia (puente de Adherencia 34 millones)

- Gustavo Morales: Puente de Adherencia. (3 millones), se debe evaluar piso vinilo para Exteriores, se debe programar visita al colegio con proveedor para Verificación de Superficie.
- Ramon de Zubina: Con respecto a las Actividades Adicionales, se incrementa el presupuesto (8 millones Aprox)

Nota: Programar recorrido contratista e interventora para definición final de alcances que faltan en los colegios en intervención y próximos a intervenir, para evitar desfases futuros.

- " — " — " — " — " — " — " — " — " — " —
- Julio Florez B: Evaluar actividad de reparcheo en toda el Área de la cancha, pintura y demarcación, Mepramiento de fallas, Manteniendo la distribución de juegos proyectados. (se proyecta inicio de la obra para el 15 de Noviembre)
Prodein evaluará propuesta presupuestal para bajar costo de desfase.

Julio Florez A: se estima entrega de obra civil superior para el 15 de Noviembre.

- Prodein plantea opción de remiendo en cubierta de biblioteca, Tapando orificios con Perfiles Metálicos Tipo cmra. (Presentación 28 de octubre).
- Se hará visita con estructural, Prodein y Parax para mepramiento de soldaduras.

Nota: viernes 25 de octubre.

- / visita de Gustavo Morales a: 30 am con proveedor de piso caucho.
- / Entrega Colegio Cristóbal Colón y revisión previa de interventoría.

Friedrich Naumann B: Prodein realizará verificación de red de cables existentes, dependiendo de esa definición de parte eléctrica (2 semanas) Se estima entrega Parcial de 3 Aulas para 8 de noviembre.

El Aula Aislada se inicia el 11 de Noviembre con Actividades estructurales y cambio de cubierta. (3 semanas).

Friedrich Naumann A: los equipos llega entre 2 y 3era semana de Noviembre, se deben instalar reguladores de equipos existentes y el Medidor (4 reg.)

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

(Equipos encina, marmita, plancha y bato manta).

ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
01	NP Faltantes por cobrar = - Cerroamiento, Medida acra en pvc, es- tibas plasticas, lavaplatos en Acero inoxidable, Desatorque y emborquillado, rejillas para carrocerias en pvc, Trami- te y regulador de Gas.	PRODEM.	/	/	/
02	Enviar presupuestos y presentacion de Col. Julioflores sede B. (Viernes 25 de octubre).	PRODEM.	/	/	/
03	Fecha maxima de radicacion de Acra N° 05 = 8 de Noviembre.	DACCX	/	/	/
04	DACCX debe entregar correccion de parte financiera hasta el mes de septiembre y el informe de octubre. (01 de Noviembre)	DACCX	/	/	/
<p>Nota: En el cobro Alfonso Jaramillo, se evidenció Humedad por capilaridad Por lo tanto se hicieron reseros en zonas puntuales de fisuras, luego se Aplicó el estuco Tradicional y por ultimo pintura, esto se hizo para Mejoramiento de Acabado y Nivelacion de Muros.</p>					

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO:
F-GER001-05

FECHA: 7/11/2019
2019

Pag. 1 de

LUGAR: OFICINA DACAX
CIUDAD: Bogotá D.C.

Fecha: 07/11/2019

Hora inicio: 9:20 am
Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
German Villalba Clavijo	Coord. PRODEM S6	
CESAR MONIAXA	RESIDENTE	
Juan S. Cordero ROSA	A. Diseñador	
Carli Nieto Carrero	Apoyo Supervisión SED	
MARIN 2 CORONADO	Apoyo Interventoría	
Milag Juliana Lagos M.	Inspector DACAX SAS	
Antonio Sanchez	Proceder	
Javier Barua	PRODEM	
Gilberto Anguillo	Resid. Interventoría Dacax	
/	/	/
/	/	/
/	/	/

OBJETO DE LA REUNION

Comité de obra N° 10.

Colegio Alfonso Jaramillo: Interventoría hace revisión del procedimiento de Aplicación del acabado en Muros, No se evidencia Mayor problema; Prodem se compromete a hacer limpieza de zonas con pintura, También se expone que se están evidenciado Mochas en Muros por parte del contrato eléctrico. Se debe evaluar como proceder a arreglar las irregularidades posteriores en la entrega de los Salones.

→ Pendiente por entregar 5 salones (3 estucados / 1 pintado), se estima entrega de (Salones el 22 de noviembre viernes), el cerramiento perimetral debe estar a una h=2,08, se hará entrega de APU sin cotizaciones sob con proalco el día 14 de noviembre para que interventoría vaya adelantando revisión.

• La Secretaría queda pendiente en Averiguar la actividades de los Tanques para poder definir el Alance de la conexión de la Baterías Sanitarias con Tanques de almacenamiento, Prodem definirá ruta y diametro de esta Tubería, Se debe Solicitar las especificaciones de los equipos para cubrir a que presión debe llegar.

• Nuevo Horizonte:

Ya se sube la actividad de cubrimiento de Tubería sanitaria alavista con revisión de interventoría, Prodem entregara concepto y planimetría de la parte estructural de la zapata y columna para Tanque elevado. (avalado por Asesor estructural), se solicita Certificado de Acero utilizado en conjunto con el Diseño estructural, Prodem enviará la interventoría un informe del Procedimiento Técnico de la construcción de la columna, con base a una revisión de Ambas partes se tomará la decisión de la Demolicion de la columna o NO. (viernes 15 de noviembre).

Ya se inició enchape de Muro / piso y Mesón, esta semana llegaron equipos y Carpintería Metálica, se estima entrega Final del colegio para el día 29 de noviembre viernes, El mantenimiento de Fachada ya se finalizó.

→ la cubierta esta en fabricación.

OBJETO DE LA REUNION

- Villa Elisa A: ya se finalizó la instalación de la red hidrosanitaria, ya se terminó el mesón del baño hombres y hoy se terminó mesón de baño niños, ya está definiendo el listado de compras de equipos y carpintería Metálica, Prodein expone diferencia de Material en cielo raso y propone instalación de cielo raso (revisión presupuesto) la interventoría y la sed avala la instalación de este cielo raso.
- República Dominicana: se evidencian fisuras en piso, muro y techo que provienen mas por asentamiento y es difícil dar garantía del Mejoramiento de estos. (Prodein enviará propuesta de como realizar estas adecuaciones), se debe programar visita de Alconce el día 14 de noviembre.
- Villa Elisa sede A = Se realizará visita en conjunto interventoría, contratista y Rectoría para identificar Areas de Mayor importancia para la intervención. (14 ó 15 de noviembre queda pendiente confirmación por parte de la sed).
- USAQUÉN = queda pendiente Aprobación de la prorroga para iniciar el filtro la otra semana.
- Nota Alfonso Jaramillo = se debe evaluar que tipo de Tratamiento se debe hacer con la lamina de TUPLEX existente en el remate Superior de Muro en un Salón.
- Friedrich Alcamann B: se finalizan actividades de acabos, queda pendiente remate de Pintura Final, bajante y finalizar peacorrido, prodein esta en revision de ubicación de parlantes, interventoría realizará visita con Asesor electrico el día ~~de hoy~~ 13 de NOV, se hará entrega parcial de los Salones para ser habilitados al colegio y dar inicio al salón aislado (13 NOV), se define instalación de lamina de Superboard en Ventana Fallante.
- Julio Florez A = Se arreglaron 14 Toma corrientes se cambiaron a nuevas, se cambio el tubo, se está terminando de Marquillado, Prodein deja el soporte tecnico para la iluminación existente, se requiere revision de la lamina para proceder a algún arreglo posterior. (Aseo y brillo). Entrega final programada para viernes 15 de noviembre, se realizará pre entrega a interventoría el día 14 de Noviembre con pendiente de Tapete de colores para revision previa del rector e interventoría para compra e instalación y hacer entrega final el Lunes 18 de noviembre.
- Julio Florez B = se debe entregar NP del tipo de Mejoramiento a realizar.
- General Santander = Prodein expone Malla de cerramiento, se requiere NP para Malla, se instalara piso duro para Salones Convivencia.

OBJETO DE LA REUNION

- Gustavo Morales sede B: de los 210 m² del Totalidad de la cancha se estima una instalación de piso caucho para una área de 140 m², Prodein está revisando otras alternativas de piso caucho y para esta actividad se debe realizar en NP.
- Prado Veraniego: se estima un área de 60 m² para instalación de piso caucho. NOTA = el Acta N° 6 de obra y Actas de interventoría se deben radicar el 29 de noviembre porque hay plazo de pagar cuentas el 4 de diciembre.
→ interventoría hará revisión de NP entregados por Prodein para realizar radicación el lunes 18 de noviembre.
- Se dará inicio de los siguientes colegios = villa eliza A, General Santander, Prado Veraniego, Ramón de Zubiría y República Dominicana. (Se debe programar visita previa a ingreso e inicio de obra) y una visita al Gustavo Morales B con la rectora.
- Friedrich Naumann A = el medidor lo da Gas Natural y lo carga al recibo de Gas del colegio.
- Alfonso Jaramillo NOTA = en este colegio no se pintará la reja por debajo, esto ya fue aprobado por interventoría y SED.
- Julio Florez B = Prodein expone diseño de demarcación de cancha para ser cancha de tenis y béisbol cumpliendo con la norma, se está evaluando esto en el presupuesto final, se debe aplicar en primer como sellante para el asfalto el cual NO es contractual para General en NP.
- Liquidación = solicitud de documentos para finalización del contrato.
 - ✓ paz y salvo de servicios públicos (consumo 0.08%) de todos los colegios.
 - ✓ Actas de vecindad (todos los frentes de obra).
 - ✓ Manejo de escombros.
 - ✓ Manual de mantenimiento (cada frente obra - recibido), preventivo.
 - ✓ Planos record. (Todos los colegios)
- la Arquitecta Carol hará envío del check list de documentación para la liquidación y el formato/lineamiento de los planos record.
- ✓ Certificado de áreas intervenidas. (cubierto y no cubierto)
- ✓ Bitácora física y escaneada (todos los frentes).

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO:
F-GER001-05

FECHA:
2019 27/11/2019

Pag. 1 de ____

LUGAR: Secretaría de Educación
CIUDAD: Bogotá DC.

Fecha: 27/11/2019

Hora inicio: 8:30
Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Geol Nieto Camacho	Apoyo Supervisión SED	At.
German Villalba Clavijo	Coordinador PRODEIN JG	
CESAR MONIANA	RESIDENTE	
JAVIER GARCIA	RLC PRODEIN	
YANIS H. CONTRA	Apoyo Interventoría	
Gildardo Argüello	Presid. Interventoría	
Silvia Juliana Linares M.	Inspectoría DACAX	

OBJETO DE LA REUNION

Informe No 11.

- Nuevo Horizonte: La entrega a interventoría se estima a inicios de diciembre, en la semana 26 se finalizaron actividades y la llegada de cubierta para instalación.
- Col. Uzcacén: El día 25 de noviembre se realiza la actividad extra de extendido de grava, este colegio queda pendiente por entrega oficial al rector.
- Friedrich Neumann sede B:
 - Se hizo entrega parcial al almacenista, se deben subsanar pendientes de detalles de obra civil, instalación de portarre faltante, router faltante y conexión de bajante, estas actividades ya están en proceso de ejecución.
 - Se espera respuesta de Almacenista para dar inicio a la intervención del salón aislado (retiro de mobiliario), la entrega final se estima que será el 19 de diciembre, esto depende de la entrega del Área por parte del colegio.
 - Nota: se evidencia una grieta rota desde el inicio de la intervención, esto se evidencia en el registro fotográfico inicial y durante la ejecución, si esta actividad se realiza será pagada (cambio de tela).

Julio Florez:

- Pendiente instalación de Incorpor en la luz entre el remate de muro y cubierta del Salón Múltiple. (esto será subsano hasta el día 29 de Noviembre).
- pendiente reposición de parche para rambo.
- Se estima entrega a interventoría el día 28/29 de Nov y para el rector el lunes

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica
62 de diciembre.

OBJETO DE LA REUNION

- Alfonso Jaramillo = se terminaron los 2 salones faltantes, al 27 de noviembre se finalizan actividades de Aseo y limpieza de las áreas, se hará entrega parcial de las áreas terminadas al contratista eléctrico para que se hagan cargo de los alambres en cuanto a pintura.
- los trabajos faltantes ya se mandaron a cortar se estima la entrega de esto el 27 de noviembre, la instalación se iniciará el mismo día y se entregará a interventoría el 29 de noviembre.
- Prodein espone el recorrido de la red de suministro de Tanques por la zona Verde y evita romper la mayoría de pisos/enchapes.
- Para la actividad del trazado de la red de suministro de Tanques se tendrá una cuadrilla especial y se estima en duración de 15 días, la interventoría aprueba la ruta por la zona verde, Prodein enviará plano detallado del Trazado para interventoría.
- El 29 de noviembre se realizará entrega de salones al contratista eléctrico.
- El cerramiento contractual se encuentra dividido en ítems, este es el mismo existente en el colegio.
- Se pasará NP del cerramiento de prodein, este NP ya fue revisado y aprobado por interventoría, falta Aprobación por parte de la SED. (entrega estimada del 19 de diciembre)
- Villa Eliza sede D:
- Para el día 29 de noviembre se finalizan actividades de instalación de enchape y demás obra civil.
- Superboard en lamina de 6mm (ya se realizó pedido de Material).
- El pedido de Puercos Metálicos ya se hizo y se espera la llegada para la instalación.
- Se Estima entrega final para el 10 de diciembre.
- FIAN por intervencion =
- (Villa Eliza A, Julio Flores B, Gustavo Morales B, General Santander, Republica Dominicana y Prado Veraniego) y Ramón de Zubiría).
- Cobajo Julio Flores Sede B:
- Reparación de fallos y fisuras.
- Imprimante.
- Mezcla en caliente.
- Se debe enviar por parte de prodein el Acta de vecindad.
- (Se estima inicio de Actividades entre el 03 y 04 de diciembre)
- Gustavo Morales sede B:
- Se estima inicio el 3 de noviembre con Actividades preliminares y reparación de fallos.

OBJETO DE LA REUNION

- Prodein revisará la existencia del APO de la Emulsion, si no esta dentro de los item contractual se debe realizar Ap.
 - Piso Caucho se mantiene el APO no previsto, se espera aprobación por la Sed.
 - Colegio Prado Veraniego: Se estima inicio de Actividades preliminares de obra civil el Martes 03 de Diciembre.
 - General Santander = Actividades de archapés por piso (seismicas). se estima inicio de Actividad el Lunes/Martes 03 de Diciembre.
 - Ramón de Zubiria = inicio el Martes 03 de Diciembre.
- PRODEIN estima que para el "22 de diciembre" se este terminando la mayoría de Colegios, y un porcentaje de Avance AHO.
- Republica Dominicana: se debe programar reunión previa al inicio de Actividades con el rector. (03 de Diciembre)
 - General Santander = se debe programar reunión previa al inicio de Actividades con el rector. (03 de Diciembre)
- NOTA = Prodein enviará programación general de Diciembre de la contingencia para generar un mejor seguimiento en conjunto con interventoría.

Nota = las Actividades obra se han visto afectadas desde el 21 de noviembre por paro nacional y marchas diarias presentadas en la totalidad de la Ciudad.

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO:
F-GER001-05

FECHA: 10/12/2019
2019

Pag. 1 de ____

LUGAR: Secretaría de Educación
CIUDAD: Bogotá DC.

Fecha: 10 de diciembre 2019

Hora Inicio: 8:40
Hora Fin: ____

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
María Dorado	Apoyo Interventoría	
Daniel García C	Prodein 56 SAS	
Germán Villalba C	Cord. Prodein 56 SA	
JESAR MONJANA	RESIDENTE PRODEIN	
Sanjay Sanjay D	Residente Prodein	
Gilberto Arjuello	Resid. Interventoría	
Silvia Juliana Larios N	Inspector Interventoría	
Carl Nieto Carrera	Apoyo Supervisión SED	

OBJETO DE LA REUNION

- Comité N° 012:
- Col. Villa Elisa: la interventoría aprueba diseño estructural de cubierta.
 - Rep. dominicana = ya se dio inicio de Actividades de obra (9 de diciembre 2019)
 - Ramón de zabala = no se dio inicio el día 9 de diciembre porque el colegio no dio autorización de ingreso de personal.
 - Col. Julio Florez B = ya se inicia actividades de nivelación y preliminares.
 - Col. Gustavo Morales sede B: la interventoría aprueba diseño de cancha.
 - Canchas colegios Julio Florez B y Gustavo Morales = queda pendiente ajustar con balance final. (Interventoría hace envío de recomendación) "sin malla."
 - Prado Veroniego = la cubierta para el área de intervención debe ser Translúcida para generar luz en los salones. (Policarbonato ajover).
 - Nuevo Horizonte: ya se instalaron las puertas Metálicas de los baños, Finalizan actividades eléctricas, en proceso de estucado de muros, pendiente conexión de Aparatos Sanitarios, instalación de tanque, cubierta de madero, perfil Metálico y canal de cubierta, También el techo de lavamanos. Nota: se debe reforzar la pintura de Muro de Muro de madero (Entrega final 20 de diciembre)
 - Villa Elisa sede D = se definen tipo de lámparas para salones (lámpara bajo placa Hermética) (23 de diciembre).
 - Naumann B = (Entrega 20 de diciembre) el día 11 de diciembre. Se inicia instalación de estructura salón Isla.
 - General Santander: (se realiza revisión previa a entrega el día 27 de diciembre).
 - Entrega de Aulas el 20 de diciembre. y la instalación de paros, la instalación de la malla esta proyectada para Enero.

C: Concluida

P: Pendiente

NA: No Aplica

OBJETO DE LA REUNION

• Alfonso Jaramillo: la interventoría revisó los salones y prodein hace entrega de los Acabados de los Salones a Satisfacción, los daños posteriores a esto son responsabilidad del contratista eléctrico, la acometida de Tanques Finaliza el 11 de diciembre, se están en construcción las cajas de inspección. Se hará una prueba hidráulica (2 días con manómetro) (visita de revisión el 20 de diciembre).

Nota: las observaciones Ambientales generadas por interventoría se entregarán por parte de prode prodein el 18 de diciembre.

• República Dominicana: (Revisión 23 de diciembre) alcance es = carcamos, puerta baño y vestier, enchape de muros, medias conas en PVC, dilatación de junta en cielo raso. (15 días de ejecución).

• Ramón de Zubiria - Alcance de ejecución, desmontada y pulida de piso, repillas para carcamos (4 días), medias conas en PVC y revisión de nueva filtración en Área de producción. (23 de diciembre para revisión previa a entrega) El inicio de Actividades era para el 11 de diciembre.

• Prado Veraniego - ya se iniciaron actividades de obra, se plante una instalación de cubierta con upvc y fibra de vidrio para generar iluminación natural en el Área. (estructura cubierta semana del 16 de diciembre).

• Villa Elba sede A: se define la intervención de 2 fases (2 aulas de segundo piso y corredor) inicio de Actividades viernes 13 de dic y se estima entrega 15/01/20

• Julio Flores Sede B: Se debe evaluar con respecto al balance la pintura total de la cancha, El arreglo de la cancha se hará de acuerdo a la recomendación enviada por interventoría DACAX SAS. (pintura 15 de enero entrega)

• Gustavo Morales - se debe asfaltar la totalidad del Área y slurring para sellamiento de fisuras existentes; se inicia asfalto entre lunes y martes (16-17 de diciembre). Se estima entrega para la última semana de diciembre. (según programación de subcontratista de piso caucho).

Nota: Prodein se compromete a entregar balance General el viernes 13 de diciembre y la entrega de NP a interventoría el martes 17 de diciembre para que interventoría radique el 20 de diciembre a la sed.

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO:
F-GER001-05

FECHA:
2019

Pag. 1 de 2

LUGAR: Colegio Julio Flores Sede B.

CIUDAD: Bogotá DC

Fecha: 08/01/2020

Hora Inicio: 10:00 am

Hora Fin:

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Henry Sotz C	Abogado legal DACAX e Interventoría Incargado de Int	
Carl Hied Camargo	Apoy. Supervisión SED	
Gildardo Arqueño	Presid. Interventoría	
Germán Villalba Clavijo	Coord. Proyecto	
Carlos Roberto Sanchez	Proceder Presidente	
CESAR MONILAJA	RESIDENTE PRODETH	
Silvia Juliana Larios M.	Inspectora de obra	

OBJETO DE LA REUNION

Comité de obra para definición de propuesta para arreglo de cancha, en convenio con interventoría, SED y PRODETH JG SAS.

Se Socializa la problemática evidenciada en el Área al momento de la intervención la interventoría hace recomendación de propuesta de intervención y tipos de equipo para utilizar según el estado del suelo:

Equipo = minicompactor "Pequeño vibratorio rodillo Compactor Manual" autopropulsado (1-2 cilindros) Máximo: 1 tonelada. (realizar prueba previa).

Procedimiento a realizar recomendado por interventoría:

1. Identificación de fallos y demarcaciones de pinturas existentes (localizados con medidas en plano de la cancha).

2. Numeración y Rectificación de Áreas, con base realiza presupuesto y programación por Áreas sectorizadas. Para ser Socializada y recomendada por la interventoría.

Anexa a esta acta y posterior enviada a la secretaría de la Secretaría educación para proceder a la intervención.

recomendaciones de Construcción:

- Demarcación de Área de Fallos y líneas de pintura (10 cm de lado y lado)

- Remoción y Retiro Manual de los fallos y líneas de pintura.

- Construcción de filtro Dren en espina de pescado en zona sur oriental de la cancha siendo esta la más crítica.

- Reparación de fallos con material BOCO.

- la construcción se hará por etapas y con los equipos de compactación recomendados.

OBJETO DE LA REUNION

- Imprimación con ~~slurming~~ emulsión asfáltico en la totalidad del Área
 - Aplicación de asfalto en la totalidad del Área.
 - Socializar con rector los puntos base para juegos (Volleyball, tenis y basketball)
 - ^{NOTA:} Calcular ML de demarcación de pintura en la totalidad de la cancha.
 - Aplicación de slurming en la totalidad de la cancha para unificar el Acabado Final.
 - Mantenimiento de las 4 calas de inspección (esta actividad se debe realizar al inicio o paralelo de las Actividades).
 - Se debe tener un control de bombeo para identificación de pendientes para evitar emposamientos.
- Todo lo anterior debe ser enviado en horas de la tarde del 8 de enero para ser revisado por interventoría. (Programación, Procedimiento, equipos, Materiales, personal de obra).
- Prodein evaluará esto para proceder a dar Fecha de INICIO de Actividades. No se puede dar inicio posterior a esta semana.
- NOTA: Mejoramiento de recebo boco con cemento al 5%.

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO:
F-GER001-05

FECHA:
2019

Pag. 1 de

LUGAR: Cedeo Julio Flores Sede B.
CIUDAD: Bogotá DC.

Fecha: 14/01/2020

Hora Inicio:

Hora Fin:

ASISTENTES		FIRMA
NOMBRE	CARGO	
CESAR MONTEANA	RESIDENTE PRODEIN	
JANER GARCIA C	PRODEIN	
German Villalba Clavijo	Coord. Proyectos PRODEIN 36	
CARLOS A. GRANADOS G.	Asesor. DCEE	
Gildardo Anquello	Presid. Interventoria	
Caral Nieto Carmona	Apoy. Supervisión SED	
Silvia Juliana Londo M.	Inspector de Interventoria	
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/

OBJETO DE LA REUNION

Reunión Secretaria, Contralista e Interventoria de definición de actividades a realizar.
Prodein proponer unificar la zona 1 y 2, bajar a 25cm propuestas por interventoria para dejar secar y con base a eso se tomará la decisión de bajar 10 cm más, se define que se excavará inicialmente a 35 cm para revisión y dejar secar, se debe retirar el recebo existente y hacer relleno con recebo nuevo, el recebo retirado se debe evaluar reutilizarlo en la zona 3, la cual tiene fallas puntuales, en esa zona se retirará toda la capa de Asfalto.
Se propone utilizar cemento 1:3 para aglizar el secado del recebo.
En la zona 4 central prodein propone hacer prueba de calentamiento del Asfalto y Aplicación de Sello para verificar el acabado final.
Prodein evaluará presupuestalmente el retiro de la capa de Asfalto aplicado de la zona 4, para asegurar el mismo acabado con las demás zonas.
Se puede utilizar recebo B400.
Todo lo anterior es con base a un hallazgo evidenciado en el costado sur de la cancha, en donde se inicia con la demolición del Asfalto.
Se realiza excavación a 25cm de acuerdo a recomendación de Interventoria.
Se encuentra un colchón a 15cm de material saturado de agua de la cual no se sabe su procedencia, También se encontró una caja de inspección de 80x80x1.00m, de la cual no se sabe que tipo de recolección tiene, se evidencia que la caja no se encuentra esmaltada o impermeabilizada, lo cual puede estar generando filtraciones a la cancha, de esta caja se encuentra salida de tubería de 8" Tipo Novafort la cual no se conoce su estado actual.

P: Pendiente NA: No Aplica NI

C: Concluida

OBJETO DE LA REUNION

ni a donde llega.

Por lo anterior Prodein realizó 8 apiques donde se evidencia que la subbase se encuentra saturada de agua.

Intervención Apiceta Todo lo anterior mencionado

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO:
F-GER001-05

FECHA:
2019

Pag. 1 de 1

LUGAR: Secretaría de Educación distrital

CIUDAD: Bogotá DC

Fecha: 27/01/2020

Hora inicio: 5:10 pm

Hora Fin: 6:30 pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carol Nieto Carmona	Asesora Supervisión SED	CUT
JANIER GARCIA C	PRODEIN JB SAS	[Firma]
CELSAR MONTAÑA	RESIDENTE PRODEIN	[Firma]
Germán Villalba C.	Coord. PRODEIN S.G	[Firma]
Lidia Tayerly Díaz P.	Profesional SISOMA	[Firma]
Filberto Argüello	Residente Interventoría	[Firma]
Silvia Juliana Larios	Inspectora de Interventoría	[Firma]
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/

OBJETO DE LA REUNION

Comite de Reunión:

Prodein expone entrega de observaciones de los frentes:

1. Friedrich Naumann sede B: Lunes 03 de Febrero

2. Nuevo Horizonte: Viernes 31 de enero

3. General Santander: Viernes 31 de Enero

4. Alfonso Jaramillo: Lunes 3 de Febrero

5. Prado Veraniego: Se solicita tener Área despejada para arriego de dilataciones encontradas en piso de Área, las Tejas (11) se entregarán al cobro mediante una (Queda pendiente definición de día para ingreso de personal para dicha actividad)

→ Prodein hará arriego los días (01-02 de febrero).

6. Ramón de Zubiria: Lunes 03 de Febrero

7. Villa Elba A: Lunes 03 de Febrero

8. Villa Elba D: Martes 04 de Febrero

9. Republica Dominicana: Lunes 03 de Febrero

10. Gustavo Morales B: Viernes 31 de Enero

Nota:

Se hará envío de lineamientos sobre informes finales de el Área ambiental y de Interventoría.

- la interventoría hará envío de informe de observaciones por cada uno de los frentes para la subsección.

• Friedrich Naumann A. No se requiere cambio de medicor, Prodein entregará certificación de recd. de gas.

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica



Bogotá D.C., Septiembre de 2020

Ingeniero
HENCY SOTO GALVAN
Representante Legal
DACAX S.A.S.
Carrera 24 No. 51 – 48 oficina 1004
dacaxsas@gmail.com
PBX: 6496495
Ciudad.

Asunto: Aprobación informe final ambiental y SST de interventoría. “Contrato 883201 de 2019. “Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo”.

Respetada Ingeniero Soto,

En atención a los radicados E-2020-88705 y E-2020-88081 del 25 de Agosto de 2020, mediante el cual la interventoría presenta el Informe Final Ambiental y SST del contrato relacionado en el asunto; al respecto de manera atenta la SED comunica que los documentos cumplen con los requisitos exigidos de conformidad con la normatividad vigente, razón por la cual se encuentran APROBADOS.

Cordialmente,

LUIS ANTONIO PINZON PARRA

Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Revisó: Juan Enrique Ortega – Abogado DCCEE 
Proyectó y Aprobó: Christian Felipe Rodríguez – Gestión Ambiental DCCEE 

Fuente de Información: Christian Felipe Rodríguez – Gestión Ambiental DCCEE
Fuente de documentación: Carol Viviana Nieto - Apoyo a la Supervisión.



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

Bucaramanga, 24 de agosto de 2020

Señores:

Supervisora

Carol Nieto

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

Av. El Dorado No. 66 - 63

Bogotá D.C.

Ref. Contrato No. 883201, que tiene por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.”.

Asunto: RADICACION DE INFORME FINAL AMBIENTAL DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO EN REFERENCIA

Con el fin de cumplir con los compromisos contractuales como interventoría al contrato relacionado en la referencia, queremos realizar la radicación del informe final ambiental de interventoría y sus anexos, los cuales ya fueron enviados y entregado al ingeniero CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN.

Agradecemos su atención y ayuda

Cordialmente,

HENCY SOTO GALVAN

Representante Legal Dacax S.A.S.

91.264.294 de Bucaramanga.

Carrera 24 # 51- 48 Torre 2 Ofi. 1004.
Tele fax (7) 6946495-Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

INFORME FINAL AMBIENTAL



**ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN**

INTERVENTORÍA

CONTRATO 833201 - 2019

DACAX S.A.S.

**GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.**



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. ACTIVIDADES AMBIENTALES SEGÚN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	6
1.1 Manejo ambiental de residuos convencionales	6
1.2 Manejo de residuos peligrosos y especiales	6
1.3 Manejo de sustancias químicas	7
1.4 Ahorro y uso eficiente del agua.....	8
1.5 Manejo y control de emisiones atmosféricas.....	8
1.6 Capacitación y sensibilización ambiental	11
1.7 Manejo de fauna y flora	12
1.8 Manejo de aguas residuales	13
2. ACTIVIDADES DE OBRA	13
3. CONTROL DE MATERIALES.....	15
4. CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD	17
4.1 Generación	17
4.2 Disposición final.....	19
4.3 Aprovechamiento y/o reutilización de RCD	20
5. SOLICITUD CIERRE DE PIN.....	22
6. CERTIFICACIONES	22
6.1 Manejo de Sumideros	22
6.2 Manejo de la vegetación	23
7. INDICADORES.....	24
7.1 Indicador de eficiencia	24
7.2 Indicador de eficacia	25
7.3 Indicador de efectividad	25
8. CONCLUSIONES	27



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

RELACIÓN DE TABLAS

Tabla 1. Relación de generación y disposición final de Residuos peligros y especiales.....	6
Tabla 2. Vehículos utilizados durante la ejecución del contrato.....	9
Tabla 3. Relación de capacitaciones realizadas.....	11
Tabla 4. Relación de actividades de obra por Institución Educativa intervenida.....	14
Tabla 5. Relación de materiales adquiridos durante el contrato	16
Tabla 6. Relación de generación de RCD	17
Tabla 7. clase y tipo de RCD generado.....	18
Tabla 8. Disposición final de RCD.....	19
Tabla 9. Reutilización de RCD	21
Tabla 10. Indicador de Eficiencia	24
Tabla 11. Indicador de Eficacia	25
Tabla 12. Indicador de Efectividad	26



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de cumplir con las obligaciones específicas del contrato SED 883201, cuyo objeto es desarrollar la **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO”**, la Empresa DACAX S.A.S, presenta el informe final ambiental consolidado, correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de mayo de 2019 al 27 de enero de 2020, donde se relacionan las acciones realizadas por esta interventoría durante la ejecución total del contrato, como acompañamientos y verificaciones para aprobaciones al contratista de obra, a fin de dar el aval a la Secretaría de Educación Distrital – SED, para la revisión de la correcta implementación de las fichas de manejo ambiental, que fueron aprobadas mediante el Plan de Manejo Ambiental.

Durante la ejecución del contrato se realizó el seguimiento a la ejecución de obras de mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales en las plantas físicas de diecinueve (19) Instituciones Educativas listadas a continuación:

1. Colegio Usaquén
2. Colegio Ramon de Zubiria
3. Colegio Frederich Newman sede A
4. Colegio Frederich Newman sede B
5. Colegio Julio Flores sede A
6. Colegio I.T.D. Julio Flores sede B
7. Colegio Cristóbal Colon
8. Colegio Alfonso Jaramillo
9. Colegio Villa Elisa sede A
10. Colegio Villa Elisa sede D

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

11. Colegio Nuevo Horizonte
12. Colegio General Santander
13. Colegio Republica Dominicana
14. Colegio Prado
15. Colegio La Gaitana
16. Colegio Gustavo Morales Sede A
17. Colegio Gerardo Molina
18. Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda
19. Colegio Gustavo Morales Sede B

Con base en lo anterior, la presente interventoría realizó el seguimiento y acompañamiento al contratista durante la ejecución de las actividades contractuales, con el fin de garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas para la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales negativos generados en el desarrollo de las obras.

A continuación, se presenta la evidencia del seguimiento de los controles implementados que se realizaron durante la ejecución del contrato:



INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA

1. ACTIVIDADES AMBIENTALES SEGÚN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA

De acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Interventoría, se realizó el seguimiento y verificación al cumplimiento de legislación ambiental vigente y las medidas de manejo, control, prevención y mitigación que se implementaron en cada uno de los frentes de obra, las cuales se listan a continuación:

1.1 Manejo ambiental de residuos convencionales

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental en cuanto al manejo de residuos sólidos ordinarios y potencialmente reciclables y reutilizables, la presente interventoría realizó la revisión y el control de la instalación de puntos ecológicos en cada una de las instituciones educativas intervenidas, así como del adecuado manejo de los mismos y la disposición final de los residuos generados, la cual se llevó a cabo a través de los operadores del servicio de aseo distrital.

1.2 Manejo de residuos peligrosos y especiales

Durante la ejecución del contrato en los diferentes frentes de obra, la presente interventoría realizó el seguimiento y la verificación en cuanto a la generación, acopio y disposición final de los residuos peligrosos y especiales listados a continuación:

Tabla 1. Relación de generación y disposición final de Residuos peligros y especiales

MES	MATERIAL	PESO (Kg)	TON	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
Junio	Tejas de asbesto cemento	3.280	3,28	Celda de seguridad TRACOL S.A.S E.S.P.
Septiembre	Tejas de asbesto cemento	5.640	5,64	
Enero	Luminarias de mercurio	12	0,012	Celda de seguridad TECNIAMSA S.A.S E.S.P.
	Envases de pintura	73	0,072	



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

MES	MATERIAL	PESO (Kg)	TON	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
	Tejas de asbesto cemento	915	0,915	
TOTAL		9.920	9,92	

En cuanto al acopio temporal de las 9,92 Toneladas de residuos peligrosos y especiales listados en la Tabla 1 cabe aclarar que estos fueron almacenados en las Instituciones Educativas Julio Flores sede A y B, Newman sede B, Alfonso Jaramillo y Villa Elisa sede D y se generaron a partir de las actividades de desmonte de instalaciones eléctricas, desmonte de techos, adecuaciones de salones, pintura de paredes, enchapes de muros, arreglos de pisos, y cambios de tableta.

Considerando lo anterior, el contratista solicitó la recolección y posterior disposición final de dichos residuos a través de las sociedades TRACOL S.A.S E.S.P. y TECNIAMSA S.A.S E.S.P. empresas encargadas del almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos en celda de seguridad por medio de la Resolución 1821 de 2017 y 141 de 2013, respectivamente.

En el Anexo 1. Se presenta la documentación ambiental legal vigente de los proveedores utilizados para la disposición final de residuos.

En el Anexo 2. Se presentan las certificaciones de disposición final de los residuos peligrosos relacionados.

1.3 Manejo de sustancias químicas

Durante la ejecución del contrato el contratista adquirió, almacenó y utilizó sustancias químicas como insumo para el desarrollo de las actividades de obra, las cuales se listan a continuación:

- Pinturas
- Thinner
- Cemento
- Limpiador PVC
- Pegante PVC
- Pegante para enchape



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

En consecuencia, el manejo de dichas sustancias se dio conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuenta la señalización, cerramientos, hojas de seguridad y tomando las medidas adecuadas para evitar incidentes, accidentes y derrames.

En el Anexo 3. Se presentan las hojas de seguridad de las sustancias químicas utilizadas durante la ejecución de actividades técnicas.

1.4 Ahorro y uso eficiente del agua

El suministro del agua requerida para las actividades constructivas fue realizado por cada una de las instituciones educativas intervenidas. Este recurso fue utilizado para las actividades de mezcla de concretos y para humectación de materiales granulares.

En cuanto al uso eficiente del recurso, se realizaron charlas de ahorro de agua y uso eficiente al personal de obra.

1.5 Manejo y control de emisiones atmosféricas

En cumplimiento de lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental ofertado por la firma contratista, durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes actividades referentes al control de emisiones atmosféricas:

- Se realizó la verificación de los vehículos a utilizados cumplieran con el certificado de emisión de gases, revisión técnico-mecánica y Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito (SOAT) vigente.
- Se verificó que todas volquetas relacionadas contaran con el PIN ambiental generado por la SDA.
- Durante las jornadas de inducción y capacitación se dio a conocer a los conductores y operadores los límites de velocidad de los vehículos y maquinaria permitidos durante su operación.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

- Diariamente se realizó control y seguimiento del estado de los vehículos a utilizar; con el fin de evitar y prevenir el mal funcionamiento de los mismos, y así reducir los impactos ambientales que puedan generar.
- Todos los vehículos utilizados para el transporte de materiales y RCD contaron con su respectiva carpa, la cual es utilizada para evitar las emisiones de material particulado cuando las volquetas se encuentran cargadas y en movimiento.
- Los centros de acopio seleccionados para el manejo de materiales pétreos y RCD contaron con un cerramiento en malla sintética (polisombra) con el fin de proporcionar protección al material almacenado y evitar las dispersiones de material particulado.
- Los materiales pétreos y RCD en acopio temporal permanecieron cubiertos con polietileno negro con el fin de evitar el arrastre de material como consecuencia de la acción del viento y/o la lluvia.

Durante el desarrollo de las actividades de obra se utilizaron un total de siete (7) vehículos para el transporte de materiales e insumos y la disposición final de RCD, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Vehículos utilizados durante la ejecución del contrato

PERIODO	VEHICULO Y/O MAQUINARIA	ACTIVIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA
MAYO	N.A.	N.A.	N.A.
JUNIO	VOLQUETA SCD358	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Usaqué Colegio La Gaitana Colegio Gerardo Molina
	VOLQUETA WYJ907		
JULIO	VOLQUETA SCD358	Retiro de materiales sobrantes – RCD	Colegio La Gaitana, Colegio Gerardo Molina Colegio Gustavo Morales
	VOLQUETA WYJ907		



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

PERIODO	VEHICULO Y/O MAQUINARIA	ACTIVIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA
AGOSTO	VOLQUETA SCD358	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio La Gaitana Colegio Gustavo Morales, Colegio Virginia Gutiérrez Colegio Julio Flores Sede A
SEPTIEMBRE	VOLQUETA SCD358	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Cristóbal Colon
	VOLQUETA WYJ907		
OCTUBRE	VOLQUETA WYJ907	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Nuevo Horizonte Colegio Villa Elisa Sede D
NOVIEMBRE	VOLQUETA WYJ907	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Alfonso Jaramillo Colegio Villa Elisa Sede D
DICIEMBRE	VOLQUETA WYJ907	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Julio Flores Sede A Colegio Frederich Newmann B Colegio Villa Elisa Sede A - D Colegio Prado Veraniego
ENERO	VOLQUETA WYJ907	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Julio Flores Sede B, Colegio Alfonso Jaramillo Colegio Villa Elisa A Colegio General Santander, Colegio Republica Dominicana
	VOLQUETA SCD358		
	VOLQUETA TFQ301		
	VOLQUETA SKB280		
	VOLQUETA TDL973		
	VOLQUETA SRN550		
	VOLQUETA TBZ671		

En el Anexo 4. Se presenta la documentación legal vigente de cada uno de los vehículos listados.

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



1.6 Capacitación y sensibilización ambiental

Durante la ejecución del contrato se llevaron a cabo un total de 23 capacitaciones en temáticas ambientales basadas en la protección del medio ambiente y por supuesto en el control, prevención y mitigación de los impactos negativos identificados en el Plan de Manejo Ambiental que se pudieran generar en el ejercicio de las actividades de obra.

En la Tabla 3, se presenta la relación de capacitaciones del componente ambiental aplicadas al personal de obra durante el desarrollo del contrato.

Tabla 3. Relación de capacitaciones realizadas

MES	FECHA	TEMÁTICA DE CAPACITACION
MAYO	NA	NA.
JUNIO	06 de junio de 2019	▪ Ahorro de agua y clasificación de residuos
	20 de junio de 2019	▪ Protección de flora y fauna
JULIO	08 de julio de 2019	▪ Ahorro de agua y clasificación de residuos
	15 de julio de 2019	▪ Protección de flora y fauna
AGOSTO	02 de agosto de 2019 05 de agosto de 2019	▪ Ahorro de agua orden y aseo
	08 de agosto de 2019	▪ Manejo de residuos sólidos -protección de flora y orden y aseo.
	19 de agosto de 2019 22 de agosto de 2019	▪ Manejo de residuos sólidos -protección de flora
SEPTIEMBRE	02 de septiembre de 2019	▪ Manejo de residuos sólidos -protección de flora y orden y aseo.
	06 de septiembre de 2019	▪ Protección de fauna
	24 de septiembre de 2019	▪ Manejo de residuos peligrosos – protección de flora y orden y aseo
OCTUBRE	14 de octubre de 2019	▪ Ahorro y uso eficiente del agua



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

MES	FECHA	TEMÁTICA DE CAPACITACION
	16 de octubre de 2019	▪ Control de emisiones
NOVIEMBRE	08 de noviembre de 2019	▪ Gestión de residuos Convencionales
	12 de noviembre de 2019	▪ Gestión de residuos de construcción y Demolición
	19 de noviembre de 2019	▪ Protección de Flora
	22 de noviembre de 2019	▪ Protección de Fauna
DICIEMBRE	16 de diciembre de 2019	▪ Gestión de residuos peligrosos y especiales
	20 de diciembre de 2019	▪ Control de emisiones
	21 de diciembre de 2019	▪ Programa de Orden y Aseo
	26 de diciembre de 2019	▪ Ahorro y uso eficiente del agua
ENERO	10 de enero de 2020	▪ Clasificación de residuos sólidos- código de colores
	13 de enero de 2020	▪ Protección de flora
	20 de enero de 2020	▪ Protección de fauna

En el Anexo 5. Se presenta la evidencia de las capacitaciones realizadas durante la ejecución del contrato.

1.7 Manejo de fauna y flora

Con el fin de propender por el cuidado de la fauna y flora que pudiera presentarse en las instalaciones de las Instituciones Educativas intervenidas, la firma contratista desarrolló diez (10) capacitaciones en cuanto al manejo y protección de la fauna y flora al personal tanto operativo como administrativo vinculado al proyecto teniendo en cuenta estas temáticas.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

Por otro lado, en el mes de noviembre se identificaron 23 individuos arbóreos en el área de influencia directa del Colegio Alfonso Jaramillo donde se estaban llevando a cabo actividades de mejoramiento del cerramiento perimetral de dicha institución, considerando esto, la firma contratista procedió a realizar el respectivo aislamiento de cada uno de los individuos identificados con el fin de evitar cualquier tipo de afectación durante la ejecución de las actividades técnicas realizadas.

1.8 Manejo de aguas residuales

El manejo de las aguas residuales provenientes de las unidades sanitarias utilizadas para el uso del personal durante el desarrollo de las actividades de obra, se llevó a cabo por medio de la red de alcantarillado público, teniendo en cuenta que cada una de las instituciones intervenidas estuvo de acuerdo con el uso de las mismas siempre y cuando se garantizara el mantenimiento periódico de las instalaciones sanitarias por parte del contratista.

Por otro lado, y como caso excepcional, durante la ejecución de obras en el Colegio Villa Elisa, se realizó las adecuaciones de los baños de la institución, razón por la cual la firma contratista tuvo que contratar los servicios de la empresa Baños WC Portátiles de Colombia, la cual cuenta con registro de Vertimientos No 01592 emitido el 03 de noviembre de 2011 para la prestación del servicio de mantenimiento y disposición de las aguas residuales generadas.

En el Anexo 6. Se presenta el registro de vertimientos con la respectiva certificación del servicio de alquiler y aseo de cuatro (4) baños portátiles tipo flushing.

2. ACTIVIDADES DE OBRA

Durante la ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de los 19 colegios distritales se llevaron a cabo intervenciones puntuales según los requerimientos de infraestructura de cada uno de ellos. Con el fin de avalar y supervisar las que dichos requerimientos atendieran las necesidades para la prestación del servicio educativo, la presente interventoría realizó el seguimiento a cada una de las actividades de obra desarrolladas, las cuales se describen a continuación:

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

Tabla 4. Relación de actividades de obra por Institución Educativa intervenida

No	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ACTIVIDADES DE OBRA
1	Colegio Usaquén	<ul style="list-style-type: none">▪ Obras de urbanismo▪ Construcción de andenes▪ Instalación de materas
2	Colegio Ramón de Zubiria	<ul style="list-style-type: none">▪ Adecuación de cocinas▪ Enchapes▪ Muros▪ Media cañas▪ Cárcamos▪ Impermeabilización de pisos▪ Pinturas
3	Colegio Frederich Newman sede A	<ul style="list-style-type: none">▪ Adecuación de pisos▪ Mampostería▪ Enchapes▪ Cárcamos▪ Adecuaciones Eléctricas y de gas natural
4	Colegio Frederich Newman sede B	<ul style="list-style-type: none">▪ Cambios de cubierta▪ Adecuación de redes eléctricas
5	Colegio Julio Flores sede A	<ul style="list-style-type: none">▪ Cambios de cubierta
6	Colegio Julio Flores sede B	<ul style="list-style-type: none">▪ Construcción de cancha múltiple
7	Colegio Cristóbal Colón	<ul style="list-style-type: none">▪ Adecuación de redes hidráulicas y sanitarias▪ Enchapes▪ Impermeabilización
8	Colegio Alfonso Jaramillo	<ul style="list-style-type: none">▪ Adecuación de salones (Estuco y pintura)▪ Instalación de cerramiento perimetral▪ Instalación de tubería hidráulica
9	Colegio Villa Elisa sede D	<ul style="list-style-type: none">▪ Enchapes y adecuación de baños▪ Adecuación de salones▪ Instalación de SuperBoard en cielo raso
10	Colegio Villa Elisa sede A	<ul style="list-style-type: none">▪ Instalación de cubiertas, canales, flanches, platinas y perfilería metálica en salones



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

No	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ACTIVIDADES DE OBRA
11	Colegio Nuevo Horizonte	<ul style="list-style-type: none">▪ Adecuación de baños▪ Enchapes▪ Instalación de unidades sanitarias▪ Adecuación de redes hidráulicas▪ Restauración de patio▪ Instalación de cubierta
12	Colegio General Santander	<ul style="list-style-type: none">▪ Adecuación de salones▪ Enchapes▪ Instalación de malla de protección de cancha
13	Colegio Republica Dominicana	<ul style="list-style-type: none">▪ Enchape en cocina▪ Media caña▪ Pintura
14	Colegio Prado	<ul style="list-style-type: none">▪ Adecuación de jardines▪ Nivelación de placa de piso▪ Instalación piso Forza
15	Colegio La Gaitana	<ul style="list-style-type: none">▪ Construcción de caseta▪ Reinstalación de rejas
16	Colegio Gustavo Morales Sede A	<ul style="list-style-type: none">▪ Instalación de cubiertas
17	Colegio Gerardo Molina	<ul style="list-style-type: none">▪ Adecuación de cocina y cuarto frio
18	Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda	<ul style="list-style-type: none">▪ Instalación de cerramientos
19	Colegio Gustavo Morales Sede B	<ul style="list-style-type: none">▪ Adecuación de cancha múltiple

3. CONTROL DE MATERIALES

Durante la ejecución del contrato y teniendo en cuenta los requerimientos técnicos en cada una de las instituciones intervenidas, el contratista realizó la adquisición de 146,3 m³ de materiales, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

Tabla 5. Relación de materiales adquiridos durante el contrato

MATERIAL	VOLUMEN DE MATERIAL ADQUIRIDO POR MES (m³)								TOTAL ACUMULADO	PROVEEDOR	PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES
	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE			
Cemento	2,7	0,36	0,6	0,23	0,43	0,54	0,56	0,51	5,93	Ferremundo	NA
Materiales Pétreos (Base, sub base, rajón, recebo)	0,29	0	3,67	0,88	16,7	19,11	3,71	43,5	87,86	Ferremundo	Certificado de registro minero RMN: GCNF01
										Rex Ingeniería	Res ANLA 0110 de 2017
											Res ANLA 0836 de 2015
Plásticos (Polisombra, Tubería PVC y otros)	0,3	0,96	0,18	0,06	0,09	0,12	0	0	1,71	Ferremundo	NA
Metales (Acero, Hierro, Cobre, Aluminio, Estaño y Zinc)	1,07	1,15	0	0,91	4,3	0,87	1,4	1,32	11,02	Ferremundo	NA
Sustancias Químicas	0	0	0	0	0	0	0	0,42	0,42		
Asfalto	0	0	0	0	0	0	0	39,32	39,32	CTU	Resolución CAR 1984 de 2016
TOTAL, MES	4,36	2,47	4,45	2,08	21,52	20,64	5,67	85,07	146,3	-	-

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

Considerando la relación anterior, se evidencia que, la firma contratista adquirió 87,86 m³ de materiales pétreos los cuales fueron insumo principal para el desarrollo del contrato, estos materiales fueron adquiridos por medio de un depósito de materiales denominado Ferremundo, quien presentó el registro minero y la documentación legal ambiental vigente del proveedor utilizado para la compra de dichos materiales (Rex Ingeniería), el cual comercializa materiales pétreos a través de la Resolución 0836 de 2015 otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. Por otro lado, se adquirieron 39,32 m³ de mezcla asfáltica utilizada en la reconstrucción de la cancha múltiple del Colegio Julio Flores sede B, material certificado por la Sociedad CTU, la cual opera bajo el permiso de emisiones atmosféricas otorgado por la CAR bajo la Resolución 1984 de 2016.

En el Anexo 1. Se presenta la documentación legal ambiental vigente de los proveedores utilizados para la compra de materiales.

En el Anexo 7. Se presentan las evidencias y certificaciones de compra de material.

4. CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD

4.1 Generación

Durante el desarrollo del contrato se generaron 519,9 m³ de Residuos de Construcción y Demolición - RCD resultantes de las actividades técnicas realizadas en cada una de las Instituciones Educativas intervenidas con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo, como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 6. Relación de generación de RCD

MES DE REPORTE	VOLUMEN GENERADO (m³)
Mayo	0
Junio	35,23
Julio	14



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

MES DE REPORTE	VOLUMEN GENERADO (m ³)
Agosto	42
Septiembre	8,5
Octubre	21,36
Noviembre	12,525
Diciembre	74,3
Enero	312
TOTAL, ACUMULADO	519,9

Considerando lo anterior, y teniendo en cuenta que el objeto general del contrato fue llevar a cabo obras de mantenimiento y mejoramiento en la infraestructura de 19 Instituciones Educativas del distrito de Bogotá, se presenta, en la Tabla 7 la clase y tipo de RCD a generados durante la ejecución del proyecto.

Tabla 7. clase y tipo de RCD generado

CLASE DE MATERIAL	TIPO DE RCD GENERADO	ACTIVIDAD
Pétreos	Asfalto	Demolición de carpeta asfáltica de canchas deportivas
	Material de excavación	Instalación de tubería sanitaria
	Concreto	Demolición de estructuras en concreto
No pétreos	Polisombra	Cerramientos
	Madera	
Residuos peligrosos	Tejas de asbesto	Cambio de cubiertas
	Luminarias	
	Envases de pintura e insumos químicos	Adecuación de áreas comunes y salones



Cabe resaltar que el almacenamiento de dichos residuos se realizó cumpliendo con lo establecido dentro del Plan de Manejo Ambiental ofertado por el contratista y aprobado por la presente interventoría.

4.2 Disposición final

En cuanto a la disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición, el contratista realiza la disposición de 427 m³ de RCD generados durante la ejecución de las actividades de obra en cada una de las Instituciones Educativas intervenidas. En la Tabla 8 se presenta la relación del volumen de RCD dispuestos por mes.

Tabla 8. Disposición final de RCD

MES DE REPORTE	VOLUMEN (m³)	RESIDUOS PÉTREOS (TON)	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
Mayo	0	0	Escombrera "Las Manas" Máquinas Amarillas
Junio	35	23.08	
Julio	14	11.54	
Agosto	42	23.08	
Septiembre	7	11.54	
Octubre	21	11.54	
Noviembre	7	11.54	
Diciembre	49	80.79	
Enero	252	415.51	
TOTAL, ACUMULADO	427	588.62	

En el Anexo 8. Se presentan los certificados de Disposición final de los residuos de Construcción y Demolición generados durante el desarrollo del contrato

Cabe resaltar que la disposición final de dichos residuos se realizó en la escombrera denominada "Las Manas" operada por la Sociedad Maquinas Amarillas, bajo la Resolución 1480 de 2014



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (**Ver Anexo 1**) y teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad ambiental legal vigente.

4.3 Aprovechamiento y/o reutilización de RCD

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 1115 de 2012, Artículo 4, donde se establece que, *“las Entidades Públicas y Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y construcción al interior del perímetro urbano del Distrito Capital deberán incluir desde la etapa de estudios y diseños los requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr la utilización de elementos reciclados provenientes de los Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados por las etapas constructivas y de desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 25%, del total de volumen o peso de material usado en la obra”*; se llevó a cabo la reutilización de 92,9 m³ de los residuos de construcción y demolición generados en obra, lo cual corresponde al 64% de aprovechamiento, considerando que, durante la ejecución del contrato el contratista adquirió un total de 146,3 m³ de materiales para el desarrollo de las obras. dando cumplimiento a lo requerido por la Autoridad Ambiental Competente y lo exigido en la legislación ambiental legal vigente.

Cabe resaltar que la interventoría realizó el acompañamiento y el seguimiento de dicha reutilización, por lo cual se acredita que lo relacionado a continuación fue cumplido a cabalidad por parte de la firma contratista.

En el Anexo 9. Se presentan los formatos de aprovechamiento de RCD de cada uno de los periodos reportados.

En la Tabla 9, se presenta la relación de la reutilización de RCD teniendo en cuenta el volumen reutilizado, el material adquirido, el porcentaje de reutilización y la actividad técnica en la cual se utilizó dicho material, de cada uno de los periodos reportados durante la vigencia del presente contrato.



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

Tabla 9. Reutilización de RCD

MES DE REPORTE	VOLUMEN REUTILIZADO (m³)	MATERIAL ADQUIRIDO EN OBRA (m³)	% REUTILIZACIÓN	ACTIVIDAD
Mayo	0	0	0	-
Junio	0,225	4,36	5%	▪ Adecuación de materia (Reutilización material de excavación)
Julio	0	2,47	0%	-
Agosto	0	4,45	0%	-
Septiembre	1,5	2,08	72%	▪ Cerramiento perimetral (Reutilización de cerramiento)
Octubre	0,36	21,52	2%	▪ Cerramiento perimetral (Reutilización de cerramiento)
Noviembre	5,525	20,64	27%	▪ Fundición de placa (Reutilización de residuos de demolición) ▪ Cerramiento perimetral (Reutilización de cerramiento) ▪ Instalación de Tubería sanitaria (Reutilización de material de excavación)
Diciembre	25,3	5,67	446%	▪ Adecuación de jardines (Reutilización de material de excavación) ▪ Cerramiento perimetral (Reutilización de cerramiento) ▪ Instalación de Tubería sanitaria (Reutilización de material de excavación)
Enero	60	85,07	71%	▪ Relleno de cancha múltiple (Reutilización de carpeta asfáltica)
TOTAL, ACUMULADO	92,9	146,3	64%	-

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

5. SOLICITUD CIERRE DE PIN

Mediante el número de radicado E-2020-69265, la presente interventoría solicita al área de Gestión Ambiental de la Secretaría de Educación, el cierre del PIN No 17110, teniendo en cuenta que, durante la ejecución del contrato de obra No CO1.PCCNTR.881434, se adelantaron los correspondientes cargues de la información en el aplicativo Web de la Secretaría Distrital de Ambiente: <https://www.secretariadeambiente.gov.co/ventanillavirtual/app>, como lo establece la Resolución 1138 de 2013 y el Decreto 586 de 2015, garantizando que los RCD generados se transportaron y dispusieron cumpliendo con lo establecido en las Resoluciones 01115 de 2012, 00932 de 2015, por el fin de prevenir, mitigar y minimizar el impacto de los RCD generados por la ciudad, el ambiente y la salud de la comunidad.

En el Anexo 10. Se presenta la trazabilidad de la información correspondiente a la carga al aplicativo de la Secretaría Distrital de Ambiente y la respectiva solicitud de cierre.

6. CERTIFICACIONES

6.1 Manejo de Sumideros

Con relación al manejo de sumideros, la presente interventoría realizó la revisión y el acompañamiento de las labores de orden, aseo y limpieza llevadas a cabo por el contratista en el área general de la obra, en las vías aledañas y en la identificación, revisión, limpieza y protección de los dos (2) sumideros ubicados en el área de influencia de la institución educativa Julio Flores Sede A y B, con el fin de garantizar el control del riesgo de aportar material particulado a las redes de alcantarillado, corrientes superficiales y a la atmosfera.

De igual forma, durante las jornadas de capacitación en temáticas propias del componente ambiental, se promovió a los trabajadores la incorporación hábitos amigables con el medio ambiente, con el fin de generar conciencia en cuanto a la disposición de residuos ordinarios, el manejo y disposición final de los residuos de construcción y demolición generados y así mismo el buen manejo de los materiales e insumos requeridos en obra.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

En el Anexo 11. Se presenta la certificación donde consta que se realizó la protección de los sumideros presentes en el área de intervención.

6.2 Manejo de la vegetación

En cuanto al manejo de la vegetación, durante la ejecución del contrato no fue necesaria la intervención de zonas verdes aledañas al proyecto, salvo en el mes de noviembre, donde se identificaron 23 individuos arbóreos en el área de influencia directa del Colegio Alfonso Jaramillo donde se estaban llevando a cabo actividades de mejoramiento del cerramiento perimetral de dicha institución, considerando esto, la firma contratista procedió a realizar el respectivo aislamiento de cada uno de los individuos identificados con el fin de evitar cualquier tipo de afectación durante la ejecución de las actividades técnicas realizadas.

Considerando lo anterior, la presente interventoría realizó la solicitud a la firma contratista para que se realizara la protección y aislamiento respectivo a cada uno de los individuos identificados con el fin de evitar algún tipo de afectación de dichas especies arbóreas, de igual forma, se llevó a cabo el acompañamiento durante la ejecución de la actividad solicitada, evidenciando que el área a intervenir quedara totalmente aislada de la vegetación identificada.

Una vez culminada la intervención de la Institución Educativa se realizó el retiro del aislamiento suministrado, dejando el área previamente aislada en iguales condiciones a las iniciales y sin causar ningún impacto negativo a los individuos arbóreos presentes en la zona.

En el Anexo 12. Se presenta la certificación donde consta que se realizó la protección de especies arbóreas sin causar afectación alguna, dejando el área en iguales condiciones a las iniciales.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

7. INDICADORES

7.1 Indicador de eficiencia

$$\frac{\text{Gastos mensuales de la implementación del PG – RCD}}{\text{Presupuesto planeado para el PG RCD}} \times 100$$

Considerando que, el valor total proyectado por la firma contratista para la gestión de la implementación del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – PG-RCD fue de \$16.797.852, los indicadores de eficiencia para la totalidad de periodos reportados durante la vigencia del presente contrato se relacionan a continuación:

Tabla 10. Indicador de Eficiencia

MES DE REPORTE	GASTOS EN LA GESTIÓN DEL PG-RCD	INDICADOR DE EFICIENCIA
Mayo	\$ -	0%
Junio	\$ 4.680.000,00	28%
Julio	\$ 560.000,00	3%
Agosto	\$ 1.680.000,00	10%
Septiembre	\$ 5.720.000,00	34%
Octubre	\$ 840.000,00	5%
Noviembre	\$ 280.000,00	2%
Diciembre	\$ 1.960.000,00	12%
Enero	\$ 11.080.000,00	66%
TOTAL, ACUMULADO	\$ 26.800.000,00	160%

Teniendo en cuenta lo anterior el valor económico total acumulado para la gestión de la implementación del PG-RCD fue superior en \$10.002.148 al proyectado, dejando así un indicador de eficiencia acumulado del 160%.



7.2 Indicador de eficacia

$$\frac{\text{Cantidad de residuos aprovechados por mes en obra}}{\text{Cantidad de material usado al mes para el desarrollo de la obra}} \times 100$$

Con relación a lo relacionado en el Numeral 3 y 4.3, donde se reporta la cantidad de material ingresado a obra y el volumen de RCD reutilizado, se realiza el calculo del indicador de eficacia de cada uno de los periodos reportados, dando como resultado un indicador de eficacia acumulado del 64%, como se evidencia en la Tabla 11.

Tabla 11. Indicador de Eficacia

MES DE REPORTE	VOLUMEN REUTILIZADO (m³)	MATERIAL ADQUIRIDO EN OBRA	INDICADOR DE EFICACIA
Mayo	0	0	0
Junio	0,225	4,36	5,2%
Julio	0	2,47	0%
Agosto	0	4,45	0%
Septiembre	1,5	2,1	72%
Octubre	0,36	21,52	2%
Noviembre	5,53	20,64	27%
Diciembre	25,29	5,67	446%
Enero	60	85,07	70,53%
TOTAL ACUMULADO	92,9	146,3	64%

7.3 Indicador de efectividad

$$\frac{\text{Cantidad de RCD dispuesto en obra por mes}}{\text{Cantidad de RCD proyectado en obra al mes}} \times 100$$



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

Considerando que, el volumen mensual proyectado por la firma contratista para la disposición final de RCD fue de 63 m³, los indicadores de efectividad para cada uno de los periodos reportados se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 12. Indicador de Efectividad

MES DE REPORTE	VOLUMEN DE RCD DISPUESTO (m³)	INDICADO DE EFECTIVIDAD
Mayo	0	0%
Junio	35	56%
Julio	14	22%
Agosto	42	67%
Septiembre	7	11%
Octubre	21	33%
Noviembre	7	11%
Diciembre	49	78%
Enero	252	400%



8. CONCLUSIONES

- De acuerdo con el Informe final del componente ambiental, la presente interventoría acredita que, la firma contratista ha dado cumplimiento a cada una de las actividades y obligaciones establecidas en el Contrato CO1.PCCNTR.881434 y a la normatividad ambiental legal vigente.
- Durante la ejecución del contrato se llevaron a cabo un total de 23 capacitaciones en temáticas propias del componente ambiental.
- Durante la ejecución del contrato, la firma contratista adquirió un total de 146,3 m³ de materiales para el desarrollo de las actividades técnicas.
- Durante la ejecución del contrato, la firma contratista realizó la disposición final de 9,92 Toneladas de residuos peligrosos y especiales.
- Durante el desarrollo del contrato se generaron 519,9 m³ de Residuos de Construcción y Demolición - RCD resultantes de las actividades técnicas realizadas en cada una de las Instituciones Educativas intervenidas con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo
- Durante la ejecución del contrato, la firma contratista realizó la disposición final de 427 m³ de RCD generados durante la ejecución de las actividades de obra en cada una de las Instituciones Educativas intervenidas.
- Se llevó a cabo la reutilización de 92,9 m³ de los residuos de construcción y demolición generados en obra, lo cual corresponde al 64% de aprovechamiento, considerando que, durante la ejecución del contrato el contratista adquirió un total de 146,3 m³ de materiales para el desarrollo de las obras. dando cumplimiento a lo requerido por la Autoridad Ambiental Competente y lo exigido en la legislación ambiental legal vigente.



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

Bucaramanga, 24 de agosto de 2020

Señores:

Supervisora

Carol Nieto

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

Av. El Dorado No. 66 - 63

Bogotá D.C.

Ref. Contrato No. 883201, que tiene por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.”.

Asunto: RADICACION DE INFORME FINAL SST DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO EN REFERENCIA

Con el fin de cumplir con los compromisos contractuales como interventoría al contrato relacionado en la referencia, queremos realizar la radicación del informe final SST de interventoría y sus anexos, los cuales ya fueron enviados y entregado al ingeniero CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN.

Agradecemos su atención y ayuda

Cordialmente,

HENCY SOTO GALVAN

Representante Legal Dacax S.A.S.

91.264.294 de Bucaramanga.

Carrera 24 # 51- 48 Torre 2 Ofi. 1004.
Tele fax (7) 6946495-Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

**INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FINAL**



**ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN**

INTERVENTORÍA

CONTRATO SED 883201

**DACAX S.A.S.
GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.**

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. OBJETIVOS.....	5
1.1 Objetivo general.....	5
1.2 Objetivos específicos	5
2. CONTROL DE PERSONAL	6
2.1 Control de personal de obra.....	6
2.2 Control de personal de interventoría	11
3. MAQUINARÍA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS.....	13
4. REPORTE DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD.....	14
4.1 Reporte de actividades	14
4.2 Estadística de accidentalidad e incidentes	17
5. PAGO DE PARAFISCALES Y SALARIOS.....	17
6. PROGRAMA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.....	18
7. CONCLUSIONES	22

RELACIÓN DE TABLAS

Tabla 1. Control de Personal de obra durante la ejecución del contrato.....	7
Tabla 2. Control de Personal de interventoría durante la ejecución del contrato	12
Tabla 3. Relación de la maquinaria usada durante la ejecución del contrato	13
Tabla 4. Relación de vehículos utilizados durante la ejecución del contrato.....	13
Tabla 5. Relación de actividades de obra por Institución Educativa intervenida	15
Tabla 6. Indicador de Estadística de Accidentalidad durante la ejecución del contrato	17
Tabla 7. Relación de actividades de capacitación y entrenamiento.....	19



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

INTRODUCCIÓN

Los Sistemas de Gestión Integral de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, han venido siendo desarrollados, como respuesta a necesidades de identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo tanto productivo como ambiental, estableciendo una autodeterminación y declaración de conformidad con las normas existentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Considerando lo anterior, y con la finalidad de cumplir con las obligaciones específicas del contrato SED 883201, cuyo objeto es desarrollar la **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO”**, la Empresa DACAX S.A.S, presenta el informe final de Seguridad y Salud en el Trabajo consolidado, correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de mayo de 2019 al 27 de enero de 2020, donde se relacionan las acciones realizadas por esta interventoría durante la ejecución total del contrato, como acompañamientos y verificaciones para aprobaciones al contratista de obra, a fin de dar el aval a la Secretaría de Educación Distrital – SED, para la revisión de la correcta implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ofertado por el contratista y aprobado por la presente interventoría.

Durante la ejecución del contrato se realizó el seguimiento a la ejecución de obras de mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales en las plantas físicas de diecinueve (19) Instituciones Educativas listadas a continuación:

1. Colegio Usaquén
2. Colegio Ramon de Zubiria
3. Colegio Frederich Newman sede A
4. Colegio Frederich Newman sede B
5. Colegio Julio Flores sede A
6. Colegio I.T.D. Julio Flores sede B
7. Colegio Cristóbal Colon
8. Colegio Alfonso Jaramillo
9. Colegio Villa Elisa sede A
10. Colegio Villa Elisa sede D
11. Colegio Nuevo Horizonte

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

12. Colegio General Santander
13. Colegio Republica Dominicana
14. Colegio Prado
15. Colegio La Gaitana
16. Colegio Gustavo Morales Sede A
17. Colegio Gerardo Molina
18. Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda
19. Colegio Gustavo Morales Sede B

Con base en lo anterior, se realizó el seguimiento y acompañamiento al contratista durante la ejecución de las actividades contractuales, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente y la implementación de lo establecido en el SG-SST.

A continuación, se presenta la evidencia del seguimiento de los controles implementados que se realizaron durante la ejecución del contrato:



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Reportar el cumplimiento y la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual tuvo cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.

1.2 Objetivos específicos

- Identificar la implementación de medidas de manejo de los riesgos que se ejecutan durante la realización de labores la adecuación y/o mejoramientos escolares de los colegios intervenidos durante el periodo.
- Verificar el cumplimiento normativo de pagos de seguridad social, bienestar laboral, entrega de dotaciones y uso de elementos de protección personal, en cada actividad que se realice en los centros educativos.
- Demostrar el cumplimiento de Políticas, reglamento interno y procedimientos que se requieran para el desarrollo de actividades de obra.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2. CONTROL DE PERSONAL

2.1 Control de personal de obra

Durante la ejecución de actividades de obra, se realizó el control del personal reportado por el contratista y su respectivo movimiento entre los frentes de obra, tanto del personal administrativo como del operativo contratado y subcontratado, verificando así la siguiente información:

- 11 personas vinculadas como personal administrativo (mano de obra calificada)
- 20 personas vinculadas como personal operativo (mano de obra no calificada)
- 9 personas vinculadas como personal operativo (mano de obra no calificada) subcontratado

De acuerdo con lo relacionado, la firma contratista reportó la contratación de 40 personas para dar cumplimiento a la plantilla mínima de profesionales requerida por la entidad y para la ejecución de las actividades de obra en cada una de las instituciones educativas objeto de intervención.

A continuación, en la Tabla 1 se presenta el listado de personal vinculado durante la ejecución de la totalidad del contrato, relacionando: nombre, número de documento de identificación, cargo, fecha de ingreso, fecha de retiro, tiempo de vinculación, contratante y el centro de trabajo.



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

Tabla 1. Control de Personal de obra durante la ejecución del contrato

MANO DE OBRA CALIFICADA PRODEIN J.G S.A.S								
No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	No. DE MESES LABORADOS	CONTRATANTE	CENTRO DE TRABAJO
1	GARCIA CABEZAS JAVIER	79.597.425	REPRESENTANTE LEGAL	4/06/2019	NA	204 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
2	VILLALBA CLAVIJO GERMAN FERNANDO	1.018.428.711	COORD. DE PROYECTOS	4/06/2019	27/01/2020	204 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
3	MONTAÑA MUÑOZ CESAR AUGUSTO	80.052.914	RESIDENTE DE OBRA	4/06/2019	27/01/2020	204 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
4	ESGUERRA BERNAL KAREN ANDREA	1.016.012.140	RESIDENTE HSEQ	4/06/2019	30/08/2019	86 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
5	CORREDOR DIAZ LEIDY YOLIMA	1.030.628.877	AUX. DE INGENIERIA	4/06/2019	2/10/2019	98 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
6	TAFUR BORJA DIEGO ANDRES	1.023.925.184	AUX. DE INGENIERIA	4/06/2019	1/08/2019	57 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
7	BUITRAGO ARIAS ZULY VIVIANA	1.033.737.954	COORD. HSEQ	7/06/2019	5/09/2019	88 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
8	URIBE BARON LADY JOHANA	52.918.226	ING. AMBIENTAL	26/06/2019	3/09/2019	67 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
9	SANCHEZ ROJAS SANTIAGO ANDRES	79.871.627	RESIDENTE DE OBRA	1/07/2019	27/01/2020	177 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
10	DIAZ PIRAZAN LIDA MAYERLY	53.132.223	ING AMBIENTAL	26/09/2019	27/01/2020	121 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

MANO DE OBRA CALIFICADA PRODEIN J.G S.A.S								
No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	No. DE MESES LABORADOS	CONTRATANTE	CENTRO DE TRABAJO
11	CARDENAS ROJAS JUAN SEBASTIAN	1.010.202.258	INSPECTOR DE OBRA	22/10/2019	27/01/2020	95 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo

MANO DE OBRA NO CALIFICADA PRODEIN J.G S.A.S								
No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	No. DE MESES LABORADOS	CONTRATANTE	CENTRO DE TRABAJO
1	RINCON PAYARES ALEXANDER JOSE	1.235.249.448	OFICIAL	4/06/2019	27/01/2019	204 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
2	CARRILLO MAHECHA HECTOR JULIO	1.013.668.768	AYUDANTE	4/06/2019	27/01/2019	204 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
3	CARRILLO MAHECHA JAVIER	3.132.914	OFICIAL	4/06/2019	27/01/2019	204 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
4	NAVARRETE CRUZ FERNANDO	80.877.986	OFICIAL	1/06/2019	8/06/2019	23 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Usaquén (junio)
5	RUIZ BUITRAGO RICARDO ALFREDO	1.033.805.610	AYUDANTE	4/06/2019	27/06/2019	23 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Usaquén (junio)
6	BRICEÑO CASTAÑEDA CARLOS DAVID	1.023.003.587	AYUDANTE	4/06/2019	15/06/2019	11 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Usaquén (junio)
7	OTALORA VARGAS MAURICIO	79.810.915	OFICIAL	4/06/2019	8/06/2019	23 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Usaquén (junio)
8	TOVAR RAMIREZ JULIAN ANDRES	80.879.106	AYUDANTE	4/06/2019	8/06/2019	23 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Usaquén (junio)
9	GARCIA AVILA LUIS ALBERTO	1.085.046.285	OFICIAL	16/06/2019	27/06/2019	11 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Gustavo Morales sede A (junio)

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

MANO DE OBRA NO CALIFICADA PRODEIN J.G S.A.S								
No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	No. DE MESES LABORADOS	CONTRATANTE	CENTRO DE TRABAJO
10	ORTEGA PILLIMUE JOSE LEONARDO	1.012.359.343	OFICIAL	16/06/2019	27/06/2019	11 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Ramon de Zubiria (junio)
11	AVILA DIAZ RUBEN DARIO	80.355.232	OFICIAL	16/06/2019	27/06/2019	11 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Gerardo Molina (junio)
12	ACOSTA VELASCO JOSE JEFFERSON	1.013.594.943	INSTALADOR	9/07/2019	27/01/2020	198 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
13	MORALES NOYA RENETH	12.603.306	AYUDANTE	9/07/2019	27/01/2020	198 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
14	DUEÑAS SIOLO NEVIS	1.033.376.245	AYUDANTE	21/10/2019	7/01/2020	76 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
15	RUIZ BELTRAN CRISTHIAN ALFONSO	1.083.871.568	AYUDANTE	28/11/2019	27/01/2020	55 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
16	PEDRAZA RIOS JOSE SAUL	79.511.716	OFICIAL	12/11/2019	2/12/2019	20 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
17	FINSICUE CONDA OVAN	1.006.527.542	AYUDANTE	5/12/2019	27/01/2020	30 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
18	FRANCISCO MORENO PEREZ	1.018.513.454	AYUDANTE	7/12/2019	27/01/2020	30 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
19	NIETO ROA JOSE ANDRES	1.031.132.649	OPERADOR MAQUINARIA	1/01/2020	27/01/2020	27 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
20	QUINTERO VELANDIA RODRIGO	79.991.876	OPERADOR MAQUINARIA	1/01/2020	27/01/2020	27 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

DE OBRA SUBCONTRATADA								
No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	No. DE MESES LABORADOS	CONTRATANTE	CENTRO DE TRABAJO
1	VIADERO MONROY LUIS EDUARDO	1.098.639.962	PINTOR	20/06/2019	30/06/2020	10 DÍAS	CIVIL MONTAJES	Gerardo Molina (junio)
2	BUSTOS UMBARILA IDSON URIEL	80.397.342	OFICIAL	1/07/2019	31/07/2019	30 DÍAS	CONSTRUCCIONES Y SERVICIO	Ramon de Zubiria (Julio)
3	VELASQUEZ GONZALEZ EDISSON HUMBERTO	1.023.909.422	OFICIAL	1/07/2019	31/07/2019	30 DÍAS	CONSTRUCCIONES Y SERVICIO	La Gaitana y Gerardo Molina (Julio)
4	CHARRIS MELENDEZ JUAN GUILLERMO	1.082.947.266	SOLDADOR	12/07/2019	27/01/2020	78 DIAS	CIVIL MONTAJES	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
5	SALINAS ALMANZA LUIS EDUARDO	79.151.529	SOLDADOR	1/08/2019	30/09/2019	60 DÍAS	METALICAS LESS	Julio Flores (agosto)
6	ACERO NAVARRO ARNOLD STEVEN	1.016.074.706	AYUDANTE	2/10/2019	30/11/2019	58 DIAS	CREO CONSTRUCCIONES	Julio Flores (octubre - noviembre)
7	BERNAL CAICEDO CRISTHIAN CAMILO	1.024.567.427	AYUDANTE	9/10/2019	30/11/2019	51 DÍAS	CREO CONSTRUCCIONES	Julio Flores (octubre - noviembre)
8	MORENO SANCHEZ EDGAR ENRIQUE	79.614.351	AYUDANTE	1/10/2019	30/11/2019	59 DÍAS	CREO CONSTRUCCIONES	Julio Flores (octubre - noviembre)
9	MADRID MORALES YESID ANTONIO	73.150.899	SOLDADOR	28/11/2019	27/01/2020	69 DÍAS	CIVIL MONTAJES	Personal vinculado en todos los centros de trabajo

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



2.2 Control de personal de interventoría

Durante la ejecución del contrato, la presente interventoría contó con el acompañamiento de diez (10) profesionales y especialistas con el fin de dar cumplimiento a la planilla mínima exigida por la Secretaría de Educación Distrital – SED. En la Tabla 2, se presenta la relación de personal de interventoría vinculado al proyecto, donde se relaciona la siguiente información:

- Nombre
- Documento de identidad
- Cargo
- Vínculo laboral
- Contratante
- Salario
- Fecha de ingreso
- Fecha de retiro
- No de meses laborados

Considerando la información anteriormente mencionada, la presente interventoría presenta en el Anexo 1. los paz y salvos correspondientes de cada uno de los profesionales que hicieron parte del proyecto. No obstante, es importante aclarar que, a la fecha no se ha logrado la obtención de los paz y salvos del siguiente personal:

- Arquitecta. Silvia Juliana Larios cuyo cargo desempeñado fue Inspector técnico de Interventoría durante la totalidad del contrato
- Ingeniera Sandra Yonaira Valencia cuyo cargo desempeñado fue directora de Interventoría durante los cuatro (4) primeros meses del contrato.

Esta situación se presenta teniendo en cuenta el manejo inadecuado que este personal le dio al dinero suministrado por la gerencia de la empresa DACAX SAS a la caja menor del contrato, evidenciando apropiación de este dinero y la no entrega de la relación de la misma, además de incumplir con el reglamento interno de trabajo y demostrar falencias éticas, profesionales, técnicas y administrativas. Por estas razones, actualmente se adelantan los procesos administrativos y judiciales pertinentes.

De igual forma, en el Anexo 1. Se presenta el oficio remitido por el representante legal de la empresa DACAX S.A.S debidamente notariado donde se manifiesta lo descrito anteriormente.



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

Tabla 2. Control de Personal de interventoría durante la ejecución del contrato

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	VINCULO LABORAL	CONTRATANTE	SALARIO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	No. DE MESES LABORADOS
1	PINZON CARLOS	78.850.656	RESIDENTE	TÉRMINO FIJO	DACAX SAS	\$ 3.800.000	6/05/2019	20/08/2019	3
2	LARIOS SILVIA	1.018.479.970	INSPECTORA	TÉRMINO FIJO	DACAX SAS	\$ 1.696.000	6/05/2019	8/02/2020	9
3	VALENCIA SANDRA	63.359.726	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TÉRMINO FIJO	DACAX SAS	\$ 828.116	6/05/2019	8/09/2019	4
4	DIAZ LIDA	53.132.223	ASESOR AMBIENTAL	OPS	DACAX SAS	\$ 525.000	6/05/2019	18/09/2019	4
5	MORENO CARLOS	10.101.867	ASESOR ELECTRICO	OPS	DACAX SAS	\$ 262.500	6/05/2019	8/02/2020	9
6	MORENO DALTON	13.838.445	ASESOR ESTRUCTURAL	OPS	DACAX SAS	\$ 525.000	6/05/2019	8/02/2020	9
7	SOTO HENCY	91.264.294	ASESOR PRESUPUESTO	TÉRMINO FIJO	DACAX SAS	\$ 525.000	6/05/2019	8/02/2020	9
8	ARGUELLO GILDARDO	13.814.817	RESIDENTE	TÉRMINO FIJO	DACAX SAS	\$ 3.000.000	27/08/2019	8/02/2020	6
9	HUERTAS SINDY	1.014.206.897	ASESOR AMBIENTAL	OPS	DACAX SAS	\$ 525.000	20/09/2019	8/02/2020	5
10	CORDOBA MARTIN	79.372.186	RESIDENTE	TÉRMINO FIJO	DACAX SAS	\$ 877.803	19/10/2019	19/10/2019	2.22

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



3. MAQUINARÍA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS

La firma contratista PRODEIN J.G S.A.S dispuso de un total de siete (7) volquetas de forma intermitente, para el transporte de materiales y residuos de construcción y demolición - RCD, las cuales cumplieron con todos los lineamientos ambientales y legales a lo largo de la ejecución del proyecto.

En cuanto a la maquinaria, se utilizó un (1) mini cargador y un (1) Vibro compactador para labores operativas dentro del proyecto.

En la Tabla 3 y en la Tabla 4, se presenta la relación de maquinaria y vehículos que estuvieron vinculados al proyecto de forma intermitente durante la ejecución de la obra, haciendo referencia al tipo de maquinaria y/o vehículo, la actividad técnica y la institución educativa objeto de intervención donde en la cual fue utilizado.

Tabla 3. Relación de la maquinaria usada durante la ejecución del contrato

No	PERIODO	MAQUINARIA/EQUIPO	ACTIVIDAD	CENTRO DE TRABAJO
1	Diciembre	Minicargador	Arreglo de cancha múltiple	Institución educativa gustavo morales
2		Vibrocompactador		
3	Enero	Minicargador	Arreglo de cancha múltiple	Institución educativa julio flores sede b
4		Vibrocompactador		

Tabla 4. Relación de vehículos utilizados durante la ejecución del contrato

PERIODO	VEHICULO	ACTIVIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA
MAYO	N.A.	N.A.	N.A.
JUNIO	VOLQUETA SCD358	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Usaquén Colegio La Gaitana Colegio Gerardo Molina
	VOLQUETA WYJ907		
JULIO	VOLQUETA SCD358	Retiro de materiales sobrantes – RCD	Colegio La Gaitana, Colegio Gerardo Molina Colegio Gustavo Morales
	VOLQUETA WYJ907		



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

PERIODO	VEHICULO	ACTIVIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA
AGOSTO	VOLQUETA SCD358	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio La Gaitana Colegio Gustavo Morales, Colegio Virginia Gutiérrez Colegio Julio Flores Sede A
SEPTIEMBRE	VOLQUETA SCD358	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Cristóbal Colon
	VOLQUETA WYJ907		
OCTUBRE	VOLQUETA WYJ907	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Nuevo Horizonte Colegio Villa Elisa Sede D
NOVIEMBRE	VOLQUETA WYJ907	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Alfonso Jaramillo Colegio Villa Elisa Sede D
DICIEMBRE	VOLQUETA WYJ907	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Julio Flores Sede A Colegio Frederich Newmann B Colegio Villa Elisa Sede A - D Colegio Prado Veraniego
ENERO	VOLQUETA WYJ907	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Julio Flores Sede B, Colegio Alfonso Jaramillo Colegio Villa Elisa A Colegio General Santander, Colegio Republica Dominicana
	VOLQUETA SCD358		
	VOLQUETA TFQ301		
	VOLQUETA SKB280		
	VOLQUETA TDL973		
	VOLQUETA SRN550		
	VOLQUETA TBZ671		

En el Anexo 2. Se presenta la documentación legal vigente de la maquinaria y vehículos utilizados durante la ejecución del contrato

4. REPORTE DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD

4.1 Reporte de actividades

Durante la ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de los 19 colegios distritales se llevaron a cabo intervenciones puntuales según los requerimientos de infraestructura de cada uno de ellos. Con el fin de avalar y supervisar las que dichos requerimientos atendieran las necesidades para la prestación del servicio educativo,



la presente interventoría realizó el seguimiento a cada una de las actividades de obra desarrolladas, las cuales se describen a continuación:

Tabla 5. Relación de actividades de obra por Institución Educativa intervenida

No	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ACTIVIDADES DE OBRA	ACCIDENTALIDAD
1	Colegio Usaqué	<ul style="list-style-type: none">▪ Obras de urbanismo▪ Construcción de andenes▪ Instalación de materas	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
2	Colegio Ramón de Zubiria	<ul style="list-style-type: none">▪ Adecuación de cocinas▪ Enchapes▪ Muros▪ Media cañas▪ Cárcamos▪ Impermeabilización de pisos▪ Pinturas	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
3	Colegio Frederich Newman sede A	<ul style="list-style-type: none">▪ Adecuación de pisos▪ Mampostería▪ Enchapes▪ Cárcamos▪ Adecuaciones Eléctricas y de gas natural	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
4	Colegio Frederich Newman sede B	<ul style="list-style-type: none">▪ Cambios de cubierta▪ Adecuación de redes eléctricas	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
5	Colegio Julio Flores sede A	<ul style="list-style-type: none">▪ Cambios de cubierta	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
6	Colegio Julio Flores sede B	<ul style="list-style-type: none">▪ Construcción de cancha múltiple	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
7	Colegio Cristóbal Colón	<ul style="list-style-type: none">▪ Adecuación de redes hidráulicas y sanitarias▪ Enchapes▪ Impermeabilización	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
8	Colegio Alfonso Jaramillo	<ul style="list-style-type: none">▪ Adecuación de salones (Estuco y pintura)▪ Instalación de cerramiento perimetral▪ Instalación de tubería hidráulica	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

No	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ACTIVIDADES DE OBRA	ACCIDENTALIDAD
9	Colegio Villa Elisa sede D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enchapes y adecuación de baños ▪ Adecuación de salones ▪ Instalación de SuperBoard en cielo raso 	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
10	Colegio Villa Elisa sede A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instalación de cubiertas, canales, flanches, platinas y perfilera metálica en salones 	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
11	Colegio Nuevo Horizonte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adecuación de baños ▪ Enchapes ▪ Instalación de unidades sanitarias ▪ Adecuación de redes hidráulicas ▪ Restauración de patio ▪ Instalación de cubierta 	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
12	Colegio General Santander	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adecuación de salones ▪ Enchapes ▪ Instalación de malla de protección de cancha 	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
13	Colegio Republica Dominicana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enchape en cocina ▪ Media caña ▪ Pintura 	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
14	Colegio Prado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adecuación de jardines ▪ Nivelación de placa de piso ▪ Instalación piso Forza 	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
15	Colegio La Gaitana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Construcción de caseta ▪ Reinstalación de rejas 	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
16	Colegio Gustavo Morales Sede A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instalación de cubiertas 	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
17	Colegio Gerardo Molina	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adecuación de cocina y cuarto frio 	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
18	Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instalación de cerramientos 	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
19	Colegio Gustavo Morales Sede B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adecuación de cancha múltiple 	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.


4.2 Estadística de accidentalidad e incidentes

Durante la ejecución del proyecto, y teniendo en cuenta el apoyo de los componentes técnico, ambiental y SST, y del seguimiento de interventoría, no se presentaron accidentes o incidentes en ninguno de los centros de trabajo.

Tabla 6. Indicador de Estadística de Accidentalidad durante la ejecución del contrato

TASA DE ACCIDENTABILIDAD	
$T.D.A = \frac{No. Accidentes en el periodo}{No. total de trabajadores en el periodo} \times 100$	
TDA	0

Gráfica 1. Estadística de Accidentalidad durante la ejecución del contrato



5. PAGO DE PARAFISCALES Y SALARIOS

Durante la ejecución del contrato, tanto la firma contratista como la presente interventoría realizan los pagos pertinentes al SGLB, Parafiscales y al SGSS, cumpliendo así con lo establecido por la normatividad vigente.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

En el Anexo 3. Se presenta la certificación del Representante Legal o del Revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios de la firma contratista y de los subcontratistas listados a continuación:

- Prodein J.G S.A.S
- Creo Construcciones
- Edgar Maquinaria
- Industrias Metálicas Less
- Civil Montajes

En el Anexo 4 se presentan las planillas de pago de seguridad de la firma contratista y de los subcontratistas listados a continuación:

- Prodein J.G S.A.S
- Creo Construcciones
- Edgar Maquinaria
- Industrias Metálicas Less
- Civil Montajes
- Construcciones Servicio Empresarial

En el Anexo 5 se presentan los paz y salvos de la totalidad del personal administrativo y operativo vinculado al contrato por medio del contratista de obra.

En el Anexo 6. Se remiten las planillas de seguridad social del personal vinculado a la interventoría durante la ejecución de la totalidad del contrato

Considerando lo anterior, es de resaltar que, la presente interventoría realizó la revisión, el seguimiento y control de los pagos de parafiscales, salarios y seguridad social realizados tanto por la firma contratista como por los subcontratistas vinculados a las actividades de obra, demostrando cumplimiento y pertinencia en los reportes entregados durante la ejecución del contrato.

6. PROGRAMA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.

Durante el periodo de ejecución de obra se presentó el cronograma de actividades del área de SST, algunas de estas actividades se realizaron de forma extraordinaria a las programadas. A continuación, se resaltan en verde las actividades ejecutadas y en la casilla se informa la fecha y las programadas se resaltan con color gris, así evidenciando el cumplimiento de las actividades de SST.



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

Tabla 7. Relación de actividades de capacitación y entrenamiento

ACTIVIDAD/ CAPACITACIÓN	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	No DE PARTICIPANTES
Inducciones SSTA	Lady Uribe Karen Esguerra	Primera, Segunda y Cuarta semana de junio	6,17 y 27 de junio	28
Orden y aseo zonas de trabajo	Lady Uribe Karen Esguerra	Tercera semana de junio	18 de junio	8
Prevención de enfermedad laboral	Lady Uribe Karen Esguerra	Tercera semana de junio	16 de junio	2
Estándares de seguridad	Lady Uribe Karen Esguerra	Cuarta semana de junio	27 de junio	3
Señalización de obra	Lady Uribe Karen Esguerra	Cuarta semana de junio	25 de junio	8
Trabajos de alto riesgo	Lady Uribe Karen Esguerra	Primera semana de junio	7 de junio	4
Inducciones SSTA	Lady Uribe Karen Esguerra	Segunda y tercera semana de julio	9,12,18 de julio	6
Plan de emergencias	Lady Uribe Karen Esguerra Zully Buitrago	Primera semana de julio	1 y 3 de julio	11
Accidente de trabajo y enfermedad laboral - ATEL	Lady Uribe Karen Esguerra Zully Buitrago	Segunda semana de Julio	11 y 12 julio	7
Reporte de condiciones inseguras	Lady Uribe Karen Esguerra Zully Buitrago	Tercera semana de junio	29 de julio	10
Trabajos de alto riesgo	Lady Uribe Karen Esguerra Zully Buitrago	Cuarta semana de junio	22, 24 y 26 de julio	10
INDUCCION DE OBRA	Lady Uribe Zuly Buitrago	Primera semana de agosto	2-ago	3

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

ACTIVIDAD/ CAPACITACIÓN	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	No DE PARTICIPANTES
MEDEVAC	Lady Uribe Zuly Buitrago	Primera semana de agosto	2 y 5 de agosto	9
Pausas activas - COPASST	Lady Uribe Zuly Buitrago	Segunda semana de agosto	8 de agosto	6
Condición y acto inseguro	Lady Uribe Zuly Buitrago	Tercera semana de agosto	19 y 22 de agosto	9
Pausas activas	Lady Uribe Zuly Buitrago	Segunda semana de agosto	15 de agosto	5
Condición y acto inseguro	Lady Uribe Zuly Buitrago	Segunda y tercera semana de septiembre	9 y 23 de septiembre	6
Orden y aseo zonas de trabajo	Lady Uribe Zuly Buitrago	Primera y cuarta semana de septiembre	2 y 24 de septiembre	5
Brigada	Lady Uribe Zuly Buitrago	Primera semana de septiembre	6 de septiembre	2
Orden y aseo	Lida Diaz	Segunda semana de octubre	12 de octubre	2
Higiene postural	Lida Diaz	Cuarta semana de octubre	24 de octubre	2
MEDEVAC	Lida Diaz	Cuarta semana de octubre	24 de octubre	2
Accidente de trabajo y enfermedad laboral - ATEL	Lida Diaz	Cuarta semana de octubre	26 de octubre	2
Trabajo de alto riesgo	Lida Diaz	Tercera semana de octubre	22 de octubre	2
Plan de emergencias	Lida Diaz	Segunda semana de noviembre	12 de noviembre	7
Trabajo de alto riesgo	Lida Diaz	Segunda semana de noviembre	18 de noviembre	7
Higiene postural	Lida Diaz	Tercera semana de noviembre	22 de noviembre	7
Accidente de trabajo y enfermedad laboral	Lida Diaz	Cuarta semana de diciembre	26 de noviembre	7

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

ACTIVIDAD/ CAPACITACIÓN	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	No DE PARTICIPANTES
MEDEVAC	Lida Diaz	Segunda semana de diciembre	12 de diciembre	3
COPASST	Lida Diaz	Tercera semana diciembre	18 de diciembre	3
Condición acto inseguro	Lida Diaz	Tercera semana de diciembre	16 de diciembre	10
Comité de convivencia laboral- responsabilidades	Lida Diaz	Cuarta semana de diciembre	23 de diciembre	10
Trabajo de alto riesgo	Lida Diaz	Segunda semana de enero	14 de enero	2
Higiene postural	Lida Diaz	Tercera semana de enero	16 de enero	2
Accidente de trabajo y enfermedad laboral	Lida Diaz	Tercera semana de enero	22 de enero	2
Plan de emergencias	Lida Diaz	Segunda semana de enero	8 de enero	2

En el Anexo 7. Se presenta la evidencia de asistencia de cada una de las actividades de capacitación y entrenamiento ejecutadas por el contratista durante la ejecución de las actividades de obra, así mismo, se presenta el cronograma de capacitaciones ofertado por el contratista y aprobado y supervisado por la presente interventoría.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

7. CONCLUSIONES

De acuerdo con el presente informe final de SST del periodo comprendido entre el 28 de mayo de 2019 y el 27 de enero de 2020, se culminaron las actividades de obra en el Contrato CO1.PCCNTR.881434 dando estricto cumplimiento a lo establecido en el SG-SST ofertado por el contratista.

Se lograron definir las directrices de cumplimiento e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual tuvo cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.

Se garantizó que todo el personal de obra contara con las afiliaciones a Seguridad social, así como la entrega y utilización de los Elementos de Protección Personal y cumplimiento de procesos.

Se dio cumplimiento a los estándares de seguridad, en los diferentes frentes de obra, con la implementación de los procedimientos y riesgos asociados, a las actividades de obra, accesos a zonas comunes y señalización de prevención de obra, para terceros como para el personal vinculado al proyecto

No se presentan accidentes de trabajo durante la ejecución del contrato en ninguna de las instituciones educativas objeto de intervención.

**CERTIFICACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGO DE
PARAFISCALES (Ley 789 de 2002)**

Señores

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL - SED

Bogotá.


Referencia: Contrato de interventoría No. 883201 del 27/03/2019, **que tiene por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.”**

Yo, **HENCY SOTO GALVÁN** identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.264.294 de Bucaramanga, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO en mi calidad de Representante Legal de DACAX S.A.S. BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he efectuado el pago por concepto de aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la factura de acta final de interventoría.

Yo, **PAOLA ANDREA OSORIO** identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.510.148 expedida en Toro, Valle del Cauca, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO en mi calidad de contadora publica de DACAX S.A.S. BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la empresa ha efectuado el pago por concepto de aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la factura de acta final de interventoría.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 2 días del mes de septiembre de 2020.


Paola Andrea Osorio
Contadora Pública TP. 156108-T
CC. 63.510.148 de Toro



HENCY SOTO GALVAN
C.C: 91.264.294 de Bucaramanga
Representante Legal DACAX S.A.S. NIT
804.010.094-1

Bucaramanga, 05 de septiembre de 2019

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente certifico que la empresa **DACAX SAS** identificada con Nit. 804.010.094-1, y/o **HENCY SOTO GALVAN** como representante legal de la misma, se encuentra a paz y salvo por todo concepto como residente de obra en el desarrollo del contrato de interventoría N° 883201 DE 2019, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO." ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA – SECRETARIA DE EDUCACION Y DACAX SAS., desde el 06 de mayo del 2019 hasta el 20 de agosto de 2019.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento.



CARLOS ANDRES PINZON HERNANDEZ
CC. 79.850.656
CEL: 322 226 3958
CORREO: andres1arquitectura@hotmail.com

Bucaramanga, 30 de ABRIL de 2020

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente certifico que la empresa **DACAX SAS** identificada con Nit. 804.010.094-1, se encuentra a paz y salvo por todo concepto como asesor especialista estructural en el desarrollo del contrato de interventoría **No 883201 DE 2019**, cuyo objeto es: **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.”** ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DACAX SAS., desde el 06 de mayo del 2019 hasta el 08 de febrero de 2020.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento.



DALTON MORENO GIRARDOT

CC. 13.838.445

CEL: 315 3847886 CORREO: dalton.moreno@gmail.com

NOTARIA UNICA DE PIEDECUESTA

La presente diligencia Notarial se hizo bajo el sistema tradicional previsto en el decreto 960 de 1970 y no con sistema de identificación Biométrica por la siguiente razón

Pandemia coronavirus

13 MAY 2020

Piedecuesta,

LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE PIEDECUESTA

CERTIFICA QUE

Gildardo Arguello Ardila -

Identificado(s) como aparece al pie de su(s) nombre(s) reconocieron como suya(s) la(s) firma(s) que aparecen en el presente documento y aceptaron que el contenido de este es cierto.

Piedecuesta, **13 MAY 2020** Fecha

G. Arguello

13'814817



Notaria Unica De Piedecuesta
Dra. Adriana Haydee Mantilla Duran
NIT 63.319.856 -8
Carrera 10 No. 7-67
6542282 - 6562738 - 6554841
RESPONSABLE IMPUESTO A LAS VENTAS

11 de 2020

FACTURA DE VENTA FV1-801325
FECHA 13/May/2020 11:04 am

CONCEPTO FACTURACION	CANT	VALOR
AUTENTICACIONES	1	\$ 2,000
Subtotal:		\$ 2,000
IVA:		\$ 380
TOTAL:		\$ 2,380

FORMA DE PAGO: Efectivo

Recibido: \$ 2,400
Cambio: \$ 20

Nelson Daza
0

Impresor: Corporación Avance
NIT. 804010424-9

SIGNO MR! Resol. SIC 18886 2017-04-19

PAZ Y SALVO

certifico que la empresa **DACAX SAS** identificada con Nit. **SOTO GALVAN** como representante legal de la misma, yo por todo concepto como residente de obra en el interventoría N° 883201 DE 2019, cuyo objeto es: **ICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS INSTITUCIONES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN EDUCATIVO."** ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA y **DACAX SAS.**, desde el 26 de agosto del 2019 hasta el 31 de mayo del 2020.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento.


GILDARDO ARGUELLO ARDILA
CC. 13.814.817
CEL: 3177362167

Bucaramanga, 30 de ABRIL de 2020

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente certifico que la empresa **DACAX SAS** identificada con Nit. 804.010.094-1, y/o **HENCY SOTO GALVAN** como representante legal de la misma, se encuentra a paz y salvo por todo concepto como residente de obra en el desarrollo del contrato de interventoría N° 883201 DE 2019, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO." ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA – SECRETARIA DE EDUCACION Y DACAX SAS., desde el 26 de agosto del 2019 hasta el 08 de febrero de 2020.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento.




GILDARDO ARGUELLO ARDILA
CC. 13.814.817
CEL: 3177362167

Bucaramanga, 30 de ABRIL de 2020

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente certifico que la empresa **DACAX SAS** identificada con Nit. 804.010.094-1, se encuentra a paz y salvo por todo concepto como asesor especialista costos y presupuestos en el desarrollo del contrato de interventoría N° **883201 DE 2019**, cuyo objeto es: **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.”** ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA – SECRETARIA DE EDUCACION Y DACAX SAS., desde el 06 de mayo del 2019 hasta el 08 de febrero de 2020.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento.



HENCY SOTO GALVAN
CC. 91.264.294
CEL: 3173636588
CORREO: hencysoto@gmail.com

Bucaramanga, 26 de noviembre de 2019

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente certifico que la empresa **DACAX SAS** identificada con Nit. 804.010.094-1, y/o **HENCY SOTO GALVAN** como representante legal de la misma, se encuentra a paz y salvo por todo concepto como asesora especialista ambiental sisoma en el desarrollo del contrato de interventoría N° 883201 DE 2019, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO." ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA – SECRETARIA DE EDUCACION Y DACAX SAS., desde el 08 de mayo del 2019 hasta el 30 de agosto de 2019.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento.



ING. LIDA MAYERLY DIAZ PIRAZAN
CC. 53.132.223 de Bogotá D.C.
CEL: 320 807 6182
CORREO: lidamay85@gmail.com




HUELLA

Bucaramanga, 30 de ABRIL de 2020

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente certifico que la empresa **DACAX SAS** identificada con Nit. 804.010.094-1, y/o **HENCY SOTO GALVAN** como representante legal de la misma, se encuentra a paz y salvo por todo concepto como director de interventoría en el desarrollo del contrato de interventoría N° 883201 DE 2019, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO." ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA – SECRETARIA DE EDUCACION Y DACAX SAS., desde el 19 de octubre del 2019 hasta el 08 de febrero de 2020.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento.



MARTIN RAFAEL CORDOBA GONZALEZ
CC. 79.372.186
CEL: 3143147087



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE
DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el cinco (05) de mayo de dos mil veinte (2020),
en la Notaría Sesenta y Tres (63) del Circuito de Bogotá D.C., compareció:

MARTIN RAFAEL CORDOBA GONZALEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUJP
#0079372186 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es
cierto.

----- Firma autógrafa -----




nb6l4pvr6kuj
05/05/2020 - 11:20:34:956



El compareciente no fue identificado mediante biometría en línea por la siguiente razón: Otras
excepciones de ley

Este folio se asocia al documento de PAZ Y SALVO



ENRIQUE JOSE NATES GUERRA
Notario sesenta y tres (63) del Circuito de Bogotá D.C.

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: nb6l4pvr6kuj



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

Bucaramanga, 12 de junio de 2020

Señores:

Supervisora

Carol Nieto

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

Av. El Dorado No. 66 - 63

Bogotá D.C.

Ref. Contrato No. 014-2019 Grupo 2, que tiene por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.”.

Asunto: PAZ Y SALVO DE PROFESIONALES del contrato en referencia.

Con el fin de cumplir con los compromisos contractuales como interventoría al contrato relacionado en la referencia, queremos informar que aún no se ha podido obtener los paz y salvos del siguiente personal: la Arq. Silvia Juliana Larios (INSPECTOR DE OBRA), y con la Ing. SANDRA YONAIRA VALENCIA (DIRECTORA DE INTERVENTORIA POR 4 MESES) con base al mal manejo de caja menor y apropiación de dineros de caja menor de la empresa DACAX SAS y la falta de entrega a la fecha de la relación de la misma en el contrato de interventoría con la secretaria de educación (SED), y faltas graves del reglamento de trabajo de la empresa (Arq. Silvia Juliana Larios) y las falencias profesionales, técnicas y administrativas y faltas graves del reglamento de trabajo de la empresa (Ing. SANDRA YONAIRA VALENCIA), razón por la cual se adelantan procesos administrativos y judiciales. Cabe recalcar que no existe una norma que imponga al trabajador el deber de firmar la liquidación que le hace su empleador al terminar el contrato de trabajo. Ni el reconocimiento y pago de los derechos laborales causados está supeditado a que el trabajador firme la liquidación. En consecuencia, no existe obligación legal alguna de que el trabajador firme la paz y salvo, y la firma no es necesaria ni para el trabajador ni para el empleador. Por otra parte, la liquidación es importante porque en ella se relacionan los conceptos liquidados, de manera que el trabajador pueda conocer qué le liquidaron y qué le están pagando, pero para ello no hace falta la firma del trabajador

Por lo anterior mencionado, informamos que no se hace posible presentar los paz y salvo de los profesionales.

Cordialmente,

Carrera 24 # 51- 48 Torre 2 Ofi. 1004.
Tele fax (7) 6946495-Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

HENCY SOTO GALVAN
Representante Legal Dacax S.A.S.
91.264.294 de Bucaramanga.

Carrera 24 # 51- 48 Torre 2 Ofi. 1004.
Tele fax (7) 6946495-Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.

Bucaramanga, 24 de Noviembre de 2020

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente certifico que la empresa **DACAX SAS** identificada con Nit. 804.010.094-1, se encuentra a paz y salvo por todo concepto como asesor especialista estructural en el desarrollo del contrato de interventoría **No 883201 DE 2019**, cuyo objeto es: **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.”** ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y **DACAX SAS.**, desde el 11 de diciembre del 2019 hasta el 08 de febrero de 2020.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento.



DALTON MORENO GIRARDOT

CC. 13.838.445

CEL: 315 3847886 CORREO: dalton.moreno@gmail.com



Resolución No. 103823 del 20110811

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de prestaciones económicas en el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida del Sistema General de Pensiones

El JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PENSIONADO de la Seccional SANTANDER del Seguro Social

En uso de sus facultades estatutarias y

CONSIDERANDO:

Que el **14 de Abril de 2011**, se presentó a reclamar pensión de vejez el (la) señor(a) **GILDARDO ARGUELLO ARDILA**, identificado(a) con la **CEDULA DE CIUDADANIA No. 13.814.817**, números de afiliación **913814817** de la Seccional SANTANDER, por considerar cumplidos los requisitos legales para acceder a ella, teniendo como último empleador a **ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA**, NIT No. **890200162**

Que en efecto de resolver la solicitud presentada, se procede a estudiar los documentos obrantes en el expediente y las normas aplicables, encontrando:

Que según los documentos obrantes en el expediente, el (la) asegurado(a) nació el **25 de Febrero de 1951**, concluyendo que acredita la edad necesaria para acceder a la prestación solicitada.

Que dentro del expediente, obra copia de la resolución **320**, mediante la cual el **ACUEDUCTO DE BUCARAMANGA** reconoce pensión mensual vitalicia de jubilación al (la) solicitante, a partir del **01 de Septiembre de 2000**, en cuantía inicial de **\$1 967 053**.

Que el artículo 16 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, normatividad vigente para la época en que se concedió pensión mensual vitalicia de jubilación establece que el empleador que haya concedido una pensión de jubilación de carácter legal, continuará cotizando al Seguro Social hasta que el trabajador cumpla con los requisitos mínimos exigidos por este Instituto para otorgar la pensión de vejez, momento en el cual el Seguro Social cubre dicha pensión, siendo de cuenta del empleador jubilante el pago del mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Seguro Social y la que venía cancelando el empleador; es decir que este Instituto subroga al empleador en la obligación de continuar cancelado la pensión de jubilación que hubiere otorgado, quedando éste a cargo del pago del excedente.

Que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, establece el Régimen de Transición para las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley en mención acrediten 35 o más años de edad en el caso de las mujeres y 40 o más años de edad en el caso de los hombres, o más de 15 años de servicio, permitiendo aplicar la edad para pensionarse, el número de semanas o tiempo cotizado y el monto pensional del régimen anterior al que venía afiliados, el cual para el caso en cuestión se trata del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que exige para acceder a la pensión de vejez acreditar 55 o más años de edad en el caso de las mujeres o 60 o más años de edad en el caso de los hombres y un mínimo de 500 semanas cotizadas al Seguro Social en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad o un total de 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo.

Que revisados los reportes de semanas cotizadas por el (la) asegurado(a) a través de los Sistemas de Facturación y Autoliquidación de Aportes, expedidos por las Gerencias Nacionales de Historia Laboral y Nómina de Pensionados de la Vicepresidencia de Pensiones y de Recaudo y Cartera de la Vicepresidencia Financiera del Instituto de Seguros Sociales, luego de efectuar la imputación de pagos prevista en el artículo 29 del Decreto 1818 de 1996, modificado por los artículos 53 del Decreto 1406 de 1999 y 9 del Decreto 510 de 2003, se establece que el (la) asegurado(a) cotizó a este Instituto en forma interrumpida un total de **1890** semanas, desde

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIERIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	549324942	9401861025	E	2019/12/03	2020/01/16	BANCO POPULAR	44	\$662,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIERIA L (3 Afiliados)					\$2,484,348	\$397,500			\$2,484,348	\$99,600			\$2,484,348	\$99,600			\$2,484,348	\$44,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: DOS (1 Afiliados)					\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400		\$0	\$0	
1	CC	52768823	GALLO MARYBEL	230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$4,400	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: TRES (2 Afiliados)					\$1,656,232	\$265,000			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$40,400		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$1,656,232	\$265,000			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$40,400		\$0	\$0	
2	CC	10101867	MORENO CARLOS	230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0
3	CC	3250101	NIÑO GABRIEL	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS010	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0
Total Afiliados(3)					\$2,484,348	\$397,500			\$2,484,348	\$99,600			\$2,484,348	\$99,600			\$2,484,348	\$44,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIERIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	549324942	9401861025	E	2019/12/03	2020/01/16	BANCO POPULAR	44	\$662,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$397,500	\$12,600	\$0	\$410,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$132,500	\$4,200	\$0	\$136,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$265,000	\$8,400	\$0	\$273,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$44,800	\$1,500	\$0	\$46,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$44,800	\$1,500	\$0	\$46,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$99,600	\$3,200	\$0	\$102,800	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	\$99,600	\$3,200	\$0	\$102,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$99,600	\$3,200	\$0	\$102,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$33,200	\$1,100	\$0	\$34,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$66,400	\$2,100	\$0	\$68,500	
TOTAL				3	\$641,500	\$20,500	\$0	\$662,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIERIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2020-01	549332330	9401861426	E	2020/01/03	2020/01/16	BANCO POPULAR	13	\$647,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIERIA L (3 Afiliados)					\$2,484,348	\$397,500			\$2,484,348	\$99,600			\$2,484,348	\$99,600			\$2,484,348	\$44,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: DOS (1 Afiliados)					\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400		\$0	\$0	
1	CC	52768823	GALLO MARYBEL	230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$4,400	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: TRES (2 Afiliados)					\$1,656,232	\$265,000			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$40,400		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$1,656,232	\$265,000			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$40,400		\$0	\$0	
2	CC	10101867	MORENO CARLOS	230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0
3	CC	3250101	NIÑO GABRIEL	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS010	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0
Total Afiliados(3)					\$2,484,348	\$397,500			\$2,484,348	\$99,600			\$2,484,348	\$99,600			\$2,484,348	\$44,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIERIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2020-01	549332330	9401861426	E	2020/01/03	2020/01/16	BANCO POPULAR	13	\$647,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$397,500	\$3,800	\$0	\$401,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$132,500	\$1,300	\$0	\$133,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$265,000	\$2,500	\$0	\$267,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$44,800	\$500	\$0	\$45,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$44,800	\$500	\$0	\$45,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$99,600	\$1,000	\$0	\$100,600	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	\$99,600	\$1,000	\$0	\$100,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$99,600	\$1,100	\$0	\$100,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$33,200	\$400	\$0	\$33,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$66,400	\$700	\$0	\$67,100	
TOTAL				3	\$641,500	\$6,400	\$0	\$647,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIERIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	462675504	8493918562	E	2019/06/05	2019/06/27	BANCO POPULAR	22	\$652,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIERIA L (3 Afiliados)					\$2,484,348	\$397,500			\$2,484,348	\$99,600			\$2,484,348	\$99,600			\$2,484,348	\$44,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: DOS (1 Afiliados)					\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400		\$0	\$0	
1	CC	52768823	GALLO MARYBEL	230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$4,400	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: TRES (2 Afiliados)					\$1,656,232	\$265,000			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$40,400		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$1,656,232	\$265,000			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$40,400		\$0	\$0	
2	CC	10101867	MORENO CARLOS	230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0
3	CC	3250101	NIÑO GABRIEL	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS010	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0
Total Afiliados(3)					\$2,484,348	\$397,500			\$2,484,348	\$99,600			\$2,484,348	\$99,600			\$2,484,348	\$44,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIERIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	462675504	8493918562	E	2019/06/05	2019/06/27	BANCO POPULAR	22	\$652,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$397,500	\$6,500	\$0	\$404,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$132,500	\$2,200	\$0	\$134,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$265,000	\$4,300	\$0	\$269,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$44,800	\$800	\$0	\$45,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$44,800	\$800	\$0	\$45,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$99,600	\$1,700	\$0	\$101,300	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	\$99,600	\$1,700	\$0	\$101,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$99,600	\$1,700	\$0	\$101,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$33,200	\$600	\$0	\$33,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$66,400	\$1,100	\$0	\$67,500	
TOTAL				3	\$641,500	\$10,700	\$0	\$652,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIERIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	454198367	8493223134	E	2019/05/03	2019/06/05	BANCO POPULAR	33	\$684,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L (6 Afiliados)					\$2,567,166	\$411,000			\$2,567,166	\$103,200			\$2,564,162	\$103,000			\$2,567,166	\$50,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CINCO (3 Afiliados)					\$82,818	\$13,500			\$82,818	\$3,600			\$79,814	\$3,400			\$82,818	\$6,000		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					\$82,818	\$13,500			\$82,818	\$3,600			\$79,814	\$3,400			\$82,818	\$6,000		\$0	\$0	
1	CC	18395949	BENAVIDES CARLOS	230201	1	\$27,607	\$4,500	EPS005	1	\$27,607	\$1,200	CCF24	1	\$27,607	\$1,200	14-23	1	\$27,607	\$2,000	1	\$0	\$0
2	CC	3253229	FLORIDO ALBERTO	25-14	1	\$27,604	\$4,500	EPS002	1	\$27,604	\$1,200	CCF24	1	\$24,600	\$1,000	14-23	1	\$27,604	\$2,000	1	\$0	\$0
3	CC	1012465954	FLORIDO JOHAN	230301	1	\$27,607	\$4,500	EPS002	1	\$27,607	\$1,200	CCF24	1	\$27,607	\$1,200	14-23	1	\$27,607	\$2,000	1	\$0	\$0
Centro de Trabajo: DOS (1 Afiliados)					\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400		\$0	\$0	
4	CC	52768823	GALLO MARYBEL	230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$4,400	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: TRES (2 Afiliados)					\$1,656,232	\$265,000			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$40,400		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$1,656,232	\$265,000			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$40,400		\$0	\$0	
5	CC	10101867	MORENO CARLOS	230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0
6	CC	3250101	NIÑO GABRIEL	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS010	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0
Total Afiliados(6)					\$2,567,166	\$411,000			\$2,567,166	\$103,200			\$2,564,162	\$103,000			\$2,567,166	\$50,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIERIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-04	2019-05	454198367	8493223134	E	2019/05/03	2019/06/05	BANCO POPULAR	33	\$684,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$411,000	\$10,200	\$0	\$421,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$137,000	\$3,400	\$0	\$140,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$269,500	\$6,600	\$0	\$276,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$4,500	\$200	\$0	\$4,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$50,800	\$1,300	\$0	\$52,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	\$50,800	\$1,300	\$0	\$52,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$103,000	\$2,600	\$0	\$105,600	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	\$103,000	\$2,600	\$0	\$105,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	\$103,200	\$2,800	\$0	\$106,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$33,200	\$900	\$0	\$34,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$66,400	\$1,700	\$0	\$68,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$2,400	\$100	\$0	\$2,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$1,200	\$100	\$0	\$1,300	
TOTAL				6	\$668,000	\$16,900	\$0	\$684,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIERIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	519587358	8499018789	E	2019/11/05	2019/11/12	BANCO POPULAR	7	\$645,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIERIA L (3 Afiliados)					\$2,484,348	\$397,500			\$2,484,348	\$99,600			\$2,484,348	\$99,600			\$2,484,348	\$44,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: DOS (1 Afiliados)					\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400		\$0	\$0	
1	CC	52768823	GALLO MARYBEL	230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$4,400	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: TRES (2 Afiliados)					\$1,656,232	\$265,000			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$40,400		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$1,656,232	\$265,000			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$40,400		\$0	\$0	
2	CC	10101867	MORENO CARLOS	230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0
3	CC	3250101	NIÑO GABRIEL	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS010	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0
Total Afiliados(3)					\$2,484,348	\$397,500			\$2,484,348	\$99,600			\$2,484,348	\$99,600			\$2,484,348	\$44,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIERIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	519587358	8499018789	E	2019/11/05	2019/11/12	BANCO POPULAR	7	\$645,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$397,500	\$2,100	\$0	\$399,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$132,500	\$700	\$0	\$133,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$265,000	\$1,400	\$0	\$266,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$44,800	\$300	\$0	\$45,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$44,800	\$300	\$0	\$45,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$99,600	\$600	\$0	\$100,200	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	\$99,600	\$600	\$0	\$100,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$99,600	\$600	\$0	\$100,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$33,200	\$200	\$0	\$33,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$66,400	\$400	\$0	\$66,800	
TOTAL				3	\$641,500	\$3,600	\$0	\$645,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIERIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	511590904	8498129314	E	2019/10/02	2019/10/23	BANCO POPULAR	21	\$669,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L (5 Afiliados)					\$2,539,556	\$406,500			\$2,539,556	\$102,000			\$2,539,556	\$102,000			\$2,539,556	\$48,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CINCO (2 Afiliados)					\$55,208	\$9,000			\$55,208	\$2,400			\$55,208	\$2,400			\$55,208	\$4,000		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$55,208	\$9,000			\$55,208	\$2,400			\$55,208	\$2,400			\$55,208	\$4,000		\$0	\$0	
1	CC	1033684523	AHUMADA EDWARD	25-14	1	\$27,604	\$4,500	EPS017	1	\$27,604	\$1,200	CCF24	1	\$27,604	\$1,200	14-23	1	\$27,604	\$2,000	1	\$0	\$0
2	CC	1026580323	RICO CRISTIAN	230301	1	\$27,604	\$4,500	EPS002	1	\$27,604	\$1,200	CCF24	1	\$27,604	\$1,200	14-23	1	\$27,604	\$2,000	1	\$0	\$0
Centro de Trabajo: DOS (1 Afiliados)					\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$33,200			\$828,116	\$4,400		\$0	\$0	
3	CC	52768823	GALLO MARYBEL	230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$4,400	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: TRES (2 Afiliados)					\$1,656,232	\$265,000			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$40,400		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$1,656,232	\$265,000			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$66,400			\$1,656,232	\$40,400		\$0	\$0	
4	CC	10101867	MORENO CARLOS	230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0
5	CC	3250101	NIÑO GABRIEL	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS010	30	\$828,116	\$33,200	CCF24	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$20,200	30	\$0	\$0
Total Afiliados(5)					\$2,539,556	\$406,500			\$2,539,556	\$102,000			\$2,539,556	\$102,000			\$2,539,556	\$48,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIERIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-09	2019-10	511590904	8498129314	E	2019/10/02	2019/10/23	BANCO POPULAR	21	\$669,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$406,500	\$6,300	\$0	\$412,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$137,000	\$2,100	\$0	\$139,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$269,500	\$4,200	\$0	\$273,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$48,800	\$800	\$0	\$49,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	\$48,800	\$800	\$0	\$49,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$102,000	\$1,600	\$0	\$103,600	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	\$102,000	\$1,600	\$0	\$103,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$102,000	\$1,800	\$0	\$103,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$33,200	\$600	\$0	\$33,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$67,600	\$1,100	\$0	\$68,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$1,200	\$100	\$0	\$1,300	
TOTAL				5	\$659,300	\$10,500	\$0	\$669,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCAMANGA-SANTANDER	6946495	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	1000000638	8493550534	E	2019/06/26	2019/06/21	BANCO BOGOTA	0	\$2,204,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Días	IBC	Aporte	
Sucursal: ADMINISTRACION (6 Afiliados)							\$7,802,552	\$1,248,600				\$7,802,552	\$312,400				\$7,802,552	\$330,800			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)							\$3,302,551	\$528,500				\$3,302,551	\$132,300				\$3,302,551	\$17,400			\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)							\$3,302,551	\$528,500				\$3,302,551	\$132,300				\$3,302,551	\$17,400			\$0	\$0	
1	CC	91234031	BARON ALIRIO		25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS037	30	\$828,116	\$33,200	CCF40	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$4,400	30	\$0	\$0
2	CC	1095938541	GOMEZ DAVID		230201	30	\$1,166,000	\$186,600	EPS002	30	\$1,166,000	\$46,700	CCF40	30	\$1,166,000	\$46,700	14-11	30	\$1,166,000	\$6,100	30	\$0	\$0
3	CC	91264294	SOTO HENCY		25-14	30	\$1,060,000	\$169,600	EPS005	30	\$1,060,000	\$42,400	CCF40	30	\$1,060,000	\$42,400	14-11	30	\$1,060,000	\$5,600	30	\$0	\$0
4	CC	63359726	VALENCIA SANDRA		25-14	9	\$248,435	\$39,800	EPS005	9	\$248,435	\$10,000	CCF40	9	\$248,435	\$10,000	14-11	9	\$248,435	\$1,300	9	\$0	\$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (2 Afiliados)							\$4,500,001	\$720,100				\$4,500,001	\$180,100				\$4,500,001	\$313,400			\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)							\$4,500,001	\$720,100				\$4,500,001	\$180,100				\$4,500,001	\$313,400			\$0	\$0	
5	CC	1018479970	LARIOS SILVIA		230301	25	\$1,333,334	\$213,400	EPS016	25	\$1,333,334	\$53,400	CCF40	25	\$1,333,334	\$53,400	14-11	25	\$1,333,334	\$92,900	25	\$0	\$0
6	CC	79850656	PINZON CARLOS		25-14	25	\$3,166,667	\$506,700	EPS017	25	\$3,166,667	\$126,700	CCF40	25	\$3,166,667	\$126,700	14-11	25	\$3,166,667	\$220,500	25	\$0	\$0
Total Afiliados(6)							\$7,802,552	\$1,248,600				\$7,802,552	\$312,400				\$7,802,552	\$330,800			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-05	2019-06	1000000638		8493550534	E	2019/06/26	2019/06/21	BANCO BOGOTA	\$2,204,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$1,248,600	\$0	\$0	\$1,248,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$848,600	\$0	\$0	\$848,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$213,400	\$0	\$0	\$213,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$186,600	\$0	\$0	\$186,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$330,800	\$0	\$0	\$330,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$330,800	\$0	\$0	\$330,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$312,400	\$0	\$0	\$312,400	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	6	\$312,400	\$0	\$0	\$312,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	\$312,400	\$0	\$0	\$312,400	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$53,400	\$0	\$0	\$53,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$126,700	\$0	\$0	\$126,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$46,700	\$0	\$0	\$46,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$52,400	\$0	\$0	\$52,400	
TOTAL				6	\$2,204,200	\$0	\$0	\$2,204,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-06	2019-07	67288241		8494896307	E	2019/07/23	2019/07/29	BANCO DE OCCIDENTE	\$2,675,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: ADMINISTRACION (6 Afiliados)					\$9,282,232	\$1,523,200			\$9,282,232	\$371,500			\$9,282,232	\$371,500			\$9,282,232	\$396,400		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)					\$3,882,232	\$621,200			\$3,882,232	\$155,500			\$3,882,232	\$155,500			\$3,882,232	\$20,500		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)					\$3,882,232	\$621,200			\$3,882,232	\$155,500			\$3,882,232	\$155,500			\$3,882,232	\$20,500		\$0	\$0	
1	CC	91234031	BARON ALIRIO	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS037	30	\$828,116	\$33,200	CCF40	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$4,400	30	\$0	\$0
2	CC	1095938541	GOMEZ DAVID	230201	30	\$1,166,000	\$186,600	EPS002	30	\$1,166,000	\$46,700	CCF40	30	\$1,166,000	\$46,700	14-11	30	\$1,166,000	\$6,100	30	\$0	\$0
3	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	\$1,060,000	\$169,600	EPS005	30	\$1,060,000	\$42,400	CCF40	30	\$1,060,000	\$42,400	14-11	30	\$1,060,000	\$5,600	30	\$0	\$0
4	CC	63359726	VALENCIA SANDRA	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS005	30	\$828,116	\$33,200	CCF40	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$4,400	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (2 Afiliados)					\$5,400,000	\$902,000			\$5,400,000	\$216,000			\$5,400,000	\$216,000			\$5,400,000	\$375,900		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)					\$5,400,000	\$902,000			\$5,400,000	\$216,000			\$5,400,000	\$216,000			\$5,400,000	\$375,900		\$0	\$0	
5	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS016	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF40	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$111,400	30	\$0	\$0
6	CC	79850656	PINZON CARLOS	25-14	30	\$3,800,000	\$646,000	EPS017	30	\$3,800,000	\$152,000	CCF40	30	\$3,800,000	\$152,000	14-11	30	\$3,800,000	\$264,500	30	\$0	\$0
Total Afiliados(6)					\$9,282,232	\$1,523,200			\$9,282,232	\$371,500			\$9,282,232	\$371,500			\$9,282,232	\$396,400		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-06	2019-07	67288241	8494896307	E	2019/07/23	2019/07/29	BANCO DE OCCIDENTE	6	\$2,675,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$1,523,200	\$7,000	\$0	\$1,530,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,080,600	\$4,900	\$0	\$1,085,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$256,000	\$1,200	\$0	\$257,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$186,600	\$900	\$0	\$187,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$396,400	\$1,800	\$0	\$398,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$396,400	\$1,800	\$0	\$398,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$371,500	\$1,700	\$0	\$373,200	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	6	\$371,500	\$1,700	\$0	\$373,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	\$371,500	\$1,900	\$0	\$373,400	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$64,000	\$300	\$0	\$64,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$152,000	\$700	\$0	\$152,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$33,200	\$200	\$0	\$33,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$46,700	\$300	\$0	\$47,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$75,600	\$400	\$0	\$76,000	
TOTAL				6	\$2,662,600	\$12,400	\$0	\$2,675,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	1000000021	8496179106	E	2019/08/26	2019/08/29	BANCO BOGOTA	3	\$2,613,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: ADMINISTRACION (6 Afiliados)					\$9,055,217	\$1,487,000			\$9,055,217	\$362,400			\$9,055,217	\$362,400			\$9,055,217	\$395,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)					\$3,655,217	\$585,000			\$3,655,217	\$146,400			\$3,655,217	\$146,400			\$3,655,217	\$19,300		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)					\$3,655,217	\$585,000			\$3,655,217	\$146,400			\$3,655,217	\$146,400			\$3,655,217	\$19,300		\$0	\$0	
1	CC	91234031	BARON ALIRIO	25-14	26	\$717,701	\$114,900	EPS037	26	\$717,701	\$28,800	CCF40	26	\$717,701	\$28,800	14-11	26	\$717,701	\$3,800	26	\$0	\$0
2	CC	1095938541	GOMEZ DAVID	230201	27	\$1,049,400	\$168,000	EPS002	27	\$1,049,400	\$42,000	CCF40	27	\$1,049,400	\$42,000	14-11	27	\$1,049,400	\$5,500	27	\$0	\$0
3	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	\$1,060,000	\$169,600	EPS005	30	\$1,060,000	\$42,400	CCF40	30	\$1,060,000	\$42,400	14-11	30	\$1,060,000	\$5,600	30	\$0	\$0
4	CC	63359726	VALENCIA SANDRA	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS005	30	\$828,116	\$33,200	CCF40	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$4,400	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (2 Afiliados)					\$5,400,000	\$902,000			\$5,400,000	\$216,000			\$5,400,000	\$216,000			\$5,400,000	\$375,900		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)					\$5,400,000	\$902,000			\$5,400,000	\$216,000			\$5,400,000	\$216,000			\$5,400,000	\$375,900		\$0	\$0	
5	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS016	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF40	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$111,400	30	\$0	\$0
6	CC	79850656	PINZON CARLOS	25-14	30	\$3,800,000	\$646,000	EPS017	30	\$3,800,000	\$152,000	CCF40	30	\$3,800,000	\$152,000	14-11	30	\$3,800,000	\$264,500	30	\$0	\$0
Total Afiliados(6)					\$9,055,217	\$1,487,000			\$9,055,217	\$362,400			\$9,055,217	\$362,400			\$9,055,217	\$395,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-07	2019-08	1000000021		8496179106	E	2019/08/26	2019/08/29	BANCO BOGOTA	\$2,613,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$1,487,000	\$3,500	\$0	\$1,490,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,063,000	\$2,500	\$0	\$1,065,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$256,000	\$600	\$0	\$256,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$168,000	\$400	\$0	\$168,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$395,200	\$900	\$0	\$396,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$395,200	\$900	\$0	\$396,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$362,400	\$900	\$0	\$363,300	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	6	\$362,400	\$900	\$0	\$363,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	\$362,400	\$1,000	\$0	\$363,400	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$64,000	\$200	\$0	\$64,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$152,000	\$400	\$0	\$152,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$28,800	\$100	\$0	\$28,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$42,000	\$100	\$0	\$42,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$75,600	\$200	\$0	\$75,800	
TOTAL				6	\$2,607,000	\$6,300	\$0	\$2,613,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-08	2019-09	1000000325		8497886481	E	2019/09/23	2019/10/09	BANCO BOGOTA	\$1,605,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: ADMINISTRACION (4 Afiliados)					\$5,514,783	\$882,400			\$5,514,783	\$220,700			\$5,514,783	\$220,700			\$5,514,783	\$262,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)					\$1,888,116	\$302,100			\$1,888,116	\$75,600			\$1,888,116	\$75,600			\$1,888,116	\$10,000		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)					\$1,888,116	\$302,100			\$1,888,116	\$75,600			\$1,888,116	\$75,600			\$1,888,116	\$10,000		\$0	\$0	
1	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	\$1,060,000	\$169,600	EPS005	30	\$1,060,000	\$42,400	CCF40	30	\$1,060,000	\$42,400	14-11	30	\$1,060,000	\$5,600	30	\$0	\$0
2	CC	63359726	VALENCIA SANDRA	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS005	30	\$828,116	\$33,200	CCF40	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$4,400	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (2 Afiliados)					\$3,626,667	\$580,300			\$3,626,667	\$145,100			\$3,626,667	\$145,100			\$3,626,667	\$252,500		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)					\$3,626,667	\$580,300			\$3,626,667	\$145,100			\$3,626,667	\$145,100			\$3,626,667	\$252,500		\$0	\$0	
3	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS016	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF40	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$111,400	30	\$0	\$0
4	CC	79850656	PINZON CARLOS	25-14	16	\$2,026,667	\$324,300	EPS017	16	\$2,026,667	\$81,100	CCF40	16	\$2,026,667	\$81,100	14-11	16	\$2,026,667	\$141,100	16	\$0	\$0
Total Afiliados(4)					\$5,514,783	\$882,400			\$5,514,783	\$220,700			\$5,514,783	\$220,700			\$5,514,783	\$262,500		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-08	2019-09	1000000325	8497886481	E	2019/09/23	2019/10/09	BANCO BOGOTA	16	\$1,605,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$882,400	\$10,400	\$0	\$892,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$626,400	\$7,400	\$0	\$633,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$256,000	\$3,000	\$0	\$259,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$262,500	\$3,100	\$0	\$265,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$262,500	\$3,100	\$0	\$265,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$220,700	\$2,600	\$0	\$223,300	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	\$220,700	\$2,600	\$0	\$223,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$220,700	\$2,700	\$0	\$223,400	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$64,000	\$800	\$0	\$64,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$81,100	\$1,000	\$0	\$82,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$75,600	\$900	\$0	\$76,500	
TOTAL				4	\$1,586,300	\$18,800	\$0	\$1,605,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-09	2019-10	1000000572		8497832010	E	2019/10/23	2019/10/11	BANCO BOGOTA	\$803,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: ADMINISTRACION (3 Afiliados)					\$2,853,228	\$456,600			\$2,853,228	\$114,200			\$2,853,228	\$114,200			\$2,853,228	\$118,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)					\$1,253,228	\$200,600			\$1,253,228	\$50,200			\$1,253,228	\$50,200			\$1,253,228	\$6,700		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)					\$1,253,228	\$200,600			\$1,253,228	\$50,200			\$1,253,228	\$50,200			\$1,253,228	\$6,700		\$0	\$0	
1	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	\$1,060,000	\$169,600	EPS005	30	\$1,060,000	\$42,400	CCF40	30	\$1,060,000	\$42,400	14-11	30	\$1,060,000	\$5,600	30	\$0	\$0
2	CC	63359726	VALENCIA SANDRA	25-14	7	\$193,228	\$31,000	EPS005	7	\$193,228	\$7,800	CCF40	7	\$193,228	\$7,800	14-11	7	\$193,228	\$1,100	7	\$0	\$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$64,000			\$1,600,000	\$64,000			\$1,600,000	\$111,400		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$64,000			\$1,600,000	\$64,000			\$1,600,000	\$111,400		\$0	\$0	
3	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS016	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF40	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$111,400	30	\$0	\$0
Total Afiliados(3)					\$2,853,228	\$456,600			\$2,853,228	\$114,200			\$2,853,228	\$114,200			\$2,853,228	\$118,100		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-09	2019-10	1000000572	8497832010	E	2019/10/23	2019/10/11	BANCO BOGOTA	0	\$803,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$456,600	\$0	\$0	\$456,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$200,600	\$0	\$0	\$200,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$118,100	\$0	\$0	\$118,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$118,100	\$0	\$0	\$118,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$114,200	\$0	\$0	\$114,200	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$114,200	\$0	\$0	\$114,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$114,200	\$0	\$0	\$114,200	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$64,000	\$0	\$0	\$64,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$50,200	\$0	\$0	\$50,200	
TOTAL				3	\$803,100	\$0	\$0	\$803,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-09	2019-10	1000000572		8497832010	E	2019/10/23	2019/10/11	BANCO BOGOTA	\$803,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: ADMINISTRACION (3 Afiliados)					\$2,853,228	\$456,600			\$2,853,228	\$114,200			\$2,853,228	\$114,200			\$2,853,228	\$118,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)					\$1,253,228	\$200,600			\$1,253,228	\$50,200			\$1,253,228	\$50,200			\$1,253,228	\$6,700		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)					\$1,253,228	\$200,600			\$1,253,228	\$50,200			\$1,253,228	\$50,200			\$1,253,228	\$6,700		\$0	\$0	
1	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	\$1,060,000	\$169,600	EPS005	30	\$1,060,000	\$42,400	CCF40	30	\$1,060,000	\$42,400	14-11	30	\$1,060,000	\$5,600	30	\$0	\$0
2	CC	63359726	VALENCIA SANDRA	25-14	7	\$193,228	\$31,000	EPS005	7	\$193,228	\$7,800	CCF40	7	\$193,228	\$7,800	14-11	7	\$193,228	\$1,100	7	\$0	\$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$64,000			\$1,600,000	\$64,000			\$1,600,000	\$111,400		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$64,000			\$1,600,000	\$64,000			\$1,600,000	\$111,400		\$0	\$0	
3	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS016	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF40	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$111,400	30	\$0	\$0
Total Afiliados(3)					\$2,853,228	\$456,600			\$2,853,228	\$114,200			\$2,853,228	\$114,200			\$2,853,228	\$118,100		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-09	2019-10	1000000572	8497832010	E	2019/10/23	2019/10/11	BANCO BOGOTA	0	\$803,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$456,600	\$0	\$0	\$456,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$200,600	\$0	\$0	\$200,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$256,000	\$0	\$0	\$256,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$118,100	\$0	\$0	\$118,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$118,100	\$0	\$0	\$118,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$114,200	\$0	\$0	\$114,200	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$114,200	\$0	\$0	\$114,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$114,200	\$0	\$0	\$114,200	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$64,000	\$0	\$0	\$64,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$50,200	\$0	\$0	\$50,200	
TOTAL				3	\$803,100	\$0	\$0	\$803,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	04589392	9400131003	E	2019/11/26	2019/11/29	BANCO DE OCCIDENTE	3	\$860,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: ADMINISTRACION (3 Afiliados)					\$2,991,247	\$478,600			\$2,991,247	\$119,700			\$2,991,247	\$119,700			\$2,991,247	\$140,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)					\$1,060,000	\$169,600			\$1,060,000	\$42,400			\$1,060,000	\$42,400			\$1,060,000	\$5,600		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,060,000	\$169,600			\$1,060,000	\$42,400			\$1,060,000	\$42,400			\$1,060,000	\$5,600		\$0	\$0	
1	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	\$1,060,000	\$169,600	EPS005	30	\$1,060,000	\$42,400	CCF40	30	\$1,060,000	\$42,400	14-11	30	\$1,060,000	\$5,600	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (2 Afiliados)					\$1,931,247	\$309,000			\$1,931,247	\$77,300			\$1,931,247	\$77,300			\$1,931,247	\$134,500		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)					\$1,931,247	\$309,000			\$1,931,247	\$77,300			\$1,931,247	\$77,300			\$1,931,247	\$134,500		\$0	\$0	
2	CC	79372186	CORDOBA MARTIN	25-14	12	\$331,247	\$53,000	EPS037	12	\$331,247	\$13,300	CCF40	12	\$331,247	\$13,300	14-11	12	\$331,247	\$23,100	12	\$0	\$0
3	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS016	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF40	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$111,400	30	\$0	\$0
Total Afiliados(3)					\$2,991,247	\$478,600			\$2,991,247	\$119,700			\$2,991,247	\$119,700			\$2,991,247	\$140,100		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-10	2019-11	04589392	9400131003	E	2019/11/26	2019/11/29	BANCO DE OCCIDENTE	3	\$860,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$478,600	\$1,100	\$0	\$479,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$222,600	\$500	\$0	\$223,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$256,000	\$600	\$0	\$256,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$140,100	\$400	\$0	\$140,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$140,100	\$400	\$0	\$140,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$119,700	\$300	\$0	\$120,000	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$119,700	\$300	\$0	\$120,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$119,700	\$400	\$0	\$120,100	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$64,000	\$200	\$0	\$64,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$13,300	\$100	\$0	\$13,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$42,400	\$100	\$0	\$42,500	
TOTAL				3	\$858,100	\$2,200	\$0	\$860,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-12	2020-01	1000000193		9402240079	E	2020/01/24	2020/01/29	BANCO BOGOTA	\$1,016,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: ADMINISTRACION (3 Afiliados)					\$3,488,116	\$558,100			\$3,488,116	\$139,600			\$3,488,116	\$139,600			\$3,488,116	\$174,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)					\$1,060,000	\$169,600			\$1,060,000	\$42,400			\$1,060,000	\$42,400			\$1,060,000	\$5,600		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,060,000	\$169,600			\$1,060,000	\$42,400			\$1,060,000	\$42,400			\$1,060,000	\$5,600		\$0	\$0	
1	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	\$1,060,000	\$169,600	EPS005	30	\$1,060,000	\$42,400	CCF40	30	\$1,060,000	\$42,400	14-11	30	\$1,060,000	\$5,600	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (2 Afiliados)					\$2,428,116	\$388,500			\$2,428,116	\$97,200			\$2,428,116	\$97,200			\$2,428,116	\$169,100		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)					\$2,428,116	\$388,500			\$2,428,116	\$97,200			\$2,428,116	\$97,200			\$2,428,116	\$169,100		\$0	\$0	
2	CC	79372186	CORDOBA MARTIN	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS037	30	\$828,116	\$33,200	CCF40	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$57,700	30	\$0	\$0
3	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS016	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF40	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$111,400	30	\$0	\$0
Total Afiliados(3)					\$3,488,116	\$558,100			\$3,488,116	\$139,600			\$3,488,116	\$139,600			\$3,488,116	\$174,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-12	2020-01	1000000193	9402240079	E	2020/01/24	2020/01/29	BANCO BOGOTA	5	\$1,016,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$558,100	\$2,100	\$0	\$560,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$302,100	\$1,100	\$0	\$303,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$256,000	\$1,000	\$0	\$257,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$174,700	\$700	\$0	\$175,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$174,700	\$700	\$0	\$175,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$139,600	\$500	\$0	\$140,100	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$139,600	\$500	\$0	\$140,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$139,600	\$700	\$0	\$140,300	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$64,000	\$300	\$0	\$64,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$33,200	\$200	\$0	\$33,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$42,400	\$200	\$0	\$42,600	
TOTAL				3	\$1,012,000	\$4,000	\$0	\$1,016,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-11	2019-12	1000001990		9401766565	E	2019/12/23	2020/01/13	BANCO BOGOTA	\$1,027,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: ADMINISTRACION (3 Afiliados)					\$3,488,116	\$558,100			\$3,488,116	\$139,600			\$3,488,116	\$139,600			\$3,488,116	\$174,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)					\$1,060,000	\$169,600			\$1,060,000	\$42,400			\$1,060,000	\$42,400			\$1,060,000	\$5,600		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,060,000	\$169,600			\$1,060,000	\$42,400			\$1,060,000	\$42,400			\$1,060,000	\$5,600		\$0	\$0	
1	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	\$1,060,000	\$169,600	EPS005	30	\$1,060,000	\$42,400	CCF40	30	\$1,060,000	\$42,400	14-11	30	\$1,060,000	\$5,600	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (2 Afiliados)					\$2,428,116	\$388,500			\$2,428,116	\$97,200			\$2,428,116	\$97,200			\$2,428,116	\$169,100		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)					\$2,428,116	\$388,500			\$2,428,116	\$97,200			\$2,428,116	\$97,200			\$2,428,116	\$169,100		\$0	\$0	
2	CC	79372186	CORDOBA MARTIN	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS037	30	\$828,116	\$33,200	CCF40	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$57,700	30	\$0	\$0
3	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS016	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF40	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$111,400	30	\$0	\$0
Total Afiliados(3)					\$3,488,116	\$558,100			\$3,488,116	\$139,600			\$3,488,116	\$139,600			\$3,488,116	\$174,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	1000001990	9401766565	E	2019/12/23	2020/01/13	BANCO BOGOTA	21	\$1,027,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$558,100	\$8,500	\$0	\$566,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$302,100	\$4,600	\$0	\$306,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$256,000	\$3,900	\$0	\$259,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$174,700	\$2,700	\$0	\$177,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$174,700	\$2,700	\$0	\$177,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$139,600	\$2,200	\$0	\$141,800	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$139,600	\$2,200	\$0	\$141,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$139,600	\$2,200	\$0	\$141,800	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$64,000	\$1,000	\$0	\$65,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$33,200	\$500	\$0	\$33,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$42,400	\$700	\$0	\$43,100	
TOTAL				3	\$1,012,000	\$15,600	\$0	\$1,027,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	1000000650	9403000792	E	2020/02/24	2020/02/21	BANCO BOGOTA	0	\$882,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: ADMINISTRACION (3 Afiliados)					\$3,082,941	\$493,400			\$3,082,941	\$123,500			\$3,082,941	\$123,500			\$3,082,941	\$142,400		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)					\$1,123,600	\$179,800			\$1,123,600	\$45,000			\$1,123,600	\$45,000			\$1,123,600	\$5,900		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,123,600	\$179,800			\$1,123,600	\$45,000			\$1,123,600	\$45,000			\$1,123,600	\$5,900		\$0	\$0	
1	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	\$1,123,600	\$179,800	EPS005	30	\$1,123,600	\$45,000	CCF40	30	\$1,123,600	\$45,000	14-11	30	\$1,123,600	\$5,900	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (2 Afiliados)					\$1,959,341	\$313,600			\$1,959,341	\$78,500			\$1,959,341	\$78,500			\$1,959,341	\$136,500		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)					\$1,959,341	\$313,600			\$1,959,341	\$78,500			\$1,959,341	\$78,500			\$1,959,341	\$136,500		\$0	\$0	
2	CC	79372186	CORDOBA MARTIN	25-14	9	\$263,341	\$42,200	EPS037	9	\$263,341	\$10,600	CCF40	9	\$263,341	\$10,600	14-11	9	\$263,341	\$18,400	9	\$0	\$0
3	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	30	\$1,696,000	\$271,400	EPS016	30	\$1,696,000	\$67,900	CCF40	30	\$1,696,000	\$67,900	14-11	30	\$1,696,000	\$118,100	30	\$0	\$0
Total Afiliados(3)					\$3,082,941	\$493,400			\$3,082,941	\$123,500			\$3,082,941	\$123,500			\$3,082,941	\$142,400		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-01	2020-02	1000000650	9403000792	E	2020/02/24	2020/02/21	BANCO BOGOTA	0	\$882,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$493,400	\$0	\$0	\$493,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$222,000	\$0	\$0	\$222,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$271,400	\$0	\$0	\$271,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$142,400	\$0	\$0	\$142,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$142,400	\$0	\$0	\$142,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$123,500	\$0	\$0	\$123,500	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$123,500	\$0	\$0	\$123,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$123,500	\$0	\$0	\$123,500	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$67,900	\$0	\$0	\$67,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$10,600	\$0	\$0	\$10,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$45,000	\$0	\$0	\$45,000	
TOTAL				3	\$882,800	\$0	\$0	\$882,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-02	2020-03	1000000746		9403906259	E	2020/03/24	2020/03/12	BANCO BOGOTA	\$555,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: ADMINISTRACION (2 Afiliados)					\$2,028,134	\$324,600			\$2,028,134	\$81,200			\$2,028,134	\$81,200			\$2,028,134	\$68,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)					\$1,123,600	\$179,800			\$1,123,600	\$45,000			\$1,123,600	\$45,000			\$1,123,600	\$5,900		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,123,600	\$179,800			\$1,123,600	\$45,000			\$1,123,600	\$45,000			\$1,123,600	\$5,900		\$0	\$0	
1	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	\$1,123,600	\$179,800	EPS005	30	\$1,123,600	\$45,000	CCF40	30	\$1,123,600	\$45,000	14-11	30	\$1,123,600	\$5,900	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (1 Afiliados)					\$904,534	\$144,800			\$904,534	\$36,200			\$904,534	\$36,200			\$904,534	\$63,000		\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$904,534	\$144,800			\$904,534	\$36,200			\$904,534	\$36,200			\$904,534	\$63,000		\$0	\$0	
2	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	16	\$904,534	\$144,800	EPS016	16	\$904,534	\$36,200	CCF40	16	\$904,534	\$36,200	14-11	16	\$904,534	\$63,000	16	\$0	\$0
Total Afiliados(2)					\$2,028,134	\$324,600			\$2,028,134	\$81,200			\$2,028,134	\$81,200			\$2,028,134	\$68,900		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-03	1000000746	9403906259	E	2020/03/24	2020/03/12	BANCO BOGOTA	0	\$555,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$324,600	\$0	\$0	\$324,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$179,800	\$0	\$0	\$179,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$144,800	\$0	\$0	\$144,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$68,900	\$0	\$0	\$68,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$68,900	\$0	\$0	\$68,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$81,200	\$0	\$0	\$81,200	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$81,200	\$0	\$0	\$81,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$81,200	\$0	\$0	\$81,200	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$36,200	\$0	\$0	\$36,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$45,000	\$0	\$0	\$45,000	
TOTAL				2	\$555,900	\$0	\$0	\$555,900	

**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa **DALMO S.A.S**, identificada con **NI** número **900210849**, aportó por el empleado **DALTON MORENO GIRARDOT** identificado(a) con **CC** número **13838445** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2019 y 12 - 2019 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I N G	R E D	T A D	T A D	T A D	V S T	V S T	S L N	S L N	I G M	I G M	V A C	V A C	V C T	V C T	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF40	Comfenalco Santander Caja de Compensación Filiar	1														X	0		30	\$5,300,000	0.04000	\$212,000	\$0	\$0	Abril - 2019	34520235	09/05/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1														X	0		30	\$5,300,000	0.04000	\$212,000	\$0	\$0	Mayo - 2019	34520235	09/05/2019	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1														X	0		30	\$5,300,000	0.00522	\$27,700	\$0	\$0	Abril - 2019	34520235	09/05/2019	Si
CCF40	Comfenalco Santander Caja de Compensación Filiar	1															0		30	\$5,300,000	0.04000	\$212,000	\$0	\$0	Mayo - 2019	35102191	13/06/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1															0		30	\$5,300,000	0.04000	\$212,000	\$0	\$0	Junio - 2019	35102191	13/06/2019	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	\$5,300,000	0.00522	\$27,700	\$0	\$0	Mayo - 2019	35102191	13/06/2019	Si
CCF40	Comfenalco Santander Caja de Compensación Filiar	1															0		30	\$5,300,000	0.04000	\$212,000	\$0	\$0	Junio - 2019	35755257	11/07/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1															0		30	\$5,300,000	0.04000	\$212,000	\$0	\$0	Julio - 2019	35755257	11/07/2019	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	\$5,300,000	0.00522	\$27,700	\$0	\$0	Junio - 2019	35755257	11/07/2019	Si
CCF40	Comfenalco Santander Caja de Compensación Filiar	1													X		0		5	\$883,334	0.04000	\$35,400	\$0	\$0	Julio - 2019	36585619	09/08/2019	Si
CCF40	Comfenalco Santander Caja de Compensación Filiar	1															0		25	\$4,416,667	0.04000	\$176,700	\$0	\$0	Julio - 2019	36585619	09/08/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1													X		0		5	\$883,334	0.04000	\$35,400	\$0	\$0	Agosto - 2019	36585619	09/08/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1															0		25	\$4,416,667	0.04000	\$176,700	\$0	\$0	Agosto - 2019	36585619	09/08/2019	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1													X		0		5	\$883,334	0.00000	\$0	\$0	\$0	Julio - 2019	36585619	09/08/2019	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		25	\$4,416,667	0.00522	\$23,100	\$0	\$0	Julio - 2019	36585619	09/08/2019	Si
CCF39	Cajasan Caja de Compensación Filiar	1															0		20	\$3,533,334	0.04000	\$141,400	\$0	\$0	Agosto - 2019	37028087	11/09/2019	Si
CCF39	Cajasan Caja de Compensación Filiar	1													X		0		10	\$3,533,334	0.04000	\$141,400	\$0	\$0	Agosto - 2019	37028087	11/09/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1															0		20	\$3,533,334	0.04000	\$141,400	\$0	\$0	Septiembre - 2019	37028087	11/09/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1													X		0		10	\$1,766,667	0.04000	\$70,700	\$0	\$0	Septiembre - 2019	37028087	11/09/2019	Si

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Enero** de **2020**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1														0	20	\$3,533,334	0.00522	\$18,500	\$0	\$0	Agosto - 2019	37028087	11/09/2019	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1													X	0	10	\$1,766,667	0.00000	\$0	\$0	\$0	Agosto - 2019	37028087	11/09/2019	Si
CCF39	Cajasan Caja de Compensacion Filiar	1														0	30	\$5,300,000	0.04000	\$212,000	\$0	\$0	Septiembre - 2019	37721087	08/10/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1														0	30	\$5,300,000	0.04000	\$212,000	\$0	\$0	Octubre - 2019	37721087	08/10/2019	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1														0	30	\$5,300,000	0.00522	\$27,700	\$0	\$0	Septiembre - 2019	37721087	08/10/2019	Si
CCF39	Cajasan Caja de Compensacion Filiar	1														0	30	\$5,300,000	0.04000	\$212,000	\$0	\$0	Octubre - 2019	38297327	13/11/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1														0	30	\$5,300,000	0.04000	\$212,000	\$0	\$0	Noviembre - 2019	38297327	13/11/2019	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1														0	30	\$5,300,000	0.00522	\$27,700	\$0	\$0	Octubre - 2019	38297327	13/11/2019	Si
CCF39	Cajasan Caja de Compensacion Filiar	1														0	30	\$5,300,000	0.04000	\$212,000	\$0	\$0	Noviembre - 2019	38974611	11/12/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1														0	30	\$5,300,000	0.04000	\$212,000	\$0	\$0	Diciembre - 2019	38974611	11/12/2019	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1														0	30	\$5,300,000	0.00522	\$27,700	\$0	\$0	Noviembre - 2019	38974611	11/12/2019	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los 14 días del mes Enero de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:				1014206897	NÚMERO PLANILLA:	4303960031		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	SINDY JOHANA HUERTAS BEJARANO					PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:				BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO
DIRECCIÓN:	CLL 64 J # 79-54 TELÉFONO:				1111111	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997300786
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:				I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:				Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO								
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO								

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 232.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300	\$ 0	\$ 232.800	\$ 2.300	\$ 235.100
SUBTOTALES:										\$ 232.800	\$ 2.300	\$ 235.100

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 181.900	\$ 0	\$ 1.800	\$ 0	\$ 181.900	\$ 1.800	\$ 0	\$ 183.700
SUBTOTALES:													\$ 181.900	\$ 1.800	\$ 0	\$ 183.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 35.500	\$ 35.500	\$ 400	\$ 0	\$ 35.900
SUBTOTALES:									\$ 35.500	\$ 400	\$ 0	\$ 35.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU							
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1014206897	HUERTAS BEJARANO SINDY JOHANA	INDEPENDIE NTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		\$ 1.454.800			NO																		230301- PORVENIR	30	1.454.800	\$ 232.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 232.800	EPS005- SANITAS S.A.	30	1.454.800	\$ 181.900	\$ 0	\$ 181.900	14-11 - ARL SURA	30	1.454.800	\$ 101420689	\$ 35.500		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 454.700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1014206897
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	SINDY JOHANA HUERTAS BEJARANO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 64 J # 79-54	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:	4313013381			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:	6								
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/12/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997726190				

TOTAL APORTES A PENSION													
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	EMPLEADOR			COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR		1	\$ 232.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 0	\$ 232.800	\$ 1.100	\$ 233.900
SUBTOTALES:											\$ 232.800	\$ 1.100	\$ 233.900

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 181.900	\$ 0	\$ 800	\$ 0	\$ 181.900	\$ 800	\$ 0	\$ 182.700
SUBTOTALES:													\$ 181.900	\$ 800	\$ 0	\$ 182.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 35.500	\$ 35.500	\$ 200	\$ 0	\$ 35.700
SUBTOTALES:									\$ 35.500	\$ 200	\$ 0	\$ 35.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD					ARP				IBC	CCF					IBCF	ESAP	MINEDU					
																								ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC		TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO				TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1014206897	HUERTAS BEJARANO SINDY JOHANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		\$ 1.454.800		NO																	230301-PORVENIR	30	1.454.800	\$	\$ 232.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 232.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.454.800	\$	\$ 181.900	\$ 0	\$ 181.900	14-11 - ARL SURA	30	1.454.800	\$	\$ 101420689	\$ 35.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 452.300
--------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1014206897					NÚMERO PLANILLA: 4314509593 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SINDY JOHANA HUERTAS BEJARANO					PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES noviembre AÑO 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES noviembre AÑO 2019									
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:					DÍAS DE MORA: 0									
DIRECCIÓN: CLL 64 J # 79-54 TELÉFONO: 1111111					FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2019/12/20 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9998092365									
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE														
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y facilitadoras de la act														
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO														
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO														

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR			1	\$ 232.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.800	\$ 0	\$ 232.800
SUBTOTALES:												\$ 232.800	\$ 0	\$ 232.800

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 181.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 181.900	\$ 0	\$ 0	\$ 181.900
SUBTOTALES:													\$ 181.900	\$ 0	\$ 0	\$ 181.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA			1	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 35.500	\$ 35.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.500	
SUBTOTALES:											\$ 35.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU							
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
1	CC 1014206897	HUERTAS BEJARANO SINDY JOHANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		\$ 1.454.800		NO																		230301-PORVENIR	30	1.454.800	\$ 232.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 232.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.454.800	\$ 181.900	\$ 0	\$ 181.900	14-11 - ARL SURA	30	1.454.800	\$ 1014206897	\$ 35.500		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 450.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA						
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1014206897	NÚMERO PLANILLA:	4315180021		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:				SINDY JOHANA HUERTAS BEJARANO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:		12	MES	diciembre	AÑO
DIRECCIÓN:	CLL 64 J # 79-54		TELÉFONO:	11111111	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/02/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998861643	
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE						
TIPO EMPRESA:	PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act						
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO									
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO						

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 232.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 0	\$ 232.800	\$ 2.100	\$ 234.900
SUBTOTALES:										\$ 232.800	\$ 2.100	\$ 234.900

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 181.900	\$ 0	\$ 1.600	\$ 0	\$ 181.900	\$ 1.600	\$ 0	\$ 183.500
SUBTOTALES:													\$ 181.900	\$ 1.600	\$ 0	\$ 183.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 35.500	\$ 35.500	\$ 400	\$ 0	\$ 35.900
SUBTOTALES:									\$ 35.500	\$ 400	\$ 0	\$ 35.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																									
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																											
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU									
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN			DÍAS COT	IBC					CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE						
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD																					EMPLEADOR	EMPLEADO				
1	CC	HUERTAS BEJARANO SINDY JOHANA	INDEPENDIE NTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		\$ 1.454.800			NO																		230301- PORVENIR	30	1.454.800	\$	\$ 232.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 232.800	EPS005- SANITAS S.A.	30	1.454.800	\$	\$ 181.900	\$ 0	\$ 181.900	14-11 - ARL SURA	30	1.454.800	\$	\$ 101420689	\$ 35.500	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 454.300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA						
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1014206897	NÚMERO PLANILLA:	4323362627		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:				SINDY JOHANA HUERTAS BEJARANO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2020
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:		0			
DIRECCIÓN:	CLL 64 J # 79-54		TELÉFONO:	1111111	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/02/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999061811	
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE						
TIPO EMPRESA:	PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act						
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO									
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO						

TOTAL APORTES A PENSION												
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES	
CODIGO	NOMBRE	EMPLEADOR			COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 232.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.800	\$ 0	\$ 232.800
SUBTOTALES:										\$ 232.800	\$ 0	\$ 232.800

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 181.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 181.900	\$ 0	\$ 0	\$ 181.900
SUBTOTALES:													\$ 181.900	\$ 0	\$ 0	\$ 181.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 35.500	\$ 35.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.500
SUBTOTALES:									\$ 35.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD					ARP				DÍAS COT	IBC	CCF					SEN	ICBF	ESAP	MINEDU			
																								ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC			TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO					TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 1014206897	HUERTAS BEJARANO SINDY JOHANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		\$ 1.454.800		NO																	230301-PORVENIR	30	1.454.800	\$	\$ 232.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 232.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.454.800	\$	\$ 181.900	\$ 0	\$ 181.900	14-11 - ARL SURA	30	1.454.800	\$	\$ 101420689	\$ 35.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 450.200
--------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 53132223		DIAZ PIRAZAN LIDA MAYERLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 24 No. 51 48	BOGOTA-BOGOTA D.E	777777	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-05	2019-05	1000000824	9412992385	I	2019/06/10	2020/11/24	BANCO BOGOTA	533	\$276,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 53132223	DIAZ LIDA	230301	25	\$690,097	\$110,500	EPS016	25	\$690,097	\$86,300		0	\$0	\$0		25	\$690,097	\$3,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$690,097	\$110,500			\$690,097	\$86,300			\$0	\$0			\$690,097	\$3,700		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$110,500	\$42,000	\$0	\$152,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$110,500	\$42,000	\$0	\$152,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,700	\$1,500	\$0	\$5,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$3,700	\$1,500	\$0	\$5,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$86,300	\$32,800	\$0	\$119,100	
SANITAS	EPS016	805,000,427	7	1	\$86,300	\$32,800	\$0	\$119,100	
TOTAL				1	\$200,500	\$76,300	\$0	\$276,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 53132223		DIAZ PIRAZAN LIDA MAYERLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 24 No. 51 48	BOGOTA-BOGOTA D.E	777777	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-06	100000082	9412992477	I	2019/07/08	2020/11/24	BANCO BOGOTA	505	\$326,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 53132223	DIAZ LIDA	230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS016	30	\$828,116	\$103,600		0	\$0	\$0		25	\$828,116	\$4,400	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$103,600			\$0	\$0			\$828,116	\$4,400		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$135,500	\$47,600	\$0	\$180,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$132,500	\$47,600	\$0	\$180,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,400	\$1,600	\$0	\$6,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$4,400	\$1,600	\$0	\$6,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$103,600	\$37,200	\$0	\$140,800	
SANITAS	EPS016	805,000,427	7	1	\$103,600	\$37,200	\$0	\$141,800	
TOTAL				1	\$240,500	\$86,400	\$0	\$326,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 53132223		DIAZ PIRAZAN LIDA MAYERLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 24 No. 51 48	BOGOTA-BOGOTA D.E	777777	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-07	2019-07	100000082	9412992605	I	2019/08/08	2020/11/24	BANCO BOGOTA	474	\$321,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 53132223	DIAZ LIDA	230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS016	30	\$828,116	\$103,600		0	\$0	\$0		25	\$828,116	\$4,400	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$103,600			\$0	\$0			\$828,116	\$4,400		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$135,500	\$44,600	\$0	\$177,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$132,500	\$44,600	\$0	\$177,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,400	\$1,500	\$0	\$5,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$4,400	\$1,500	\$0	\$5,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$103,600	\$34,900	\$0	\$138,500	
SANITAS	EPS016	805,000,427	7	1	\$103,600	\$34,900	\$0	\$138,500	
TOTAL				1	\$240,500	\$81,000	\$0	\$321,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 53132223		DIAZ PIRAZAN LIDA MAYERLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 24 No. 51 48	BOGOTA-BOGOTA D.E	777777	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-08	2019-08	100000082	9413005770	I	2019/09/06	2020/11/24	BANCO BOGOTA	445	\$316,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 53132223	DIAZ LIDA	230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS016	30	\$828,116	\$103,600		0	\$0	\$0		25	\$828,116	\$4,400	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$103,600			\$0	\$0			\$828,116	\$4,400		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$135,500	\$41,700	\$0	\$174,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$132,500	\$41,700	\$0	\$174,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,400	\$1,400	\$0	\$5,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$4,400	\$1,400	\$0	\$5,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$103,600	\$32,700	\$0	\$136,300	
SANITAS	EPS016	805,000,427	7	1	\$103,600	\$32,700	\$0	\$136,300	
TOTAL				1	\$240,500	\$75,800	\$0	\$316,300	
