


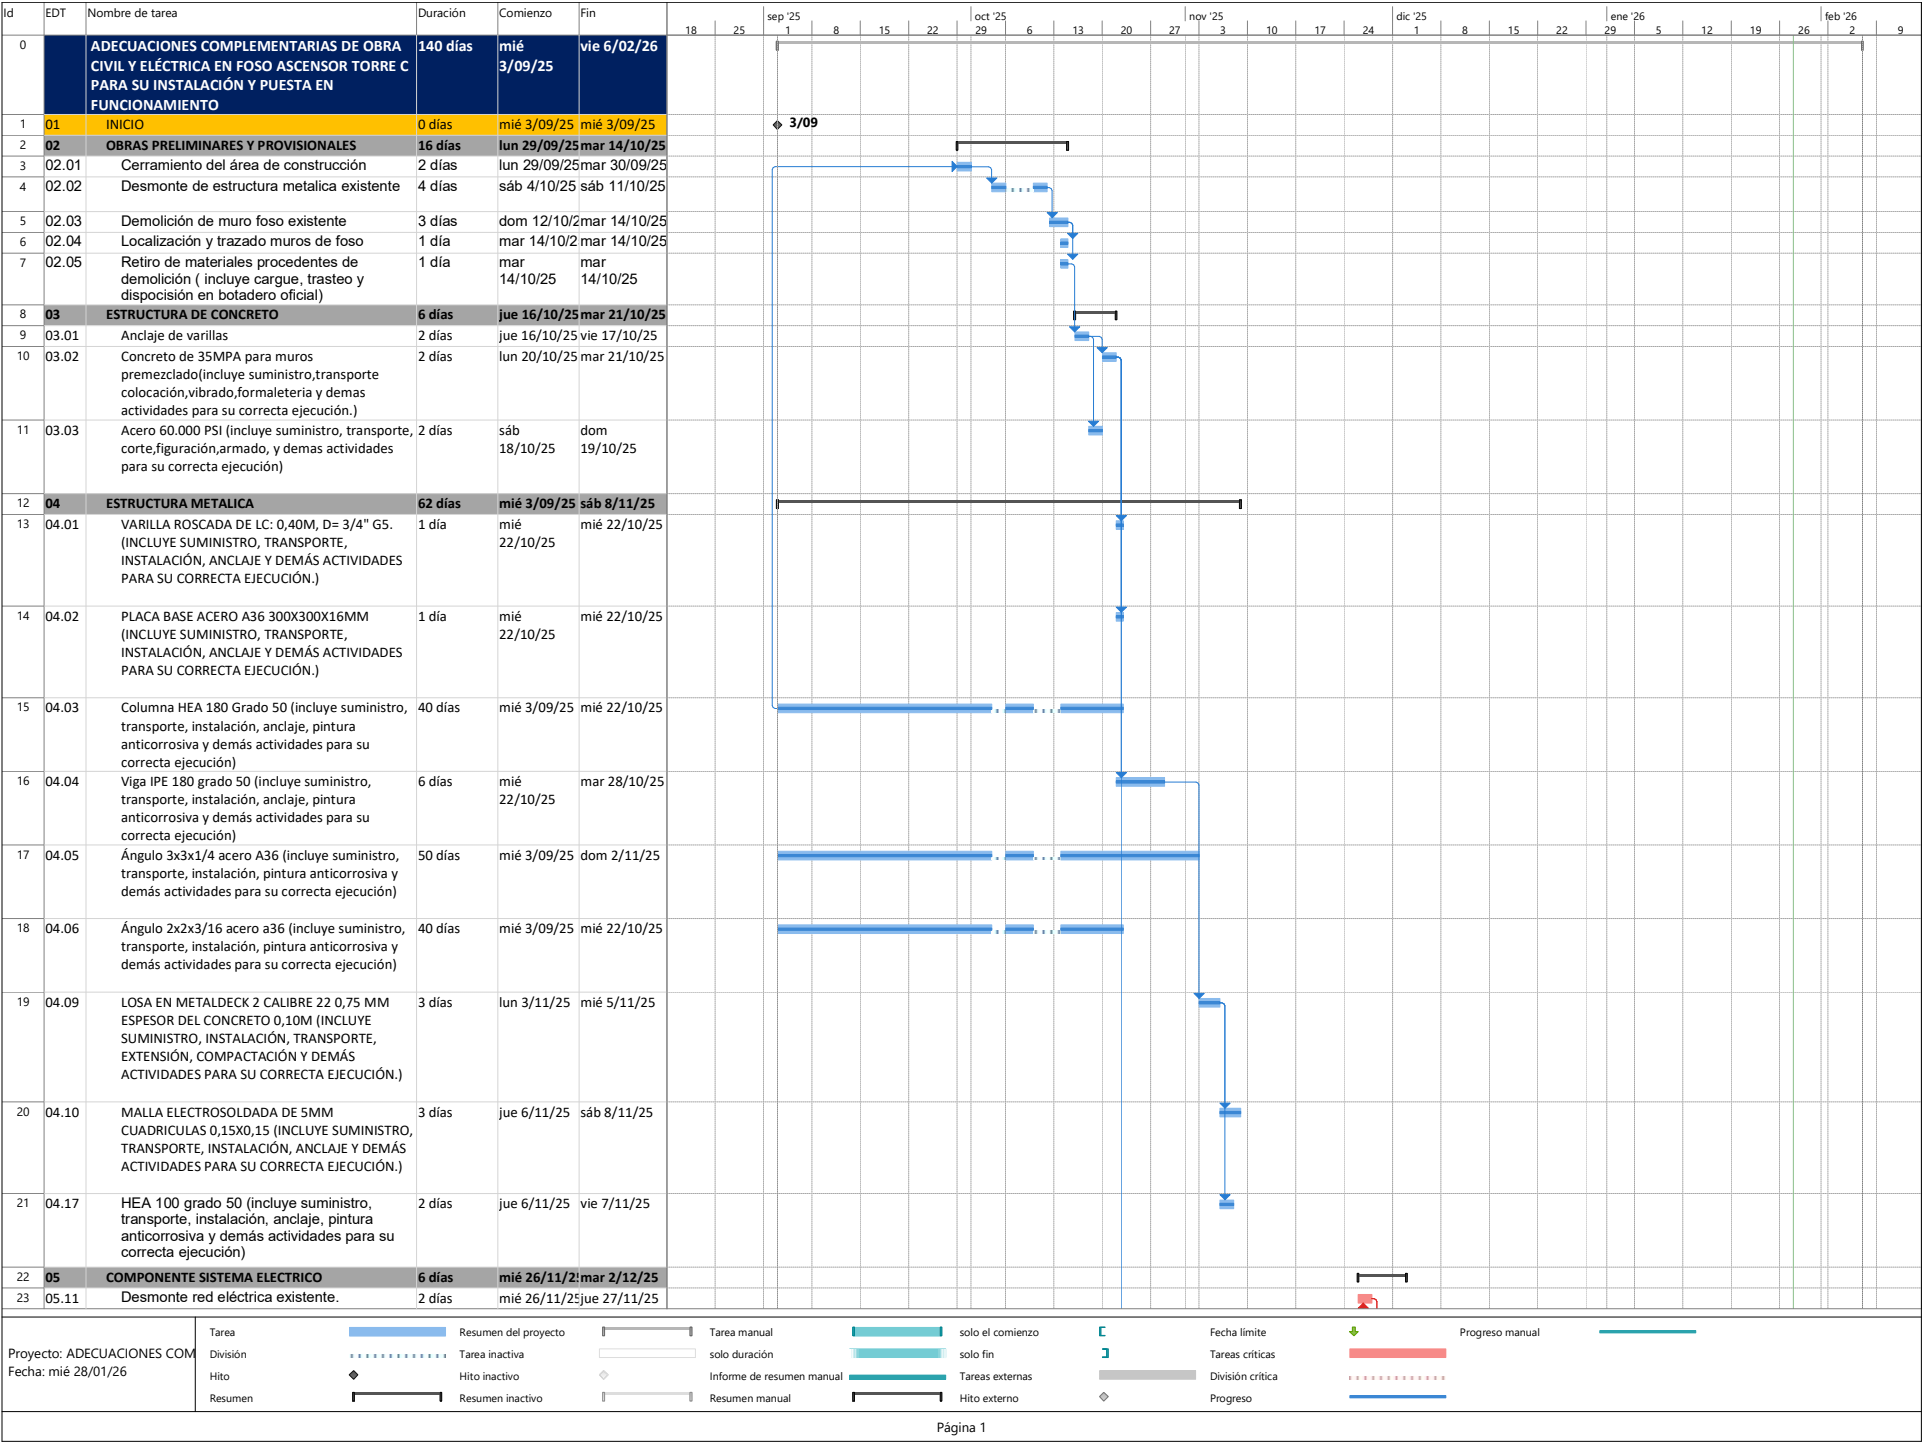

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
24	05.01	Suministro e Instalación de Gabinete de Distribución del Ascensor de medidas aproximadas 700x500x250 mm (AxLxP), tipo exterior, IP65-IK10, en lamina cold Rolled calibre 16, con pintura electroestática color RAL 7035, Equipado con: Barraje Principal 3F-5H	3 días	vie 28/11/25	lun 1/12/25
25	05.03	Suministro e instalación de alimentador en cable libre de Halógenos HR FR 3" # 4 Fase + 1" # 4 Neutro + 1" # 4 Tierra, desde el Breaker del tablero de la Subestación hasta el Breaker totalizador Gabinete de Distribución del Ascensor	1 día	mar 2/12/25	mar 2/12/25
26	05.04	Suministro e instalación de terminal o borna para ponchar de cobre estañado para cable calibre # 4 AWG	1 día	mar 2/12/25	mar 2/12/25
27	05.05	Suministro e instalación de puente para equipotencialización de las estructuras metálicas en cable #10 AWG	1 día	mar 2/12/25	mar 2/12/25
28	05.10	Suministro e instalación de puente para equipotencialización a la puesta a tierra en cable calibre # 2 AWG	1 día	mar 2/12/25	mar 2/12/25
29	05.09	Suministro e instalación de salida de datos en cable categoria 6A hasta 1 m. Incluye Jack blindado.	1 día	mar 2/12/25	mar 2/12/25
30	11	NO PREVISTOS	77 días	mié 3/09/25	mar 25/11/25
31	11.04	Suministro e instalación de acero estructural para platinas, pernos en tornillos de anclaje de elementos de la estructura metalica	40 días	mié 3/09/25	jue 16/10/25
32	11.05	Desmonte de cerramiento perimetral de estructura metalica del ascensor en laminas de Superboard 8,0mm	2 días	mié 22/10/25	jue 23/10/25
33	11.06	Suministro e instalación de cerramiento perimetral de estructura metalica del ascensor en laminas de Superboard 8,0mm	2 días	lun 24/11/25	mar 25/11/25
34	06	INSTALACIONES SANITARIAS	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25
35	06.02	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 21 ø 2"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25
36	06.04	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 21 descolgada ø 1"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25
37	06.05	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 21 descolgada ø 2"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25
38	06.07	Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria ø 2"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25
39	06.08	Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria ø 6"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25
40	06.09	Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria ø 8"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25
41	06.11	Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria descolgada ø 2"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25
42	06.14	Grava de río ø ½" - ¾"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25
43	06.15	Geotextil NT 1600	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25
44	06.17	Espuma elastomérica tubular ø 1 3/8" x 1/2"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25
45	06.18	Espuma elastomérica tubular ø 2 3/8" x 1/2"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25
46	06.19	Válvula de retención hidro en Cu ø 2"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25
47	06.20	Válvula de rbola PVC tipo pesado ø 2"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25
48	06.21	Válvula universal PVC ø 2"	10 días	mié 3/12/25	sáb 13/12/25
49	08	ESTRUCTURA DE CONCRETO DEL SISTEMA DE DRENAJE	27 días	vie 28/11/25	lun 29/12/25
50	08.01	LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO	1 día	vie 28/11/25	vie 28/11/25
51	08.02	DEMOLICION DE PISO PARA SISTEMA FILTRO FOSO ASCENSOR, CAJA EYECTOR, DESARENADOR Y DUCTOS TUBERIAS	4 días	sáb 29/11/25	mié 3/12/25

Proyecto: ADECUACIONES COM
Fecha: mié 28/01/26

Tarea

División

HitoResumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 2

ID	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
52	08.03	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN HUMEDO DE PISO PARA SISTEMA FILTRO FOSO ASCENSOR, CAJA EYECTOR, DESARENADOR Y DUCTOS TUBERIAS	3 días	sáb 29/11/25	mar 2/12/25
53	08.04	RELLENO CON CAPA DE ARENA COMPACTADO PARA FONDO TUBERIA DUCTO	2 días	mié 3/12/25	jue 4/12/25
54	08.05	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	2 días	vie 5/12/25	sáb 6/12/25
55	08.06	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVACION	2 días	lun 8/12/25	mar 9/12/25
56	08.07	RETIRO DE MATERIALES PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL)	2 días	mié 10/12/25	jue 11/12/25
57	08.08	RECONSTRUCCION DE PISO DE PARQUEADERO SOTANO EN CONCRETO 3500 PSI ESP=20CM	3 días	vie 12/12/25	lun 15/12/25
58	08.09	CONCRETO DE 15 MPA PARA SOLADO FONDO DE ESTRUCTURAS - CAJA DE INSPECCION, REGISTROS (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO, FORMALETERÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)	1 día	mar 16/12/25	mar 16/12/25
59	08.22	CONCRETO DE 35 MPA ESTRUCTURA DE REGISTROS PREMEZCLADO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO, FORMALETERÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)	2 días	mar 16/12/25	mié 17/12/25
60	08.21	CONCRETO DE 35 MPA ESTRUCTURA DE CAJA DE INSPECCION, PREMECLADO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO, FORMALETERÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)	3 días	jue 18/12/25	sáb 20/12/25
61	08.10	CONCRETO DE 35 MPA ESTRUCTURA DESARENADOR PREMEZCLADO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO, FORMALETERÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)	4 días	lun 22/12/25	jue 25/12/25
62	08.11	MALLA ELECTROSOLDADA DE 5MM CUADRICULAS 0,15X0,15 (INCLUYE SUMINISTRIO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, ANCLAJE Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)	2 días	mar 16/12/25	mié 17/12/25
63	08.12	TAPA DE ACCESO REGISTRO DE FOSO EYECTOR, DESARENADOR Y CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 3500PSI, PERFIL EN ANGULO YACERO DE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 10X10CM 1/4"	3 días	vie 26/12/25	lun 29/12/25
64	12	NO PREVISTOS FINALES	6 días	jue 29/01/26	mié 4/02/26
65	12.08	Suministro e instalación de tubería EMT de 1 1/2" Incluye accesorios de soportes, curvas, terminales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	1 día	jue 29/01/26	jue 29/01/26

Proyecto: ADECUACIONES COM Fecha: mié 28/01/26	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha limite		Progreso manual	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Tareas criticas			
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		División critica			
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo		Progreso			

Nombre de tarea			Duración	Comienzo	Fin			sep '25						oct '25						nov '25						dic '25						ene '26						feb '26	
66	12.09	Suministro e instalación de Sistema Electrico Bombas Sumergibles, alimentador en cable de Cu 2" # 6 Fase + 1" # 6 Neutro + 1" # 6 Tierra, desde el Breaker del tablero de la Subestación hasta Punto de Conexión, (Incluye Suministro e instalacion de Coraza met	1 día	vie 30/01/26	vie 30/01/26				1		8		15		22							3		10		17		24											
67	12.11	Sumistro e instalacion de Coraza metalica 1 1/2" llegada de acometida AC llegada a tablero BT de ascensor (Incluye Conectores rectos 1 1/2" para coraza metalica, Accesorios de fijación)	1 día	vie 30/01/26	vie 30/01/26																																		
68	12.12	Mortero de Nivelación Groouting en losa zapata estructura ascensor	1 día	sáb 31/01/26	sáb 31/01/26																																		
69	12.13	Marquillas para Breaker y cables Ascensor	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26																																		
70	12.15	Suministro de bomba sumergible para aguas residuales y lodos con contenido de sólidos, tipo doble canal, accionada por motor eléctrico monofásico de 1 HP, tensión 120 V, caudal máximo aproximado de 97 GPM, altura dinámica total hasta 18 m, descarga de 1 1	1 día	lun 2/02/26	lun 2/02/26																																		
71	12.14	Concreto 35MPA Reparación de losa entrepisos ascensor en altura (Incluye suministro, transporte, coocación, vibrado, formaletería y demas actividades para su correcta ejecución)	2 días	mar 3/02/26	mié 4/02/26																																		
72	09	ORDEN Y ASEO DEL AREA	2 días	jue 5/02/26	vie 6/02/26																																		
73	09.01	LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES Y ASEO GENERAL DEL AREA DE CONSTRUCCION.	2 días	jue 5/02/26	vie 6/02/26																																		
74	10	FIN	1 día	vie 6/02/26	vie 6/02/26																																		

Proyecto: ADECUACIONES COM
Fecha: mié 28/01/26

Tarea

División

Hito

Resumen

.....

◆

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

◆

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Tarea manual

solo el comienzo

Tareas externas

Hito externo

◆

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

↓

.....

Progreso manual
