


FLUJO DE CAJA

Costo real	Costo de línea base	Costo restante	Variación de costo
\$ 134.071.437,96	\$ 0,00	\$ 78.311.814,57	\$ 212.383.252,53

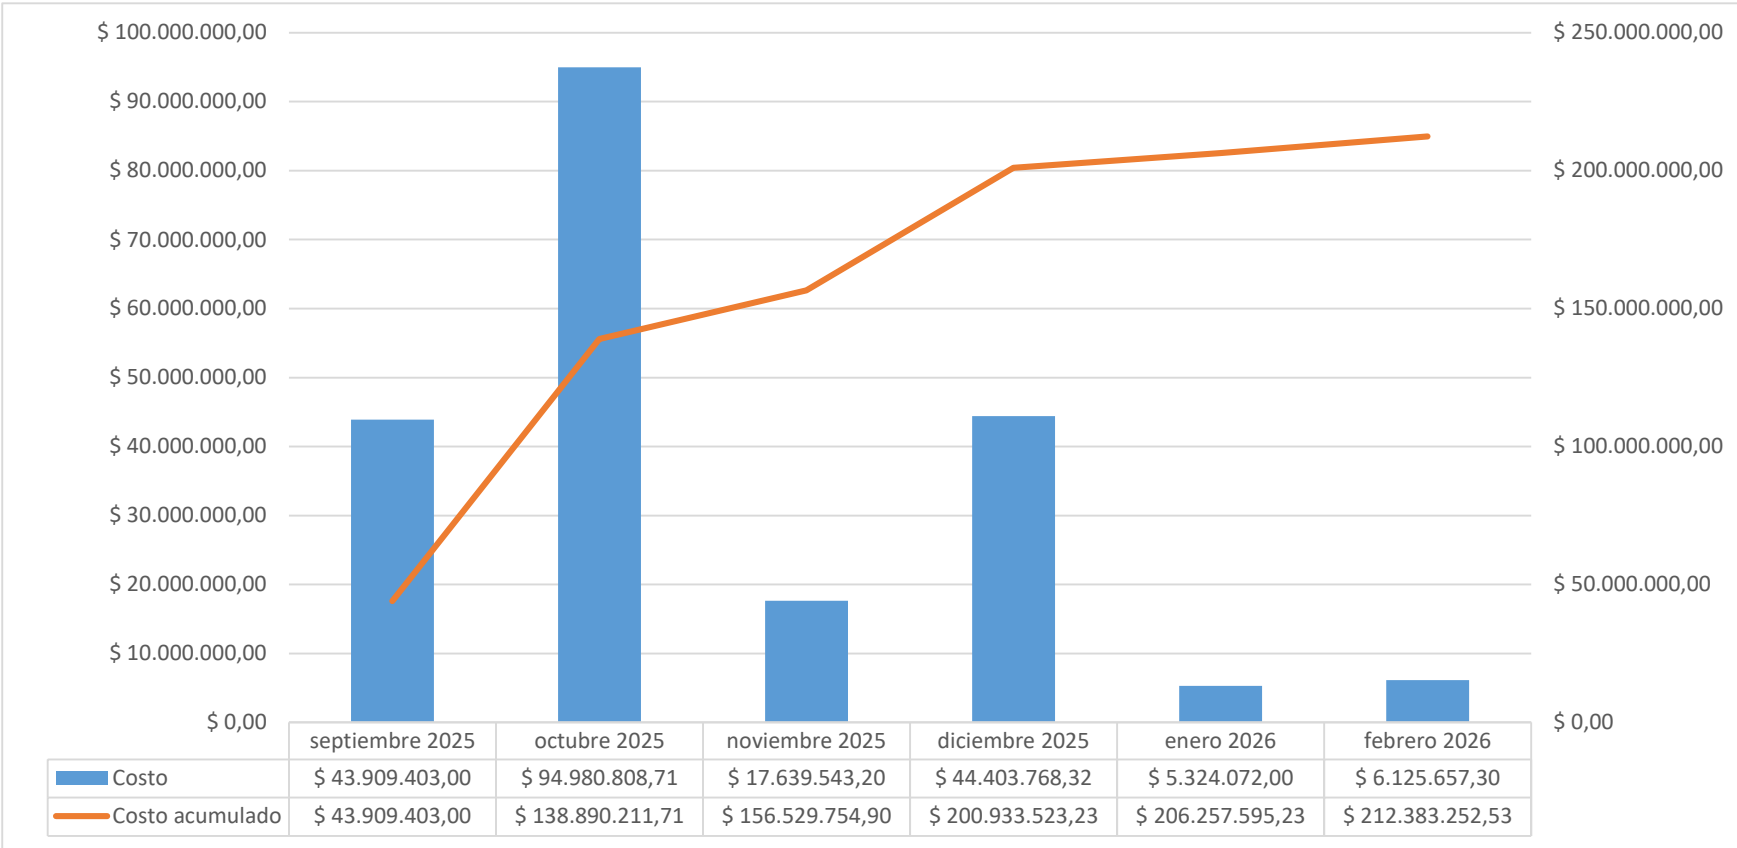

Nombre	Costo restante	Costo real	Costo	CRTR	CPTR	CPTP
INICIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES	\$ 0,00	\$ 9.578.521,00	\$ 9.578.521,00	\$ 9.578.521,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ESTRUCTURA DE CONCRETO	\$ 0,00	\$ 14.707.548,40	\$ 14.707.548,40	\$ 14.707.548,40	\$ 0,00	\$ 0,00
ESTRUCTURA METALICA	\$ 0,00	\$ 109.785.368,56	\$ 109.785.368,56	\$ 109.785.368,56	\$ 0,00	\$ 0,00
COMPONENTE SISTEMA ELECTRICO	\$ 13.921.210,00	\$ 0,00	\$ 13.921.210,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

ELECTRICO			15.921.210,00			
NO PREVISTOS	\$ 14.022.871,59	\$ 0,00	\$ 14.022.871,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INSTALACIONES SANITARIAS	\$ 18.106.290,72	\$ 0,00	\$ 18.106.290,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ESTRUCTURA DE CONCRETO DEL SISTEMA DE DRENAJE	\$ 20.811.712,96	\$ 0,00	\$ 20.811.712,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
NO PREVISTOS FINALES	\$ 11.449.729,30	\$ 0,00	\$ 11.449.729,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ORDEN Y ASEO DEL AREA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
FIN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
