



CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
Cr 38 2641 of 833
Tel: (604) 4440012 - Ext. 101
Medellín - Colombia
explanan@explanan.com



Factura electrónica de venta
No. FE 40

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600
Dirección	CI 25 G 73 B 90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2025, 11:13
Expedición	25/11/2025, 11:13
Vencimiento	04/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. ACTA DE AJUSTE No 12 PROV PERIODO OCTUBRE 2025	1.00	202,000,875.49	202,000,875.49
2	UTILIDAD 5%	1.00	8,080,035.00	8,080,035.00

Total ítems: 2

Total Bruto	210,080,910.49
IVA 19%	1,535,206.65
Total a Pagar	211,616,117.14

Valor en Letras: Doscientos once millones seiscientos dieciseis mil ciento diecisiete pesos m/cte con catorce cent.


Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-04 por \$ 211,616,117.14

Observaciones: #\$24-02-00;4303-2024;ldiazp@invias.gov.co#\$
explanan@explanan.com
Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%
Participación: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%
Nota_: Acta de Ajuste No 11 Definitivo periodo Septiembre fue de \$0

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764083967874 aprobado en 20241125 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: a1c1fb1db4db70b0b83609cd7f3c0c3153743a857f3dc814f5ed06dc9429fba92359d0dd9390055f2635ab4ae48d24a2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA	1
--------	---

05/11/2025	
------------	--

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (F

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☒ NO ☐

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.	11	(D
-------------------------------	----	----

CONTRATO DE OBRA No : 4303 DE 2024
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES

PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____
(Indicar con día, mes y año)

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

.....

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024
(Indique número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 163,399,331,768.00
---------------------------------	-----------------------

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA AGOSTO:	\$	30.542.762,00
--	----	---------------

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA AGOSTO:	\$	29,496,353.00
---------------------------------------	----	---------------

AJUSTES BALDO AGOSTO 2025									
GRUPO DE AJUSTE	INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado: <u>Septiembre 2024</u>	INDICE MES APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Agosto 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Ia	I	I / Ia	(A)	(B)	Pen-k-B	Pi-Pa*(Ia)	Pi-Pe	
Vías Interurbanas Preliminares y exploración 11601	126.36	133.64	1.05761	\$ 445,329,410.38	\$ 98,507,662.05	\$ 346,821,748.34	\$ 366,379,105.26	\$ 19,957,356.92	\$ 509,969,244.02
Vías Interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,967,074.40
Vías Interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,202,184.85
Vías Interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	126.37	130.82	1.03521	\$ 339,656,368.89	\$ 75,437,619.53	\$ 264,218,689.36	\$ 273,521,820.41	\$ 9,303,140.05	\$ 357,615,853.36
Vías Interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11605	129.13	134.71	1.04321	\$ 262,423,220.73	\$ 58,284,197.32	\$ 204,139,023.41	\$ 212,959,870.61	\$ 8,820,847.20	\$ 39,849,029.40
Vías Interurbanas Señalización y control de tránsito 11607				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,808,322.00
Vías Interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,075,508.10
Vías urbanas Actividades preliminares y exploración 11701				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacios públicos 11704				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Redes urbanas de servicios, redes hidro sanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra 11706				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Redes hidro sanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal 11707				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal 11708				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Estabilización de terreno 11709				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Puentes Preliminares 14101				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Puentes Excavación y cimentación 14102				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Puentes Rellenos 14103				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,774,693.40
Puentes Subestructura 14104				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Puentes Superestructura 14105				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PORCENTAJE AMORTIZADO:	22.21%	(%) (tres decimales)
------------------------	--------	----------------------

VALOR AJUSTE	\$	38,081,344.17	\$	1,025,062,509.64
VALOR IVA	\$	278,286.75	\$	7,490,841.42

VALOR TOTAL	\$ 38,359,630.92	\$ 1,032,553,351.04
-------------	------------------	---------------------

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA SEPTIEMBRE:	\$	35,522,000.00
--	----	---------------

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA SEPTIEMBRE:	\$	34,633,337.00
---	----	---------------

AJUSTES PROVISIONAL SEPTIEMBRE 2025									
GRUPO DE AJUSTE	INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año Utilizado <u>Septiembre 2024</u>	INDICE MES APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado <u>Septiembre 2024</u>	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	P=A-B	Pi=Pi(Ii/Io)	Pi-Pa	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	126.36	133.59	1.05722	\$ 1,739,199,754.62	\$ 386,276,265.90	\$ 1,352,923,489.12	\$ 1,430,337,771.17	\$	587,383,526.08
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31,967,074.48
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	29,202,184.85
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	126.37	130.37	1.03165	\$ 1,326,501,820.11	\$ 294,616,054.25	\$ 1,031,885,765.87	\$ 1,064,544,890.36	\$	390,275,075.31
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	129.13	134.25	1.03965	\$ 1,024,873,701.27	\$ 227,624,449.05	\$ 797,249,252.22	\$ 828,860,185.07	\$	71,460,962.29





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

VERSIÓN

1 de 3

PÁGINA

1

FECHA

05/11/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCÓ

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

12

(P)

ACTA DE AJUSTE FINAL:

☐ SI

☒ NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

(D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No :

4303 DE 2024

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

4312 DE 2024

(Indique número y año)

INTERVENTOR:

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PLAZO INICIAL:

VEINTE (20) MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

VEINTE (20) MESES

(En meses según las prórogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

21/11/2024

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/07/2026

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$ 153,399,331,758.00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

\$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$ 153,399,331,758.00

DATOS ESPECÍFICOS	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA SEPTIEMBRE:	\$ 35,522,000.00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA SEPTIEMBRE:	\$ 34,633,337.00






AJUSTES SALDO SEPTIEMBRE 2025										
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Septiembre 2024	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Septiembre 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	MAYOR VALOR PAGADO AJUSTE DEFINITIVO 11	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po-A.II	Pi-Po*(I/Io)		Pi-Po	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	126.36	133.59	1.05722	\$ 303,954,391.89	\$ 67,508,270.44	\$ 236,446,121.45	\$ 249,975,568.52	\$ 527,640.16	\$ 13,001,806.91	\$ 600,669,481.37
Vías interurbanas Alfirmados, subbases y bases 11602	129.28	135.51	1.04819	\$ 8,759,862.00	\$ 1,945,565.35	\$ 6,814,296.65	\$ 7,142,677.61	\$ 328,380.96	\$ 32,289,545.43	
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	140.08	148.44	1.05968	\$ 965,591.04	\$ 214,457.77	\$ 751,133.27	\$ 795,960.90	\$ 44,827.63	\$ 29,246,205.69	
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	126.37	130.37	1.03165	\$ 249,407,977.67	\$ 55,393,511.84	\$ 194,014,465.83	\$ 200,155,023.67	\$ 3,673,513.33	\$ 2,467,044.51	\$ 396,305,082.96
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605				\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	129.13	134.25	1.03965	\$ 308,567,213.37	\$ 68,532,778.09	\$ 240,034,435.28	\$ 249,551,800.64	\$ 2,838,207.34	\$ 6,679,158.02	\$ 80,806,641.99
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,608,322.04
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	124.85	134.46	1.07697	\$ 17,007,964.02	\$ 3,777,468.81	\$ 13,230,495.21	\$ 14,248,846.43	\$ 1,018,351.22	\$ 8,075,531.88	
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público 11704				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra 11706				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal 11707				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal 11708				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Estabilización de terreno 11709				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Puentes Preliminares 14101				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Puentes Excavación y cimentación 14102				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Puentes Rellenos 14103				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,774,893.49
Puentes Subestructura 14104				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Puentes Superestructura 14105				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES				\$ 888,663,000.00	\$ 197,372,052.30	\$ 691,290,948	\$ 721,869,877.77	\$ 7,039,360.83	\$ 23,539,569.25	\$ 1,196,775,504.85
									\$ 23,539,569.25	\$ 1,196,775,504.85
									\$ 172,019.93	\$ 8,745,667.15
									\$ 23,711,589.18	\$ 1,205,521,172.00

PORCENTAJE AMORTIZACIÓN: 22.21% (%) (tres decimales)



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE AJUSTE								CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
								VERSIÓN 2 de 3	
								PÁGINA 1	
								FECHA 05/11/2025 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CHOCÓ		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 12 (P)	ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____				MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: _____				ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)	
CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO				FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 (Indique número y año)				INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 153,399,331,758.00 (Según contrato principal)	
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 153,399,331,758.00				VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA OCTUBRE: \$ 40,801,239.00									
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA OCTUBRE: \$ 40,943,131.00									
AJUSTES PROVISIONAL OCTUBRE 2025									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Septiembre 2024	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Septiembre 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I _o	I	I / I _o	(A)	(B)	P _o =A-B	P _i =P _o *(I/I _o)	P _i -P _o	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	126.36	133.59	1.05722	\$ 1,854,219,876.11	\$ 411,822,234.48	\$ 1,442,397,641.62	\$ 1,524,931,634.67	\$ 82,533,993.05	\$ 681,718,095.97
Vías interurbanas Alfirmados, subbases y bases 11602	129.28	135.51	1.04819	\$ 53,437,985.00	\$ 11,868,576.47	\$ 41,569,408.53	\$ 43,572,638.33	\$ 2,003,229.80	\$ 34,256,722.76
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	140.08	148.44	1.05968	\$ 5,890,416.96	\$ 1,306,261.61	\$ 4,582,155.35	\$ 4,855,618.38	\$ 273,463.03	\$ 29,514,747.16
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	126.37	130.37	1.03165	\$ 1,521,469,147.33	\$ 337,918,297.62	\$ 1,183,550,849.71	\$ 1,221,010,234.10	\$ 37,459,384.39	\$ 433,090,304.37
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	129.13	134.25	1.03965	\$ 1,882,359,575.63	\$ 418,072,061.75	\$ 1,464,287,513.89	\$ 1,522,346,513.82	\$ 58,058,999.93	\$ 137,820,744.12
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,608,322.04
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	124.85	134.46	1.07697	\$ 103,754,068.98	\$ 23,043,778.72	\$ 80,710,290.26	\$ 86,922,561.30	\$ 6,212,271.04	\$ 14,175,999.61
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público 11704					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra 11706					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal 11707					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal 11708					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Estabilización de terreno 11709					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Puentes Preliminares 14101					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Puentes Excavación y cimentación 14102					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Puentes Rellenos 14103					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,774,693.49
Puentes Subestructura 14104					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Puentes Superestructura 14105					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES				\$ 5,421,131,070.00	\$ 1,204,033,210.65	\$ 4,217,097,859	\$ 4,403,639,200.60	\$ 186,541,341.24	\$ 1,379,959,629.52
PORCENTAJE AMORTIZADO: 22.21% (tres decimales)							VALOR AJUSTE	\$ 186,541,341.24	\$ 1,379,959,629.52
							VALOR IVA	\$ 1,363,186.72	\$ 10,084,320.37
							VALOR TOTAL	\$ 187,904,527.96	\$ 1,390,043,949.89

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE AJUSTE		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1																		
			VERSIÓN 3 de 3																		
			PÁGINA 1																		
			FECHA 05/11/2025 (Día / Mes / Año)																		
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 12 (P)	ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO																		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)																		
CONTRATO DE OBRA No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórogas sin suspensiones)																		
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																		
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 (Indique número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 153.399.331.758.00 (Según contrato principal)																		
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 153.399.331.758.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ -																		
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:																					
<table><tr><th colspan="4">RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR</th></tr><tr><td>*VALOR AJUSTE</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>*VALOR TOTAL AJUSTE</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr></table> * (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)				RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR				*VALOR AJUSTE	\$	-		VALOR IVA	\$	-		*VALOR TOTAL AJUSTE	\$	-			
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR																					
*VALOR AJUSTE	\$	-																			
VALOR IVA	\$	-																			
*VALOR TOTAL AJUSTE	\$	-																			
<table><tr><td>VALOR AJUSTE DEFINITIVO</td><td>\$</td><td>210.080.910.49</td><td>\$</td><td>1.379.959.629.52</td><td>VALOR AJUSTE</td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>1.535.206.65</td><td>\$</td><td>10.084.320.37</td><td>VALOR IVA</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR</td><td>\$</td><td>211.616.117.14</td><td>\$</td><td>1.390.043.949.89</td><td>VALOR TOTAL</td></tr></table>				VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	210.080.910.49	\$	1.379.959.629.52	VALOR AJUSTE	VALOR IVA	\$	1.535.206.65	\$	10.084.320.37	VALOR IVA	VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	211.616.117.14	\$	1.390.043.949.89	VALOR TOTAL
VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	210.080.910.49	\$	1.379.959.629.52	VALOR AJUSTE																
VALOR IVA	\$	1.535.206.65	\$	10.084.320.37	VALOR IVA																
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	211.616.117.14	\$	1.390.043.949.89	VALOR TOTAL																
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 210.080.910.49																					
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 211.616.117.14 (Indicar el valor incluido IVA)																					
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CATORCE CENTAVOS																					
NOTA: para la presenta acta de ajuste, se realiza el descuento del ajuste definitivo del mes de septiembre de 2025 N11 por un valor de \$- 7.039.360.83 sin IVA (\$-7.090.802.31 incluido IVA)																					
NOTAS: 1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes. 2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo. 3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes. 4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5. 6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. 7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo. 8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.																					
Firma: Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT		Firma: Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPTVC																			
Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial																					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2 VERSIÓN 1 PÁGINA 1 de 1																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE		FECHA 05/11/2025 (Día / Mes / Año)																																																																						
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ		PERIODO MES: sep-25																																																																						
ACTA PARCIAL DE OBRA No. (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 11 (Indique el número del acta)																																																																						
VALOR BÁSICO ACTA: \$ -																																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>07/11/2025</td><td>ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>08/11/2025</td><td>ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>10/11/2025</td><td>ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>12-11-2025</td><td>ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>18-11-2025</td><td>VICTOR ANDRES GUTIERREZ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>18-11-2025</td><td>LUIS JAIME DIAZ PEREZ</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	07/11/2025	ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	08/11/2025	ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10/11/2025	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	12-11-2025	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	18-11-2025	VICTOR ANDRES GUTIERREZ			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	18-11-2025	LUIS JAIME DIAZ PEREZ		
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																				
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	07/11/2025	ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																								
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	08/11/2025	ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES																																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10/11/2025	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																								
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	12-11-2025	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA																																																																						
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																								
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	18-11-2025	VICTOR ANDRES GUTIERREZ																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	18-11-2025	LUIS JAIME DIAZ PEREZ																																																																						
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																								
ORDEN DE PAGO																																																																								
CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024																																																																								
OBJETO: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"																																																																								
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ NIT. 901887085-0																																																																								
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ																																																																								
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ - VALOR EN LETRAS: PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																								
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA DE SEPTIEMBRE 2025 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) DEL PERIODO SEPTIEMBRE (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.																																																																								
Firma  Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Matrícula Profesional No.: 25202-42708 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: 12-11-2025 (Suscribe según su competencia)	Firma  Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Matrícula Profesional No.: 25202-42708 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: 12-11-2025 (Suscribe según su competencia)	Firma  Nombre: ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA Matrícula Profesional No.: 17202-124682 CLD GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 18-11-2025 (Suscribe según su competencia)																																																																						
		Firma  Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Matrícula Profesional No.: 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma: 18-11-2025																																																																						
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 de 1

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ		FECHA	05/11/2025 (Día / Mes / Año)
ACTA PARCIAL DE OBRA No.	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 12	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 210,080,910.49	PERIODO MES: oct-25	
(Indique el número del acta)		(Indique el número del acta)		(Indique el número del acta)	

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	07/11/2025	ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	08/11/2025	ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10-11-2025	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	12-11-2025	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12-11-2025	VICTOR ANDRES GUTIERREZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	12-11-2025	LUIS JAIME DIAZ PEREZ		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024	
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ NIT. 901887085-0
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	ING. LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
(Indicar el ordenador del pago)	
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 211.616.117.14	VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CATORCE CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	DEL PERIODO
ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL DE OCTUBRE 2025	OCTUBRE
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)	(Indicar el periodo del Acta)
 Firma Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Matrícula profesional No.: 25202-42708 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: 12-11-2025 (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Matrícula profesional No.: 25202-42708 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: 12-11-2025 (Suscribe según su competencia)
 Firma Nombre: ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA Matrícula profesional No.: 17202-124682 CLD GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 12-11-2025 (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA Matrícula profesional No.: 17202-124682 CLD GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 12-11-2025 (Suscribe según su competencia)
 Firma Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Matrícula Profesional No.: 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma: 12-11-2025	 Firma Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Matrícula Profesional No.: 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma: 12-11-2025

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4303 DE 2024 %

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO

TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBR	PERIODO
ACTA DE OBRA		
ACTA DE INTERVENTORIA		
ACTA DE AJUSTE	DEFINITIVA	11 sep-25
PRESTACION DE SERVICIOS		
OTRO		
CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: <u>84525</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-72-51102D-2401008-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	\$	-
No. COMPROMISO: _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$	-
No. COMPROMISO: _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO		
			TOTAL ACTA	\$	-

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nombre: ING. YESID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4303 DE 2024 %

ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBR	PERIODO
ACTA DE OBRA		
ACTA DE INTERVENTORIA		
ACTA DE AJUSTE	PROVISIONAL 12	oct-25
PRESTACION DE SERVICIOS		
OTRO		
CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: <u>84525</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-72-51102D-2401008-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO \$ <u>211,616,117.14</u>
No. COMPROMISO: _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO \$ <u>-</u>
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
			TOTAL ACTA \$ <u>211,616,117.14</u>

Firmado digitalmente
por CHAMAT LUNA
YEZID ALBERTO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nombre: ING. YESID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL					CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
						VERSIÓN	1		
						PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 4303 DE 2024

Contratista : CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

Objeto del Contrato : "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

Acta N°: 11

Valor basico : \$ -

Periodo : sep-25

Valor Incluido Iva : \$ -

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:									
Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puentes - Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA rev. ajuste y/o act y/o mod y/o comp de estudios y diseños	Valor incluido IVA Gestión social, predial y ambiental incluye PAGA	Valor incluido IVA Elaboración estudios y diseños estabilización de taludes	Valor incluido IVA Implementación protocolo de bioseguridad por covid-19	Subtotal	
1	6002	QUIBDÓ - LA MANSA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS				
NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCÓ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
901.586.808-7	MUNICIPIO 1	CARMEN DE ATRATO	\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ -	\$ -
NIT	DEPARTAMENTO 2	ANTIOQUIA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ -	\$ -
NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ -	\$ -

Firma:
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
Contratista
Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT

Firma:
Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Interventor
Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL					CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
						VERSIÓN		1	
						PÁGINA		1	DE

Contrato N°: 4303 DE 2024

Contratista : CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

Objeto del Contrato : "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

Acta N°: 12

Valor basico : \$ 210,080,910.49

Periodo : oct-25

Valor Incluido Iva : \$ 211,616,117.14

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puentes - Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA rev. ajuste y/o act y/o mod y/o comp de estudios y diseños	Valor incluido IVA Gestión social, predial y ambiental incluye PAGA	Valor incluido IVA Elaboración estudios y diseños estabilización de taludes	Valor incluido IVA Implementación protocolo de bioseguridad por covid-19	Subtotal
1	6002	QUIBDÓ - LA MANSA	\$ 211,616,117.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211,616,117.14
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTALES			\$ 211,616,117.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211,616,117.14

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCÓ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
901.586.808-7	MUNICIPIO 1	CARMEN DE ATRATO	\$ 211,616,117.14	\$ 210,080,910.49
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 211,616,117.14	\$ 210,080,910.49

NIT	DEPARTAMENTO 2	ANTIOQUIA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ -	\$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3		\$ -	\$ -

Firma:
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
Contratista
Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT

Firma:
Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Interventor
Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

UNIDAD EJECUTORA:SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CHOCÓ

FECHA05/11/2025
(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No:4303 DE 2024

CONTRATISTA:CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

MES INFORME MENSUAL:septiembre - 2025

PROYECTO:CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

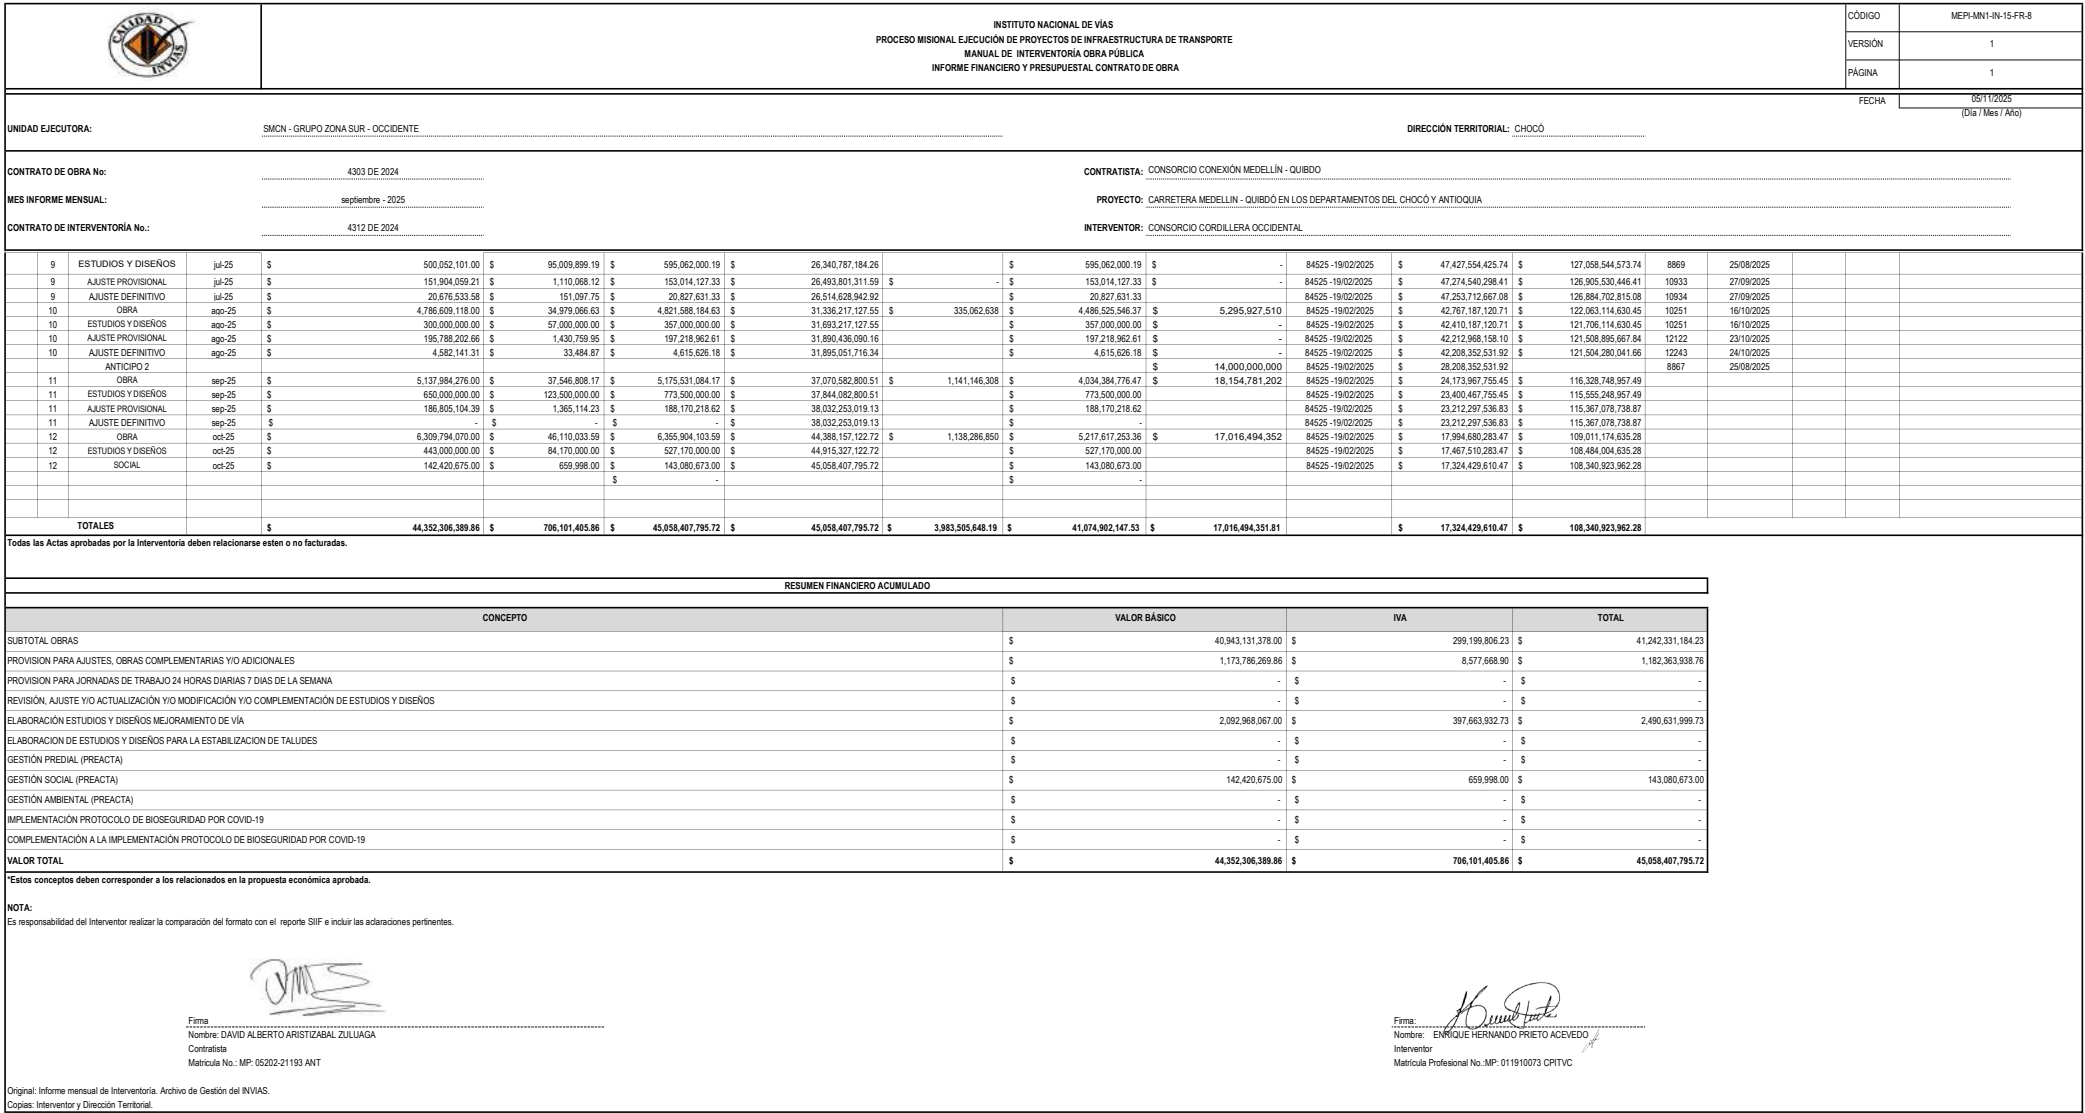
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:4312 DE 2024

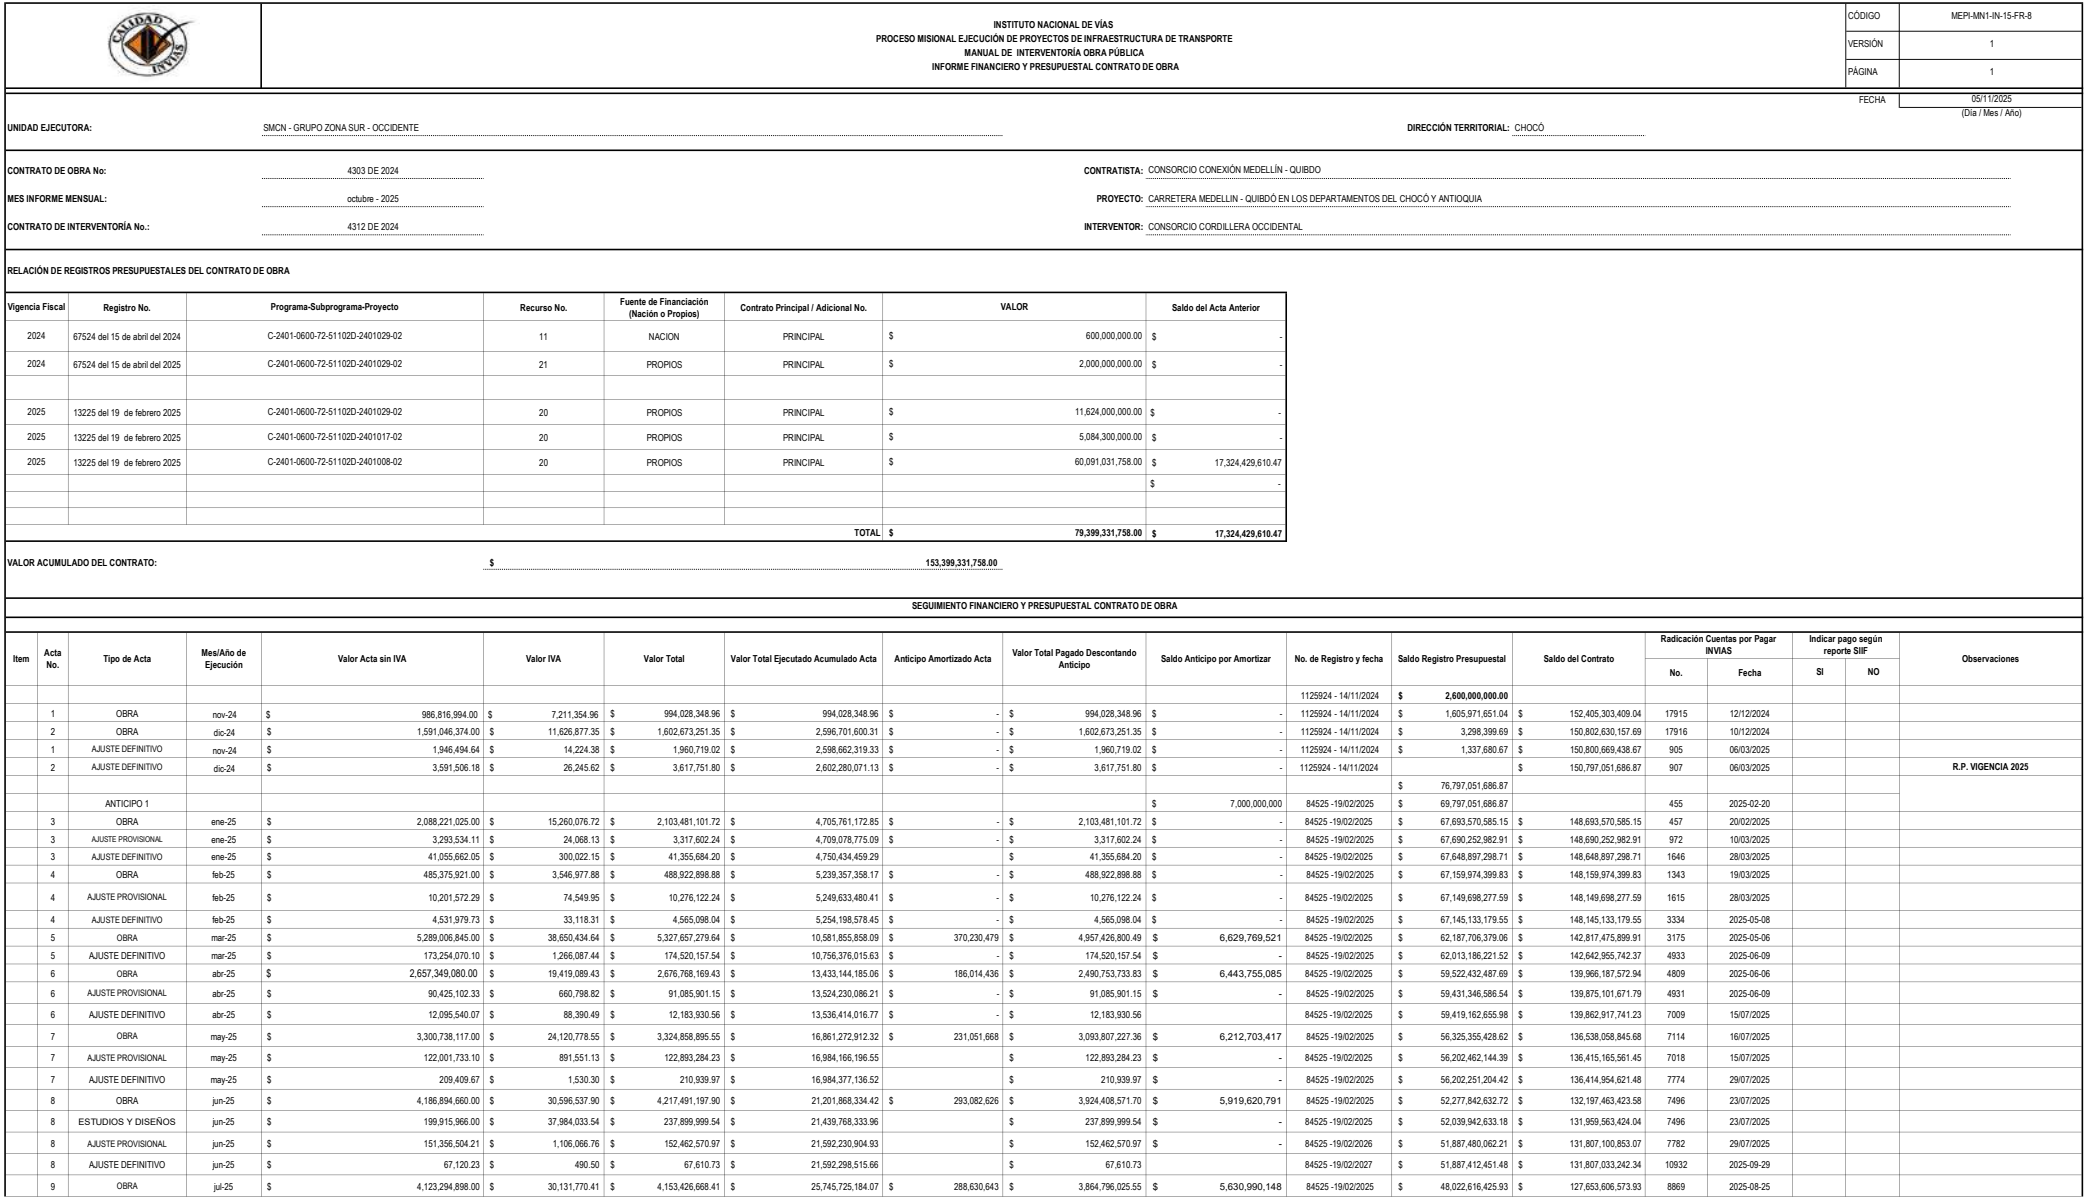
INTERVENTOR:CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

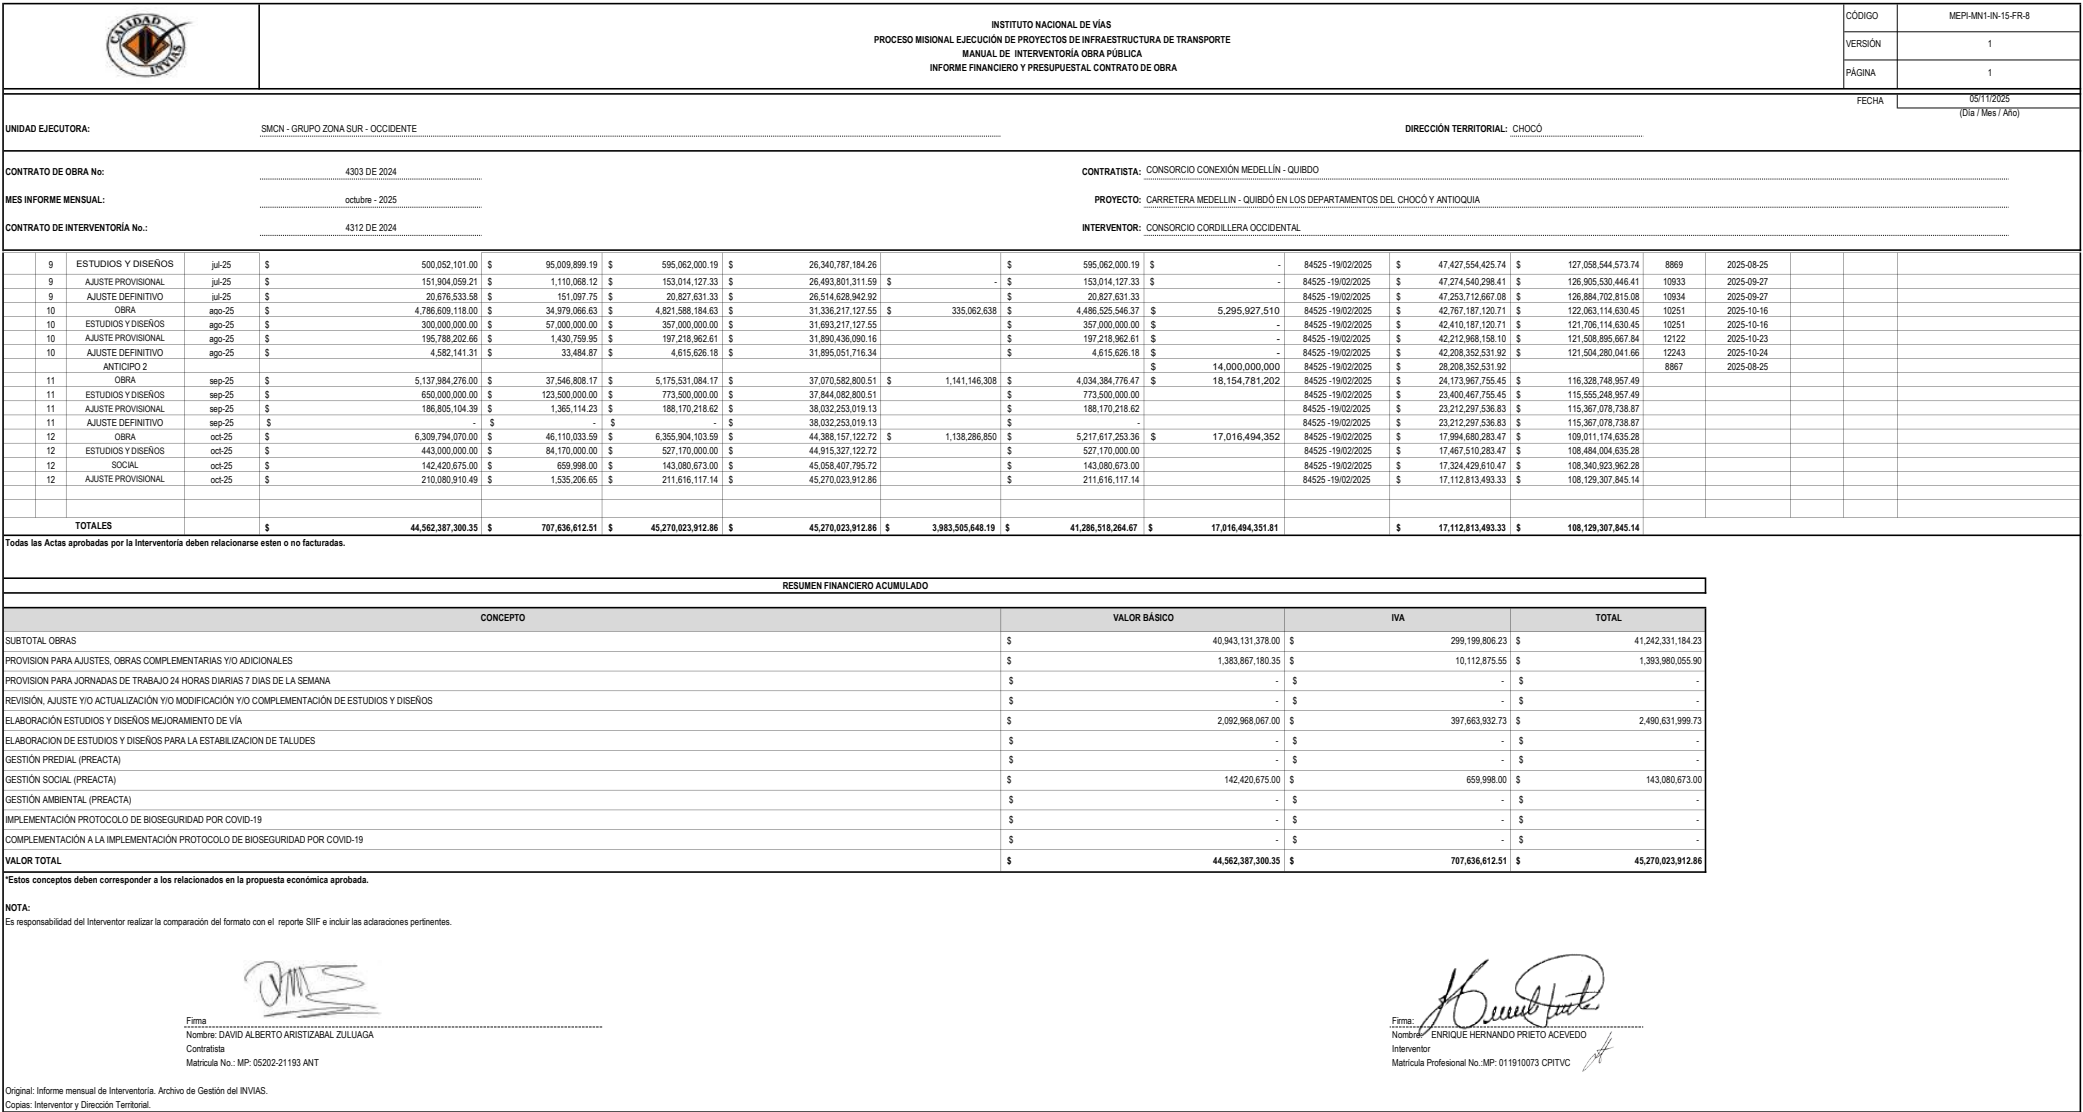
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	VALOR		Saldo del Acta Anterior
2024	67524 del 15 de abril del 2024	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	11	NACION	PRINCIPAL	\$	600.000.000,00	\$ -
2024	67524 del 15 de abril del 2025	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	21	PROPIOS	PRINCIPAL	\$	2.000.000.000,00	\$ -
2025	13225 del 19 de febrero 2025	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$	11.624.000.000,00	\$ -
2025	13225 del 19 de febrero 2025	C-2401-0600-72-51102D-2401017-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$	5.084.300.000,00	\$ -
2025	13225 del 19 de febrero 2025	C-2401-0600-72-51102D-2401008-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$	60.091.031.758,00	\$ 17.324.429.610,47
								\$ -
TOTAL						\$	79.399.331.758,00	\$ 17.324.429.610,47

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 153.399.331.758,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																		
Item	Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	Radicación Cuentas por Pagar INVIAS		Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
														No.	Fecha	SI	NO	
											1125924 - 14/11/2024	\$ 2.600.000.000,00						
	1	OBRA	nov-24	\$ 986.816.994,00	\$ 7.211.354,96	\$ 994.028.348,96	\$ 994.028.348,96	\$ -	\$ 994.028.348,96	\$ -	1125924 - 14/11/2024	\$ 1.605.971.651,04	\$ 152.405.303.409,04	17915	12/12/2024			
	2	OBRA	dic-24	\$ 1.591.046.374,00	\$ 11.626.877,35	\$ 1.602.673.251,35	\$ 2.596.701.600,31	\$ -	\$ 1.602.673.251,35	\$ -	1125924 - 14/11/2024	\$ 3.298.399,69	\$ 150.802.630.157,69	17916	10/12/2024			
	1	AJUSTE DEFINITIVO	nov-24	\$ 1.946.494,64	\$ 14.224,38	\$ 1.960.719,02	\$ 2.598.662.319,33	\$ -	\$ 1.960.719,02	\$ -	1125924 - 14/11/2024	\$ 1.337.680,67	\$ 150.800.669.438,67	905	06/03/2025			
	2	AJUSTE DEFINITIVO	dic-24	\$ 3.591.506,18	\$ 26.245,62	\$ 3.617.751,80	\$ 2.602.280.071,13	\$ -	\$ 3.617.751,80	\$ -	1125924 - 14/11/2024	\$	\$ 150.797.051.686,87	907	06/03/2025			R.P. VIGENCIA 2025
		ANTICIPO 1								\$ 7.000.000,000		\$ 76.797.051.686,87						
											84525 - 19/02/2025	\$ 69.797.051.686,87		455	2025-02-20			
	3	OBRA	ene-25	\$ 2.088.221.025,00	\$ 15.260.076,72	\$ 2.103.481.101,72	\$ 4.705.761.172,85	\$ -	\$ 2.103.481.101,72	\$ -	84525 - 19/02/2025	\$ 67.693.570.585,15	\$ 148.693.570.585,15	457	20/02/2025			
	3	AJUSTE PROVISIONAL	ene-25	\$ 3.293.534,11	\$ 24.068,13	\$ 3.317.602,24	\$ 4.709.078.775,09	\$ -	\$ 3.317.602,24	\$ -	84525 - 19/02/2025	\$ 67.690.252.982,91	\$ 148.690.252.982,91	972	10/03/2025			
	3	AJUSTE DEFINITIVO	ene-25	\$ 41.055.662,05	\$ 300,022,15	\$ 41.355.684,20	\$ 4.750.434.459,29	\$ -	\$ 41.355.684,20	\$ -	84525 - 19/02/2025	\$ 67.648.897.298,71	\$ 148.648.897.298,71	1646	28/03/2025			
	4	OBRA	feb-25	\$ 485.375.921,00	\$ 3.546.977,88	\$ 488.922.898,88	\$ 5.239.357.358,17	\$ -	\$ 488.922.898,88	\$ -	84525 - 19/02/2025	\$ 67.159.974.399,83	\$ 148.159.974.399,83	1343	19/03/2025			
	4	AJUSTE PROVISIONAL	feb-25	\$ 10.201.572,29	\$ 74.549,95	\$ 10.276.122,24	\$ 5.249.633.480,41	\$ -	\$ 10.276.122,24	\$ -	84525 - 19/02/2025	\$ 67.149.698.277,59	\$ 148.149.698.277,59	1615	28/03/2025			
	4	AJUSTE DEFINITIVO	feb-25	\$ 4.531.979,73	\$ 33.118,31	\$ 4.565.098,04	\$ 5.254.198.578,45	\$ -	\$ 4.565.098,04	\$ -	84525 - 19/02/2025	\$ 67.145.133.179,55	\$ 148.145.133.179,55	3334	2025-05-08			
	5	OBRA	mar-25	\$ 5.289.006.845,00	\$ 38.650.434,64	\$ 5.327.657.279,64	\$ 10.581.855.858,09	\$ 370.230,479	\$ 4.957.426.800,49	\$ 6.629.769,521	84525 - 19/02/2025	\$ 62.187.706.379,06	\$ 142.817.475.899,91	3175	2025-05-06			
	5	AJUSTE DEFINITIVO	mar-25	\$ 173.254.070,10	\$ 1.266,087,44	\$ 174.520.157,54	\$ 10.756.376.015,63	\$ -	\$ 174.520.157,54	\$ -	84525 - 19/02/2025	\$ 62.013.186.221,52	\$ 142.642.955.742,37	4933	2025-06-09			
	6	OBRA	abr-25	\$ 2.657.349.080,00	\$ 19.419.089,43	\$ 2.676.768.169,43	\$ 13.433.144.185,06	\$ 186.014,436	\$ 2.490.753.733,83	\$ 6.443.755,085	84525 - 19/02/2025	\$ 59.522.432.487,69	\$ 139.966.187.572,94	4809	2025-06-06			
	6	AJUSTE PROVISIONAL	abr-25	\$ 90.425.102,33	\$ 660.798,82	\$ 91.085.901,15	\$ 13.524.230.086,21	\$ -	\$ 91.085.901,15	\$ -	84525 - 19/02/2025	\$ 59.431.346.586,54	\$ 139.875.101.671,79	4931	2025-06-09			
	6	AJUSTE DEFINITIVO	abr-25	\$ 12.095.540,07	\$ 88.390,49	\$ 12.183.930,56	\$ 13.536.414.016,77	\$ -	\$ 12.183.930,56	\$ -	84525 - 19/02/2025	\$ 59.419.162.655,98	\$ 139.862.917.741,23	7009	15/07/2025			
	7	OBRA	may-25	\$ 3.300.738.117,00	\$ 24.120.778,55	\$ 3.324.858.895,55	\$ 16.861.272.912,32	\$ 231.051,668	\$ 3.093.807.227,36	\$ 6.212.703,417	84525 - 19/02/2025	\$ 56.325.355.428,62	\$ 136.538.058.845,68	7114	16/07/2025			
	7	AJUSTE PROVISIONAL	may-25	\$ 122.001.733,10	\$ 891.551,13	\$ 122.893.284,23	\$ 16.984.166.196,55	\$ -	\$ 122.893.284,23	\$ -	84525 - 19/02/2025	\$ 56.202.462.144,39	\$ 136.415.165.561,45	7018	15/07/2025			
	7	AJUSTE DEFINITIVO	may-25	\$ 209.409,67	\$ 1.530,30	\$ 210.939,97	\$ 16.984.377.136,52	\$ -	\$ 210.939,97	\$ -	84525 - 19/02/2025	\$ 56.202.251.204,42	\$ 136.414.954.621,48	7774	29/07/2025			
	8	OBRA	jun-25	\$ 4.186.894.660,00	\$ 30.596.537,90	\$ 4.217.491.197,90	\$ 21.201.868.334,42	\$ 293.082,626	\$ 3.924.408.571,70	\$ 5.919.620,791	84525 - 19/02/2025	\$ 52.277.842.632,72	\$ 132.197.463.423,58	7496	23/07/2025			
	8	ESTUDIOS Y DISEÑOS	jun-25	\$ 199.915.966,00	\$ 37.984.033,54	\$ 237.899.999,54	\$ 21.439.768.333,96	\$ -	\$ 237.899.999,54	\$ -	84525 - 19/02/2025	\$ 52.039.942.633,18	\$ 131.999.563.424,04	7496	23/07/2025			
	8	AJUSTE PROVISIONAL	jun-25	\$ 151.356.504,21	\$ 1.106,066,76	\$ 152.462.570,97	\$ 21.592.230.904,93	\$ -	\$ 152.462.570,97	\$ -	84525 - 19/02/2026	\$ 51.887.480.062,21	\$ 131.807.100.853,07	7782	29/07/2025			
	8	AJUSTE DEFINITIVO	jun-25	\$ 67.120,23	\$ 480,50	\$ 67.610,73	\$ 21.592.298.515,66	\$ -	\$ 67.610,73	\$ -	84525 - 19/02/2027	\$ 51.887.412.451,48	\$ 131.807.033.242,34	10932	29/09/2025			
	9	OBRA	jul-25	\$ 4.123.294.898,00	\$ 30.131.770,41	\$ 4.153.426.668,41	\$ 25.745.725.184,07	\$ 288.630,643	\$ 3.864.796.025,55	\$ 5.630.990,148	84525 - 19/02/2025	\$ 48.022.616.425,93	\$ 127.653.606.573,93	8869	25/08/2025			







UNIDAD EJECUTORA: _____		DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____		FECHA: _____	
SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE		CHOCO		05/10/2025 (Día / Mes / Año)	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____		DE _____		VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ _____	
11		sep-25 (Indicar mes y año)		5,137,894,276.00	
SEGUIMIENTO No. _____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)					
CONTRATO No.: _____		PLAZO INICIAL: _____		PLAZO ACUMULADO: _____	
4303-2024		VEINTIUN (21) MESES (En meses según contrato principal)		VEINTIUN (21) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: _____		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _____		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _____	
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTOQUIA		21/11/2024 (Indique día/mes/año)		31/07/2026 (Incluida las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: _____		FECHA DE SUSPENSIÓN _____		FECHA DE REANUDACIÓN: _____	
CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO		(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		(Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: _____		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _____		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _____	
4312 DE 2024		153,399,331,758.00 (Según contrato principal)		153,399,331,758.00	
INTERVENTOR: _____		VALOR ACUMULADO _____		153,399,331,758.00	
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL					

[illegible][illegible]

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual

NOTAS:

1. Indicar los ítems de grupo agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYENDO IVA (B))	\$ 3,124,468.00		
	\$ 11,638,999.12		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C)	\$ 11,638,999.12	989,578.09	8.50%
	\$ 500,000.00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D)	\$ 500,000.00		
	\$ 131,636,631.58		
VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (A) = A + B + C + D	\$ 131,636,631.58	34,886,427.08	26.50%
VALOR IVA (OBRA) (10% SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$ 860,441.08	253,089.77	29.76%
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 132,487,072.66	34,886,427.08	26.33%
	\$ 6,000,000.00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, (B)	\$ 6,000,000.00	1,963,462.00	32.72%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)	\$ 12,912,289.09		
	\$ 12,912,289.09		
PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (N)	\$ 2,000,000.00		
	\$ 153,399,331.75	37,839,467.17	24.67%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 153,399,331.75		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C("CASA")	\$ 153,399,331.75	37,839,467.17	24.67%

OBSERVACIONES:	
 Aprueba Firma: Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Representante legal o apoderado del Contratista Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT	 Aprueba Firma: Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO Representante legal o apoderado del Interventor Matricula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA						CÓDIGO		MEP-MN-1-IN-4-FR-1				
								VERSION		1				
								PÁGINA		1				
									FECHA		05/11/2025 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CHOCÓ		ACTA No.		12				
								ACTA FINAL		☐				
CONTRATO No :		4303 DE 2024 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL:		VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:		VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO:		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.		FECHA DE INICIO DEL CO:		21/11/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
				FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:		N/A (Indique día/mes/año)				
CONTRATISTA:		CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO		RUTA 6002-6003		VALOR INICIAL (incluido IV, \$		153,399,331,758.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		4312 DE 2024		INTERVENTOR:		CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):		\$ 153,399,331,758.00				
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificadorio 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES														
1	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	4.00	\$ 530,554	\$ 2,122,216	3.00	\$ 1,591,662.00		\$ -	2.94	\$ 1,559,829
2	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	4,701.00	\$ 61,916	\$ 291,067,116	161,800.26	\$ 10,018,024,898.16	20,678.96	\$ 1,280,358,487	96,728.58	\$ 5,989,046,758
3	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	138,412.00	\$ 17,034	\$ 2,357,710,008	166,470.61	\$ 2,835,660,370.74	16,332.99	\$ 278,216,152	73,025.22	\$ 1,243,911,597
4	11601	220 - 22		Terraplenes	m3	4,571.00	\$ 22,139	\$ 101,197,369	30,000.00	\$ 664,170,000.00		\$ -	14,716.39	\$ 325,806,158
5	11601	233 - 22		Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante	m2	10.00	\$ 20,535	\$ 205,350	10.00	\$ 205,350.00		\$ -		\$ -
Subtotal								\$ 2,752,302,059		\$ 13,519,652,280.90		\$ 1,555,574,639		\$ 7,560,324,342
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
6	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	6,073.00	\$ 196,801	\$ 1,195,172,473	14,913.24	\$ 2,934,940,545.24		\$ -	5,649.20	\$ 1,111,768,209
7	11602	330 - 22		Base granular clase A	m3	4,237.00	\$ 225,835	\$ 956,862,895		\$ -		\$ -		\$ -
Subtotal								\$ 2,152,035,368		\$ 2,934,940,545.24		\$ -		\$ 1,111,768,209
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS														
8	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	21,644.00	\$ 4,818	\$ 104,280,792	21,644.00	\$ 104,280,792.00		\$ -		\$ -
9	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	32,766.00	\$ 2,298	\$ 75,296,268	32,766.00	\$ 75,296,268.00		\$ -		\$ -
10	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	5.00	\$ 1,306,545	\$ 6,532,725	5.00	\$ 6,532,725.00		\$ -		\$ -
11	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	711.00	\$ 1,355,295	\$ 963,614,745	711.00	\$ 963,614,745.00		\$ -		\$ -
Subtotal								\$ 1,149,724,530		\$ 1,149,724,530.00		\$ -		\$ -
PAVIMENTO DE CONCRETO														
12	11603	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico	m3	61,250.00	\$ 934,000	\$ 57,207,500,000	14,294.39	\$ 13,350,960,260.00		\$ -	489.23	\$ 456,940,820
Subtotal								\$ 57,207,500,000		\$ 13,350,960,260.00		\$ -		\$ 456,940,820
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
13	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	48,390.00	\$ 52,433	\$ 2,537,232,870	16,101.68	\$ 844,259,387.44		\$ -	1,617.59	\$ 84,815,096
14	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	1,695.00	\$ 86,720	\$ 146,990,400	1,695.00	\$ 146,990,400.00		\$ -	188.68	\$ 16,362,330
15	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3	3,886.00	\$ 26,160	\$ 101,657,760		\$ -		\$ -		\$ -
16	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	7,406.00	\$ 39,054	\$ 289,233,924	1,000.00	\$ 39,054,000.00		\$ -	852.46	\$ 33,291,973
17	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con relleno	m3	6,606.00	\$ 181,292	\$ 1,197,614,952	5,604.91	\$ 1,016,125,343.72		\$ -	297.74	\$ 53,977,880
18	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG	m3	843.00	\$ 204,068	\$ 172,029,324	3,000.00	\$ 612,204,000.00		\$ -	514.85	\$ 105,064,410
19	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con gravilla	m3	9,491.00	\$ 250,000	\$ 2,372,750,000	494.00	\$ 123,500,000.00		\$ -		\$ -
20	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado "in situ" de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	127.00	\$ 3,121,132	\$ 396,383,764	1,571.34	\$ 4,904,359,556.88		\$ -		\$ -
21	14101		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado "in situ" de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	231.00	\$ 4,939,881	\$ 1,141,112,511	100.00	\$ 493,988,100.00		\$ -		\$ -
22	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado "in situ" de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	5.00	\$ 10,942,319	\$ 54,711,595	5.00	\$ 54,711,595.00		\$ -		\$ -
23	11604	623 - 22		Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	m	11,421.00	\$ 483,389	\$ 5,520,785,769	14,500.00	\$ 7,009,140,500.00	414.00	\$ 200,123,046	8,904.00	\$ 4,304,095,656
24	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes	m3	204.00	\$ 1,565,552	\$ 319,372,608	2,268.00	\$ 3,550,671,936.00		\$ -		\$ -
25	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	1,736.00	\$ 1,256,503	\$ 2,181,289,208	1,736.00	\$ 2,181,289,208.00	76.28	\$ 95,846,049	416.98	\$ 523,940,755
26	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	978.00	\$ 1,186,731	\$ 1,160,622,918	978.00	\$ 1,160,622,918.00		\$ -	139.31	\$ 165,323,496
27	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero	m3	457.00	\$ 1,218,318	\$ 556,771,326	457.00	\$ 556,771,326.00		\$ -		\$ -
28	11606	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje	m3	245.00	\$ 1,292,445	\$ 316,649,025	302.20	\$ 390,576,879.00	43.85	\$ 56,673,713	163.58	\$ 211,418,153
29	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	6.00	\$ 1,081,137	\$ 6,486,822	300.00	\$ 324,341,100.00		\$ -	6.00	\$ 6,486,822
30	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación	m3	35.00	\$ 970,637	\$ 33,972,295	200.00	\$ 194,127,400.00		\$ -		\$ -
31	11606		630.4P	Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado	m3	3,898.00	\$ 1,191,226	\$ 4,643,398,948	280.00	\$ 333,543,280.00		\$ -		\$ -
32	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	846.00	\$ 799,357	\$ 676,256,022	150.00	\$ 119,903,550.00	11.18	\$ 8,936,811	51.14	\$ 40,879,117
33	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	493,274.00	\$ 8,025	\$ 3,958,523,850	399,197.49	\$ 3,203,559,857.25	12,035.90	\$ 96,588,098	77,792.93	\$ 624,288,267
34	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	102,710.00	\$ 2,185	\$ 224,421,350	319,200.77	\$ 697,453,682.45		\$ -		\$ -
35	14103	642 - 22		Apoyo elastomérico	u	12.00	\$ 1,185,774	\$ 14,229,288	70.00	\$ 83,004,180.00		\$ -		\$ -
36	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg	5,076.00	\$ 22,385	\$ 113,626,260	72,625.00	\$ 1,625,710,625.00		\$ -		\$ -
37	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	99.00	\$ 940,534	\$ 93,112,866	680.00	\$ 639,563,120.00		\$ -	44.00	\$ 41,383,496
38	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior	m	93.00	\$ 1,238,648	\$ 115,194,264	93.00	\$ 115,194,264.00		\$ -	10.00	\$ 12,386,480
39	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior	m	26.00	\$ 1,537,648	\$ 39,978,848	20.00	\$ 30,752,960.00		\$ -		\$ -
40	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m	8,901.00	\$ 30,311	\$ 269,798,211	8,901.00	\$ 269,798,211.00		\$ -	1,536.50	\$ 46,572,853
41	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm	m	451.00	\$ 330,611	\$ 149,105,561	20.00	\$ 6,612,220.00		\$ -		\$ -
42	11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	237.00	\$ 1,068,959	\$ 253,343,283	100.00	\$ 106,895,900.00		\$ -		\$ -

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEP-MN1-IN-4-FR-1			
												VERSION		1			
												PÁGINA		1			
														FECHA		05/11/2025 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ				ACTA No. 12		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 6.895.214.745,00		MES oct-25			
ACTA FINAL																	
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBODÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.														FECHA DE INICIO DEL CO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBODÓ (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)														FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024														VALOR INICIAL (incluido IV, \$ 153.399.331.758,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 153.399.331.758,00	
INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153.399.331.758,00			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificador 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA						
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
43	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada "in situ", no incluye la conformación del terreno	m3	408,00	\$ 922,215	\$ 376.263.720	175,00	\$ 161.387.625,00	\$	-	\$	-			
44	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente	m2	1.080,00	\$ 10,550	\$ 11.394.000	8.000,00	\$ 84.400.000,00	\$	-	\$	-			
45	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	31.982,00	\$ 12,209	\$ 390.468.238	11.151,70	\$ 136.151.105,30	\$	-	4.771,06	\$ 58.249.871			
46	11604		673.1P	Geodrán planar H = 0.5 m	m	15.236,00	\$ 46,855	\$ 713.882.780	2.470,00	\$ 115.731.850,00	\$	-	383,10	\$ 17.950.151			
47	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m	171,00	\$ 144,750	\$ 24.752.250	200,00	\$ 28.950.000,00	\$	-	\$	-			
48	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	18.234,00	\$ 272,971	\$ 4.977.353.214	20.000,00	\$ 5.459.420.000,00	1.830,00	\$ 499.536.930	12.390,00	\$ 3.382.110.690			
49	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	23.670,00	\$ 30,019	\$ 710.549.730	12.500,00	\$ 375.237.500,00	\$	-	\$	-			
50	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	59.036,00	\$ 36,779	\$ 2.171.285.044	2.000,00	\$ 73.558.000,00	\$	-	\$	-			
Subtotal								\$ 38.432.604.798		\$ 37.269.561.580	\$	957.704.647	\$	9.728.597.496			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
51	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	10.497,00	\$ 3,004	\$ 31.532.988	563.257,00	\$ 1.692.024.028,00	\$	-	410.298,00	\$ 1.232.535.192			
52	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	52,00	\$ 44,747	\$ 2.326.844	100,00	\$ 4.474.700,00	\$	-	\$	-			
53	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	442,00	\$ 10,292	\$ 4.549.064	14.976,00	\$ 154.132.992,00	\$	-	\$	-			
54	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	93,00	\$ 734,584	\$ 68.316.312	93,00	\$ 68.316.312,00	\$	-	\$	-			
55	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	28,00	\$ 848,204	\$ 23.749.712	60,00	\$ 50.892.240,00	\$	-	\$	-			
56	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV	m2	59,00	\$ 681,596	\$ 40.214.164	60,00	\$ 40.895.760,00	\$	-	\$	-			
57	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	534,00	\$ 292,546	\$ 156.219.564	6.000,00	\$ 1.755.276.000,00	\$	-	316,00	\$ 92.444.536			
58	11607	730 - 22		Sección final	u	16,00	\$ 79,481	\$ 1.271.696	200,00	\$ 15.896.200,00	\$	-	\$	-			
59	11607	740 - 22		Capitales	u	177,00	\$ 15,674	\$ 2.774.298	200,00	\$ 3.134.800,00	\$	-	49,00	\$ 768.026			
Subtotal								\$ 330.954.642		\$ 3.785.043.032,00	\$	-	\$	1.325.747.754			
OBRAS VARIAS																	
60	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	1.499,00	\$ 38,337	\$ 57.467.163	4.486,00	\$ 171.979.782,00	\$	-	40,00	\$ 1.533.480			
61	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2	74,00	\$ 23,593	\$ 1.745.882	100,00	\$ 2.359.300,00	\$	-	\$	-			
62	11606	810 - 22		Protección de taludes con tierra orgánica	m2	27.489,00	\$ 22,702	\$ 624.055.278	51.300,00	\$ 1.164.612.600,00	\$	-	4.065,00	\$ 92.283.630			
63	11606	810 - 22		Protección de taludes con hidrosiembra controlada	m2	121.300,00	\$ 17,398	\$ 2.110.377.400	100,00	\$ 1.739.800,00	\$	-	\$	-			
64	11606	811 - 22		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente	m2	27.489,00	\$ 56,834	\$ 1.562.309.826	27.489,00	\$ 1.562.309.826,00	813,70	\$ 46.245.826	12.808,00	\$ 727.929.872			
65	11606		812.3P	Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC	m2	1.299,00	\$ 96,653	\$ 125.552.247	6.000,00	\$ 579.918.000,00	\$	-	\$	-			
66	11606	840 - 22		Zanja de coronación con geomembrana, sección (B=1,2m, b=0,6m)	m	5.398,00	\$ 96,243	\$ 519.519.714	5.398,00	\$ 519.519.714,00	\$	-	549,00	\$ 52.837.407			
Subtotal								\$ 5.001.027.510		\$ 4.002.439.022,00	\$	46.245.826	\$	874.584.389			
TRANSPORTES																	
67	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5.500.000,00	\$ 1,700	\$ 9.350.000.000	1.102.320,60	\$ 1.873.945.020,00	62.505,00	\$ 106.258.500	259.248,00	\$ 440.721.600			
Subtotal								\$ 9.350.000.000		\$ 1.873.945.020,00	\$	106.258.500	\$	440.721.600			
ITEM NO PREVISTO																	
NP1	11601	201-22	201.7	Demolición de Estructuras	m3		\$ 252.373,00		235,00	\$ 59.307.655,00	\$	-	83,87	\$ 21.166.523			
NP2	11601	201-22	201.15	Remoción de alcantarillas	m		\$ 118.645,00		200,00	\$ 23.729.000,00	\$	-	\$	-			
NP3	11601	201-22	201.16	Remoción de Cerca de Alambre	m		\$ 3.981,00		16.000,00	\$ 63.696.000,00	\$	-	\$	-			
NP4	11601	211-22	211.1	Remoción de Derrumbes	m3		\$ 22.185,00		210.000,00	\$ 4.658.850.000,00	26.185,52	\$ 580.925.761	197.356,27	\$ 4.378.348.850			
NP5	11602	230-22	230.1	Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial	m3		\$ 149.567,00		3.980,00	\$ 595.276.660,00	\$	-	3.004,85	\$ 449.426.400			
NP6	11602	310-22	310.1	Conformación de la calzada existente	m2		\$ 2.023,00		80.000,00	\$ 161.840.000,00	22.102,50	\$ 44.713.358	77.970,70	\$ 157.734.727			
NP7	11602	311-22	311.1	Afirmado	m3		\$ 159.988,00		6.400,00	\$ 1.023.923.200,00	109,29	\$ 17.484.489	688,54	\$ 110.157.538			
NP8	11603		600.2.3.1P	Excavación manual varias en material común en seco	m3		\$ 54.735,00		1.500,00	\$ 82.102.500,00	66,12	\$ 3.619.078	524,67	\$ 28.717.813			
NP9	11603	630-22	630.1.7	Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA	m3		\$ 537.696,00		378,00	\$ 203.249.088,00	6,02	\$ 3.236.930	172,22	\$ 92.602.005			
NP10	11604		673.1.1P	Geodren Triplanar H=2m	m2		\$ 104.464,00		68.597,16	\$ 7.165.933.722,24	204,75	\$ 21.389.004	13.152,36	\$ 1.373.948.136			
NP11	11604	673-22	673.2	Material Granular Drenante	m3		\$ 114.058,00		4.200,00	\$ 479.043.600,00	\$	-	869,89	\$ 99.217.913			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO	MEP/MI-NI-4-FR-1
			VERSION	1
			PÁGINA	1

		FECHA		05/11/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CHOCÓ	
		ACTA No.	12	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 6,895,214,745.00
		ACTA FINAL	☐	MES oct-25

CONTRATO No :	4303 DE 2024 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL:	VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBÚO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.	FECHA DE INICIO DEL CO:	21/11/2024 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/07/2026 (Indique día/mes/año)
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A (Indique día/mes/año)
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBÚO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)	VALOR INICIAL (incluido IV, \$	153,399,331,758.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	4312 DE 2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	153,399,331,758.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificadorio 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP12	11604	900-22	900.3.2	Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)	m3 - km		\$ 1,804.00		2,370,000.00	\$ 4,275,480,000.00	143,673.71	\$ 259,187,373	2,370,000.00	\$ 4,275,480,000
NP13	11604	900-22	900.1.2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia	m3 - E		\$ 1,443.00		424,804.00	\$ 612,992,172.00	71,739.00	\$ 103,519,377	394,158.46	\$ 568,770,658
NP14	11608	200.1.1P.		Tala de arbol H < 12m (incluye desentrañe, retiro y disposición final)	u		\$ 284,383.00		200.00	\$ 56,876,600.00	51.00	\$ 14,503,533	95.00	\$ 27,016,385
NP15	11608	200.1.2P.		Tala de arbol H > ó = 12 m (incluye desentrañe, retiro y disposición final)	u		\$ 549,686.00		200.00	\$ 109,937,200.00		\$ -	88.00	\$ 48,372,368
NP16	11601	500.1.1 P		Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 días	m3		\$ 1,313,657.00		4,000.00	\$ 5,254,628,000.00		\$ -	391.65	\$ 514,493,765
NP17	11601	500.1.2 P		Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días	m3		\$ 1,231,948.00		4,000.00	\$ 4,927,792,000.00	15.16	\$ 18,673,868	2,769.56	\$ 3,411,951,440
NP18	11606	685.1P		Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio	U		\$ 22,328.00		2,500.00	\$ 55,820,000.00		\$ -		\$ -
NP19	11604	633-22	633.1	Tuberia para filtro 15 o 6"	m		\$ 45,493.00		4,000.00	\$ 181,972,000.00		\$ -		\$ -
NP20	11607	700.1P		Linea de demarcaccon con imprimante para pintura	m		\$ 2,492.00		160,000.00	\$ 398,720,000.00		\$ -		\$ -
NP21	11604	671-22	671.1.1	Concreto resistencia fc 28 Mpa para bermas cunetas	m3		\$ 1,103,903.00		1,800.00	\$ 1,987,025,400.00	440.03	\$ 485,750,437	440.03	\$ 485,750,437
NP22	11606	630.1P		Suministro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (incluye conformacion y alistado del piso)	m3		\$ 1,440,005.00		2,847.00	\$ 4,099,694,235.00	1,450.00	\$ 2,088,007,250	2,362.00	\$ 3,401,291,810
NP23	11606	685.2P		Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil	m3		\$ 457,271.00		4,400.00	\$ 2,011,992,400.00		\$ -		\$ -
SUBTOTAL										\$ 38,489,881,432.24		\$ 3,641,010,458.00		\$ 19,444,446,768
ajuste al peso										\$ 1,204.58				
SUBTOTAL OBRAS								\$ 116,376,148,907	\$ 116,376,148,907	\$ 6,309,794,070.00		\$ 40,943,131,378.00		
* VALOR IVA (OBRA) (E)								\$ 850,441,088	\$ 850,441,088	\$ 46,110,033.59		\$ 299,199,806.23		
* TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A)								\$ 117,226,589,995	\$ 117,226,589,995	\$ 6,355,904,103.59		\$ 41,242,331,184.23		
* PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)								\$ 3,124,483,553	\$ 3,124,483,553					
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C)								\$ 11,635,999,121	\$ 11,635,999,121					
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)								\$ 500,000,000	\$ 500,000,000			\$ 1,182,363,938.76		
* VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D								\$ 132,487,072,669	\$ 132,487,072,669	\$ 6,355,904,103.59		\$ 42,424,695,122.99		
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL								\$ 5,042,016,807	\$ 5,042,016,807	\$ 443,000,000.00		\$ 2,092,968,067.00		
* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL								\$ 957,983,193	\$ 957,983,193	\$ 84,170,000.00		\$ 397,663,932.73		
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I+G+H								\$ 6,000,000,000	\$ 6,000,000,000	\$ 527,170,000.00		\$ 2,490,631,999.73		
* PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K)								\$ 2,000,000,000	\$ 2,000,000,000			\$ -		
* GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)								\$ 12,912,259,089	\$ 12,912,259,089	\$ 143,080,673.25		\$ 143,080,673.25		
VALOR TOTAL								\$ 153,399,331,758	\$ 153,399,331,758	\$ 7,026,154,776.84		\$ 45,058,407,795.97		


* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU	30%		
Utilidad	5%		
		Valor	%
Valor Anticipo Otorgado		\$ 21,000,000,000.00	18.04%
Valor Amortizado Presenta Acta		\$ 1,138,286,850.23	22.21%
Valor Amortizado Acumulado		\$ 3,983,505,648.19	
Valor Saldo por Amortizar		\$ 17,016,494,351.81	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO				
VALOR BÁSICO PRESENTE MES		IVA	TOTAL PRESENTE MES	
*OBRA	\$ 6,309,794,070.00	\$ 46,110,033.59	\$ 6,355,904,103.59	
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	
PROVISIÓN PARA AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -	
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS	\$ -	\$ -	\$ -	
*GESTIÓN PREDIAL	\$ -	\$ -	\$ -	
*GESTIÓN AMBIENTAL	\$ -	\$ -	\$ -	
*GESTIÓN SOCIAL	\$ 142,420,675.00	\$ 659,998.00	\$ 143,080,673.00	
*GESTIÓN SOSTENIBILIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	
*ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA	\$ 443,000,000.00	\$ 84,170,000.00	\$ 527,170,000.00	
*ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES		\$ -	\$ -	
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 6,895,214,745.00	\$ 130,940,031.59	\$ 7,026,154,776.59	

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)			
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	
E	\$ 1,558,574,639	\$ 7,560,324,342	
SB	\$ -	\$ 1,111,768,209	
B	\$ -	\$ -	
P	\$ -	\$ -	
PC	\$ -	\$ 456,940,820	
EYD	\$ 957,704,647	\$ 9,728,597,496	
SYS	\$ -	\$ 1,325,747,754	
OV	\$ 46,245,826	\$ 874,584,389	
T	\$ 106,258,500	\$ 440,721,600	
NP	\$ 3,641,010,458	\$ 19,444,446,768	
TOTAL	\$ 6,309,794,070	\$ 40,943,131,378	

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV		
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	\$ 2,158,174,268.00	\$ 15,886,284,920.00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	\$ 62,197,847.00	\$ 1,829,086,874.00
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	\$ 6,856,008.00	\$ 578,260,638.00
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	\$ 1,770,877,125.00	\$ 16,155,022,991.00
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	\$ -	\$ -
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	\$ 2,190,926,789.00	\$ 4,485,760,872.00
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	\$ -	\$ 1,327,281,234.00
Vías interurbanas Transporte y sobre carreros 11608	\$ 120,762,033.00	\$ 516,110,353.00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	\$ -	\$ -
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	\$ -	\$ -
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	\$ -	\$ -
Vías urbanas Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público 11704	\$ -	\$ -
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	\$ -	\$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP-MN1-IN-4-FR-1									
											VERSION 1									
											PÁGINA 1									
											FECHA 05/11/2025 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE											DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ	ACTA No. 12	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 6,895,214,745.00	MES oct-25						
CONTRATO No.: 4303 DE 2024 (Indique número y año)											ACTA FINAL									
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.											PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)								
											FECHA DE INICIO DEL CO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)								
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)											FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024											VALOR INICIAL (incluido IV, \$ 153,399,331,758.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):								
INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL											VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153,399,331,758.00									
											CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificatorio 3 (31 de Julio 2025)									
											OBRA EJECUTADA									
											PRESENTE ACTA									
											ACUMULADO									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)																
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR						
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 6,895,214,745															Vías urbanas Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra 11706		\$	-	\$	-
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 5,756,927,895															Vías urbanas Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal 11707		\$	-	\$	-
															Vías urbanas Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal 11708		\$	-	\$	-
															Vías urbanas Estabilización de terreno 11709		\$	-	\$	-
															Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710		\$	-	\$	-
															Transporte elevado Preliminares 14101		\$	-	\$	-
															Transporte elevado Excavación y cimentación 14102		\$	-	\$	-
															Transporte elevado Rellenos 14103		\$	-	\$ 165,323,496.00	-
															Transporte elevado Subestructura 14104		\$	-	\$	-
															Transporte elevado Superestructura 14105		\$	-	\$	-
															TOTAL ICOCIV		\$	6,309,794,070.00	\$	40,943,131,378.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$5,887,867,926.36															VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS					
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																				
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																				
OBSERVACIONES																				
NOTAS:																				
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo																				
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.																				
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.																				
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).																				
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.																				
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea el caso.																				
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.																				
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																				
Para constancia de lo anterior firman																				
Firma: 																				
Nombre: ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULIAGA																				
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO																				
Contratista																				
Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT																				
Firma: 																				
Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO																				
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO																				
Interventor																				
Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVO																				
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).																				
Copies: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial																				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA 1			
FECHA 05/10/2025 (Día / Mes / Año)															
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ				ACTA No. 11		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5.787.984.276,00		MES sep-25	
ACTA FINAL ☐															
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.								FECHA DE INICIO DEL CO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ RUTA 6002-6003 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL								VALOR INICIAL (incluido IV): \$ 153.399.331.758,00				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): N/A			
								(Según contrato principal)							
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153.399.331.758,00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificadorio 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES															
1	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	4,00	\$ 530.554	\$ 2.122.216	3,00	\$ 1.591.662,00		\$ -	2,94	\$ 1.559.829	
2	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	4.701,00	\$ 61.916	\$ 291.067.116	161.800,26	\$ 10.018.024.898,16	19.629,52	\$ 1.215.381.360	76.049,62	\$ 4.708.688.271	
3	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	138.412,00	\$ 17.034	\$ 2.357.710.008	166.470,61	\$ 2.835.660.370,74	5.804,32	\$ 98.870.787	56.692,23	\$ 965.695.445	
4	11601	220 - 22		Terraplenes	m3	4.571,00	\$ 22.139	\$ 101.197.369	30.000,00	\$ 664.170.000,00	92,00	\$ 2.036.788	14.716,39	\$ 325.806.158	
5	11601	233 - 22		Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante	m2	10,00	\$ 20.535	\$ 205.350	10,00	\$ 205.350,00		\$ -		\$ -	
Subtotal								\$ 2.752.302.059		\$ 13.519.652.280,90		\$ 1.316.288.935		\$ 6.001.749.703	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
6	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	6.073,00	\$ 196.801	\$ 1.195.172.473	14.913,24	\$ 2.934.940.545,24		\$ -	5.649,20	\$ 1.111.768.209	
7	11602	330 - 22		Base granular clase A	m3	4.237,00	\$ 225.835	\$ 956.862.895		\$ -		\$ -		\$ -	
Subtotal								\$ 2.152.035.368		\$ 2.934.940.545,24		\$ -		\$ 1.111.768.209	
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS															
8	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	21.644,00	\$ 4.818	\$ 104.280.792	21.644,00	\$ 104.280.792,00		\$ -		\$ -	
9	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	32.766,00	\$ 2.298	\$ 75.296.268	32.766,00	\$ 75.296.268,00		\$ -		\$ -	
10	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	5,00	\$ 1.306.545	\$ 6.532.725	5,00	\$ 6.532.725,00		\$ -		\$ -	
11	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	711,00	\$ 1.355.295	\$ 963.614.745	711,00	\$ 963.614.745,00		\$ -		\$ -	
Subtotal								\$ 1.149.724.530		\$ 1.149.724.530,00		\$ -		\$ -	
PAVIMENTO DE CONCRETO															
12	11603	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico	m3	61.250,00	\$ 934.000	\$ 57.207.500.000	14.294,39	\$ 13.350.960.260,00		\$ -	489,23	\$ 456.940.820	
Subtotal								\$ 57.207.500.000		\$ 13.350.960.260,00		\$ -		\$ 456.940.820	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
13	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	48.390,00	\$ 52.433	\$ 2.537.232.870	16.101,68	\$ 844.259.387,44		\$ -	1.617,59	\$ 84.815.096	
14	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	1.695,00	\$ 86.720	\$ 146.990.400	1.695,00	\$ 146.990.400,00		\$ -	188,68	\$ 16.362.330	
15	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3	3.886,00	\$ 26.160	\$ 101.657.760		\$ -		\$ -		\$ -	
16	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	7.406,00	\$ 39.054	\$ 289.233.924	1.000,00	\$ 39.054.000,00	786,06	\$ 30.698.787	852,46	\$ 33.291.973	
17	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	6.606,00	\$ 181.292	\$ 1.197.614.952	5.604,91	\$ 1.016.125.343,72		\$ -	297,74	\$ 53.977.880	
18	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG	m3	843,00	\$ 204.068	\$ 172.029.324	3.000,00	\$ 612.204.000,00		\$ -	514,85	\$ 105.064.410	
19	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con gravilla	m3	9.491,00	\$ 250.000	\$ 2.372.750.000	494,00	\$ 123.500.000,00		\$ -		\$ -	
20	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	127,00	\$ 3.121.132	\$ 396.383.764	1.571,34	\$ 4.904.359.556,88		\$ -		\$ -	
21	14101		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	231,00	\$ 4.939.881	\$ 1.141.112.511	100,00	\$ 493.988.100,00		\$ -		\$ -	
22	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	5,00	\$ 10.942.319	\$ 54.711.595	5,00	\$ 54.711.595,00		\$ -		\$ -	
23	11604	623 - 22		Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	m	11.421,00	\$ 483.389	\$ 5.520.785.769	14.500,00	\$ 7.009.140.500,00	415,00	\$ 200.606.435	8.490,00	\$ 4.103.972.610	
24	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes	m3	204,00	\$ 1.565.552	\$ 319.372.608	2.268,00	\$ 3.550.671.936,00		\$ -		\$ -	
25	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 Mpa	m3	1.736,00	\$ 1.256.503	\$ 2.181.289.208	1.736,00	\$ 2.181.289.208,00	33,72	\$ 42.366.266	340,70	\$ 428.094.706	
26	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	978,00	\$ 1.186.731	\$ 1.160.622.918	978,00	\$ 1.160.622.918,00		\$ -	139,31	\$ 165.323.496	
27	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero	m3	457,00	\$ 1.218.318	\$ 556.771.326	457,00	\$ 556.771.326,00		\$ -		\$ -	
28	11606	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje	m3	245,00	\$ 1.292.445	\$ 316.649.025	302,20	\$ 390.576.879,00		\$ -	119,73	\$ 154.744.440	
29	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	6,00	\$ 1.081.137	\$ 6.486.822	300,00	\$ 324.341.100,00		\$ -	6,00	\$ 6.486.822	
30	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación	m3	35,00	\$ 970.637	\$ 33.972.295	200,00	\$ 194.127.400,00		\$ -		\$ -	
31	11606		630.4P	Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado	m3	3.898,00	\$ 1.191.226	\$ 4.643.398.948	280,00	\$ 333.543.280,00		\$ -		\$ -	
32	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa	m3	846,00	\$ 799.357	\$ 676.256.022	150,00	\$ 119.903.550,00		\$ -	39,96	\$ 31.942.306	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPH-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

FECHA

05/10/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCÓ

ACTA No.

11

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 5.787.984.276,00

MES

sep-25

ACTA FINAL

CONTRATO No :

4303 DE 2024

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

ruta 6002-6003

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

4312 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

PLAZO INICIAL:

VEINTE (20) MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

VEINTE (20) MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CO:

21/11/2024

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/07/2026

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IV):

\$ 153.399.331.758,00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 153.399.331.758,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificadorio 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
33	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	493.274,00	\$ 8.025	\$ 3.958.523.850	399.197,49	\$ 3.203.559.857,25	11.550,77	\$ 92.694.929	65.757,03	\$ 527.700.169
34	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	102.710,00	\$ 2.185	\$ 224.421.350	319.200,77	\$ 697.453.682,45		\$ -		\$ -
35	14103	642 - 22		Apoyo elastomérico	u	12,00	\$ 1.185.774	\$ 14.229.288	70,00	\$ 83.004.180,00		\$ -		\$ -
36	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg	5.076,00	\$ 22.385	\$ 113.626.260	72.625,00	\$ 1.625.710.625,00		\$ -		\$ -
37	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	99,00	\$ 940.534	\$ 93.112.866	680,00	\$ 639.563.120,00		\$ -	44,00	\$ 41.383.496
38	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior	m	93,00	\$ 1.238.648	\$ 115.194.264	93,00	\$ 115.194.264,00		\$ -	10,00	\$ 12.386.480
39	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior	m	26,00	\$ 1.537.648	\$ 39.978.848	20,00	\$ 30.752.960,00		\$ -		\$ -
40	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m	8.901,00	\$ 30.311	\$ 269.798.211	8.901,00	\$ 269.798.211,00		\$ -	1.536,50	\$ 46.572.853
41	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm	m	451,00	\$ 330.611	\$ 149.105.561	20,00	\$ 6.612.220,00		\$ -		\$ -
42	11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	237,00	\$ 1.068.959	\$ 253.343.283	100,00	\$ 106.895.900,00		\$ -		\$ -
43	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno	m3	408,00	\$ 922.215	\$ 376.263.720	175,00	\$ 161.387.625,00		\$ -		\$ -
44	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente	m2	1.080,00	\$ 10.550	\$ 11.394.000	8.000,00	\$ 84.400.000,00		\$ -		\$ -
45	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	31.982,00	\$ 12.209	\$ 390.468.238	11.151,70	\$ 136.151.105,30		\$ -	4.771,06	\$ 58.249.871
46	11604		673.1P	Geodrén planar H = 0.5 m	m	15.236,00	\$ 46.855	\$ 713.882.780	2.470,00	\$ 115.731.850,00		\$ -	383,10	\$ 17.950.151
47	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m	171,00	\$ 144.750	\$ 24.752.250	200,00	\$ 28.950.000,00		\$ -		\$ -
48	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	18.234,00	\$ 272.971	\$ 4.977.353.214	20.000,00	\$ 5.459.420.000,00	1.020,00	\$ 278.430.420	10.560,00	\$ 2.882.573.760
49	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	23.670,00	\$ 30.019	\$ 710.549.730	12.500,00	\$ 375.237.500,00		\$ -		\$ -
50	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	59.036,00	\$ 36.779	\$ 2.171.285.044	2.000,00	\$ 73.558.000,00		\$ -		\$ -
Subtotal								\$ 38.432.604.798		\$ 37.269.561.580		\$ 644.796.837		\$ 8.770.892.849
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
51	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	10.497,00	\$ 3.004	\$ 31.532.988	563.257,00	\$ 1.692.024.028,00		\$ -	410.298,00	\$ 1.232.535.192
52	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	52,00	\$ 44.747	\$ 2.326.844	100,00	\$ 4.474.700,00		\$ -		\$ -
53	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	442,00	\$ 10.292	\$ 4.549.064	14.976,00	\$ 154.132.992,00		\$ -		\$ -
54	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	93,00	\$ 734.584	\$ 68.316.312	93,00	\$ 68.316.312,00		\$ -		\$ -
55	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	28,00	\$ 848.204	\$ 23.749.712	60,00	\$ 50.892.240,00		\$ -		\$ -
56	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV	m2	59,00	\$ 681.596	\$ 40.214.164	60,00	\$ 40.895.760,00		\$ -		\$ -
57	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	534,00	\$ 292.546	\$ 156.219.564	6.000,00	\$ 1.755.276.000,00		\$ -	316,00	\$ 92.444.536
58	11607	730 - 22		Sección final	u	16,00	\$ 79.481	\$ 1.271.696	200,00	\$ 15.896.200,00		\$ -		\$ -
59	11607	740 - 22		Captafaros	u	177,00	\$ 15.674	\$ 2.774.298	200,00	\$ 3.134.800,00		\$ -	49,00	\$ 768.026
Subtotal								\$ 330.954.642		\$ 3.785.043.032,00		\$ -		\$ 1.325.747.754
OBRAS VARIAS														
60	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	1.499,00	\$ 38.337	\$ 57.467.163	4.486,00	\$ 171.979.782,00		\$ -	40,00	\$ 1.533.480
61	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2	74,00	\$ 23.593	\$ 1.745.882	100,00	\$ 2.359.300,00		\$ -		\$ -
62	11606	810 - 22		Protección de taludes con tierra orgánica	m2	27.489,00	\$ 22.702	\$ 624.055.278	51.300,00	\$ 1.164.612.600,00		\$ -	4.065,00	\$ 92.283.630
63	11606	810 - 22		Protección de taludes con hidrosiembra controlada	m2	121.300,00	\$ 17.398	\$ 2.110.377.400	100,00	\$ 1.739.800,00		\$ -		\$ -

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1																									
												VERSIÓN		1																									
												PÁGINA		1																									
														FECHA		05/10/2025 (Día / Mes / Año)																							
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CHOCÓ		ACTA No.		11		VALOR BÁSICO ACTA: \$		5.787.984.276,00		MES		sep-25																	
														ACTA FINAL		☐																							
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)										PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																			
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																			
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)										FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024										INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL										VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 153.399.331.758,00										VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):									
																				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153.399.331.758,00																			
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificadorio 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA																											
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO																									
				GRAL. PART.		DESCRIPCIÓN ÍTEM		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																						
64		11606		811 - 22		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente		m2	27.489,00	\$ 56.834	\$ 1.562.309.826	27.489,00	\$ 1.562.309.826,00	3.343,30	\$ 190.013.112	11.994,30	\$ 681.684.046																						
65		11606		812.3P		Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC		m2	1.299,00	\$ 96.653	\$ 125.552.247	6.000,00	\$ 579.918.000,00		\$ -		\$ -																						
66		11606		840 - 22		Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m)		m	5.398,00	\$ 96.243	\$ 519.519.714	5.398,00	\$ 519.519.714,00		\$ -	549,00	\$ 52.837.407																						
Subtotal											\$ 5.001.027.510		\$ 4.002.439.022,00		\$ 190.013.112		\$ 828.338.563																						
TRANSPORTES																																							
67		11608		900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)		m3-km	5.500.000,00	\$ 1.700	\$ 9.350.000.000	1.102.320,60	\$ 1.873.945.020,00		\$ -	196.743,00	\$ 334.463.100																						
Subtotal											\$ 9.350.000.000		\$ 1.873.945.020,00		\$ -		\$ 334.463.100																						
ITEM NO PREVISTO											\$ -				\$ -																								
NP1		11601		201-22 201.7		Demolición de Estructuras		m3		\$ 252.373,00		235,00	\$ 59.307.655,00		\$ -	83,87	\$ 21.166.523																						
NP2		11601		201-22 201.15		Remoción de alcantarillas		m		\$ 118.645,00		200,00	\$ 23.729.000,00		\$ -		\$ -																						
NP3		11601		201-22 201.16		Remoción de Cerca de Alambre		m		\$ 3.981,00		16.000,00	\$ 63.696.000,00		\$ -		\$ -																						
NP4		11601		211-22 211.1		Remoción de Derrumbes		m3		\$ 22.185,00		210.000,00	\$ 4.658.850.000,00	36.305,41	\$ 805.435.521	171.170,75	\$ 3.797.423.089																						
NP5		11602		230-22 230.1		Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial		m3		\$ 149.567,00		3.980,00	\$ 595.276.660,00		\$ -	3.004,85	\$ 449.426.400																						
NP6		11602		310-22 310.1		Conformación de la calzada existente		m2		\$ 2.023,00		80.000,00	\$ 161.840.000,00		\$ -	55.868,20	\$ 113.021.369																						
NP7		11602		311-22 311.1		Afirmado		m3		\$ 159.988,00		6.400,00	\$ 1.023.923.200,00		\$ -	579,25	\$ 92.673.049																						
NP8		11603		600.2.3.1P		Excavación manual varias en material común en seco		m3		\$ 54.735,00		1.500,00	\$ 82.102.500,00		\$ -	458,55	\$ 25.098.735																						
NP9		11603		630-22 630.1.7		Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA		m3		\$ 537.696,00		378,00	\$ 203.249.088,00		\$ -	166,20	\$ 89.365.075																						
NP10		11604		673.1.1P		Geodren Triplanar H=2m		m2		\$ 104.464,00		68.597,16	\$ 7.165.933.722,24	1.622,76	\$ 169.520.001	12.947,61	\$ 1.352.559.132																						
NP11		11604		673-22 673.2		Material Granular Drenante		m3		\$ 114.058,00		4.200,00	\$ 479.043.600,00		\$ -	869,89	\$ 99.217.913																						
NP12		11604		900-22 900.3.2		Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)		m3 - km		\$ 1.804,00		2.370.000,00	\$ 4.275.480.000,00	449.545,41	\$ 810.979.920	2.226.326,29	\$ 4.016.292.627																						
NP13		11604		900-22 900.1.2		Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia		m3 - E		\$ 1.443,00		424.804,00	\$ 612.992.172,00	28.317,00	\$ 40.861.431	322.419,46	\$ 465.251.281																						
NP14		11608		200.1.1P.		Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposición final)		u		\$ 284.383,00		200,00	\$ 56.876.600,00		\$ -	44,00	\$ 12.512.852																						
NP15		11608		200.1.2P.		Tala de arbol H > ó = 12 m (incluye desenraice, retiro y disposición final)		u		\$ 549.686,00		200,00	\$ 109.937.200,00		\$ -	88,00	\$ 48.372.368																						
NP16		11601		500.1.1 P		Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 3 días		m3		\$ 1.313.657,00		4.000,00	\$ 5.254.628.000,00		\$ -	391,65	\$ 514.493.765																						
NP17		11601		500.1.2 P		Pavimento de concreto hidráulico Acelerado a 7 días		m3		\$ 1.231.948,00		4.000,00	\$ 4.927.792.000,00	50,98	\$ 62.804.709	2.754,40	\$ 3.393.277.572																						
NP18		11606		685.1P		Bolsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del sitio		U		\$ 22.328,00		2.500,00	\$ 55.820.000,00		\$ -		\$ -																						
NP19		11604		633-22 633,1		Tubería para filtro 15 o 6"		m		\$ 45.493,00		4.000,00	\$ 181.972.000,00		\$ -		\$ -																						
NP20		11607		700.1P		Linea de demarcacion con imprimante para pintura		m		\$ 2.492,00		160.000,00	\$ 398.720.000,00		\$ -		\$ -																						

[Handwritten signature]

FECHA

05/10/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCÓ

ACTA No.

11

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 5.787.984.276,00

MES

sep-25

ACTA FINAL

☐

CONTRATO No :
4303 DE 2024
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:
VEINTE (20) MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:
VEINTE (20) MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

FECHA DE INICIO DEL CO:
21/11/2024
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
31/07/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA:
CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

RUTA 6002-6003

FECHA DE SUSPENSIÓN:
N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:
N/A
(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:
4312 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 153.399.331.758,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153.399.331.758,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificadorio 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP21	11604	671-22	671.1.1	Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas	m3		\$ 1.103.903,00		1.800,00	\$ 1.987.025.400,00		\$ -		\$ -
NP22	11606		630.1P	Suministro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa autocompactante (Incluye conformacion y alistado del piso)	m3		\$ 1.440.005,00		2.847,00	\$ 4.099.694.235,00	762,00	\$ 1.097.283.810	912,00	\$ 1.313.284.560
NP23	11606		685.2P	Instalación y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil	m3		\$ 457.271,00		4.400,00	\$ 2.011.992.400,00		\$ -		\$ -
SUBTOTAL										\$ 38.489.881.432,24		\$ 2.986.885.392,00		\$ 15.803.436.310
ajuste al peso										\$ 1.204,58				
										\$ 116.376.148.907		\$ 5.137.984.276,00		\$ 34.633.337.308
* VALOR IVA (OBRA) (E) * TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A) * PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B) * PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © * PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) * VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D * REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL * IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL * TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H * PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K) * GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)										\$ 850.441.088		\$ 37.546.808,17		\$ 253.089.772,63
										\$ 117.226.589.995		\$ 117.226.589.995		\$ 34.886.427.080,63
										\$ 3.124.483.553		\$ 3.124.483.553		
										\$ 11.635.999.121		\$ 11.635.999.121		\$ 989.578.093,96
										\$ 500.000.000		\$ 500.000.000		\$ -
										\$ 132.487.072.669		\$ 132.487.072.669		\$ 35.876.005.174,59
										\$ 5.042.016.807		\$ 5.042.016.807		\$ 1.649.968.067,00
										\$ 957.983.193		\$ 957.983.193		\$ 313.493.932,73
										\$ 6.000.000.000		\$ 6.000.000.000		\$ 1.963.461.999,73
										\$ 2.000.000.000		\$ 2.000.000.000		\$ -
										\$ 12.912.259.089		\$ 12.912.259.089		\$ -
										\$ 153.399.331.758		\$ 153.399.331.758		\$ 37.839.467.174,32

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30%

Utilidad 5%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 21.000.000.000,00	18,04%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 1.141.146.307,70	22,21%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 2.845.218.797,96	
Valor Saldo por Amortizar	\$ 18.154.781.202,04	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.			
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*OBRA	\$ 5.137.984.276,00	\$ 37.546.808,17	\$ 5.175.531.084,17
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
PROVISIÓN PARA AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS	\$ -	\$ -	\$ -
*GESTIÓN PREDIAL	\$ -	\$ -	\$ -
*GESTIÓN AMBIENTAL	\$ -	\$ -	\$ -
*ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA	\$ 650.000.000,00	\$ 123.500.000,00	\$ 773.500.000,00
*IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
*COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES		\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 5.787.984.276,00	\$ 161.046.808,17	\$ 5.949.031.084,17

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)		
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 1.316.288.935	\$ 6.001.749.703
SB	\$ -	\$ 1.111.768.209
B	\$ -	\$ -
P	\$ -	
PC	\$ -	\$ 456.940.820
EYD	\$ 644.796.837	\$ 8.770.892.849
SYS	\$ -	\$ 1.325.747.754
OV	\$ 190.013.112	\$ 828.338.563
T	\$ -	\$ 334.463.100
NP	\$ 2.986.885.392	\$ 15.803.436.310
TOTAL	\$ 5.137.984.276	\$ 34.633.337.308

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV		
* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.		
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	\$ 2.184.529.165,00	\$ -
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	\$ -	\$ -
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	\$ -	\$ -
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	\$ 1.666.158.189,00	\$ -
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	\$ -	\$ -
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	\$ 1.287.296.922,00	\$ -
Vías interurbanas Señalización y control de transito 11607	\$ -	\$ -
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608	\$ -	\$ -
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	\$ -	\$ -
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	\$ -	\$ -
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	\$ -	\$ -
Vías urbanas Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público 11704	\$ -	\$ -



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1							
												VERSIÓN	1						
												PÁGINA	1						
												FECHA	05/10/2025 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CHOCÓ		ACTA No. 11		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 5.787.984.276,00		MES sep-25					
												ACTA FINAL ☐							
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.								FECHA DE INICIO DEL COI: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) RUTA 6002-6003								FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024								INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				VALOR INICIAL (incluido IV): \$ 153.399.331.758,00				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):			
												(Según contrato principal)				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153.399.331.758,00			
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS_Modificadorio 3 (31 de Julio 2025)		OBRA EJECUTADA					
				GRAL. PART.		DESCRIPCIÓN ÍTEM				UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
																CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
						VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 5.787.984.276										Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705		\$ -	\$ -
						VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 4.646.837.968										Vías urbanas Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra 11706		\$ -	\$ -
																Vías urbanas Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal 11707		\$ -	\$ -
																Vías urbanas Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal 11708		\$ -	\$ -
																Vías urbanas Estabilización de terreno 11709		\$ -	\$ -
																Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710		\$ -	\$ -
																Transporte elevado Preliminares 14101		\$ -	\$ -
																Transporte elevado Excavación y cimentación 14102		\$ -	\$ -
																Transporte elevado Rellenos 14103		\$ -	\$ -
																Transporte elevado Subestructura 14104		\$ -	\$ -
																Transporte elevado Superestructura 14105		\$ -	\$ -
																TOTAL ICOCIV		\$ 5.137.984.276,00	\$ -
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:						\$ 4.807.884.776,47		VALOR EN LETRAS:		CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS									
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																			
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																			
OBSERVACIONES																			
NOTAS:																			
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.																			
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.																			
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.																			
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).																			
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.																			
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.																			
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.																			
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																			
Para constancia de lo anterior firman																			
Firma:																			
Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT																			
Firma:																			
Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC																			
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																			

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto

25

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario141141409560

(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9018870850

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

11

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

Medellín

41. Dirección principal

CR 38 # 26 - 41 oficina 833

42. Correo electrónico

explanan@explanan.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

57604440012

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4210

47. Fecha inicio actividad

20241101

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

12

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

7144855

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

1234567891011121314151617181920

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

123

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 11 - 07 / 09 : 41: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

985. Cargo

Representante Legal Certificado


Fecha generación documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141141409560		
 (415)7707212489984(8020) 000014114140956 0					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 8 7 0 8 5 0		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	
				14. Buzón electrónico 1 1	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica 3		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 4					
72. Número					
73. Fecha 2 0 2 4 0 9 1 7					
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro 9 8					
76. Fecha de registro					
77. No. Matrícula mercantil					
78. Departamento 0 5					
79. Ciudad/Municipio 0 0 1					
Vigencia					
80. Desde 2 0 2 4 0 9 1 7					
81. Hasta 2 0 2 7 0 7 3 1					
				82. Nacional 1 0 0 %	
				83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
				85. Extranjero 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1				-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141141409560



(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico


9 0 1 8 8 7 0 8 5 0

Impuestos de Medellín

1 1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 9 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DAVID
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 9 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 3 7 5 9 9 1 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ARCILA	106. Primer nombre MATEO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		

		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141141409560			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114140956 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 8 7 0 8 5 0		0		Impuestos de Medellín		1 1	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		8 9 0 9 1 0 5 9 1		5 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social EXPLANAN S.A.S						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				9 0 2 0 2 4 0 9 1 7			
2	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		9 0 1 7 0 4 7 7 5		1 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				1 0 2 0 2 4 0 9 1 7			
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto

25

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario141141409560

(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9018870850

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

11

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

Medellín

41. Dirección principal

CR 38 # 26 - 41 oficina 833

42. Correo electrónico

explanan@explanan.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

57604440012

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4210

47. Fecha inicio actividad

20241101

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

12

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

7144855

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

1234567891011121314151617181920

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

123

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 11 - 07 / 09 : 41: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

985. Cargo

Representante Legal Certificado


Fecha generación documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141141409560		
 (415)7707212489984(8020) 000014114140956 0					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 8 7 0 8 5 0		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	
				14. Buzón electrónico 1 1	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica 3		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 4					
72. Número					
73. Fecha 2 0 2 4 0 9 1 7					
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro 9 8					
76. Fecha de registro					
77. No. Matricula mercantil					
78. Departamento 0 5					
79. Ciudad/Municipio 0 0 1					
Vigencia					
80. Desde 2 0 2 4 0 9 1 7					
81. Hasta 2 0 2 7 0 7 3 1					
				82. Nacional 1 0 0 %	
				83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
				85. Extranjero 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1				-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141141409560



(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico


9 0 1 8 8 7 0 8 5 0

Impuestos de Medellín

1 1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 9 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DAVID
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 9 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 3 7 5 9 9 1 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ARCILA	106. Primer nombre MATEO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		

		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141141409560			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114140956 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 8 7 0 8 5 0		0		Impuestos de Medellín		1 1	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		8 9 0 9 1 0 5 9 1		5 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social EXPLANAN S.A.S						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				9 0 2 0 2 4 0 9 1 7			
2	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		9 0 1 7 0 4 7 7 5		1 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				1 0 2 0 2 4 0 9 1 7			
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

A	B	C	D	E	F	G	H	BA	BL	BM	BN	BO
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

0	530205	53290	53290_46	523	Plazas de mercado y fe	0.45	101.09	102.07	130.13		
1											
2											
3											
4	A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo										
5	Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra- capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2024	2025	
6									Septiembre	Agosto	Septiembre
7									Índice	Índice	Índice
8	530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11508	08	Plataforma y acabados tipo 2	8.53	132.81	138.80	138.65
9	530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11509	09	Acabados tipo 3	0.42	137.30	145.25	144.87
10	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	126.36	133.64	133.59
11	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	129.28	135.36	135.51
12	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concret	38.51	140.08	148.80	148.44
13	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenaj	7.09	126.37	130.82	130.37
14	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	135.27	143.10	142.81
15	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigaciór	4.07	129.13	134.71	REC
16	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de transi	4.40	142.08	147.38	146.41
17	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	4.22	124.85	132.81	134.46
18	530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades preliminares y expl	13.81	125.77	132.27	132.79
19	530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de tierras, afirmad	12.21	126.34	133.06	133.50
20	530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pavimento, pavir	38.21	129.43	135.69	135.99
21	530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotécnicas, mitigación	21.15	132.79	140.76	140.78
22	530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidráulicas y drenaj	10.83	130.11	137.41	137.03
23	530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas de servicios, red	0.92	129.11	134.45	134.40
24	530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosanitarias, urbanas	1.25	130.78	137.71	137.36
25	530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas de servicios, señ	0.81	134.25	139.94	139.74
26	530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización de terreno	0.53	137.20	142.95	142.22
27	530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vertical u horizont	0.28	135.83	141.87	141.73



Outlook

**RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL (OCTUBRE 2025) Y AJUSTES 11 DEFINITIVO (\$0) SEPTIEMBRE CONTRATO 4303-2024
CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:211616117.14**

Desde Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Fecha Jue 27/11/2025 5:15 PM

Para CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL <intcordilleraoccidental@gmail.com>; Director C <director@cordilleraoccidental.com>; ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO <hernandoprieto27@yahoo.es>; Diego Aristizábal Zuluaga <proyectos@explanan.com>; Sergio Rivera Betancur <sergio.rivera@explanan.com>; Camilo Zuluaga <camilozb@gmail.com>; Explanan S.A.S <explanan@explanan.com>

CC Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>; Yezid Alberto Chamat Luna <yحات@invias.gov.co>; Juan Carlos Diaz Gonzalez <jcdiaz@invias.gov.co>

 19 archivos adjuntos (11 MB)

01. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 Acta ajuste prov Oct.pdf; 02. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 Hoja Ruta ajustes prov 12 Oct 132.pdf; 03. AFINCO-FR-12 Acta de ajuste prov Oct.pdf; 04. AFINCO-FR-13 Acta de ajustes prov Oct.pdf; 05. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Ajustes prov Oct.pdf; 06. MEPI-MN1-IN-6-FR-2.pdf; 07. MEPI-MN1-IN-4-FR-1_Acta de Obra 12.pdf; 08. RUT CONEXION MEDELLIN - QUIBDO.pdf; 09. ANEXO ICOCIV SEPTIEMBRE Y SEPTIEMBRE 2025 CAPITULOS.pdf; FE 40.pdf; 01. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 Acta ajuste Def Sep.pdf; 02. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 Hoja Ruta ajustes Def Sep.pdf; 03. AFINCO-FR-12 Acta de ajuste Def Sep.pdf; 04. AFINCO-FR-13 Acta de ajustes Def Sep.pdf; 05. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Ajustes Def Sep.pdf; 06. MEPI-MN1-IN-6-FR-2.pdf; 07. MEPI-MN1-IN-4-FR-1_Acta obra 11.pdf; 08. RUT CONEXION MEDELLIN - QUIBDO.pdf; 09. ANEXO ICOCIV SEPTIEMBRE Y SEPTIEMBRE 2025 CAPITULOS.pdf;

Señores

**CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN – QUIBDO (Cto de Obra No. 4303/24)
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL (Cto de Interventoría No. 4312/24)**

Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su información y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. **13953** el **26/11/2025** del Acta del asunto.

Atentamente;



De: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Enviado: Jueves, 27 de Noviembre de 2025 12:34 PM

Para: Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>

CC: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL (OCTUBRE 2025) Y AJUSTES 11 DEFINITIVO (\$0) SEPTIEMBRE CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:211616117.14

PSI

Cordialmente,



Luis Jaime Díaz Pérez

Subdirector (E)

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales

ldiazp@invias.gov.co

Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia

www.invias.gov.co

De: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Enviado: miércoles, 26 de noviembre de 2025 16:49

Para: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL (OCTUBRE 2025) Y AJUSTES 11 DEFINITIVO (\$0) SEPTIEMBRE CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:211616117.14

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atención y Relacionamiento con el Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, radicada con número **13953 el 26/11/2025** y se remitió a cuentas por pagar, para continuar con el trámite.

Se informa que el horario para la radicación de cuentas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en consecuencia, los mensajes recibidos por fuera de este horario se entenderán recibidos en el siguiente día hábil.

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamiento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 **Ext:**

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C.

www.invias.gov.co



De: Luis Jaime Díaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Enviado: martes, 25 de noviembre de 2025 12:30 p. m.

Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Cc: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL (OCTUBRE 2025) Y AJUSTES 11 DEFINITIVO (\$0) SEPTIEMBRE CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:211616117.14

Cordial saludo,

En el presente correo adjunto documentos del ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL (OCTUBRE 2025) Y AJUSTES 11 DEFINITIVO (\$0) SEPTIEMBRE CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:211616117.14 PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO

Cordialmente,



Luis Jaime Díaz Pérez
Subdirector (E)
Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
ldiazp@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>

Enviado: martes, 25 de noviembre de 2025 11:41

Para: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Cc: Wilmar Joaquin Zambrano Pulecio <wzambrano@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>

Asunto: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL (OCTUBRE 2025) Y AJUSTES 11 DEFINITIVO (\$0) SEPTIEMBRE CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:211616117.14

Cordial saludo,

remito los documentos SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL (OCTUBRE 2025) Y AJUSTES 11 DEFINITIVO (\$0) SEPTIEMBRE CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:211616117.14 para que sea radicado.

Gracias.



Ingeniero Civil

Juan Jose Sanchez Cardona

Subdirección modernización de carreteras Nacionales

Gerencia Zona Sur Occidente

jjsanchez@invias.gov.co

Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia

www.invias.gov.co

De: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Enviado: martes, 18 de noviembre de 2025 10:00 p. m.

Para: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Cc: Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>; Estefania Garay Perez <egaray@invias.gov.co>

Asunto: RE: PARA FIRMA: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL (OCTUBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:211616117.14

Buenas tardes

Firmado para lo pertinente

Cordialmente,



Luis Jaime Díaz Pérez
Subdirector (E)
Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
ldiazp@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>

Enviado: miércoles, 12 de noviembre de 2025 12:04

Para: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Cc: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Edilson Manuel Gomez Triana <emgomez@invias.gov.co>; Luisa Fernanda Gonzalez Cuervo <lgonzalezc@invias.gov.co>; Estefania Garay Perez <egaray@invias.gov.co>

Asunto: PARA FIRMA: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL (OCTUBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:211616117.14

Cordial saludo ing luis jaime,

remito el acta de ajustes 12 provisional contrato 4303-2024 medellin - quibdo para tramite de firma.

Asunto: PARA FIRMA: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 12 PROVISIONAL (OCTUBRE 2025). CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-0 RP84525 RECURSO:20 VALOR:211616117.14

Gracias.



Ingeniero Civil

Juan Jose Sanchez Cardona

Subdirección modernización de carreteras Nacionales

Gerencia Zona Sur Occidente

jjsanchez@invias.gov.co

Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia

www.invias.gov.co

De: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Enviado: miércoles, 12 de noviembre de 2025 9:31 a. m.

Para: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>

Asunto: RV: ENVIO ACTA AJUSTE 12 CONTRATO 4303-2024

Juan buenos días. remito para su apoyo en la revisión.

Att.

VAGP

De: Yezid Alberto Chamat Luna <[ychamat@invias.gov.co](mailto:yحاتat@invias.gov.co)>

Enviado: miércoles, 12 de noviembre de 2025 8:44

Para: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Asunto: ENVIO ACTA AJUSTE 12 CONTRATO 4303-2024

Buenos días.

Para tramite respectivo envío acta de ajuste 12 correspondiente al contrato de obra 4303-2024

Atentamente;



Director
YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Dirección Territorial Chocó
ychamat@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos. **Exención de responsabilidad:** El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co
