

INTERNEXA



INFORME DE GESTIÓN

Período comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2025

Versión No. 4

PROYECTO CONECTIVIDAD PARA CAMBIAR VIDAS.

ACUERDO ESPECÍFICO No. 4 DE 2024 (CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 1465 - 2024)

Objeto. En desarrollo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023, constituye el objeto de este Acuerdo Específico No. 4 aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros entre el FONDO ÚNICO DE TIC e INTERNEXA S.A. para la financiación y desarrollo del proyecto para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de soluciones de infraestructura y servicios de telecomunicaciones sostenibles en el largo plazo que permitan, a través de los ISP Seleccionados, la conectividad de banda ancha, para los hogares estratos 1 y 2 y Comunidades Organizadas de Conectividad ubicadas en los municipios que se listan en el Anexo 1, con el objeto de mejorar la conectividad digital, la prestación de los servicios de conectividad y el acceso universal.

Control del Documento

Información del Documento

Información del Documento	
Dueño del Documento	<i>Cristian Blanco</i>
Última Fecha Actualizado	<i>05-09-2024</i>
Ubicación y Nombre del Archivo	
Palabras Claves	<i>Informe de Gestión</i>
Circulación	<i>InterNexa, Fiducoldex, MINTIC</i>

Historia del Documento

Versión	Fecha de Elaboración del formato o del Cambio	Resumen General del Contenido del Documento o Descripción General de Cambio al mismo
<i>1.0</i>	<i>20/12/2023</i>	<i>Creación del esquema del informe</i>
<i>1.5</i>	<i>22/02/2024</i>	<i>Actualización del esquema del informe</i>

Revisión o Aprobación del Documento

Nombre	Rol
Cristian Blanco	Ingeniero de Experiencia INTERNEXA
John Chía R	Gerente Proyecto PNC
Diana Jaramillo	Directora PNC




Tabla de contenido

Control del Documento	2
Información del Documento	2
Historia del Documento	2
Revisión o Aprobación del Documento	2
1 INTRODUCCIÓN	5
2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7
2.1 ACTAS DE REUNIÓN	7
2.2 INFORMES MENSUALES	8
2.3 COMUNICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO	8
3 ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LOS HITOS DEL PROYECTO	8
NOTA: La Fase de Planeación se encuentra ejecutada al 100% ya que hizo parte de los entregables del Acuerdo Específico No. 3	9
3.1 AVANCES EN EL DESPLIEGUE	11
3.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	12
Lo anterior conforme a clausula vigésima del Acuerdo Especifico No. 4 suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e InterNexa S.A.	13
3.3 116912- P.A. CONECTIVIDAD PARA CAMBIAR VIDAS, NIT 830.054.060-5	14
3.4 ASPECTOS SOCIALES PARA REPORTAR	14
3.5 AVANCES ISP'S	14
3.6 AVANCES OPERACIÓN	14
3.7 AVANCES SOCIOAMBIENTAL	14
3.8 RIESGOS	14
4 ACTIVIDADES PLANEADAS	15
5 RECOMENDACIONES	15
6 CONCLUSIONES	15

Índice de Tablas

Tabla 1 Alcance del acuerdo específico No.4..... 6
Tabla 2 Actas de seguimiento a la ejecución (febrero)..... 7
Tabla 3 Actas comité operativo (febrero) 7
Tabla 4 Relación Actas pendientes..... 8
Tabla 5 Relación de informes mensuales..... 8
Tabla 6 Comunicaciones tramitadas durante el periodo (febrero)..... 8
Tabla 7 Entregables red troncal..... 9
Tabla 8 Avances despliegue..... 11
Tabla 9. Equipo de cuenta. 16


1 INTRODUCCIÓN

El Informe de Gestión Mensual contiene información relevante para evidenciar el cumplimiento del ACUERDO ESPECÍFICO No. 4 DE 2024 (CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1465 - 2024) suscrito entre el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES E INTERNEXA S.A y recopila el avance del proyecto durante el mes de febrero de 2025.

De conformidad con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 4; el alcance del Acuerdo Especifico No. 4 abarca: 4 departamentos, 32 municipios, con el fin de conectar alrededor de 62.309 hogares de estrato 1 y 2, involucrando componentes de expansión de red troncal, y la disponibilidad hacia los ISP de conexión y acceso a Internet.

A continuación, se relacionan los departamentos y cantidad de hogares a beneficiar:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TOTAL DE HOGARES 1 Y 2 A CONECTAREN LA CABECERA MUNICIPAL PROYECTO CONECTIVIDAD PARA CAMBIAR VIDAS	HOGARES A CONECTAR QUE NO REQUIEREN RED DE ACCESO (PROYECTOS TIPO 1)	HOGARES A PASAR Y CONECTAR EN MUNICIPIOS CON RED FTTH YA DESPLEGADA SEGÚN COLOMBIATIC PROYECTOS TIPO 2 A	HOGARES A PASAR Y CONECTAR EN MUNICIPIOS DONDE SÓLO SE REPORTA ACCESOS XDSL (2) E INALÁMBRICOS EN SU MAYORÍA SATELITALES PROYECTOS TIPO 2 B
Antioquia	Vigía del Fuerte	1.099			1.099
Cauca	Timbiquí	1.888	1.170	718	
Chocó	Acandí	1.732			1.732
Chocó	Alto Baudó	861			861
Chocó	Atrato	838			838
Chocó	Bagadó	594	368	226	
Chocó	Bahía Solano	1.601			1.601
Chocó	Bajo Baudó	1.772			1.772



SEGÚN META DE 85% DE HOGARES ESTRATO 1 Y 2 CONECTADOS EN CABECERA EN 2026					
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TOTAL DE HOGARES 1 Y 2 A CONECTAREN LA CABECERA MUNICIPAL PROYECTO CONECTIVIDAD PARA CAMBIAR VIDAS	HOGARES A CONECTAR QUE NO REQUIEREN RED DE ACCESO (PROYECTO TIPO 1)	HOGARES A PASAR Y CONECTAR EN MUNICIPIOS CON RED FTTH YA DESPLEGADA SEGÚN COLOMBIATIC PROYECTOS TIPO 2 A	HOGARES A PASAR Y CONECTAR EN MUNICIPIOS DONDE SÓLO SE REPORTA ACCESOS XDSL (2) E INALÁMBRICOS EN SU MAYORÍA SATELITALES PROYECTOS TIPO 2 B
Chocó	Bojayá	237			237
Chocó	Carmen del Darién	559			559
Chocó	Cértogui	947			947
Chocó	Condoto	2.682	1.662	1.020	
Chocó	El Cantón del San Pablo	825			825
Chocó	El Litoral del San Juan	386			386
Chocó	Istmina	5.109	3.167	1.942	
Chocó	Juradó	640			640
Chocó	Lloró	909			909
Chocó	Medio Atrato	224			224
Chocó	Medio Baudó	571			571
Chocó	Medio San Juan	713			713
Chocó	Nóvita	1.008			1.008
Chocó	Nuquí	283			283
Chocó	Río Iró	414			414
Chocó	Río Quito	423			423
Chocó	Riosucio	4.268			4.268
Chocó	San José Del Palmar	336			336
Chocó	Sipí	195			195
Chocó	Tadó	3.092			3.092
Chocó	Unguía	1.092			1.092
Chocó	Unión Panamericana	828	513	315	
Nariño	Francisco Pizarro	1.713			1.713
Nariño	San Andrés De Tumaco	24.470	15.171	9.299	
TOTALES		62.309	22.051	13.520	26.738

Tabla 1 Alcance del acuerdo específico No.4

NOTA IMPORTANTE: De acuerdo con el avance relacionado con el Específico 4, se informa que el 15 de noviembre de 2024, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) publicó el borrador de la convocatoria para los Proveedores de Servicios de Internet (ISP). Debido a que esta es una etapa preliminar del proceso, no se han registrado avances adicionales en esta fase.

2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2.1 ACTAS DE REUNIÓN

A continuación, se relacionan las actas de las reuniones realizadas durante el mes de febrero de 2025, las cuales se encuentran en proceso de revisión por las partes.

Actas de seguimiento a la ejecución realizadas en Febrero:

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN			
016	Seguimiento Ejecución - Acuerdo Especifico No. 4A.	19/02/2025	En proceso revisión ITX
017	Socialización Memorias de Cálculo	20/02/2025	En proceso revisión ITX

Tabla 2 Actas de seguimiento a la ejecución (febrero)

Actas de comité operativo en Febrero:

COMITÉ OPERATIVO			
CO_AE4_008	Comités Operativos Convenio 790 Internexa (Presencial) Febrero.	27/02/2025	En proceso revisión ITX

Tabla 3 Actas comité operativo (febrero)

Así mismo, se relacionan las actas que se tienen en proceso de elaboración o firma y que corresponden a meses anteriores:

No. ACTA	OBJETO DE LA REUNIÓN	FECHA REUNIÓN	ESTADO ACTA
COMITÉ OPERATIVO			
CO_AE4_001	Comités Operativos Contrato 790 – 2023- Julio	25/07/2024	Completada - Firmada
CO_AE4_002	Comités Operativos Convenio 790 Internexa (Presencial) Agosto.	28 /08/2024	Completada - Firmada
CO_AE4_003	Comités Operativos Convenio 790 Internexa (Presencial) Septiembre.	24/09/2024	Completada - Firmada
CO_AE4_004	Comités Operativos Convenio 790 Internexa (Presencial) Octubre.	24/10/2024	Completada - Firmada
CO_AE4_005	Comités Operativos Convenio 790 Internexa (Presencial)Noviembre.	27/11/2024	Completada - Firmada
CO_AE4_006	Comités Operativos Convenio 790 Internexa (Presencial) Diciembre.	27/12/2024	Completada - Firmada
CO_AE4_007	Comités Operativos Convenio 790 Internexa (Presencial) Enero.	31/01/2025	Completada - Firmada

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN			
002	Seguimiento Ejecución - Acuerdo Especifico No. 4A	15/08/2024	Pendiente de aprobación del Mintic 26/12/2024 ya que se solicitaron ajustes al acta 18/12/2024.
015	Seguimiento Ejecución - Acuerdo Especifico No. 4A	16/01/2025	Pendiente de Firmas por MinTic - enviado por Docusign 4/03/2025

Tabla 4 Relación Actas pendientes

2.2 INFORMES MENSUALES

A continuación, se presenta la relación de los informes mensuales que se aprobaron o enviaron a la supervisión en el mes de febrero de 2025:

No.	Mes de reporte	Radicado MINTIC	Observaciones supervisión	Estado conformidad
1	Enero	251013231 del 06/02/2025	Informe mensual – período del 1 al 31 de enero de 2025	Respuesta- 21/02/2025 252029616

Tabla 5 Relación de informes mensuales

2.3 COMUNICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO


CONSECUTIVO INTERNO	DESTINO	ASUNTO	RADICADO MINTIC	ESTADO MINTIC
CCVAE4-INTER-DIRINF-002-2025	Dirección Infraestructura MinTIC	Informe mensual – período del 1 al 31 de enero de 2025	251013231	Respuesta Mintic radicado N. 252029616
CCVAE4-INTER-DIRINF-003-2025	Dirección Infraestructura MinTIC	Remisión informes mensuales – Meses Nov, Dic 2024 y enero 2025	251021535	Sin Respuesta

Tabla 6 Comunicaciones tramitadas durante el periodo (febrero)

3 ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LOS HITOS DEL PROYECTO

De conformidad con lo establecido en el anexo técnico ENTREGABLES RED TRONCAL, se relacionan los avances que se tienen con corte al 28 de febrero 2025:

FASES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE ENTREGA	ESTADO
Planeación <i>Fase Finalizada</i>	Gestión Socioambiental	Plan de Gestión Socioambiental	Descripción de los trámites de permisos identificados previos a la ejecución del proyecto	Única Vez	La Gestión Sociambiental corresponde a la entrega de los diagnósticos para aquellos municipios que requerían despliegue de Fibra Óptica, teniendo en cuenta sus dinámicas socioambientales. Este documento fue compartido con la entidad en el acuerdo específico número 3.
	Ingeniería de Detalle y Topología	Ingeniería de detalle y topología condensada	Topologías/diagramas/ tablas de diseño de red	Única Vez	No se han reportado modificaciones con respecto a los documentos entregados.
	Presupuesto	Modelo financiero	Incluye el presupuesto, flujo de pagos y flujo de caja de proyecto, adicionalmente en la hoja "detalle de municipios" se encuentra el BOM considerado por cada municipio.	Única Vez	No se han reportado modificaciones con respecto a los documentos entregados.
	Cronograma	Cronograma para el despliegue en Project	Cronograma detallado para el despliegue en los municipios	Única Vez	No se han reportado modificaciones con respecto a los documentos entregados.




FASES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE ENTREGA	ESTADO
	Implementación	Plan de Implementación	El Plan de Implementación constituye la herramienta que permite el seguimiento de la implementación del proyecto, incluye la distribución del CAPEX y OPEX de implementación por grupos de entregables del proyecto, el cronograma del proyecto y los correspondientes hitos de seguimiento de la instalación y puesta en servicio y operación de la red.	Única vez	No se han reportado modificaciones con respecto a los documentos entregados.
	Modelo Operativo		Descripción del Modelo Operativo y atención	Única vez	No se han reportado modificaciones con respecto a los documentos entregados.

Tabla 7 Entregables red troncal

NOTA: La Fase de Planeación se encuentra ejecutada al 100% ya que hizo parte de los entregables del Acuerdo Específico No. 3

FASES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE ENTREGA	ESTADO
Ejecución	Gestión socioambiental	Informe con la trazabilidad de la gestión socioambiental ejecutada	Ver Anexo Informe Gestión Socioambiental	Al final del despliegue de cada municipio	
	Adición del Acuerdo Específico No. 4 al contrato de fiducia	Trámite para la adición del Acuerdo Específico No. 4 al contrato de Fiducia	Documento con la confirmación de la respectiva adición	Única Vez	No se han reportado modificaciones con respecto a los documentos entregados.
	Gestión del Acuerdo Específico No.4	Informe Gestión acuerdo	Informe a la ejecución presupuestal, actualización de ejecución de presupuesto y verificación de ejecución vs lo planeado Ver Anexo Informe Gestión Acuerdo	Mensual	
	Flujo de pagos y flujo de caja del proyecto.	Informe de flujo de pagos y flujo de caja del Proyecto	Informe de flujo de pagos y flujo de caja del proyecto	Mensual	No se han reportado modificaciones con respecto a los documentos entregados.



FASES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE ENTREGA	ESTADO
	Desviaciones, estructuración plan de acción con el fin de cerrar brechas entre lo planeado y lo real ejecutado.	Información	Identificación de desviaciones y estructuración plan de acción con el fin de cerrar brechas entre lo planeado y lo real ejecutado.	Según Proceda	No se han reportado modificaciones con respecto a los documentos entregados.
	Cronograma de ejecución del proyecto	Anexo informe Gestión Acuerdo	Informe avance del cronograma de ejecución del proyecto, actualización del cronograma de ejecución del proyecto y verificación de ejecución vs lo planeado	Mensual	No se han reportado modificaciones con respecto a los documentos entregados.
	Entrega de Nodo	Anexo Formato infraestructura	Informe entrega de Nodo, aplicable a la entrega de cada uno de los nodos por municipio	A la habilitación del nodo	No se han reportado modificaciones con respecto a los documentos entregados.
	Entrega de servicio en el Municipio	Anexo Formato infraestructura	Informe entrega de servicio en el Municipio, aplicable a la entrega de cada municipio	A la habilitación del Municipio	
	Prueba de Conmutación	Anexo Formato Conmutación de Red	Informe Prueba de Conmutación, aplicable a la entrega de municipios anillados	A la habilitación de ambos brazos del municipio	
	Instalación y entrega a la operación	Informe final de Instalación y entrega a la operación	Informe final de Instalación y entrega a la operación, levantamiento de información para la entrega de documentación de estado final del proyecto, incluye cambios presentados durante la ejecución frente a lo planeado y su valoración, la documentación anexa al informe final de instalación incluye: Formato de Infraestructura por sitio, Planos de red, Pruebas de Conmutación en Formato Conmutación de Red por sitio, Pruebas RFC 2544 por sitio. Para aquellos municipios que incluyen expansión de red se entrega: protocolo pruebas SAT, que incluyen pruebas Bidireccionales de OTDR, Reflectancia y Pérdidas de Conectores, así como pruebas de BERT y RFC en equipos de red transporte y en la fibra. Para todas las pruebas deberá entregar el Certificado de calibración de equipos utilizados.	A la entrega en operación del municipio	

FASES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE ENTREGA
Operación	Informe articulación ISP	Informe sobre la conexión e inicio de prestación de servicio a ISP's Anexo Informe Gestión Acuerdo	Informe sobre la conexión e inicio de prestación de servicio a ISP's	Mensual
	Informe de Operación	Informe de Operación y Mantenimiento Anexo Informe Gestión Acuerdo	Consolidación de información de la operación mensual del servicio	Mensual
	Informe de Gestión de Eventos, Disponibilidad y cumplimiento de Niveles de Servicio	Informe de cumplimiento de acuerdo de Niveles de Servicio por municipio, por ISP, ocurrencia y resolución de eventos Anexo Informe Gestión Acuerdo	Elaboración informe mensual de calidad del servicio, ocurrencia y resolución de eventos, cumplimiento de Niveles de Servicio por municipio.	Mensual
	Cronograma de Mantenimientos Preventivos	Cronograma de los mantenimientos preventivos sobre la red asociada a los servicios del Acuerdo Anexo Informe Gestión Acuerdo.	Cronograma de los mantenimientos preventivos	Mensual
	Informe de Ejecución Presupuestal	Informe de ejecución presupuestal, flujo de pagos y flujo de caja del proyecto	Actualización de la información de flujos de pagos y caja planeados Vs lo ejecutado	Mensual

Tabla 8 Avances despliegue

3.1 AVANCES EN EL DESPLIEGUE

De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, se presentan los avances que se tienen con corte al 28 de febrero de 2025 frente a la entrega del servicio por departamento:

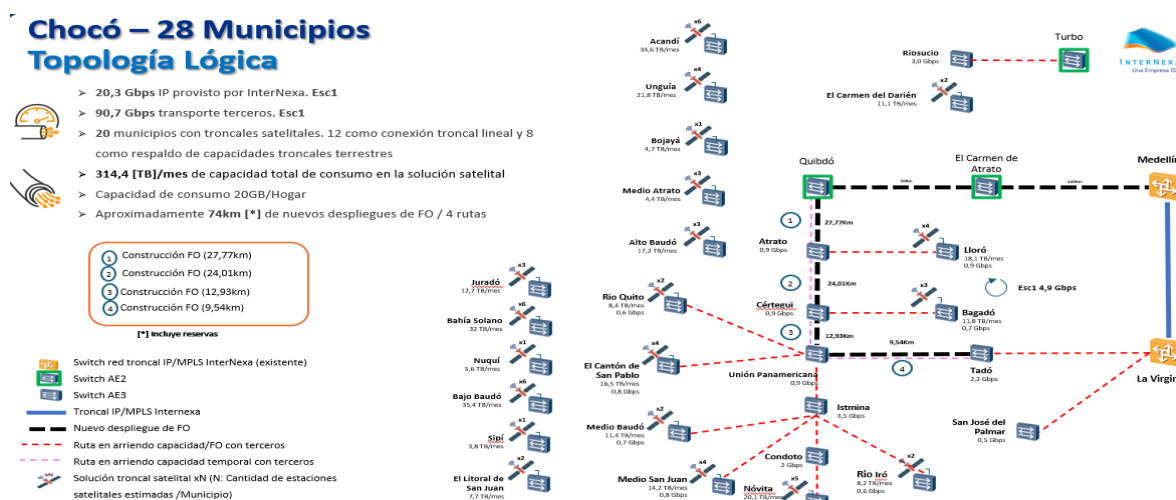


Diagrama topológico Choco.

Parámetro	Unidad	Enlace Quibdó - Tadó	Enlace Quibdó - Yuto	Enlace Yuto - Certegui	Enlace Certegui – Unión Panameri.	Enlace Unión Pana - Tadó
Longitud Óptica	Km	78,100	28,752	25,500	10,200	13,400

Longitudes Ópticas Expansión de Red Choco.

CAPEX

Tipo costo
[fijo/variable]

Cantidad total

Datos		-	32
Hogares Objetivo a Conectar Estrato 1 y 2 en Cabecera M	Unidad	-	62.309
Red Troncal		Fijo	
Construcción red Fibra óptica troncal [Km FO]		Fijo	
Total Km FO troncal a construir (+ reservas)	Cantidad	-	74,2
Fibra Optica / ADSS / 48 hilos / suministro + instalación	CAPEX / Km	Fijo	77,377

L

Longitudes según memorias de cálculo.

Departamento	Fecha estimada de entrega contractual	Fecha de entrega	% avance al 28 de febrero de 2025	Observaciones
Antioquia	25/08/2025	25/08/2025	0%	Vigía del Fuerte. No se presentan avances
Cauca	23/05/2025	23/05/2025	0%	Timbiquí. No se presentan avances
Choco	04/08/2025	04/08/2025	100%	Atrato. 28000 metros tendidos y acondicionados.
Choco	09/08/2025	09/08/2025	100%	Certegui. 25000 metros tendidos y acondicionados.
Choco	03/08/2025	03/08/2025	100%	Unión Panamericana, 10000 metros tendidos y acondicionados.
Choco	03/08/2025	03/08/2025	100%	Tadó, 13400 metros tendidos y acondicionados.
Nariño	08/05/2025	08/05/2025	0%	Francisco Pizarro. No se presentan avances.
Nariño	08/05/2025	08/05/2025	0%	San Andres de Tumaco. No se presentan avances.

3.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Frente a la ejecución presupuestal del Acuerdo, es importante señalar que si bien la aprobación de la facturación del 30% del valor de la expansión de red se obtuvo en comité del 24 de enero de 2025, sólo hasta el mes de febrero se reflejó el desembolso en Internexa. Por ende, la legalización de recursos se deberá adelantar en el mes de marzo de 2025.

A continuación, se relaciona la factura asociada a la compensación por expansión de red correspondiente al 30% del subtotal en los departamentos de: Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño:

FACTURA	APROBACION COMITE	COMITE ASESOR	VALOR APROBADO
FVE59854	24-01-2025	43	\$ 7.219.094.907


Lo anterior conforme a clausula vigésima del Acuerdo Especifico No. 4 suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e InterNexa S.A.

Toda la información referente a esta transacción se encuentra en el servidor del MinTic y se podrá consultar en el siguiente link dispuesto por la supervisión para ello.

https://mintic-my.sharepoint.com/personal/dinfraestructura_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdinfraestructura%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDirecci%C3%B3n%20de%20Infraestructura%2FFCCV%2FEJECUCION%2FAcuerdo%204%2FInformes%20de%20gesti%C3%B3n%2FLegalizaciones%20AE4&ga=1

En dicha carpeta se podrá consultar cada soporte descrito así:

- Soportes rendimientos
- 116912 - rendimientos AE4 - febrero (003)_encrypted_.pdf
- 116912 - documento custodia de la información.pdf
- 256157918 - Extracto cuenta AE4.pdf
- Acta CA No.43.pdf
- Comprobante de pago FVE59854.pdf
- FVE59854.pdf
- GEF-TIC-FM-020..pdf
- GMF PAGOS 28022025.xlsx
- Legalización Febrero 2025.xlsx
- Soporte de Pago.pdf

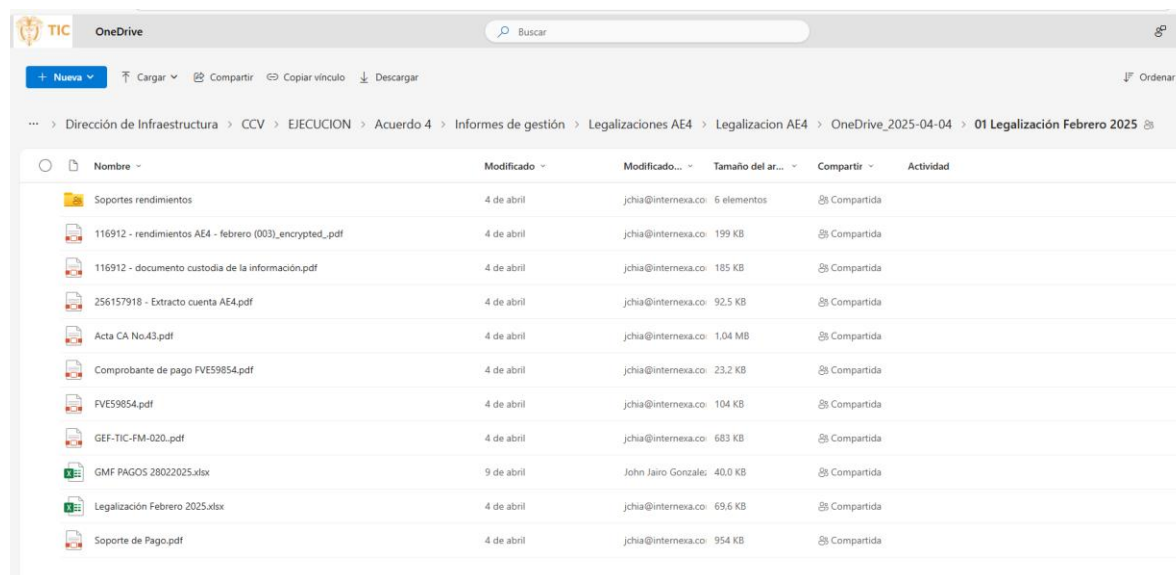

Nombre	Modificado	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
Soportes rendimientos	4 de abril	jchia@internexa.co	6 elementos	Compartida	
116912 - rendimientos AE4 - febrero (003)_encrypted_.pdf	4 de abril	jchia@internexa.co	199 KB	Compartida	
116912 - documento custodia de la información.pdf	4 de abril	jchia@internexa.co	185 KB	Compartida	
256157918 - Extracto cuenta AE4.pdf	4 de abril	jchia@internexa.co	92.5 KB	Compartida	
Acta CA No.43.pdf	4 de abril	jchia@internexa.co	1.04 MB	Compartida	
Comprobante de pago FVE59854.pdf	4 de abril	jchia@internexa.co	23.2 KB	Compartida	
FVE59854.pdf	4 de abril	jchia@internexa.co	104 KB	Compartida	
GEF-TIC-FM-020..pdf	4 de abril	jchia@internexa.co	683 KB	Compartida	
GMF PAGOS 28022025.xlsx	9 de abril	John Jairo Gonzalez	40.0 KB	Compartida	
Legalización Febrero 2025.xlsx	4 de abril	jchia@internexa.co	69.6 KB	Compartida	
Soporte de Pago.pdf	4 de abril	jchia@internexa.co	954 KB	Compartida	

3.3 116912- P.A. CONECTIVIDAD PARA CAMBIAR VIDAS, NIT 830.054.060-5

3.4 ASPECTOS SOCIALES PARA REPORTAR

En el mes de febrero de 2025 no se presentaron actividades sociales para reportar.

3.5 AVANCES ISP'S

Para el mes de febrero de 2025, la operación del AE4 aún no ha iniciado, por lo que no se reportan avances en este periodo.

3.6 AVANCES OPERACIÓN

Para el mes de febrero de 2025, la operación del AE4 aún no ha iniciado, por lo que no se reportan avances en este periodo.

3.7 AVANCES SOCIOAMBIENTAL

En el mes de febrero de 2025 se adelanta la expansión Choco en los municipios de Atrato, Cértegui y Unión Panamericana, Tadó información que se está recopilando y se debe entregar con el informe del mes de marzo de 2025 pues se encuentra en proceso de entrega la expansión a la supervisión.

3.8 RIESGOS

Para el mes de febrero de 2025, se tiene un (1) riesgo en monitoreo:

- **R3- Impactos por situaciones sociales, orden público y ambientales:** Este riesgo se tiene en constante monitoreo dado que se identificó en la expansión del departamento de Chocó, específicamente para el tramo de Carmen de Atrato – Quibdó, teniendo en cuenta las comunicados indígenas que no permiten la instalación de la FO y los requerimientos de grupos al margen de la ley, situaciones que podrían afectar la entrega del departamento.

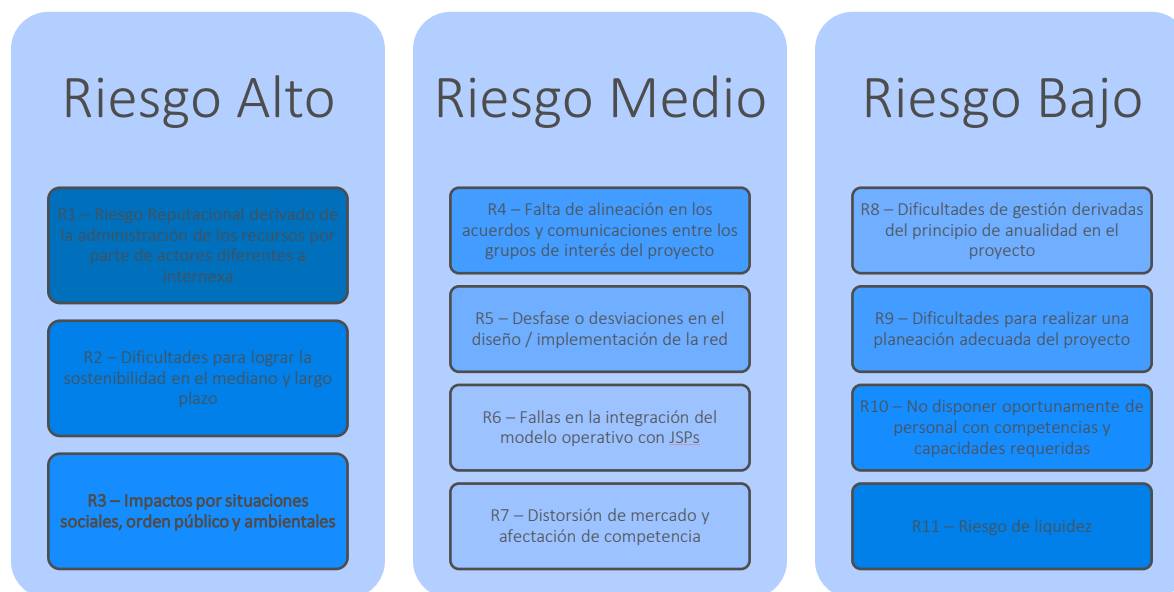


Ilustración 1 - Riesgos AE2

Se adjunta como anexo matriz de seguimiento mensual a los riesgos. (Anexo No. 13 - Seguimiento Riesgos del Proyecto AE4)

4 ACTIVIDADES PLANEADAS

Para el mes de marzo de 2025, se adelantarán como mínimo las siguientes actividades:

- Habilitación de los Nodos en Choco para la entrega de abril.

5 RECOMENDACIONES

- Realizar sensibilización con los ISPs de las convocatorias con el fin de agilizar los procesos de conexión de hogares.

6 CONCLUSIONES

- No se presentaron PQRS asociados a la prestación del servicio.

PERSONAL ASOCIADO AL PROYECTO – MATRIZ DE ESCALAMIENTO INCIDENTES TÉCNICOS.

A continuación, se relaciona el personal que se encuentra asignado al proyecto:

Nombre	Rol	Datos de Contacto
John Chía R	Gerente Proyecto	ichia@internexa.com +57 322 5975641
Roger García	PMO	rgarcia@internexa.com +57 314 4544979
Elías Fadul Meyer	Gerente Negocios Gobierno	efadul@internexa.com +57 3153364787
Paola Ruiz	Gestión Documental	pruiz@internexa.com +57 301 6203464
Juliana Saldarriaga	Jurídico	jsaldarriaga@internexa.com +57 (604) 3171111 ext. 73202 +57 315 5030160
Cristian Blanco B.	Servicio al Cliente	cblanco@internexa.com +57 312 4422966
Daniel A. Cruz R.	Líder ISP	dcruz@internexa.com +57 3183709910

Tabla 9. Equipo de cuenta.



Ilustración 2 - Matriz de escalamiento – Incidentes Técnicos
