



I N T E R N E X A

INFORME DE GESTIÓN

Período comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2025

Versión No. 3

PROYECTO CONECTIVIDAD PARA CAMBIAR VIDAS

ACUERDO ESPECÍFICO No. 4 DE 2024
(CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1465 - 2024)

Objeto. En desarrollo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023, constituye el objeto de este Acuerdo Específico No. 4 aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros entre el FONDO ÚNICO DE TIC e INTERNEXA S.A. para la financiación y desarrollo del proyecto para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de soluciones de infraestructura y servicios de telecomunicaciones sostenibles en el largo plazo que permitan, a través de los ISP Seleccionados, la conectividad de banda ancha, para los hogares estratos 1 y 2 y Comunidades Organizadas de Conectividad ubicadas en los municipios que se listan en el Anexo 1, con el objeto de mejorar la conectividad digital, la prestación de los servicios de conectividad y el acceso universal.

Control del Documento

Información del Documento

Información del Documento	
Dueño del Documento	<i>Cristian Blanco</i>
Última Fecha Actualizado	<i>05-09-2024</i>
Ubicación y Nombre del Archivo	
Palabras Claves	<i>Informe de Gestión</i>
Circulación	<i>InterNexa, Fiducoldex, MINTIC</i>

Historia del Documento


Versión	Fecha de Elaboración del formato o del Cambio	Resumen General del Contenido del Documento o Descripción General de Cambio al mismo
<i>1.0</i>	<i>20/12/2023</i>	<i>Creación del esquema del informe</i>
<i>1.5</i>	<i>22/02/2024</i>	<i>Actualización del esquema del informe</i>

Revisión o Aprobación del Documento

Nombre	Rol
Cristian Blanco	Ingeniero de Experiencia INTERNEXA
John Chía R	Gerente Proyecto PNC
Diana Jaramillo	Directora PNC

Tabla de contenido

Control del Documento	2
Información del Documento	2
Historia del Documento	2
Revisión o Aprobación del Documento	2
1 INTRODUCCIÓN	5
2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7
2.1 ACTAS DE REUNIÓN	7
2.2 INFORMES MENSUALES	7
2.3 COMUNICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO	8
3 ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LOS HITOS DEL PROYECTO	8
3.1 AVANCES EN EL DESPLIEGUE	11
3.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	13
3.3 ASPECTOS SOCIALES PARA REPORTAR	15
3.4 AVANCES ISP'S	15
3.5 AVANCES OPERACIÓN	16
3.6 AVANCES SOCIOAMBIENTAL	16
3.7 RIESGOS	16
4 ACTIVIDADES PLANEADAS	17
5. RECOMENDACIONES	17
6. CONCLUSIONES	18



Índice de Tablas

Tabla 1 Alcance del acuerdo específico No.4 6

Tabla 2 Actas de seguimiento a la ejecución (marzo) 7

Tabla 3 Actas comité operativo (marzo)..... 7

Tabla 4 Relación Actas pendientes 7

Tabla 5 Relación de informes mensuales 8

Tabla 6 Comunicaciones tramitadas durante el periodo (marzo) 8

Tabla 7 Entregables red troncal..... 9

Tabla 8 Avances despliegue..... 11

Tabla 9. Equipo de cuenta. 18


1 INTRODUCCIÓN

El Informe de Gestión Mensual contiene información relevante para evidenciar el cumplimiento del ACUERDO ESPECÍFICO No. 4 DE 2024 (CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1465 - 2024) suscrito entre el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES E INTERNEXA S.A. y recopila el avance del proyecto durante el mes de marzo de 2025.

De conformidad con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 4; el alcance del Acuerdo Especifico No. 4 abarca: 4 departamentos, 32 municipios, con el fin de conectar alrededor de 62.309 hogares de estrato 1 y 2, involucrando componentes de expansión de red troncal, y la disponibilidad hacia los ISP de conexión y acceso a Internet.

A continuación, se relacionan los departamentos y cantidad de hogares a beneficiar:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TOTAL DE HOGARES 1 Y 2 A CONECTAREN LA CABECERA MUNICIPAL PROYECTO CONECTIVIDAD PARA CAMBIAR VIDAS	HOGARES A CONECTAR QUE NO REQUIEREN RED DE ACCESO (PROYECTOS TIPO 1)	HOGARES A PASAR Y CONECTAR EN MUNICIPIOS CON RED FTTH YA DESPLEGADA SEGÚN COLOMBIATIC PROYECTOS TIPO 2 A	HOGARES A PASAR Y CONECTAR EN MUNICIPIOS DONDE SÓLO SEREPORTA ACCESOS XDSL (2) E INALÁMBRICOS EN SU MAYORÍA SATELITALES PROYECTOS TIPO 2 B
Antioquia	Vigía del Fuerte	1.099			1.099
Cauca	Timbiquí	1.888	1.170	718	
Chocó	Acandí	1.732			1.732
Chocó	Alto Baudó	861			861
Chocó	Atrato	838			838
Chocó	Bagadó	594	368	226	
Chocó	Bahía Solano	1.601			1.601
Chocó	Bajo Baudó	1.772			1.772



SEGÚN META DE 85% DE HOGARES ESTRATO 1 Y 2 CONECTADOS EN CABECERA EN 2026					
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TOTAL, DE HOGARES 1 Y 2 A CONECTAREN LA CABECERA MUNICIPAL PROYECTO CONECTIVIDAD PARA CAMBIAR VIDAS	HOGARES A CONECTAR QUE NO REQUIEREN RED DE ACCESO (PROYECTO TIPO 1)	HOGARES A PASAR Y CONECTAR EN MUNICIPIOS CON RED FTTH YA DESPLEGADA SEGÚN COLOMBIATIC PROYECTOS TIPO 2 A	HOGARES A PASAR Y CONECTAR EN MUNICIPIOS DONDE SÓLO SEREPORTA ACCESOS XDSL (2) E INALÁMBRICOS EN SU MAYORÍA SATELITALES PROYECTOS TIPO 2 B
Chocó	Bojayá	237			237
Chocó	Carmen del Darién	559			559
Chocó	Cértegui	947			947
Chocó	Condoto	2.682	1.662	1.020	
Chocó	El Cantón del San Pablo	825			825
Chocó	El Litoral del San Juan	386			386
Chocó	Istmina	5.109	3.167	1.942	
Chocó	Juradó	640			640
Chocó	Lloró	909			909
Chocó	Medio Atrato	224			224
Chocó	Medio Baudó	571			571
Chocó	Medio San Juan	713			713
Chocó	Nóvita	1.008			1.008
Chocó	Nuquí	283			283
Chocó	Río Iró	414			414
Chocó	Río Quito	423			423
Chocó	Riosucio	4.268			4.268
Chocó	San José Del Palmar	336			336
Chocó	Sipí	195			195
Chocó	Tadó	3.092			3.092
Chocó	Unguía	1.092			1.092
Chocó	Unión Panamericana	828	513	315	
Nariño	Francisco Pizarro	1.713			1.713
Nariño	San Andrés De Tumaco	24.470	15.171	9.299	
TOTALES		62.309	22.051	13.520	26.738

Tabla 1 Alcance del acuerdo específico No.4

NOTA IMPORTANTE: De acuerdo con el avance relacionado con el Específico 4, se informa que el 15 de noviembre de 2024, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) publicó el borrador de la convocatoria para los Proveedores de Servicios de Internet (ISP). Debido a que esta es una etapa preliminar del proceso, no se han registrado avances adicionales en esta fase.

2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2.1 ACTAS DE REUNIÓN

A continuación, se relacionan las actas de las reuniones realizadas durante el mes de marzo de 2025, las cuales se encuentran en proceso de revisión por las partes.

Actas de seguimiento a la ejecución realizadas en Marzo:

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN			
018	Entrega Expansión Choco AE4	03/03/2025	En proceso de aprobación MinTic revisión mediante sesión teams 03/04/2025
019	Entrega Expansión Choco AE4	05/03/2025	En proceso revisión y aprobación MinTic
020	Entrega Expansión Choco AE4	07/03/2025	En proceso revisión y aprobación MinTic.
021	Seguimiento PNC AE4 19 Feb 25	17/03/2025	En proceso revisión y aprobación MinTic
022	Ajustes Acuerdo 4 (Memorias de cálculo y capacidades)	21/03/2025	En proceso revisión ITX
023	Análisis Memoria de Calculo AE4	31/03/2025	En proceso revisión ITX.

Tabla 2 Actas de seguimiento a la ejecución (marzo)

Actas de comité operativo en Marzo:

COMITÉ OPERATIVO			
CO_AE4_009	Comités Operativos Convenio 790 InterNexa (Presencial) Marzo.	26/03/2025	En proceso revisión ITX

Tabla 3 Actas comité operativo (marzo)


Así mismo, se relacionan las actas que se tienen en proceso de elaboración o firma y que corresponden a meses anteriores:

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN			
002	Seguimiento Ejecución - Acuerdo Especifico No. 4A	15/08/2024	Pendiente de Firmas – enviado por DocuSign 4/04/2025.
009	Seguimiento - AE4 Mesa Técnica Entrega Habilidadación de Nodos Choco	13/12/2024	Pendiente de Firmas – enviado por DocuSign 4/04/2025
010	AE4 Mesa Técnica Entrega Habilidadación Nodos - Sesión 2 Tadó	16/12/2024	Pendiente de Firmas – enviado por DocuSign 4/04/2025.
011	Mesa Técnica Conexión Choco Habilidadación de Nodo	17/12/2024	Pendiente de Firmas – enviado por DocuSign 4/04/2025.

Tabla 4 Relación Actas pendientes

2.2 INFORMES MENSUALES

A continuación, se presenta la relación de los informes mensuales que se aprobaron o enviaron a la supervisión en el mes de marzo de 2025:



No.	Mes de reporte	Radicado MINTIC	Observaciones supervisión	Estado conformidad
1	Febrero	251025399 del 07/03/2025 251035984 del 31/03/2025	252044869 del 21/03/2025	En revisión MINTIC
2	Noviembre, diciembre 2024 y enero 2025	251021535 del 28/02/2025	252048609 del 31/03/2025	Aprobados

Tabla 5 Relación de informes mensuales

2.3 COMUNICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO


CONSECUTIVO INTERNO	DESTINO	ASUNTO	RADICADO MINTIC	ESTADO MINTIC
CCVAE4-INTER-DIRINF-004-2025	Dirección Infraestructura MinTIC	Informe mensual – periodo del 1 al 28 de febrero de 2025	251025399	Con respuesta
CCVAE4-INTER-DIRINF-005-2025	Dirección Infraestructura MinTIC	Notificación entrega habilitación de nodos departamento de Chocó	251026407	Sin respuesta
CCVAE4-INTER-DIRINF-006-2025	Dirección Infraestructura MinTIC	Notificación entrega expansión de red departamento de Chocó	251028559	Sin respuesta
CCVAE4-INTER-DIRINF-007-2025	Dirección Infraestructura MinTIC	Remisión informe mensual – Mes febrero 2025 – Versión 2.	251035984	Sin respuesta

Tabla 6 Comunicaciones tramitadas durante el periodo (marzo)

3 ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LOS HITOS DEL PROYECTO

De conformidad con lo establecido en el anexo técnico ENTREGABLES RED TRONCAL, se relacionan los avances que se tienen con corte al 31 de marzo 2025:

FASES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE ENTREGA	ESTADO AL 30 DE NOVIEMBRE
Planeación <i>Fase Finalizada</i>	Gestión Socioambiental	Plan de Gestión Socioambiental	Descripción de los trámites de permisos identificados previos a la ejecución del proyecto	Única Vez	La Gestión Socioambiental corresponde a la entrega de los diagnósticos para aquellos municipios que requerían despliegue de Fibra Óptica, teniendo en cuenta sus dinámicas socioambientales. Este documento fue compartido con la entidad en el acuerdo específico número 3.
	Ingeniería deDetalle y Topología	Ingeniería de detalle y topología condensada	Topologías/diagramas/ tablas de diseño de red	Única Vez	No se han reportado modificaciones con respecto a los documentos entregados.
	Presupuesto	Modelo financiero	Incluye el presupuesto, flujo de pagos y flujo de caja de proyecto, adicionalmente en la hoja “detalle de municipios” se encuentra el BOM considerado por cada municipio.	Única Vez	No se han reportado modificaciones con respecto a los documentos entregados.
	Cronograma	Cronograma para el despliegue en Project	Cronograma detallado para el despliegue en los municipios	Única Vez	No se han reportado modificaciones con respecto a los documentos entregados.




FASES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE ENTREGA	ESTADO AL 30 DE NOVIEMBRE
	Implementación	Plan de Implementación	El Plan de Implementación constituye la herramienta que permite el seguimiento de la implementación del proyecto, incluye la distribución del CAPEX y OPEX de implementación por grupos de entregables del proyecto, el cronograma del proyecto y los correspondientes hitos de seguimiento de la instalación y puesta en servicio y operación de la red.	Única vez	No se han reportado modificaciones con respecto a los documentos entregados.
	Modelo Operativo		Descripción del Modelo Operativo y atención	Única vez	No se han reportado modificaciones con respecto a los documentos entregados.


Tabla 7 Entregables red troncal

NOTA: La Fase de Planeación se encuentra ejecutada al 100% ya que hizo parte de los entregables del Acuerdo Específico No. 3

FASES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE ENTREGA	ESTADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024
Ejecución	Gestión socioambiental	Informe con la trazabilidad de la gestión socioambiental ejecutada	Ver Anexo Informe Gestión Socioambiental	Al final del despliegue de cada municipio	
	Adición del Acuerdo Específico No. 4 al contrato de fiducia	Trámite para la adición del Acuerdo Específico No. 4 al contrato de Fiducia	Documento con la confirmación de la respectiva adición	Única Vez	No se han reportado modificaciones con respecto a los documentos entregados.
	Gestión del Acuerdo Específico No. 4	Informe Gestión acuerdo	Informe a la ejecución presupuestal, actualización de ejecución de presupuesto y verificación de ejecución vs lo planeado Ver Anexo Informe Gestión Acuerdo	Mensual	
	Flujo de pagos y flujo de caja del proyecto.	Informe de flujo de pagos y flujo de caja del Proyecto	Informe de flujo de pagos y flujo de caja del proyecto	Mensual	No se han reportado modificaciones con respecto a los documentos entregados.
	Desviaciones, estructuración plan de acción con el fin de cerrar brechas entre lo	Información	Identificación de desviaciones y estructuración plan de acción con el fin de cerrar brechas entre lo planeado y lo real ejecutado.	Según Proceda	No se han reportado modificaciones con respecto a los documentos entregados.



FASES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE ENTREGA	ESTADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024
	planeado y lo real ejecutado.				
	Cronograma de ejecución del proyecto	Anexo informe Gestión Acuerdo	Informe avance del cronograma de ejecución del proyecto, actualización del cronograma de ejecución del proyecto y verificación de ejecución vs lo planeado	Mensual	No se han reportado modificaciones con respecto a los documentos entregados.
	Entrega de Nodo	Anexo Formato infraestructura	Informe entrega de Nodo, aplicable a la entrega de cada uno de los nodos por municipio	A la habilitación del nodo	Se está trabajando en mesas técnicas entre ITXA y la supervisión para ajustar memorias y OTROSI.
	Entrega de servicio en el Municipio	Anexo Formato infraestructura	Informe entrega de servicio en el Municipio, aplicable a la entrega de cada municipio	A la habilitación del Municipio	
	Prueba de Conmutación	Anexo Formato Conmutación de Red	Informe Prueba de Conmutación, aplicable a la entrega de municipios anillados	A la habilitación de ambos brazos del municipio	
	Instalación y entrega a la operación	Informe final de Instalación y entrega a la operación	Informe final de Instalación y entrega a la operación, levantamiento de información para la entrega de documentación del estado final del proyecto, incluye cambios presentados durante la ejecución frente a lo planeado y su valoración, la documentación anexa al informe final de instalación incluye: Formato de Infraestructura por sitio, Planos de red, Pruebas de Conmutación en Formato Conmutación de Red por sitio, Pruebas RFC2544 por sitio. Para aquellos municipios que incluyen expansión de red se entrega: protocolo pruebas SAT, que incluyen pruebas Bidireccionales de OTDR, Reflectancia y Pérdidas de Conectores, así como pruebas de BERT y RFC en equipos red transporte y en la fibra. Para todas las pruebas se deberá entregar el Certificado de calibración de equipos utilizados.	A la entrega en operación del municipio	




FASES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE ENTREGA
Operación	Informe articulación ISP	Informe sobre la conexión e inicio de prestación de servicio a ISP's Anexo Informe Gestión Acuerdo	Informe sobre la conexión e inicio de prestación de servicio a ISP's	Mensual
	Informe de Operación	Informe de Operación y Mantenimiento Anexo Informe Gestión Acuerdo	Consolidación de información de la operación mensual del servicio	Mensual
	Informe de Gestión de Eventos, Disponibilidad y cumplimiento de Niveles de Servicio	- Informe de cumplimiento de acuerdo de Niveles de Servicio por municipio, por ISP, ocurrencia y	Elaboración informemensual de calidad del servicio, ocurrencia y resolución de eventos, cumplimiento de	Mensual
		resolución de eventos Anexo Informe Gestión Acuerdo	Niveles de Servicio por municipio	
	Cronograma de Mantenimientos Preventivos	Cronograma de los mantenimientos preventivos sobre la red asociada a los servicios del Acuerdo Anexo Informe Gestión Acuerdo	Cronograma de los mantenimientos preventivos	Mensual
	Informe de Ejecución Presupuestal	Informe de ejecución presupuestal, flujo de pagos y flujo de caja del proyecto	Actualización de la información de flujos de pagos y caja planeados Vs lo ejecutado	Mensual

Tabla 8 Avances despliegue

3.1 AVANCES EN EL DESPLIEGUE

De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, se presentan los avances que se tienen con corte al 31 de marzo de 2025 frente a la entrega del servicio por departamento:



Expansión Fibra óptica

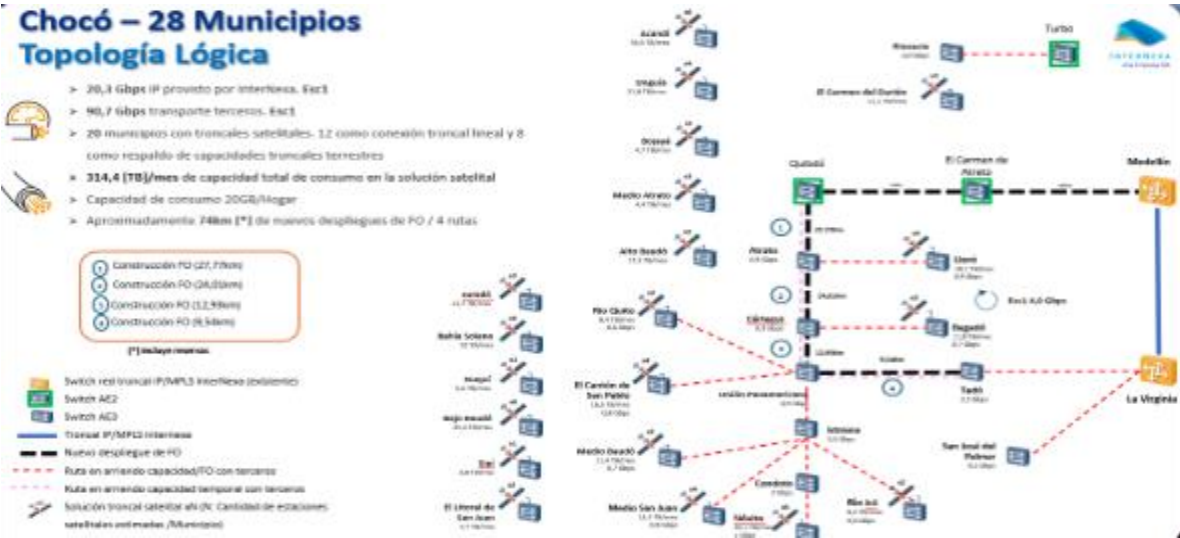


Diagrama topológico Choco.

Parámetro	Unidad	Enlace Quibdó - Tadó	Enlace Quibdó - Yuto	Enlace Yuto - Cértegui	Enlace Cértegui – Unión Panameri.	Enlace Unión Pana - Tadó
Longitud Óptica	Km	78,100	28,752	25,500	10,200	13,400

Longitudes construidas.

CAPEX		Tipo costo [fijo/variable]	Cantidad total
Datos		-	32
Hogares Objetivo a Conectar Estrato 1 y 2 en Cabecera M	Unidad	-	62.309
Red Troncal		Fijo	
Construcción red Fibra óptica troncal [Km FO]		Fijo	
Total Km FO troncal a construir (+ reservas)	Cantidad	-	74,2
Fibra Optica / ADSS / 48 hilos / suministro + instalación	CAPEX / Km	Fijo	77,377

Longitudes según memorias de cálculo.

Departamento	Fecha estimada de entrega contractual	Fecha de entrega	% avance al 31 de marzo de 2025	Observaciones
Antioquia	25/08/2025	25/08/2025	0%	Vigía del Fuerte. No se presentan avances
Cauca	23/05/2025	23/05/2025	0%	Timbiquí. No se presentan avances
Choco	04/08/2025	04/08/2025	100%	Atrato. 28000 metros tendidos y acondicionados.
Choco	09/08/2025	09/08/2025	100%	Cértegui. 25000 metros tendidos y acondicionados.
Choco	03/08/2025	03/08/2025	100%	Unión Panamericana, 10000 metros tendidos y acondicionados.
Choco	03/08/2025	03/08/2025	100%	Tadó, 13400 metros tendidos y acondicionados.
Nariño	08/05/2025	08/05/2025	0%	Francisco Pizarro. No se presentan avances.
Nariño	08/05/2025	08/05/2025	0%	San Andrés de Tumaco. No se presentan avances.

3.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Los aportes que realizará el FONDO ÚNICO DE TIC al patrimonio autónomo constituido para el desarrollo del proyecto objeto del presente Acuerdo 4, por valor de DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECISIETE DOSCIENTOS TRECE OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$210.317.213.859), de los cuales CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE (\$121.696.056.109) corresponden a los servicios asociados a la red troncal expansión, habilitación y provisión de capacidad por parte de INTERNEXA S.A.) y \$88.621.157.750 a la red de acceso y que se destinarán a los ISP que resulten beneficiarios de los contratos de fomento que se suscribirán posteriormente. La expansión de red troncal tiene un Capex aproximando de \$ 24.063.649.680

De conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -Causación y cálculo de la Compensación de Capacidad, se presenta el avance financiero con respecto a los siguientes ítems:

Compensación por Habilitación (CH), la cual se causará una única vez para cada ubicación una vez dicha ubicación cumpla los protocolos de prueba definidos en el Anexo 2. Es necesario aclarar que a la fecha no se ha facturado ninguna habilitación ya que se requiere un OTROSÍ para formalizar los ajustes realizados en la ejecución. Para la compensación por habilitación con corte al 31 de marzo de 2025, no se presenta avance.

Frente a la Compensación Fija (Cf), la cual se causará todos los meses a partir del momento en que exista un ISP que se conecte en la correspondiente ubicación. Al corte del 31 de marzo no se tiene ningún ISP conectado.

Es importante resaltar que si pasados tres (3) meses desde el momento en que se causó el valor CH para la ubicación "i" no se ha conectado ningún ISP seleccionado, a discreción del FONDO ÚNICO DE TIC podrá:

- a) Iniciar la causación del factor Cfi, aun sin contar con un ISP seleccionado en la ubicación; o
- b) Aplicar lo previsto en la cláusula "Modificación o suspensión de ubicaciones durante la ejecución".

Ahora bien, con respecto a la Capacidad Variable (CV), la cual se causará en aquellos meses en los que al menos un ISP reciba la capacidad y el acceso a Internet en la ubicación. En el mes de marzo se no presentó facturación.

Finalmente, y frente al pago de la Compensación de Expansión, establecida en la CLÁUSULA VIGÉSIMA, se presenta el siguiente avance:

Si bien la aprobación de la facturación del 30% del valor de la expansión de red se obtuvo en comité del 24 de enero de 2025, sólo hasta el mes de febrero se reflejó el desembolso en InterNexa.

A continuación, se relaciona la factura asociada a la compensación por expansión de red correspondiente al 30% del subtotal en los departamentos de: Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño:

FACTURA	APROBACIÓN COMITÉ	COMITÉ ASESOR	VALOR APROBADO
FVE59854	24-01-2025	43	\$ 7.219.094.907


lo anterior conforme a clausula vigésima del Acuerdo Especifico No. 4 suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e InterNexa S.A.

Respecto a la legalización de estos recursos con corte al 31 de marzo, serán reportados en el mes de abril a la supervisión mediante un comunicado. Toda la información referente a esta transacción se encuentra en el servidor del MinTic y se podrá consultar en el siguiente enlace dispuesto por la supervisión para ello.

https://mintic-my.sharepoint.com/personal/dinfraestructura_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdinfraestructura%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDirecci%C3%B3n%20de%20Infraestructura%2FFCCV%2FEJECUCION%2FAcuerdo%204%2FInformes%20de%20gesti%C3%B3n%2FLegalizaciones%20AE4&ga=1

En dicha carpeta se podrá consultar cada soporte descrito así:

- Soportes rendimientos
- 116912 - rendimientos AE4 - febrero (003)_encrypted_.pdf
- 116912 - documento custodia de la información.pdf
- 256157918 - Extracto cuenta AE4.pdf
- Acta CA No.43.pdf
- Comprobante de pago FVE59854.pdf
- FVE59854.pdf
- GEF-TIC-FM-020..pdf
- GMF PAGOS 28022025.xlsx
- Legalización Febrero 2025.xlsx
- Soporte de Pago.pdf



3.3 ASPECTOS SOCIALES PARA REPORTAR

En el mes de marzo de 2025 no se presentaron actividades sociales para reportar.

3.4 AVANCES ISPs

Para el mes de marzo de 2025, la operación del AE4 aún no ha iniciado, por lo que no se reportan avances en este periodo.

Se informa que solo hasta el 21 de marzo se dio aprobación en el comité asesor de los siguientes ISP adjudicados:


ISP	DPTO	MUNICIPIO	CANT HOGARES	ADJUDICACIÓN	FECHA APROBACIÓN COMITÉ ASESOR
AFATEL	CHOCÓ	CONDOTO	2685	28/02/2025	21/03/2025
AFATEL	CHOCÓ	NOVITA	1008	28/02/2025	21/03/2025
GLOBAL CONNECTION TICS	CHOCÓ	BAGADÓ	594	28/02/2025	21/03/2025
MAKRO SISTEM	CHOCÓ	CERTEGUI	780	28/02/2025	21/03/2025
MAKRO SISTEM	CHOCÓ	RIO QUITO	423	28/02/2025	21/03/2025
MAKRO SISTEM	CHOCÓ	TADÓ	3092	28/02/2025	21/03/2025
NARANJA	CHOCÓ	MEDIO SAN JUAN	713	28/02/2025	21/03/2025
SERVICIOS INFORMATICOS DEL CHOCO	CHOCÓ	ISTMINA	5109	28/02/2025	21/03/2025
SERVICIOS INFORMATICOS DEL CHOCO	CHOCÓ	MEDIO BAUDO	571	28/02/2025	21/03/2025
SOLUCIONES PACIFICO	CHOCÓ	EL CANTÓN DE SAN P	825	28/02/2025	21/03/2025
TESERPAC	CHOCÓ	UNIÓN PANAMERICANA	858	28/02/2025	21/03/2025

3.5 AVANCES OPERACIÓN

Para el mes de marzo de 2025, la operación del AE4 aún no ha iniciado, por lo que no se reportan avances en este periodo.

3.6 AVANCES SOCIOAMBIENTAL

En el mes de marzo de 2025 InterNexa solicita a la supervisión coordinar la revisión en terreno de la expansión de red. Los entregables de toda la gestión socio ambiental se encuentran cargados en el servidor de la supervisión y podrán ser consultados para tal fin:



The screenshot shows a OneDrive interface with a breadcrumb trail: Dirección de Infraestructura > CCV > EJECUCION > Acuerdo 4 > Informes de gestión > Expasion de Red AE4 > Entregables proyectos MINTIC > Radicados > 4. Gestión social y permisos. Below the trail is a table with the following data:

Nombre	Modificado	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
1. Alcaldías	14 de marzo	crsanchez@interne	12 elementos	Compartida	
2. Comunidades	14 de marzo	crsanchez@interne	7 elementos	Compartida	
3. Predios	14 de marzo	crsanchez@interne	5 elementos	Compartida	

https://mintic-my.sharepoint.com/personal/dinfraestructura_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdinfraestructura%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDirecci%C3%B3n%20de%20Infraestructura%2FCCV%2FEJECUCION%2FAcuerdo%204%2FInformes%20de%20gesti%C3%B3n%2FExpasion%20de%20Red%20AE4%2FEntregables%20proyectos%20MINTIC%2FRadicados%2F4%2E%20Gesti%C3%B3n%20social%20y%20permisos&ga=1

3.7 RIESGOS

Para el mes de marzo de 2025, se tiene un (1) riesgo en monitoreo:

- **R3- Impactos por situaciones sociales, orden público y ambientales:** Este riesgo se tiene en constante monitoreo dado que se identificó en la expansión del departamento de Chocó, específicamente para el tramo de Carmen de Atrato – Quibdó, teniendo en cuenta las comunicades indígenas que no permiten la instalación de la FO y los requerimientos de grupos al margen de la ley, situaciones que podrían afectar la entrega del departamento.

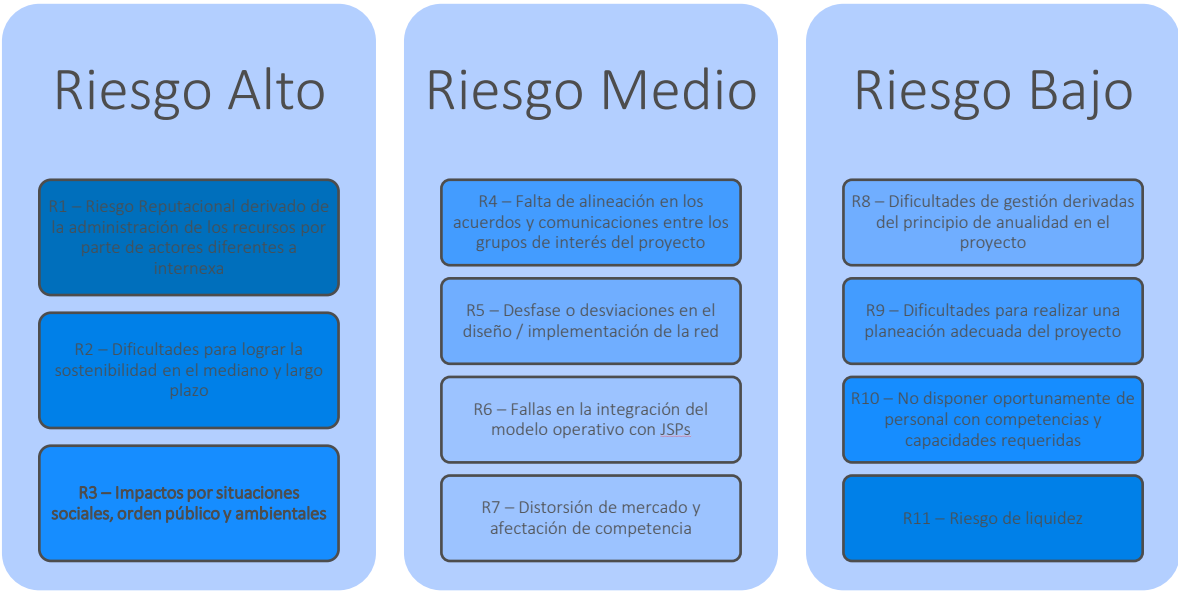


Ilustración 1 - Riesgos AE2

Se adjunta como anexo matriz de seguimiento mensual a los riesgos. (Anexo No. 13 - Seguimiento Riesgos del Proyecto AE4)

4 ACTIVIDADES PLANEADAS

Para el mes de abril de 2025, se adelantarán como mínimo las siguientes actividades:

- Habilitación de los Nodos en Choco para la entrega de abril.
- Programación de entrega en terreno de los municipios de la expansión de Red.

5. RECOMENDACIONES

- Realizar sensibilización con los ISPs de las convocatorias con el fin de agilizar los procesos de conexión de hogares, se informa que solo hasta el 21 de marzo se dio aprobación en el comité asesor de los siguientes ISP adjudicados:

Convocatoria	ISP	Municipio	Hogares Adjudicados	Hogares Instalados
004 de 2024*	Global Connection Tics	Bagadó	594	0
	Makro Sistem	Cértegui	780	0
	AFATEL	Condoto	2685	0
	Soluciones Pacífico	El Cantón de San Pablo	825	0
	Servicios Informáticos del Chocó	Istmina	5109	0
	Servicios Informáticos del Chocó	Medio Baudó	571	0
	Naranja	Medio San Juan	713	0
	AFATEL	Novita	1008	0
	Makro Sistem	Rio Quito	423	0
	Makro Sistem	Tadó	3092	0
	Tersepac	Unión Panamericana	858	0

*En proceso de legalización de contratos y aprobación de pólizas.

6.CONCLUSIONES

- No se presentaron PQRS asociados a la prestación del servicio.

PERSONAL ASOCIADO AL PROYECTO – MATRIZ DE ESCALAMIENTO INCIDENTES TÉCNICOS.

A continuación, se relaciona el personal que se encuentra asignado al proyecto:

Nombre	Rol	Datos de Contacto
John Chía R	Gerente Proyecto	jchia@internexa.com +57 322 5975641
Roger García	PMO	rgarcia@internexa.com +57 314 4544979
Diana Jaramillo	Gerente Negocios Gobierno	djaramillo@internexa.com +57 3164725641
Paola Ruiz	Gestión Documental	pruiz@internexa.com +57 301 6203464
Juliana Saldarriaga	Jurídico	jsaldarriaga@internexa.com +57 (604) 3171111 ext. 73202 +57 315 5030160
Cristian Blanco B.	Servicio al Cliente	cblanco@internexa.com +57 312 4422966
Daniel A. Cruz R.	Líder ISP	dcruz@internexa.com +57 3183709910

Tabla 9. Equipo de cuenta.




Ilustración 2 - Matriz de escalamiento – Incidentes Técnicos
