

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA						CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-9			
								VERSIÓN		1			
								PÁGINA		1 de 2			
										FECHA		05/07/2025 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE						DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CÓRDOBA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:		1050 DE 2021						INTERVENTOR:		CONSORCIO VIAL NORTE			
MES INFORME MENSUAL:		jun-25						INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN PROYECTO: 2030". MÓDULO 3					
CONTRATO DE OBRA No:		923 DE 2021						CONTRATISTA:		CONSORCIO ISLA 066 - 2020			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA													
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior						
2021	432821	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	Nación	principal	\$ 1.500.000.000,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	Nación	principal	\$ 78.935.467,00	\$ -						
		TOTAL				\$ 1.578.935.467,00	\$ -						
2022	100522	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	Nación	principal	\$ 2.023.610.025,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	Nación	principal	\$ 162.914.989,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	Nación	principal	\$ 24.001.302,00	\$ -						
TOTAL				\$ 2.210.526.316,00	\$ -								
2023	103523	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	Nación	principal	\$ 2.890.871.463,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	Nación	principal	\$ 232.735.700,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	Nación	principal	\$ 34.287.574,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	Nación	principal	\$ 542.000.000,00	\$ -						
TOTAL				\$ 3.699.894.737,00	\$ -								
2024	158824	C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	11	Nación	principal	\$ 2.890.871.464,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	11	Nación	principal	\$ 232.735.699,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	Nación	principal	\$ 34.287.574,00	\$ -						
TOTAL				\$ 3.157.894.737,00	\$ -								
2025	139925	C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	11	Nación	principal	\$ 1.106.253.821,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	11	Nación	principal	\$ 214.832.953,00	\$ 112.695.525,11						
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	Nación	principal	\$ 31.650.068,00	\$ 31.650.068,00						
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	Nación	Adición No.1	\$ 377.894.415,00	\$ 377.894.415,00						
	388125	C-2401-0600-96-51102D-2401029-02	11	Nación	Adición No.1	\$ 1.322.305.585,00	\$ 1.322.305.585,00						
TOTAL				\$ 1.352.736.842,00	\$ 1.844.345.593,11								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$		13.699.988.099,00									
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA													
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones	
1	JUNIO DE 2021	\$ 5.567.240,00	\$ 1.057.776,00	\$ 6.625.016,00	\$ -	\$ 6.625.016,00		432821 De 26/05/2021	\$ 1.572.310.451,00	\$ 11.993.363.083,00	105875 DE 10/11/2021		
2	JULIO DE 2021	\$ 39.902.600,00	\$ 7.581.494,00	\$ 54.109.110,00	\$ -	\$ 47.484.094,00		432821 De 26/05/2021	\$ 1.524.826.357,00	\$ 11.945.878.989,00	87252 DE 21/09/2021		
	ANTICIPO 1					\$ 504.201.181,00	\$ 504.201.181,00	432821 De 26/05/2021	\$ 1.020.625.176,00		73470 DE 18/08/2021		
3	AGOSTO DE 2021	\$ 91.462.600,00	\$ 17.377.894,00	\$ 162.949.604,00	\$ 10.289.820	\$ 98.550.674,00	\$ 493.911.361	432821 De 26/05/2021	\$ 922.074.502,00	\$ 11.837.038.495,00	87851 DE 23/09/2021		
4	SEPTIEMBRE DE 2021	\$ 133.582.560,00	\$ 25.380.686,00	\$ 321.912.850,00	\$ 10.289.820	\$ 148.673.426,00	\$ 483.621.541	432821 De 26/05/2021	\$ 773.401.076,00	\$ 11.678.075.249,00	113728 DE 29/11/2021		
5	OCTUBRE DE 2021	\$ 138.358.540,00	\$ 26.288.123,00	\$ 486.559.513,00	\$ 10.289.820	\$ 154.356.843,00	\$ 473.331.721	432821 De 26/05/2021	\$ 619.044.233,00	\$ 11.513.428.586,00	119350 DE 13/12/2021		
6	NOVIEMBRE DE 2021	\$ 144.901.920,00	\$ 27.531.365,00	\$ 658.992.798,00	\$ 10.289.820	\$ 162.143.465,00	\$ 463.041.901	432821 De 26/05/2021	\$ 456.900.768,00	\$ 11.340.995.301,00	121243 DE 15/12/2021		
7	DICEMBRE DE 2021	\$ 149.210.600,00	\$ 28.350.014,00	\$ 836.553.412,00	\$ 10.289.820	\$ 167.270.794,00	\$ 452.752.081	432821 De 26/05/2021	\$ 289.629.974,00	\$ 11.163.434.687,00	123536 DE 20/12/2021		
	ANTICIPO 2					\$ 289.629.974,00	\$ 742.382.055	432821 De 26/05/2021	\$ -		124265 DE 21/12/2021	Adición de Anticipo por valor de \$289.629.974	
8	ENERO DE 2022	\$ 162.413.940,00	\$ 30.858.649,00	\$ 1.029.826.001,00	\$ 61.865.171	\$ 131.407.418,00	\$ 680.516.884	100522 De 25/01/2022	\$ 2.079.118.898,00	\$ 10.970.162.098,00	31855 DE 31/03/2022		
9	FEBRERO DE 2022	\$ 180.968.470,00	\$ 34.384.009,00	\$ 1.245.178.480,00	\$ 61.865.171	\$ 153.487.308,00	\$ 618.651.713	100522 De 25/01/2022	\$ 1.925.631.590,00	\$ 10.754.809.619,00	48853 DE 12/05/2022		
10	MARZO DE 2022	\$ 193.215.780,00	\$ 36.710.998,00	\$ 1.475.105.258,00	\$ 61.865.171	\$ 168.061.607,00	\$ 556.786.542	100522 De 25/01/2022	\$ 1.757.569.983,00	\$ 10.524.882.841,00	56306 DE 01/06/2022		
11	ABRIL DE 2022	\$ 191.876.600,00	\$ 36.456.554,00	\$ 1.703.438.412,00	\$ 61.865.171	\$ 166.467.983,00	\$ 494.921.371	100522 De 25/01/2022	\$ 1.591.102.000,00	\$ 10.296.549.687,00	63442 DE 16/06/2022		
12	MAYO DE 2022	\$ 192.814.400,00	\$ 36.634.736,00	\$ 1.932.887.548,00	\$ 61.865.171	\$ 167.583.965,00	\$ 433.056.200	100522 De 25/01/2022	\$ 1.423.518.035,00	\$ 10.067.100.551,00	79077 de 28/07/2022		
13	JUNIO DE 2022	\$ 182.577.340,00	\$ 34.689.695,00	\$ 2.150.154.583,00	\$ 61.865.171	\$ 155.401.864,00	\$ 371.191.029	100522 De 25/01/2022	\$ 1.268.116.171,00	\$ 9.849.833.516,00	83154 de 05/08/2022		
14	JULIO DE 2022	\$ 210.409.238,00	\$ 39.977.755,00	\$ 2.400.541.576,00	\$ 61.865.171	\$ 188.521.822,00	\$ 309.325.858	100522 De 25/01/2022	\$ 1.079.594.349,00	\$ 9.599.446.523,00	105106 de 29/09/2022		
15	AGOSTO DE 2022	\$ 245.014.853,00	\$ 46.552.822,00	\$ 2.692.109.251,00	\$ 77.331.464	\$ 214.236.211,00	\$ 231.994.394	100522 De 25/01/2022	\$ 865.358.138,00	\$ 9.307.878.848,00	115036 de 24/10/2022		
16	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 250.320.022,00	\$ 47.560.804,00	\$ 2.989.990.077,00	\$ 77.331.464	\$ 220.549.362,00	\$ 154.662.930	100522 De 25/01/2022	\$ 644.808.776,00	\$ 9.009.998.022,00	138511 de 16/12/2022		

17	OCTUBRE DE 2022	\$	225.220.976,00	\$	42.791.985,00	\$	3.258.003.038,00	\$	77.331.464	\$	190.681.497,00	\$	77.331.466	100522 De 25/01/2022	\$	454.127.279,00	\$	8.741.985.061,00	142278 de 22/12/2022	
18	NOVIEMBRE DE 2022	\$	225.561.554,00	\$	42.856.695,00	\$	3.526.421.287,00	\$	77.331.466	\$	191.086.783,00	\$	-	100522 De 25/01/2022	\$	263.040.496,00	\$	8.473.566.812,00	143712 de 27/12/2022	
19	DICIEMBRE DE 2022	\$	221.042.434,00	\$	41.998.062,00	\$	3.789.461.783,00	\$	-	\$	263.040.496,00	\$	-	100522 De 25/01/2022	\$	-	\$	8.210.526.316,00	145181 de 30/12/2022	
20	ENERO DE 2023	\$	226.245.288,00	\$	42.986.605,00	\$	4.058.693.676,00	\$	-	\$	269.231.893,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	2.888.662.844,00	\$	7.941.294.423,00	37849 de 18/04/2023	
21	FEBRERO DE 2023	\$	227.817.467,00	\$	43.285.319,00	\$	4.329.796.462,00	\$	-	\$	271.102.786,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	2.617.560.058,00	\$	7.670.191.637,00	37860 de 18/04/2023	
22	MARZO DE 2023	\$	241.617.586,00	\$	45.907.341,00	\$	4.617.321.389,00	\$	-	\$	287.524.927,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	2.330.035.131,00	\$	7.382.666.710,00	47662 de 15/05/2023	
23	ABRIL DE 2023	\$	236.634.785,00	\$	44.960.609,00	\$	4.898.916.783,00	\$	-	\$	281.595.394,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	2.048.439.737,00	\$	7.101.071.316,00	64743 de 05/07/2023	
24	MAYO DE 2023	\$	238.393.965,00	\$	45.294.853,00	\$	5.182.605.601,00	\$	-	\$	283.688.818,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	1.764.750.919,00	\$	6.817.382.498,00	64341 de 04/07/2023	
25	JUNIO DE 2023	\$	237.303.290,00	\$	45.087.625,00	\$	5.464.996.516,00	\$	-	\$	282.390.915,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	1.482.360.004,00	\$	6.534.991.583,00	75671 de 04/08/2023	
26	JULIO DE 2023	\$	272.724.036,00	\$	51.817.567,00	\$	5.789.538.119,00	\$	-	\$	324.541.603,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	1.157.818.401,00	\$	6.210.449.980,00	82281 de 27/09/2023	
27	AGOSTO DE 2023	\$	274.355.362,00	\$	52.127.519,00	\$	6.116.021.000,00	\$	-	\$	326.482.881,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	831.335.520,00	\$	5.883.967.099,00	82161 de 25/09/2023	
28	SEPTIEMBRE DE 2023	\$	274.487.317,00	\$	52.152.590,23	\$	6.442.660.907,23	\$	-	\$	326.639.907,23	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	504.695.612,77	\$	5.557.327.191,77	83955 el 31/10/2023 84803 el 14/11/2023	
29	OCTUBRE DE 2023	\$	285.151.833,00	\$	54.178.848,27	\$	6.781.991.588,50	\$	-	\$	339.330.681,27	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	165.364.931,50	\$	5.217.996.510,50	85473 el 22/11/2023	
30	NOVIEMBRE DE 2023	\$	295.129.167,00	\$	56.074.541,73	\$	7.133.195.297,23	\$	-	\$	351.203.708,73	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	356.161.222,77	\$	4.866.792.801,77	88322 el 13/12/2023	
31	DICIEMBRE DE 2023	\$	292.316.877,00	\$	55.540.206,63	\$	7.481.052.380,86	\$	-	\$	347.857.083,63	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	8.304.139,14	\$	4.518.935.718,14	88347 el 13/12/2023	
32	ENERO DE 2024	\$	257.348.986,00	\$	48.896.307,34	\$	7.787.297.674,20	\$	-	\$	306.245.293,34	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	-	\$	4.212.690.424,80		
														158824 De 07/03/2024	\$	2.859.953.582,80				
33	FEBRERO DE 2024	\$	265.142.429,00	\$	50.377.061,51	\$	8.102.817.164,71	\$	-	\$	315.519.490,51	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	2.544.434.092,29	\$	3.897.170.934,29	2339 de 10/04/2024	
34	MARZO DE 2024	\$	262.284.000,00	\$	49.833.960,00	\$	8.414.935.124,71	\$	-	\$	312.117.960,00	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	2.232.316.132,29	\$	3.585.052.974,29	3673 de 06/05/2024	
35	ABRIL DE 2024	\$	258.435.126,00	\$	49.102.673,94	\$	8.722.472.924,65	\$	-	\$	307.537.799,94	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	1.924.778.332,35	\$	3.277.515.174,35	5248 de 04/06/2024	
36	MAYO DE 2024	\$	262.407.993,00	\$	49.857.518,67	\$	9.034.738.436,32	\$	-	\$	312.265.511,67	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	1.612.512.820,68	\$	2.965.249.662,68	6473 de 26/06/2024	
37	JUNIO DE 2024	\$	207.696.294,00	\$	39.462.295,86	\$	9.281.897.026,18	\$	-	\$	247.158.589,86	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	1.365.354.230,82	\$	2.718.091.072,82	7753 de 24/07/2024	
38	JULIO DE 2024	\$	197.049.904,00	\$	37.439.481,76	\$	9.516.386.411,94	\$	-	\$	234.489.385,76	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	1.130.864.845,06	\$	2.483.601.687,06	10766 de 10/09/2024	
39	AGOSTO DE 2024	\$	183.046.953,00	\$	34.778.921,07	\$	9.734.212.286,01	\$	-	\$	217.825.874,07	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	913.038.970,99	\$	2.265.775.812,99	12061 de 01/10/2024	
40	SEPTIEMBRE DE 2024	\$	153.983.734,00	\$	29.256.909,46	\$	9.917.452.929,47	\$	-	\$	183.240.643,46	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	729.798.327,53	\$	2.082.535.169,53	16341 de 21/11/2024	
41	OCTUBRE DE 2024	\$	232.363.242,00	\$	44.149.015,98	\$	10.193.965.187,45	\$	-	\$	276.512.257,98	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	453.286.069,55	\$	1.806.022.911,55	17111de 04/12/2024	
42	NOVIEMBRE DE 2024	\$	215.125.218,00	\$	40.873.791,42	\$	10.449.964.196,87	\$	-	\$	255.999.009,42	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	197.287.060,13	\$	1.550.023.902,13	19161 de 16/12/2024	
43	DICIEMBRE DE 2024	\$	165.787.445,49	\$	31.499.614,64	\$	10.647.251.257,00	\$	-	\$	197.287.060,13	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	-	\$	1.352.736.842,00	20418 de 30/12/2024	
44	ENERO DE 2025	\$	219.397.888,00	\$	41.685.598,72	\$	10.908.334.743,72	\$	-	\$	261.083.486,72	\$	-	139925 De 10/03/2025	\$	1.091.653.355,28	\$	1.091.653.355,28		
45	FEBRERO DE 2025	\$	196.773.580,00	\$	37.386.980,20	\$	11.142.495.303,92	\$	-	\$	234.160.560,20	\$	-	139925 De 10/03/2025	\$	857.492.795,08	\$	857.492.795,08		
46	MARZO DE 2025	\$	183.080.223,00	\$	34.785.242,37	\$	11.360.360.769,29	\$	-	\$	217.865.465,37	\$	-	139925 De 10/03/2025	\$	639.627.329,71	\$	639.627.329,71		
47	ABRIL DE 2025	\$	185.936.462,00	\$	35.327.927,78	\$	11.581.625.159,07	\$	-	\$	221.264.389,78	\$	-	139925 De 10/03/2025	\$	418.362.939,93	\$	418.362.939,93		
ADICIÓN No.1														388125 De 21/05/2025	\$	1.700.000.000,00	\$	2.118.362.939,93		
48	MAYO DE 2025	\$	230.266.678,00	\$	43.750.668,82	\$	11.855.642.505,89	\$	-	\$	274.017.346,82	\$	-	139925 De 10/03/2025	\$	144.345.593,11	\$	1.844.345.593,11		
														388125 De 21/05/2025	\$	1.700.000.000,00				
49	JUNIO DE 2025	\$	231.503.400,00	\$	43.985.646,00	\$	12.131.131.551,89	\$	-	\$	275.489.046,00	\$	-	139925 De 10/03/2025	\$	-	\$	1.568.856.547,11		
														388125 De 21/05/2025	\$	1.568.856.547,11				
TOTALES		\$	10.194.228.195,49	\$	1.936.903.356,40	\$	12.131.131.551,89	\$	793.831.155,00	\$	12.131.131.551,89									

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* Valor total básico (C) = (A) + (B)	\$ 10.194.228.195,49	\$ 1.936.903.356,40	\$ 12.131.131.551,89
*	\$ -	\$ -	\$ -
*	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 10.194.228.195,49	\$ 1.936.903.356,40	\$ 12.131.131.551,89

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS GARCIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520203053 CND

Firma
Nombre: ELLEN OBEIMAR ALVARDY GALEANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 de 3	

FECHA		7/07/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO NORTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	-------------	------------------------	---------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1050 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NORTE
--------------------------------	--------------	--------------	----------------------

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3

FECHA DE INICIO:	23/06/2021
PLAZO INICIAL:	50,2 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/12/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 11.999.988.099,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 13.699.988.099,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10	\$ 1.199.998.810,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.399.997.620,00
Calidad del servicio	30	\$ 3.599.996.430,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
21	5	2021	28	2	2026
21	5	2021	28	2	2026
21	5	2021	31	8	2028
31	8	2025	31	8	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No. 0 Y 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/06/2021

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10	\$ 1.199.998.810,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.399.997.620,00
Calidad del servicio	30	\$ 3.599.996.430,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
23	6	2021	3	4	2026
23	6	2021	3	4	2026
23	6	2021	3	10	2028
3	10	2025	3	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 3

FECHA

7/07/2025
(Día / Mes / Año)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

8/08/2022

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	\$ 1.199.998.810,00	21	5	2021	3	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00	21	5	2021	3	4	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.399.997.620,00	21	5	2021	3	10	2028
Calidad del servicio	30	\$ 3.599.996.430,00	3	10	2025	3	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No.:

3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

8/08/2022

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	\$ 1.199.998.810,00	21	5	2021	3	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00	21	5	2021	3	4	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.399.997.620,00	21	5	2021	3	10	2028
Calidad del servicio	30	\$ 3.599.996.430,00	3	10	2025	3	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No.:

4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

12/01/2024

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	\$ 1.369.998.809,90	10	5	2025	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00	10	5	2025	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.739.997.619,80	10	5	2025	31	12	2028
Calidad del servicio	30	\$ 4.109.996.429,70	30	12	2025	30	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No.:

5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

13/06/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3


	FECHA	7/07/2025 (Día / Mes / Año)
--	-------	---

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS GARCIA
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 2520203053 CND

Firma 

Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
 Supervisor del Contrato de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 2

FECHA		5/07/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--	---

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA
-------------------------------	--------------------------------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

FECHA DE INICIO: 23/06/2021 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 54.2 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2025 (Incluye órdenes y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☒ NO ☐ VERSION No. 1 FECHA DE VERSION: 14/09/2021

OBSERVACIONES:
SE RADICA PLAN DE CALIDAD AL INVIAS MEDIANTE OFICIO 49980-CE-0112; SE APRUEBA MEDIANTE OFICIO DT-COR17756.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ No. DE AUDITORIAS PROGRAMADAS: 3 FECHA ÚLTIMA AUDITORIA: 5/06/2025
 PRESENTO INFORME DE AUDITORIA: SI ☐ NO ☐ No. DE AUDITORIAS REALIZADAS: 3 FECHA PRÓXIMA AUDITORIA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☒ NO ☐ FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 115 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 115

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:
El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:	0	No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:	0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:	0	No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:	0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:	0		

OBSERVACIONES:
A LA FECHA NO SE CUENTA CON NO CONFORMIDADES

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:	142
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	4	No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:	138

OBSERVACIONES:
 • Con la POR No. 138, Solicita se mejoren las condiciones del acceso a la vereda Joval en el km 28 de la vía Santa Lucía Moñitos, ya que presenta demasiada pendiente y dificulta el ingreso y salida de vehículos a la vereda, principalmente en temporada de lluvia.
 • Con la POR No. 139 El Señor Mafily presento comunicación escrita, en la cual solicita la conformación del acceso en su predio ubicado en el PR15+900 Mi de la Vía Santa Lucía Moñitos, ya que se construyó una alcantarilla en este punto sin tener en cuenta el acceso al predio.
 • Con la POR No. 140 El señor Doria se presentó a las oficinas del Consorcio Isla 066 para reportar que las aguas de escorrentía de la vía que llegan al box construido en el KM 25+730 de la vía Santa Lucía - Moñitos ha venido ocasionando socavación del terreno en su predio situación que unida a las intensas lluvias de esta temporada ha incrementado el daño del terreno, por lo que solicita se implemente alguna alternativa para mitigar la situación y evitar que el daño se agudice.
 • Con la POR No. 141 En nombre de la JAC de la vereda Joval y de la Junta de Padres de Familia de la Institución Educativa Sede Joval, solicitan la construcción de dos resaltos en la zona escolar de la vereda Joval, así como el mejoramiento del acceso a la institución educativa.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	72%	El 2 de agosto-22, el gestor técnico del proyecto diligencia encuesta de satisfacción
IG2: Índice de gestión 2 =	100%	Se remite informe mensual # 49 y los semanales 207, 208, 209 Y 210
IG3: Índice de gestión 3 =	100%	Se realizan ensayos de verificación de los materiales. Se reportan en resumen ensayos de laboratorio

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:
EL CONTRATO CONTINUAN CON LA REVISIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, SE ALCANZARON A REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE TERRAPLÉN, AFIRMADO, PAVIMENTO MR-40, ADEMAS ,ITEMS PARA LA CONSTRUCCIONES DE OBRAS HIDRAULICAS.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).


No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACIÓN TOTAL	GEOMAX	2103823	25/02/2025	EE-13-25	24/08/2025	
2	NIVEL AUTOMÁTICO	TOPCON	X72744	25/02/2025	NN-17-25	24/08/2025	
3	MÁQUINA DE ENSAYO MARSHALL / CBR	Pinzuar	298	21/06/2024	F-32049-001 R0	21/06/2025	En proceso de calibración.
4	PRENSA DOBLE RANGO PARA ENSAYO AFLEXION Y COMPRESION	Pinzuar	211	17/02/2024	F-31072-002 R0	17/02/2025	En proceso de calibración.
5	BALANZA 300 g	Lexus	YS132405	21/06/2024	M-32049-002 R0	21/06/2025	En proceso de calibración.
6	BALANZA 30 Kg	Lexus	YS136366	20/06/2024	M-32049-003 R0	20/06/2025	En proceso de calibración.
7	BALANZA 30 Kg	Lexus	YS136292	21/06/2024	M-32049-004 R0	21/06/2025	En proceso de calibración.
8	BALANZA 6000 g	Lexus	5124011095	21/06/2024	M-32049-005 R0	21/06/2025	En proceso de calibración.
9	HORNO	Pinzuar	180	21/06/2024	CTA-23-22096-S	21/06/2025	En proceso de calibración.


OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma 
Nombre: Marco Aurelio Oliveros, Garcia
Director de Interventoría
Matrícula No. 2520203053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Firma 
Nombre: Amaury Javier Guzmán Vidal
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 22202149534 COR

Firma 
Nombre: Ellen Obelmau, Eddy Galeano
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 13202-47439 BOL



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6.6. Otros documentos seguimiento mensual

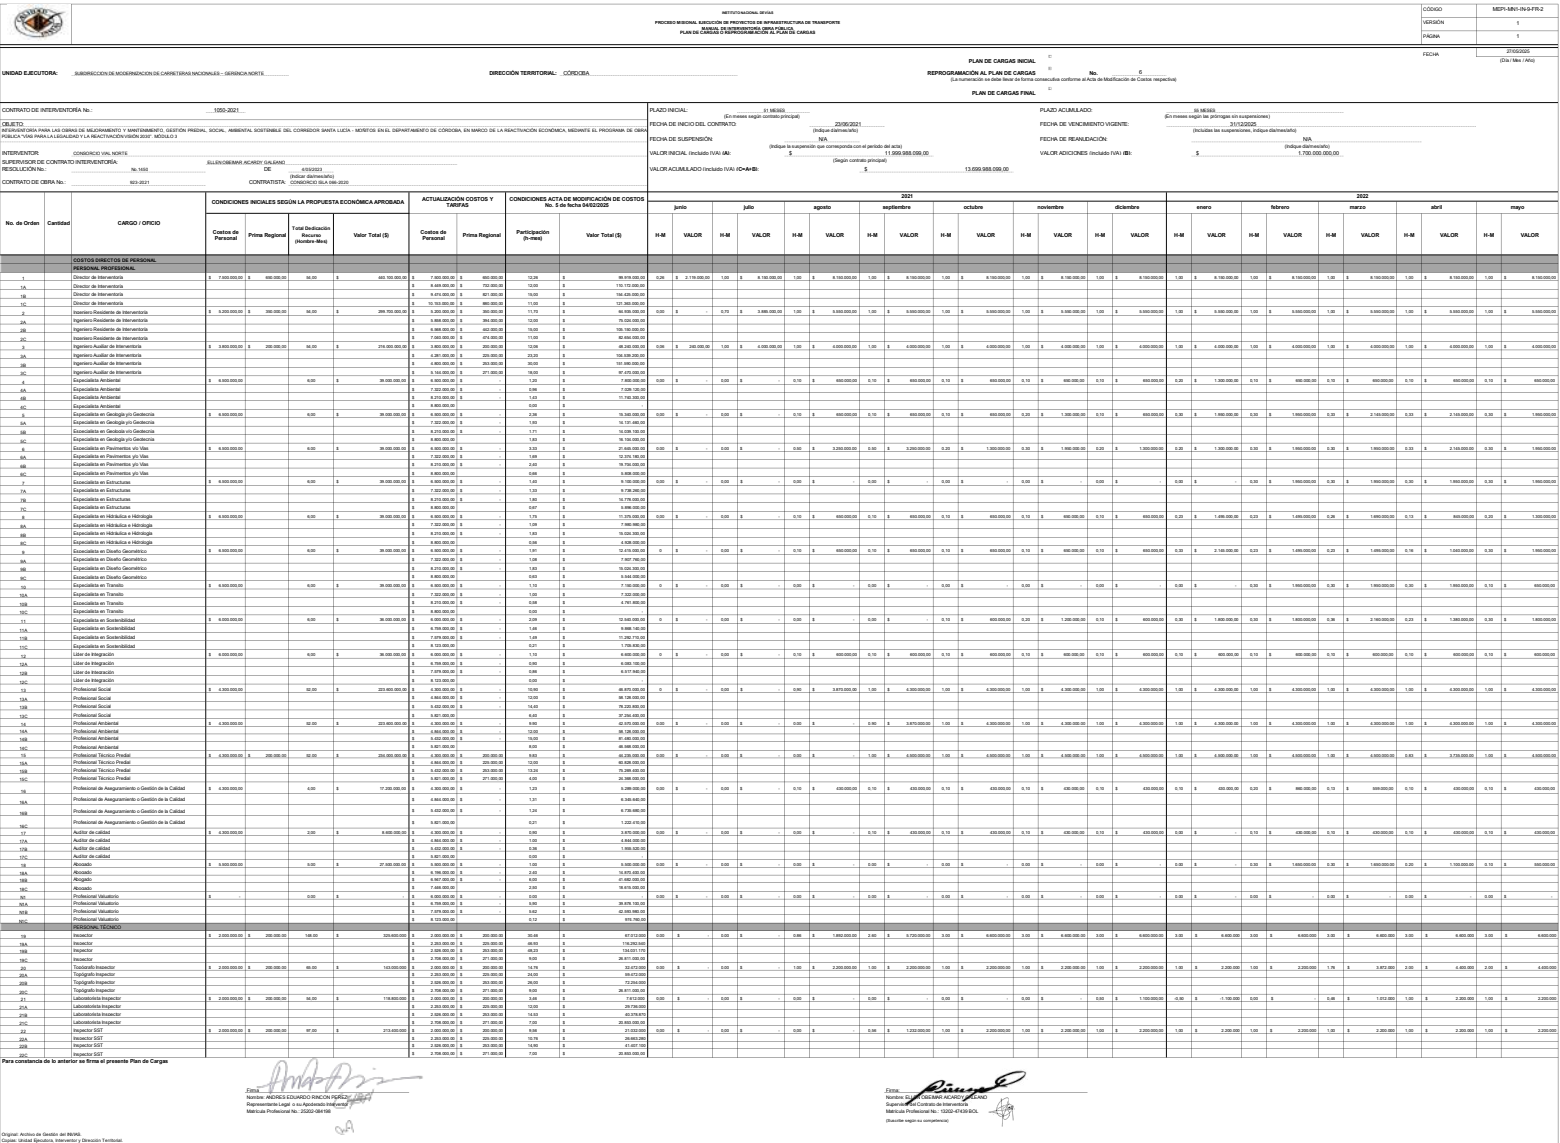
- Seguimiento a la inversión del Anticipo. Se dio cierre a la cuenta del anticipo en el mes de noviembre de 2022. El informe final de inversión y buen manejo del anticipo se adjunto en el informe mensual de interventoria del mes de noviembre 2022.

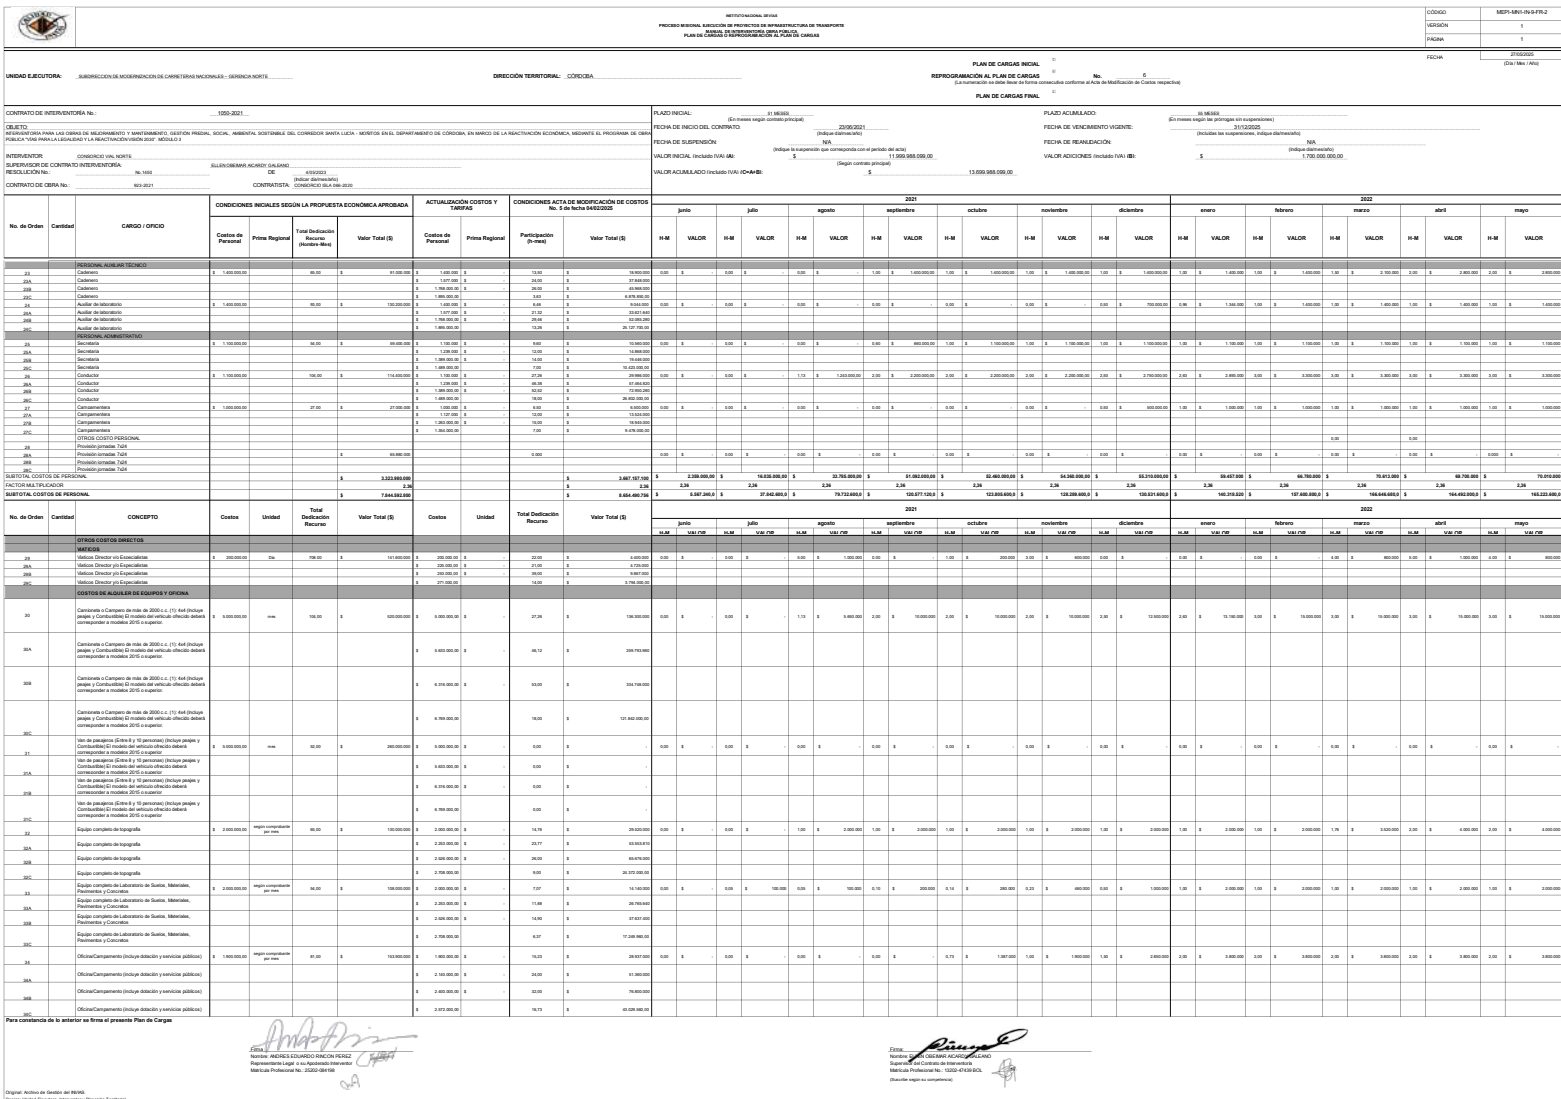


INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

- Plan de cargas







UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODIFICACIONES DE CARPENTAS NACIONALES - SECCIÓN NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: COCUEBA REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. E
 (La numeración se debe leer de la forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Cartera respectiva)
 PLAN DE CARGAS FINAL

[illegible]

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.								
CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS								


--

Para constancia de lo anterior se firmó el presente Plan de Cargas


 Firma _____
 Nombre: **ANDRÉS EDUARDO TRASCÓN PERLA**
 Representante Legal o Apoderado Autorizado
 del/los Productor/es de: **2022-2018**


 Firma _____
 Nombre: **DANIEL DE LA CRUZ**
 Representante del Comité de Intermediarios
 del/los Productor/es de: **2022-2018**

[illegible]



CÓDIGO	MEPS-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

PLAN DE CARGAS INICIAL ⁽¹⁾

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ⁽²⁾ No. 6

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acto de Modificación de Costos respectivos)


PLAN DE CARGAS FINAL ⁽³⁾

CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°:		000-001	PLAZA INICIAL:	01/08/2018	PLAZA DE ACERCAAMIENTO:	31/08/2018
			(Si existe rango o rango principal)	23/06/2021	(Si existe rango o rango principal)	31/08/2021
OBJETO			FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	(Indicar fecha)	FECHA DE ACERCAAMIENTO VIGENTE	(Indicar la suspensión, indicar detalles)
REVISIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, GESTIÓN DE RIESGO, ASISTENCIA TÉCNICA Y DEL CONSORCIO ÁREA LUZ, MONITOREO EN EL DEPARTAMENTO DE COCAICA, EN VÍNCULO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y/O PARA LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD VIGENTE 2020 Y 2021			FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	FECHA DE REANILACIÓN	N/A
INTERVENCIÓN			VALOR INICIAL (Incluido IVA)	(Indicar si suspensión que corresponda con el estado del servicio)	VALOR ADICIONES (Incluido IVA)	
CONSEJO TECNICO			\$	1.000.000.000,00	\$	(Indicar detalles)
SUPERIOR DE CONTRATO INTERVENCIÓN			VALOR ACERCAADO (Incluido IVA) (+/-)	(Según corresponda)	\$	1.000.000.000,00
FECHA DE INICIO			01/08/2018			
FECHA DE CIERRE			31/08/2021			

[illegible]

Nome: Andrés Eduardo Rincón Pérez
 Representante Legal o su Apoderado Interventor: [Firma]
 Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Firma: 
 Nombre: ELLEN ORCIBAR ACHAY GARCIA
 Supervisor del Contrato de Inventario
 Matrícula Profesional No.: 13052-47409-BOL
 (Suscribir según su competencia)



CÓDIGO	MEPS-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PLAN DE CARGAS INICIAL

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 6

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Corteje respectivo)

PLAN DE CARGAS FINAL ⁽¹⁾

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º

PLAZO INICIAL

PLAZO ACUMULADO:

version)

OBJETO:
INTERVENCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN FISCAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORRIDOR SANTA LUCÍA - MORITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓCINA

FECHA DE INC

FECHA DE VENCIMENTO:

Indique dalmas/afu)

PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS "VÍAS PARA LA SALUD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2035", MÓDULO 3

FECHA DE SUB

FECHA DE REANUDAC

NA
(Indique diâmetro(s))

INTERVENIOR: CONSORCIO VIAL NORTE
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENORÍA: JUAN OSBORN RICARDO GALIANO

VALOR INICIAL

VALOR ADICIONES (m)

1.700.000.000,00

RESOLUCION No:	No 1630	DE	4/05/2022
CONTRATO DE OBRA No:	003-2021	CONTRATISTA:	(Indicar el nombre)

VALOR ACTUAL

[illegible]

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

[illegible]

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma: 
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal o su Apoderado Interventor 
Matricula Profesional No.: 25000-08498

Firma: 
Nombre: STEVEN OSCAR ACARI GÁLVEZ
Supervisor del Contrato de Inventario
Matrícula Profesional No.: 13202-6769 BOL

Copias: Unidad Ejecutiva, Interventoría y Dirección.

Original Article de Gestión del NPA.



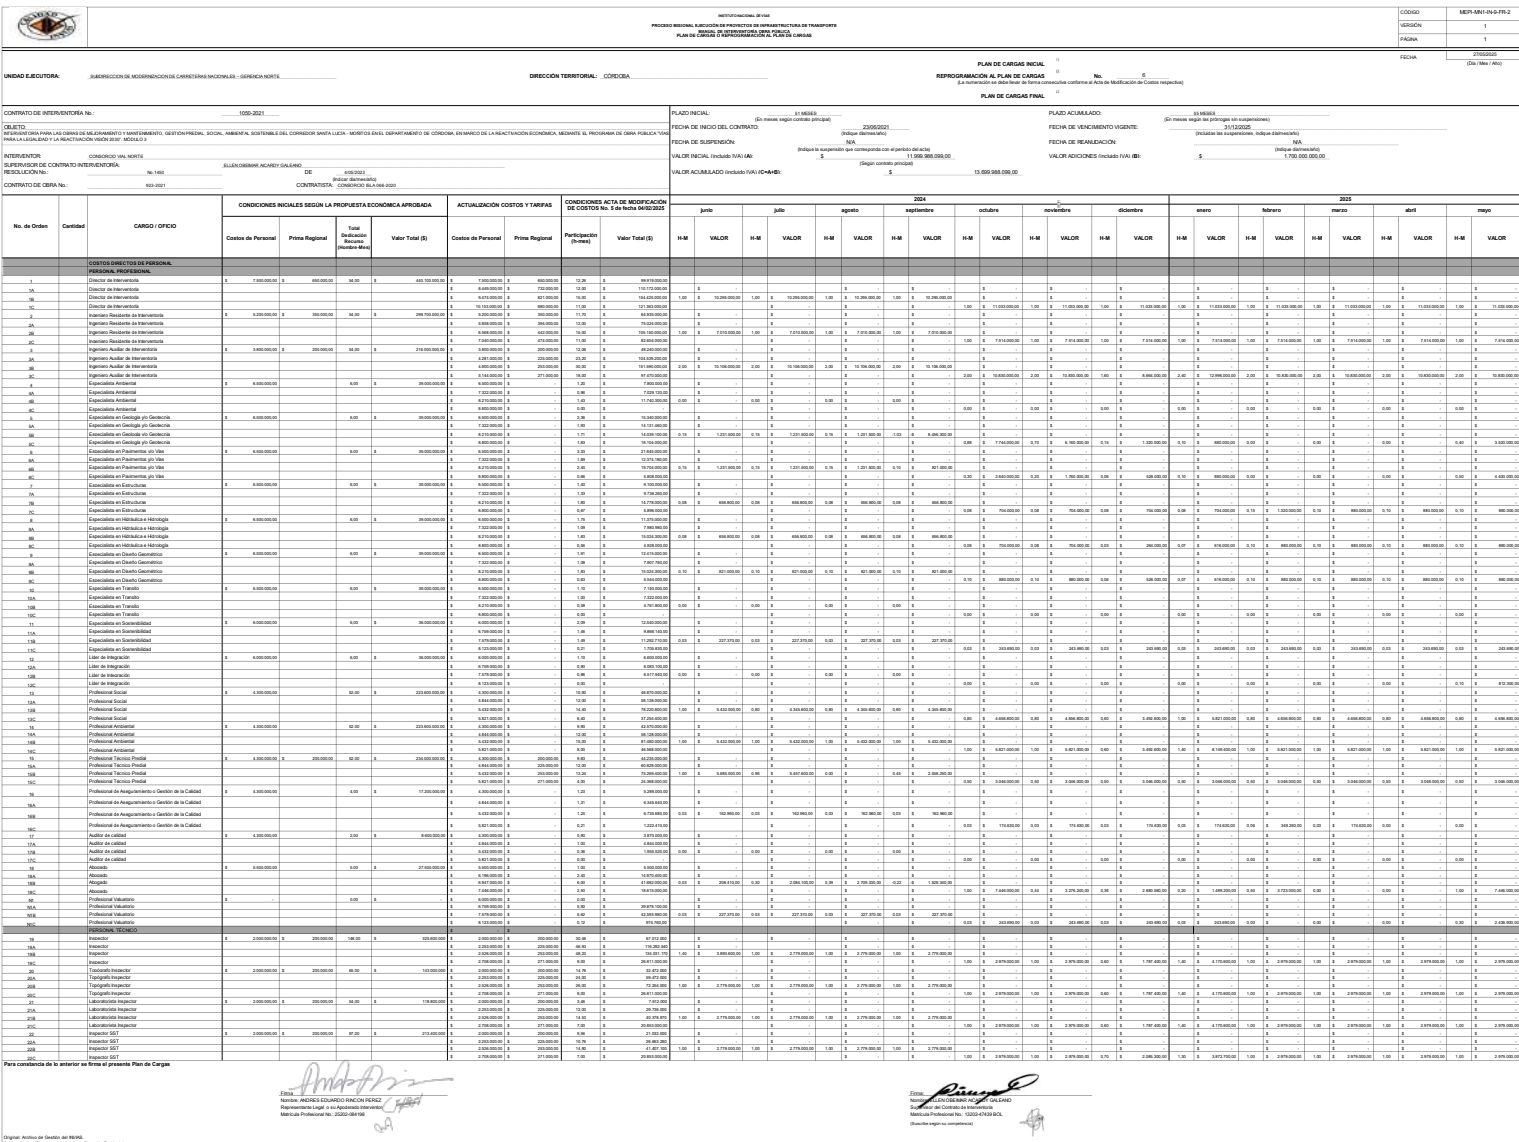
UNIDAD EJECUTORA:	JUBOTREC/CON DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA NORTE	DIRECCION TERRITORIAL:	CORCOCHA	REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS	Nº	0
				(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectivos)		

		CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPOSTA ECONOMICA APROBADA	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS	CONDICIONES ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS No. 5 de	2022	0	2024
--	--	--	--------------------------------	---	------	---	------

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta o continúa agendada.								
CAUSALES ACTA DE MODIFICACION DE COETOS Y REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS								

[illegible]

Handwritten signature: *Handwritten signature*



Formulario de presupuesto y programación de recursos. Incluye secciones para: Datos Generales, Plan de Cargas, Plan de Cargas Final, y Plan de Cargas por Proyecto. Contiene tablas detalladas de costos, personal, y recursos asignados.



CÓDIGO	MEPI-MINI-IN-D-FPI-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓDIGO.....

PLAN DE CARGAS INICIAL

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectivo)

(Dia / Mes / Año)

CONTRATO DE INTERVENCIÓN N.º		1000-2021
OBJETO ELABORAR PARA LA COMISIÓN DE MONITOREO 1) MONITOREO, GESTIÓN EMPRESARIAL, SOCIO, AMBIENTAL, SOSTENIBILIDAD DEL CONSEJO ANTA-LIMA - MONEDA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LOCALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VIAL DEL MODELO 3		
INTERVENIOR	CONGONCO SUR NORTE	
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENORIA	ALLEN GIBSON MACKEY GONZALEZ	
PROCESO N.º	1001	DE 4000003
CONSTRUCTORA/OTRA N.º	NAJ-001	DE (párrafo derogado)
		CONTRATACIÓN PROVISORIA DE SERVICIOS

PLAZO INICIAL:	21 MESSES	
	(En meses según contrato principal)	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	23/05/2021	
	(Indique día/mes/año)	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	
	(Indique la suspensión que corresponde con el período del acto)	
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (\$):	\$	11,995,988.000.00
	(Según contrato principal)	
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=AN) (\$):	\$	

PLAZO ACUMULADO:	31/03/2020 (En meses según las prórrogas de suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (1):	\$ 1.700.000.000,00

[illegible]

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

[illegible]

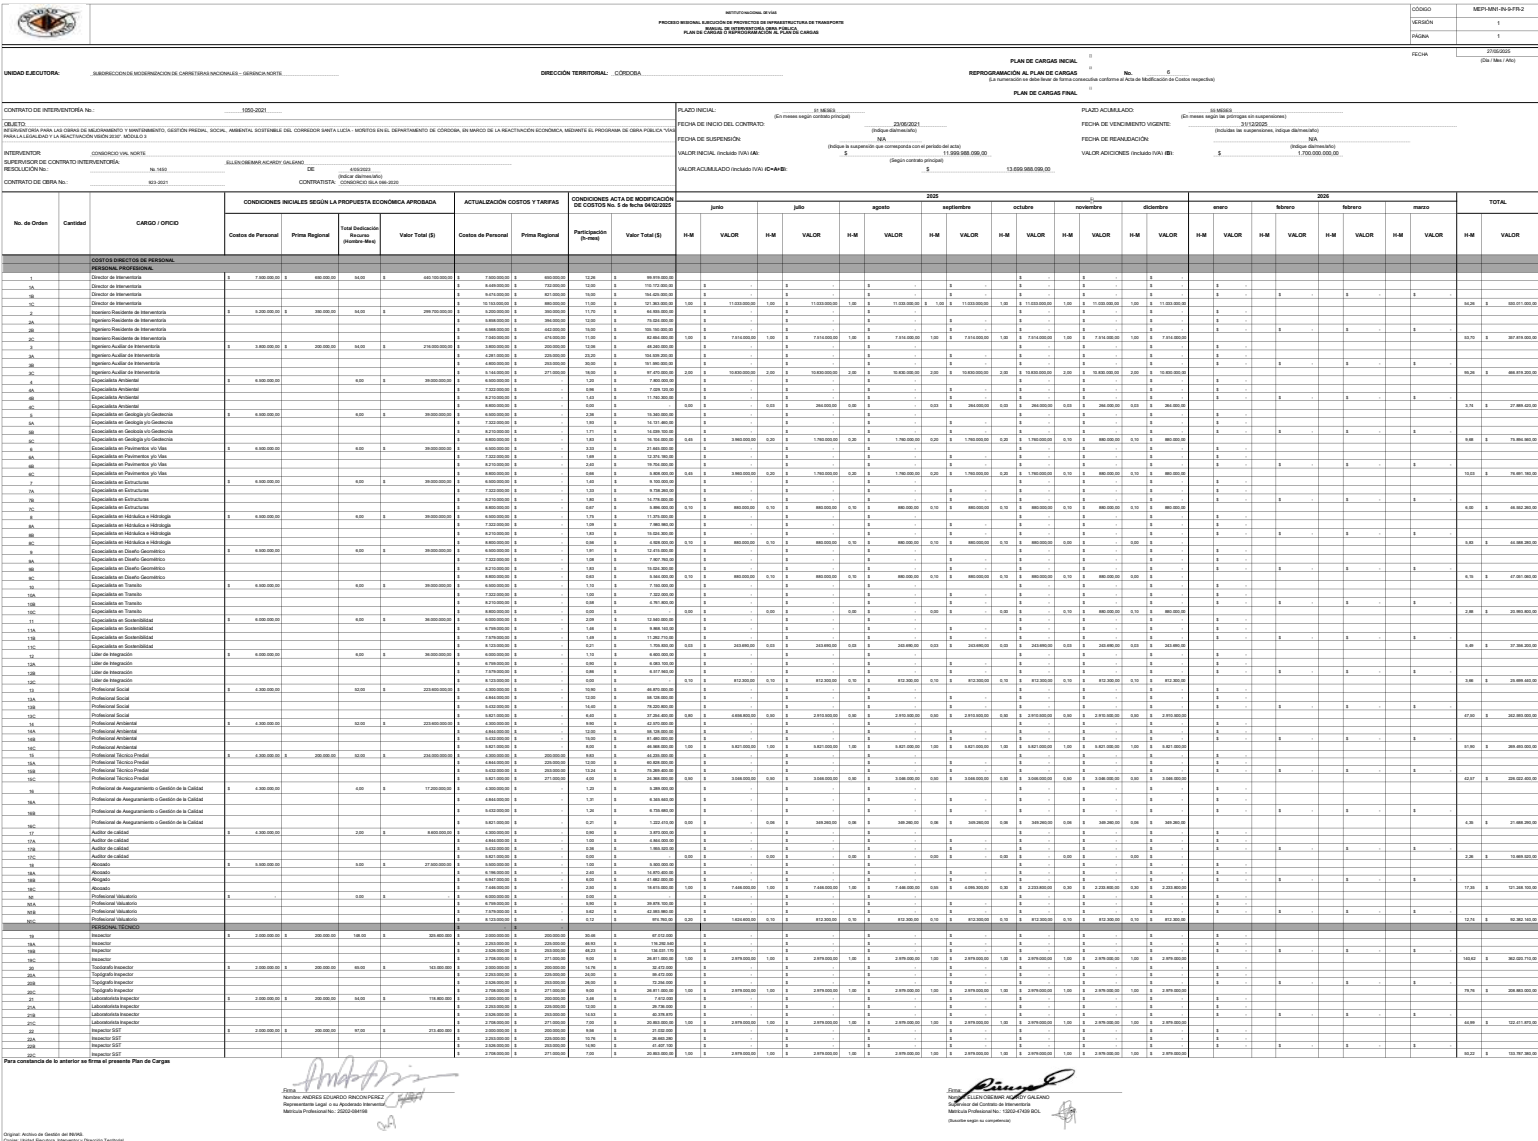
- | |
|---|
| 1. Tener en cuenta el Carga total del Inventario debe haber estado (Pública o Privada) en concordancia con el valor del documento presentando un balance positivo en los diferentes conceptos de la referencia, fíjese de ser el caso y luego proporcionar la información, que permite detallar la composición de la cantidad del personal, obra social, aplicación y uso de los recursos del proyecto. |
| 2. La subsección (Pública o Privada) el Inventario debe presentar situaciones de acuerdo a los siguientes conceptos, tales como, referencia, fines de obra y bienes muebles al momento de la referencia, a efectos de detallar el presupuesto, la inversión, el destino y el uso de los recursos del proyecto. |
| 3. La ubicación del personal debe estar sujeta a un contrato o convenio de prestación de servicios con el Organismo de referencia. |
| 4. La cuenta de la inversión debe haber sido recibida, a efectos de que se encuentre debidamente reflejada en el presupuesto de la obra social. |
| 5. El Carga total del Inventario debe ser correcta y su valor coincidir con el valor del presupuesto de la obra social y la Cuenta de Inversión. |

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma: 
 Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
 Representante Legal o su Apoderado Interventor 
 Matricula Profesional No.: 25202-084196

Firma: 
Nombre: JUAN CARLOS OBISPO ACOSTA GARCIA
Sucesor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13002-47439 DCL
(Escriba según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INIAP.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventoría y Dirección Territorial.



Original Article de Gestión del NPA.



DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓDIGO: _____

PLAN DE CARGAS INICIAL

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 6
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectivos)

PLAN DE CARGAS FINAL

PLAZO INICIAL: 51 MESER

PLAZO ACUMULADO: 56 MESES

OBJETO: OBRAS PARA LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO Y FORTALECIMIENTO: SERVICIO PERSONAL, SOCIAL, EDUCACIONAL, DEPORTIVA DEL CONDOMINIO ANEXO LUCERO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS Y PARA FOMENTAR LA REACTIVACION MEDIANTE EL MODELO 0			
REPRESENTADOR: CONDOMINIO LOS VIENTOS		REPRESENTADO: ILLUMINEMAR HERNANDEZ SALGADO	
SUPERVISOR DE CONTRATO AUTENTIFICADO: Nº 1680		DE: 0000003	
RESOLUCION (No):		(valor eliminado)	
CONTRATO DE OBRAS Nº: 001-2011		CONTRATISTA: CONDOMINIO SIA 188-2010	

PLAZO INICIAL:	01/08/2021	PLAZO ACABADO:	01/08/2021
(de fecha inicio de préstamo al principio)		(de fecha inicio de préstamo al principio)	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29/06/2021	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2021
(fecha de desembolso)		(fecha de vencimiento, fíjase de acuerdo)	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	FECHA DE REANUDACIÓN:	NA
(Indique la suspensión que corresponda con el período del préstamo)		(Indique de acuerdo)	
VALOR INICIAL, incluido IVA (I):	\$ 13.659.980.000,00	VALOR ACCIONES (incluido IVA) (A):	\$ 1.700.000.000,00
(según contrato principal)			
VALOR ACUMULADO incluido IVA: ☒ SI	\$ 13.659.980.000,00		

[illegible]

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

[illegible]

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas inicial el interviniente debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversión, con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, fuentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2 Para la programación el Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con los actos de costos tramitados para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

4. En los eventos de suspensión del plan contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la recomposición al plan de recursos.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Cuentas tramitada.

Para constancia de lo anterior se firmó el presente Bien de Cuenta

Firma: _____
 Nombre: ANDRÉS EDUARDO RINCON PAREZ
 Representante Legal o su Apoderado Interimario
 Matrícula Profesional No.: 25200-08198

Firma: 
Nombre: GLEN-OSMAR ALCARAZ GALEANO
Superior del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13203-47439 BOL
(Suscriba según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INPS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventoría y Dirección Territorial.

[illegible]

|--|

|--|

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|--|

[illegible]

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estado de la ejecución del proyecto al periodo del presente mes se encuentra en una inversión básica de obra del 88,03% equivalente a \$ 125.638.559.161 millones de pesos que comparando con el programado del 87.81% que corresponde a \$ 125.333.618.968 millones de pesos. No se presenta atraso a corte del presente informe, por lo cual el contratista se encuentra cumpliendo el programa de inversión aprobado.

En el broche del PR25+700 lado derecho, Se realizó la instalación y conformación de material de terraplén. Posteriormente se instala y conforma la subbase granular.

Se instalan delineadores de obstáculo entre el PR18+200 y el PR23+940, instalación de defensas metálicas en el PR5+380 Y PR5+452 margen derecha. Construcción de disipadores en el PR8+856.

En el Box Culvert del PR34+650 se realiza excavación para construcción de prolongación box, demolición de box Culvert existente, solado e instalación de acero de refuerzo losa inferior, construcción de losa inferior prolongación. Los puentes del PR6+970, PR34+500 y PR45+300 se encuentran terminados y habilitados para la circulación del tráfico vehicular.

En el puente del PR45+700 se realiza excavación de anillos e instalación de acero en Caisson 1 y 2 estribo N°2 y Caisson 3 y 4 estribo N°1. Se funden los Caisson 1 y 2 estribo N°2 y Caisson 3 y 4 estribo N°1. Instalación de soleado y construcción de zarpa muro de acompañamiento estribo 1 y 2.

Durante el mes de junio 2025 se realiza seguimiento a las actividades de reparación paliativa mediante el método de costura cruzada.

En cuanto a la modificación y ajuste de los diseños, al corte del 30 de junio de 2025 se vienen realizando los ajustes necesarios entre el PR22+000 al PR46+000. Se han presentado diferentes ajustes a los diseños fase III por lo que han surgido mayores cantidades de obras y ítem no previstos. Se han identificado sitios con riesgos menores los cuales requieren tratamiento que se encuentran en estudio de los especialistas.

Se presenta acta parcial de obra # 49 correspondiente a las actividades realizadas en el mes de junio 2025.

La inversión total ejecutada acumulada en el contrato de obra a corte del 30 de junio de 2025 es de \$ 153.792.580.929 millones de pesos, equivalente al 86,03% con respecto al valor del contrato.

Para el contrato de obra se otorgó en el mes de agosto de 2021 un valor de \$ 8.225.125.125 como anticipo, en el mes de diciembre-21 se tramitó un segundo anticipo por valor de \$2.747.414.331 y en el mes de agosto-23 se tramitó un tercer anticipo por valor de \$3.371.395.812 para un valor total de anticipo de \$14.343.935.268, de los cuales con el acumulado del acta de obra # 49 se ha alcanzado a amortizar \$13.025.916.280 millones de pesos, quedando un saldo por amortizar de \$1.318.018.988 millones de pesos.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Para el contrato de interventoría se otorgó en el mes de agosto-21 \$ 504.201.181 como anticipo y en el mes de diciembre de 2021 se tramitó un segundo anticipo de \$289.629.974, de los cuales con el acta de costo # 18 correspondiente al mes de noviembre de 2022 se terminó de amortizar el anticipo al 100%.

Durante el mes de junio 2025 se realiza seguimiento a las actividades de reparación paliativa mediante el método de costura cruzada.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

8. ANEXOS

8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Correspondencia enviada Junio de 2025

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3530	49980-CE-3530	4/06/2025		SU COMUNICADO 43447 RESPUESTA RADICADO NO 317423 COMUNICADO 49980-CE-3511. PROPUESTA RECONFORMACIÓN DESCOLE Y CANAL DE DRENAJE PARA ODT K8+856 L.D.
3531	49980-CE-3531	4/06/2025	2025E-VUVRAZ-059628	REMISIÓN DE UN AVALÚO COMERCIAL APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
3532	49980-CE-3532	4/06/2025		RADICADO 43493- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE- 3515. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS FUNCIONALES PARA INTERVENCIÓN DE LOSAS CON AFECTACIONES
3533	49980-CE-3533	5/06/2025		RESPUESTA 42478 – “APU DE MANTENIMIENTO - MONITOREO AÑO 3”
3534	49980-CE-3534	5/06/2025		RESPUESTA RADICADO 43348- RESPUESTA RADICADO NO 316785 COMUNICADO 49980-CE- 3486 PLANTEAMIENTO METODOLOGÍA PARA CATEGORIZACIÓN DE TRAMOS
3535	49980-CE-3535	5/06/2025		RESUMEN MESA TRABAJO DEL 04 DE JUNIO DE 2025 – SEGUIMIENTO, APROBACIÓN Y REMISIÓN DE INSUMOS APROBADOS
3536	49980-CE-3536	5/06/2025	2025E-VUVRAZ-060725	REMISIÓN DE LA PRE-ACTA NO 48 DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025
3537	49980-CE-3537	5/06/2025		RESPUESTA RADICADO 43429- MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE MATERIALES EN LOS BROCHES PENDIENTES POR PAVIMENTAR DEL K25+000 Y K27+200 PARA MITIGAR LOS ESFUERZOS DE EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DE LA SUBRASANTE
3538	49980-CE-3538	24/06/2025		RESPUESTA SU COMUNICAD 43581. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR MES DE JUNIO DE 2025; - DEMORA ENTREGA INFORMACIÓN E&D MUROS SECTOR K31+400 AL K41+800
3539	49980-CE-3539	6/06/2025		RESPUESTA RADICADO 43552 - INFORME AMBIENTAL MAYO 2025
3540	49980-CE-3540	6/06/2025	2025E-VUVRAZ-061665	CARENCIA MANTENIMIENTO REVEGETALIZACION DE LOS TALUDES CON MALLA TRIPLE TORSION – RESPUESTA A SU COMUNICADO 43553 “INSTALACION DE MALLA TRIPLE TORSION EN TALUDES EROSIONADOS”

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3541	49980-CE-3541	10/06/2025		RESPUESTA RADICADO 43363- RESPUESTA A RADICADO No 317418 COMUNICADO 49980-CE-3502. SU COMUNICADO 43138_ PROPUESTA ACCESO K34+650 IZQ, BOX CULVERT K34+658 Y CANAL DESCOLE ODT K35+345
3542	49980-CE-3542	9/06/2025	2025E-VUVRAZ-061772	ACTUALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA
3543	49980-CE-3543	10/06/2025		RESPUESTA RADICADO 43156- ENTREGA DE REPORTE DE VISITA DE CAMPO ESPECIALISTA DE GEOTÉCNIA 11 DE ABRIL DE 2025. INFORME DE VISITA ESPECIALISTA EN GEOTECNIA INTERVENTORÍA 04 y 05 DE JUNIO DE 2025
3544	49980-CE-3544	11/06/2025		SU COMUNICADO 43449 ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No. 6
3545	49980-CE-3545	11/06/2025		RADICADO 43553- RESPUESTA A RADICADO 316765 COMUNICADO 49980-CE-3490 RESPUESTA RADICADO 43101 – “SOLICITUD DE APROBACIÓN DE INSTALACIÓN DE MALLA TRIPLE TORSIÓN EN TALUDES EROSIONADOS.”
3547	49980-CE-3547	11/06/2025		SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN DE RIESGOS GEOTÉCNICOS A LOS PROPIETARIOS DEL PREDIO PR 41+880 Y ACCIONES CORRESPONDIENTES
3548	49980-CE-3548	12/06/2025		APREMIO N2 - INCUMPLIMIENTO / IMPOSICIÓN DE MULTAS - REITERACIÓN DE REQUERIMIENTO PARA Q SE EJECUTE DE MANERA INMEDIATA Y URGENTE LA “SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL JURÍDICO PREDIAL” EXIGIDA 2024S-VBOG-098973 Y N. 2025S-VBOG-035800 DE 2025-05-30
3549	49980-CE-3549	12/06/2025		INFORME ENSAYO DE CAMPO PARA VERIFICACIÓN DE INFILTRACIÓN
3550	49980-CE-3550	13/06/2025	2025E-VUVRAZ-064091	SOLICITUD DE APROBACIÓN PROFESIONAL PREDIAL – PAULA PIÑERO B
3551	49980-CE-3551	12/06/2025		RADICADO 43707 – RESPUESTA COMUNICADO 41436-PROPUESTA ESTRUCTURA GUARDAGANADO EN ACCESO K34+512 Y EXCAVACIÓN SISTEMA DE DRENAJE ODT S K35+345 Y K35+432. SECTOR LAS FLORES

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3552	49980-CE-3552	12/06/2025	2025E-VUVRAZ-063819	MANEJO INADECUADO RESIDUOS VEGETALES EN LA VÍA PR 43+450
3553	49980-CE-3553	13/06/2025		RADICADO 43717 - MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE MATERIALES EN LOS BROCHES PENDIENTES POR PAVIMENTAR DEL K25+000 Y K27+200 PARA MITIGAR LOS ESFUERZOS DE EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DE LA SUBRASANTE
3554	49980-CE-3554	13/06/2025		RT RAD. 43720 Y DEMÁS INSUMOS JURÍDICOS Y PREDIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO – OF N 2024S-VBOG-098973 DE 2024-12-27 y OF N 2025S-VBOG-035800 DE 2025-05-30, Y DE ACUERDO CON LO REQUERIDO POR ESTA INTERVENTORÍA EN COM N. CE-3548 DEL 11-06-2025
3555	49980-CE-3555	13/06/2025		CONDICIÓN INSEGURA PR 43+350
3556	49980-CE-3556	13/06/2025		RESPUESTA RADICADO 43625 RESPUESTA RADICADO 49980-CE-3521 CONDICIÓN INSEGURA PR 11+900
3557	49980-CE-3557	13/06/2025	2025E-VUVRAZ-064155	SOLICITUD CONCEPTO NO OBJECCIÓN PLAN DE INVERSION AMBIENTAL V. 6
3558	49980-CE-3558	13/06/2025		RESULTADOS ENSAYOS PDC EN MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO PUENTE K45+700
3559	49980-CE-3559	13/06/2025		RESPUESTA COMUNICADO 43529 DEL 04 DE JUNIO DE 2025- APROBACIÓN INFORME ACTIVIDADES SOCIALES N°87 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
3560	49980-CE-3560	13/06/2025	2025E-VUVRAZ-064648	SU COMUNICADO 43461 RADICADO PREACTA DE OBRA No. 48, MAYO 2025 PARA REVISIÓN
3561	49980-CE-3561	17/06/2025		RADICADO 43624 – PROPUESTA OBRA MITIGACIÓN ENCOLE BOX CULVERT K25+730 DER
3562	49980-CE-3562	17/06/2025		RTA RAD 43707- RTA A RDO CODO CE-3325 ALCANCE CADO CE- 3318- RTA COMUNICADO 41436-PROPUESTA ESTRUCTURA GUARDAGANADO EN ACCESO K34+512 Y EXCAVACIÓN SISTEMA DE DRENAJE ODT S K35+345 Y K35+432. SECTOR LAS FLORES

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3563	49980-CE-3563	17/06/2025	2025E-VUVRAZ-065385	RESPUESTA RADICADO 2025S-VBOG-040173 DE ASUNTO SOLICITUD DE PÓLIZAS AJUSTADAS A LA ADICIÓN NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1050 DE 2021 SANTA LUCIA - MOÑITOS
3564	49980-CE-3564	18/06/2025	2025E-VUVRAZ-066203	ENTREGA INFORME TRIMESTRAL DE INTERVENTORIA NO. 15 – COMPONENTE DE SOSTENIBILIDAD
3565	49980-CE-3565	18/06/2025		RESPUESTA COMUNICADO 43538- ENTREGA SOPORTES ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD MES DE MAYO DE 2025
3566	49980-CE-3566	17/06/2025		ÚLTIMO APREMIO NO. 3 - INCUMPLIMIENTO / IMPOSICIÓN DE MULTAS _ REITERACIÓN DE REQUERIMIENTO PARA Q SE EJECUTE DE MANERA INMEDIATA Y URGENTE LA “SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL JURÍDICO PREDIAL”
3567	49980-CE-3567	18/06/2025	2025E-VUVRAZ-066075	ALCANCE COMUNICACIÓN 49980-CE-3550 SOLICITUD DE APROBACIÓN PROFESIONAL PREDIAL – PAULA PIÑERO B
3568	49980-CE-3568	2/07/2025	2025E-VUVRAZ-070998	PRONUNCIAMIENTO FRENTE A RADICADO DEL CONTRATISTA NO. 43432 DEL 26 DE MAYO DE 2025 Y SU ALCANCE CON NO. 43965 DEL 20 DE JUNIO DE 2025. REFERENTE A LA VIABILIDAD O NO DE RECONOCER VALORES DIFERENTES A LOS CONTEMPLADOS EN EL APÉNDICE F
3570	49980-CE-3570	19/06/2025		APREMIO POR FALTA MANTENIMIENTO REVEGETALIZACION DE LOS TALUDES CON MALLA TRIPLE TORSION
3571	49980-CE-3571	1/07/2025		RESPUESTA A SU RADICADO 43844 – “SOLICITUD APROBACIÓN INSTALACIÓN DE MALLA TRIPLE TORSIÓN ENTRE EL PR 13+110/128 CD.
3572	49980-CE-3572	24/06/2025	2025E-VUVRAZ-067909	REQUERIMIENTO LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL EN EL CORREDOR VIAL
3573	49980-CE-3573	24/06/2025		RADICADO 43493 - PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS FUNCIONALES PARA INTERVENCIÓN DE LOSAS CON AFECTACIONES
3574	49980-CE-3574	24/06/2025		RESPUESTA COMUNICADO 43857- RESPUESTA RADICADO 49980-CE-3561 - PROPUESTA OBRA MITIGACIÓN ENCOLE BOX CULVERT K25+730 DER

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3575	49980-CE-3575	24/06/2025		RESPUESTA RADICADO 43717- MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE MATERIALES EN LOS BROCHES PENDIENTES POR PAVIMENTAR DEL K25+000 Y K27+200 PARA MITIGAR LOS ESFUERZOS DE EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DE LA SUBRASANTE
3576	49980-CE-3576	24/06/2025	2025E-VUVRAZ-068239	SOLICITUD CRONOGRAMA Y PLAN DE INVERSIÓN PREDIAL AJUSTADO A DICIEMBRE 31 DE 2025
3577	49980-CE-3577	25/06/2025		RADICADO 43873 – DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN CON BARRERA DE TRAFICO K41+150 CI
3578	49980-CE-3578	25/06/2025		ALCANCE COMUNICADO 49980-CE-3515- RESPUESTA RADICADO 43182- ALCANCE A COMUNICACIÓN No 42837. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS FUNCIONALES PARA INTERVENCIÓN DE LOSAS CON AFECTACIONES
3579	49980-CE-3579	24/06/2025		SOLICITUD DE PÓLIZAS AJUSTADAS A LA ADICIÓN NO. 1 Y PRORROGA NO. 1
3580	49980-CE-3580	25/06/2025	2025E-VUVRAZ-068378	ESTADO DE TRÁMITE – ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No.6 Y PLAN DE CARGAS No.6
3581	49980-CE-3581	2/07/2025	2025E-VUVRAZ-071028	RESPUESTA RADICADOS 43660 Y RADICADO 43811 DE ASUNTO: ALCANCE AL RADICADO 43660 - PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE OBRA ALTERNATIVAS PATOLOGÍAS DE MR
3582	49980-CE-3582	25/06/2025		RADICADO 43939- ENTREGA DE DISEÑOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE CON GRANO CAUCHO (M-GCR-19) Y MDC-10 PARA ALTERNATIVAS PRESENTADAS EN SITIOS CLASIFICADOS COMO LEVES Y MODERADOS
3583	49980-CE-3583	25/06/2025	2025E-VUVRAZ-068894	REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) Y SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA DONACIÓN DE MATERIAL SOBRANTE PR 25+730 LADO DERECHO
3584	49980-CE-3584	25/06/2025		RADICADO 43953– DISEÑO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL K31+350 CARRIL DERECHO
3585	49980-CE-3585	25/06/2025		CONTESTACIÓN ACCIÓN DE TUTELA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3586	49980-CE-3586	25/06/2025	2025E-VUVRAZ-068782	SOLICITUD INGRESO PROFESIONAL PREDIAL
3857	49980-CE-3587	26/06/2025		RESPUESTA RADICADO 43601- PROPUESTA PROTECCIÓN DE SOCAVACIÓN DE TERRAPLÉN CON BORDILLO-CUNETA ENTRE EL K34+310 AL K34+382 DER
3588	49980-CE-3588	27/06/2025		RESPUESTA COMUNICADO 42754 DEL 28 DE MAYO DE 2025 -APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD
3589	49980-CE-3589	7/07/2025		ALCANCE COMUNICADO 49980-CE-3592- MEMORANDO TÉCNICO MT-2385-CM456-2025 INFORME GEOTERRA
3590	49980-CE-3590	27/06/2025		RADICADO 43987 -ENTREGA DE CONCEPTOS TÉCNICOS HIDRÁULICOS PARA LA DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE PUENTES EXISTENTES EN K34+500-K45+300 Y K45+700

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Correspondencia recibida Junio de 2025.

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4274	49980-CR-4274	5/06/2025	79349980 – MEM-0155	RESPUESTA AL OFICIO 49980-CE-3528 MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE MATERIALES EN LOS BROCHES PENDIENTES POR PAVIMENTAR DEL K25+000 Y K27+200 PARA MITIGAR LOS ESFUERZOS DE EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DE LASUBRASANT
4275	49980-CR-4275	5/06/2025	43563	REMISIÓN DE MODELO DE INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA DEL PREDIO 002-D-T3-MSM, PERMISO DE INTERVENCIÓN Y ACTA DE ENTREGA
4276	49980-CR-4276	5/06/2025	43574	ENTREGA INFORME MENSUAL IMPLEMENTACION SG-SST MAYO 2025
4277	49980-CR-4277	6/06/2025	43581	ALCANCE RADICADO No 43493. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR MES DE JUNIO DE 2025
4278	49980-CR-4278	6/06/2025	43580	REMISIÓN DE INFORME MENSUAL PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025
4279	49980-CR-4279	6/06/2025	2025S-VBOG-037308	RESPUESTA AL RADICADO No. 2025E-VUVRAZ-059628
4280	49980-CR-4280	6/06/2025	43601	PROPUESTA PROTECCIÓN DE SOCAVACIÓN DE TERRAPLÉN CON BORDILLO-CUNETAS ENTRE EL K34+310 AL K34+382 DER
4281	49980-CR-4281	9/06/2025		RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3488 CUYO ASUNTO SE REFERENCIA COMO "RADICADO 43156 ENTREGA DE REPORTE VISITA DE CAMPO ESPECIALISTYA DE GEOTECNIA 11 DE ABRIL DE 2025"
4282	49980-CR-4282	9/06/2025	43624	PROPUESTA OBRA MITIGACIÓN ENCOLE BOX CULVERT K25+730 DER
4283	49980-CR-4283	9/06/2025	43625	RESPUESTA RADICADO 49980-CE-3521 CONDICIÓN INSEGURA PR 11+900
4284	49980-CR-4284	10/06/2025		INFORME JURIDICO PREDIAL ABRIL 2025
4285	49980-CR-4285	10/06/2025		INFORME JURIDICO PREDIAL MAYO 2025
4286	49980-CR-4286	10/06/2025	43660	PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE OBRA ALTERNATIVAS PATOLOGÍAS DE MR

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4287	49980-CR-4287	11/06/2025	43697	RDO CVS N 20251106304 EN EL CUAL SE RTE EL INFORME TÉCNICO FINAL AÑO 3 DEL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DEL SECTOR DE LAS OBRAS OBJETO DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y RDO CVS N. 20251106232 EN EL CUAL SE RTE EL INFORME MANTENIMIENTO DE 15,84 HA AÑO 2.
4288	49980-CR-4288	11/06/2025	43706	RESPUESTA A RADICADO 316212 COMUNICADO 49980-CE-3478 RESPUESTA COMUNICADO 42865 - ENTREGA SOPORTES ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ABRIL 2025
4289	49980-CR-4289	11/06/2025	43707	RTA A RDO COMUNICADO 49980-CE-3325 ALCANCE COMUNICADO 49980-CE- 3318- RTA COMUNICADO 41436-PROPUESTA ESTRUCTURA GUARDAGANADO EN ACCESO K34+512 Y EXCAVACIÓN SISTEMA DE DRENAJE ODT S K35+345 Y K35+432. SECTOR LAS FLORES
4290	49980-CR-4290	12/06/2025	43714	REITERACIÓN N° 12 DE LOS COMU CON No. 43089 DEL 13/05/2025, "SOLICITUD DE DOS (02) MESAS DE TRABAJO SEMANAL PRESENCIAL O VIRTUAL CON TEMARIOS PREVIOS A SURTIR EN CADA REUNIÓN CON LOS PROFESIONALES TÉCNICO Y JURÍDICO PREDIALES CONTRATISTA E INTERVENTORÍA"
4291	49980-CR-4291	12/06/2025	43715	RTA RDO COMUNICADO 49980-CE-3518 SOLICITUD. CON ASUNTO "SOLICITUD ASISTENCIA PRESENCIAL EN INVÍAS PARA MESA DE TRABAJO PREDIALMIÉRCOLES 04 DE JUNIO DE 2025.
4292	49980-CR-4292	12/06/2025	2025S-VBOG-039163	RESPUESTA AL RADICADO No 2025E-VUVRAZ-060725, REVISIÓN PRE-ACTA PREDIAL MAYO 2025
4293	49980-CR-4293	12/06/2025	43717	RTA A RAD 49980-CE-3537 RTA RDO 43429 - MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE MATERIALES EN LOS BROCHES PENDIENTES POR PAVIMENTAR DEL K25+000 Y K27+200 PARA MITIGAR LOS ESFUERZOS DE EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DE LA SUBRASANTE
4294	49980-CR-4294	12/06/2025	43720	REMISIÓN DE MODELO DE ALCANCE DE OFERTA DE COMPRA DEL PREDIO 001-I-T10-MSM Y OFERTA DE COMPRA DEL PREDIO 006-DT6-MSM
4295	49980-CR-4295	13/06/2025	43733	RESPUESTA RADICADO 318382 49980-CE-3533 RESPUESTA 42478 – "APU DE MANTENIMIENTO - MONITOREO AÑO 3"

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4296	49980-CR-4296	13/06/2025	43734	RESPUESTA RADICADO 49980-CE-3519 DEVOLUCIÓN. CON ASUNTO "RESUMEN MESA TRABAJO DEL 27 DE MAYO DE 2025 - APROBACIÓN Y REMISIÓN DE INSUMOS APROBADOS. – DEVOLUCIÓN INSUMO REMITIDO CON RADICADO 42969."
4297	49980-CR-4297	13/06/2025	43738	REMISIÓN INFORME SOSTENIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
4298	49980-CR-4298	13/06/2025	43747	NOTA TECNICA ACTUALIZACION DURANTE CONSTRUCCION VERIFICACION COTA FUNDACION ALETAS EN ESTRIBOS DEL PUENTE K45+700
4299	49980-CR-4299	16/06/2025	43755	RESPUESTA RADICADO 319245 49980-CE-3552 MANEJO INADECUADO RESIDUOS VEGETALES EN LA VÍA PR 43+450- RADICADO 319370 49980-CE-3555 CONDICIÓN INSEGURA PR 43+350
4300	49980-CR-4300	16/06/2025	D055-25	COMUNICACIÓN INTERNA 49980-CE-3551. RADICADO 43707 - PROPUESTA ESTRUCTURA GUARDAGANADO EN ACCESO K34+512 Y EXCAVACIÓN SISTEMA DE DRENAJE ODT'S K35+345 Y K35+432. SECTOR LAS FLORES
4301	49980-CR-4301	17/06/2025	43770	REITERACIÓN N° 13 "SOLICITUD DE DOS (02) MESAS DE TRABAJO SEMANAL PRESENCIAL O VIRTUAL CON TEMARIOS PREVIOS A SURTIR EN CADA REUNIÓN CON LOS PROFESIONALES TÉCNICO Y JURÍDICO PREDIALES CONTRATISTA E INTERVENTORÍA"
4302	49980-CR-4302	17/06/2025	2025S-VBOG-040173	SOLICITUD DE PÓLIZAS AJUSTADAS A LA ADICIÓN NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1050 DE 2021 SANTA LUCIA - MOÑITOS
4303	49980-CR-4303	17/06/2025	2025S-VBOG-040169	RESPUESTA RADICADO 2025E-VUVRAZ-025850 - REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES NO 13 VIGENCIA 2025-APREMIO - PROYECTO SANTA LUCIA - MOÑITOS
4304	49980-CR-4304	17/06/2025	2025S-VBOG-040174	SOLICITUD DE PÓLIZAS AJUSTADAS A LA ADICIÓN NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 DEL CONTRATO 923 DE 2021 SANTA LUCIA - MOÑITOS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4305	49980-CR-4305	17/06/2025	43811	ALCANCE AL RADICADO 43660 - PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE OBRA ALTERNATIVAS PATOLOGÍAS DE MR
4306	49980-CR-4306	18/06/2025	43819	RESPUESTA AL OFICIO BAJO EL RADICADO DE SALIDA 2025S-VBOG-035800 DE FECHA 2025-05-30
4307	49980-CR-4307	18/06/2025	43821	REMISIÓN DE MODELO DE OFERTA DE COMPRA DEL PREDIO 003-IT7-MSM
4308	49980-CR-4308	19/06/2025	43843	ENTREGA SEGURIDAD SOCIAL INGRESO DE PERSONAL A OBRA – ACTIVIDAD INSTALACION DEFENSAS METALICAS
4309	49980-CR-4309	19/06/2025	43844	SOLICITUD APROBACIÓN INSTALACIÓN DE MALLA TRIPLE TORSIÓN ENTRE EL PR 13+110 AL PR 13+128 COSTADO DERECHO
4310	49980-CR-4310	19/06/2025	43850	ENTREGA INFORME SEMANAL DE IMPLEMENTACIÓN PMT Y SEÑALIZACION VIAL DEL 03 AL 14 DE JUNIO 2025
4311	49980-CR-4311	19/06/2025	43857	RESPUESTA RADICADO 319687 COMUNICADO 49980-CE-3561 - PROPUESTA OBRA MITIGACIÓN ENCOLE BOX CULVERT K25+730 DER
4312	49980-CR-4312	20/06/2025	43868	ALCANCE COMUNICACIÓN 42885- RESPUESTA RADICADO 314486- SOLICITUD INSTALACIÓN BARANDAS LATERALES, PR 30 Y 31 VEREDA ABRE LOS OJOS
4313	49980-CR-4313	20/06/2025	79349980 – MEM-0156	49980-CE-3532 con asunto: RADICADO 43493- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE- 3515. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS FUNCIONALES PARA INTERVENCIÓN DE LOSAS CON AFECTACIONES
4314	49980-CR-4314	20/06/2025	43873	DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN CON BARRERA DE TRÁFICO K41+150 CI
4315	49980-CR-4315	24/06/2025	79349980 – MEM-0157	49980-CE-3553 con asunto: RADICADO 43717- MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE MATERIALES EN LOS BROCHES PENDIENTES POR PAVIMENTAR DEL K25+000 Y K27+200 PARA MITIGAR LOS ESFUERZOS DE EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DE LA SUBRASANTE
4316	49980-CR-4316	24/06/2025	43884	REITERACIÓN N° 14 “SOLICITUD DE DOS (02) MESAS DE TRABAJO SEMANAL PRESENCIAL O VIRTUAL CON TEMARIOS PREVIOS A SURTIR EN CADA REUNIÓN CON LOS PROFESIONALES TÉCNICO Y JURÍDICO PEDIALES CONTRATISTA E INTERVENTORÍA”.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4317	49980-CR-4317	24/06/2025	43886	RT OF CE-3554. ASUNTO "PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO POR EL INVIAS SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL JURÍDICO PREDIAL" OF 2024S-VBOG-098973 DE 27/12/24, OF 2025S-VBOG-035800 DE 30/05/25, Y LO REQUERIDO POR INTERVENTORÍA EN OF N. CE-3548 DEL 11-06-25
4318	49980-CR-4318	24/06/2025	43903	COMUNICADOS CE-3548 – CE-3566 RTA. CON ASUNTO "APREMIO NO. 2 – INCUMPLIMIENTO / IMPOSICIÓN DE MULTAS, REITERACIÓN DE REQUERIMIENTO PARA QUE SE EJECUTE DE MANERA INMEDIATA Y URGENTE LA "SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL JURÍDICO PREDIAL CONTRATISTA"
4319	49980-CR-4319	24/06/2025		49980-CE-3493 con asunto: RADICADO 43182 - ALCANCE A COMUNICACIÓN No 42837. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS FUNCIONALES PARA INTERVENCIÓN DE LOSAS CON AFECTACIONES
4320	49980-CR-4320	24/06/2025	43907	RESPUESTA RADICADO No.319396 COMUNICADO 49980-CE-3560; SU COMUNICADO 43461 RADICADO PREACTA DE OBRA No. 48, MAYO 2025
4321	49980-CR-4321	24/06/2025	43925	REMISION DE ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE
4322	49980-CR-4322	25/06/2025	43939	ENTREGA DE DISEÑOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE CON GRANO CAUCHO (M-GCR-19) Y MDC-10 PARA ALTERNATIVAS PRESENTADAS EN SITIOS CLASIFICADOS COMO LEVES Y MODERADOS
4323	49980-CR-4323	25/06/2025	43941	RESPUESTA RADICADO No.319141 COMUNICADO 49980-CE-3544; SU COMUNICADO 43449 ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No. 6
4324	49980-CR-4324	25/06/2025	43948	RESPUESTA RADICADO 319275- 49980-CE-3547 - SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN DE RIESGOS GEOTÉCNICOS A LOS PROPIETARIOS DEL PREDIO PR41+880 Y ACCIONES CORRESPONDIENTES
4325	49980-CR-4325	25/06/2025	43953	DISEÑO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN EL K31+350 CARRIL DERECHO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4326	49980-CR-4326	25/06/2025	43965	ALCNCE RAD 43432 COM CE-3467 RTA "RTA A SU OF 42291 DEL 31/03/25 RTA 2025S- VBOG-020075 A) SILENCIO ADTIVO POSITIVO - MATERIALIZACIÓN IPSO IURE O DE PLENO DERECHO B)VIABILIDAD O NO DE RECONOCER VALORES DIFERENTES A LOS CONTEMPLADOS EN EL APÉNDICE F"
4327	49980-CR-4327	25/06/2025	43969	RESPUESTA A RADICADO 319375 COMUNICADO 49980-CE-3556 RESPUESTA RADICADO 43625 RESPUESTA RADICADO 49980-CE- 3521 CONDICIÓN INSEGURA PR 11+900
4328	49980-CR-4328	26/06/2025		49980-CE-3494 CON ASUNTO: RADICADO 43191- ANALISIS DE SEGUIMIENTO TOPOGRAFICO EN PUNTOS DE CONTROL DEFORMACIONES DEL CORREDOR SANTA LUCIA – MOÑITOS. PAVIMENTO FLEXIBLE: K2+150 – K8+000. PAVIMENTO RÍGIDO: K8+000 – K8+650. K12+000 – K13+400
4329	49980-CR-4329	26/06/2025		49980-CE-3513 CON ASUNTO: RADICADO 43348- RESPUESTA RADICADO NO 316785 COMUNICADO 49980-CE-3486 PLANTEAMIENTO METODOLOGÍA PARA CATEGORIZACIÓN DE TRAMOS
4330	49980-CR-4330	26/06/2025	43987	ENTREGA DE CONCEPTOS TÉCNICOS HIDRÁULICOS PARA LA DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE PUENTES EXISTENTES EN K34+500-K45+300 Y K45+700
4331	49980-CR-4331	26/06/2025	43991	ENTREGA SEGURIDAD SOCIAL INGRESO DE PERSONAL A OBRA – ACTIVIDAD DE PINTURA TRAFICA
4332	49980-CR-4332	26/06/2025		49980-CE-3527 CON ASUNTO RADICADO 43426- ENTREGA INFORME DE AUSCULTACIÓN DE DAÑOS PRESENTADOS SOBRE PAVIMENTOS DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA MOÑITOS
4333	49980-CR-4333	27/06/2025	44003	RESPUESTA RADICADO NO 320120 COMUNICADO 49980-CE-3576. CON ASUNTO "SOLICITUD CRONOGRAMA Y PLAN DE INVERSIÓN PREDIAL AJUSTADO A DICIEMBRE 31 DE 2025"
4334	49980-CR-4334	27/06/2025	2025S-VBOG-043806	RESPUESTA AL RADICADO NO 2025E-VUVRAZ-047409 PRE-ACTA SOCIAL NO.47 ABRIL 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4335	49980-CR-4335	27/06/2025		49980-CE-3532 CON ASUNTO RADICADO 43493- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE- 3515. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS FUNCIONALES PARA INTERVENCIÓN DE LOSAS CON AFECTACIONES
4336	49980-CR-4336	1/07/2025	44030	RESPUESTA APREMIO DE MULTA RADICADO 319890 - 49980-CE- 3570
4337	49980-CR-4337	1/07/2025	44048	ENTREGA INFORME MENSUAL MEPI SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
4338	49980-CR-4338	1/07/2025	44052	VERIFICACIÓN Y RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS GAVIONES UBICADOS EN EL K39+600
4339	49980-CR-4339	1/07/2025	44053	VERIFICACIÓN Y NOTA TÉCNICA DE GEOTÉCNIA PARA MURO DE CONTENCIÓN EN EL K40+260
4340	49980-CR-4340	1/07/2025	44054	ENTREGA DE RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO DEL TALUD K45+100

8.2. Registro Fotográfico.



Puente PR 45+700 lado izquierdo. Excavacion caisson muro de acompañamiento.



PR 45+700 lado izquierdo. Toma de muestras para ensayos de laboratorio.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 45+480 a mayor lado izquierdo. Perfilación de talud.



Disipador PR 8+856 lado derecho. Instalación de formaletas para fundida de solado.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 25+950 a mayor carril derecho. Costuras a losas en Concreto MR40.



PR 23+650 a menor del lado derecho. Limpieza y sello de juntas entre pavimento y cunetas.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Disipador PR8+856 lado derecho. Instalación de solado.



PR 8+530 carril derecho. Demolición de losa #118 y 119.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Puente PR 45+700. Toma de muestras para ensayos de laboratorio a material de excavación en Caisson muro de acompañamiento.



PR 34+500 lado izquierdo. Instalación de parrilla guarda ganado.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Box culvert PR 34+658 lado derecho. Se realizan actividades de excavación.



Box Culvert PR 34+658 lado derecho. Demolición de ODT existente.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Puente PR 45+700 lado izquierdo. Excavaciones de caisson.



PR 45+480 a mayores, lado izquierdo. Perforaciones para instalación de pernos en talud.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 8+925 lado derecho. Ensayo de filtración con anilina.



PR 9+200 a mayores. Toma de reflectividad a señalización vertical.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 45+700 margen izquierda. Instalación de defensas en laterales sobre box culvert acceso a vereda Membrillal.



Puente PR 45+700 lado izquierdo. Ensayo PDC en caisson 2 - estribo 1, muro de acompañamiento.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Disipador PR 8+856, lado derecho. Instalación de formaletas para fundida de muros.



Puente PR 45+700. Acero de canastas caisson muro de acompañamiento.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 46+420-46+430 lado derecho. Instalación de malla triple torsión para protección de talud.



PR 8+925 lado derecho. Lleno con material de terraplén tipo corona en el apique realizado para el ensayo de infiltración con anilina.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 8+925 lado derecho. Toma de densidades.



PR 9+800 a mayores, carril izquierdo. Costuras de módulos en concreto MR 40.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Disipador PR8+856 lado derecho. Fundida de muros.



Disipador PR 8+856 lado derecho. Ensayo de asentamiento y toma de muestras al concreto utilizado en la fundida de los muros.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 8+225 Lado izquierdo. Demolición del módulo en concreto MR 40 #115.



Puente PR 45+700 lado izquierdo. Fundida de caisson muro de acompañamiento.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR45+700 lado izquierdo. Asentamiento y toma de muestras de concreto en la fundida de caisson 3 y 4 del muro de acompañamiento.



Disipador PR 8+856 lado derecho. Fundida de losa de empalme.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 4+400 lado derecho (acopio). Toma de muestras de los agregados del concreto para ensayos de laboratorio.



PR 45+480 a mayores, lado izquierdo. Instalación de malla triple torsión y geomanto para protección de talud.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Box Culvert PR 34+658 lado derecho. Amarre acero de refuerzo para parrilla losa inferior.



Puente PR 45+700 lado izquierdo. Instalación de acero de refuerzo de zarpa muro de acompañamiento estribo 1.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Alcantarilla PR 25+700 lado derecho. Demolición de ODT existente.



Puente PR 45+700 lado izquierdo. Desencofrado de zarpa, muro de acompañamiento estribo #1.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Broche PR 25+700-PR 25+725 lado derecho. Mejoramiento sobre carril.



Broche PR25+700 al PR25+725 lado derecho. Toma de densidades en el mejoramiento con material de terraplén.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 5+420-PR 5+470 lado derecho. Instalación de defensas metálicas.



Box Culvert PR 34+658, lado izquierdo. Encofrado de muro sur.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Broche PR 25+700-25+750 carril derecho. Chequeo de niveles a material de terraplén instalado.



Broche PR 25+700-PR25+750 carril derecho. Instalación de subbase.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 26+352 lado derecho. Perforación para instalación de pernos en talud.



PR16+990. Imprimación en resaltos tipo pompeyanos.

8.3. Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales.

	
Foto 1. Recorrido especialista en geotecnia tratamiento taludes	Foto 2. Instalación Pasto Vetiver PR 12+780/850 izq.
	
Foto 3. Instalación Pasto Vetiver PR 5+770 izq.	Foto 4. Instalación malla triple torsión PR 45+480/550 izq.
	
Foto 5. Siembra Pasto Vetiver PR 5+800 izq.	Foto 6. Resiembra pasto semilla al voleo PR 30+900 der.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS



ATENCIÓN AL USUARIO



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Verificación de especies y construcciones afectadas



Descripción: Vista general del predio y de especies

Descripción: Vista de especies y cerca



Verificación de especies y mejoras afectadas



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 49

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

8.4. BITÁCORA

de lechada y reinstalación de sellante BITUFLEX.

- Costura de losas PM25+922 / PM26+932 cder (713, 714, 715, 716 y 717)
 - Se organiza Señalización del PR8+000 / PR13+860 calzada.
 - Se adecua e instala Parilla de obra guardagigante en el PR34+500 lado 129 (Acceso Vereda San José)
- Estado del tiempo: Soleado.

Interventoría

Amaru Guzman - Ing. Residente

Contratista

Jaime Sanchez - Ing. Residente

03 de Junio 2025 (Martes).

- Perfilado de talud PM45+500 / PM45+540 lado 129, este talud tenía manto TRM500.
 - Excavación, acero y fundida de anillo 4 de los caisson 1 y 2, muro de acompañamiento estribo 1; anillo 4 de los caisson 3 y 4, muro de acompañamiento estribo 2.
 - Solado disipador PM8+856 lado derecho.
 - Instalación de malla triple torsión en el PM15+420 / PR15+460 lado 129.
 - Limpieza en junta longitudinal de las cunetas del PM23+650 a menores lado derecho, para aplicar lechada y reinstalación de sellante BITUFLEX.
 - Demolición de losas 118 en el PM8+525 Cder, para realizar ensayos.
- Estado del tiempo: Lluvias de 2:00 a 3:00 pm.

Interventoría

Amaru Guzman - Ing. Residente.

Contratista

Jaime Sanchez - Ing. Residente


04 - Junio de 2025 (miércoles).


- se realiza recorrido con la especialista en geotecnia de interventoría en compañía con el contratista, se evalúan los puntos los cuales pueden requerir posiblemente una intervención de obras de contención; los sitios son los reportados por el contratista en el oficio 43156. Y se revisan los sitios nuevos Propuestas por el contratista para instalación de malla triple torsión en el oficio 43101.
- Perfilado de talud PR45+520 / PR45+542 lado der.
- Excavación, acero y fundida de anillo 5 de los caisson 1 y 2, muro de

acompañamiento estribo 1; Anillo 5 de los caisson 3 y 4, muro de acompañamiento estribo 2.

- Excavación y demolición losa superior en Box Culvert PR 34+658 lado derecho.
- Se retira defensa en el PR 34+645 lado izq, para adecuar acceso a Predio (una vez realizada esta actividad el contratista debe realizar la reinstalación de los cuerpos de defensa).
- Instalación acero de refuerzo muros y losa dissipador K8+856 lado derecho.
- Costura de losa en el PR 25+952/PR 25+983 c der (724, 725, 726, 727, 728, 729 y 730)

Estado del tiempo: Soleado.



Interventoria



Contratista

05 de Junio 2025 (Jueves).

- Se funda losa dissipador descale ODT PR 8+856 lado derecho
- Se realiza excavación hasta anillo 6 caissons en estribos 1 y 2 puente PR 45+700 lado izquierdo
- Se instala malla triple torsión talud PR 15+510/540 der.
- Demolición parcial de muros box PR 34+658 lado derecho
- Sello con polibit entre pavimento y cuneta PR 11+370/345 der. y PR 11+312/340 izq.
- Reparación de losas pavimento MR 40 en módulos #792, 693 y 694, 709, 710, 711, 712 entre el PR 25+870/900 carril izquierdo
- Se realiza demolición losa MR 40 # 118 PR 8+525 lado derecho para ensayo de infiltración con anilina en apique de 2,5 m de profundidad. Acompañamiento esp. geotecnia y lab. CUN
- Se realiza reflectividades de señalización vertical entre el PR 2 y el PR 9+200

Estado del tiempo - Soleado


Interventoria


Contratista

6 de junio 2025 (Viernes)

- Excavación en caissons hasta anillo 2 en estribos 1 y 2 del puente PR 45+700 lado izquierdo
- Instalación de malla triple torsión PR 46+420/430 lado derecho
- Se continúa con demolición de muros box PR 34+658 lado derecho
- Sello con polibit entre pavimento MR 40 y cunetas PR 24+230/422 y PR 11+312/340 lado derecho
- Reparación de losas pavimento MR 40 con costura # 713, 715, 716, 717, 719 y 720 PR 25+810/820 carril izquierdo

Estado del tiempo = Soleado

Interventora

Contratista

7 de junio 2025 (Sábado)

- Perforación de pernos de anclaje en talud PR 45+480 lado izquierdo
- Instalación de malla triple torsión talud PR 46+420/430 lado derecho
- Se funda muro dissipador descale ODT PR 8+856 lado derecho
- Excavación en caissons hasta anillo 9 en estribos 1 y 2 del puente PR 45+700 lado izquierdo
- En la excavación paralela al gorgo en el PR 8+525 lado derecho no se observa ningún tipo de filtración o humedad en el terreno por la anilina vertida
- Reparación de lasas pavimento MR con costuras modulos # 725 al 733 PR 25+956/996 carril derecho

Estado del tiempo = Soleado


Interventora


Contratista

9 de junio 2025 (Lunes)

- Se continúa demolición ODT tipo box PR 34+658 lado derecho
- Perforación para pernos de anclaje talud PR 45+480/540 lado izquierdo
- Reparación de losas pavimento MR 40 con costura # 360 a la 372 PR 9+600/656 carril izquierdo
- Se termina excavación caissons muro de acompañamiento PR 45+700 lado

izquierdo quedando las profundidades asf: 1= 9,66m; 2=9,71m; 3=9,5m; 4=9,91m
Estado del tiempo= Soleado



Interventoría


Contratista

10 de junio 2025 (martes)

- Sello con polibit entre pavimento y cuneta PR 24+950 lado derecho
 - Perforación para pernos anclaje talud PR 45+480/540 lado izquierdo
 - Reparación de bases pavimento MR 40 con costura módulos # 374 al 381 PR 9+656/690 carril izquierdo
 - Se continúa con la demolición estructural ODT tipo box PE 34+658 der.
- Estado del tiempo= Soleado



Interventoría



Contratista

11 de junio 2025 (miércoles)

- Se fundo muros dissipador descole ODT PR 8+556 lado derecho
- Se continúa con excavación en ODT tipo box PE 34+658 lado derecho
- Perforación para pernos de anclaje talud PR 45+480/540 lado izquierdo
- Reparación de bases de pavimento MR 40 módulos # 374 al 381 PR 9+656/690 carril izquierdo con costuras
- Se realiza lleno por capas en gorgue PR 8+525 carril derecho donde se realizó ensayo de infiltración con anilina

Estado del tiempo= Soleado



Interventoría



Contratista

12 de junio 2025 (jueves)

- Instalación malla triple torsión talud PR 45+480/540 lado izquierdo. Se instala geomanto
- Reparación de bases pavimento MR 40 módulos # 360 a la 369 PR 9+568/643 carril derecho con costuras
- Se realiza demolición módulo # 115 PR 8+225 carril izquierdo


se toma muestras para realizar ensayo de retención de humedad
Estado del tiempo = Soleado



Interventora


Contratista

13 de junio 2025 (viernes)

- Instalación de geomanto y malla triple torsión PR 45+480/340 lado izquierdo
 - Se funde caisson #1,3,4 de muro de acompañamiento puente PR 45+700 lado izquierdo
 - Sello junta entre cuneta y pavimento PR 24+900/990
 - No se realiza reparación de losas pavimento MR 40 con costuras
- Estado del tiempo = Soleado


Interventora



Contratista

14 de junio 2025 (sábado)

- Instalación de geomanto talad PR 45+480/540 lado izquierdo
- Se funde caisson #2 muro de acompañamiento Puente PR 45+700 lado izquierdo
- Reparación de losas pavimento MR 40 con costura módulos # 382, 386, 391, 392, 393 y 394 carril derecho
- No se realiza trabajos en ODT tipo Box PR 34+658 prolongación de por inundación

Estado del tiempo = Soleado


Interventora


Contratista


16 de junio 2025 (lunes)

- Instalación de geomanto y malla triple torsión PR 45+480/540 lado izquierdo
- Se realiza reparaciones de losas MR 40 con costura en las que presentaban fisuras
- Se funde losa inferior entre aletas box colueta PR 34+658 prolongación

lado derecho

Estado del tiempo = Soleado


Interventoría



Contralista

17 de junio 2025 (martes)

- Instalación de malla triple torsión talud PR 45+480/540 lado izquierdo y geomanto
- Se funde zarpa estribos 1 y 2 puente PR 45+700 lado izquierdo
- Se funde muro dissipador descale ODT PR 8+856 lado derecho
- Se amarra acero para losa inferior box culvert PR 34+658 lado derecho

Estado del tiempo = Soleado



Interventoría



Contralista

18 de junio 2025 (miércoles)

- Se funde losa inferior box culvert PR 34+658 lado derecho
- Instalación pernos de anclaje talud PR 45+480/550 lado izquierdo
- No se realiza reparación de losas pavimento MR 40 con costuras
- Se evidenciar por parte de la Interventoría sedimentos y abundante material vegetal zanja de coronación PR 31+730/780 lado derecho

Estado del tiempo = Soleado


Interventoría


Contralista

19 de junio 2025 (jueves)

- Se funde zarpa del muro de acompañamiento Puente PR 45+700 lado izq.
 - Instalación de manto T2M-500 en talud del PR 45+480/PR 45+540 lado izq.
 - Excavación en alcantarilla doble existente PR 25+715 / PR 25+725 cder (Broche).
 - y PR 25+734 / PR 25+737 cder (Broche).
 - Perforaciones para pernos en el talud del PR 45+480 / PR 45+500 lado izq.
 - Jello de junta longitudinal en borde del PR 11+880 / PR 11+955 lado derecho
- Estado del tiempo: Soleado.

Interventor

Contratista

20 de junio 2025. (Viernes).

- Instalación de manto TRM-500 en talud PM 45+480/PR 45+450 lado izq.
 - Excavación para conformación de Vía PR 25+700/PR 25+715 cder (Broche).
 - Instalación de malla triple torsión en talud PR 45+480/PR 45+540 lado izq.
 - Instalación y conformación de material de terraplen en broche PR 25+700/PM 25+725 cder y PR 25+734/PR 25+747 cder.
 - Remoción de 7 tubos alcantarilla doble en el PR 25+705 cder.
 - Demolición solado alcantarilla PR 25+705 cder.
 - Sello de junta longitudinal en borde del PH 1+880/PR 1+905 lado der
 - Desencofrado Zarpa de estribo 1 muro acompañamiento Puente PR 45+700 lado izq, instalación acero para Zarpa en estribo 2.
 - Instalación formaleta en muro 1 Box culvert PR 34+658 lado derecho.
 - Se retoma reparación de losas en concreto MR40 del PR 9+734/PR 9+745 cdercho (modulos 395, 396, 397, 398 y 399). - método Paleativo Costura Cruzada
- Estado del tiempo: soleado.

Observaciones: El material de afirmado que se encontraba instalado en el broche del PR 25+730 fue recuperado por el contratista e instaló como primera capa del lleno que se hizo en la excavación de 1.2 m de profundidad.


Interventor


Contratista

21 de junio 2025 (Sábado).

- Se finaliza Zarpa de muro acompañamiento estribo 2 Puente PR 45+700 lado izq.
- Mejoramiento con material de terraplen en broche PR 25+700/PR 25+747 cder.
- Instalación de defensas metálicas PR 5+380/PR 5+452 cder.
- Instalación de Pernos en talud PR 45+535/PR 45+550 izq.
- Instalación de manto TRM-500 en talud PR 45+535/PR 45+550 izq.
- Instalación de formaletas para construcción muro ODT tipo box culvert PR 34+658 carril derecho.
- Reparación de losas en concreto MR40 por método Paleativo Costura Cruzada modulos 402, 403, 404, 405 y 406 del PR 9+985 a mayores. y modulos

446, 447, 448, 449 del PR10000 menores (esta es la segunda reparación que se realiza a estos módulos)
Estado del tiempo: Soleado.



Interventora


Contratista

24 de junio 2025 (Martes).


- Instalación de subbase granular en broche PR251700/PR251747 lado derecho.
 - Perfilado de talud en el PR261362/PR261354 lado derecho.
 - Instalación acero de refuerzo muro sur Box culvert PR341658 lado derecho.
 - Reparación de losas en concreto MR40 por método Paliativo Costura Cruzada módulos 437, 438 y 439 del PR91938 a mayores y módulos 444, 445, 447 y 448 c. izq. del PR91971 a mayores.
- Estado del tiempo: Soleado.



Interventora


Contratista

25 de junio 2025 (Miércoles).

- Se realiza excavación en broche box culvert PR 251730 carril izquierdo.
 - Instalación defensa metálica con abatida PR 51368/464 lado derecho.
 - Se realiza corte en el talud PR 261400/411 lado derecho.
 - Instalación de pernos de anclaje talud PR 261360/391 lado derecho.
 - Reparación de losas en concreto MR40 método paliativo costura cruzada módulos #449, 451, 452, 453, 454, 455, 456 PR91945/101026 c. izquierdo; y módulos #461 y 463 PR 101057/029 carril izquierdo.
 - Sello de juntas entre coneta y pavimento con bituflex entre el PR 241800/684 izq.
- Estado del tiempo: Soleado



Interventora



Contratista

26 de junio (jueves)

- Instalación de terraplen PR 251700/747 carril izquierdo.
- Instalación de defensas metálicas y abatidas PR 51368/452 lado izquierdo.

- Se instala pintura sobre resaltes tipo pompeyano PR 17+100, PR 18+450, PR 18+940, PR 22+700, PR 23+310,
 - Se fonde losa entre aldos box colvert PR 34+658 lado derecho
 - Perforación de pernos de anclaje en talud PR 26+360/391 lado derecho
 - Reparación de losas concreto MR 40 con método paliativo costura cruzada módulos # 464, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 PR 10+060/109 carril izquierdo
 - Sello juntas caneta y pavimento PR 25+160/325 lado derecho
- Estado del tiempo = Soleado



Interventora


Contratista

27 de junio 2025 (viernes)


- Se instala terraplen PR 25+700/747 carril izquierdo
 - Se instala defensa metálica PR 7+650/710 lado izquierdo; PR 7+770/826 lado derecho
 - Se fonde muro norte box colvert PR 34+650 lado derecho
 - Se continúa en perforación para pernos de anclaje talud PR 26+360/391 lado derecho
 - Reparación de losas concreto MR 40 con método paliativo costura cruzada módulos # 473, 474, 475, 476, 477 PR 10+100/122 c. derecho; # 454, 455, 456 PR 10+075 al PR 10+028 c. derecho.
- Estado del tiempo = Soleado y lluvias 1 hora en la tarde



Interventora


Contratista

28 de junio 2025 (sábado)

- Se instala ferropén PR 25+700/747 carril izquierdo
- Instalación de defensas metálicas PR 10+900/11+056 lado izquierdo y PR 13+614 lado izquierdo
- Se instala capa de subbase aproximada PR 25+700/747 carril izquierdo
- Se fonde muro de acompañamiento sentido sur Puente PR 45+700 lado izquierdo
- Reparación de losas concreto MR 40 con método paliativo costura cruzada módulos # 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484 PR 10+122/154 carril derecho


Interventora


Contratista
