



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9			
									VERSIÓN	1			
									PÁGINA	1 de 2			
										FECHA	05/10/2025 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE					DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CÓRDOBA				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:		1050 DE 2021					INTERVENTOR:		CONSORCIO VIAL NORTE				
MES INFORME MENSUAL:		sep-25					INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN PROYECTO: 2030". MÓDULO 3						
CONTRATO DE OBRA No:		923 DE 2021					CONTRATISTA:		CONSORCIO ISLA 066 - 2020				
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA													
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior						
2021	432821	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	Nación	principal	\$ 1.500.000.000,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	Nación	principal	\$ 78.935.467,00	\$ -						
		TOTAL				\$ 1.578.935.467,00	\$ -						
2022	100522	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	Nación	principal	\$ 2.023.610.025,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	Nación	principal	\$ 162.914.989,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	Nación	principal	\$ 24.001.302,00	\$ -						
TOTAL				\$ 2.210.526.316,00	\$ -								
2023	103523	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	Nación	principal	\$ 2.890.871.463,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	Nación	principal	\$ 232.735.700,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	Nación	principal	\$ 34.287.574,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	Nación	principal	\$ 542.000.000,00	\$ -						
TOTAL				\$ 3.699.894.737,00	\$ -								
2024	158824	C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	11	Nación	principal	\$ 2.890.871.464,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	11	Nación	principal	\$ 232.735.699,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	Nación	principal	\$ 34.287.574,00	\$ -						
TOTAL				\$ 3.157.894.737,00	\$ -								
2025	139925	C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	11	Nación	principal	\$ 1.106.253.821,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	11	Nación	principal	\$ 214.832.953,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	Nación	principal	\$ 31.650.068,00	\$ -						
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	Nación	Adición No.1	\$ 377.694.415,00	\$ -						
	388125	C-2401-0600-96-51102D-2401029-02	11	Nación	Adición No.1	\$ 1.322.305.585,00	\$ 1.046.604.798,07						
TOTAL				\$ 1.352.736.842,00	\$ 1.046.604.798,07								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 13.699.988.099,00											
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA													
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones	
1	JUNIO DE 2021	\$ 5.567.240,00	\$ 1.057.776,00	\$ 6.625.016,00	\$ -	\$ 6.625.016,00		432821 De 26/05/2021	\$ 1.572.310.451,00	\$ 11.993.363.083,00	105875 DE 10/11/2021		
2	JULIO DE 2021	\$ 39.902.600,00	\$ 7.581.494,00	\$ 54.109.110,00	\$ -	\$ 47.484.094,00		432821 De 26/05/2021	\$ 1.524.826.357,00	\$ 11.945.878.989,00	87252 DE 21/09/2021		
	ANTICIPO 1					\$ 504.201.181,00	\$ 504.201.181,00	432821 De 26/05/2021	\$ 1.020.625.176,00		73470 DE 18/08/2021		
3	AGOSTO DE 2021	\$ 91.462.600,00	\$ 17.377.894,00	\$ 162.949.604,00	\$ 10.289.820	\$ 98.550.674,00	\$ 493.911.361	432821 De 26/05/2021	\$ 922.074.502,00	\$ 11.837.038.495,00	87851 DE 23/09/2021		
4	SEPTIEMBRE DE 2021	\$ 133.582.560,00	\$ 25.380.686,00	\$ 321.912.850,00	\$ 10.289.820	\$ 148.673.426,00	\$ 483.621.541	432821 De 26/05/2021	\$ 773.401.076,00	\$ 11.678.075.249,00	113728 DE 29/11/2021		
5	OCTUBRE DE 2021	\$ 138.358.540,00	\$ 26.288.123,00	\$ 486.559.513,00	\$ 10.289.820	\$ 154.356.843,00	\$ 473.331.721	432821 De 26/05/2021	\$ 619.044.233,00	\$ 11.513.428.586,00	119350 DE 13/12/2021		
6	NOVIEMBRE DE 2021	\$ 144.901.920,00	\$ 27.531.365,00	\$ 658.992.798,00	\$ 10.289.820	\$ 162.143.465,00	\$ 463.041.901	432821 De 26/05/2021	\$ 456.900.768,00	\$ 11.340.995.301,00	121243 DE 15/12/2021		
7	DICIEMBRE DE 2021	\$ 149.210.600,00	\$ 28.350.014,00	\$ 836.553.412,00	\$ 10.289.820	\$ 167.270.794,00	\$ 452.752.081	432821 De 26/05/2021	\$ 289.629.974,00	\$ 11.163.434.687,00	123536 DE 20/12/2021		
	ANTICIPO 2					\$ 289.629.974,00	\$ 742.382.055	432821 De 26/05/2021	\$ -		124265 DE 21/12/2021	Adición de Anticipo por valor de \$289.629.974	
8	ENERO DE 2022	\$ 162.413.940,00	\$ 30.858.649,00	\$ 1.029.826.001,00	\$ 61.865.171	\$ 131.407.418,00	\$ 680.516.884	100522 De 25/01/2022	\$ 2.079.118.898,00	\$ 10.970.162.098,00	31855 DE 31/03/2022		
9	FEBRERO DE 2022	\$ 180.968.470,00	\$ 34.384.009,00	\$ 1.245.178.480,00	\$ 61.865.171	\$ 153.487.308,00	\$ 618.651.713	100522 De 25/01/2022	\$ 1.925.631.590,00	\$ 10.754.809.619,00	48853 DE 12/05/2022		
10	MARZO DE 2022	\$ 193.215.780,00	\$ 36.710.998,00	\$ 1.475.105.258,00	\$ 61.865.171	\$ 168.061.607,00	\$ 556.786.542	100522 De 25/01/2022	\$ 1.757.569.983,00	\$ 10.524.882.841,00	56306 DE 01/06/2022		
11	ABRIL DE 2022	\$ 191.876.600,00	\$ 36.456.554,00	\$ 1.703.438.412,00	\$ 61.865.171	\$ 166.467.983,00	\$ 494.921.371	100522 De 25/01/2022	\$ 1.591.102.000,00	\$ 10.296.549.687,00	63442 DE 16/06/2022		
12	MAYO DE 2022	\$ 192.814.400,00	\$ 36.634.736,00	\$ 1.932.887.548,00	\$ 61.865.171	\$ 167.583.965,00	\$ 433.056.200	100522 De 25/01/2022	\$ 1.423.518.035,00	\$ 10.067.100.551,00	79077 de 28/07/2022		
13	JUNIO DE 2022	\$ 182.577.340,00	\$ 34.689.695,00	\$ 2.150.154.583,00	\$ 61.865.171	\$ 155.401.864,00	\$ 371.191.029	100522 De 25/01/2022	\$ 1.268.116.171,00	\$ 9.849.833.516,00	83154 de 05/08/2022		
14	JULIO DE 2022	\$ 210.409.238,00	\$ 39.977.755,00	\$ 2.400.541.576,00	\$ 61.865.171	\$ 188.521.822,00	\$ 309.325.858	100522 De 25/01/2022	\$ 1.079.594.349,00	\$ 9.599.446.523,00	105106 de 29/09/2022		
15	AGOSTO DE 2022	\$ 245.014.853,00	\$ 46.552.822,00	\$ 2.692.109.251,00	\$ 77.331.464	\$ 214.236.211,00	\$ 231.994.394	100522 De 25/01/2022	\$ 865.358.138,00	\$ 9.307.878.848,00	115036 de 24/10/2022		
16	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 250.320.022,00	\$ 47.560.804,00	\$ 2.989.990.077,00	\$ 77.331.464	\$ 220.549.362,00	\$ 154.662.930	100522 De 25/01/2022	\$ 644.808.776,00	\$ 9.009.998.022,00	138511 de 16/12/2022		

	OCTUBRE DE 2022	\$	225.220.976,00	\$	42.791.985,00	\$	3.258.003.038,00	\$	77.331.464	\$	190.681.497,00	\$	77.331.466	100522 De 25/01/2022	\$	454.127.279,00	\$	8.741.985.061,00	142278 de 22/12/2022	
18	NOVIEMBRE DE 2022	\$	225.561.554,00	\$	42.856.695,00	\$	3.526.421.287,00	\$	77.331.466	\$	191.086.783,00	\$	-	100522 De 25/01/2022	\$	263.040.496,00	\$	8.473.566.812,00	143712 de 27/12/2022	
19	DICIEMBRE DE 2022	\$	221.042.434,00	\$	41.998.062,00	\$	3.789.461.783,00	\$	-	\$	263.040.496,00	\$	-	100522 De 25/01/2022	\$	-	\$	8.210.526.316,00	145181 de 30/12/2022	
20	ENERO DE 2023	\$	226.245.288,00	\$	42.986.605,00	\$	4.058.693.676,00	\$	-	\$	269.231.893,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	2.888.662.844,00	\$	7.941.294.423,00	37849 de 18/04/2023	
21	FEBRERO DE 2023	\$	227.817.467,00	\$	43.285.319,00	\$	4.329.796.462,00	\$	-	\$	271.102.786,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	2.617.560.058,00	\$	7.670.191.637,00	37860 de 18/04/2023	
22	MARZO DE 2023	\$	241.617.586,00	\$	45.907.341,00	\$	4.617.321.389,00	\$	-	\$	287.524.927,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	2.330.035.131,00	\$	7.382.666.710,00	47662 de 15/05/2023	
23	ABRIL DE 2023	\$	236.634.785,00	\$	44.960.609,00	\$	4.898.916.783,00	\$	-	\$	281.595.394,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	2.048.439.737,00	\$	7.101.071.316,00	64743 de 05/07/2023	
24	MAYO DE 2023	\$	238.393.965,00	\$	45.294.853,00	\$	5.182.605.601,00	\$	-	\$	283.688.818,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	1.764.750.919,00	\$	6.817.382.498,00	64341 de 04/07/2023	
25	JUNIO DE 2023	\$	237.303.290,00	\$	45.087.625,00	\$	5.464.996.516,00	\$	-	\$	282.390.915,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	1.482.360.004,00	\$	6.534.991.583,00	75671 de 04/08/2023	
26	JULIO DE 2023	\$	272.724.036,00	\$	51.817.567,00	\$	5.789.538.119,00	\$	-	\$	324.541.603,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	1.157.818.401,00	\$	6.210.449.980,00	82281 de 27/09/2023	
27	AGOSTO DE 2023	\$	274.355.362,00	\$	52.127.519,00	\$	6.116.021.000,00	\$	-	\$	326.482.881,00	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	831.335.520,00	\$	5.883.967.099,00	82161 de 25/09/2023	
28	SEPTIEMBRE DE 2023	\$	274.487.317,00	\$	52.152.590,23	\$	6.442.660.907,23	\$	-	\$	326.639.907,23	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	504.695.612,77	\$	5.557.327.191,77	83955 el 31/10/2023 84803 el 14/11/2023	
29	OCTUBRE DE 2023	\$	285.151.833,00	\$	54.178.848,27	\$	6.781.991.588,50	\$	-	\$	339.330.681,27	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	165.364.931,50	\$	5.217.996.510,50	85473 el 22/11/2023	
30	NOVIEMBRE DE 2023	\$	295.129.167,00	\$	56.074.541,73	\$	7.133.195.297,23	\$	-	\$	351.203.708,73	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	356.161.222,77	\$	4.866.792.801,77	88322 el 13/12/2023	
31	DICIEMBRE DE 2023	\$	292.316.877,00	\$	55.540.206,63	\$	7.481.052.380,86	\$	-	\$	347.857.083,63	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	8.304.139,14	\$	4.518.935.718,14	88347 el 13/12/2023	
32	ENERO DE 2024	\$	257.348.986,00	\$	48.896.307,34	\$	7.787.297.674,20	\$	-	\$	306.245.293,34	\$	-	103523 De 02/02/2023	\$	-	\$	4.212.690.424,80		
													158824 De 07/03/2024	\$	2.859.953.582,80			2340 de 10/04/2024		
33	FEBRERO DE 2024	\$	265.142.429,00	\$	50.377.061,51	\$	8.102.817.164,71	\$	-	\$	315.519.490,51	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	2.544.434.092,29	\$	3.897.170.934,29	2339 de 10/04/2024	
34	MARZO DE 2024	\$	262.284.000,00	\$	49.833.960,00	\$	8.414.935.124,71	\$	-	\$	312.117.960,00	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	2.232.316.132,29	\$	3.585.052.974,29	3673 de 06/05/2024	
35	ABRIL DE 2024	\$	258.435.126,00	\$	49.102.673,94	\$	8.722.472.924,65	\$	-	\$	307.537.799,94	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	1.924.778.332,35	\$	3.277.515.174,35	5248 de 04/06/2024	
36	MAYO DE 2024	\$	262.407.993,00	\$	49.857.518,67	\$	9.034.738.436,32	\$	-	\$	312.265.511,67	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	1.612.512.820,68	\$	2.965.249.662,68	6473 de 26/06/2024	
37	JUNIO DE 2024	\$	207.696.294,00	\$	39.462.295,86	\$	9.281.897.026,18	\$	-	\$	247.158.589,86	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	1.365.354.230,82	\$	2.718.091.072,82	7753 de 24/07/2024	
38	JULIO DE 2024	\$	197.049.904,00	\$	37.439.481,76	\$	9.516.386.411,94	\$	-	\$	234.489.385,76	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	1.130.864.845,06	\$	2.483.601.687,06	10766 de 10/09/2024	
39	AGOSTO DE 2024	\$	183.046.953,00	\$	34.778.921,07	\$	9.734.212.286,01	\$	-	\$	217.825.874,07	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	913.038.970,99	\$	2.265.775.812,99	12061 de 01/10/2024	
40	SEPTIEMBRE DE 2024	\$	153.983.734,00	\$	29.256.909,46	\$	9.917.452.929,47	\$	-	\$	183.240.643,46	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	729.798.327,53	\$	2.082.535.169,53	16341 de 21/11/2024	
41	OCTUBRE DE 2024	\$	232.363.242,00	\$	44.149.015,98	\$	10.193.965.187,45	\$	-	\$	276.512.257,98	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	453.286.069,55	\$	1.806.022.911,55	17111de 04/12/2024	
42	NOVIEMBRE DE 2024	\$	215.125.218,00	\$	40.873.791,42	\$	10.449.964.196,87	\$	-	\$	255.999.009,42	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	197.287.060,13	\$	1.550.023.902,13	19161 de 16/12/2024	
43	DICIEMBRE DE 2024	\$	165.787.445,49	\$	31.499.614,64	\$	10.647.251.257,00	\$	-	\$	197.287.060,13	\$	-	158824 De 07/03/2024	\$	-	\$	1.352.736.842,00	20418 de 30/12/2024	
44	ENERO DE 2025	\$	219.397.888,00	\$	41.685.598,72	\$	10.908.334.743,72	\$	-	\$	261.083.486,72	\$	-	139925 De 10/03/2025	\$	1.091.653.355,28	\$	1.091.653.355,28	7268 de 18/07/2025	
45	FEBRERO DE 2025	\$	196.773.580,00	\$	37.386.980,20	\$	11.142.495.303,92	\$	-	\$	234.160.560,20	\$	-	139925 De 10/03/2025	\$	857.492.795,08	\$	857.492.795,08	7312 de 21/07/2025	
46	MARZO DE 2025	\$	183.080.223,00	\$	34.785.242,37	\$	11.360.360.769,29	\$	-	\$	217.865.465,37	\$	-	139925 De 10/03/2025	\$	639.627.329,71	\$	639.627.329,71	7314 de 21/07/2025	
47	ABRIL DE 2025	\$	185.936.462,00	\$	35.327.927,78	\$	11.581.625.159,07	\$	-	\$	221.264.389,78	\$	-	139925 De 10/03/2025	\$	418.362.939,93	\$	418.362.939,93	7316 de 21/07/2025	
	ADICIÓN No.1												388125 De 21/05/2025	\$	1.700.000.000,00	\$	2.118.362.939,93			
48	MAYO DE 2025	\$	230.266.678,00	\$	43.750.668,82	\$	11.855.642.505,89	\$	-	\$	274.017.346,82	\$	-	139925 De 10/03/2025	\$	144.345.593,11	\$	1.844.345.593,11	7317 de 21/07/2025	
													388125 De 21/05/2025	\$	1.700.000.000,00					
49	JUNIO DE 2025	\$	231.503.400,00	\$	43.985.646,00	\$	12.131.131.551,89	\$	-	\$	275.489.046,00	\$	-	139925 De 10/03/2025	\$	-	\$	1.568.856.547,11	11164 de 03/10/2025	
													388125 De 21/05/2025	\$	1.568.856.547,11					
50	JULIO DE 2025	\$	217.463.616,00	\$	41.318.087,04	\$	12.389.913.254,93	\$	-	\$	258.781.703,04	\$	-	388125 De 21/05/2025	\$	1.310.074.844,07	\$	1.310.074.844,07	11165 de 03/10/2025	
51	AGOSTO DE 2025	\$	221.403.400,00	\$	42.066.646,00	\$	12.653.383.300,93	\$	-	\$	263.470.046,00	\$	-	388125 De 21/05/2025	\$	1.046.604.798,07	\$	1.046.604.798,07	11166 de 03/10/2025	
52	SEPTIEMBRE DE 2025	\$	219.307.642,00	\$	41.668.451,98	\$	12.914.359.394,91	\$	-	\$	260.976.093,98	\$	-	388125 De 21/05/2025	\$	785.628.704,09	\$	785.628.704,09		
TOTALES		\$	10.852.402.853,49	\$	2.061.956.541,42	\$	12.914.359.394,91	\$	793.831.155,00	\$	12.914.359.394,91									

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* Valor total básico (C) = (A) + (B)	\$ 10.852.402.853,49	\$ 2.061.956.541,42	\$ 12.914.359.394,91
*	\$ -	\$ -	\$ -
*	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 10.852.402.853,49	\$ 2.061.956.541,42	\$ 12.914.359.394,91

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

- Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
- Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS GARCIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520203053 CND

Firma
Nombre: ELLIEN OBEIMAR ACADY GALEANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 de 3	

FECHA		5/10/2025 (Día / Mes / Año)	
-------	--	--------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO NORTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	-------------	------------------------	---------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1050 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NORTE
--------------------------------	--------------	--------------	----------------------

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3

FECHA DE INICIO:	23/06/2021
PLAZO INICIAL:	50,2 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/12/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 11.999.988.099,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 13.699.988.099,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10	\$ 1.199.998.810,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.399.997.620,00
Calidad del servicio	30	\$ 3.599.996.430,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
21	5	2021	28	2	2026
21	5	2021	28	2	2026
21	5	2021	31	8	2028
31	8	2025	31	8	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No. 0 Y 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/06/2021

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10	\$ 1.199.998.810,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.399.997.620,00
Calidad del servicio	30	\$ 3.599.996.430,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
23	6	2021	3	4	2026
23	6	2021	3	4	2026
23	6	2021	3	10	2028
3	10	2025	3	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2 de 3		

FECHA

5/10/2025
(Día / Mes / Año)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

8/08/2022

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	\$ 1.199.998.810,00	21	5	2021	3	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00	21	5	2021	3	4	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.399.997.620,00	21	5	2021	3	10	2028
Calidad del servicio	30	\$ 3.599.996.430,00	3	10	2025	3	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No.:

3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

8/08/2022

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	\$ 1.199.998.810,00	21	5	2021	3	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00	21	5	2021	3	4	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.399.997.620,00	21	5	2021	3	10	2028
Calidad del servicio	30	\$ 3.599.996.430,00	3	10	2025	3	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No.:

4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

12/01/2024

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	\$ 1.369.998.809,90	10	5	2025	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00	10	5	2025	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.739.997.619,80	10	5	2025	31	12	2028
Calidad del servicio	30	\$ 4.109.996.429,70	30	12	2025	30	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No.:

5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

8/07/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3


	FECHA
	5/10/2025 (Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS GARCIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520203053 CND

Firma 

Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE	FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1050 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

FECHA DE INICIO: 23/06/2021 **PLAZO INICIAL:** 54.2 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2025
(Indicar día, mes y año) (Incluye órdenes y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

1. PLAN DE CALIDAD
 PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☒ NO ☐ VERSION No. 1 FECHA DE VERSION: 14/09/2021

OBSERVACIONES:
 SE RADICA PLAN DE CALIDAD AL INVIAS MEDIANTE OFICIO 49980-CE-0112; SE APRUEBA MEDIANTE OFICIO DT-COR17756.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD
 PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ No. DE AUDITORIAS PROGRAMADAS: 3 FECHA ÚLTIMA AUDITORIA: 5/06/2025
 PRESENTE INFORME DE AUDITORIA: SI ☐ NO ☐ No. DE AUDITORIAS REALIZADAS: 3 FECHA PRÓXIMA AUDITORIA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)
 PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☒ NO ☐ FECHA DE APROBACIÓN:

 No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 148 No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: 148

 CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:

 El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
 La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES
 No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
 No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
 No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
 A LA FECHA NO SE CUENTA CON NO CONFORMIDADES

5. QUEJAS Y RECLAMOS
 No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 3 No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 1
 No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 2 No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 147
 No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 4 No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 143

OBSERVACIONES:
 •Con la PQR No. 143 La señora Camila Galván solicitó instalar la señalización con el nombre de la vereda villa concepción en la entrada que conduce a esta, conforme a la norma vigente en Colombia.
 •Con la PQR No. 145 El señor Álvaro Hernández Cruz Manifiesta que en estas temporadas de lluvia el puente construido en proximidad a su vivienda no es suficiente para la cantidad de flujo de agua que pasa por allí y se devuelve afectando enormemente ya que esa agua inunda su propiedad dañando toda la madera y maquinaria ya que se dedica a la carpintería; por lo que solicita que:
 1) Se debe cavar más profundo la quebrada para que así pueda pasar más agua por el puente
 2) Se me reconozca los daños causados por estos hechos, los cuales estima en más de 20 millones de pesos.
 •Con la PQR No. 146 El señor Miguel de los santos solicita la construcción de uno o dos resaltos a la altura del PR30 y PR31, vereda abre los ojos, municipio de Loricá.
 •Con la PQR No. 147 La Junta de acción comunal solicita la construcción de un resalto a la altura del KM 27+500 de la vía Santa Lucía Moñitos, dado el riesgo que representa el tránsito de vehículos a altas velocidades en este sector.

 Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	72%	El 2 de agosto-22, el gestor técnico del proyecto diligencia encuesta de satisfacción
IG2: Índice de gestión 2 =	100%	Se remite informe mensual # 52 y los semanales 220, 221, 22, 223.
IG3: Índice de gestión 3 =	100%	Se realizan ensayos de verificación de los materiales. Se reportan en resumen ensayos de laboratorio

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.


OBSERVACIONES:
EL CONTRATO CONTINUAN CON LA REVISIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, SE ALCANZARON A REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE TERRAPLÉN, AFIRMADO, PAVIMENTO MR-40, ADEMÁS, ÍTEMS PARA LA CONSTRUCCIONES DE OBRAS HIDRAULICAS.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACIÓN TOTAL	GEOMAX	2107095	24/07/2025	2327	23/01/2026	
2	NIVEL AUTOMÁTICO	GEOMAX	303673	10/05/2025	2196	9/11/2025	
3	TERMÓMETRO BIMETÁLICO	MENGTE	265	13/08/2025	TC-30686	13/08/2026	
4	TERMÓMETRO BIMETÁLICO	WINTERS	A3429	25/08/2025	TC-31029	25/08/2026	
5	MÁQUINA DE ENSAYO MARSHALL / CBR	Pinzuar	298	12/08/2025	F-35106-003 R0	12/08/2026	
6	PRENSA DOBLE RANGO PARA ENSAYO A FLEXION Y COMPRESION	Pinzuar	211	13/08/2025	F-35106-002 R0	13/08/2026	
7	COMPARADOR DE CARÁTULA	MOORE& WRIGHT	9916624	1/09/2025	L-35250-001 R0	1/09/2026	
8	COMPARADOR DE CARÁTULA	BAKER	FDF458	1/09/2025	NA-35250-002 R0	1/09/2026	
9	COMPARADOR DE CARÁTULA	BAKER	FDF564	19/09/2025	NA-35250-003 R0	19/09/2026	
10	BALANZA 300 g	LEXUS	YS132405	13/08/2025	M-35106-004 R0	13/08/2026	
11	BALANZA 30 Kg	Lexus	YS136366	12/08/2025	M-35106-005 R0	12/08/2026	
12	BALANZA 30 Kg	Lexus	YS136292	13/08/2025	M-35106-006 R0	13/08/2026	
13	BALANZA 6000 g	Lexus	5124011095	13/08/2025	M-35106-007 R0	13/08/2026	
14	HORNO	Pinzuar	180	12/08/2025	T-35106-008 R0	12/08/2026	
15	HORNO ELÉCTRICO	Pinzuar	SN1467	13/08/2025	T-35106-009 R0	13/08/2026	

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma: 
Nombre: Mario Aurelio Oliveros García
Director de Interventoría
Matrícula No. 2520203053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Firma: 
Nombre: Amaury Javier Guzmán Vidal
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 22202149534 COR

Firma: 
Nombre: Willem Obeiman Alcázar Galeano
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 13202-47439 BOL



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6.6. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del Anticipo. Se dio cierre a la cuenta del anticipo en el mes de noviembre de 2022. El informe final de inversión y buen manejo del anticipo se adjunto en el informe mensual de interventoria del mes de noviembre 2022.



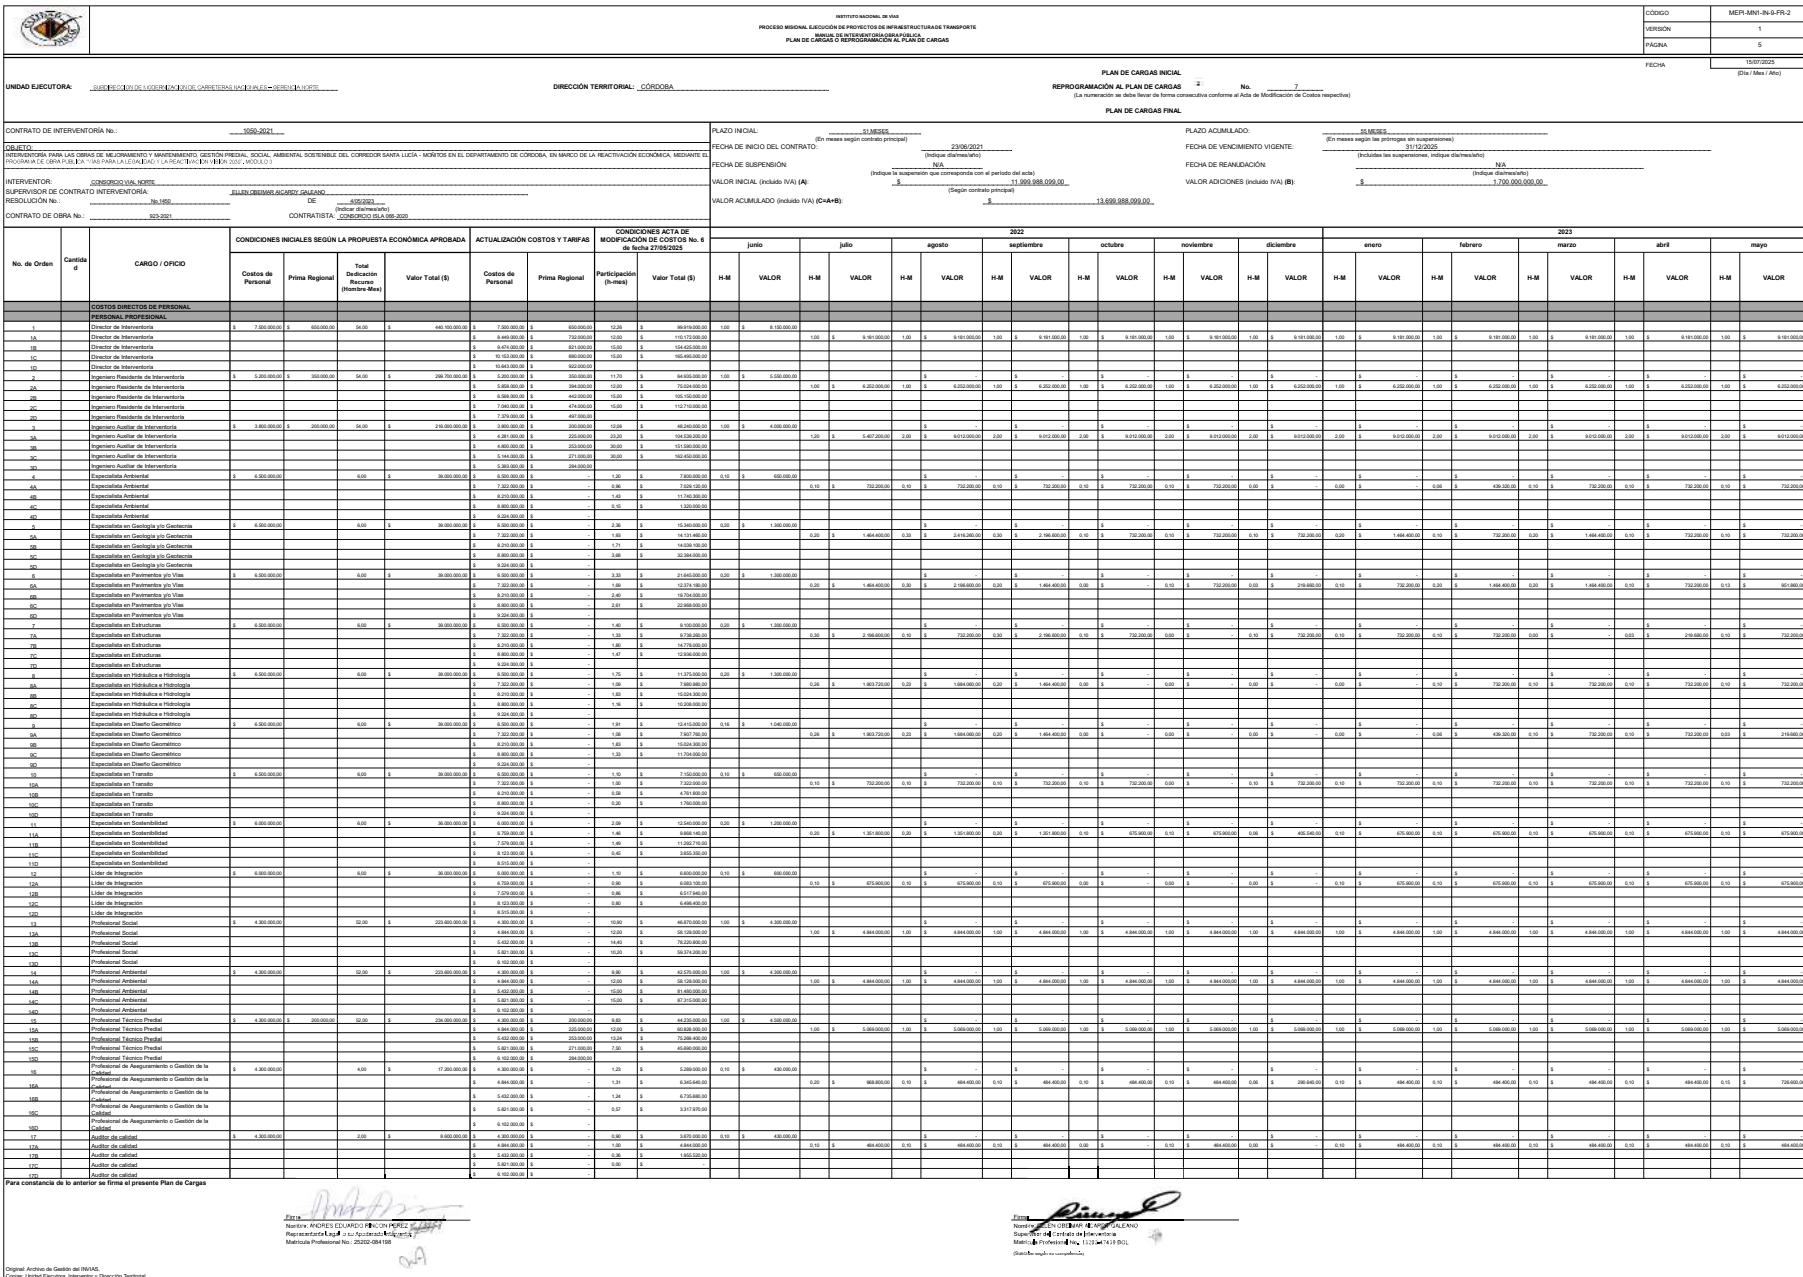
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

- Plan de cargas

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

[illegible]





CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	6
FECHA	15/07/2025 (Días / Meses / Años)

PLAN DE CARGAS INICIAL

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

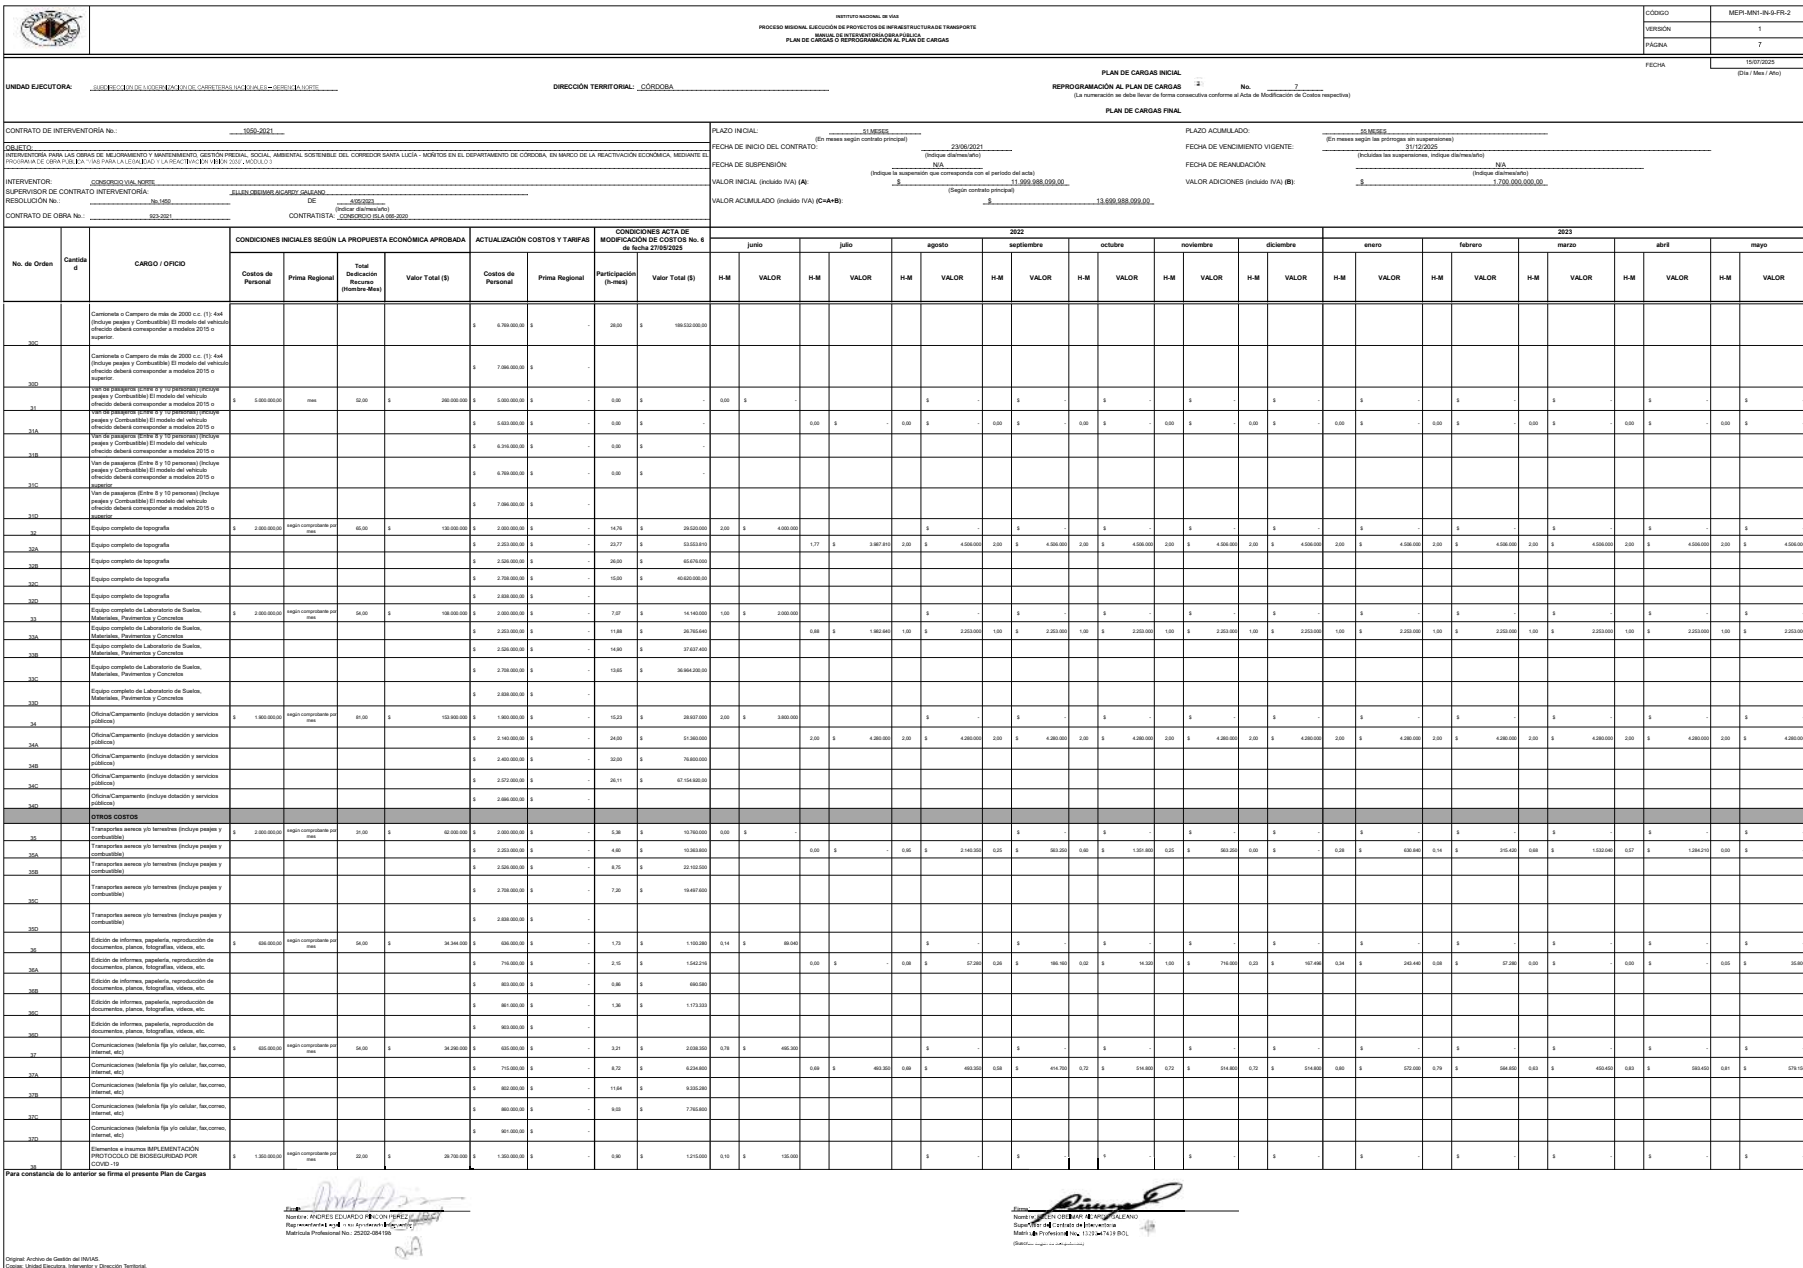
No. 7

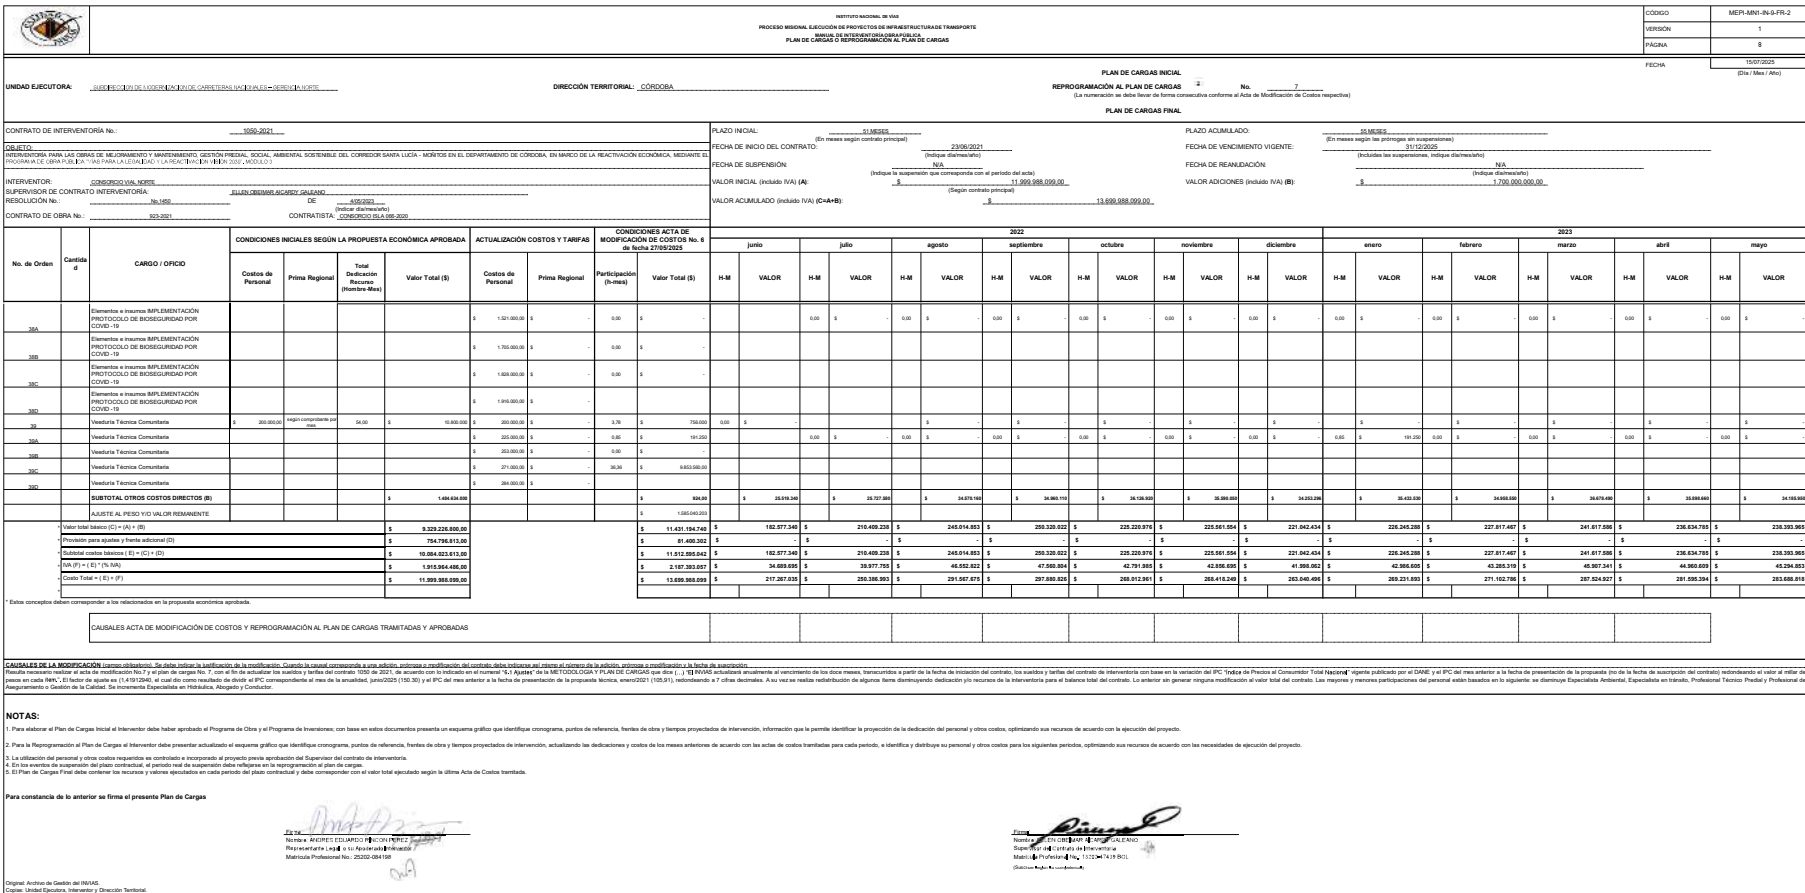
(il a numération ne doit pas de forme croquis de la forme de Modification de l'Etat territorial)

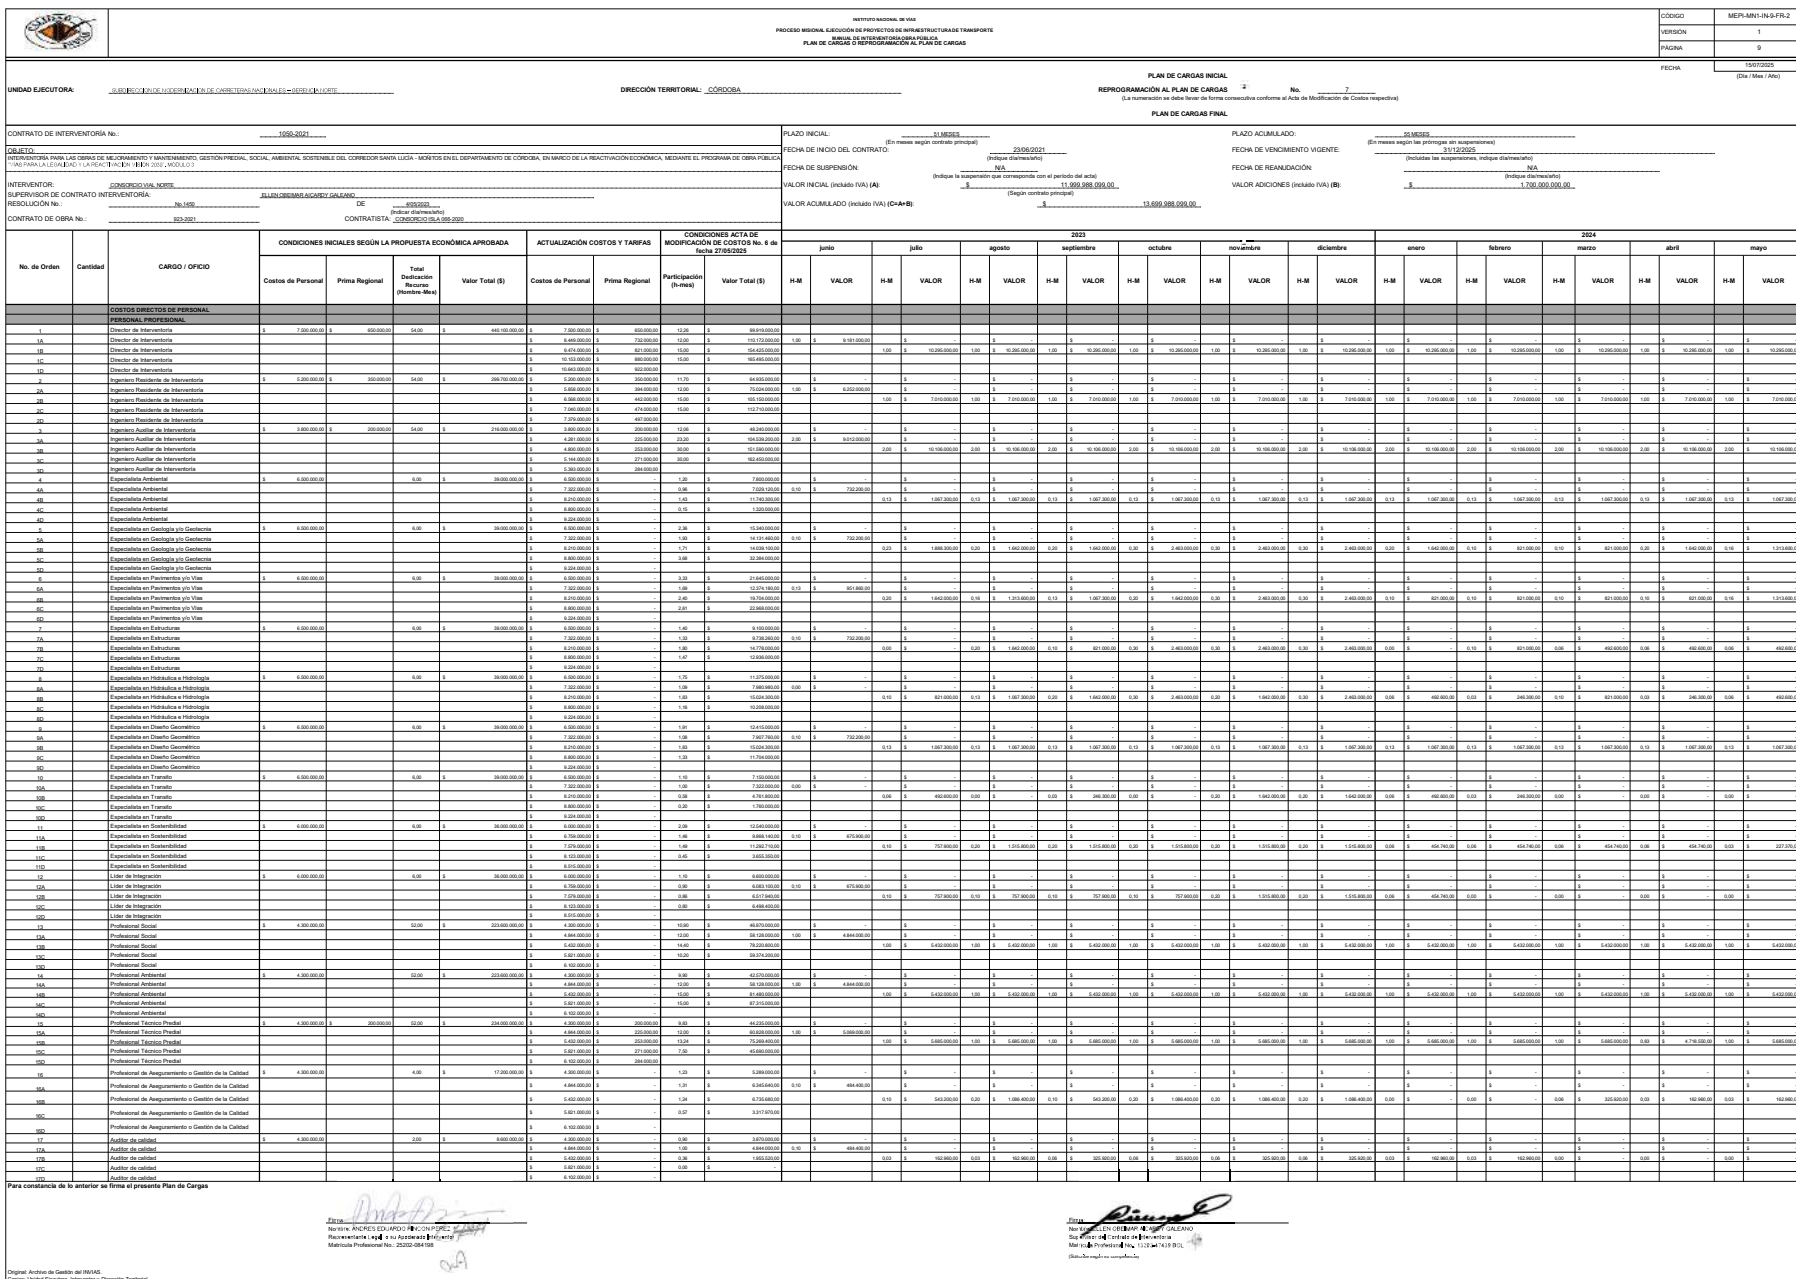
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: _____

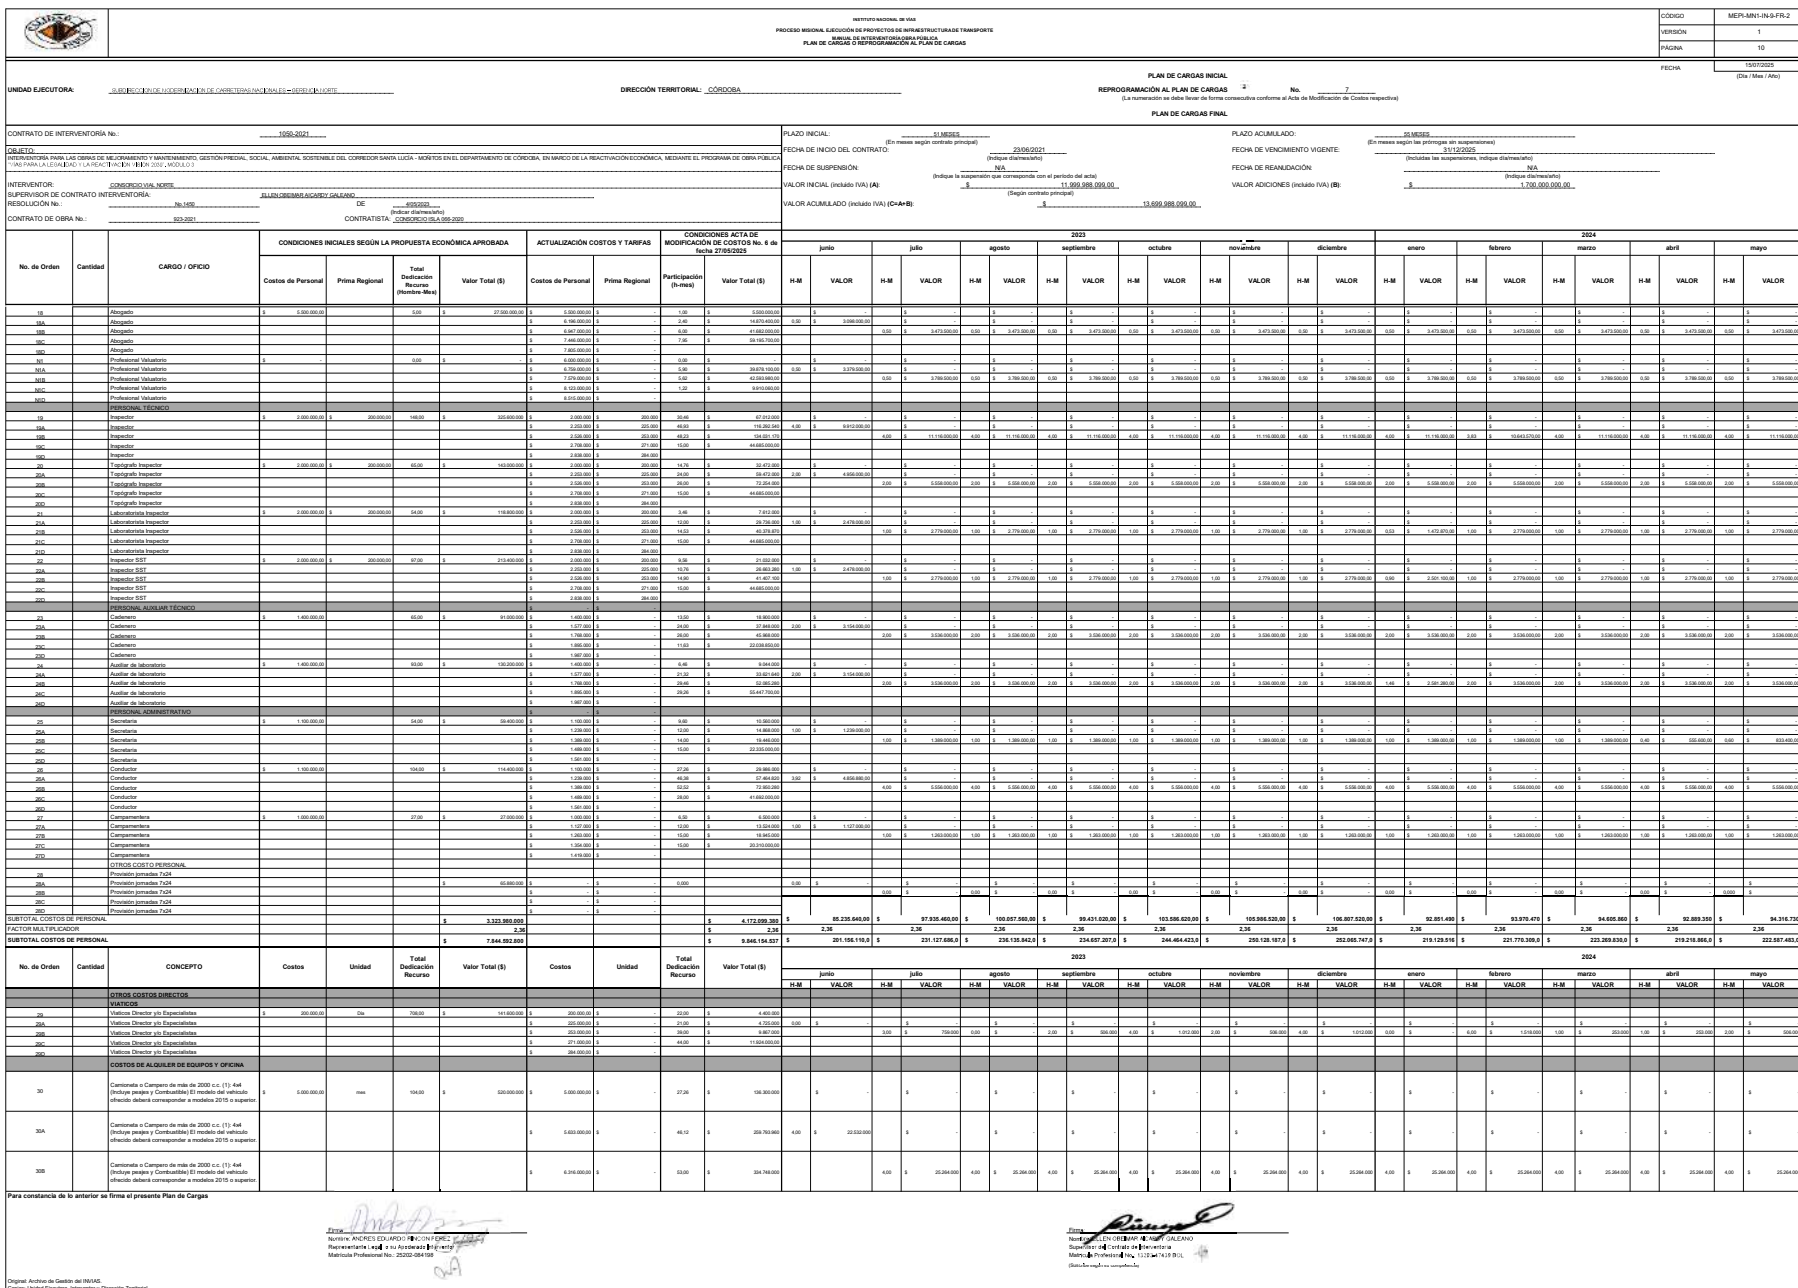
029.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
13.699.988.099.00	

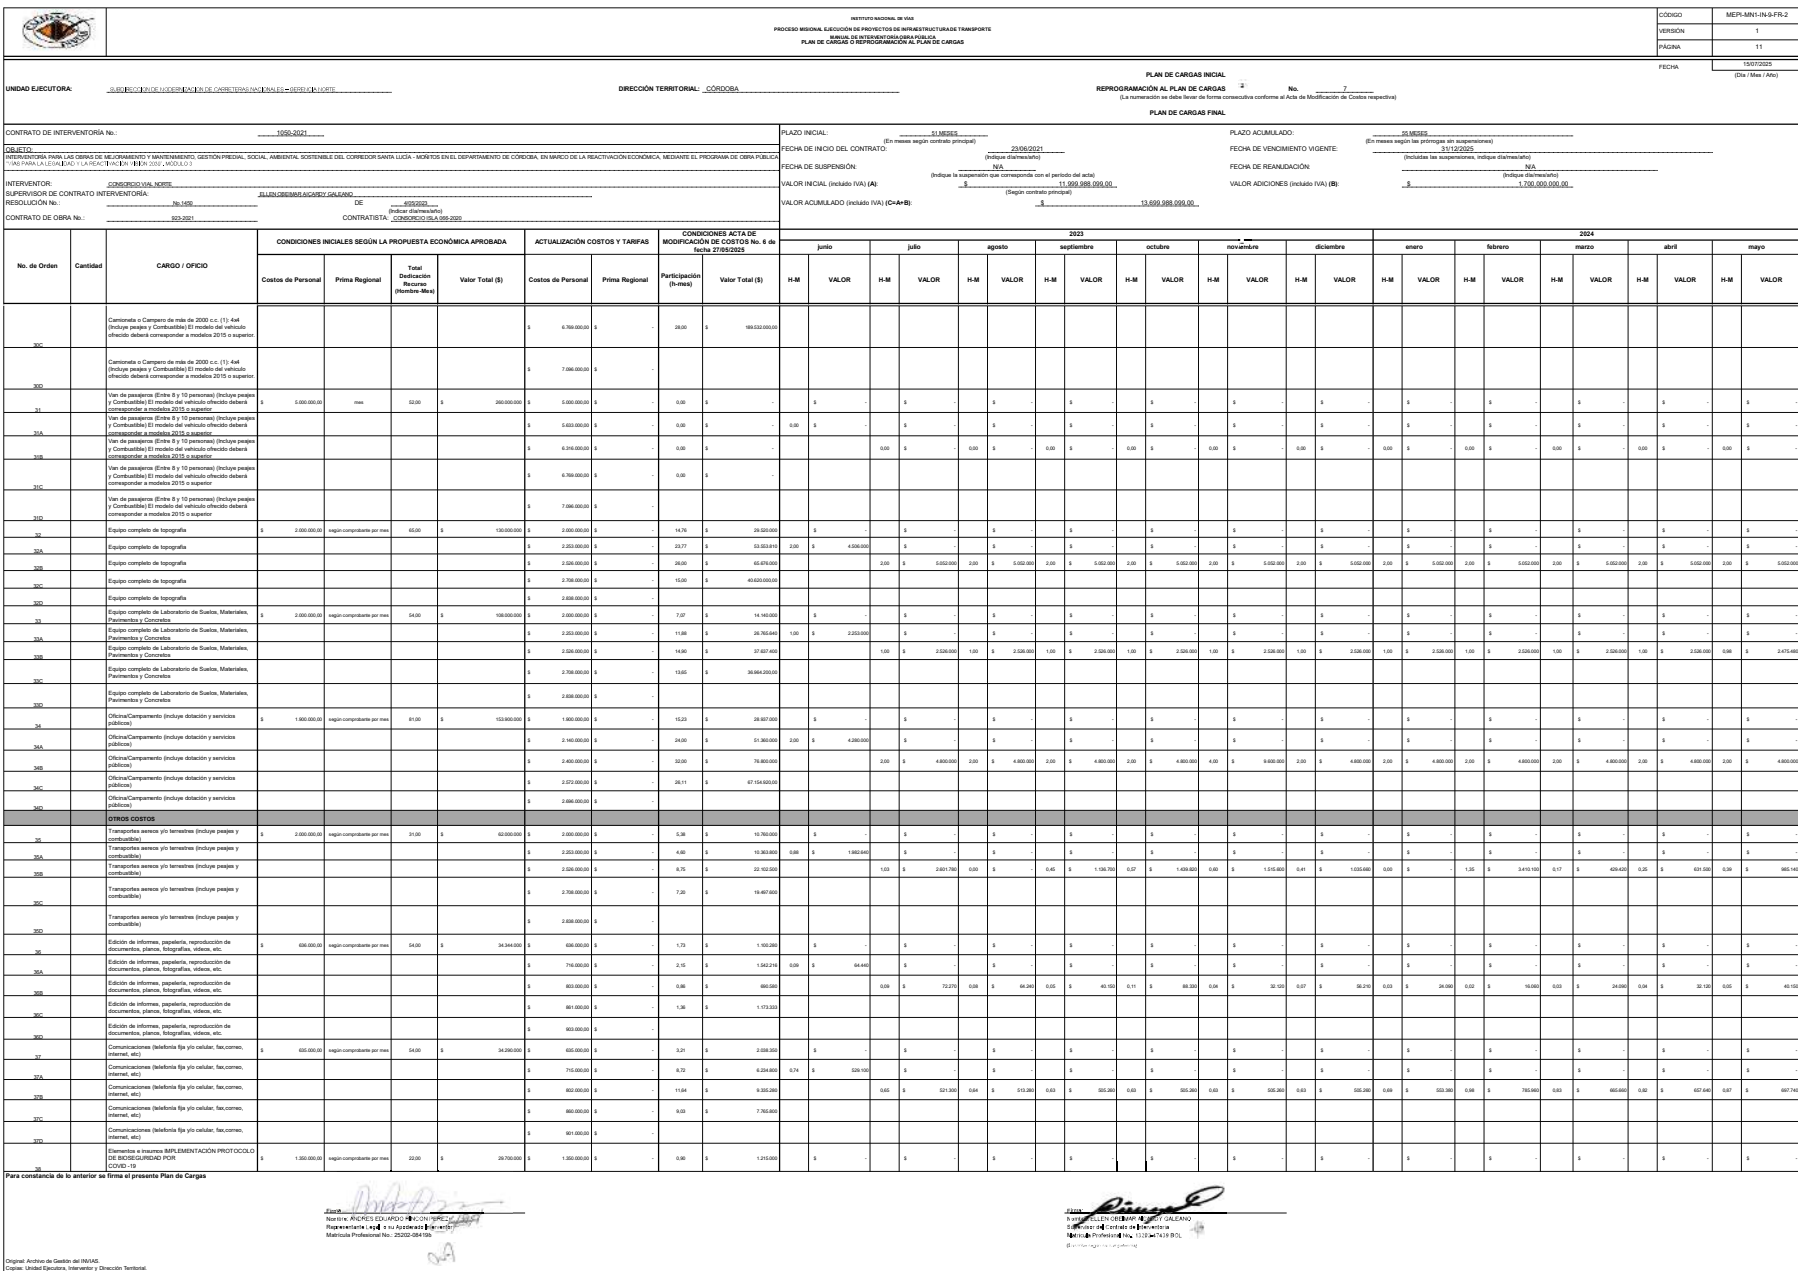
Forma: 
Nombre: EUSEBIO OREJÓN (ALEJANO)
Supervisor del Censo de Población
Matrícula Profesional No. 1225-47419 BCL

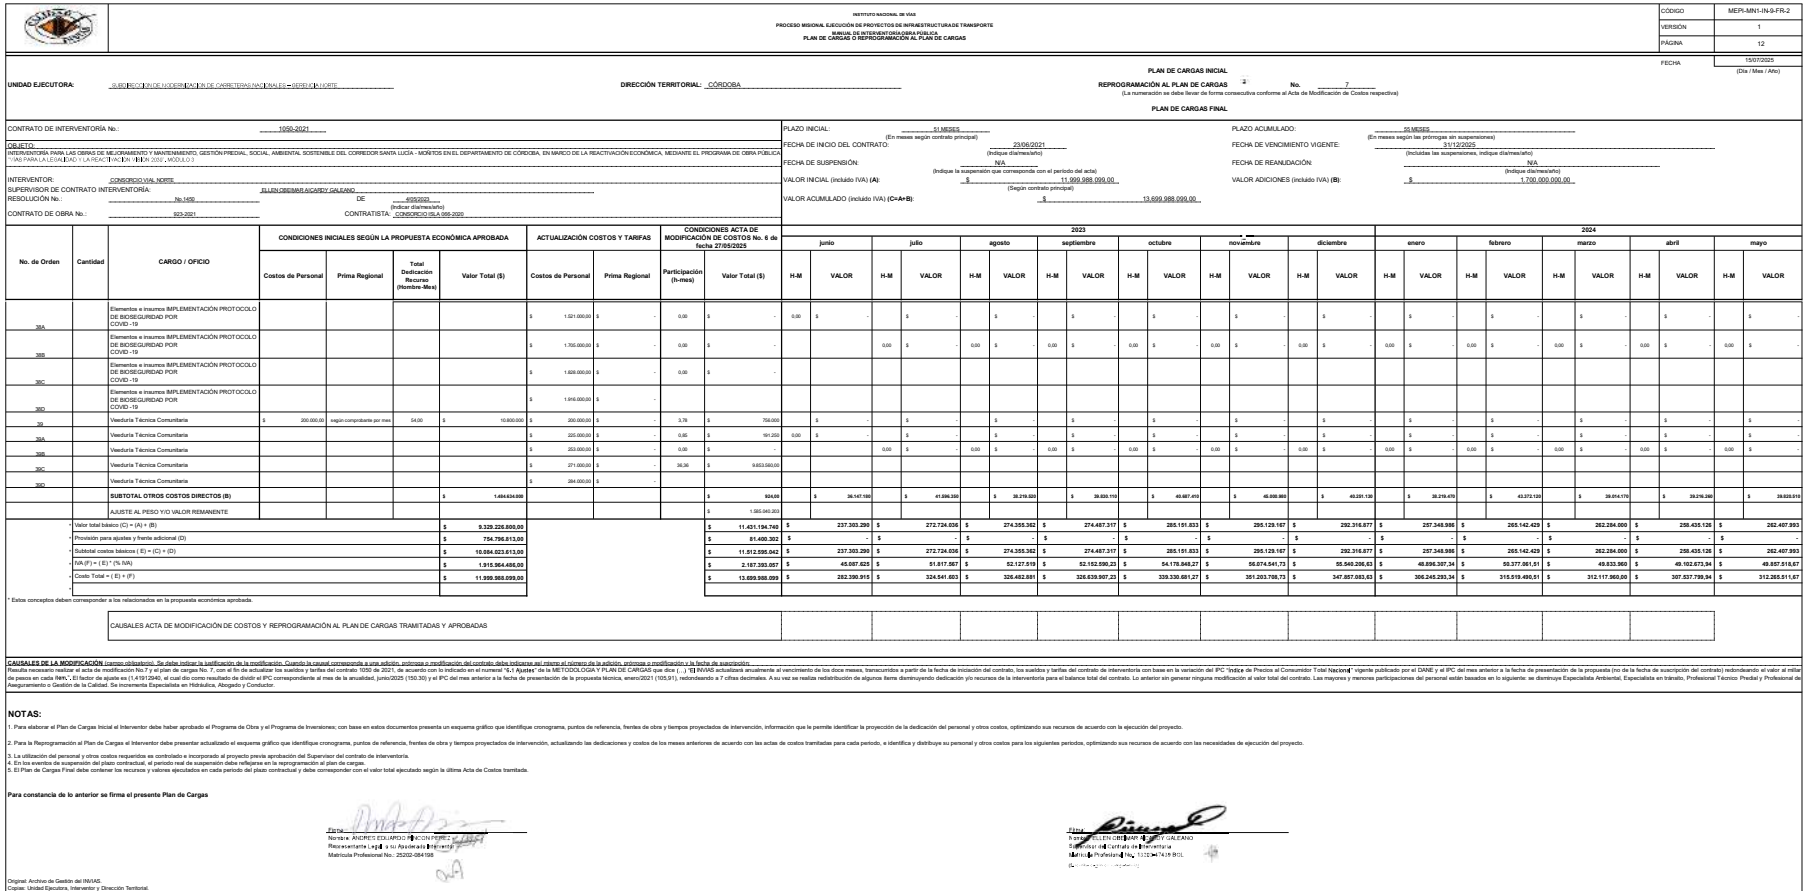














UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PROCESO MISAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

PLAN DE CARGAS INICIAL

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

(La reprogramación se debe hacer de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Cargas respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CÓDIGO: MEPLMNT-NS-PR-2
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 13

FECHA: 15/07/2021
(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: 5095-2021

PLAZO INICIAL: 15 MESES

PLAZO ADICIONAL: 15 MESES

OBJETO: RECONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MORTOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS (PROYECTO EJECUTIVO LA REACTIVACIÓN) - EJE 1001-2021, 1002-2021

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/09/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2022
(Indique día/mes/año)

INTERVENIOR: CONSEJO VALLE DEL CAQUETÉ

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el parámetro del acto)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENCIÓN: JELEN DREVER JACOB GARCIA

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 1.899.999.000,00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 0

RESOLUCIÓN No.: 4052003 DE 2020 (Porcentaje de ejecución)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+D+E): 13.699.999.000,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 0

CONTRATO DE OBRA No.: 523-2021

CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA

CONDICIONES ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS No. 6 de fecha 27/05/2025

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recursos (Personas)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (I-mes)	Valor Total (\$)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																															
PERSONAL PROFESIONAL																															
1		Director de Intervención	\$ 7.000.000,00	\$ 800.000,00	\$ 40,00	\$ 460.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 800.000,00	12,25	\$ 89.000.000,00																					
1A		Director de Intervención	\$ 6.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ 35,00	\$ 410.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 700.000,00	12,25	\$ 75.000.000,00																					
1B		Director de Intervención	\$ 6.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ 35,00	\$ 410.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 700.000,00	12,25	\$ 75.000.000,00																					
1C		Director de Intervención	\$ 6.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ 35,00	\$ 410.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 700.000,00	12,25	\$ 75.000.000,00																					
2		Ingeniero Residente de Intervención	\$ 3.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 15,00	\$ 200.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 300.000,00	11,70	\$ 34.800.000,00																					
2A		Ingeniero Residente de Intervención	\$ 2.500.000,00	\$ 250.000,00	\$ 12,50	\$ 166.666.666,67	\$ 2.500.000,00	\$ 250.000,00	11,70	\$ 29.166.666,67																					
2B		Ingeniero Residente de Intervención	\$ 2.500.000,00	\$ 250.000,00	\$ 12,50	\$ 166.666.666,67	\$ 2.500.000,00	\$ 250.000,00	11,70	\$ 29.166.666,67																					
2C		Ingeniero Residente de Intervención	\$ 2.500.000,00	\$ 250.000,00	\$ 12,50	\$ 166.666.666,67	\$ 2.500.000,00	\$ 250.000,00	11,70	\$ 29.166.666,67																					
3		Ingeniero Auxiliar de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00	\$ 5,00	\$ 66.666.666,67	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00	10,00	\$ 11.111.111,11																					
3A		Ingeniero Auxiliar de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00	\$ 5,00	\$ 66.666.666,67	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00	10,00	\$ 11.111.111,11																					
3B		Ingeniero Auxiliar de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00	\$ 5,00	\$ 66.666.666,67	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00	10,00	\$ 11.111.111,11																					
3C		Ingeniero Auxiliar de Intervención	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00	\$ 5,00	\$ 66.666.666,67	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00	10,00	\$ 11.111.111,11																					
4		Expedita Anterior	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
4A		Expedita Anterior	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
4B		Expedita Anterior	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
4C		Expedita Anterior	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
5		Expedita en Geología y/o Geotécnica	\$ 6.000.000,00	\$ 600.000,00	\$ 30,00	\$ 400.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 600.000,00	2,36	\$ 13.333.333,33																					
5A		Expedita en Geología y/o Geotécnica	\$ 6.000.000,00	\$ 600.000,00	\$ 30,00	\$ 400.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 600.000,00	2,36	\$ 13.333.333,33																					
5B		Expedita en Geología y/o Geotécnica	\$ 6.000.000,00	\$ 600.000,00	\$ 30,00	\$ 400.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 600.000,00	2,36	\$ 13.333.333,33																					
5C		Expedita en Geología y/o Geotécnica	\$ 6.000.000,00	\$ 600.000,00	\$ 30,00	\$ 400.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 600.000,00	2,36	\$ 13.333.333,33																					
6		Expedita en Perforación y/o Yacimientos	\$ 3.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 15,00	\$ 200.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 300.000,00	11,70	\$ 34.800.000,00																					
6A		Expedita en Perforación y/o Yacimientos	\$ 2.500.000,00	\$ 250.000,00	\$ 12,50	\$ 166.666.666,67	\$ 2.500.000,00	\$ 250.000,00	11,70	\$ 29.166.666,67																					
6B		Expedita en Perforación y/o Yacimientos	\$ 2.500.000,00	\$ 250.000,00	\$ 12,50	\$ 166.666.666,67	\$ 2.500.000,00	\$ 250.000,00	11,70	\$ 29.166.666,67																					
6C		Expedita en Perforación y/o Yacimientos	\$ 2.500.000,00	\$ 250.000,00	\$ 12,50	\$ 166.666.666,67	\$ 2.500.000,00	\$ 250.000,00	11,70	\$ 29.166.666,67																					
7		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
7A		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
7B		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
7C		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
8		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
8A		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
8B		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
8C		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
9		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
9A		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
9B		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
9C		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
10		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
10A		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
10B		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
10C		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
11		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
11A		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
11B		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
11C		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
12		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
12A		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
12B		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
12C		Expedita en Exploración	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
13		Profesional Social	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
13A		Profesional Social	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56																					
13B		Profesional Social	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 20,00	\$ 266.666.666,67	\$ 4.000.000,00	\$ 400.000,00	2,00	\$ 15.555.555,56												</									



UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PLAN DE CARGAS INICIAL
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
(La reprogramación de esta línea de ítem consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

CÓDIGO
MEPMV-10-9-FR-2
VERSIÓN
1
PÁGINA
14

FECHA
15/01/2025
(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°: 309-2021
OBJETO:
INTERVENCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MORTOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA (PROBOP) ALIADO A LA REACTIVACIÓN (PROBOP-REACTIVACIÓN)
INTERVENIOR:
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENCIÓN: ALDO DOMÍNGUEZ GARCÍA
RESOLUCIÓN N°: 160-2021 DE 16/02/2021 (Fecha de expedición)
CONTRATISTA: CONSORCIO USA 999-2020

PLAZO INICIAL: 12 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/09/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el parámetro del acto)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 1.999.999.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=H+B): 13.699.999.000,00

PLAZO ADICIONAL: 0 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23/09/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 1.700.000.000,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPOSTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS N° 6 de fecha 27/05/2025												2024												2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recursos (personas- Mes)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (0-100%)	Valor Total (\$)	junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre		enero		febrero		marzo		abril		mayo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18		Altoparlante	\$	5.000.000,00	0,00	\$	27.000.000,00	\$	5.000.000,00	\$	1,00	\$	5.000.000,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$



MINISTERIO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISAL: EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ÁREA DE INTERVENCIÓN EN PUESTOS
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO MEPLMVI-NS-FR-2
VERSIÓN 1
PÁGINA 15
FECHA 15/01/2021
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

PLAN DE CARGAS INICIAL
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
(La reprogramación de esta línea de items consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos (previsión))

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 3095-2021

PLAZO INICIAL: 01/01/2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/09/2021
(Indique la fecha de inicio del contrato)

PLAZO ACUMULADO: 01/01/2021
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2021
(Indique la fecha de vencimiento)

OBJETO: INTERVENCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRELAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SANEAMIENTO DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MORTOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA (OBRAS ALTERNATIVAS) LA REACTIVACIÓN (EPR 2021, MOD 3)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acto)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la reanudación que corresponda con el período del acto)

INTERVENIOR: CONSORCIO VAL NITES

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 11.899.999.000,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 1.700.000.000,00

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENCIÓN: No. 080 DE

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+H+B): \$ 13.599.999.000,00

RESOLUCIÓN No. 080 DE

CONTRATISTA: CONSORCIO USA 999-2020

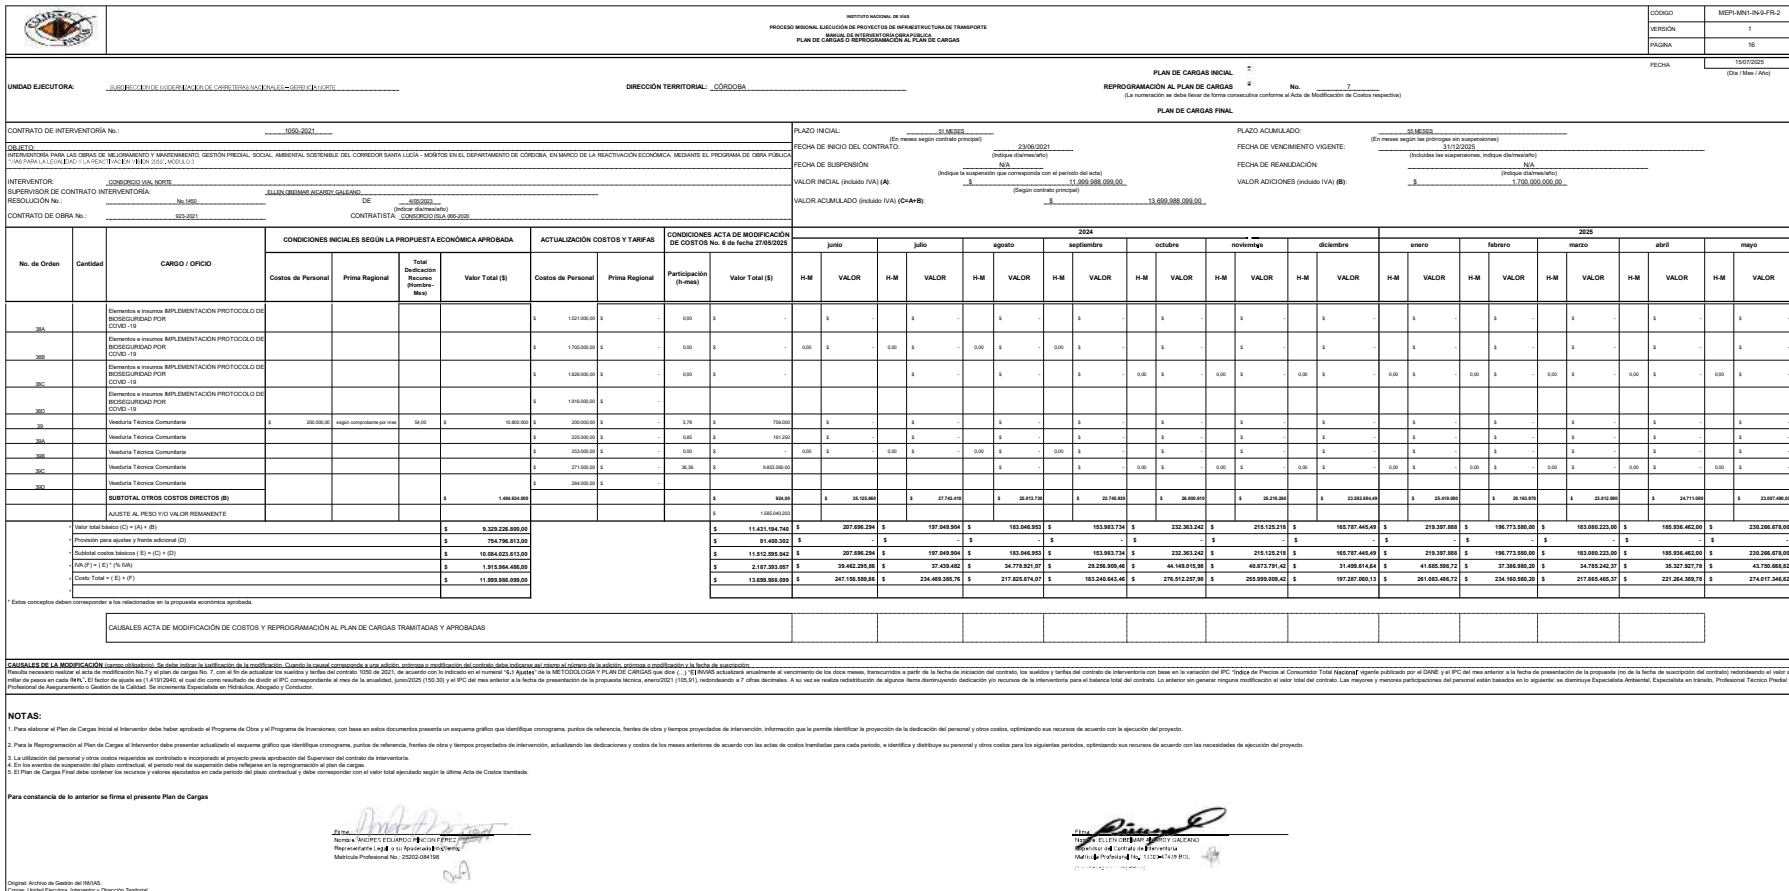
CONTRATO DE OBRA No.: 3095-2021

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 6 de fecha 27/09/2025												junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre		enero		febrero		marzo		abril		mayo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Personas Mes)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (0-miles)	Valor Total (\$)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Carretera a Campero de más de 2000 c.c. (1) 444 (incluye pesaje y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelo 2015 o superior				\$ 6.780.000,00	\$ -	20,00	\$ 108.000.000,00					\$ -		\$ -		\$ -	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.000.000,00	2,00	\$ 10.00

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Notario: RICARDO EDUARDO ROYAL
Representante: [Firma]
Matrícula Profesional No.: 25202-084-108

Notario: RICARDO EDUARDO ROYAL
Representante: [Firma]
Matrícula Profesional No.: 25202-084-108





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENCIÓN AEROPÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	17

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES – GERENCIA NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PLAN DE CARGAS INICIAL

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 7

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: _____ 1050-2021

PLAZO INICIAL: 51 MESES

PLAZO ACUMULADO: 55 MESES

OBJETO:
INTERVENCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN FISCAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MONTE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN EN 2020", MÓDULO 3

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ NA _____

FECHA DE REANUDACIÓN	NA
----------------------	----

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 11.999.999.999,0

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 1.700.000.000,00

CONTRATO DE OBRA N.º: 923-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

1000

--	--

	COND
--	------

N	
---	--

2

--	--

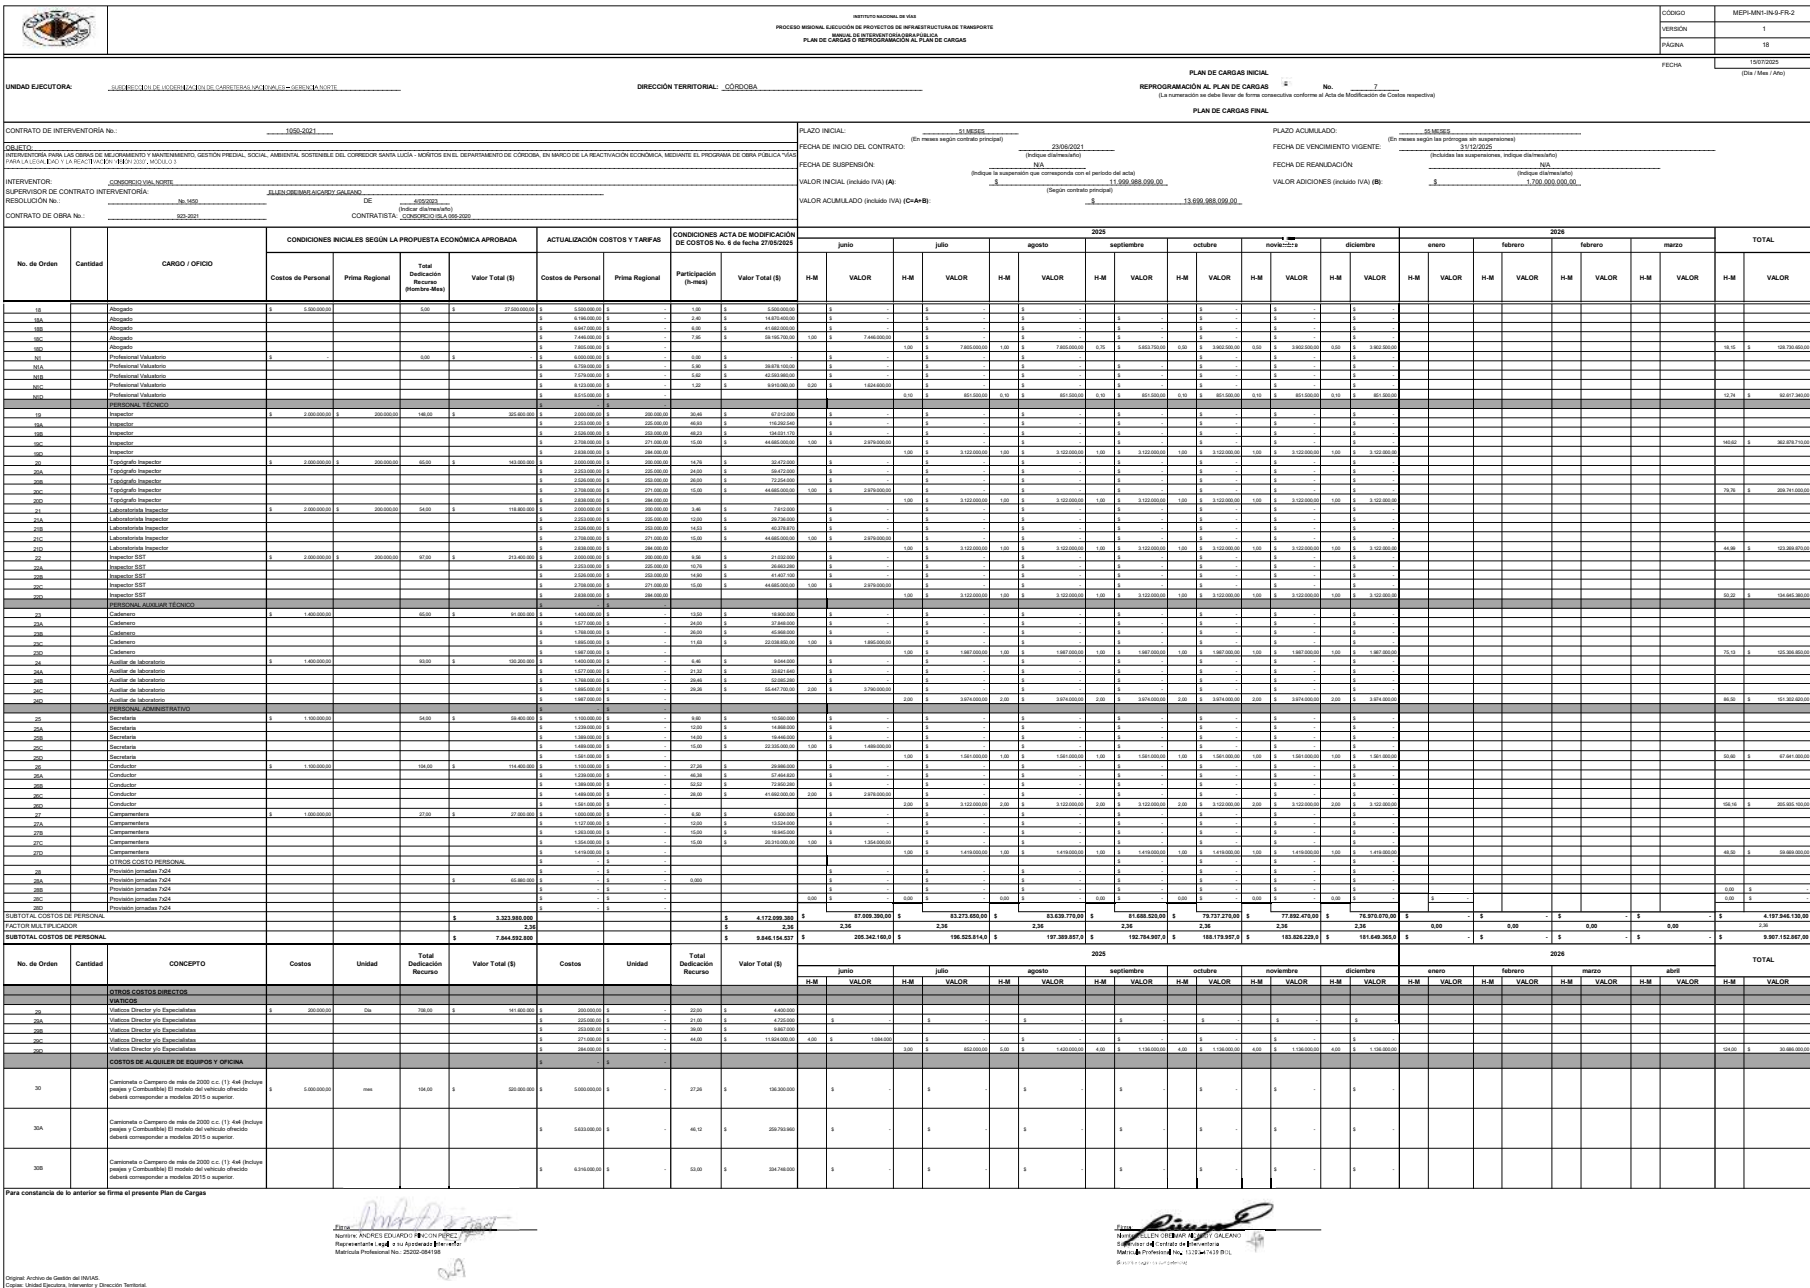
[illegible]

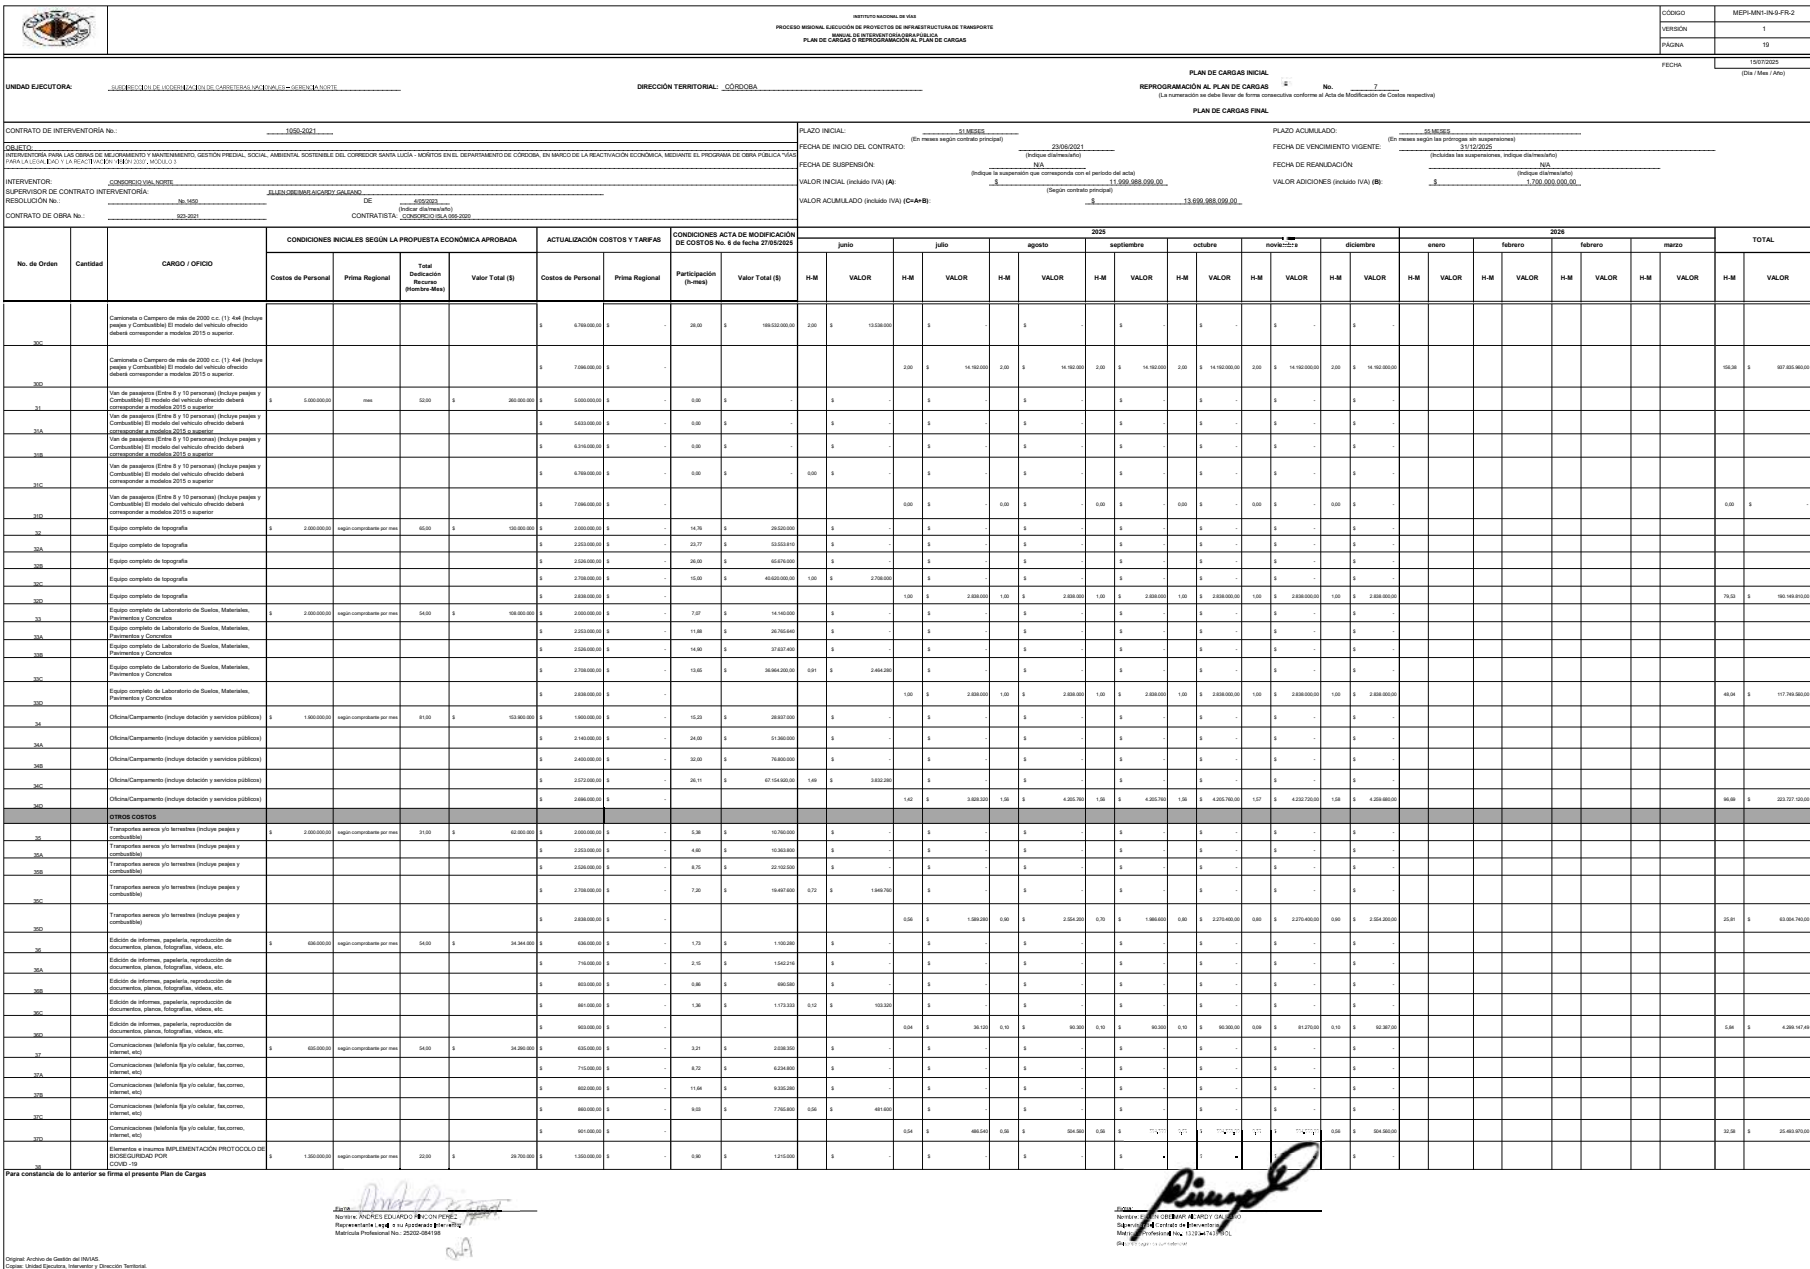
Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Carga

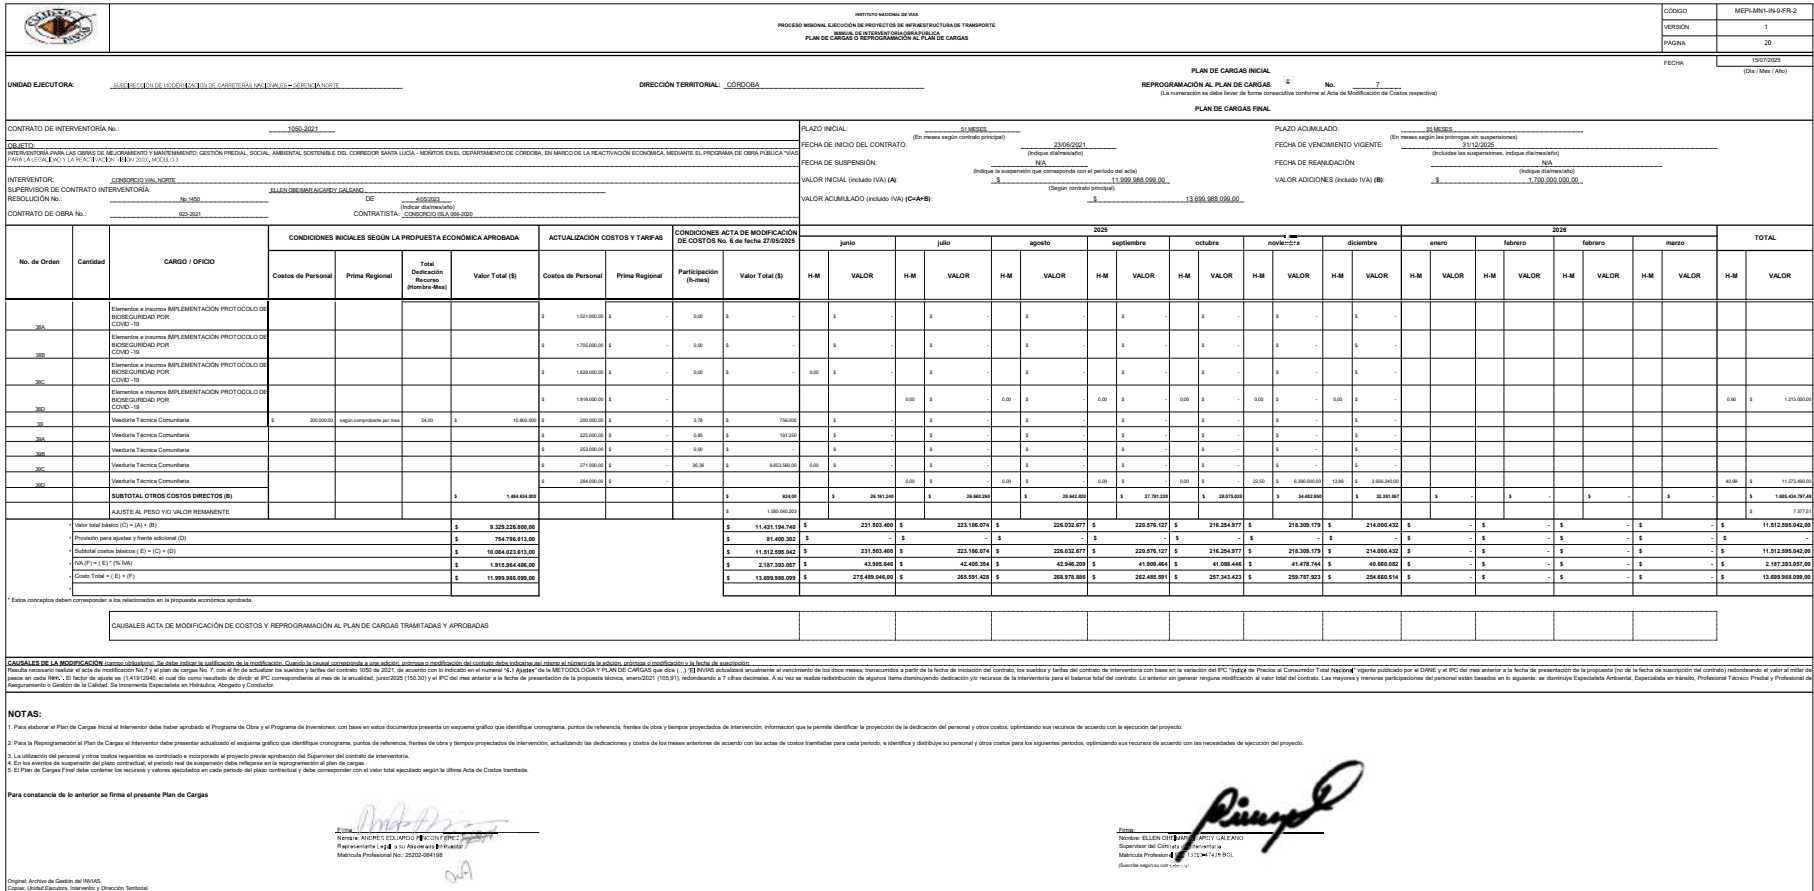
Firma: 
Nombre: ANDRÉS EDUARDO PÁEZ
Representante Legal o su Apoderado: 
Matrícula Profesional No.: 25202-054195

Firma 
Nombre: ELLEN GABE MAR A. ASPI GALEANO
Supervisor del Control de Inventario
Matrícula Profesional No. 1320-47419 BCL

Original: Archivo de Gestión del IN/IAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.







[illegible]

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGOS																									CODIGO	MEPLAN-BG-FPB-2			
																									VERSION	1			
																									PAGINA	1			
No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS N. 6 de fecha 27/03/2023																				
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Deducción Recargos (Diferencia Neg)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (Diferencia)	Valor Total (\$)	2023																		
											junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo							
										H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR				
33		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concreto	\$	2.000.000,00	según correspondiente por ítem	162,00	\$	168.000,00	\$	2.000.000,00	7,57	\$	14.760,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
33A		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concreto					\$	2.000.000,00			11,08	\$	26.760,00	1,00	\$	2.300,00		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
33B		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concreto					\$	2.000.000,00			16,93	\$	37.037,00		1,00	\$	2.000,00	1,00	\$	2.000,00	1,00	\$	2.000,00	1,00	\$	2.000,00	1,00		
33C		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concreto					\$	2.700.000,00			16,96	\$	36.961,20,00																
33D		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concreto					\$	2.000.000,00			-																		
34		OficinaCarpentero (incluye dotación y servicios públicos)	\$	1.000.000,00	según correspondiente por ítem	67,00	\$	103.000,00			10,33	\$	38.037,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
34A		OficinaCarpentero (incluye dotación y servicios públicos)					\$	1.100.000,00			30,00	\$	67.000,00	0,00	\$	4.300,00		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
34B		OficinaCarpentero (incluye dotación y servicios públicos)					\$	2.000.000,00			30,00	\$	70.000,00		0,00	\$	4.000,00	0,00	\$	4.000,00	0,00	\$	4.000,00	0,00	\$	4.000,00	0,00		
34C		OficinaCarpentero (incluye dotación y servicios públicos)					\$	3.000.000,00			30,11	\$	87.000.00,00																
34D		OficinaCarpentero (incluye dotación y servicios públicos)					\$	2.000.000,00			-																		
OTROS COSTOS																													
35		Transportes, servicios y/o biomotor (incluye pago de combustible)	\$	3.000.000,00	según correspondiente por ítem	31,00	\$	63.000,00	\$	3.000.000,00	9,30	\$	10.760,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
35A		Transportes, servicios y/o biomotor (incluye pago de combustible)					\$	2.000.000,00			6,00	\$	10.560,00	0,00	\$	1.900,00		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
35B		Transportes, servicios y/o biomotor (incluye pago de combustible)					\$	2.000.000,00			6,75	\$	12.100,00		1,00	\$	2.000,00	0,00	\$	2.000,00	0,00	\$	2.000,00	0,00	\$	2.000,00	0,00		
35C		Transportes, servicios y/o biomotor (incluye pago de combustible)					\$	2.700.000,00			7,20	\$	16.207,00																
35D		Transportes, servicios y/o biomotor (incluye pago de combustible)					\$	2.000.000,00			-																		
36		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	\$	600.000,00	según correspondiente por ítem	60,00	\$	60.000,00			1,70	\$	1.100,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
36A		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					\$	700.000,00			2,70	\$	1.600,00	0,00	\$	60,00		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
36B		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					\$	600.000,00			0,00	\$			0,00	\$	70.000	0,00	\$	60.000	0,00	\$	60.000	0,00	\$	60.000	0,00		
36C		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					\$	600.000,00			1,30	\$	1.170,00																
36D		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					\$	600.000,00			-																		
37		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	\$	600.000,00	según correspondiente por ítem	60,00	\$	60.000,00			3,37	\$	3.000,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
37A		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)					\$	700.000,00			6,70	\$	4.000,00	0,70	\$	600,00		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
37B		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)					\$	600.000,00			11,64	\$	9.000,00		0,00	\$	621.000	0,00	\$	610.000	0,00	\$	600.000	0,00	\$	600.000	0,00		
37C		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)					\$	600.000,00			0,33	\$	1.700,00																
37D		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)					\$	600.000,00			-																		
38		Bienestar e Insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIENESTAR POR COVID-19	\$	1.000.000,00	según correspondiente por ítem	20,00	\$	20.000,00			6,60	\$	1.270,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
38A		Bienestar e Insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIENESTAR POR COVID-19					\$	1.000.000,00			0,00	\$	-	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
38B		Bienestar e Insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIENESTAR POR COVID-19					\$	1.700.000,00			0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
38C		Bienestar e Insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIENESTAR POR COVID-19					\$	1.000.000,00			0,00	\$	-																
38D		Bienestar e Insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIENESTAR POR COVID-19					\$	1.000.000,00			-																		
39		Verdulería Técnica Comunitaria	\$	200.000,00	según correspondiente por ítem	60,00	\$	10.000,00			0,70	\$	700,00		-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
39A		Verdulería Técnica Comunitaria					\$	200.000,00			0,00	\$	300,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
39B		Verdulería Técnica Comunitaria					\$	200.000,00			0,00	\$			0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
39C		Verdulería Técnica Comunitaria					\$	200.000,00			30,30	\$	9.000.000,00																
39D		Verdulería Técnica Comunitaria					\$	200.000,00			-																		
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)							\$	1.460.000,00			\$	604,00	\$	36.167,00	\$	41.360,00	\$	36.700,00	\$	38.600,00	\$	38.600,00	\$	40.300,00	\$	38.600,00	\$	38.600,00	
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE											\$	1.000.000,00																	
Valor total básico (C) = (A) + (B)							\$	9.330.230.000,00			\$	11.421.964,74	\$	237.303.200	\$	272.724.036	\$	274.305.362	\$	274.407.317	\$	285.101.033	\$	285.120.107	\$	282.316.877	\$	287.340.906	
Provisión para inflación o Items adicionales (D)							\$	764.700.000,00			\$	91.400,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)							\$	10.094.930.000,00			\$	11.513.364,74	\$	237.303.200	\$	272.724.036	\$	274.305.362	\$	274.407.317	\$	285.101.033	\$	285.120.107	\$	282.316.877	\$	287.340.906	
IVA (F) = (E) * (% IVA)							\$	1.910.864.486,00			\$	2.167.360,60	\$	49.087.628	\$	61.817,007	\$	62.162.090,23	\$	64.178.048,27	\$	64.178.048,27	\$	65.040.208,63	\$	65.040.208,63	\$	65.040.208,63	
Costo Total = (E) + (F)							\$	11.999.999.999,00			\$	13.680.725,34	\$	282.380.815	\$	336.643.081	\$	336.643.081,27	\$	339.330.081,27	\$	351.283.760,73	\$	347.837.080,63	\$	346.240.293,34	\$	346.240.293,34	

No. de Orden		Cantidad	CARGO/ OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUUESTA ECONOMICA APROBADA				ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS				CONDICIONES ACTUALES				MODIFICACION DE COSTOS No. 6 de Junta 1/2019				junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre		enero		febrero		marzo		abril		mayo	
				Costos de Personal	Prima Regional	Total Recursos (Miles Pesos)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (por mil)	Valor Total (\$)	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR	H.M.	VALOR		
COSTO DIRECTOS DE PERSONAL																																											
PERSONAL PROFESIONAL																																											
1		Director de Interventoría	\$	7.000.000,00	\$	900.000,00	\$	50,00	\$	400.100.000,00	\$	7.000.000,00	\$	900.000,00	\$	50,00	\$	400.100.000,00	\$	7.000.000,00	\$	900.000,00	\$	50,00	\$	400.100.000,00	\$	7.000.000,00	\$	900.000,00	\$	50,00	\$	400.100.000,00	\$	7.000.000,00	\$	900.000,00	\$	50,00	\$	400.100.000,00	
2		Director de Interventoría	\$	4.000.000,00	\$	500.000,00	\$	30,00	\$	200.050.000,00	\$	4.000.000,00	\$	500.000,00	\$	30,00	\$	200.050.000,00	\$	4.000.000,00	\$	500.000,00	\$	30,00	\$	200.050.000,00	\$	4.000.000,00	\$	500.000,00	\$	30,00	\$	200.050.000,00	\$	4.000.000,00	\$	500.000,00	\$	30,00	\$	200.050.000,00	
3A		Director de Interventoría	\$	4.000.000,00	\$	400.000,00	\$	20,00	\$	160.000.000,00	\$	4.000.000,00	\$	400.000,00	\$	20,00	\$	160.000.000,00	\$	4.000.000,00	\$	400.000,00	\$	20,00	\$	160.000.000,00	\$	4.000.000,00	\$	400.000,00	\$	20,00	\$	160.000.000,00	\$	4.000.000,00	\$	400.000,00	\$	20,00	\$	160.000.000,00	
4		Director de Interventoría	\$	4.000.000,00	\$	400.000,00	\$	20,00	\$	160.000.000,00	\$	4.000.000,00	\$	400.000,00	\$	20,00	\$	160.000.000,00	\$	4.000.000,00	\$	400.000,00	\$	20,00	\$	160.000.000,00	\$	4.000.000,00	\$	400.000,00	\$	20,00	\$	160.000.000,00	\$	4.000.000,00	\$	400.000,00	\$	20,00	\$	160.000.000,00	
5A		Ingeniero Residente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	
6A		Ingeniero Residente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	
7A		Ingeniero Residente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	
8A		Ingeniero Residente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	
9A		Ingeniero Residente de Interventoría	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	\$	3.000.000,00	\$	300.000,00	\$	15,00	\$	120.000.000,00	
10A		Ingeniero Asesor de Interventoría	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	
11A		Ingeniero Asesor de Interventoría	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	
12A		Ingeniero Asesor de Interventoría	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	
13A		Ingeniero Asesor de Interventoría	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	
14A		Ingeniero Asesor de Interventoría	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	
15A		Ingeniero Asesor de Interventoría	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	
16A		Ingeniero Asesor de Interventoría	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	
17A		Ingeniero Asesor de Interventoría	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	
18A		Ingeniero Asesor de Interventoría	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	
19A		Ingeniero Asesor de Interventoría	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	
20A		Ingeniero Asesor de Interventoría	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	
21A		Ingeniero Asesor de Interventoría	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	
22A		Ingeniero Asesor de Interventoría	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	
23A		Ingeniero Asesor de Interventoría	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	
24A		Ingeniero Asesor de Interventoría	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	
25A		Ingeniero Asesor de Interventoría	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	
26A		Ingeniero Asesor de Interventoría	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	
27A		Ingeniero Asesor de Interventoría	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	
28A		Ingeniero Asesor de Interventoría	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	200.000,00	\$	10,00	\$	80.000.000,00	\$	2.000.000,00	\$	2																					

										CÓDIGO	MEPAR01-06-PR-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										VERSION	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										PÁGINA	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESUMEN AL PLAN DE CARGAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFFAS				CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 6 de fecha 17/05/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Definición Recursos (Bono)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (Bono)	Valor Total (\$)	2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											junio				julio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
											agosto				septiembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
											octubre				noviembre				diciembre				enero				febrero				marzo				abril				mayo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR</

		SEGUIMIENTO AL PLAN DE GASTOS																										CÓDIGO	MEF/PARTI-26-PP-2					
		CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 6 de fecha 27/08/2023																										VERSION	1					
		CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 6 de fecha 27/08/2023																										PAGINA	1					
No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUUESTA ECONOMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFFAS				CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 6 de fecha 27/08/2023												2024											
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Deducciones Reservas (Reservas Retenidas)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (P-RM)	Valor Total (\$)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR		
33		Equipo completo de Laboratorio de Saneamiento, Microbiología, Parasitología y Citología	\$	2,000,000.00	según presupuesto por ítem	50,000	\$	100,000.00	\$	2,050,000.00	\$	-	7,57	\$	10,100.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
33A		Equipo completo de Laboratorio de Saneamiento, Microbiología, Parasitología y Citología	\$	2,000,000.00			\$	2,000,000.00	\$	-	11,94	\$	20,760.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
33B		Equipo completo de Laboratorio de Saneamiento, Microbiología, Parasitología y Citología	\$	2,000,000.00			\$	2,000,000.00	\$	-	10,90	\$	27,007.00	0,90	\$	2,470.00	0,90	\$	2,470.00	0,90	\$	2,470.00	0,90	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
33C		Equipo completo de Laboratorio de Saneamiento, Microbiología, Parasitología y Citología	\$	2,700,000.00			\$	2,700,000.00	\$	-	10,90	\$	30,960.00		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,91	\$	2,460.00	0,91	\$	2,460.00	0,91	\$	2,460.00	0,91	\$	2,460.00
33D		Equipo completo de Laboratorio de Saneamiento, Microbiología, Parasitología y Citología	\$	2,000,000.00			\$	2,000,000.00	\$	-																								
34		Obisec/Campamento (incluye distación y servicios públicos)	\$	1,000,000.00	según presupuesto por ítem	67,000	\$	100,000.00	\$	1,067,000.00	\$	-	10,20	\$	20,167.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
34A		Obisec/Campamento (incluye distación y servicios públicos)	\$	1,000,000.00			\$	1,000,000.00	\$	-	20,00	\$	67,360.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
34B		Obisec/Campamento (incluye distación y servicios públicos)	\$	2,000,000.00			\$	2,000,000.00	\$	-	50,00	\$	70,360.00	0,00	\$	4,000.00	0,00	\$	4,000.00	0,00	\$	4,000.00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
34C		Obisec/Campamento (incluye distación y servicios públicos)	\$	2,000,000.00			\$	2,000,000.00	\$	-	50,00	\$	70,360.00		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
34D		Obisec/Campamento (incluye distación y servicios públicos)	\$	2,000,000.00			\$	2,000,000.00	\$	-	50,00	\$	70,360.00		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00
34E		Obisec/Campamento (incluye distación y servicios públicos)	\$	2,000,000.00			\$	2,000,000.00	\$	-	50,00	\$	70,360.00		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00
34F		Obisec/Campamento (incluye distación y servicios públicos)	\$	2,000,000.00			\$	2,000,000.00	\$	-	50,00	\$	70,360.00		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00
OTROS COSTOS			\$			\$			\$																									
35		Transporte aéreo y/o terrestre (incluye pagaje y combustible)	\$	2,000,000.00	según presupuesto por ítem	50,000	\$	100,000.00	\$	2,050,000.00	\$	-	5,00	\$	10,100.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
35A		Transporte aéreo y/o terrestre (incluye pagaje y combustible)	\$	2,000,000.00			\$	2,000,000.00	\$	-	4,90	\$	9,800.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
35B		Transporte aéreo y/o terrestre (incluye pagaje y combustible)	\$	2,000,000.00			\$	2,000,000.00	\$	-	4,70	\$	9,400.00	1,00	\$	9,400.00	1,00	\$	9,400.00	1,00	\$	9,400.00	1,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
35C		Transporte aéreo y/o terrestre (incluye pagaje y combustible)	\$	2,700,000.00			\$	2,700,000.00	\$	-	7,20	\$	10,467.00		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00
35D		Transporte aéreo y/o terrestre (incluye pagaje y combustible)	\$	2,000,000.00			\$	2,000,000.00	\$	-	7,20	\$	10,467.00		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00
36		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	\$	600,000.00	según presupuesto por ítem	60,000	\$	30,000.00	\$	630,000.00	\$	-	1,20	\$	1,100.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36A		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	\$	600,000.00			\$	600,000.00	\$	-	2,10	\$	1,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36B		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	\$	600,000.00			\$	600,000.00	\$	-	0,00	\$	600.00	0,10	\$	110.00	0,00	\$	20.00	0,00	\$	20.00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36C		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	\$	600,000.00			\$	600,000.00	\$	-	1,30	\$	1,110.00		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,01	\$	60.00	0,00	\$	20.00	0,10	\$	100.00	0,00	\$	110.00
36D		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	\$	600,000.00			\$	600,000.00	\$	-																								
36E		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	\$	600,000.00			\$	600,000.00	\$	-	1,20	\$	1,100.00		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00
37		Comunicaciones (teléfono fijo y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	\$	600,000.00	según presupuesto por ítem	60,000	\$	30,000.00	\$	630,000.00	\$	-	5,20	\$	2,100.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
37A		Comunicaciones (teléfono fijo y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	\$	600,000.00			\$	600,000.00	\$	-	6,20	\$	6,200.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
37B		Comunicaciones (teléfono fijo y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	\$	600,000.00			\$	600,000.00	\$	-	11,00	\$	9,200.00	0,00	\$	700.00	0,00	\$	700.00	0,00	\$	700.00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
37C		Comunicaciones (teléfono fijo y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	\$	600,000.00			\$	600,000.00	\$	-	6,20	\$	6,200.00		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,17	\$	600.00	0,17	\$	600.00	0,17	\$	600.00	0,17	\$	600.00
37D		Comunicaciones (teléfono fijo y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	\$	600,000.00			\$	600,000.00	\$	-																								
38		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$	1,000,000.00	según presupuesto por ítem	20,000	\$	20,000.00	\$	1,020,000.00	\$	-	0,00	\$	1,200.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
38A		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$	1,000,000.00			\$	1,000,000.00	\$	-	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
38B		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$	1,000,000.00			\$	1,000,000.00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
38C		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$	1,000,000.00			\$	1,000,000.00	\$	-	0,00	\$	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
38D		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$	1,000,000.00			\$	1,000,000.00	\$	-																								
39		Visita Técnica Comunitaria	\$	200,000.00	según presupuesto por ítem	50,000	\$	10,000.00	\$	210,000.00	\$	-	3,70	\$	190.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
39A		Visita Técnica Comunitaria	\$	200,000.00			\$	200,000.00	\$	-	0,00	\$	190.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
39B		Visita Técnica Comunitaria	\$	200,000.00			\$	200,000.00	\$	-	4,00	\$	4,000	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
39C		Visita Técnica Comunitaria	\$	200,000.00			\$	200,000.00	\$	-	36,70	\$	3,660.00		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00
39D		Visita Técnica Comunitaria	\$	200,000.00			\$	200,000.00	\$	-																								
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)			\$			\$	1,040,000.00			\$	1,040,000.00			\$	217,000.00	\$	217,000.00	\$	217,000.00	\$	217,000.00	\$	217,000.00	\$	217,000.00	\$	217,000.00	\$	217,000.00	\$	217,000.00	\$	217,000.00	
AJUSTE AL PRESUPUESTO VALOR REMANENTE			\$			\$			\$																									
Valor total básico (C) = (A) + (B)			\$			\$	6,329,320,000.00			\$	11,401,104,710	\$		\$	207,696,204	\$	197,040,004	\$	103,046,903	\$	103,903,734	\$	232,302,242	\$	216,120,210	\$	160,707,440,40	\$	210,307,000	\$				
Procedido para ajuste y cierre adicional (D)			\$			\$	756,796,813.04			\$	81,440,000	\$	-	\$	81,440,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Subtotal costos Muestra (E) = (C) + (D)			\$			\$	7,086,116,813.04			\$	11,482,544,710	\$		\$	309,136,204	\$	197,040,004	\$	103,046,903	\$	103,903,734	\$	232,302,242	\$	216,120,210	\$	160,707,440,40	\$	210,307,000	\$				
IVA (F) = [E] * (F) (N/A)			\$			\$	1,016,984,448.00			\$	27,149,007	\$		\$	39,442,200.00	\$	37,470,923.07	\$		\$	46,149,019.00	\$	40,873,779.42	\$	31,409,814.60	\$	41,880,090.71	\$	37,360,990.20	\$	34,708,240.20	\$		
Costo Total = (E) + (F)			\$			\$	12,103,001,261.00			\$	12,508,543,710	\$		\$	248,578,303.70	\$	234,510,926.07	\$	103,246,643.40	\$	103,950,643.40	\$	279,212,021.38	\$	208,093,624.42	\$	197,307,090.10	\$	201,168,080.70	\$	201,548,080.70	\$		

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGOS											CODIGO		MEP-MET-04-S-PR-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
											VERSION		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
											PAGINA		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPOSTA ECONOMICA APROBADA				ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPOSTA ECONOMICA APROBADA				SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGOS												TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Costos de Personal		Prima Regional	Total Recursos (Puntaje Base)	Valor Total (\$)	Costos de Personal		Prima Regional	Participación (Puntaje Base)		Valor Total (\$)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estado de la ejecución del proyecto al periodo del presente mes se encuentra en una inversión básica de obra del 92.05% equivalente a \$127.416.735.114 millones de pesos que comparando con el programado del 92.2% que corresponde a \$127.685.755.128 millones de pesos. se presenta un atraso del 0.211% a corte del presente informe, por lo cual el contratista se encuentra incumpliendo el programa de inversión aprobado.

Se realiza la demolición y reconstrucción de losas del PR9+057 al PR9+079 lado derecho, Se realizan actividades de bacheo entre el PR0+125.5 y el PR2+150 por el lado derecho y del PR0+120 al PR2+120 lado izquierdo, se realiza instalación de mezcla MDC-19 (Sobre carpeta) entre el PR0+110 y el PR1+689, instalación de MDC-19 para nivelación del PR3+535 al PR3+640 lado izquierdo y PR3+510 al PR3+525 lado derecho.

Se instalan tachas en el PR24+600, PR28+680, PR29+250, PR47+485, PR47+685. Construcción de resaltos pompeyano en el PR24+600 lado derecho, PR28+675 lado derecho, PR29+250 lado izquierdo, PR47+485 puente broqueles lado izquierdo, PR47+685 puente broqueles lado izquierdo.

Se realiza protección de taludes mediante malla triple torsion en el PR13+100 lado derecho.

En el Box culvert PR34+650 (Prolongación lado derecho). Se realiza instalación de afirmado y terraplén.

Los puentes del PR6+970, PR34+500, PR45+300 y PR45+700 se encuentran terminados y habilitados para la circulación del tráfico vehicular.

Durante el mes de septiembre 2025 se realiza seguimiento a las actividades de reparación paliativa mediante el método de costura cruzada.

En cuanto a la modificación y ajuste de los diseños, al corte del 30 de septiembre de 2025 se vienen realizando los ajustes necesarios entre el PR22+000 al PR46+000. Se han presentado diferentes ajustes a los diseños fase III por lo que han surgido mayores cantidades de obras y Ítem no previstos. Se han identificado sitios con riesgos menores los cuales requieren tratamiento que se encuentran en estudio de los especialistas.

Se presenta acta parcial de obra # 52 correspondiente a las actividades realizadas en el mes de septiembre 2025.

La inversión total ejecutada acumulada en el contrato de obra a corte del 30 de septiembre de 2025 es de \$156.315.672.830 millones de pesos, equivalente al 87.44% con respecto al valor del contrato.

Para el contrato de obra se otorgó en el mes de agosto de 2021 un valor de \$ 8.225.125.125 como anticipo, en el mes de diciembre-21 se tramitó un segundo anticipo por valor de \$2.747.414.331 y en el mes de agosto-23 se tramito un tercer anticipo por valor de \$3.371.395.812 para un valor total de anticipo de \$14.343.935.268, de los cuales con el acumulado del acta de obra # 52 se ha alcanzado a amortizar \$13.218.083.756 millones de pesos, quedando un saldo por amortizar de \$1.125.851.512 millones de pesos.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Para el contrato de interventoría se otorgó en el mes de agosto-21 \$ 504.201.181 como anticipo y en el mes de diciembre de 2021 se tramitó un segundo anticipo de \$289.629.974, de los cuales con el acta de costo # 18 correspondiente al mes de noviembre de 2022 se terminó de amortizar el anticipo al 100%.

Durante el mes de septiembre 2025 se realiza seguimiento a las actividades de reparación paliativa mediante el método de costura cruzada.

Durante el mes de septiembre 2025 se realiza seguimiento a las actividades de reconstrucción de losas MR-40 en los tramos de prueba escogidos por los especialistas en pavimento.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

8. ANEXOS

8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Correspondencia enviada Septiembre de 2025

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3756	49980-CE-3756	2/09/2025		RESPUESTA COMUNICADO 45067- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3665– SOLICITUD APROBACIÓN INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN DE VEREDAS EL JOBAL Y PAJONAL
3757	49980-CE-3757	29/08/2025		RESPUESTA COMUNICADO 45113- ENTREGA PRELIMINAR DEL DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC- 19 CON ASFALTO NORMALIZADO 60-70 + ADITIVO PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA ACTIVIDAD DE PARCHEO
3758	49980-CE-3758	1/09/2025		RESPUESTA COMUNICADO 45177- RESPUESTA COMUNICADO 49880-CE-3680 DISEÑO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL K31+350 CARRIL DERECHO
3759	49980-CE-3759	19/09/2025	2025E-VUVRAZ-105252	REMISIÓN DE INSCRIPCIÓN DE OFERTA CORRESPONDIENTE A LA FICHA PREDIAL 004I-T1
3760	49980-CE-3760	2/09/2025		RADICADO 45287- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3693- ENTREGA DE NOTAS TÉCNICAS DE GEOTECNIA PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LOS SITIOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL K31+035 Y K41+130. RESPUESTA OBSERVACIONES DE GEOTECNIA MURO K31+350
3761	49980-CE-3761	2/09/2025		RADICADO 45288- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE- 3719 - PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS FUNCIONALES PARA INTERVENCIÓN DE LOSAS CON AFECTACIONES
3762	49980-CE-3762	2/09/2025		RESPUESTA COMUNICADO 45121- ENTREGA SOPORTES ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD JULIO 2025
3763	49980-CE-3763	3/09/2025		RESPUESTA COMUNICADO 45211- DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC19 CON ASFALTO NORMALIZADO 60-70 + ADITIVO PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA ACTIVIDAD DE PARCHEO. ENTREGA COMPLETA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3764	49980-CE-3764	3/09/2025		RTA 45102 TRABAJOS NO AUTORIZADOS REPARACION DE LOSAS PAVIMENTO MR40 ENTREGA DE PROCEDIMIENTO PR-CI066-QAQC-23 "PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA REPARACIÓN DE LOSAS AISLADAS CON GRIETAS CRÍTICAS Y SUSTITUCIÓN POR
3765	49980-CE-3765	3/09/2025	2025E-VUVRAZ-098419	DISPOSICION DE FRESADO DE MEZCLA ASFÁLTICA
3766	49980-CE-3766	3/09/2025		RTA 45209- ENTREGA DE DISEÑOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE CON GRANO CAUCHO (M-GCR-19) Y MDC-10 PARA ALTERNATIVAS PRESENTADAS EN SITIOS CLASIFICADOS COMO LEVES Y MODERADOS. DISEÑO MDC-10. INFORME TÉCNICO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MDC-10
3767	49980-CE-3767	4/09/2025		SOLICITUD DE RADICACIÓN DE LA FICHA PREDIAL IDENTIFICADO CON NÚMERO NO. 015A-D-T3-MSM
3768	49980-CE-3768	4/09/2025		RTA 45288- RTA A RAD No 49980- CE- 3719 RESPUESTA COMUNICADO 44892 - RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE- 3671 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS FUNCIONALES PARA INTERVENCIÓN DE LOSAS CON AFECTACIONES
3769	49980-CE-3769	4/09/2025	2025E-VUVRAZ-098454	INUNDACIÓN PR23+980 SECTOR BUENOS AIRES
3770	49980-CE-3770	4/09/2025		DEVOLUCIÓN CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN PREDIAL. RESPUESTA A SU COMUNICADO IDENTIFICADO CON RADICADO NO. 44003
3771	49980-CE-3771	5/09/2025	2025E-VUVRAZ-098937	INTERVENCIONES TALUD PR 15+400 MARGEN IZQUIERDA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3772	49980-CE-3772	5/09/2025		RESPUESTA COMUNICADO 44809- ENTREGA DE NOTAS TÉCNICAS DE GEOTECNIA PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LOS SITIOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL K31+035 Y K41+130. ATENCIÓN A OBSERVACIONES SITIO K41+130
3773	49980-CE-3773	8/09/2025		RAD 45359 ALCANCE C 44909 - ENTREGA DE DISEÑOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE CON GRANO CAUCHO (M-GCR-19) Y MDC-10 PARA ALTERNATIVAS PRESENTADAS EN SITIOS CLASIFICADOS COMO LEVES Y MODERADOS. DISEÑO MSC-19 CAM GCR TIPO I PREMIUM
3774	49980-CE-3774	8/09/2025		RADICADO 45399- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE- 3763- DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC19 CON ASFALTO NORMALIZADO 60-70 + ADITIVO PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA ACTIVIDAD DE PARCHEO. ENTREGA COMPLETA
3775	49980-CE-3775	8/09/2025		RESPUESTA COMUNICADO 45178- ENTREGA NOTA TÉCNICA, VERIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE EXTENSIÓN DE BOX CULVERT K45+880 Y K46+076
3776	49980-CE-3776	8/09/2025		RADICADO 45401- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3705- ENTREGA REPORTE VISITA DE CAMPO ESPECIALISTA DE GEOTÉCNIA 11 DE ABRIL DE 2025. INFORME DE VISITA ESPECIALISTA EN GEOTECNIA INTERVENTORÍA 04 y 05 DE JUNIO DE 2025
3777	49980-CE-3777	8/09/2025		RESPUESTA COMUNICADO 45136- INTERVENCIÓN EN LOSAS AISLADAS O INTERMEDIAS NOS 238 A 247 CARRIL DERECHO. (K9+060 – 9+100)
3778	49980-CE-3778	8/09/2025		RTA 45359- RTA CE-3617 - ENTREGA DE DISEÑOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE CON GRANO CAUCHO (M-GCR-19) Y MDC-10 PARA ALTERNATIVAS PRESENTADAS EN SITIOS CLASIFICADOS COMO LEVES Y MODERADOS. DISEÑO MSC-19 CAM GCR TIPO I PREMIUM.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3779	49980-CE-3779	9/09/2025		RAD 45397- RTA CE- 3766- ENTREGA DE DISEÑOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE CON GRANO CAUCHO (M- GCR-19) Y MDC-10 PARA ALTERNATIVAS PRESENTADAS EN SITIOS CLASIFICADOS COMO LEVES Y MODERADOS. DISEÑO MDC-10. INFORME TÉCNICO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MDC-10
3780	49980-CE-3780	8/09/2025		SU COMUNICADO 45365 RADICADO PREACTA DE OBRA No. 51, AGOSTO 2025 PARA REVISIÓN
3781	49980-CE-3781	9/09/2025		RADICADO 45435- ALCANCE A COMUNICADO RADICADO 44839 ENTREGA REPORTE DE VISITA DE CAMPO 24 Y 25 DE JULIO DE 2025 REVISIÓN INSPECCIÓN Y ESTADO DE LOSAS DE PAVIMENTO. AJUSTE VISITA DE CAMPO 29 DE AGOSTO DE 2025
3782	49980-CE-3782	9/09/2025		RESPUESTA COMUNICADO 45367 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025- APROBACIÓN INFORME ACTIVIDADES SOCIALES N°51 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
3783	49980-CE-3783	9/09/2025		RESPUESTA RADICADO 45368 - INFORME AMBIENTAL AGOSTO 2025
3784	49980-CE-3784	9/09/2025	2025E-VUVRAZ-100444	REQUERIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
3785	49980-CE-3785	9/09/2025		RESPUESTA COMUNICADO 45285 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 -APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD
3786	49980-CE-3786	9/09/2025	2025E-VUVRAZ-100450	RESPUESTA RADICADO 45437 – “RESPUESTA 49980-CE-3771 INTERVENCIONES TALUD PR 15+400 MARGEN IZQUIERDA”
3787	49980-CE-3787	9/09/2025		RADICADO 45436- ENTREGA DISEÑO DE MEZCLA MDC-19 CON ASFALTO 6070 NORMALIZADO CONAMBIEN
3788	49980-CE-3788	10/09/2025	2025E-VUVRAZ-100979	SU COMUNICADO 45364 ENTREGA APU - PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA EVALUACIÓN GEOTECNIA DE PATOLOGÍAS PREMATURAS EN LOSAS DE CONCRETO DEL PROYECTO SANTA LUCÍA MOÑITOS
3789	49980-CE-3789	10/09/2025		RADICADO 45438- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3661– VERIFICACIÓN Y NOTA TÉCNICA DE GEOTÉCNIA PARA MURO DE CONTENCIÓN EN EL K40+260

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3790	49980-CE-3790	10/09/2025		RADICADO 45439-ENTREGA DE DISEÑO GEOTÉCNICO MURO DE CONTENCIÓN PARA TALUD DEL K41+050
3791	49980-CE-3791	10/09/2025		RADICADO 45440- ENTREGA DE DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN PARA TALUD DEL K40+260
3792	49980-CE-3792	10/09/2025		INFORME REUNIÓN TERRITORIAL Y RECORRIDO OBRA RECORRIDO DE INSPECCIÓN PAVIMENTOS LOS DÍAS 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2025
3793	49980-CE-3793	10/09/2025		RESPUESTA COMUNICADO 45399- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3763- DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC19 CON ASFALTO NORMALIZADO 60-70 + ADITIVO PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA ACTIVIDAD DE PARCHEO. ENTREGA COMPLETA
3794	49980-CE-3794	10/09/2025	2025E-VUVRAZ-100999	SU COMUNICADO 45399; RESPUESTA 49980-CE-3763 RESPUESTA COMUNICADO 45211- DISEÑO DE MEZCLAASFÁLTICA MDC19 CON ASFALTO NORMALIZADO 60-70 + ADITIVOPROMOTOR DE ADHERENCIA PARA ACTIVIDAD DE PARCHEO.ENTREGA COMPLETA
3795	49980-CE-3795	11/09/2025		RESPUESTA COMUNICADO 45397- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE- 3766 DISEÑO MDC-10. INFORME TÉCNICO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MDC-10
3796	49980-CE-3796	11/09/2025		RESPUESTA COMUNICADO 45436- ENTREGA DISEÑO DE MEZCLA MDC-19 CON ASFALTO 6070 NORMALIZADO CONAMBIEN
3797	49980-CE-3797	11/09/2025	2025E-VUVRAZ-101588	SU COMUNICADO 45473 RESPUESTA RADICADO No.327435 COMUNICADO 49980-CE-3780; SU COMUNICADO 45365 RADICADO PRE-ACTA DE OBRA No. 51, AGOSTO 2025 PARA REVISIÓN
3798	49980-CE-3798	19/09/2025	2025E-VUVRAZ-105168	RESPUESTA COMUNICADO 45463- SOLICITUD APLICACIÓN PROCEDIMIENTO DE QUE TRATA "CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO" del citado Contrato
3799	49980-CE-3799	15/09/2025	2025E-VUVRAZ-102865	REMISION COMUNICADO 2025S-VCOR-067300 - DISPOSICION DE FRESADO DE MEZCLA ASFÁLTICA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3800	49980-CE-3800	15/09/2025	2025E-VUVRAZ-102678	ESTADO DEL TRAMITE RESPECTO A LOS INSUMOS PEDIALES DE LOS BALDÍOS PARA PROCEDIMIENTO DE RADICACIÓN DE ADJUDICACIÓN ANTE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT, RADICADO INVIAS 2025E-VUVRAZ-083741 DEL 28 DE JULIO DE 2025
3801	49980-CE-3801	12/09/2025		SU COMUNICADO 45363 RESPUESTA A OFICIO 49980-3753; ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No. 6
3802	49980-CE-3802	15/09/2025		RESPUESTA COMUNICADO 45440- ENTREGA DE DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN PARA TALUD DEL K40+260
3803	49980-CE-3803	15/09/2025		INFORME DE VISITA ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 28 Y 29 DE AGOSTO 2025
3804	49980-CE-3804	15/09/2025		RTA 44152- RTA A RAD CE-3479 RTA RAD 42543- RTA A RAD CE-3376 –OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA A NOTA TÉCNICA, VERIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE EXTENSIÓN DE LAS ALETAS DEL COSTADO IZQUIERDO – ESTRIBOS 1 Y 2 –PUENTE K45+700
3805	49980-CE-3805	16/09/2025	2025E-VUVRAZ-103694	RESPUESTA RADICADO 45496 – RESPUESTA A LAS COMUNICACIONES 49980-CE-3784, 49980-CE-3677, 49980-CE-3704, 49980-CE-3709, 49980-CE-3721, 49980-CE-3744
3806	49980-CE-3806	16/09/2025		RESPUESTA COMUNICADO 44759- ENTREGA DISEÑO Y MEMORIA GEOTÉCNICA MURO DE CONTENCIÓN K41+865 AL K41+882 CARRIL IZQUIERDO
3807	49980-CE-3807	16/09/2025		RTA RAD. 45366 DEL 04/08/2025- ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO MASPS-MN-1-IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL VERSIÓN NUEVE (9) -SOLICITUD DE REVISIÓN DE PROVISIONES PARA POSIBLE INCLUSIÓN DE NUEVA OPC EN EL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL – VERSIÓN 9
3808	49980-CE-3808	22/09/2025		ALCANCE COMUNICADO 49980-CE-3809 RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO CVN. MEZCLA MDC-19 INSTALADA DEL K0+000 AL K2+000

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3809	49980-CE-3809	16/09/2025		RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO CVN. MEZCLA MDC-19 INSTALADA DEL K0+000 AL K2+000
3810	49980-CE-3810	16/09/2025		REPORTE EROSION PR24+640 COSTADO DERECHO, EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS SIN TAPAR
3811	49980-CE-3811	18/09/2025		RADICADO 45563- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3793- DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC19 CON ASFALTO NORMALIZADO 60-70 + ADITIVO PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA ACTIVIDAD DE PARCHEO
3812	49980-CE-3812	17/09/2025		RTA 45287- RESPUESTA COMUNICADO CE-3693 - ENTREGA DE NOTAS TÉCNICAS DE GEOTECNIA PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LOS SITIOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL K31+035 Y K41+130. RTA OBSERVACIONES DE GEOTECNIA MURO K31+350
3813	49980-CE-3813	18/09/2025		REMISION RADICADO 45496 –NOTA TÉCNICA PROTECCION DE TALUDES MALLA TRIPLE TORSION
3814	49980-CE-3814	18/09/2025		CONDICIÓN INSEGURA PR 12 + 234 CARRIL IZQUIERDO- PR 12 + 270 CARRIL DERECHO
3815	49980-CE-3815	18/09/2025		SEGUIMIENTO Y SOLICITUD DE GESTIÓN DE PQRS ABIERTAS
3816	49980-CE-3816	29/09/2025	2025E-VUVRAZ-108733	RESPUESTA SOLICITUD VISITA ACADÉMICA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, CURSO DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS I
3818	49980-CE-3818	23/09/2025		RADICADO 45630- ENTREGA NOTA TÉCNICA NT 054 PROPUESTA DE LOSAS DE APROXIMACIÓN Y POMPEYANOS PASO URBANO SANTA LUCIA
3819	49980-CE-3819	22/09/2025	2025E-VUVRAZ-106192	SU COMUNICADO 45628; RESPUESTA A RADICADO 328417 COMUNICADO 49980-CE-3809 RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO CVN. MEZCLA MDC-19 INSTALADA DEL K0+000 AL K2+000
3820	49980-CE-3820	23/09/2025	2025E-VUVRAZ-106495	SOLICITUD CONCEPTO DE NO OBJECCIÓN A LA PRE-ACTA AMBIENTA No 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3821	49980-CE-3821	24/09/2025		RESPUESTA COMUNICADO 45627- ENTREGA SOPORTES ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD AGOSTO 2025
3822	49980-CE-3822	25/09/2025		RADICADO 45675- RESPUESTA A COMUNICADO 49980-CE-3425 -PROPUESTA PROTECCIÓN ANTE SOCAVACIÓN DE TERRAPLÉN ENTRE K28+473 A K28+520
3824	49980-CE-3824	29/09/2025		ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PENDIENTES DE FIRMA
3825	49980-CE-3825	26/09/2025	2025E-VUVRAZ-108177	REMISIÓN DE 10 INSUMOS JURÍDICO PREDIALES PARA REVISIÓN Y TRÁMITE
3826	49980-CE-3826	26/09/2025		RADICADO 45758- REMISIÓN INFORME ASENTAMIENTOS Y CONSOLIDACIÓN DE BROCHES DE VÍA EN K27+135 Y K25+700

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Correspondencia recibida Septiembre de 2025.

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4543	49980-CR-4543	25/08/2025	45136	INTERVENCIÓN EN LOSAS AISLADAS O INTERMEDIAS Nos 238 A 247 CARRIL DERECHO. (K9 060 – 9 100)
4544	49980-CR-4544	25/08/2025	45138	SOLICITUD FECHA DE RECORRIDO PARA ENTREGA DE TRAMOS K2 AL K7 Y DEL K17 AL K22 Y ENVIO DE FORMATO ACTA DE VISITA PREVIA
4545	49980-CR-4545	25/08/2025	45137	RENIVELACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE ENTRE EL K3+510 Y EL K3+650
4546	49980-CR-4546	25/08/2025	45141	RESPUESTA A RADICADO 49980-CE-3735. ALCANCE CONSECUTIVO 49980-CE-3720 - REPARACIONES LOSAS DETERIORADAS K10+065-K10+100 - CD
4547	49980-CR-4547	25/08/2025	45142	RESPUESTA RADICADO 324637- RESPUESTA COMUNICADO 44673 DEL 29 DE JULIO DE 2025 -APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD
4548	49980-CR-4548	25/08/2025	45143	REMISIÓN PRE-ACTA COBRO SOCIAL N°51 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025
4549	49980-CR-4549	25/08/2025	D096-25	COMUNICACIÓN INTERNA 49980-CE-3724. RADICADO 44972 – RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3654 - ENTREGA NOTA TÉCNICA, VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA EXTENSIÓN DEL BOX CULVERT K46+076. TERCERA REVISIÓN
4550	49980-CR-4550	25/08/2025	45148	ENTREGA SEGURIDAD SOCIAL Y EXAMEN OCUPACIONAL OPERADOR FRESADORA
4551	49980-CR-4551	25/08/2025	45150	RESPUESTA A SU RADICADO NO 324838 COMUNICADO 49980-CE-3713. ESQUEMA ACCESO SECTOR PUENTE REGINO-K34+370-K34+430 CD
4552	49980-CR-4552	26/08/2025	45172	REMISIÓN DE PREACTA PREDIAL NO 51 DEL MES DE AGOSTO DE 2025
4553	49980-CR-4553	26/08/2025	45173	REMISIÓN INFORME SOSTENIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4554	49980-CR-4554	26/08/2025	45177	RTA RAD CE-3680 RTA COMUNICADO 44630– RESPUESTA A RADICADO NO 320946 COMUNICADO 49980-CE- 3596 RESPUESTA RADICADO 43953 DISEÑO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL K31+350 CARRIL DERECHO
4555	49980-CR-4555	26/08/2025	45178	RESPUESTA A RADICADO 318000 COMUNICADO 49980-CE-3523 RESPUESTA A RADICADO 42976 ENTREGA NOTA TÉCNICA, VERIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE EXTENSIÓN DE BOX CULVERT K45+880 Y K46+076
4556	49980-CR-4556	27/08/2025		INFORME ACTIVIDADES ESPECIALISTA DE SOSTENIBILIDAD AGOSTO
4557	49980-CR-4557	27/08/2025	45202	REMISIÓN PRE-ACTA AMBIENTAL NO 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025
4558	49980-CR-4558	27/08/2025	45172	REMISIÓN DE PREACTA PREDIAL NO 51 DEL MES DE AGOSTO DE 2025
4559	49980-CR-4559	28/08/2025	45209	ALCANCE RAD 44909 RTA CE-3617 RTA 43939 ENTREGA DE DISEÑOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE GRANO CAUCHO (M- GCR19) Y MDC10 PARA ALTERNATIVAS PRESENTADAS EN SITIOS CLASIFICADOS COMO LEVES Y MODERADOS. DISEÑO MDC-10. INFOTÉCNICO EVAL DE DESEMPEÑO MDC10
4560	49980-CR-4560	28/08/2025	45210	RESPUESTA A RADICADO NO 325537 COMUNICADO 49980-CE-3742. RESPUESTA COMUNICADO 45137- RENIVELACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE ENTRE EL K3+510 Y EL K3+650
4561	49980-CR-4561	28/08/2025	45211	ALCANCE A COMUNICADO RADICADO No 45113 ENTREGA PRELIMINAR DEL DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC19 CON ASFALTO NORMALIZADO 60-70 + ADITIVO PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA ACTIVIDAD DE PARCHEO. ENTREGA COMPLETA
4562	49980-CR-4562	28/08/2025	CORREO	RESPUESTA 49980-CE-3736 SOLICITUD INGRESO TOPÓGRAFO – CAMILO ALTAMIRANDA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4563	49980-CR-4563	29/08/2025		RESPUESTA 49980-CE-3731 con asunto: RADICADO 45067 – RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3665– SOLICITUD APROBACIÓN INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN DE VEREDAS EL JOBAL Y PAJONAL
4564	49980-CR-4564	29/08/2025		INFORME JURÍDICO PREDIAL – ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025
4565	49980-CR-4565	29/08/2025	79349980–MEM-00170	REVISIÓN DISEÑO MARSHALL MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 DE ACUERDO OF CE-3738 DEL 22-08-2025 ASUNTO “RADICADO 45113- ENTREGA PRELIMINAR DEL DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC19 CON ASFALTO NORMALIZADO 60-70 + ADITIVO PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA ACTIVIDAD DE PARCHEO
4566	49980-CR-4566	29/08/2025	45230	REMISIÓN DE INSUMOS JURÍDICO - PREDIALES
4567	49980-CR-4567	29/08/2025	45231	REMISIÓN DE INFORME MENSUAL PREDIAL DE AGOSTO DE 2025
4568	49980-CR-4568	1/09/2025	MEMORANDO -041-2025	INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTA EN VÍAS PERIODO AGOSTO DE 2025
4569	49980-CR-4569	1/09/2025	D100-25	COMUNICACIÓN INTERNA 49980-CE-3748. RADICADO 45177– RESPUESTA COMUNICADO 49880-CE-3680- DISEÑO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL K31+350 CARRIL DERECHO. TERCERA REVISIÓN
4570	49980-CR-4570	1/09/2025	45285	ENTREGA INFORME MENSUAL SEGURIDAD SOCIAL MEPI AGOSTO 2025
4571	49980-CR-4571	1/09/2025	45286	REMISIÓN DE ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE AGOSTO 26 DE 2025, Y ALCANCE AL RADICADO N°324637- RESPUESTA COMUNICADO 44673 DEL 29 DE JULIO DE 2025. APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD
4572	49980-CR-4572	1/09/2025	45287	RESPUESTA RADICADO No 324319 COMUNICADO 49980-CE-3693 RESPUESTA 44590 - ENTREGA DE NOTAS TÉCNICAS DE GEOTECNIA PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LOS SITIOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL K31+035 Y K41+130. RESPUESTA OBSERVACIONES DE GEOTECNIA MURO K31+350

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4573	49980-CR-4573	1/09/2025	45288	RESPUESTA A RADICADO No 325006 COMUNICADO 49980-CE-3719 RESPUESTA COMUNICADO 44892 - RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3671 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS FUNCIONALES PARA INTERVENCIÓN DE LOSAS CON AFECTACIONES
4574	49980-CR-4574	2/09/2025	79349980 – MEM-0171	CONCEPTO REVISIÓN DISEÑO MARSHALL MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 DE ACUERDO CON EL OF CE-3755 DEL 28/08/25 CON EL ASUNTO "RADI 45211- ALCANCE COMUNICADO CE- 3738- ENTREGA PRELIMINAR DEL DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC19 CON ASFALTO NORMALIZADO 60-70
4575	49980-CR-4575	2/09/2025	79349980 – MEM-0172	INFORME ACTIVIDADES ESPECIALISTA PAVIMENTOS AGOSTO DE 2025
4576	49980-CR-4576	2/09/2025	79349980– MEM-0173	49980-CE-3739 RESPUESTA RADICADO 45102- ENTREGA DE PROCEDIMIENTO PR-CI066- QAQC-23 "PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA REPARACIÓN DE LOSAS AISLADAS CON GRIETAS CRÍTICAS Y SUSTITUCIÓN POR LOSAS REFORZADAS EN TRAMOS MODERADOS Y LEVES
4577	49980-CR-4577	3/09/2025	79349980 – MEM-0174	CONCEPTO REVISIÓN DISEÑO MARSHALL MEZCLA ASFÁLTICA MDC-10 DE ACUERDO CON EL OF CE-3754 28/08/25 ASUNTO "RAD 45209- ALCANCE CE-3708- ENTREGA DISEÑOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE CON GRANO CAUCHO (M-GCR-19) Y MDC-10 PARA ALTERNATIVAS PRESENTADAS
4578	49980-CR-4578	3/09/2025	79349980 – MEM-0175	CE-3761 RTA 44892- RTA CE-3671 RT 44064– RT A RAD CE-3573, RAD CE-3578 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS FUNCIONALES PARA INTERVENCIÓN DE LOSAS CON AFECTACIONES Y RD 45288- RTA CE-3719 - PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS FUNCIONALES PARA INTERVENCIÓN DE LOSAS
4579	49980-CR-4579	3/09/2025	2025S-VBOG- 064511	REITERACIÓN OFICIO 2025S-VBOG-059178 - SOLICITUD INFORME ACTUALIZADO PAS CONTRATO DE OBRA 923 DE 2021 - PROYECTO SANTA LUCIA - MOÑITOS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4580	49980-CR-4580	4/09/2025		49980-CE-3689 CON ASUNTO: RADICADO 44809- ALCANCE COMUNICADO CON RADICADO NO 44590 - ENTREGA DE NOTAS TÉCNICAS DE GEOTECNIA PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LOS SITIOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL K31+035 Y K41+130. ATENCIÓN A OBSERVACIONES SITIO K41+130
4581	49980-CR-4581	4/09/2025	45358	ENTREGA INFORME MENSUAL IMPLEMENTACION SG-SST AGOSTO DE 2025
4582	49980-CR-4582	4/09/2025	45359	ALCANCE A 44909 RTA PARCIAL A RAD CE-3617 RTA 43939- ENTREGA DE DISEÑOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE CON GRANO CAUCHO (M-GCR-19) Y MDC-10 PARA ALTERNATIVAS PRESENTADAS EN SITIOS CLASIFICADOS COMO LEVES Y MODERADOS. DISEÑO MSC-19 CAM GCR TIPO I
4583	49980-CR-4583	4/09/2025	45363	RESPUESTA RADICADO No.326210 COMUNICADO 49980-CE-3753. SU COMUNICADO 45123; ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No. 6.- REUNION AGOSTO 27-2025
4584	49980-CR-4584	4/09/2025	45364	ENTREGA APU - PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA EVALUACIÓN GEOTECNIA DE PATOLOGÍAS PREMATURAS EN LOSAS DE CONCRETO DEL PROYECTO SANTA LUCÍA MOÑITOS
4585	49980-CR-4585	4/09/2025	45365	PREACTA DE OBRA No. 51, AGOSTO 2025 PARA REVISIÓN
4586	49980-CR-4586	4/09/2025	45366	REMISIÓN PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL V-9 Y SOPORTES CORRESPONDIENTES
4587	49980-CR-4587	4/09/2025	45367	REMISIÓN INFORME DE GESTIÓN SOCIAL N°51- MES DE AGOSTO DE 2025
4588	49980-CR-4588	5/09/2025	45368	REMISIÓN INFORME AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
4589	49980-CR-4589	8/09/2025	45397	RTA A RAD CE-3766. RTA 45209- ENTREGA DE DISEÑOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE CON GRANO CAUCHO (M-GCR-19) Y MDC-10 PARA ALTERNATIVAS PRESENTADAS EN SITIOS CLASIFICADOS COMO LEVES Y MODERADOS. DISEÑO MDC-10. INFORME TÉCNICO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4590	49980-CR-4590	8/09/2025	45398	RESPUESTA 49980-CE3767 SOLICITUD DE RADICACIÓN DE LA FICHA PREDIAL IDENTIFICADO CON NÚMERO NO. 015A-D-T3-MSM
4591	49980-CR-4591	8/09/2025	45399	RESPUESTA RADICADO 325453 COMUNICADO 49980-CE-3733. AFECTACIONES A LA ESTABILIDAD DEL TALUD POR ACTIVIDADES AGRÍCOLAS PR 15+400 MI
4592	49980-CR-4592	8/09/2025	45400	RESPUESTA RADICADO 325453 COMUNICADO 49980-CE-3733. AFECTACIONES A LA ESTABILIDAD DEL TALUD POR ACTIVIDADES AGRÍCOLAS PR 15+400 MI
4593	49980-CR-4593	8/09/2025	45401	RTA A RAD CE-3705 RTA COMUNICADO 44120- RTA A RAD CE-3543 RESPUESTA RADICADO 43156- ENTREGA DE REPORTE DE VISITA DE CAMPO ESPECIALISTA DE GEOTÉCNIA 11 DE ABRIL DE 2025. INFORME DE VISITA ESPECIALISTA EN GEOTECNIA INTERVENTORÍA 04 y 05 DE JUNIO DE 2025
4594	49980-CR-4594	8/09/2025		49980-CE-3749 con asunto: RADICADO 45178- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3523 ENTREGA NOTA TÉCNICA, VERIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE EXTENSIÓN DE BOX CULVERT K45+880 Y K46+076
4595	49980-CR-4595	8/09/2025	79349980-MEM-0176	49980-CE-3741_RESPUESTA RADICADO 45136- INTERVENCIÓN EN LOSAS AISLADAS O INTERMEDIAS N°238 A 247 CARRIL DERECHO. (K9+060 – 9+100)
4596	49980-CR-4596	8/09/2025	79349980 – MEM-0177	49980-CE-3773- RAD 45359- ALCANCE 44909 - ENTREGA DE DISEÑOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE CON GRANO CAUCHO (M-GCR-19) Y MDC-10 PARA ALTERNATIVAS PRESENTADAS EN SITIOS CLASIFICADOS COMO LEVES Y MODERADOS. DISEÑO MSC-19 CAM GCR TIPO I PREMIUM
4597	49980-CR-4597	8/09/2025	45435	ALCANCE A COMUNICADO RADICADO 44839 ENTREGA REPORTE DE VISITA DE CAMPO 24 Y 25 DE JULIO DE 2025 REVISIÓN INSPECCIÓN Y ESTADO DE LOSAS DE PAVIMENTO. AJUSTE VISITA DE CAMPO 29 DE AGOSTO DE 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4598	49980-CR-4598	9/09/2025	45436	ENTREGA DISEÑO DE MEZCLA MDC-19 CON ASFALTO 6070 NORMALIZADO CONAMBIEN
4599	49980-CR-4599	9/09/2025	45437	RESPUESTA A RADICADO No 327207 COMUNICADO 49980-CE-3771. INTERVENCIONES TALUD PR 15+400 MARGEN IZQUIERDA
4600	49980-CR-4600	9/09/2025	45438	RESPUESTA A RADICADO 323700 COMUNICADO 49980-CE-3661 RESPUESTA COMUNICADO 44053- VERIFICACIÓN Y NOTA TÉCNICA DE GEOTÉCNIA PARA MURO DE CONTENCIÓN EN EL K40+260
4601	49980-CR-4601	9/09/2025	45439	ENTREGA DE DISEÑO GEOTÉCNICO MURO DE CONTENCIÓN PARA TALUD DEL K41+050
4602	49980-CR-4602	9/09/2025	45441	REMISIÓN DE INSUMOS JURÍDICO - PREDIALES. PREDIO 004-I-T1-MSM
4603	49980-CR-4603	9/09/2025	79349980 – MEM-0178	INFORME REUNIÓN TERRITORIAL Y RECORRIDO OBRA RECORRIDO DE INSPECCIÓN PAVIMENTOS LOS DÍAS 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2025
4604	49980-CR-4604	9/09/2025	45440	ENTREGA DE DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN PARA TALUD DEL K40+260
4605	49980-CR-4605	10/09/2025	45463	SOLICITUD APLICACIÓN PROCEDIMIENTO DE QUE TRATA LA "CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO" del citado contrato
4606	49980-CR-4606	10/09/2025	45462	RESPUESTA A RADICADO No. 325745 COMUNICADO 49980-CE-3745. RESPUESTA COMUNICADO 44978 RADICADO ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL No.50 (JULIO DE 2025)
4607	49980-CR-4607	10/09/2025	79349980 – MEM-0179	REVISIÓN DISEÑO MARSHALL MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 DE ACUERDO CON EL OF CE-3774 8 /09/2025 "RAD 45399- RTA COMUNICADO CE- 3763- DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC19 CONASFALTO NORMALIZADO 60-70 + ADITIVO PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA ACTIVIDAD DE PARCHEO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4608	49980-CR-4608	10/09/2025	79349980 – MEM-0180	REVISIÓN DISEÑO MARSHALL MEZCLA ASFÁLTICA MDC-10 DE ACUERDO CON EL OF CE-3779 08/09/2025 "RAD 45397- RTA CE-3766- ENTREGA DE DISEÑOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE CON GRANO CAUCHO (M- GCR-19) Y MDC-10 PARA ALTERNATIVAS PRESENTADAS EN SITIOS
4609	49980-CR-4609	10/09/2025	79349980 – MEM-0181	CONCEPTO REVISIÓN DISEÑO MARSHALL MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 DE ACUERDO CON EL OFICIO 49980-CE-3787 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CON EL ASUNTO "RADICADO 45436- ENTREGA DISEÑO DE MEZCLA MDC-19 CON ASFALTO 6070 NORMALIZADO CONAMBIEN
4610	49980-CR-4610	10/09/2025	45473	RESPUESTA RADICADO No.327435 COMUNICADO 49980-CE-3780; SU COMUNICADO 45365 RADICADO PRE-ACTA DE OBRA No. 51, AGOSTO 2025 PARA REVISIÓN
4611	49980-CR-4611	10/09/2025	45471	RESPUESTA A RADICADO No 326935 COMUNICADO 49980-CE-3762 RESPUESTA COMUNICADO 45121- ENTREGA SOPORTES ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD JULIO 2025
4612	49980-CR-4612	11/09/2025	2025S-VBOG-066986	INFORME MENSUAL PREDIAL AGOSTO 2025
4613	49980-CR-4613	11/09/2025	2025S-VBOG-066986	RESPUESTA AL RADICADO NO 2025E-VUVRAZ-095103 PRE-ACTA SOCIAL NO.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL CO-923-2021-CI-1050-2021
4614	49980-CR-4614	12/09/2025	45496	RESPUESTA RADICADO No. 327665 COMUNICADO 49980-CE-3784 REQUERIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y COMUNICADOS 49980-CE-3677, 49980-CE-3704, 49980-CE-3709, 49980-CE-3721, 49980-CE-3744
4615	49980-CR-4615	12/09/2025	2025S-VCOR-067300	RESPUESTA AL RADICADO NO 2025E-VUVRAZ-098419 USO DE FRESADO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4616	49980-CR-4616	15/09/2025	45538	RESPUESTA RADICADO No.327887 COMUNICADO 49980-CE-3797; SU COMUNICADO 45473 RESPUESTA RADICADO No.327435 COMUNICADO 49980-CE-3780; SU COMUNICADO 45365 RADICADO PRE-ACTA DE OBRA No. 51, AGOSTO 2025 PARA REVISIÓN
4617	49980-CR-4617	15/09/2025	45539	RADICADO ACTA DE AJUSTES PROVISIONALES No.51 (AGOSTO DE 2025)
4618	49980-CR-4618	29/09/2025		49980-CE-3613 con asunto: RADICADO 44152- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3479 OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA A NOTA TÉCNICA, VERIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE EXTENSIÓN DE LAS ALETAS DEL COSTADO IZQUIERDO – ESTRIBOS 1 Y 2 –PUENTE K45+700
4619	49980-CR-4619	15/09/2025		INFORME VISITA DE ESPECIALISTA DE GEOTECNIA A OBRA 28 Y 29 DE AGOSTO
4620	49980-CR-4620	15/09/2025		RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3398 CUTYO ASUNTO DE REFERENCIA COMO RADICADO 42543
4621	49980-CR-4621	15/09/2025	2025S-VBOG-067605	SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA Y REUNIÓN PARA SEGUIMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LOSAS DE PAVIMENTO AFECTADAS EN EL PROYECTO SANTA LUCIA - MOÑITOS
4622	49980-CR-4622	16/09/2025		49980-CE-3676 con asunto: RADICADO 44759- ENTREGA DISEÑO Y MEMORIA GEOTÉCNICA MURO DE CONTENCIÓN K41+865 AL K41+882 CARRIL IZQUIERDO
4623	49980-CR-4623	16/09/2025	CORREO	49980-CE-3699 con asunto: RADICADO 44892- RESPUESTA RADICADO No 323704 COMUNICADO 49980-CE-3671 RESPUESTA COMUNICADO 44064–
4624	49980-CR-4624	16/09/2025	45562	REMISIÓN INFORME SOSTENIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4625	49980-CR-4625	16/09/2025	45563	RTA A RAD CE-3793 RESPUESTA COMUNICADO 45399- RTA COMUNICADO 49980-CE-3763- DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC19 CON ASFALTO NORMALIZADO 60-70 + ADITIVO PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA ACTIVIDAD DE PARCHEO. ENTREGA COMPLETA
4626	49980-CR-4626	16/09/2025	45564	RESPUESTA RADICADO No.327990 COMUNICADO 49980-CE-3801; SU COMUNICADO 45363 RESPUESTA A OFICIO 49980-3753; ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS No. 6
4627	49980-CR-4627	16/09/2025	45565	REMISIÓN DE INSUMOS JURÍDICO - PEDIALES. PREDIO 004-I-T1-MSM
4628	49980-CR-4628	16/09/2025	45574	SOLICITUD DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN PREDIAL ACTUALIZADO CONFORME A LA APROBACIÓN Y/O NO OBJECCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS INFORMES VALUATORIOS
4629	49980-CR-4629	17/09/2025		RT CE-3760 - RAD 45287- RTA COMUNICADO CE-3693- ENTREGA DE NOTAS TÉCNICAS DE GEOTECNIA PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LOS SITIOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL K31+035 Y K41+130. RESPUESTA OBSERVACIONES DE GEOTECNIA MURO K31+350
4630	49980-CR-4630	17/09/2025	45591	RESPUESTA MOVILIDADES ACADÉMICAS - PRÁCTICA SANTA LUCÍA-MOÑITOS UPB-MONTERÍA
4631	49980-CR-4631	18/09/2025	45599	RESPUESTA RADICADO No 328347 - 49980-CE-3807 SOLICITUD DE REVISIÓN DE PROVISIONES PARA POSIBLE INCLUSIÓN DE NUEVA OPC EN EL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL – VERSIÓN 9
4632	49980-CR-4632	18/09/2025	CORREO	CE-3811 con asunto: RADICADO 45563- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3793- DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC19 CON ASFALTO NORMALIZADO 60-70 + ADITIVO PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA ACTIVIDAD DE PARCHEO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4633	49980-CR-4633	19/09/2025	2025S-VBOG-069590	RESPUESTA RADICADO 2025E-VUVRAZ-098443 - REMISIÓN INFORME ACTUALIZADO PAS CONTRATO DE OBRA 923 DE 2021
4634	49980-CR-4634	19/09/2025	45627	ENTREGA SOPORTES ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD AGOSTO 2025
4635	49980-CR-4635	19/09/2025	45628	RESPUESTA A RADICADO 328417 COMUNICADO 49980-CE-3809 RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO CVN. MEZCLA MDC-19 INSTALADA DEL K0+000 AL K2+000
4636	49980-CR-4636	22/09/2025	45629	REMISIÓN DE INSUMOS JURÍDICO - PREDIALES
4637	49980-CR-4637	22/09/2025	45630	ENTREGA NOTA TÉCNICA NT 054 PROPUESTA DE LOSAS DE APROXIMACIÓN Y POMPEYANOS PASO URBANO SANTA LUCIA
4638	49980-CR-4638	22/09/2025	45631	RADICADO N° 327084 COMUNICADO CE-3770 RTA. "DEVOLUCIÓN CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN PREDIAL. RTA A SU COMUNICADO IDENTIFICADO CON RAD 44003." - RAD N° 328414 CE-3594 RTA. CON ASUNTO "APREMIO AL CONTRATISTA DE OBRA A FIN DE CONMINARLO PARA QUE CUMPLA
4639	49980-CR-4639	23/09/2025	45664	ENTREGA PAQUETE No.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS VERSIÓN 1
4640	49980-CR-4640	19/09/2025	2025S-VBOG-069590	RESPUESTA RADICADO 2025E-VUVRAZ-098443 - REMISIÓN INFORME ACTUALIZADO PAS CONTRATO DE OBRA 923 DE 2021
4641	49980-CR-4641	23/09/2025	45675	RESPUESTA A RADICADO 314275 COMUNICADO 49980-CE-3425 RESPUESTA COMUNICADO 42411-PROPUESTA PROTECCIÓN ANTE SOCAVACIÓN DE TERRAPLÉN ENTRE K28+473 A K28+520
4642	49980-CR-4642	23/09/2025	45676	REMISIÓN PRE-ACTA AMBIENTAL NO 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
4643	49980-CR-4643	24/09/2025	45691	REMISIÓN COMUNICADO CON RADICADO NO. 45475
4644	49980-CR-4644	24/09/2025	2025S-VBOG-070669	RESPUESTA AL RADICADO NO 2025E-VUVRAZ-083741

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4645	49980-CR-4645	24/09/2025	45692	SOLICITUD RESPETUOSA DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE REVISIÓN, APROBACIÓN Y NO OBJECCIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVÍAS
4646	49980-CR-4646	26/09/2025	45758	REMISIÓN INFORME ASENTAMIENTOS Y CONSOLIDACIÓN DE BROCHES DE VÍA EN K27+135 Y K25+700
4647	49980-CR-4647	26/09/2025	45759	ALCANCE AL RAD N° 45631 QUE RESPONDE LOS COMUNICADOS CE-3770 RTA. CON ASUNTO "DEVOLUCIÓN CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN PREDIAL. RTA A SU COMUNICADO IDENTIFICADO CON RAD NO. 44003." - RAD CE-3594 RTA. CON ASUNTO "APREMIO AL CONTRATISTA DE OBRA
4648	49980-CR-4648	29/09/2025		INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD SEPTIEMBRE DEL 2025
4649	49980-CR-4649	29/09/2025	79349980 – MEM-0182	RESPUESTA COMUNICADO 43348-CE-3818 RADICADO 45630 - ENTREGA NOTA TÉCNICA NT 054 PROPUESTA DE LOSAS DE APROXIMACIÓN Y POMPEYANOS PASO URBANO SANTA LUCIA
4650	49980-CR-4650	30/09/2025	MT-2385-CM456-2025 V3	REVISIÓN TÉCNICA DE LA PROBLEMÁTICA VIAL ENTRE EL CORREGIMIENTO DE SANTA LUCÍA Y EL MUNICIPIO DE MOÑITOS, CÓRDOBA: ANÁLISIS DE LAS CAUSA RAÍZ DE LA PATOLOGÍA PREMATURA DEL PAVIMENTO
4651	49980-CR-4651	30/09/2025	45806	REMISIÓN DE ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE
4652	49980-CR-4652	30/09/2025	45807	REMISIÓN DE INFORME MENSUAL PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
4653	49980-CR-4653	30/09/2025	45808	ENTREGA INFORME MENSUAL SEGURIDAD SOCIAL MEPI- SG-SST SEPTIEMBRE DE 2025
4654	49980-CR-4654	30/09/2025	45809	REMISIÓN DE PREACTA PREDIAL NO 52 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4655	49980-CR-4655	30/09/2025	45810	SOLICITUD RESPETUOSA DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE REVISIÓN, APROBACIÓN Y NO OBJECCIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVÍAS, FRENTE A LOS INSUMOS PREDIALES CORRESPONDIENTES A TRÁMITES EXPROPIATORIOS
4656	49980-CR-4656	30/09/2025	45811	RESPUESTA A RADICADO No 320954 COMUNICADO 49980-CE-3597 RESPUESTA RADICADO 43873- DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN CON BARRERA DE TRÁFICO K41+150 CI
4657	49980-CR-4657	30/09/2025	45812	REMISIÓN DE INSUMOS JURÍDICO - PREDIAL. PREDIO 013-D-T10-MSM

8.2. Registro Fotográfico.



PR 14+080 carril izquierdo. Costura de módulos en concreto MR40.



PR 0+700 carril derecho. Fresado para instalar de mezcla MDC19.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 0+700 carril izquierdo. Instalación de mezcla MDC19 para bacheo.



PR 0+700 a mayor carril izquierdo. Toma de muestras y temperatura a la mezcla MDC19.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 1+000 carril izquierdo. Instalación de mezcla MDC 19 para bacheo.



Se realizan actividades de Cajeo en el centro poblado de Santa Lucía.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 3+510 al 3+640 calzada. Replanteo y marca de bordes de rasante y cortes.



PR 3+510 lado derecho. Fresado.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 13+400 carril izquierdo. Costuras de módulos en concreto MR40.



PR 9+700 lado derecho. Sello de junta entre cuneta y pavimento con Bituflex.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 13+100 carril derecho. Costura de losas.



PR 29+250 Carril derecho. Demolición de losa para anclar resalto tipo Pompeyano.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 28+900 lado derecho. Instalación de costales con material para controlar erosión.



PR 41+950 de ambos lados. Control de erosión.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 47+485-PR 47+685 carril izquierdo. Fundida de resaltos.



PR 3+580 a mayor. Instalación de mezcla MDC 19.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 3+580 carril derecho. Muestreo mezcla MDC-19.



PR 14+200 carril derecho- 13+600 carril izquierdo. Costura de módulos en concreto MR 40.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 25+700 a menor carril izquierdo. Descapote y adecuación de terreno para construcción de cunetas típicas.



PR 25+650 margen. Instalación de SBG para soporte de cunetas típicas.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 9+060 carril derecho. Demolición del módulo #238.



PR 9+060 al 9+087 carril derecho. Demolición de los módulos en concreto MR40.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 14+270 a mayor, carril derecho. Costura de losas en concreto MR 40.



PR 3+520 hasta 3+620. Revisión de niveles rasante.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 0+117 a mayor, carril izquierdo. Imprimación.



PR 0+217 carril derecho a mayor. Toma de muestras y temperaturas mezcla MDC 19.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR9+087 carril derecho. Toma de densidades.



Pr 9+060-087 carril derecho. Toma de densidades a tramo con SBG.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 0+110 calzada completa. Levantamiento topográfico.



PR 0+345-380 carril izquierdo. Instalación de mezcla MDC 19 - Sobre carpeta.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 0+760 hacia mayor, carril derecho. Toma de muestras y temperaturas de mezcla MDC19 - sobre carpeta.



PR 9+060 al PR 9+082.5 carril derecho. Fundida de 5 módulos en concreto MR40.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 25+700 a menor, lado izquierdo. Instalación de formaletas para fundida de cunetas.



PR 9+150 lado derecho. Perfilado de talud que presenta deslizamiento.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 9+870 lado derecho. Sello de junta de cunetas con polibit.



PR 0+770 al 0+870 carril izquierdo. Instalación de mezcla MDC 19.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 0+760 hacia mayor, carril izquierdo. Toma de muestra mezcla MDC19 - sobre carpeta.



PR1+530 carril izquierdo. Toma de muestras y verificación de espesores vía existente.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR1+340 al PR 1+450 carril derecho. Levantamiento topográfico.



PR 15+020 a mayor, carril derecho. Adecuación de módulos en concreto MR40 por método de costura cruzada.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 9+087 al PR 9+100 carril derecho. Toma de densidades a subrasante estabilizada con cal en tramo de lozas demolidas.



PR 24+600 carril izquierdo. Instalación de tachas en resalto.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 1+453 al PR1+525 carril derecho. Instalación de mezcla MDC19 -sobre carpeta.



PR1+670 carril izquierdo. Toma de muestras, temperatura y compactación de briquetas de la sobre carpeta asfáltica MDC19.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR13+400 carril derecho. Adecuación de módulos en concreto MR40 por método de costura cruzada.



PR 25+760 a mayor, lado izquierdo. Sello lateral de cunetas con polibit.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 9+085 lado derecho. Control topográfico a cajeo.



PR 9+087 carril derecho. Toma de muestras para ensayos de laboratorio.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 27+150 carril derecho. Adecuación de módulos en concreto MR40 por método de costura cruzada.



PR 41+950 ambos carriles. Llenos, adecuación y descole con piedra pegada.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 47+485 y 47+685. Resaltos Pompeyanos construidos.



PR 46+520 lado izquierdo. Instalación de cercas nuevas.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 9+087 a mayor, carril derecho. Instalación material de terraplén.



Pr 25+700. Control de asentamientos en broches.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 9+087 lado derecho. Tomas de densidades en la SBG.



PR 9+087 a mayor, carril derecho. Fundida de módulos en concreto MR-40.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 4+700. Toma de muestras y asentamiento concreto MR-40.



PR 13+340 carril izquierdo. Adecuación de módulos en concreto MR40 por método de costura cruzada.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 1+745 carril izquierdo. Revisión de niveles de base.



PR 1+745 carril izquierdo. Demolición de carpeta asfáltica y nivelación de base en centro poblado (corregimiento Santa Lucía).

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 1+745 carril izquierdo. Toma de densidades y humedades en SBG centro poblado Santa Lucía.



PR 1+745 carril izquierdo. Instalación acero para fundida de módulos en concreto MR40.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



PR 1+745 a mayor, en el carril izquierdo. Fundida de módulos en concreto MR40.



PR 1+623 al 1+655 carril izquierdo. Compactación de Base granular.

8.3. Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales.

 26 sep. 2025 9:41	 5 sep. 2025 3:21
Foto 1. Mantenimiento año 3 plantación PR 4+400	Foto 2. Mantenimiento año 3 plantación PR 4+400
 03 de septiembre del 2025 11:05 a.m.	 16/09/2025 CONSORCIO ISLA 066-2020
Foto 3. Perforaciones pernos talud PR 15+400 LI	Foto 4. Siembra Pasto Vetiver PR 45+500 LI
 9 sep. 2025 3:05	
Foto 5. Reposición Pasto Vetiver PR 13+500 LI	Foto 6. Mantenimiento geomanto PR 10+600 LD

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS






INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 52

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3


8.4. BITÁCORA

Estado del tiempo = Soleado



Interventor

Amury Guzman - Ing. Residente




Contratista

Jaime Sanchez - Ing. Residente

29 de agosto 2025 (viernes)


- Se funde bajantes en sitio PR 29+350 lado izq.
- Instalación de malla triple torsión y geomanto PR 73+100/113 lado der.
- Lleno estructural muro 1 box culvert PR 34+658 lado der. con terraplen
- Instalación mezcla asfáltica MDC 19 PR 0+460/560 carril izq; sobre carpeta PR 0+110 al PR 0+217 carril izq.
- Reparación de losas pavimento MR 40 con costura en módulos # 175 y 176 PR 14+782/792 c. izq.
- # 539, 540 y 541 PR 10+391/405 c. der.

Estado del tiempo = Soleado



Interventor

Amury Guzman - Ing. Residente




Contratista

Jaime Sanchez - Ing. Residente

30 de agosto 2025 (sábado)


- Instalación de cerca PR 45+470/502 - PR 45+260/300 lado izq.
- Instalación mezcla asfáltica MDC 19 PR 0+300/640 carril izq. sobre carpeta PR 0+220/345 der.
- Reparación de losas pavimento MR 40 con costura en módulos # 548 y 549 PR 10+432/446 der.
- # 177 y 178 PR 14+780/810 der.

Estado del tiempo = Soleado



Interventor

Amury Guzman - Ing. Residente



Contratista

Jaime Sanchez - Ing. Residente

1 de septiembre 2025 (lunes)

- Se funde muros de bajantes PR 29+360 lado izq.
- Se funde muros canal descole alcantarilla PR 35+340 lado izq.
- Lleno estructural con terraplen muro 1 box culvert PR 34+658 lado der.
- Instalación mezcla asfáltica MDC 19 PR 0+700/910 carril izq.

- Reparación de losas pavimento MR 40 con costura en módulos

509 PR 10+260 c. izq.


518 PR 10+300 c. izq.


084 PR 10+370 c. izq.

179 al 182 PR 14+800/822,5 c. izq.

239 y 240 PR 14+073/077,5 c. izq.

Estado del tiempo = Soleado


Interventora


Contratista

2 de septiembre 2023 (martes)

- Lleno estructural con terraplen box colvert PR 34+658 lado der.

- Instalación mezcla asfáltica MDC-19 PR 0+940/1+675 c. izq. en parcheo

- Reparación de losas pavimento MR 40 con costura en módulos


83 PR 13+367 c. izq.

86 y 87 PR 13+373/386 c. izq.

188, 189 y 190 PR 14+485/463 c. der.

Estado del tiempo = Soleado


Interventora


Contratista

3 de septiembre 2023 (miércoles)

- Se funde muros canal PR 35+340 en descole lado izq.

- Se funde resalto tipo pompeyano PR 47+685 y PR 47+485 carril izq.

- Lleno estructural con terraplen muro 1 box colvert PR 34+658 lado der.

- Reparación de losas pavimento MR 40 con costura en módulos

88, 89 y 90 PR 13+368 c. izq.


- Sello con polybit en cunetas PR 10+850/900 lado izq.

- No hubo suministro de mezcla asfáltica para parcheo

- Fresado carpeta asfáltica PR 3+510/640 carril derecho

Estado del tiempo = Soleado


Interventora



Contratista


4 de septiembre 2025 (jueves)

- Instalación de mezcla asfáltica PR 0+830/1+420 c. der; PR 1+460/992 c. izq.
- Colocación de costalo con material de sitio para control de erosión PR 38+900
- Reparación de losas pavimento MR 40 con costura en módulos
- #104 a 113 PR 13+459/503 c. izq.
- # 203 y 204 PR 14+885/925 c. der.
- #223 PR 15+005 c. der.
- # 240 PR 14+074 c. izq.
- #245 PR 14+092 c. izq.
- #262 PR 14+121 c. der.
- #267 y 268 PR 14+142/201 c. der.

- Sello entre cuneta y pavimento MR 40 PR 9+610/700 lado der.

Estado del tiempo = Soleado


Interventor



Contratista

5 de septiembre 2025 (viernes)

- Instalación de mezcla asfáltica MDC 19 PR 3+584/600 c. der. para nivelación. Se instala malla fibra de vidrio
- Instalación piedra pegada con concreto 14 MPa en ODT PR 41+950 ambos lados
- Se funde resalto tipo pempeyano PR 29+250 c. der.
- Reparación de losas pavimento MR 40 en módulos
- #114 al 118 PR 13+502/525 c. izq.
- # 127 y 128 PR 14+885/925 c. izq.
- # 240 PR 14+074 c. izq.
- Sello entre cuneta y pavimento MR 40 PR 9+575/605 lado der.

Estado del tiempo = Soleado


Interventor


Contratista

6 de septiembre 2025 (sábado)

- Excavación para construcción de cunetas PR 25+646/700 lado izq.
- Reparación de losas pavimento MR 40 con costura en módulos
- #277, 278 y 279 PR 14+243/254 c. der.


129, 130 y 131 PR 13+569/583 c. izq.

156 y 157 PR 13+600 c. izq.

140 PR 13+140 c. izq.

- Sello de junta entre cuneta y pavimento MR 40 PR 9+470/520 lado der.
- Se presentan lluvias en horas de la mañana
- Se evidencia erosión en borde de pavimento PR 24+640 lado der.
- No hubo suministro de mezcla asfáltica


Interventoría


Contratista

8 de septiembre 2025 (lunes)


- Instalación mezcla asfáltica MDC-19 en la nivelación PR 3+535/640 c. izq.
- Instalación de subbase para soporte de cunetas PR 25+645/700 lado izq.
- Demolición de losas MR-40 PR 9+060/087 c. der.
- Reparación de losas pavimento MR 40 con costura en módulos


280, 281, 282 PR 14+252/270 lado der

Se evidencia una sola cuadrilla en el corredor vial

- Sello de junta entre cuneta y pavimento PR 9+470/520 lado der.
- Recolce bordillo desplazados PR 30+100/150 lado izq.

Estado del tiempo: Soleado


Interventoría


Contratista

9 de septiembre 2025 (martes)

- Instalación mezcla asfáltica MDC-19 nivelación PR 3+510/525 c. izq. y en sobre carpeta PR 0+220/340 c. izq.
- Instalación de pintura para tráfico en resalto tipo pompeyano PR 28+680; PR 29+250; PR 47+486.
- Se funde cunetas en MR-40 PR 25+645/667 lado izq.
- Reparación de losas pavimento MR 40 con costura en módulos

281 al 289 PR 14+270/295 c. der.

Se evidencia una sola cuadrilla en el corredor vial

- Se observa exploración con bullabaz por parte del propietario predio PR 16+550 lado izq. demandando el geomanto y los drenos horizontales

Estado del tiempo = Soleado

Interventoría

Juan J. Jaramila
Contratista

10 de septiembre 2025 (miércoles)

- Se funde conetas MR-40 PR 25+645/663 lado izq.
- Se funde pavimento MR-40 módulos #238 al 242 PR 9+057/080 c. der.
- Instalación de mezcla asfáltica MDC-19 proveniente de Conambien PR 0+345/780 alternado ambos carriles.
- Reparación de lasas pavimento MR40 con costura en módulos #290, 291, 292, 293 y 294 PR 14+295/313 carril der.
- Compactación en SB6 de 93% en el PR 9+057 a mayores en 6 horas. Se realizó liberación por laboratorio posteriormente.

Estado del tiempo = Soleado

Interventoría

Juan J. Jaramila
Contratista

11 de septiembre 2025 (jueves)

- Se funde conetas MR40 PR 25+645/663 lado izq.
- Se perfiló talud PR 9+150/190 lado derecho por deslizamiento
- Instalación de mezcla asfáltica MDC-19 proveniente de Conambien PR 0+780/1350 c. der.
- Reparación de brea pavimento MR40 con costura en módulos #291, 292; #294 der; #314, 315, 316 izq PR 14+303/407
- Sello en junta de conetas PR 9+800/870 lado der con polybit

Estado del tiempo = Lluvias fuertes entre el PR 13+000 al PR 46+000


Interventoría


Juan J. Jaramila
Contratista

12 de septiembre 2025 (viernes)

- Instalación de mezcla asfáltica MDC-19 proveniente de Conambien PR 1+340/517 c. izq; PR 1+453/463 c. der.
- Reparación de lasas pavimento MR40 con costura en módulos #225 c. izq; #234, 235 c. der; #241, 242 c. der. PR 14+986/75+065

- Extracción de núcleos pavimento MR 40 en conjunto Contralista-Interventora en grietas reparadas con costura. Profundidad promedio del la grieta entre 1 y 1.5 cm PR 10+230/400 (vector moderado) una 9,5 cm muestra
Estado del tiempo = Soleado


Interventora


Contralista

13 de septiembre 2025 (sábado)


- Instalación mezcla asfáltica HDC 19 proveniente de Conambien PR 1+463/667 ambos carriles
- Instalación de tachos reflectivos antes y después resaltes PR 24+600; PR 28+680; PR 29+250; PR 47+485, PR 47+685
- Reparación de losas pavimento MR 40 con costura en módulos

#234 c. der; #236 c. izq; #247 al 250 c. izq. PR 15+020/107

En jornada del día anterior se rechazó densidades (80%) tramo PR 9+087/100 c. der. Contralista toma muestras de sobrasante rechazada

Estado del tiempo = Lluvias 2 horas


Interventora


Contralista

15 de septiembre 2025 (lunes)

- Instalación de mezcla asfáltica HDC 19 PR 1+657/689 calzada


- Reparación de losas pavimento MR 40 con costura en módulos

#22 c. der; #26 y 27 c. izq; #53, 54 y 55 der; #104, 105 y 106 PR 13+459/16+145

#252, 253, 257 c. izq; #258, 259, 260, 261 c. der. PR 15+107/138

Estado del tiempo = 2 horas de lluvia


Interventora


Contralista

16 de septiembre 2025 (martes)

- Reparación de losas pavimento MR 40 con costura en módulos

#98, 99, 100, 101, 102 c. der PR 13+431/459

#262, 263, 269 al 273 PR 15+203/222 c. der

#291, 292 c. der PR 15+306/313


#60, 61, 62, 63 c. izq PR 16+763/785

- Instalación de sellos conetos PR 25+750/800 c. izq.
- Se evidencia que continúa desplazamiento de material del costado derecho erosionado al borde pavimento con profundidad de 63 cm

Estado del tiempo = Soleado



Interventora



Contratista


17 de septiembre (miércoles) 2025

- Excavación para construcción de estructura de pavimento PR 9+077/102 c. der.
- Instalación de material de terraplen como subrasante PR 9+077/903 c. der.
- Instalación de geomanta talud PR 9+150/160 lado der.
- Reparación de bari pavimento HR 40 con costura en módulos


#91 al 97 c. der PR 13+400/431

- Se observó material de terraplen instalado en el PR 9+077 c. der saturado y con grumos, por lo que se solicitó al Contratista su retiro y reemplazo

Estado del tiempo = Seco



Interventora



Contratista

18 de septiembre 2025 (jueves)

- Instalación de cercas PR 31+520/560 lado der.
- Reparación de bari pavimento HR 40 con costura en módulos

#70 al 74 c. izq. PR 13+305/323


#300, 315, 316, 317, 364, 387, 388 PR 15+346/746 c. der.

#41 al 47 c. der. PR 27+180/215

- Sello entre coneto y pavimento HR 40 PR 26+300/340 lado der.
- En horas de la mañana se presentó bloqueo PR 0+000 sector Los Cruces por parte de la Minga Indígena
- Se observa que el Contratista realizó llomos en punta erosionado PR 36+900 c. izq. PR 39+600 c. der
- Se adecuó llegada de aguas a la cabecera OOT tipo alcantarilla PR 41+950 con la conformación del terreno e instalación de piedra pegada

Estado del tiempo = Seco


Interventora


Contratista

19 de septiembre 2025 (viernes)

- Instalación de cercas PR 46+515/523; PR 46+450/500 lado izq.
- Excavación puente existente PR 45+215 lado der.
- Sello con bitollex lasas pavimento MR 40 PR 26+330/380 izq.; PR 26+360/390 der.
- Adecuación de lasas pavimento MR 40 con costura en módulos


#48 al 54 c. der PR 27+215/250


#389 al 397 c. der PR 18+746/789

#67 al 69 c. izq. PR 13+291/305

- Se observa escalonamiento lasas #1208 a la 1212 PR 28+830 c. der.

Estado del tiempo = Seco


Interventora


Contratista

20 de septiembre 2025 (sábado)

- Se funde lasas pavimento MR 40 reforzadas # 243 a la 247 PR 9+080/112 c. der.
- Adecuación de lasas pavimento MR 40 con costura en módulos


#40, 51, 65, 67, 68 c. der PR 27+170/290

#398, 399, 400, 406, 418, 419 c. der PR 15+789/882

- Contratista realiza limpieza y arreglo geomático desprendido PR 10+700 der.
- No se observan actividades talud PR 15+400 lado izq.

Estado del tiempo = Seco


Interventora


Contratista

22 de septiembre 2025 (lunes)

- Demolición carpeta asfáltica PR 1+745/776 sector Santa Lucra para construcción de pavimento MR 40
- Adecuación de lasas pavimento MR 40 con costura en módulos

#401, 420, 421, 423 y 424 PR 15+805/890 c. der.

408, 411, 412, 415 c. 129 PR 75+827/860

69 al 73 c. der PR 27+290/315.

63 al 66 c. 129 PR 13+273/291

Estado del tiempo = Seco

Interventora

Contratista

23 de septiembre 2023 (martes)

- Se funde losas pavimento MR 40 PR 1+746/776 reforzadas c. 129.
- Sello entre cuneta y pavimento PR 26+420/475 lado 129.
- Se continua con la demolición ponton existente PR 45+715 lado der.
- Adecuación de losas pavimento MR 40 con costura a los módulos

428 al 432 c. der PR 15+902/943

440, 441 c. der. PR 15+864/871

430 al 433 c. 129 PR 15+929/943

74 al 77 c. der. PR 27+315/335

Estado del tiempo = Seco

Interventora

Contratista

24 de septiembre 2023 (miércoles)

- Demolición carpeta asfáltica PR 1+522/554 c. 129. Sector Santa Lucra, para construcción pavimento MR 40
- Cerezo subbase PR 1+623/655 c. 129.
- Adecuación de losas pavimento MR 40 con costura a módulos

510, 511, 513, 536, 553, 441, 442, 443 PR 15+821/76+306 c. der.

70, 71, 72, 96, 97, 98 c. 129 y der PR 27+310/425

Estado del tiempo = Seco

Interventora

Contratista

25 de septiembre 2025 (jueves)


- Se funde losas pavimento MR 40 reforzadas PR 1+623/633 c. izq.
- Instalación de geomanto talud PR 9+153/170 lado der.
- Instalación de formaleta muro encofe ODT Alcantarilla PR 9+480 lado der.
- Sello canetas PR 26+335/625 lado izquierdo y PR 26+520/590 lado derecho
- Inicio perforaciones para pernos talud PR 15+400 lado izq.
- Adecuación de losas pavimento MR 40 en módulos con costura


94, 99, 100, 101, 147, 148, 149 PR 27+430/670 c. der.

556, 577, 578, 579, 599 PR 16+495/682 c. der.

866, 867, 868 PR 19+080/092 c. der.

Estado del tiempo: 2 horas de lluvia


Interventor


Contratista

26 de septiembre 2025 (viernes)


- Perforaciones para pernos talud PR 15+400 lado izq.
- Adecuación de losas pavimento MR 40 con costura en módulos

927, 928, 929, 975, 976, 977 PR 19+359/580 c. der.

185, 186, 1005, 1006 PR 27+820/925 c. der.

Estado del tiempo: 1 hora de lluvias


Interventor


Contratista

27 de septiembre 2025 (sábado)

- Instalación de pernos talud PR 15+400 lado izq.
- Se funde pavimento MR 40 en resalto Santa Lucra PR 1+522/354 c. izq.
- Se funde muro pantalla en alcantarilla encofe PR 9+480 lado derecho.
- Adecuación de losas pavimento MR 40 en módulos con costura


927, 928, 929 PR 19+359/372 c. izq.


975, 976, 977 PR 19+569/580 c. der.

- Interventor solicita al Contratista recomprimir el tramo a fundir entre el PR 1+523/554 c. izq. por humedad observado en la SBC

- No se realiza perforaciones para pernos por falla mecánica en el telehandler

Estado del tiempo = 1 hora de lluvia



Interventoría



Contratista

29 de septiembre 2025 (lunes)

- Construcción de filtros laterales PR 91945 en ambos lados
- Limpieza manual y minicargador cunetas PR 51730 lado der.; PR 151810 lado der. PR 101600 y PR 101665 lado derecho
- Aplicación pintura amarilla en resacos constituidos en zona urbana de Santa Lucra
- Adecuación losas de pavimento MR-40 con costura en módulos
- #986, 987 PR 91619/627 c. der.
- #997 al 1002 PR 191669/697 c. izq.
- #1012 PR 271965 c. der.
- #1044, 1045 y 1046 PR 281722 c. der.
- #1070 PR 281790 ambos carriles
- #1140 PR 281544 c. der.
- #1172 PR 281694 c. der.


Estado del tiempo = Seco



Interventoría


Contratista

30 de septiembre 2025 (martes)

- Demolición resalto y carpeta asfáltica PR 11745/776 carril der.
- Adecuación losas de pavimento MR-40 con costura en módulos
- #997, 998, 999 PR 191682 c. der.
- #1039, 1040, 1041, 1042 PR 191856/886 der.
- #1046, 1047 PR 191901/905 c. der.
- #1178, 1179 PR 281695 c. izq.
- #1179, 1180 PR 281700 c. der.
- #1889 PR 281745 c. der.
- #1200, 1201 PR 281800 c. izq.


Interventoría


Contratista
