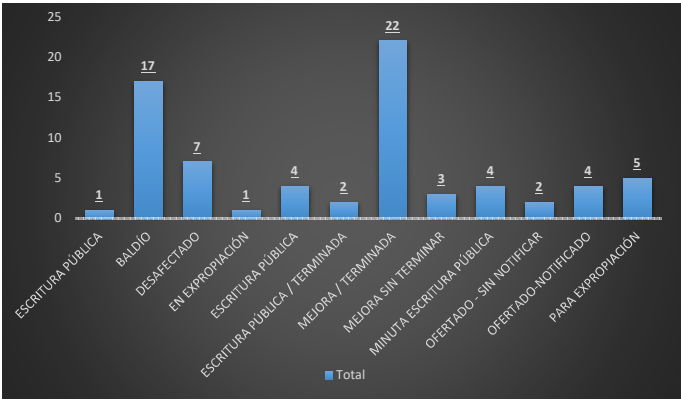


	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1 2 de 10
		PÁGINA	

FECHA	11/12/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

Predio	No. Folio	concepto contratista	SUSTENTO del CONTRATISTA	OBSERVACIONES
002-I-T1-MSM	140-39777	29-may-24	MODIFICACION AL DISEÑO APROBADO POR LA INTERVENTORIA, se describe la utilización de micropilotes dentro del corredor disponible Oficio interventoría 49980-CE-2411 Y RSTA 36281 de marzo 2024	hay comunicaciones del contratista con referencias técnicas de la obra, no se encuentra comunicación de INVIAS o Interventoría que relacionen el tema de los predios y su desafectación. En la comunicación refería a la interventoría se relacionan son avances en insumos prediales
003-D-T1-MSM	140-154845	29-may-24	MODIFICACION AL DISEÑO APROBADO POR LA INTERVENTORIA, se describe la utilización de micropilotes dentro del corredor disponible Oficio interventoría 49980-CE-2411 Y RSTA 36281 de marzo 2024	hay comunicaciones del contratista con referencias técnicas de la obra, no se encuentra comunicación de INVIAS o Interventoría que relacionen el tema de los predios y su desafectación. En la comunicación refería a la interventoría se relacionan son avances en insumos prediales
004B-D-T10-MSM	SIN FMI	30-jul-24	MODIFICACION AL DISEÑO APROBADO POR LA INTERVENTORIA, se describe la utilización de micropilotes dentro del corredor disponible Oficio INVIAS 2024S-VBOG-048312 de julio 2024 y mensajes de interventoría de 14 de mayo de 2024	El documento del contratista soporta la desafectación en INVIAS, sin embargo, la comunicación del INVIAS esta delimitada entre PRs, y el predio se encuentra fuera de esta descripción.

Etiquetas de fila	i de No. FICHA P
ESCRITURA PÚBLICA	1
BALDÍO	17
DESAFECTADO	7
EN EXPROPIACIÓN	1
ESCRITURA PÚBLICA	4
ESCRITURA PÚBLICA / TERMINADA	2
MEJORA / TERMINADA	22
MEJORA SIN TERMINAR	3
MINUTA ESCRITURA PÚBLICA	4
OFERTADO - SIN NOTIFICAR	2
OFERTADO-NOTIFICADO	4
PARA EXPROPIACIÓN	5
Total general	72



ESCRITURA PÚBLICA	1
BALDÍO	17
DESAFECTADO	7
EN EXPROPIACIÓN	1
ESCRITURA PÚBLICA	4
ESCRITURA PÚBLICA / TERMINADA	2
MEJORA / TERMINADA	22
MEJORA SIN TERMINAR	3
MINUTA ESCRITURA PÚBLICA	4
OFERTADO - SIN NOTIFICAR	2
OFERTADO-NOTIFICADO	4
PARA EXPROPIACIÓN	5

PAGOS EN DESARROLLO DE LA GESTION SOCIAL ADELANTADA EN EL PROYECTO		
PREACTA No.22 – MARZO DE 2023	\$ 93.089.611	VoBo INVIAS 5520116 10/04/2023
PREACTA No.26 – JULIO DE 2023	\$ 307.924.457	VoBo INVIAS 5544583 02/08/2023
PREACTA No.27 – AGOSTO DE 2023	\$ 44.046.715	VoBo INVIAS 2023S-VBOG-004246 14/09/2023
PREACTA No 28- SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 303.478.114	VoBo INVIAS VBOG-009801 04/10/2023
PREACTA No 30- NOVIEMBRE DE 2023	\$ 219.789.428	VoBo INVIAS VBOG-023260 24/11/2023
PREACTA No 31- DICIEMBRE DE 2023	\$ 3.130.276	VoBo INVIAS 2023S-VBOG-028360 13/12/2023
PREACTA No 36– MAYO 2024	\$ 63.187.656	VoBo INVIAS 2024S-VBOG-037253 11/06/2024
PREACTA No 40– SEPTIEMBRE 2024	\$ 26.921.444	VoBo INVIAS 2024S-VBOG-071013 01/10/2024
PREACTA No 42– Noviembre 2024	\$ 339.790.462	VoBo INVIAS 2024S-VBOG-093203 09/12/2024
PREACTA No 44– Enero 2025	\$ 0.00	VoBo INVIAS 2025S-VBOG-006952 10/02/2025
PREACTA No 45– Febrero 2025	\$ 134.370.411	VoBo INVIAS 2025S-VBOG-031483 19/05/2025
PREACTA No 47– ABRIL 2025	\$ 512.816	VoBo INVIAS 2025S-VBOG-043806 23 /06/2025
PREACTA No 50- JULIO 2025	\$ 2.917.241	VoBo INVIAS 2025S-VBOG-058875 14/08/2025
PREACTA No 51– AGOSTO 2025	\$ 0.00	VoBo INVIAS 2025S-VBOG-066986 14/09/2025
PREACTA No 53– OCTUBRE 2025	\$ 2.727.808	VoBo INVIAS 2025S-VBOG-084726 06/11/2025
TOTAL	\$ 1.541.373.623	

VALORES GESTIÓN SOCIAL 02 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	\$ 1.808.894.949
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 1.541.373.623
RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	\$ 267.521.326

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1 3 de 10
		PÁGINA	

FECHA	11/12/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

VALOR PIA V7	\$ 1.239.845.322,00	NO OBJECCION SS 2025S-VBOG-091929 DEL 28/11/2025
PRE-ACTA No. 54 (NOVIEMBRE 2025)	\$ -	
TOTAL RECONOCIDO	\$ 1.092.355.186,00	
REMANENTE TOTAL	\$ 147.490.136,00	

Maquinaria activa en corredor vial.
Santa Lucia - Moñitos
1 retro excavadora de llantas.
1 cama baja
1 minicargador
2 mixer
1 carro tanque
6 volqueta doble.
1. motor niveladora
1 vibro compactador
1 compresor.
1 telejandier
1 retro excavadora de oruga..
2 cargador frontal.

3- Gestión Predial. Luis Romero (Profesional predial interventoría). Durante la semana se hicieron gestiones relacionadas con las comunicaciones que el Contratista ha radicado, se hizo seguimiento y trámite.
Como la remisión del informe mensual mediante comunicación 46820
Mediante la comunicación 46868 se recibió la oferta del predio 14DT3. Con la comunicación 45398 con el que el INVIAS aprueba unos insumos relacionados con el predio 15ADT3. Con la comunicación 46798 se recibió los soportes de la desafectación, donde el Contratista atendió la comunicación de la Interventoría solicitando los soportes del porqué de las desafectaciones.
Con la comunicación 44679, el Contratista manifestó que no tienen la obligación de asumir los costos que cobra el operador catastral de unas fichas de gestión catastral. Sin embargo, este tema se trató en mesa de trabajo con el INVAS y de lo cual se estará remitiendo una comunicación por parte de la Interventoría.
Con la comunicación 46922 se recibió el contrato de compraventa de las mejoras del predio 2DT6.
Se está revisando la pre-acta predial N°54 remitida por el Contratista a través de la comunicación 46845.
Con la comunicación 46920 relacionada con unos documentos pendientes por gestión en el INVIAS, los cuales se trataron en la mesa de trabajo de ayer, en la que el Contratista manifestó que en registro se encuentran para inscripción de oferta los predios 10, 12 y 13 del tramo 10.
Así mismo en la notaría se encuentra en trámite los documentos relacionados con los predios 15IT3, 2DT3, 3IT6, 2DT7.
Y finalmente recordamos que por parte del INVIAS está pendiente por trámite el saneamiento del predio 6DT10, la resolución de expropiación del predio 4IT1, y unos documentos relacionados con la inscripción de oferta del predio 14DT3 y 03IT7.
Maria victoria Mozzo (Profesional jurídico predial interventoría). El trámite ante la ANT continúa, y a la fecha no se ha recibido respuesta respecto a la comunicación con la cual se radicaron los insumos.
Aprovechando la presencia del Dr. Omar Camelo, coordinador en la Subdirección de Sostenibilidad, se solicita muy respetuosamente celeridad con unos insumos como el saneamiento por mandamiento de la ley del 006-D del cual depende otras 17 resoluciones, y así poder radicar masivamente las otras resoluciones teniendo en cuenta la mesa de trabajo que tuvimos en el INVIAS el 21 de octubre donde se quedó en que se iba a manejar paralelamente los dos trámites tanto en ANT como por saneamiento, con el fin de contar con esas franjas de terreno a nombre de la entidad.
Adicionalmente, se tiene el tema de la resolución de expropiación pendiente. El Dr. Raúl, mediante comunicación y mediante correos electrónicos, ha solicitado también un informe de justificación para el predio 03IT3, acerca de las demoras para iniciar el trámite de la resolución. En la reunión del día de ayer, el ingeniero Pablo informó que el Contratista para el lunes nos hacían entrega de esta.
Entonces, tan pronto contemos con ese documento, será remitido a la Subdirección para la revisión correspondiente y continuar con los trámites.
Omar Camelo Osorio (coordinador Subdirección de Sostenibilidad). la resolución 06D la tiene la subdirectora, sino que se han presentado problemas tecnológicos en los últimos días para la firma de este documento.

Raúl Tobaria (Gestor Jurídico Predial). las inscripciones de oferta ya están listas, no se han podido subir por los problemas tecnológicos.
Se encuentra pendiente por parte de la Interventoría un recurso de reposición contra una nota devolutiva.
Con respecto a una resolución de expropiación se remitió el oficio con el que se realiza una recomendación con respecto a tener en cuenta la redacción y la congruencia del documento, dado que se modificó en casi un 95%, para evitar devoluciones por este tipo de observaciones.
Maria victoria Mozzo (Profesional jurídico predial interventoría). Respecto a los predios desafectados y a la solicitud que hizo el INVIAS, se consultara al Contratista en qué estado están los tres informes que mediante comunicación el ingeniero Luis solicitó que se remitieran nuevamente para revisión, y así continuar con el trámite para entrega de carpetas al archivo.
Pablo Piedrahita (Profesional Predial Contratista). Con respecto a lo mencionado por el ingeniero Luis Romero, que hay tres ofertas de inscripción en la oficina de Loricá. Son tres escrituras que están para calificación. También hay un tema que está paralelo de la Preacta predial con el cobro de la mejora del 05BIT10 que se pagó este mes con el fin de que dado la posibilidad de que el INVIAS nos pueda remitir el visto de no objeción antes de finalizar el mes, poder realizar el cobro en el acta de obra.
Luis Romero (Profesional predial interventoría). Efectivamente, como dice el Contratista, para dar claridad de qué en su momento se realizó la desafectación, se está evaluando por parte de la Interventoría la información suministrada por el contratista. Se elaborará una comunicación de respuesta donde se informará que los documentos aportados por el Contratista esta vez cuentan con la trazabilidad que permite identificar en su momento que el INVIAS o la interventoría se pronunció sobre esas desafectaciones dándoles validez al hecho de desafectar esos predios. Ofertados no están porque se habían revisado unas mejoras en baldíos entonces pues no hay inscripción y donde si eran titulares no había necesidad de levantarla.
Marco Oliveros (Director de interventoría). Estamos al día por parte del director de INVIAS territorial?
Pablo Piedrahita (Profesional Predial Contratista). Hasta el momento no tenemos nada pendiente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1 4 de 10
		PÁGINA	

FECHA	11/12/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

4- Gestión Ambiental. Jesus Pataquiva (Profesional ambiental interventoría). Con comunicación 49980-CE-3972 se remitió al Contratista el radicado 2025S-VBOG-091929 con el que la Subdirección de Sostenibilidad emite concepto de no objeción al Plan de Inversión Ambiental versión 7, teniendo en cuenta que se actualizó por la inclusión del informe final técnico de las obras objeto de ocupación de cauce. Dicho Plan de Inversión cuenta con un remanente de \$147.490.135 para ejecutar las labores de mantenimiento del último año de las plantaciones establecidas.

Se recibió el radicado de la CVS No. 20252118740 del 26 de noviembre de 2025, con el cual la Corporación notifica al Consorcio Isla 066-2020 sobre la resolución No. 222 del 8 de septiembre del 2025, Por la cual se autoriza una reducción de la tasa de aprovechamiento de la Resolución 132 del 17 de junio del 2022 al valor de \$ 7.228.200.

Se realizó visita en conjunto con el Contrista a las labores de mantenimiento y monitoreo de las medidas compensatorias establecidas por la CVS en el permiso de aprovechamiento forestal único.

Con comunicación 49980-CE-3992 la Interventoría remitió concepto favorable al informe mensual ambiental correspondiente al mes de noviembre 2025.

Con respecto a lo que se ha venido ejecutando en el campo, el Contratista dio terminación a la instalación de los pernos en el PR 10+770 costado derecho y se encuentra actualmente instalando la malla triple torsión con el geomanto y la siembra de pasto con hoyos abonados.






Labores de mantenimiento en las que se observa que los árboles han presentado un buen comportamiento y se encuentran en buen estado.










Alberto Negrette (Profesional ambiental del contratista). Efectivamente, como lo mencionó la Interventoría, nos encontramos realizando el procesamiento de información del mantenimiento de las 15,84 hectáreas y el informe del monitoreo año tres de epífitas. Por lo que para la próxima semana se estaría radicando la CVS los informes correspondientes. Con relación a la estabilización de taludes, se trasladó el equipo para seguir con la instalación de pernos en el PR 12+500 costado izquierdo.

Con respecto a la reducción de la tasa de aprovechamiento, el Contratista está a la espera de la emisión de la factura por parte de la CVS para poder iniciar el trámite administrativo y poder cerrar esa obligación con respecto a los permisos, e iniciar el proceso para tramitar los paz y salvos.

Marco Oliveros (Director de interventoría). ¿Se ha definido la intervención de los tramos en los taludes que han presentado derrumbes por las lluvias que hubo a principios del mes de diciembre?

Alberto Negrette (Profesional ambiental del contratista). El Contratista responde que la situación se verificó con la Interventoría, y que se encuentra realizando el levantamiento topográfico para enviarlo al especialista en geotecnia del Contratista, quien deberá elaborar el concepto técnico en unos tramos críticos, especialmente el tramo del PR-14 costado derecho, y el PR 14+700, costado izquierdo, para solicitar aprobación por parte de la Interventoría para la instalación de malla triple torsión.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1 5 de 10
		PÁGINA	

FECHA 11/12/2025
(Día / Mes / Año)

5- Gestión Social. Arlenys Assias (Profesional Social Interventoría). Para esta semana continuamos con 148 PQR recibidas de las cuales 5 se encuentran abiertas, estas se encuentran supeditadas a la construcción de resaltos y señales. Ayer se emitió concepto por parte del especialista de la interventoría el cual aprobó los puntos donde se estarán ubicando los resaltos. Una vez recibido por el contratista se debe iniciar con las actividades para dar cierre a estas PQR.

GESTIÓN SOCIAL				
PROYECTO DE ATENCIÓN AL USUARIO				
CONSOLIDADO PQRS				
RECIBIDAS EN EL PERIODO	CERRADAS EN EL PERIODO	TOTAL CERRADAS	ABIERTAS	TOTAL
1	0	143	5	148

GESTIÓN SOCIAL				
PROYECTO DE ATENCIÓN AL USUARIO				
CON	PR	PETICIONARIO	ASUNTO	GESTIÓN A LA FECHA
143	29+350	Camila Galván:	Instalar señalización con el nombre de la vereda Villa concepción-Jobal en la entrada que conduce a esta,	Contratista informa la instalación de estas señales la realiza la misma empresa que realiza la pintura de los resaltos, una vez se construyan los resaltos aprobados para el sector de Jobal, Morrocoy y Abre los Ojos, se realizará la instalación de esta señal. Proyectado para realizarse el mes de noviembre aproximadamente.
145	23+800	Álvaro Hernández	Inundación en su predio ,	Con rad. 46298 de 31 de oct. El Consorcio Isla, envió a la Interventoría una propuesta de intervención en este punto, con miras a minimizar la problemática presentada. actualmente se encuentra en revisión del especialista de la Interventoría .
146	30+150	Miguel de los Santos González Galeano	Solicita la instalación de uno o dos reductores de velocidad en el sector de la Vereda Abre los Ojos,	Estas solicitudes se encuentran en el área de diseño del Contratista , quien informan que una vez se tengan los resultados se procederá a la instalación de los resaltos.
147	27+500	JAC de Joval	Se solicita la instalación de resaltos	
148	15+910	Never Narváez-JAC Vereda Morrocoy	la JAC de la vereda Morrocoy- ante el INVIAS, en la cual requieren la instalación de reductores de velocidad a la altura del KM 16	



GESTIÓN SOCIAL

INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

El día 1 de diciembre se realizó acompañamiento al contratista en la visita destinada a efectuar el cierre de las actas de vecindad del sector de Bajo Limón que presentaban inconvenientes

La actividad contó con la presencia de funcionarios de las oficinas de Planeación, Gestión del Riesgo e Infraestructura, quienes, en calidad de testigos, emitieron su concepto técnico, con lo cual fue posible proceder al cierre de dichas actas.



GESTIÓN SOCIAL

OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

➤ Se realizó visita de seguimiento a la OPC ADECUACIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA DEL BARRIO SANTA LUCÍA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, se verifica en compañía del área técnica el avance de la misma





GESTIÓN SOCIAL

OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

➤ la interventoría revisó la propuesta de Obra con Participación Comunitaria presentada por la Institución Educativa de Bajo Limón, remitida por el Contratista mediante comunicación N°46984 del 9 de diciembre de 2025

- **Objetivo:** adecuar el comedor escolar de la IE Bajo Blanco para mejorarla salubridad, funcionalidad y accesibilidad de este, ya que La infraestructura actual presenta deficiencias que afectan el servicio de alimentación de los estudiantes
- **Actividades a realizar:** trabajos de cimentación, estructura en madera, cubierta, pisos, accesibilidad y mobiliario.
- **Área del comedor:** **47,81 m²** con capacidad para **48 estudiantes**.
- **Aporte de La comunidad:** (I.E. Bajo Blanco aporta **\$1.500.000** sillas y mesas .)
- **Población beneficiada:** **305 estudiantes** y el personal institucional.
- **Costo total del proyecto:** **\$60.131.610**

GESTIÓN SOCIAL

OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA



COMEDOR





FECHA	11/12/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

GESTIÓN SOCIAL

SEGURIDAD VIAL

- Se aprobó el diseño de 300 gorras en drill y un pendón tipo pasa calle para la campaña vial orientada al no uso del Celular mientras se conduce – 16 dic 2025



Se aprobó material informativo tipo volante, que será distribuido una vez culminadas las actividades de construcción de los resaltos sobre la vía, con el propósito de socializar con la comunidad las medidas implementadas y prevenir posibles accidentes o colisiones contra dichos elementos viales.



GESTIÓN SOCIAL

GESTIÓN SOCIO PREDIAL

- La Interventoría revisó y aprobó cuatro factores de compensación (UMV, TDO, ARRTO y UME).
- Corresponden a la ficha socioeconómica de la unidad social de la señora Lesvia Castro, ubicada en el PR 45+563 MI.
- El valor aprobado es de **\$29.387.608**.
- Fue remitida a la Subdirección de Sostenibilidad para solicitar el **concepto de no objeción** bajo radicado **49980-CE-3994 del 10/12/2025**.

PR 45+563 MI



Rossi Rodriguez (Profesional Social contratista). El resumen que presentó la Interventoría está muy completo. No hay nada más que complementar frente a la gestión social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-14-FR-1 VERSIÓN 1 9 de 10 PÁGINA
		FECHA 11/12/2025 (Día / Mes / Año)
6- Gestión SST. Johan Barrera (Profesional SST Interventoría). Al inicio de la semana anterior y de esta semana se evidencia la correcta implementación del PMT por parte del contratista en los tramos donde se vienen ejecutando actividades. En el comité de hace 15 días solicitamos la programación de fin de año, con el personal que estará disponible durante finales de 2025 y inicios del año 2026, tiempo en el que el proyecto entrará en receso. Estamos a la espera de esta programación.		
		
Eukary Estrada (Profesional SST del Contratista). El día de hoy voy a compartir el oficio del personal que queda disponible para atender cualquier eventualidad y los recorridos que se van a realizar en estas fechas.		
COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 18/12/2025 (Día / Mes / Año)		
NOTAS: 1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.		









	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1 10 de 10
		PÁGINA	

FECHA		11/12/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Ellen Aicardy	Supervisor del contrato	Instituto Nacional de Vías	
Lucas Guzmán	Apoyo técnico DT	Instituto Nacional de Vías	
Raúl Tobaría	Gestor Jurídico Predial	Instituto Nacional de Vías	
Omar Camelo Osorio	Coordinador Subdirección de Sostenibilidad	Instituto Nacional de Vías	
Marco Oliveros	Director de Interventoría	Consorcio Vial Norte	
María Ruíz	Auxiliar Interventoría	Consorcio Vial Norte	
Maryan Pérez	Auxiliar Interventoría	Consorcio Vial Norte	
Jesús Pataquiva	Profesional Ambiental	Consorcio Vial Norte	
Arlens Assias	Profesional Social	Consorcio Vial Norte	
Johan Barrera	Profesional SST	Consorcio Vial Norte	
Maria victoria Mozzo	Profesional Jurídico predial	Consorcio Vial Norte	
Luis Romero	Profesional predial	Consorcio Vial Norte	
Gonzalo Romero	Abogado Jurídico Predial contratista	Consorcio Isla 066 - 2020	
Pablo Piedrahita	Profesional Predial	Consorcio Isla 066 - 2020	
Rossi Rodríguez	Profesional Social	Consorcio Isla 066 - 2020	
Eukari Estrada	Profesional SST	Consorcio Isla 066 - 2020	
Jaime Sanchez	Director de Obra	Consorcio Isla 066 - 2020	
Alberto Negrete	Profesional Ambiental	Consorcio Isla 066 - 2020	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1 1 de 7
		PÁGINA	

	FECHA 18/12/2025 (Día / Mes / Año)
--	--

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 177
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 923 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA O66 - 2020

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA –MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

CONTRATO DE Interventoría No. 1050 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS		
COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1- Avance financiero de obra acumulado a 13 de diciembre de 2025
 2- Avance de obra
 3- Gestión Predial
 4- Gestión Ambiental
 5- Gestión Social
 6- Gestión SST

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

REPROGRAMACIÓN 16		informe semanal	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO AL MES	DICIEMBRE-25	\$ 142.725.953	100,00%
ACUMULADO PROGRAMADO A	13 DICIEMBRE-25	\$ 138.428.984	96,99%
EJECUTADO AL	13 DICIEMBRE-25	\$ 130.137.128	91,18%
AVANCE		-\$ 8.291.855,72	-5,81%

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1 2 de 7
		PÁGINA	

FECHA	18/12/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

Informe de Gestión – Área Predial

Período: Diciembre

1. Comités y Reuniones

- Programación de reunión para el 18 de diciembre, con el fin de validar actuaciones con INVIAS, contratista e interventoría, relacionadas con la Preacta Predial No. 55.

2. Revisión de Comunicaciones e Informes

- Revisión de la comunicación No. 46820, correspondiente al informe predial mensual.
- Revisión de la comunicación No. 46868, relacionada con la oferta del informe 014 D T3.
- Revisión de la comunicación No. 45398, mediante la cual INVIAS aprueba los insumos 015A D T3.
- Revisión de la comunicación No. 46798, relacionada con los soportes del proceso de desafectación.
- Revisión de la comunicación No. 446799, asociada a los costos de las fichas del gestor catastral.
- Revisión de la comunicación No. 46920, correspondiente a la relación de documentos pendientes ante INVIAS.
- Se revisa informe De avance a fin de actualizar la matriz general de seguimiento.


3. Gestión Contractual y Documental

- Revisión del trámite No. 46922, relacionado con el contrato de compraventa de mejoras – 2D T6.
- Revisión de la comunicación No. 46845, correspondiente a la Preacta No. 54.

4. Observaciones Generales

Las actividades desarrolladas estuvieron enfocadas en el seguimiento predial, la revisión técnica y administrativa de comunicaciones oficiales, la gestión documental ante INVIAS y la coordinación interinstitucional para la validación de preactas prediales, garantizando la continuidad y control de los procesos a cargo del área.

Etiquetas de fila	Cuenta de No. FICHA PREDIAL
ESCRITURA PÚBLICA	1
BALDÍO	18
DESAFECTADO	7
EN EXPROPIACIÓN	1
ESCRITURA PÚBLICA	4
ESCRITURA PÚBLICA / TERMINADA	2
MEJORA / TERMINADA	22
MEJORA SIN TERMINAR	3
MINUTA ESCRITURA PÚBLICA	4
OFERTADO - SIN NOTIFICAR	2
OFERTADO-NOTIFICADO	3
PARA EXPROPIACIÓN	5
Total general	72

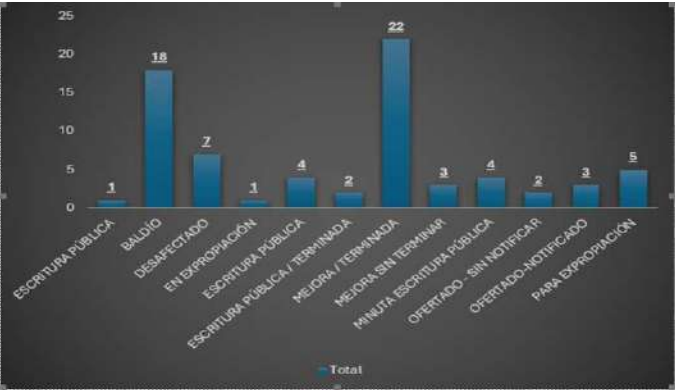

PAGOS EN DESARROLLO DE LA GESTION SOCIAL ADELANTADA EN EL PROYECTO		
PREACTA No.22 – MARZO DE 2023	\$ 93.089.611	VoBo INVIAS SS20116 10/04/2023
PREACTA No.26 – JULIO DE 2023	\$ 307.924.457	VoBo INVIAS SS44583 02/08/2023
PREACTA No.27 – AGOSTO DE 2023	\$ 44.046.715	VoBo INVIAS 2023S-VBOG-004246 14/09/2023
PREACTA No 28- SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 303.478.114	VoBo INVIAS VBOG-009801 04/10/2023
PREACTA No 30- NOVIEMBRE DE 2023	\$ 219.789.428	VoBo INVIAS VBOG-023260 24/11/2023
PREACTA No 31- DICIEMBRE DE 2023	\$ 3.130.276	VoBo INVIAS 2023S-VBOG-028360 13/12/2023
PREACTA No 36– MAYO 2024	\$ 63.187.656	VoBo INVIAS 2024S-VBOG-037253 11/06/2024
PREACTA No 40– SEPTIEMBRE 2024	\$ 26.921.444	VoBo INVIAS 2024S-VBOG-071013 01/10/2024
PREACTA No 42– Noviembre 2024	\$ 339.790.462	VoBo INVIAS 2024S-VBOG-093203 09/12/2024
PREACTA No 44– Enero 2025	\$ 0.00	VoBo INVIAS 2025S-VBOG-006952 10/02/2025
PREACTA No 45– Febrero 2025	\$ 134.370.411	VoBo INVIAS 2025S-VBOG-031483 19/05/2025
PREACTA No 47– ABRIL 2025	\$ 512.816	VoBo INVIAS 2025S-VBOG-043806 23 /06/2025
PREACTA No 50– JULIO 2025	\$ 2.917.241	VoBo INVIAS 2025S-VBOG-058875 14/08/2025
PREACTA No 51– AGOSTO 2025	\$ 0.00	VoBo INVIAS 2025S-VBOG-066986 14/09/2025
PREACTA No 53– OCTUBRE 2025	\$ 2.727.808	VoBo INVIAS 2025S-VBOG-084726 06/11/2025
TOTAL	\$ 1.541.373.623	

VALORES GESTIÓN SOCIAL 17 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	\$ 1.808.894.949
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 1.541.373.623
RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	\$ 267.521.326

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1 3 de 7
		PÁGINA	

FECHA	18/12/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

<table border="1"> <tr> <td>VALOR PIA V7</td> <td>\$ 1.239.845.322,00</td> <td rowspan="4">NO OBJECCION SS 2025S-VBOG-091929 DEL 28/11/2025</td> </tr> <tr> <td>PRE-ACTA No. 54 (NOVIEMBRE 2025)</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECONOCIDO</td> <td>\$ 1.092.355.186,00</td> </tr> <tr> <td>REMANENTE TOTAL</td> <td>\$ 147.490.136,00</td> </tr> </table>	VALOR PIA V7	\$ 1.239.845.322,00	NO OBJECCION SS 2025S-VBOG-091929 DEL 28/11/2025	PRE-ACTA No. 54 (NOVIEMBRE 2025)	\$ -	TOTAL RECONOCIDO	\$ 1.092.355.186,00	REMANENTE TOTAL	\$ 147.490.136,00	
VALOR PIA V7	\$ 1.239.845.322,00	NO OBJECCION SS 2025S-VBOG-091929 DEL 28/11/2025								
PRE-ACTA No. 54 (NOVIEMBRE 2025)	\$ -									
TOTAL RECONOCIDO	\$ 1.092.355.186,00									
REMANENTE TOTAL	\$ 147.490.136,00									

Maquinaria activa en corredor vial.
Santa Lucía - Moñitos
 1 retro excavadora de llantas.
 1 cama baja
 1 minicargador
 2 mixer
 1 carrotanque
 6 volqueta doble.
 1.motoniveladora
 1 vibro compactador
 1 compresor.
 1 telejanhdler
 1 retro excavadora de oruga..
 2 cargador frontal.
 1 Vibro compactador
 1Vibro compactador llanta neumáticos
 1 Finesher

3- Gestión Predial. Luis Romero (Profesional predial interventoría). El contratista presento informe de desafectaciones sobre los 7 informes que habían sido devueltos por falta de soportes. Se proyecto comunicación al contratista indicando que quedaban aclaradas las desafectaciones de los predios relacionados. Los documentos donde se aclara la desafectación deben ser anexados a los expedientes para el archivo.
 Tenemos reunión hoy a las 9:30 am para revisar la preacta predial del mes de noviembre.

Marco Oliveros (Director de interventoría). La preacta predial se debe tramitar con fecha de diciembre porque ya cerramos el acta de noviembre.

Maria victoria Mozzo (Profesional jurídico predial interventoría). Adicional a lo manifestado por el Ing. Luis, la semana pasada nos remitieron el saneamiento por mandamiento de ley, había un compromiso por parte del contratista de esta semana hacer entregas parciales de las otras que nos hacen falta, a la fecha la interventoría no ha recibido resoluciones de saneamiento.

Tenemos pendiente un recurso de reposición, ayer converse con el Ing. Pablo y el Dr. Gonzalo para agilizar este tema. Me comentan que ya lo están organizando, que hace falta simplemente un tema de avalúo que es por la cual se interpuso el recurso, entonces para que porfavor tengamos un poco de celeridad.

Ayer hable con el Dr. Raúl porque está pendiente una resolución de expropiación, unas cancelaciones y otra documentación que no se han podido recibir por el ataque cibernético al sistema de la entidad.

Raúl Tobaría (Gestor Jurídico Predial). Los oficios ya están revisados, hoy ya deben dar los lineamientos para emitir la correspondencia. Una vez se de el lineamiento para remitir la documentación, realizaremos el envío de la misma. Les agradezco enviar el recurso de reposición a más tardar el día de hoy para no salirnos de los términos.

Había un tema de un recurso de reposición contra una nota evolutiva de la ficha predial 1DT10, ese oficio ya lo hice y el recurso salió con radicado pero preciso colapso el tema de la AZ y no se pudo descargar, entonces para que analicemos el tema ya que los términos ya pasaron para interponer ese recurso que fue un error de registro de una mala interpretación que se hizo, entonces para que pensemos si vale la pena volver a pasar el recurso o más bien solicitar los trámites nuevamente ante la oficina de registro y explicarlo nuevamente.

Lo que queda pendiente serían las resoluciones de saneamiento. ¿Cuándo tienen pendiente pasarlas?. Solo quedan 8 días laborales para que se acabe el año y a mí se me termina el contrato el 31 de diciembre, como ya conozco el tema nos vamos por la misma línea y sacamos las 7 que están pendientes.

Gonzalo Romero (Profesional Jurídico Predial contratista). Frente a la nota devolutiva ya no es posible interponer el recurso, se va a radicar el insumo para generar una nueva actuación administrativa.

Frente al tema de recurso de la resolución de expropiación, tenemos gran parte de la información pero necesitamos el insumo de la lonja. Esperamos recibir esta información a más tardar mañana para poder terminar la resolución de expropiación.

Actualmente también estamos proyectando 3 nuevas resoluciones de expropiación, (la de los avisos), que lo ideal también es que estén en cola junto con las resoluciones de saneamiento.

Creería que en coordinación con el equipo técnico jurídico predial del contratista, podemos estar radicando a más tardar el 23 de diciembre los saneamientos.

Dr. Raúl tengo conocimiento que la resolución de expropiación fue avalada por usted y posteriormente fue enviada a la doctora Alejandra. ¿Puedo manifestar dentro de mi informe que ya fue avalado por el gestor jurídico predial. **Raúl Tobaría (Gestor Jurídico Predial).** No, el aval se da cuando se surtan todos los filtros

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1 4 de 7
		PÁGINA	

FECHA	18/12/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

Raúl Tobaría (Gestor Jurídico Predial). Cuando le da a usted el vencimiento de ese recurso. **Gonzalo Romero (Profesional Jurídico Predial contratista).** 24 de diciembre **Maria victoria Mozzo (Profesional jurídico predial interventoría).** Entonces, tenemos que, a más tardar el 23 de diciembre radican los saneamientos. Tenemos adicionalmente tres resoluciones de expropiación a radicar. Estamos pendientes de un informe de justificación subsanado de observaciones por parte del contratista. Y por parte del INVIAS tenemos una expropiación, tenemos unas cancelaciones, tenemos la resolución de expropiación.

Doctor Raúl, nuestro profesional predial ya hizo la revisión de los informes técnicos y los mismos ya quedaron revisados y aprobados por interventoría. Entonces, en el transcurso del día, le estaré remitiendo los mismos para el soporte de la cancelación de acuerdo a la solicitud que usted me hizo.

Raúl Tobaría (Gestor Jurídico Predial). De conformidad con el comunicado que me radicaron ayer 49980-CE-4980 ¿me lo enviaste como una copia para que estuviera atento a ese seguimiento y trazabilidad?. **Maria victoria Mozzo (Profesional jurídico predial interventoría).** Si señor , así es. **Raúl Tobaría (Gestor Jurídico Predial).** hice una lectura rápida y ahí en el numeral 17 dicen que sin embargo y pese a estar aprobado, pero pues nombren ahí, si van a decir que pese a estar aprobado el acto administrativo por parte de la inventaría y que se realizó el cambio del profesional jurídico predial de la interventoría, pero también decir en qué fecha fue, quién lo aprobó, por qué, por medio de qué acta de reunión fue, porque quedo muy vago. No dicen la fecha, si No van a decir quién lo aprobó, por lo menos citen como consta en el acta de fecha tal. Lo mismo en el numeral 18 que dicen como consecuencia del anterior se procede a realizar la respectiva consulta de la agencia nacional de tierras sin que exista respuesta, si pero por medio de cual oficio radicaron. **Gonzalo Romero (Profesional Jurídico Predial contratista).** No podemos anexar esa resolución, porque realmente no nos han entregado información. **Raúl Tobaría (Gestor Jurídico Predial).** Pero si pueden citar en virtud de la comunicación, si la reiteraron también citar la reiteración, para que por lo menos se vea la trazabilidad de la diligencia que la interventoría hizo al tema, no quisiera ponerlos en más diligencias pero vamos a presentar una resolución de expropiación con unas novedades nuevas en cuanto a la situación jurídica de un predio con un estudio del 2022. Me parece que también se debe anexar la actualización del estudio de títulos que cambió. Si No estoy mal, en el apéndice dice que si existen nuevas situaciones que cambie la situación jurídica del predio, se debe actualizar el estudio de títulos, porque cambia el diagnóstico.

Gonzalo Romero (Profesional Jurídico Predial contratista). La escritura del señor Erasmo Javier Martínez esta en la notaría de Purísima para firma, me voy a dar los datos a la dirección territorial para que se acerquen a firmar. **Sair Silgado (Abogado de apoyo DT).** Por favor tener en cuenta que el ingeniero Nestor Lemus sale de vacaciones a partir del 29 de diciembre, para que lo tengan en cuenta para los tramites notariales y así evitar reprocesos.

Pablo Piedrahita (Profesional Predial Contratista). Dado que el INVIAS no puede sacar documentos por la AZ, propongo que si el acta predial cumple para la aprobación de la entidad y de la interventoría, sea aprobada mediante acta de comité. **Luis Romero (Profesional predial interventoría).** En la reunión conversamos con el Dr. Cristian y se define como se va a realizar el tramitar del acta.

4- Gestión Ambiental. Jesus Pataquiva (Profesional ambiental interventoría). se encuentra pendiente que por parte del contratista se radique a la CVS el informe del mantenimiento del año 3 de las plantaciones y el monitoreo de las epifitas que han sido rescatadas.

En cuanto al avance respecto de la estabilización de taludes, el Contratista realizó la instalación de pernos y malla triple torsión en el PR 12+550 del costado izquierdo.



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1 5 de 7
		PÁGINA	

FECHA	18/12/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

De igual forma, el Contratista se encuentra realizando labores de instalación de pernos y perfilación del talud en el PR 12+680 y PR 12+770 del lado izquierdo.



PR 12+680 LADO IZQ



PR 12+770 LADO IZQ



16/12/2025 3:02:22

Se solicita al Contratista realizar la limpieza de las obras hidráulicas que se encuentren colmatadas, así como mantener la limpieza en las labores de instalación de mezcla asfáltica del PR 8+800 al PR 9+300.

Alberto Negrete (Profesional ambiental del contratista). Se continúa atendiendo la protección de los taludes con la malla triple torsión, pasando al talud del PR 12+600 costado izquierdo, el cual deberá quedar terminado durante esta semana antes de salir a las festividades de fin de año.

Se está a la espera que la CVS envíe la factura de la reducción de la tasa de aprovechamiento forestal, que está alrededor de los siete millones doscientos mil pesos, y así dejar cumplido todo el tema de las obligaciones con respecto a los pagos a la CVS.

Marco Oliveros (Director de interventoría). Ingeniero Alberto, te recomiendo la limpieza de las alcantarillas que están bastante colmatadas y en invierno por el volumen de agua se pueden desbordar. **Alberto Negrette (Profesional ambiental del contratista).** Ingeniero, con respecto a la alcantarilla, hoy envié el personal para atender la del K 17+000 y la del K 12+900.

5- Gestión Social. Arlenys Assias (Profesional Social Interventoría). Para esta semana tenemos un total de 148 PQR recibidas, de las cuales se encuentran cerradas 144 y abiertas 4. Durante el periodo se dio cierre a la PQR 147 de la junta de acción comunal de la vereda Jobal, con la construcción del resalto en el PR27+500. El contratista informa que los demás resaltos se realizarán entre la 3 semana de diciembre y la primera semana de enero.

En cuanto a la PQR 145, en estos momentos la propuesta que pasó el contratista para mitigar un poco la inundación del predio se encuentra en revisión por parte del especialista hidráulico del contratista. Una vez se tengan los ajustes realizados, se continuará con este proceso.

En cuanto a obras con participación comunitaria, se envió el oficio con las observaciones de la OPC de Bajo Blanco. Estamos a espera de la respuesta de estas observaciones por parte del contratista. En cuanto a la OPC de las baterías sanitarias en la zona urbana del municipio de Moñitos, el contratista propuso la entrega de la OPC a la comunidad el día 19 de diciembre.






	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1 6 de 7
		PÁGINA	
		FECHA	18/12/2025 (Día / Mes / Año)

En cuanto al programa de seguridad vial, el día 16 de diciembre se realizó el acompañamiento al contratista, quien llevó a cabo una campaña de seguridad vial orientada a promover el no uso del celular mientras se conduce. Se realizó la entrega de 300 gorras a los usuarios de la vía.



Marco Oliveros (Director de interventoría). El contratista recoge equipos el sábado y muy posiblemente las PQR que se encuentran pendientes queden para el próximo año. La idea es no dejar resaltos empezados para evitar inseguridad vial.

Rossi Rodríguez (Profesional Social contratista). Sí, precisamente le quería ampliar un poquito esa información. Los resaltos que quedaron pendientes ya se construirían en enero para no dejar ninguna actividad iniciada y por el tema de seguridad en la vía. Entonces los resaltos pendientes ya quedan para enero. Igual la instalación de la señal con el nombre de la vereda Jobal también se instalaría en enero cuando se termine de instalar el resto de señalización. La comunidad como de la vereda instalaron una señal con el nombre particular del caserío que ellos estaban solicitando, pero ellos como comunidad se unieron, compraron la señal y la instalaron hace unos días. Nosotros instalaríamos para complementar el nombre de la vereda.

En cuanto a la OPC de Moñitos, el ingeniero Jaime hizo una visita ayer al final de la tarde para verificar las condiciones técnicas en las que se encuentra. No he podido hablar con él para mirar si complementaron todo, porque la semana pasada cuando yo estuve todavía faltaban muchas cositas, entonces no sé cómo la encontró ayer y si es posible recibirla.

Marco Oliveros (Director de interventoría). Listo, Dr. Rossi, una solicitud en cuanto al resalto, pintar con amarillo y de acuerdo a lo que hablamos con el Ing. Jaime, colocar la señal vertical para efecto de avisar a los vehículos que hay un resalto. Entonces, pedimos de manera especial esa actividad.

6- Gestión SST. Johan Barrera (Profesional SST Interventoría). Contribuyendo a la solicitud que acaba de realizar al área social del contratista, sería sano que se instalara la señalización vertical de reducción de velocidad en la zona de los 2 resaltos construidos, la idea es que se aprovechara desde el área Social y SST del contratista para realizar una socialización a los actores viales de la ubicación de los pompeyanos, para evitar cualquier eventualidad por el desconocimiento. El contratista he venido realizando la actividad de pintura sobre los resaltos pompeyanos.



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-14-FR-1 VERSIÓN 1 7 de 7 PÁGINA																																																																								
		FECHA 18/12/2025 (Día / Mes / Año)																																																																								
Eukary Estrada (Profesional SST del Contratista). El día de mañana se estará realizando esa actividad de pintura, en el transcurso del día compartiré la seguridad social del personal.																																																																										
<table><tr><td>COMPROMISOS PACTADOS</td><td>FECHA DE CUMPLIMIENTO</td><td>RESPONSABLE</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE																																																																					
COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE																																																																								
FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA (Día / Mes / Año)																																																																										
NOTAS: 1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra. 2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento 3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.																																																																										
LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:																																																																										
<table><tr><td>NOMBRE DEL PARTICIPANTE</td><td>CARGO</td><td>EMPRESA / ENTIDAD</td><td>FIRMA</td></tr><tr><td>Lucas Guzmán</td><td>Apoyo técnico DT</td><td>Instituto Nacional de Vías</td><td></td></tr><tr><td>Sair Silgado</td><td>Juridico - Apoyo DT</td><td>Instituto Nacional de Vías</td><td></td></tr><tr><td>Raúl Tobaría</td><td>Gestor Jurídico Predial</td><td>Instituto Nacional de Vías</td><td></td></tr><tr><td>Marco Oliveros</td><td>Director de Interventoría</td><td>Consorcio Vial Norte</td><td></td></tr><tr><td>María Ruiz</td><td>Auxiliar Interventoría</td><td>Consorcio Vial Norte</td><td></td></tr><tr><td>Maryan Pérez</td><td>Auxiliar Interventoría</td><td>Consorcio Vial Norte</td><td></td></tr><tr><td>Jesús Pataquiva</td><td>Profesional Ambiental</td><td>Consorcio Vial Norte</td><td></td></tr><tr><td>Arlenys Assias</td><td>Profesional Social</td><td>Consorcio Vial Norte</td><td></td></tr><tr><td>Johan Barrera</td><td>Profesional SST</td><td>Consorcio Vial Norte</td><td></td></tr><tr><td>Maria victoria Mozzo</td><td>Profesional Juridico predial</td><td>Consorcio Vial Norte</td><td></td></tr><tr><td>Luis Romero</td><td>Profesional predial</td><td>Consorcio Vial Norte</td><td></td></tr><tr><td>Gonzalo Romero</td><td>Abogado Juridico Predial contratista</td><td>Consorcio Isla 066 - 2020</td><td></td></tr><tr><td>Oscar Gomez</td><td>Apoyo Area Predial contratista</td><td>Consorcio Isla 066 - 2020</td><td></td></tr><tr><td>Eukari Estrada</td><td>Profesional SST</td><td>Consorcio Isla 066 - 2020</td><td></td></tr><tr><td>Jaime Sanchez</td><td>Director de Obra</td><td>Consorcio Isla 066 - 2020</td><td></td></tr><tr><td>Rossi Rodriguez</td><td>Profesional Social</td><td>Consorcio Isla 066 - 2020</td><td></td></tr><tr><td>Alberto Negrete</td><td>Profesional Ambiental</td><td>Consorcio Isla 066 - 2020</td><td></td></tr></table>			NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA	Lucas Guzmán	Apoyo técnico DT	Instituto Nacional de Vías		Sair Silgado	Juridico - Apoyo DT	Instituto Nacional de Vías		Raúl Tobaría	Gestor Jurídico Predial	Instituto Nacional de Vías		Marco Oliveros	Director de Interventoría	Consorcio Vial Norte		María Ruiz	Auxiliar Interventoría	Consorcio Vial Norte		Maryan Pérez	Auxiliar Interventoría	Consorcio Vial Norte		Jesús Pataquiva	Profesional Ambiental	Consorcio Vial Norte		Arlenys Assias	Profesional Social	Consorcio Vial Norte		Johan Barrera	Profesional SST	Consorcio Vial Norte		Maria victoria Mozzo	Profesional Juridico predial	Consorcio Vial Norte		Luis Romero	Profesional predial	Consorcio Vial Norte		Gonzalo Romero	Abogado Juridico Predial contratista	Consorcio Isla 066 - 2020		Oscar Gomez	Apoyo Area Predial contratista	Consorcio Isla 066 - 2020		Eukari Estrada	Profesional SST	Consorcio Isla 066 - 2020		Jaime Sanchez	Director de Obra	Consorcio Isla 066 - 2020		Rossi Rodriguez	Profesional Social	Consorcio Isla 066 - 2020		Alberto Negrete	Profesional Ambiental	Consorcio Isla 066 - 2020	
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA																																																																							
Lucas Guzmán	Apoyo técnico DT	Instituto Nacional de Vías																																																																								
Sair Silgado	Juridico - Apoyo DT	Instituto Nacional de Vías																																																																								
Raúl Tobaría	Gestor Jurídico Predial	Instituto Nacional de Vías																																																																								
Marco Oliveros	Director de Interventoría	Consorcio Vial Norte																																																																								
María Ruiz	Auxiliar Interventoría	Consorcio Vial Norte																																																																								
Maryan Pérez	Auxiliar Interventoría	Consorcio Vial Norte																																																																								
Jesús Pataquiva	Profesional Ambiental	Consorcio Vial Norte																																																																								
Arlenys Assias	Profesional Social	Consorcio Vial Norte																																																																								
Johan Barrera	Profesional SST	Consorcio Vial Norte																																																																								
Maria victoria Mozzo	Profesional Juridico predial	Consorcio Vial Norte																																																																								
Luis Romero	Profesional predial	Consorcio Vial Norte																																																																								
Gonzalo Romero	Abogado Juridico Predial contratista	Consorcio Isla 066 - 2020																																																																								
Oscar Gomez	Apoyo Area Predial contratista	Consorcio Isla 066 - 2020																																																																								
Eukari Estrada	Profesional SST	Consorcio Isla 066 - 2020																																																																								
Jaime Sanchez	Director de Obra	Consorcio Isla 066 - 2020																																																																								
Rossi Rodriguez	Profesional Social	Consorcio Isla 066 - 2020																																																																								
Alberto Negrete	Profesional Ambiental	Consorcio Isla 066 - 2020																																																																								
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial																																																																										



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

• Acta de reunión

Durante el mes de diciembre de 2025 se realizaron actas de reunión del componente técnico, ambiental y predial.

Reunión #	Fecha	Componente
231	26-11-2025	Técnico
232	04-12-2025	Técnico
233	18-12-2025	Predial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	26/11/2025 (Día / Mes / Año)
--	-------	--

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 231
(La numeración será consecutiva)

Unidad Ejecutora: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 DIRECCIÓN Territorial: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 923-2021
(Indicar número de contrato y año)

Contratista: CONSORCIO ISLA 066-2020

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

CONTRATO DE Interventoría No. 1050-2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

OBJETIVOS DE LA REUNION
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA-RECORRIDO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
1 Ejecución ensayo factor de compactación del terraplén. Seguimiento	01/12/2025	Contratista - Interventoria
2 Respuesta observaciones informe de Geotecnia de la estructura de disipación del box ubicado en el K46+071 y K45+880. Se cumplió Parcialmente	26/11/2025	Interventoria
3 Check List para el cierre y entrega de 10Km (K2-K7) - (K17-K22). Seguimiento	Seguimiento	Contratista - Interventoria
4 APU Geocontenedores y presupuesto. (Propuesta de protección ante socavación de terraplén entre K28+473 a K28+520). Seguimiento	28/11/2025	Contratista
5 Revisión observaciones del informe de geotecnia del muro del K31+350. Seguimiento	26/11/2025	Contratista
6 Revisión observaciones del informe de geotecnia (46644) y estructural (46617) del muros del K41+130. No se cumplió	24/11/2025	Interventoria
8 Respuesta informe estructural muro K40+200. No se cumplió	24/11/2025	Interventoria
9 Ensayo de deformación de mezcla asfáltica. Seguimiento	28/11/2025	Contratista
10 Revisión resaltes K27+800 - K30+400 - K26 - K16. No se cumplió	25/11/2025	Contratista
11 Inspección del alineamiento de la tubería en el K12+200. No se cumplió	22/11/2025	Contratista
13 Relación de desafectaciones prediales. Seguimiento	29/11/2025	Contratista
14 Actualización del informe de consolidación de los broches del K27. Se cumplió	20/11/2025	Contratista
15 Cantidades a realizar de demarcaciones horizontales y marcas viales en el k46+500-k51+800. Seguimiento	22/11/2025	Contratista
16 Fecha de firma, radicación de APU y actas de fijación por la territorial del INVIAS. Se cumplió	21/11/2025	Interventoria

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1 Solicitud de grabación de comités técnico y de obra
2 Precios No Previstos
3 Factor de compactación terraplén.
4 Muros
5 Check List para el cierre y entrega de obras

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-14-FR-2	
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE				VERSIÓN		1	
MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA				PÁGINA			
ACTA DE REUNIÓN							
				FECHA		26/11/2025	
						(Día / Mes / Año)	
DESARROLLO DE LA REUNIÓN							
1	El contratista manifiesta que envió alcance del procedimiento en el transcurso del día con el radicado 44266 del 9/7/2025. La interventoría emitió respuesta con comunicado 3630 el 16/7/2025. El contratista envió respuesta con RADICADO 44591 el 23/7/2025. El Contratista explicó el procedimiento para el ensayo, el método implica cubicación y pesaje de la volqueta, llenado del volco con material de terraplén y enrasado de la superficie. También, se pesaría la volqueta llena y se calcularía la humedad del material, la densificación del material se realizará con base en documentos existentes, utilizando un compactador y estableciendo una cuadrícula para la toma de datos mediante nueve puntos. Se mencionó que después de compactado el material y verificado el porcentaje de compactación, se mide el volumen compactado hasta el nivel inicial del suelo. Adicionalmente, se señaló que el ensayo de próctor, que implica colocar el material en un recipiente en tres capas con 25 golpes, es fundamental para determinar las masas unitarias y el factor de compactación, y que este proceso es normativo para encontrar la densidad a granel del material. Se acordará con la topografía la revisión para la pista y ejecución del ensayo a la mayor brevedad. Se realizó el ensayo del proctor en conjunto, pendiente el ensayo en campo. El contratista informa que se encuentra liberado el predio del PR 13+500 (ZODME), donde se realizará ensayo y que además lo equipos los tiene realizando el mantenimiento al corredor, el contratista manifiesta que, una vez se termine esta actividad, se procede con el ensayo. La interventoría indica que el material tiene que ser el mismo utilizado en su momento y el cual ya se realizó el ensayo de proctor						
2	El informe estructural de la estructura de disipación de los Box del K46+071 y K45+880 aún está pendiente la información de geotecnia y estructural por parte del contratista. La Interventoría enfatizó la importancia de definir esto a la mayor brevedad para determinar qué obras se pueden completar dentro del plazo, sobre todo establecer si estas obras se van ejecutar para efecto de incluirla en el presupuesto final. El contratista informa que envió oficio con radicado 44972 el 14/8/2025 de la parte estructural y la Interventoría emitió respuesta con radicado 325542 (3740) el 25/8/2025. El contratista envió respuesta a las observaciones del informe de Geotecnia con radicado 45178 el 26/8/2025. La interventoría responde con radicado 327397 (3775) el 8/9/2025 adjuntando el informe de la especialista indicando la no aprobación del informe presentado por el Consorcio Isla-066-2020. El contratista respondió con el radicado 46451 del 8 de noviembre, interventoría indica que se tendrá respuesta por parte de la especialista de geotecnia antes del 26 de noviembre-25. Interventoría dió respuesta el 24/11/2025 con el comunicado 3953, se aprobó el Box Culvert del K45+880, el contratista da fecha del 19/12/2025 para dar respuesta a las observaciones del Box Culvert del K46+071.						
3	El contratista enviará el Inventario de obras parcial para facilitar el recorrido del cierre y entrega de 10Km (K2-K7) - (K17-K22). Con respecto al cierre y entrega la interventoría manifiesta que envió un oficio indicando que a partir del 14 de noviembre-25 los pares de cada área (social, predial, ambiental,técnico), la idea es que se reúna y se pongan de acuerdo y avance de manera ágil para el cierre del contrato en cumplimiento con el Manual de interventoría						
4	La interventoría informa que su especialista hidráulico envió observaciones con "Radicado 314275 - 49980-CE-3425" para la propuesta de protección ante socavación de terraplén entre K28+473 a K28+520, las cuales se encuentran en revisión por parte del contratista. Pendiente por parte del contratista dar respuesta a las observaciones emitidas por el especialista hidráulico de la interventoría y enviar esquema final. La Interventoría considera que se genere presupuesto. El contratista requirió topografía. Se estableció un presupuesto aproximado de 48 millones de pesos para esta obra, aunque se esperará la revisión del especialista hidráulico para obtener una guía más precisa y un presupuesto final. El especialista hidráulico del contratista ya entregó el informe, El contratista manifiesta que envió respuesta con radicado 45675 el 23/9/2025. La interventoría respondió con el comunicado 49980-CE-3849 (07-10-2025). El contratista dió respuesta con RADICADO 46021 el 10/10/2025. La Interventoría emitió comunicado final con RADICADO 332112-49980-CE-3879. Con base en esto, el contratista deberá entregar un Análisis de precios Unitarios de los insumos no previstos en la actividad aprobada por la Interventoría y estimar cantidades de obra para elaborar presupuesto. El contratista menciona que están trabajando en la cotización y Subrayó la necesidad de aprovechar el clima seco para avanzar en estas obras, especialmente en el K28+500, antes de la temporada de lluvias.						
5	En atención al oficio 3693 del 08 de agosto de 2025 emitido por la interventoría, el contratista remitió el comunicado 45287 el 01 de septiembre de 2025, dando respuesta a las observaciones geotécnicas sobre el diseño del muro en el PR31+350. La interventoría informa que emitió respuesta al informe de geotecnia con radicado 3812 del 17/9/2025. La interventoría envió respuesta con radicado CE_3772 con atención a las observaciones de geotecnia del muro K41+130. El contratista manifiesta que emitió respuesta con RADICADO 46271 correspondiente al informe de geotecnia del muro K31+350. La interventoría dio respuesta con el radicado 333961(49980-CE-3924), esta pendiente la respuesta por parte del contratista. La interventoría indica que es importante continuar con el seguimiento topográfica del sector del PR31+350, y que, de no ejecutarse el muro se deben realizar obras provisionales con el fin de mitigar futuras remociones en este punto, que de acuerdo lo manifestado por el contratista los controles topográficos demuestran que se han tenido leves movimientos.						
6	El contratista que envió con el comunicado 46644 que responde el oficio 3772 (05-09-20 de la interventoría referente a las observaciones de las notas técnicas de geotecnia del muro del PR41+130. pendiente respuesta por la interventoría.						
7	El Ing Lucas manifestó en el comité 220 que el muro del K40+200 debe construirse obligatoriamente, independientemente de la disponibilidad de fondos. la Ing Giovanna solicita se les ordene por escrito para la construcción del muro ya que la obra no puede quedar inconclusa y deben responder los tres involucrados: La interventoría, el INVIAS y el Contratista. La interventoría reitera que estas decisiones ya habían sido discutidas en reuniones anteriores y quedarán registradas en el acta. Pendiente respuesta de la Interventoría al Radicado 45438 del 8/9/2025 enviado por el Contratista del informe en geotecnia. El contratista envió informe estructural con radicado 45440 el 8/9/2025. La interventoría emitió respuesta con radicado 328267 (3802) el 15/9/2025. El contratista envió respuesta con radicado 45890 del 2/10/2024. La interventoría emitió respuesta con radicado 330429 - 49980-CE-3843 el 6/10/2025. De acuerdo lo indicado por el residente ambiental del contratista en el sector del PR40+200, se requieren talar 8 árboles estos, dos ejemplares, no incluidos en el inventario inicial, demandan un permiso de la CVS debido a ajustes en el diseño. Se solicitó visita de la CVS para el permiso de tala. La interventoría solicita un informe de esta situación. El INVIAS solicita se realice mesa de trabajo conjunta con los especialistas para definir el tema del muro del K40+200 lo mas pronto posible. Se reitera la necesidad de la entrega de los diseños para revisión e inicio a la mayor brevedad de la construcción. El contratista manifiesta que envió respuesta al informe de geotecnia con RADICADO 46364 y se encuentra pendiente la respuesta del informe estructural. La Interventoría dio respuesta el 20 de noviembre con comunicado 49980-CE-3942 en donde da la aprobación por parte de geotecnia. El Contratista radicará hoy 19/11/2025 la respuesta estructural con radicado 46642, Interventoría manifiesta que una vez recibido se enviará a nuestro especialista en estructuras.						
8	Se encuentra pendiente el envío del ensayo de deformación por parte del contratista, de la mezcla asfáltica, requisito indispensable para la aprobación del MDC-19 para bacheo.						
9	El contratista informa que envió comunicado con RADICADO 46417, dando alcance a RADICADO 46336 RESPUESTA A RADICADO 332774 COMUNICADO 49980-CE-3897 SEÑALIZACIÓN VIAL - APREMIO indicando que este ajuste implica la modificación de la señalización vertical, sumando señalización y cambiando algunas secciones a doble línea, ya que no se permite adelantar con resaltes. La Interventoría dio respuesta con el radicado 333506 (49980-CE-3932), esta pendiente la respuesta por parte del Contratista.						
10	El contratista manifiesta que se encuentra pendiente por enviar al personal a cursos de alturas y de espacios confinados para poder realizar la inspección del alineamiento de la tubería en el K12+200 que parece estar desalineada en sus extremos/interior, lo que podría afectar el flujo de agua y la funcionabilidad de la misma. La actividad se programa para el día 04/12/2025						
11	El contratista socializa los valores aproximados de la bolsa social, ambiental y predial, de los cuales ambiental sobrarian 86 millones, social sobran 61 millones, y de la bolsa predial faltarían cerca de 200 millones. En principio se considera que se debe realizar la OPC de Bajo Blanco. También se mencionó que se aceptó la compensación de 100 árboles para el permiso de ocupación de cauce y se requiere un informe final para cerrar el expediente. El costo del informe final será de 10 millones de pesos, lo que modificaría el balance de inversión para el área ambiental. El contratista explicó que cerrar los permisos ambientales este año es crucial para evitar un año adicional de seguimiento y un gasto de alrededor de 18 millones de pesos. Si se cierra el permiso y más adelante se necesita intervenir obras con cauce, se requeriría un nuevo permiso y una nueva compensación. El contratista mencionó que el trámite de cierre de permisos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal podría durar hasta tres meses, y el de aprovechamiento forestal podría demorarse más debido a la ley de garantías y la posible falta de personal el próximo semestre. Se decidió que se modificará la inversión para mover los 10 millones para el informe final y solicitar la contratación del profesional para iniciar el proceso de cierre en la CVS en diciembre-25						
12	El Contratista aclaró que el Box ubicado en el K46+061 y el Box K45+880, que requieren intervención, no necesitan permiso de cauce porque son aguas de escorrentía intermitente. También se discutió una propuesta para alinear un canal en el K23+900 para la obra de arte, que requiere la aprobación del hidráulico para la actividad.						
	El contratista enviará actualización del informe de consolidación de los broches del K25 y del K27. El Contratista radico el informe de consolidación del K25+700 el día 11/11/2015 con radicado 46511, la Interventoría dio respuesta el 20/11/2025 con radicado 334513 (39980-CE-3934). Esta pendiente el envío por parte del contratista el informe del K27+135. El contratista envió el informe el día 20/11/2025 el informe de consolidación del K27+135. Interventoría dió aprobación el día 24/11/2025 para poder construir el pavimento en el K27+135						

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA		26/11/2025
		(Día / Mes / Año)

13	El contratista iniciará con la marcación por topografía para la renivelación en los tramos de MR. El contratista informó que ya tienen la aprobación para la marcación por topografía para la renivelación en los tramos de MR, por lo que informa que se definió un plan de trabajo de tres semanas alternando la nivelación y la aplicación de Granocaucho.
14	La Interventoría solicita se les envíe la relación de las desafectaciones prediales, que de acuerdo lo informado por los profesionales prediales estos requieren que se entreguen el informe técnico, por el cual se determinó la condición de predios desafectados. La Interventoría dio respuesta mediante el radicado 333939 (49980-CE-3923), esta pendiente la respuesta por parte del contratista.
15	Se realizará un recorrido en conjunto en el sector del PR41+900 para identificar la necesidad de instalación de defensas metálicas, considerando la presencia de alturas de talud con respecto a la vía. Esto permitirá al contratista realizar los pedidos correspondientes a sus proveedores para el cierre de año. Se realizó recorrido el día 12/11/2025.
16	La Ingeniera Giovanna Espinel preguntó sobre el estado del Acta No.218, que es crucial porque, según lo discutido, establece la orden del INVIAS para trabajar en ciertos tramos, específicamente los tramos leves y moderados de MR y enfatizó que sin un documento firmado por el INVIAS, tanto el contratista como la Interventoría corren un riesgo contractual y aclaró que el Acta No.218 era para corroborar el informe de Geoterra y que no está suscrita por el INVIAS. Ambas partes acordaron que el INVIAS debe avalar las alternativas sugeridas en el informe para dar inicio a las obras. La Interventoría manifiesta que solicitará el acta firmada.
17	Ante el aumento del flujo vehicular para la temporada de fin de año, El INVIAS Territorial, solicita reforzar la señalización horizontal en el tramo comprendido entre el PR46+500 y el PR51+000. Especialmente en la aplicación de pintura para las líneas de demarcación, y se estaría llevando a cabo una vez finalice labores de mantenimiento de parcheo por parte de otro contratista. Mientras el Consorcio Isla pasará un presupuesto de estas actividades el 04/12/2025
18	La interventoría solicita al contratista revisar y atender el sitio del PR43+630 el cual se continúan presentando socavación por el costado izquierdo, aprovechando que se tiene personal trabajando en la erosión presentada en el PR43+530, es importante adecuar descoles para que continúe esta situación. El contratista manifiesta que revisará lo solicitado por la interventoría.
19	La Ing. Giovanna solicita a la Interventoría fecha de firma, radicación de APU y actas de fijación por la territorial del INVIAS. (ver compromiso pactados). La interventoría envió para aprobación al Invias el 21/11/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

		FECHA	26/11/2025 (Día / Mes / Año)
--	--	-------	--




COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
1 1 Ejecución ensayo factor de compactación del terraplén.	15/12/2025	Contratista - Interventoria
2 2 Respuesta observaciones informe de Geotecnia de la estructura del box ubicado en el K46+071.	19/12/2025	Contratista
3 3 Check List para el cierre y entrega de 10Km (K2-K7) - (K17-K22).	Seguimiento	Contratista - Interventoria
4 4 APU Geocontenedores y presupuesto. (Propuesta de protección ante socavación de terraplén entre K28+473 a K28+520)	19/12/2025	Contratista
5 5 Revisión observaciones del informe de geotecnia del muro del K31+350.	29/11/2025	Contratista
6 6 Revisión observaciones del informe de geotecnia (46644) del muro del K41+130	04/12/2025	Interventoria
6 6 Revisión observaciones del informe estructural (46617) del muro del K41+130	04/12/2025	Interventoria
8 8 Respuesta informe estructural muro K40+200.	29/11/2025	Interventoria
9 9 Ensayo de deformación de mezcla asfáltica.	19/12/2025	Contratista
10 10 Revisión resaltos K27+800 - K30+400 - K26 - K16.	01/12/2025	Contratista
11 11 Inspección del alineamiento de la tubería en el K12+200.	04/12/2025	Contratista
13 13 Relación de desafectaciones prediales.	29/11/2025	Contratista
15 15 Cantidades a realizar de demarcaciones horizontales y marcas viales en el k46+500-k51+000	04/12/2025	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN	26/11/2025 (Día / Mes / Año)
-----------------------	--

NOTAS:

- Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / Entidad	FIRMA
NESTOR LEMUS	DIRECTOR	TERRITORIAL CORDOBA	
ELLEN OBEIMAR AICARDY	SUPERVISOR	TERRITORIAL CORDOBA	
LUCAS GUZMAN	INGENIERO APOYO	TERRITORIAL CORDOBA	
AMAURY GUZMAN VIDAL	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL NORTE	
MARIAN PEREZ ROJAS	AUXILIAR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL NORTE	Maryan Catheryne Pérez Rojas
GIOVANNA ESPINEL	COORDINADORA CONTRACTUAL	CONSORCIO ISLA 066-2020	
JAIME SANCHEZ MENESES	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO ISLA 066-2020	
BRYAN BABILONIA GUZMAN	AUXILIAR DE INGENIERIA	CONSORCIO ISLA 066-2020	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	04/12/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 232
(La numeración será consecutiva)

Unidad Ejecutora: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 DIRECCIÓN Territorial: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 923-2021
(Indicar número de contrato y año)

Contratista: CONSORCIO ISLA 066-2020

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

CONTRATO DE Interventoría No. 1050-2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

OBJETIVOS DE LA REUNION
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA-RECORRIDO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS		
COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
1 Ejecución ensayo factor de compactación del terraplén. Seguimiento	15/12/2025	Contratista - Interventoria
2 Respuesta observaciones informe de Geotecnia de la estructura del box ubicado en el K46+071. Seguimiento	19/12/2025	Contratista
3 Check List para el cierre y entrega de 10Km (K2-K7) - (K17-K22). Seguimiento	Seguimiento	Contratista - Interventoria
4 APU Geocontenedores y presupuesto. (Propuesta de protección ante socavación de terraplén entre K28+473 a K28+520). Seguimiento	19/12/2025	Contratista
5 Revisión observaciones del informe de geotecnia del muro del K31+350. Se cumple	29/11/2025	Contratista
6 Revisión observaciones del informe de geotecnia (46644) del muros del K41+130. Se cumple	04/12/2025	Interventoria
6 Revisión observaciones del informe estructural (46617) del muros del K41+130. Se cumple	04/12/2025	Interventoria
7 Respuesta informe estructural muro K40+200. Se cumple	29/11/2025	Interventoria
8 Ensayo de deformación de mezcla asfáltica. Seguimiento	19/12/2025	Contratista
9 Revisión resaltes K27+800 - K30+400 - K26 - K16. Se cumple	01/12/2025	Contratista
10 Inspección del alineamiento de la tubería en el K12+200. Se cumple	04/12/2025	Contratista
11 Relación de desafectaciones prediales. Se cumple	29/11/2025	Contratista
12 Cantidades a realizar de demarcaciones horizontales y marcas viales en el k46+500-k51+800. No se cumple	04/12/2025	Contratista

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN	
1	Solicitud de grabación de comités técnico y de obra
2	Precios No Previstos
3	Factor de compactación terraplén.
4	Muros
5	Check List para el cierre y entrega de obras

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	04/12/2025 (Día / Mes / Año)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-14-FR-2 VERSIÓN 1 PÁGINA	MEPI-MN1-IN-14-FR-2 1
		FECHA	04/12/2025 (Día / Mes / Año)
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
1	El contratista manifiesta que envió alcance del procedimiento en el transcurso del día con el radicado 44266 del 9/7/2025. La interventoría emitió respuesta con comunicado 3630 el 16/7/2025. El contratista envió respuesta con RADICADO 44591 el 23/7/2025. El Contratista explicó el procedimiento para el ensayo, el método implica cubicación y pesaje de la volqueta, llenado del volco con material de terraplén y enrasado de la superficie. También, se pasaría la volqueta llena y se calcularía la humedad del material, la densificación del material se realizará con base en documentos existentes, utilizando un compactador y estableciendo una cuadrícula para la toma de datos mediante nueve puntos. Se mencionó que después de compactado el material y verificado el porcentaje de compactación, se mide el volumen compactado hasta el nivel inicial del suelo. Adicionalmente, se señaló que el ensayo de próctor, que implica colocar el material en un recipiente en tres capas con 25 golpes, es fundamental para determinar las masas unitarias y el factor de compactación, y que este proceso es normativo para encontrar la densidad a granel del material. Se acordará con la topografía la revisión para la pista y ejecución del ensayo a la mayor brevedad. Se realizó el ensayo del próctor en conjunto, pendiente el ensayo en campo. El contratista informa que se encuentra liberado el predio del PR 13+500 (ZODME), donde se realizará ensayo y que además lo equipos los tiene realizando el mantenimiento al corredor, el contratista manifiesta que, una vez se termine esta actividad, se procede con el ensayo. La interventoría indica que el material tiene que ser el mismo utilizado en su momento y el cual ya se realizó el ensayo de próctor		
2	El informe estructural de la estructura de disipación de los Box del K46+071 y K45+880 aún está pendiente la información de geotecnia y estructural por parte del contratista. La Interventoría enfatizó la importancia de definir esto a la mayor brevedad para determinar qué obras se pueden completar dentro del plazo, sobre todo establecer si estas obras se van ejecutar para efecto de incluirla en el presupuesto final. El contratista informa que envió oficio con radicado 44972 el 14/8/2025 de la parte estructural y la Interventoría emitió respuesta con radicado 325542 (3740) el 25/8/2025. El contratista envió respuesta a las observaciones del informe de Geotecnia con radicado 45178 el 26/8/2025. La interventoría responde con radicado 327397 (3775) el 8/9/2025 adjuntando el informe de la especialista indicando la no aprobación del informe presentado por el Consorcio Isla-066-2020. El contratista respondió con el radicado 46451 del 8 de noviembre, interventoría indica que se tendrá respuesta por parte de la especialista de geotecnia antes del 26 de noviembre-25. Interventoría dió respuesta el 24/11/2025 con el comunicado 3953, se aprobó el Box Culvert del K45+880, el contratista da fecha del 19/12/2025 para dar respuesta a las observaciones del Box Culvert del K46+071.		
3	El contratista enviará el Inventario de obras parcial para facilitar el recorrido del cierre y entrega de 10Km (K2-K7) - (K17-K22). Con respecto al cierre y entrega la interventoría manifiesta que envió un oficio indicando que a partir del 14 de noviembre-25 los pares de cada área (social, predial, ambiental, técnico), la idea es que se reúna y se pongan de acuerdo y avance de manera ágil para el cierre del contrato en cumplimiento con el Manual de interventoría		
4	La interventoría informa que su especialista hidráulico envió observaciones con "Radicado 314275 - 49980-CE-3425" para la propuesta de protección ante socavación de terraplén entre K28+473 a K28+520, las cuales se encuentran en revisión por parte del contratista. Pendiente por parte del contratista dar respuesta a las observaciones emitidas por el especialista hidráulico de la interventoría y enviar esquema final. La Interventoría considera que se genere presupuesto. El contratista requirió topografía. Se estableció un presupuesto aproximado de 48 millones de pesos para esta obra, aunque se esperará la revisión del especialista hidráulico para obtener una guía más precisa y un presupuesto final. El especialista hidráulico del contratista ya entregó el informe, El contratista manifiesta que envió respuesta con radicado 45675 el 23/9/2025. La interventoría respondió con el comunicado 49980-CE-3849 (07-10-2025). El contratista dió respuesta con RADICADO 46021 el 10/10/2025. La Interventoría emitió comunicado final con RADICADO 332112-49980-CE-3879, Con base en esto, el contratista deberá entregar un Análisis de precios Unitarios de los insumos no previstos en la actividad aprobada por la Interventoría y estimar cantidades de obra para elaborar presupuesto. El contratista menciona que están trabajando en la cotización y Subrayó la necesidad de aprovechar el clima seco para avanzar en estas obras, especialmente en el K28+500, antes de la temporada de lluvias. El contratista informa que aún está elaborando el APU-NP, pero ha encontrado dificultades para obtener cotizaciones de los geocontenedores debido a que es un material poco común. La interventoría insiste en que se presente una alternativa que se encuentre dentro del alcance del proyecto y que utilice materiales de fácil adquisición.		
5	En atención al oficio 3693 del 08 de agosto de 2025 emitido por la interventoría, el contratista remitió el comunicado 45287 el 01 de septiembre de 2025, dando respuesta a las observaciones geotécnicas sobre el diseño del muro en el PR31+350. La interventoría informa que emitió respuesta al informe de geotecnia con radicado 3812 del 17/9/2025. La interventoría envió respuesta con radicado CE_3772 con atención a las observaciones de geotecnia del muro K41+130. El contratista manifiesta que emitió respuesta con RADICADO 46271 correspondiente al informe de geotecnia del muro K31+350. La interventoría dió respuesta con el radicado 333961 (49980-CE-3924), esta pendiente la respuesta por parte del contratista. El contratista dió respuesta el día 29/11/2025 (46831), se encuentra pendiente la respuesta de la Interventoría. La interventoría indica que es importante continuar con el seguimiento topográfico del sector del PR31+350, y que, de no ejecutarse el muro se deben realizar obras provisionales con el fin de mitigar futuras remociones en este punto, que de acuerdo lo manifestado por el contratista los controles topográficos demuestran que se han tenido leves movimientos.		
6	El contratista manifiesta que envió con el comunicado 46644 responde el oficio 3772 (05-09-20 de la interventoría referente a las observaciones de las notas técnicas de geotecnia del muro del PR41+130. La interventoría dió respuesta el día 04/12/2025 con el Radicado 336373 (49980-CE-3971), esta pendiente respuesta del contratista		
7	El Ing Lucena manifestó en el comité 220 que el muro del K40+200 debe construirse obligatoriamente, independientemente de la disponibilidad de fondos. La Ing Giovanna solicita se les ordene por escrito para la construcción del muro ya que la obra no puede quedar inconclusa y deben responder los tres involucrados: La interventoría, el INVIAS y el Contratista. La interventoría reitera que estas decisiones ya habían sido discutidas en reuniones anteriores y quedarán registradas en el acta. Pendiente respuesta de la Interventoría al Radicado 45438 del 8/9/2025 enviado por el Contratista del informe en geotecnia. El contratista envió informe estructural con radicado 45440 el 8/9/2025. La interventoría emitió respuesta con radicado 328267 (3802) el 15/9/2025. El contratista envió respuesta con radicado 45890 del 2/10/2024. La interventoría emitió respuesta con radicado 330429 - 49980-CE-3843 el 6/10/2025. De acuerdo lo indicado por el residente ambiental del contratista en el sector del PR40+200, se requieren talar 8 árboles estos, dos ejemplares, no incluidos en el inventario inicial, demandan un permiso de la CVS debido a ajustes en el diseño. Se solicitó visita de la CVS para el permiso de tala. La interventoría solicita un informe de esta situación. El INVIAS solicita se realice mesa de trabajo conjunta con los especialistas para definir el tema del muro del K40+200 lo mas pronto posible. Se reitera la necesidad de la entrega de los diseños para revisión e inicio a la mayor brevedad de la construcción. El contratista manifiesta que envió respuesta al informe de geotecnia con RADICADO 46364 y se encuentra pendiente la respuesta del informe estructural. La Interventoría dió respuesta el 20 de noviembre con comunicado 49980-CE-3942 en donde da la aprobación por parte de geotecnia. El Contratista radicó 19/11/2025 la respuesta estructural con radicado 46642, Interventoría manifiesta que se dió respuesta con el comunicado 3970 del 27 de noviembre del 2025.		
	Se encuentra pendiente el envío del ensayo de deformación por parte del contratista, de la mezcla asfáltica, requisito indispensable para la aprobación del MDC-19 para bacheo.		
8	El contratista informa que envió comunicado con RADICADO 46417, dando alcance a RADICADO 46336 RESPUESTA A RADICADO 332774 COMUNICADO 49980-CE-3897 SEÑALIZACIÓN VIAL - APREMIO indicando que este ajuste implica la modificación de la señalización vertical, sumando señalización y cambiando algunas secciones a doble línea, ya que no se permite adelantar con resaltes. La Interventoría dió respuesta con el radicado 333506 (49980-CE-3932), esta pendiente la respuesta por parte del Contratista.		
9	El contratista manifiesta que se encuentra pendiente por enviar al personal a cursos de alturas y de espacios confinados para poder realizar la inspección del alineamiento de la tubería en el K12+200 que parece estar desalineada en sus extremos/interior, lo que podría afectar el flujo de agua y la funcionabilidad de la misma. La actividad se programa para el día 04/12/2025		
10	El contratista socializa los valores aproximados de la bolsa social, ambiental y predial, de los cuales ambiental sobrarían 86 millones, social sobran 61 millones, y de la bolsa predial faltarían cerca de 200 millones. En principio se considera que se debe realizar la OPC de Bajo Blanco. También se mencionó que se aceptó la compensación de 100 árboles para el permiso de ocupación de cauce y se requiere un informe final para cerrar el expediente. El costo del informe final será de 10 millones de pesos, lo que modificaría el balance de inversión para el área ambiental. El contratista explicó que cerrar los permisos ambientales este año es crucial para evitar un año adicional de seguimiento y un gasto de alrededor de 18 millones de pesos. Si se cierra el permiso y más adelante se necesita intervenir obras con cauce, se requeriría un nuevo permiso y una nueva compensación. El contratista mencionó que el trámite de cierre de permisos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal podría durar hasta tres meses, y el de aprovechamiento forestal podría demorarse más debido a la ley de garantías y la posible falta de personal el próximo semestre. Se decidió que se modificará la inversión para mover los 10 millones para el informe final y solicitar la contratación del profesional para iniciar el proceso de cierre en la CVS en diciembre-25		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA		04/12/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

11	El Contratista aclaró que el Box ubicado en el K46+061 y el Box K45+880, que requieren intervención, no necesitan permiso de cauce porque son aguas de escorrentía intermitente. También se discutió una propuesta para alinear un canal en el K23+900 para la obra de arte, que requiere la aprobación del hidráulico para la actividad.
12	El contratista enviará actualización del informe de consolidación de los broches del K25 y del K27. El Contratista radico el informe de consolidación del K25+700 el día 11/11/2015 con radicado 46511, la Interventoría dio respuesta el 20/11/2025 con radicado 334513 (39980-CE-3934). Esta pendiente el envío por parte del contratista el informe del K27+135. El contratista envió el informe el día 20/11/2025 el informe de consolidación del K27+135. Interventoría dió aprobación el día 24/11/2025 para poder construir el pavimento en el K27+135
13	El contratista iniciará con la marcación por topografía para la renivelación en los tramos de MR. El contratista informó que ya tienen la aprobación para la marcación por topografía para la renivelación en los tramos de MR, por lo que informa que se definió un plan de trabajo de tres semanas alternando la nivelación y la aplicación de Granocaucho.
14	La Interventoría solicita se les envíe la relación de las desafectaciones prediales, que de acuerdo lo informado por los profesionales prediales estos requieren que se entreguen el informe técnico, por el cual se determinó la condición de predios desafectados. La Interventoría dio respuesta mediante el radicado 333939 (49980-CE-3923), esta pendiente la respuesta por parte del contratista. El contratista dio respuesta el día 27/11/2025 con el Radicado 46798, esta pendiente respuesta de interventoría
15	Se realizará un recorrido en conjunto en el sector del PR41+900 para identificar la necesidad de instalación de defensas metálicas, considerando la presencia de alturas de talud con respecto a la vía. Esto permitirá al contratista realizar los pedidos correspondientes a sus proveedores para el cierre de año. Se realizó recorrido el día 12/11/2025.
16	La Ingeniera Giovanna Espinel preguntó sobre el estado del Acta No.218, que es crucial porque, según lo discutido, establece la orden del INVIAS para trabajar en ciertos tramos, específicamente los tramos leves y moderados de MR y enfatizó que sin un documento firmado por el INVIAS, tanto el contratista como la Interventoría corren un riesgo contractual y aclaró que el Acta No.218 era para corroborar el informe de Geoterra y que no está suscrita por el INVIAS. Ambas partes acordaron que el INVIAS debe avalar las alternativas sugeridas en el informe para dar inicio a las obras. La Interventoría manifiesta que solicitara nuevamente el acta firmada.
	Ante el aumento del flujo vehicular para la temporada de fin de año, El INVIAS Territorial, solicita reforzar la señalización horizontal en el tramo comprendido entre el PR46+500 y el PR51+000. Especialmente en la aplicación de pintura para las líneas de demarcación, y se estaría llevando a cabo una vez finalice labores de mantenimiento de parcheo por parte de otro contratista. Mientras el Consorcio Isla pasará un presupuesto de estas actividades el 04/12/2025
18	La interventoría solicita al contratista revisar y atender el sitio del PR43+630 el cual se continuan presentando socavación por el costado izquierdo, aprovechando que se tiene personal trabajando en la erosión presentada en el PR43+530, es importante adecuar descoles para que conitue esta situación. El contratista manifiesta que revisará lo solicitado por la interventoría.
19	La Ing. Giovanna solicita a la Interventoría fecha de firma, radicación de APU y actas de fijación por la territorial del INVIAS. (ver compromiso pactados). La interventoría envió para aprobación al Invias el 21/11/2025
	Interventoria solicita de manera atenta que las actividades de mezcla asfáltica se realicen en horarios diurno y se notifique cualquier novedad. Así mismo la interventoria solicita la recopilación y toma de muestras de la mezcla, hacerla de maneras conjuntas (muestras testigos) de acuerdo a las especificaciones del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE Interventoría OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	04/12/2025 (Día / Mes / Año)
--	-------	--




COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
1 Ejecución ensayo factor de compactación del terraplén.	15/12/2025	Contratista - Interventoria
2 Check List para el cierre y entrega de 10Km (K2-K7) - (K17-K22).	Seguimiento	Contratista - Interventoria
3 APU Geocontenedores y presupuesto. (Propuesta de protección ante socavación de terraplén entre K28+473 a K28+520).	19/12/2025	Contratista
5 Revisión observaciones del informe de geotecnia del muro del K31+350.	12/12/2025	Interventoria
7 Revisión observaciones del informe de geotecnia (336445-49980-CE-3985) del muro del K41+130.	19/12/2025	Contratista
8 Respuesta al radicado 335810-49980 -CE- 3970 informe estructural muro K40+200.	11/12/2025	Contratista
9 Ensayo de deformación de mezcla asfáltica.	19/12/2025	Contratista
10 Revisión resaltes K27+800 - K30+400 - K26 - K16.	08/12/2025	Interventoria
11 Relación de desafectaciones prediales (dar respuesta al radicado 46798).	11/12/2025	Interventoria
12 Cantidades a realizar de demarcaciones horizontales y marcas viales en el K46+500-K51+800.	12/12/2025	Contratista
13 Dar respuesta a la propuesta de alternativa profunda de los sectores críticos (radicado 46768)	12/12/2025	Interventoria
14 Propuesta de alternativa funcionales o tramos de pruebas de los sectores críticos	11/12/2025	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

- Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / Entidad	FIRMA
ELLEN OBEIMAR AICARDY	SUPERVISOR	TERRITORIAL CORDOBA	
LUCAS GUZMAN	INGENIERO APOYO	TERRITORIAL CORDOBA	
MARCO AURELIO OLIVEROS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL NORTE	
AMAURY GUZMAN VIDAL	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL NORTE	
GIOVANNA ESPINEL	COORDINADORA CONTRACTUAL	CONSORCIO ISLA 066-2020	
JAIME SANCHEZ MENESES	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO ISLA 066-2020	
BRYAN BABILONIA GUZMAN	AUXILIAR DE INGENIERIA	CONSORCIO ISLA 066-2020	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

18/12/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 233
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 923-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA - MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1050-2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar la verificación técnica predial de la Preacta Predial No. 55.

Dejar constancia formal del visto de no objeción por parte de INVIAS, a través de la presente mesa de trabajo, ante la imposibilidad de emitir oficio formal debido al ataque cibernético sufrido por la entidad el 10/12/2025.

Revisar los soportes de gestión predial y los pagos realizados a propietarios y terceros autorizados.

Definir el procedimiento para la radicación, firma y trazabilidad de la Preacta Predial No. 55.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Revisión integral de la Preacta Predial No. 55.

Validación de los trámites de gestión predial cobrados, incluyendo inscripción de oferta, enajenación voluntaria, gestión catastral y compraventa de mejoras.

Verificación de los soportes de pago a propietarios y terceros autorizados.

Revisión de valores, predios, tramos y correspondencia con los formatos prediales.

Definición del mecanismo de no objeción mediante acta de reunión, considerando la contingencia tecnológica de INVIAS.

Procedimiento de radicación por correo electrónico, firmas y cierre del proceso.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 18/12/2025
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En mesa de trabajo realizada el 18 de diciembre de 2025, con participación del contratista, la interventoría y el profesional técnico predial de INVIAS, se efectuó la revisión detallada de la Preacta Predial No. 55.

Durante la sesión, el contratista expuso los ocho (8) trámites de gestión predial incluidos en la preacta, entre los cuales se encuentran: inscripción de oferta de compra, pago por enajenación voluntaria, gestión ante catastro descentralizado, compraventa y legalización de mejoras, actas de entrega de predios y pagos de mejoras.

La interventoría presentó los soportes documentales y financieros, verificando valores, predios, tramos y beneficiarios de los pagos, incluyendo los casos de autorización de pago a terceros, los cuales fueron debidamente justificados y soportados.

El profesional técnico predial de INVIAS revisó la información presentada, confirmando que los valores y soportes coinciden, y que no se evidencian duplicidades en los cobros realizados, quedando claridad sobre la relación de insumos cobrados en la Preacta Predial No. 55.

Se dejó constancia de que, debido al ataque cibernético sufrido por INVIAS el 10 de diciembre de 2025, no ha sido posible emitir radicado ni oficio formal; por lo tanto, se acuerda que el visto de no objeción quede soportado mediante la presente acta de reunión.

Finalmente, se definió que la Preacta Predial No. 55 será radicada por correo electrónico, con todos los documentos y firmas requeridas, garantizando la trazabilidad del proceso y permitiendo su inclusión en el Acta de Obra No. 55.

VALORES DE LA PREACTA PREDIAL No 55

VALOR TOTAL BÁSICO DE LA PREACTA \$134.168.800

VALOR IVA PREACTA \$942.465

VALOR TOTAL PREACTA PREDIAL No 55 \$ 135.111.265

OBSERVACIÓN:

Se da visto de No Objeción a la presente pre acta, sin embargo, se evidencia que estan mal calculados los valores de los costos asdministrativos, generando inconsistencias en los demas valores. Motivo por el cual para la siguiente pre acta "No. 56" se dede realizar los respectivos ajustes y descontar la diferencia que se evidencia, esta por encima del valor del la presente pre acta. Sino se realiza el descuento, la siguiente pre acta sera objeto de rechazo y no aprobación por parte de la entidad.

NOTAS:

- Las cantidades y valores consignados en la presente Pre-acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
- El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad el Contratista.
- Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en presente Pre-acta, no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
- El Numero de la presente Pre-acta debe coincidir con el número del acta de recibo parcial de obra correspondiente.
- La pre acta debe contar con todos los soportes que se relacionan en la misma, de lo contrario, es objeto de objeción.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	18/12/2025 (Día / Mes / Año)
COMPROMISOS PACTADOS		FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
Radicar la Preacta Predial No. 55 y el acta de la mesa de trabajo mediante correo electrónico para garantizar la trazabilidad.		18/12/2025	Contratista
Remitir a las partes el soporte del ataque cibernético como justificación de la no emisión de oficio formal.		18/12/2025	INVIAS
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN (Día / Mes / Año)			
NOTAS:			
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.			
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.			
LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:			
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Cristian Camilo Camargo Tuta	Profesional Técnico Predial	INVIAS	
Pablo Andrés Piedrahita Manrique	Profesional Predial	Contratista	
Luis Ariel Romero Palacio	Profesional Tecnico Predial	Interventoría	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial			



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información General del Contrato

Proceso de selección N°: CMA-DT-191-2020

ID SECOP: CO1.PCCNTR.2427741

Contrato de obra N°: 1050 DE 2021.

Fecha de suscripción: 21 de mayo de 2021

Objeto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3

Contratista: CONSORCIO VIAL NORTE con NIT.901.480.712-2 (INTEGRADO POR GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S CON NIT. 860.034.335-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, JOYCO S.A.S. CON NIT. 860.067.561-9, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 30% Y R & Q INGENIERIA COLOMBIA S.A. CON NIT. 900.508.277-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 30%)

Valor inicial: \$ 11.999.988.099,00. (IVA incluido 19%)

Adiciones: \$ 1.700.000.000. (IVA incluido 19%)

Valor Acumulado del contrato: \$ 13.699.988.099,00. (IVA incluido 19%)

Suspensiones: N/A

Plazo de ejecución inicial: 50.2 meses

Prorroga N°1: 4 meses

Prorroga N°2: 2 meses

Plazo de ejecución final: 56.2 meses

Orden de iniciación: 23 de junio de 2021

Fecha de terminación inicial: 31 de agosto de 2025

Fecha de terminación final - prorroga N°2: 28 de febrero de 2026

Domicilio contractual: Transversal 23 No. 97-74 Of. 707, Bogotá

Número de teléfono: PBX 1 432 28 80

5.2. Descripción de las Actividades Realizadas por el Interventor

Durante el periodo correspondiente del presente informe comprendido entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- ✓ Se revisaron los ensayos de laboratorio correspondiente al mes de diciembre de 2025, realizado a los materiales granulares, mezclas asfálticas, concreto MR40, concreto de 28mpa.
- ✓ Solución de diferentes interrogantes planteados por el personal contratista.
- ✓ Registro fotográfico y videos; se hace un seguimiento diario mediante fotografías de las actividades realizadas.
- ✓ La interventoría diligencia la bitácora de obra en donde se hace registro diariamente, consignando actividades realizadas, observaciones, recomendaciones y solicitudes pedidas al contratista de obra durante el mes de diciembre de 2025.
- ✓ Se realiza reunión de comité de obra No.176 y 177 en compañía de profesionales del INVIAS, personal del contratista e interventoría, para el seguimiento y control de actividades que se adelantan en la ejecución del contrato.
- ✓ Se realiza reunión desde el componente técnico y predial donde se levantan las actas 232 y 233 donde se cuenta con el acompañamiento de Contratista, Interventoría y INVIAS.
- ✓ Se hace revisión y elaboración de la preacta de obra #55 correspondiente al mes de diciembre de 2025.
- ✓ Revisión del acta de recibo parcial de obra # 55 del mes de diciembre de 2025, junto con los demás documentos necesarios para la radicación de la cuenta ante el INVIAS.
- ✓ Seguimiento y control de las actividades de los ítems no previstos correspondiente al acta de fijación #1, acta de fijación #2, acta de fijación #3, acta de fijación #4, acta de fijación #5 y acta de fijación #6.
- ✓ Seguimiento a las actividades correspondiente del área socio-ambiental, predial y sostenibilidad.

5.3. Informe especialistas y profesionales

Se relacionan los siguientes informes elaborados por especialista y profesionales de interventoría:

PROFESIONALES:

- ✓ Marco Aurelio Oliveros García. Director de interventoría.
- ✓ Amaury Javier Guzmán Vidal. Ing. Residente.
- ✓ María Daniela Ruíz Sotelo. Auxiliar de Interventoría.
- ✓ Maryan Catheryne Pérez Rojas. Auxiliar de Interventoría.
- ✓ Arlenys Assias Bernal. Profesional Social.
- ✓ Jesús Pataquiva Pinto. Profesional Ambiental.
- ✓ Luis Romero Palacio. Profesional Predial.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 1050 de 2021****FECHA:**

DD	MM	AA
31	12	2025

Desde:

01	12	2025
----	----	------


Hasta:

31	12	2025
----	----	------

Nombre: Marco Aurelio Oliveros GarcíaCargo: Director de Interventoría

No.	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	OBSERVACIONES
1	Elaboración, revisión y firma de oficios.	Oficios enviados a diferentes actores del contrato. 01/12/2025 desde el OF- 49980-CE-3971 al 31/12/2025 OF- 49980-CE -4022
2	Recibo de documentación de los actores del contrato.	Archivos con registros del contratista y del Invias. 01/12/2025 desde 49980-CR-4853 al 31/12/2025 49980-CR-4939
3	Informes semanales.	No. 233 – 04/12/2025; Semana del 28 de noviembre al 04 de diciembre No. 234 – 11/12/2025; Semana del 05 al 11 de diciembre No. 235 – 18/12/2025; Semana del 12 al 18 de diciembre No. 236 – 25/12/2025; Semana del 19 al 25 de diciembre
4	Dirección de los Comités de obras.	No. 176 – 11/12/2025 No. 177– 18/12/2025

5	Visitas periódicas al proyecto y reuniones con el contratista.	Durante el transcurso de todo el mes.
6	Reuniones virtuales.	
7	Recorrido con director sector infraestructura – Consorcio Vial Norte.	
8	Reunión entre contratista y INVIAS en la ciudad de Bogotá	
9	Atención y Llamadas telefónicas.	Durante el transcurso de todo el mes.

Firma:  _____

CC. 3227059

MTR PRO. 25202-03053CND

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA**FECHA:**

DD	MM	AA
31	12	2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 1050 de 2021Desde:


01	12	2025
----	----	------

Hasta:

31	12	2025
----	----	------

Nombre: Amaury Javier Guzmán VidalCargo: Residente de Interventoría

No.	Actividades realizadas durante el mes de diciembre 2025	Observaciones
1	Elaboración de diferentes comunicados remitidos al contratista.	Se proyectan comunicados para revisión del director de interventoría y posterior envío al contratista de obra. Donde se registran los controles de las actividades.
2	Revisión de la preacta de obra #55 mes de diciembre 2025.	se revisan las cantidades ejecutadas durante el mes de diciembre de 2025, se toman de los registros inspectores y topógrafo.
3	Revisión del acta de obra del mes de diciembre de 2025.	se revisa el acta de obra del mes de diciembre de 2025 en archivos editables previo para firma de los representantes legales y para envío los documentos de las cuentas por pagar conforme a instructivo radicación de cuentas.
4	Asistencia y participación en comité técnicos.	Se realizan comité técnico en las instalaciones de las oficinas del contratista. Se levantan las siguientes actas: Comité N°232 – 04 de diciembre de 2025.
5	Recorridos diarios a la vía	se realiza visita permanente en el corredor, llegando a los diferentes frentes de obra. se proyectan comunicados cuando se encontraron observaciones.
6	Revisión de los ensayos de laboratorio de suelos	Se revisa los ensayos de control de caracterización de terraplén, afirmado, MDC y concreto. Del periodo del mes de diciembre -25.
7	APU no previsto	Seguimiento de los APU no previsto correspondiente a las actas de fijación N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 y N°6.

Firma: 

Residente de Interventoría

TP: 22202-149534 COR



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
FECHA:**

DD	MM	AA
04	01	2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 1050 de 2021

Desde:

01	12	2025
----	----	------

Hasta:

31	12	2025
----	----	------

Nombre: María Daniela Ruiz Sotelo

Cargo: Auxiliar de Interventoría

No.	Actividades realizadas en el mes de diciembre de 2025	Observaciones
1	Elaboración Acta de costos No. 55 – diciembre de 2025	Se diligencia formato MEPI-MN1-IN-8-FR-1 acta de costos
2	Diligenciamiento formato Afinco 12 – Afectación presupuestal de obligaciones	Cuenta por cobrar – diciembre 2025
3	Diligenciamiento formato Afinco 13 – Identificación de ejecución contractual	Cuenta por cobrar –diciembre 2025
4	Elaboración de informes semanales y actualización en la plataforma CIFRA.	No. 233 - 04/12/2025; Semana del 28 de noviembre al 04 de diciembre de 2025 No. 234– 11/12/2025; Semana del 05 al 11 de diciembre de 2025 No. 235 – 18/12/2025; Semana del 12 al 18 de diciembre 2025 No. 236 – 25/12/2025; Semana del 19 al 25 de diciembre 2025
5	Elaboración de Actas de Recibo Conforme	Trámite administrativo del Consorcio Vial Norte y Gómez Cajiao para pago de facturas y cuentas de cobro de proveedores (tiquetes aéreos, dotación personal, alquiler de vehículos, alquiler de equipos de topografía, entre otros)
6	Asistencia a Comité de obras.	No.176 - 11/12/2025. No.177 -18/12/2025



8	Diligenciamiento de informe financiero y presupuestal de interventoría	se diligencia formato MEPI- MN1-IN-15-FR-9 diciembre 2025
9	Seguimiento Garantías Contrato De Obra	se diligencia formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12
10	personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría	se diligencia formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7
11	Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría	se diligencia formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13
12	Equipo Y Vehículos Contrato De Interventoría	se diligencia formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
13	Elaboración de diapositivas semanales avance proyecto	solicitud de la gerencia Grupo Norte
14	Solicitud prórroga No.2	Elaboración documentos para la solicitud de prórroga No.2 hasta el 28 de febrero de 2026

Firma: María Daniela Ruiz Sotelo
María Daniela Ruíz Sotelo
MP. 22202-410553 COR

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA INVIAS 1050-2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	
--	--	--

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre: Maryan Catheryne Pérez Rojas

Cargo: Ingeniera auxiliar de interventoría

No.	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Elaboración del informe mensual de interventoría N°55.	Informe mensual correspondiente al mes de diciembre del 2025 entregado al INVIAS.
2	Revisión de ensayos de laboratorio.	Se realiza la revisión de los ensayos de laboratorio suministrado por el contratista y laboratorios de las muestras tomadas por la interventoría. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.
3	Diligenciamiento de bitácora de obra.	Se registran las actividades diarias ejecutadas en obra durante el mes.
4	Asistencia, participación y elaboración de Acta de Comité de obra.	No. 176 – 11/12/2025 No. 177 – 18/12/2025
5	Seguimiento EYD	Se realiza seguimiento a los estudios y diseños del contrato, se envía a revisión de los especialistas las modificaciones y nuevas propuestas planteadas por el contratista, una vez se identifique la necesidad.
6	Visita a obra.	Durante el mes en curso se realizan recorridos al corredor vial.
7	Formato estado General del tiempo – IDEAM.	Se diligencia formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 del mes de diciembre 2025 y registro pluviométrico del IDEAM.
8	Formato maquinaria y equipo contrato de obra	Se diligencia formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 del mes de diciembre 2025.
9	Formato seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría.	Se diligencia formato MINFRA-MN1-IN-15-FR-15 del mes de diciembre 2025.
10	Matriz de Riesgo.	Se diligencian los campos correspondientes al componente técnico.
11	Actualización de cantidades de obra.	De los informes diarios presentados por los inspectores que se encuentran en obra, se realiza la consolidación de las cantidades reportadas para llevar el control del avance que presenta el proyecto.
12	Se realiza registro fílmico y fotografías de avance	Se publica por canal de YouTube video donde se puede apreciar el avance del proyecto hasta el mes de diciembre -25 aplicando el programa RODANDO POR LA VÍA.
13	Elaboración de diferentes comunicados remitidos al contratista	Se proyectan comunicados para revisión del director de interventoría y posterior envío al contratista de obra.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA INVIAS 1050-2021.

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"



Maryan Catheryne Pérez Rojas
Maryan Catheryne Pérez Rojas
Auxiliar de interventoría – CVN
MP: 22202-397222 COR



CONSORCIO VÍAL NORTE

Nit 901.480.712-2

INFORME GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORÍA DICIEMBRE 2025

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA" VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030".

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL- PAGA.....	4
2.1	PROYECTO 1: ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.....	4
2.1.1	SISTEMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	4
2.1.2	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD:.....	5
2.2	PROYECTO No.2: INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	7
2.3	PROYECTO No.3: MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS:	7
2.3.1	Levantamiento de Actas de Vecindad:.....	7
2.3.2	Actas de Compromiso o acuerdos con la comunidad:.....	8
2.4	PROYECTO NO. 4. RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA.....	8
2.5	PROYECTO NO. 5: CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.....	8
2.5.1	Talleres Pedagógicos:	8
2.5.2	Talleres de cultura vial	8
2.5.3	Comité de Participación Comunitaria:	8
2.6	PROYECTO 6: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA	9
2.7	PROYECTO 7: OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	9
2.8	PROYECTO NO.8: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL	12
2.9	PROYECTO NO.9: GESTIÓN SOCIAL PREDIAL	12
2.10	PROYECTO NO.10: RELACIONAMIENTO CON COMUNIDADES	12
2.11	PROGRAMA CÍVICOS GUARDAVÍAS – VEEDURÍAS CIUDADANA.....	13
2.12	PROGRAMA DE REINCORPORACIÓN.....	13
2.13	PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO.....	13
3	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA GESTIÓN SOCIAL	14
3.1	ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA.....	14
3.2	ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	15
4	PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES	15
5	CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO	16
6	CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES.....	17
7	REGISTRO FOTOGRAFICO	18



CONSORCIO VÍAL NORTE

Nit 901.480.712-2

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe contractual presenta el reporte de actividades sociales ejecutadas durante el periodo del mes de diciembre de 2025 por parte del CONSORCIO **ISLA 066-2020**., en el marco del CONTRATO No. **923 DE 2021**, paralelo se describen las acciones de control, seguimiento, verificación y acompañamiento por parte del área social de Interventoría en virtud de las funciones inherentes al **Contrato INVIAS 1050-2021**.

Durante el periodo del mes de diciembre de 2025, la Interventoría continúa con las actividades de seguimiento al Consorcio Isla 066-2020, según las siguientes acciones.

2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL- PAGA

Se verificaron las actividades contempladas en las fichas sociales dentro del Plan de la Guía Ambiental -PAGA las cuales fueron ejecutadas por el área social del Consorcio Isla 066-2020.

A continuación, se describen las actividades desarrolladas durante el periodo:

2.1 PROYECTO 1: ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.

Se realizó seguimiento al Consorcio Isla 066-2020 en cuanto a la atención a la comunidad conforme lo requiere la Guía Ambiental

2.1.1 SISTEMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

El consorcio constructor continuo con la atención a la comunidad en la oficina de atención al usuario SAU, ubicada en el corregimiento de Santa Lucía del municipio de Montería en el PR 4+400 costado derecho, atendida por parte del área social del Consorcio.

Se verifica que CUMPLE con los horarios de atención establecidos en la ficha PAGA:

Tabla 1. Relación horarios de Atención al Usuario

OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO			
DIRECCION	MUNICIPIO/ DEPARTAMENTO	DIAS DE ATENCIÓN	HORARIO ATENCIÓN
PR4+400 Margen Derecha	Monteria	Lunes a Viernes	8:00 a.m. a 12:00 m 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Fuente. Elaboración del Consorcio Vial Norte

continúa además con la atención a la comunidad con otros mecanismos como son el correo electrónico consorcioisla2020@gmail.com y línea de atención a la comunidad 311 789 1699, WhatsApp

2.1.2 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD:

Durante el mes de diciembre de 2025 no se recibieron PQRS, actualmente el sistema de atención al usuario presenta un 97,2% de productividad, toda vez que de 148 PQRS recibidas a la fecha, 144 PQRS están resueltas y el 2,7% restante se encuentran en trámite, cifra esta última representada en cuatro (4) PQRS que se encuentran en trámite, según el consolidado de esta Interventoría.

Tabla 2. Consolidado manifestaciones ciudadanas recibidas por el contratista

PQRS		
TOTAL	ABIERTAS	CERRADAS
148	4	144

Fuente. Elaboración del Consorcio Vial Norte

A continuación, se presentan las PQRS abiertas

Tabla 5. PQRS abiertas a la fecha

CON	PR	PETICIONARIO	ASUNTO	GESTIÓN A LA FECHA
143	29+350	Camila Galván:	Instalar señalización con el nombre de la vereda Villa concepción-Jobal en la entrada que conduce a esta,	Contratista informa la instalación de estas señales la realiza la misma empresa que realiza la pintura de los resaltos, una vez se construyan los resaltos aprobados para el sector de Jobal, Morrocoy y Abre los Ojos, se realizará la instalación de esta señal. Proyectado para realizarse en el mes de enero aproximadamente.
145	23+800	- Álvaro Hernández	Inundación en su predio,	Con rad. 46298 de 31 de oct. El Consorcio Isla, envió a la interventoría una propuesta de intervención en este punto, con miras a minimizar la problemática presentada. Actualmente se encuentra en revisión del especialista de la Interventoría.

CONSORCIO VÍAL NORTE

Nit 901.480.712-2

146	30+150	Miguel de los Santos González Galeano	Solicita la instalación de uno o dos reductores de velocidad en el sector de la Vereda Abre los Ojos,	Estas solicitudes se encienden en el área de diseño del Contratista, quien informan que una vez se tengan los resultados se procederá a la instalación de los resaltos
148	15+910	Never Narváez-JAC Vereda Morrocoy	la JAC de la vereda Morrocoy- ante el INVIA, en la cual requieren la instalación de reductores de velocidad a la altura del KM 16	

Grafica 1. Atención ciudadana

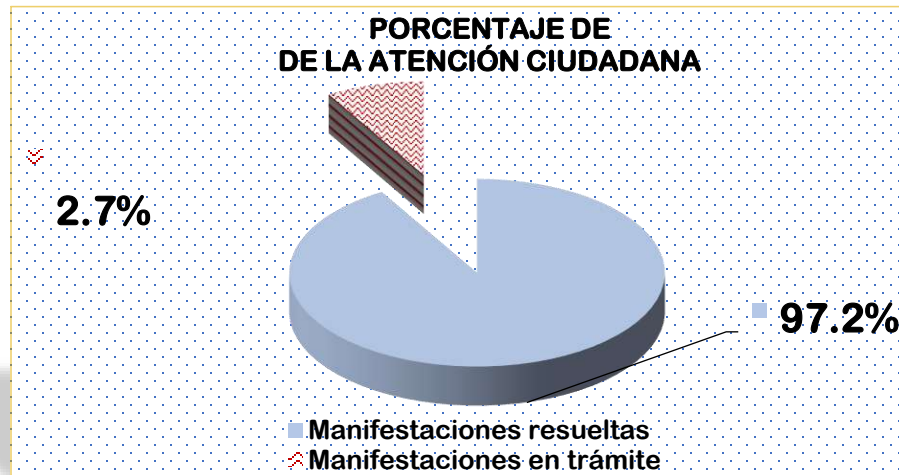


Tabla 3. indicador de gestión

INDICADOR	VALOR	%
Número de solicitudes Cerradas en el proyecto /número de solicitudes presentadas en el proyecto *100	148/144*100	97,2%

Tabla 4. Medio de recepción

MEDIO DE RECEPCIÓN	
VERBAL	94
ESCRITA	50
BUZON	2
ELECTRONICO	2
TELEFONICO	3
TOTAL	148

Fuente. Elaboración del Consorcio Vial Norte

Según información del Contratista, se reporta que el medio de recepción más utilizado por las comunidades, para realizar sus solicitudes es verbalmente, le sigue la recepción en la oficina fija, de manera escrita.

2.2 PROYECTO No.2: INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Respecto a este programa en este periodo no se realizaron actividades de divulgación

2.3 PROYECTO No.3: MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS:

Con respecto al levantamiento actas de vecindad durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

2.3.1 Levantamiento de Actas de Vecindad:

Actualmente el consorcio Isla 066-2020 reporta el levantamiento de un total de doscientas cincuenta y un (251) actas de vecindad de inicio (AVI) y Doscientos cuarenta y un (243) actas de vecindad de cierre (AVC) de las cuales la Interventoría ha firmado y aprobado doscientas cincuenta y un (251) actas de vecindad de inicio y (Doscientas cuarenta y un (243) actas de vecindad de cierre.

Para el mes de diciembre el contratista levantó 4 actas de vecindad de cierre

CONSORCIO VÍAL NORTE

Nit 901.480.712-2

Tabla 5 Consolidado Actas de Vecindad

DESCRIPCIÓN	PERIODO	ACUMULADO
Actas de vecindad de inicio	0	251
Actas de vecindad de cierre	4	243
AVI firmadas y aprobadas por interventoría	0	251
AVC firmadas y aprobadas por interventoría	0	239

Fuente. Elaboración del Consorcio Vial Norte

Tabla 6. Indicador de gestión Actas de vecindad

INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Número de predios con Acta de Vecindad inicio / Número de predios identificados	$251/251*100=100\%$
Número de predios con Acta de Vecindad Cierre / Número de predios identificados	$243/251*100=96.8\%$

Fuente. Elaboración del Consorcio Vial Norte

2.3.2 Actas de Compromiso o acuerdos con la comunidad:

Durante el periodo el Consorcio Constructor no realizó actas de compromiso con la comunidad.

2.4 PROYECTO NO. 4. RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA.

En el presente informe no se han identificado unidades productivas que se encuentren sobre el área de recuperación de derecho de vía, que requieran ser reubicados, por lo tanto, este proyecto no se ha activado para presentar información.

2.5 PROYECTO NO. 5: CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

2.5.1 Talleres Pedagógicos:

Para este periodo no se realizaron talleres pedagógicos con las Instituciones educativas de la zona de influencia

2.5.2 Talleres de cultura vial

El 16 de diciembre de 2025 Interventoría realizó acompañamiento a la campaña de seguridad vial orientada al no uso del celular mientras se conduce. La campaña contempló la entrega de 300 gorras en drill marcadas con los logos del proyecto como incentivo para los participantes de la campaña vial.

2.5.3 Comité de Participación Comunitaria:

Durante este periodo no se realizaron actividades con COPACO y la Veeduría del proyecto

2.6 PROYECTO 6: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA

A la fecha el Consorcio Isla 066-2020 cuenta actualmente con 122 empleados, de los cuales 48 personas corresponden a mano de obra no calificada de los cuales 46 son locales, lo que representa el 95,8. % del total de la mano de obra No Calificada contratada.

El proyecto ha generado un gran incremento en la economía de los municipios del AID del proyecto y de la región, ya que se cuenta con un considerable número de empleos indirectos que son generados por los trabajos del proyecto entre los que se destacan proveedores locales, vendedores de comida, dueños de viviendas que se tienen alquiladas, transporte, estaciones de servicio, entre otros reactivando de esta manera la economía de los municipios y el departamento.

Tabla 7- Contratación de personal contratista

PERSONAL CONTRATADO CONSORCIO ISLA 066-2020							
MANO DE OBRA CALIFICADA			MANO DE OBRA NO CALIFICADA			TOTAL, PERSONAL ACTIVO	TOTAL, EMPLEOS INDIRECTOS
LOCAL	FORANEA	REGIONAL	LOCAL	FORANEA	REGIONAL	127	15
34	46	0	46	1	0		

Fuente. Elaboración del Consorcio Vial Norte

A la fecha la interventoría cuenta con un total de veintiséis (26) trabajadores activos, de los cuales trece (13) corresponden al AID del proyecto con un porcentaje de contratación del 50%

Tabla 8. Contratación de personal interventoría

PERSONAL CONTRATADO INTERVENTORIA						
MANO DE OBRA CALIFICADA			MANO DE OBRA NO CALIFICADA			TOTAL, PERSONAL ACTIVO
LOCAL	FORANEA	REGIONAL	LOCAL	FORANEA	REGIONAL	26
0	13	7	1	0	5	

Fuente. Elaboración del Consorcio Vial Norte

2.7 PROYECTO 7: OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Durante el periodo no se realizaron actividades relacionadas con este programa

Nº	NOMBRE DE LA OPC	UBICACIÓN	MONTO ASIGNADO	OBJETIVO DE LA OPC	Nº BENEFICIARIOS	PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD	FECHA DE ENTRADA
1	Recuperación de la cancha múltiple	Corregimiento	\$75.000.000	Mejorar las condiciones de los escenarios	1500 (Estudiantes)	Se facilitó la vinculación de la mano de obra local	

CONSORCIO VÍAL NORTE

Nit 901.480.712-2

	ubicada en la Institución Educativa Rafael Núñez "	de Santa Lucia		deportivos que facilitan la recreación y esparcimiento de la comunidad educativa Rafael Núñez.	y padres de familia)	en el desarrollo de las actividades de mejoramiento de la OPC.	Octubre 2022
2	Mejoramiento del cerramiento de la sede principal de la I.E. Morrocoy-Municipio de san Pelayo	Vereda Morroco y	\$68.000.000	Mejoramiento condiciones de seguridad en el entorno escolar.	500 (docentes, estudiantes y padres de familia)	1) Se adelantaron Jornadas de 40 horas de capacitación. en: "Preparación de mezcla asfáltica y levantamiento de muros, a través del SENA 2) Vinculación laboral en la ejecución de la OPC, de 5 miembros de la comunidad capacitada.	Marzo 2024
3	Protección de muros perimetrales de Fachada y laterales en el centro educativo nuestra señora del Carmen, bajo Limón, moñitos, Córdoba.	Corregimiento Bajo Limón	\$75.000.000	Preservar la infraestructura física de La Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, mediante la protección del muro de cerramiento circundante.	1500 (Estudiantes y padres de familias)	La institución y los padres de familia se comprometieron a aportar el embellecimiento y la pintura de la fachada	Diciembre 2024
4	Adecuación y mejoramiento de aula para fortalecimiento de ambientes escolares en la Institución Educativa Villa Concepción sede Joval - municipio de Loricá	Jobal - municipio de Loricá	\$75.000.000	Generar espacios físicos agradables y propicios para el aprendizaje y mejoramiento de la convivencia escolar y comunitaria.	80 (Estudiantes y padres de familia)	La comunidad de la Vereda Jobal se comprometió a entregar en calidad de donación cuatro ventiladores de techo que oscilan en un valor de \$250.000 cada uno, para un total de \$1.000.000 aproximadamente. La Institución Educativa se compromete con la dotación de mobiliario para los estudiantes de los grados 3°,4° y 5	Enero 2025

Tabla 9.OPC por ejecutar

N°	NOMBRE DE LA OPC	UBICACIÓN	MONTO ASIGNADO	OBJETIVO DE LA OPC	N° BENEFICIARIOS	PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD	FECHA DE ENTREGA
5	Propuesta para las Obras con Participación Comunitaria para centro poblado del municipio Moñitos	municipio Moñitos Urbano	\$61.012.172	Adecuar la Batería Sanitaria del Barrio Santa Lucía, Zona Urbana del Municipio De Moñitos	1000	Dos luminarias	Programada enero 2026
6	Propuesta de Obras con Participación Comunitaria: Adecuación del comedor escolar en la institución educativa bajo blanco Del municipio de moñitos.	Cgto Bajo Blanco	60,131,610	Adecuar del comedor escolar en la institución educativa bajo blanco Del municipio de moñitos	305	Mobiliario	Programada Febrero 2026

Observaciones

- Durante el comité técnico del día 8 de noviembre de 2025, se acordó incluir en la Versión 9 del Plan de Inversión Social la OPC para la comunidad de Bajo Blanco, propuesta por la Veeduría del Proyecto, asignando para ella los recursos remanentes de la bolsa social, los cuales ascienden a: \$60.131.610
- la interventoría revisó la propuesta de Obra con Participación Comunitaria presentada por la Institución Educativa de Bajo Limón, remitida por el Contratista mediante comunicación N°46984 del 9 de diciembre de 2025
Objetivo: adecuar el comedor escolar de la IE Bajo Blanco para mejorar la salubridad, funcionalidad y accesibilidad de este, ya que La infraestructura actual presenta deficiencias que afectan el servicio de alimentación de los estudiantes
Actividades a realizar: trabajos de cimentación, estructura en madera, cubierta, pisos, accesibilidad y mobiliario.
Área del comedor: **47,81 m²** con capacidad para **48 estudiantes**.
Aporte de La comunidad: (I.E. Bajo Blanco aporta **\$1.500.000** sillas y mesas.)
Población beneficiada: **305 estudiantes** y el personal institucional.
Costo total del proyecto: **\$60.131.610**
- Mediante oficio 49980-CE-4002, la interventoría envió observaciones a la propuesta de Obra con Participación Comunitaria presentada por la Institución Educativa de Bajo Limón
- Mediante comunicación N°47313 de diciembre de 2025, Contratista dio respuesta a las observaciones presentadas por la Interventoría a la propuesta de la OPC de Bajo Blanco para la adecuación del Comedor Escolar, presentada por la comunidad.

- Mediante comunicación 49980-CE-4035, del 14 de enero de 2026, la interventoría respondió a la anterior comunicación solicitando incluir en los planos los detalles de corte de las vigas y/o elementos de cimentación con sus secciones despiece de acero correspondientes

2.8 PROYECTO NO.8: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL

En este periodo no se realizó socialización de protocolo sobre hallazgos fortuitos

2.9 PROYECTO NO.9: GESTIÓN SOCIAL PREDIAL

A continuación, se presenta el consolidado de la gestión socio- predial a la fecha, durante este periodo no se realizaron actividades relacionadas con este programa

GESTIÓN SOCIO PREDIAL					
PREDIOS CON FACTORES SOCIALES (16)					
FACTORES SOCIALES	PROYECTADOS	VALOR	APROBADOS	VALOR	PEDIENTES POR APLICAR
Unidad Mínima de Vivienda - UMV	12	\$ 1.060.701.486,65	11	\$ 988.618.986,25	\$ 72.082.500,40
Unidad Mínima Económica - UME	10	\$ 113.993.325,00	8	\$ 89.897.175,00	\$ 24.096.150,00
Unidad de Traslado- TDO	10	\$ 29.821.560,00	8	\$ 24.466.860,00	\$ 5.354.700,00
Unidad de Arrendamiento ARRTO	11	\$ 27.144.211,03	9	\$ 21.789.510,00	\$ 5.354.701,03
TOTAL	43	\$ 1.231.660.582,68	36	\$ 1.124.772.531,25	\$ 106.888.051,43

2.10 PROYECTO NO.10: RELACIONAMIENTO CON COMUNIDADES

Para este periodo no se realizaron actividades en este proyecto

SEGUIMIENTO OTROS PROGRAMAS

la interventoría continúa dando cumplimiento a los pliegos de condiciones del contrato, apéndice social de interventoría sobre el desarrollo de otros programas y aplicativos que se deben desarrollar en el proyecto. A continuación, se informa las gestiones realizadas en cada uno de ellos:

2.11 PROGRAMA CÍVICOS GUARDAVÍAS – VEEDURÍAS CIUDADANA.

Durante el periodo no se realizaron actividades con la veeduría ciudadana.

La veeduría ciudadana continúa utilizando los siguientes canales de comunicación: WhatsApp y correo electrónico smveeduriaciudadana2021@gmail.com para notificaciones y demás situaciones que se requieran en atención a la comunidad.

2.12 PROGRAMA DE REINCORPORACIÓN

En el mes de diciembre de 2025 no se presentó vinculación de personal por reincorporación.

Continua activa la consulta realizada por el contratista y la interventoría desde el inicio del contrato solicito ante la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN un listado de personas que presentaran esta condición para realizar la vinculación siendo negativa la respuesta según comunicado No OFI21-019233 / IDM 112000, donde informaron que para el Contrato de Obra No 923 de 2021 y Contrato de Interventoría No 1050 de 2021, no existen personas inscritas en dicha condición.

2.13 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

En cuanto a la generación de empleo se continúa dando cumplimiento a lo enunciado en el pliego de condiciones donde la interventoría realiza verificación al cumplimiento:

A continuación, se relaciona el personal que se encuentra dentro del programa de generación de empleo:

Tabla 10. Relación personal Programa Generación de Empleo

CATEGORIA	CONTRATISTA	INTEVENTORÍA
Mujeres vinculadas al proyecto	6	9
Hombre /mujeres cabeza de familia	3	1
Reinsertados	0	0
Jóvenes entre 18 y 28 años	13	1

Fuente. Elaboración del Consorcio Vial Norte

3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA GESTIÓN SOCIAL

3.1 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

- La interventoría continúa con el acompañamiento, seguimiento, verificación y aprobación a las actividades establecidas en el Documento PAGA realizadas por parte del contratista Consorcio Isla-066-2020 y las demás disposiciones del apéndice social del contrato de obra.
- Interventoría realizó seguimiento a las actividades constructivas correspondientes a esta OPC ADECUACIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA DEL BARRIO SANTA LUCÍA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS”
- El 16 de diciembre de 2025 Interventoría realizó acompañamiento a la campaña de seguridad vial orientada al no uso del celular mientras se conduce. La campaña contempló la entrega de 300 gorras en drill marcadas con los logos del proyecto como incentivo para los participantes de la campaña vial.
- la interventoría revisó la propuesta de Obra con Participación Comunitaria presentada por la Institución Educativa de Bajo Limón, remitida por el Contratista mediante comunicación N°46984 del 9 de diciembre de 2025
Objetivo: adecuar el comedor escolar de la IE Bajo Blanco para mejorar la salubridad, funcionalidad y accesibilidad de este, ya que La infraestructura actual presenta deficiencias que afectan el servicio de alimentación de los estudiantes
Actividades a realizar: trabajos de cimentación, estructura en madera, cubierta, pisos, accesibilidad y mobiliario.
Área del comedor: **47,81 m²** con capacidad para **48 estudiantes**.
Aporte de La comunidad: (I.E. Bajo Blanco aporta **\$1.500.000** sillas y mesas.)
Población beneficiada: **305 estudiantes** y el personal institucional.
Costo total del proyecto: **\$60.131.610**
- Mediante oficio 49980-CE-4002, la interventoría envió observaciones a la propuesta de Obra con Participación Comunitaria presentada por la Institución Educativa de Bajo Limón
- Mediante comunicación N°47313 de diciembre de 2025, Contratista dio respuesta a las observaciones presentadas por la Interventoría a la propuesta de la OPC de Bajo Blanco para la adecuación del Comedor Escolar, presentada por la comunidad.
- Mediante comunicación 49980-CE-4035, del 14 de enero de 2026, la interventoría respondió a la anterior comunicación solicitando incluir en los planos los detalles de corte de las vigas y/o elementos de cimentación con sus secciones despiece de acero correspondientes

3.2 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

- La atención a la comunidad se continúa realizando por parte del área social el consorcio Isla066-2020 a través de la oficina SAU ubicada en el PR4+400 del corregimiento de Santa Lucía municipio de Montería. Igualmente, se continua con la atención a través de los medios de comunicación como la línea telefónica, vía WhatsApp y correo electrónico.
- A la fecha el CONSORCIO ISLA 066, presenta un 97,2% de productividad, toda vez que de 148 PQRS recibidas a la fecha, 144 PQRS están resueltas., las otras 4 se encuentran en tramite
- A la fecha el Consorcio Isla 066-2020 cuenta actualmente con 122 empleados, de los cuales 48 personas corresponden a mano de obra no calificada de los cuales 46 son locales, lo que representa el 95,8. % del total de la mano de obra No Calificada contratada.
- Durante el periodo el Consorcio Constructor levanto 4 actas de vecindad de cierre
- El 16 de diciembre de 2025 se realizó la campaña de seguridad vial orientada al no uso del celular mientras se conduce. Durante la jornada realizó la entrega de 300 gorras en drill marcadas con los logos del proyecto como incentivo para los participantes de la campaña vial.

4 PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES

- La interventoría continuara con el seguimiento, verificación y acompañamiento a las actividades que se deben desarrollar contractualmente por parte del contratista en el mes de diciembre
- Se realizará seguimiento a las actas de vecindad de cierre en los frentes que ya se terminaron las actividades de obra.
- Seguimiento y control del Proceso de contratación de personal de MONC y MOC del área de influencia directa del proyecto.
- Acompañamiento y seguimiento a la atención de las solicitudes presentadas por la comunidad.
- Se realizara acompañamiento a la entrega de la OPC MOÑITOS URBANO
- Se revisará el informe mensual de la Gestión social del mes de diciembre adelantada por el contratista
- Se realizará gestión correspondiente a la OPC presentada por la Institución Educativa de Bajo Limón

CONSORCIO VÍAL NORTE

Nit 901.480.712-2

5 CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO

En cuanto a la correspondencia la interventoría elaboró y radicó los siguientes comunicados, dirigidos al Consorcio Isla 066-2020, Subdirección de Sostenibilidad y comunidad durante el presente periodo, como se relaciona a continuación:


Tabla 11. Relación Correspondencia enviada

Nº	ENTIDAD DESTINATARIA	CONSECUTIVO	ASUNTO	FECHA
1	Consortio Isla 066-2021	49980-CE-3993	RESPUESTA COMUNICADO 46985 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025- APROBACIÓN INFORME ACTIVIDADES SOCIALES N°54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	11 -12- 2025
2	Consortio Isla 066-2021	49980-CE-4002	RESPUESTA COMUNICADO 46984 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025. OBSERVACIONES PROPUESTA OBRA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "ADECUACIÓN DEL COMEDOR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAJO BLANCO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS"	11 -12- 2025
3	Instituto Nacional de Vías – INVIAS – Subdirección de Sostenibilidad	49980-CE-3994	SOLICITUD CONCEPTO DE NO OBJECCIÓN DE UNA (1) FICHA SOCIO ECONÓMICA	11 -12- 2025

Fuente. Elaboración del Consorcio Vial Norte

6 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES

- El contratista deberá buscar estrategias que permitan dar cumplimiento con el porcentaje de contratación de mano de obra contractualmente establecido.
- Se le recomienda al contratista la realización de actividades que promuevan la importancia de la toma de conciencia sobre la atención de la señalización vial y uso adecuado de las vías,
- La interventoría continuara con la seguimiento, verificación y acompañamiento a las actividades que se deben desarrollar contractualmente por parte del contratista en cuenta a la atención a la comunidad atendiendo las solicitudes presentadas por la comunidad.
- Realización De talleres pedagógicos en las IE del AID donde se encuentre frentes activos.
- Elaboración de actas de vecindad de cierre en los frentes que ya se terminaron las actividades de obra.
- Proceso de contratación de personal de MONC y MOC del área de influencia directa del proyecto.
- Se anexa registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo en cuanto al seguimiento y control de la interventoría a las actividades contempladas en el documento PAGA, el manual de interventoría, apéndice social y pliego de condiciones del contrato de obra e interventoría.



Arlenys Assias Bernal
T.P. 115096651-A

7 REGISTRO FOTOGRAFICO

Campaña vial



OPC Moñitos urbano- unidades sanitarias



	CONTRATO DE INTERVENTORÍA INVIAS 1050-2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	
--	--	--

INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre: Jesús Francisco Pataquiva Pinto

Cargo: Profesional Ambiental

No.	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Elaboración de comunicados para remitir al contratista	Se remiten comunicados con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato de obra por parte del contratista, y exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental.
2	Visitas de inspección a actividades ambientales del contratista	- 49980-CE-4009 se le notificó al Contratista un manejo inadecuado de los residuos sólidos y líquidos industriales, observando que no se cuenta con una contención para los productos químicos durante la instalación de mezcla asfáltica a la altura del PR 8+856, lo que está derivando en una posible contaminación de los cuerpos agua circundantes, dado que se observa residuos del líquido imprimante en la obra de drenaje transversal. Por lo que se requirió que el Contratista dé cumplimiento a lo establecido en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental en la ficha PROYECTO 2: MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES: <i>"Si se presentan derrames accidentales de aceites, acelerantes, se recogerán inmediatamente con absorbentes sintéticos, trapos, aserrín, arena."</i>, y de igual forma el Contratista deberá garantizar que no se presente el arrastre de materiales de construcción hacia las obras de drenaje longitudinal. - El 4 de diciembre se llevó a cabo acompañamiento a los trabajos de mantenimiento del año 3 a las plantaciones como medida compensatoria del Permiso de Aprovechamiento Forestal, en compañía de los residentes ambiental y forestal del Contratista.
3	Documentación contractual	- 49980-CE-3982 se remitió a la Subdirección de Sostenibilidad el radicado No. 20252118740 del 26 de noviembre de 2025, con el que la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge -CVS-, notifica al CONSORCIO ISLA 066-2020, como Contratista de Obra, sobre la Resolución No. 222 del 8 de septiembre del 2025, Por la cual se autoriza una reducción de la tasa de aprovechamiento de la Resolución 132 del 17 de junio del 2022 al valor de \$ 7.228.200. - 49980-CE-3989 se remite a la Subdirección de Sostenibilidad la subsanación de las observaciones del informe trimestral No. 16, contenidas en la comunicación 2025S-VBOG-093761.
4	Aprobación del informe mensual del contratista de obra	Mediante comunicación 49980-CE-3992 , se dio concepto de aprobación al informe mensual de obra del mes de noviembre-2025.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA INVIAS 1050-2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	
---	--	---

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance en la empedrización de áreas afectadas por la construcción ha sido de manera progresiva en aquellos sectores donde se ha instalado la malla triple torsión, utilizando como método de bioingeniería el Pasto Vetiver, el cual se ha podido evidenciar que tiene una mayor capacidad para estabilizar el suelo y promover la recuperación de ecosistemas.
- Se controlaron especies invasoras en zonas destinadas a la empedrización, reemplazándolas con pastos nativos para fomentar la biodiversidad local.
- El seguimiento de las áreas empedrizadas mostró un establecimiento adecuado de las especies sembradas, con ajustes en las técnicas de mantenimiento para optimizar resultados.
- Se aplicaron técnicas de bioingeniería en sitios críticos, combinando empedrización con estructuras de contención para reducir la erosión y mejorar la estabilidad del suelo.
- El contratista implementa planes para el manejo adecuado de residuos generados (escombros, aceites, etc.), promoviendo el reciclaje y la disposición responsable para minimizar la contaminación del entorno.
- El proyecto prioriza aspectos de sostenibilidad, sin embargo, la Interventoría recomienda mayor prevención en la revegetalización inmediata, para evitar variaciones en el contrato que podrían inducir erosión o incumplimientos futuros.

ACTIVIDADES PROYECTADAS:

- Verificación en la implementación de las medidas establecidas en el PMA, como la gestión de residuos, la protección de fuentes hídricas y la reforestación, asegurando que se sigan los lineamientos técnicos y legales aprobados.
- Inspecciones periódicas en campo para evaluar la efectividad de las acciones del Contratista, como el control de erosión, la estabilización de taludes o la reubicación de fauna, asegurando que se minimicen los impactos ambientales y se cumplan los cronogramas.
- Seguimiento a la disposición de los materiales excedentes, como tierra o escombros, evitando el depósito en áreas protegidas o sensibles desde el punto de vista ambiental.

Jesus Pataguiva

Jesús Francisco Pataquiva Pinto

Profesional Ambiental – CVN – Matrícula No. 25238-307940 CND



CONTRATO DE INTERVENTORÍA INVIAS 1050-2021.

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"



Foto 1. Limpieza plantación PR 8+370



Foto 2. Limpieza plantación PR 8+370



Foto 3. Instalación de malla triple torsión PR 10+700 CD



Foto 4. Instalación de malla triple torsión PR 10+700 CD



Foto 5. Monitoreo epifitas PR 14+100 LD



Foto 6. Mantenimiento plantación "La Pajuela"

Proyecto:

**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO
DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”**

INFORME PREDIAL DICIEMBRE DE 2025

CONTENIDO

1.	ANTECEDENTES	3
2.	GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA	4
3.	GENERALIDADES CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5
4.	LOCALIZACIÓN	6
5.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
6.	DESARROLLO DE LA GESTION PREDIAL	7
6.1	AVANCE GESTIÓN PREDIAL DEL PERIODO	7
6.1.1	IDENTIFICACIÓN PREDIOS POR JURISDICCIÓN MUNICIPAL	8
6.1.3	PREDIOS CON FICHAS PEDIALES: A la fecha todos los predios cuentan con ficha predial aprobada por todas las partes.	12
6.1.4	PREDIOS CON ESTUDIOS DE TITULO	12
6.1.5	INDICADORES EN LA GESTIÓN PREDIAL DEL PERIODO	13
7.1	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PREDIAL - ACTIVIDADES INTERVENTORÍA - CONTRATISTA	14

1. ANTECEDENTES

El Contrato No 923 de 2021 tiene como objeto el “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA –MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

El inicio de la fase de construcción se programó para el 24 de septiembre de 2021.

Tabla 1-1 Participación accionaria original del Consorcio Isla 066-2020

Integrante	% Participación	País
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.	50%	Colombia
ISMOCOL S.A.	50%	Colombia

Tabla 1-2 Integrantes Consorcio Vial Norte

Integrante	% Participación	País
GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S	40%	Colombia
JOYCO S.A.S	30%	Colombia
R & Q INGENIERIA COLOMBIA S. A	30%	Colombia

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA


Contrato de obra N°	923 de 2021
Fecha de suscripción	29 de abril de 2021
Objeto	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.
Contratista	CONSORCIO ISLA 066-2020 con NIT. 901.479.090-8 (Integrado por LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. con NIT. 800.233.881-4, con una participación del 50%, e ISMOCOL S.A. con NIT. 890.209.174-1, con una participación del 50%).
Valor inicial del contrato	CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (\$171.472.677.930) M/CTE, IVA INCLUIDO\$171.472.677.930,00 M/CTE.
Adiciones	N/A
Suspensiones	N/A
Plazo de ejecución	51 meses
Fecha de Inicio del Contrato	23 de junio de 2021
Fecha de terminación	31 diciembre de 2025
Sede Principal Contratista	Calle 127 A No. 53 A – 45 Torre II oficina 1003 - Bogotá
Teléfono	+57 (4) 444 4744

3. GENERALIDADES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Objeto	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3
Contratista	CONSORCIO VIAL NORTE con NIT.901.480.712-2 (INTEGRADO POR GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S CON NIT. 860.034.335-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, JOYCO S.A.S. CON NIT. 860.067.561-9, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 30% Y R & Q INGENIERIA COLOMBIA S.A. CON NIT. 900.508.277-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 30%)
Valor inicial del contrato	\$ 11.999.988.099,00. (IVA incluido 19%)
Adiciones	1
Suspensiones	N/A
Plazo de ejecución	50.2 meses
Fecha de Inicio del Contrato	23 de junio de 2021
Fecha de terminación	31 diciembre de 2025
Domicilio contractual	Transversal 23 No. 97-74 Of. 707, Bogotá
Teléfono	PBX 1 432 28 80

4. LOCALIZACIÓN

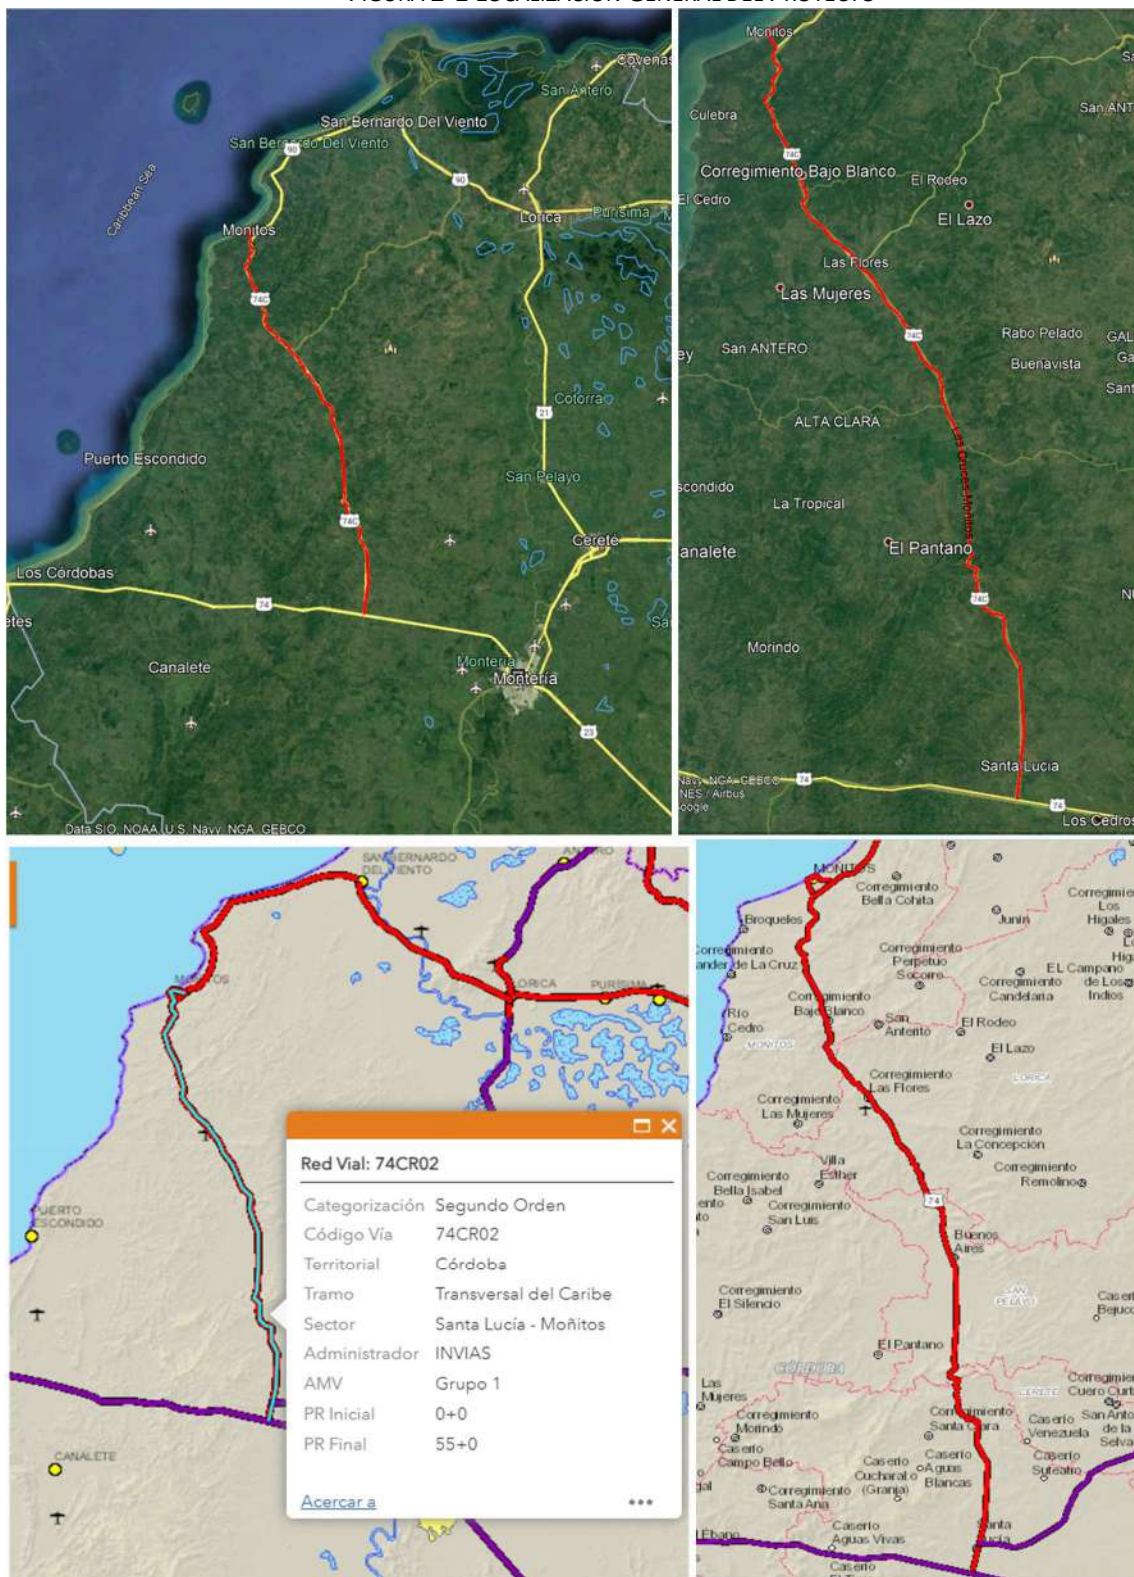FIGURA 2-1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO



5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Ruta 74CR02 Santa Lucía – Moñitos que en su mayoría es destapada generalmente se ve afectada por los fuertes inviernos que azotan la región y que han ocasionado daños significativos en toda la estructura de la carretera originando baches, hundimientos y encharcamientos de aguas superficiales que dificultan la transitabilidad de los vehículos que a diario utilizan la carretera.

El Proyecto de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor santa lucía – moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública *“vías para la legalidad y la reactivación visión 2030”*, tiene el propósito de incrementar la competitividad con el resto del país, mejorar la interconectividad de los departamentos de la costa colombiana, disminuir los índices de accidentalidad en la zona, facilitar el turismo en la región y fomentar el progreso económico y social de la Costa Atlántica en general, mediante la consolidación de las vías para la legalidad y la reactivación económica.

La longitud aproximada del tramo es de 55 km iniciando en el corregimiento de Santa Lucía que hace parte del municipio de Montería pasando, cruzando los municipios de San Pelayo, Lórica y Moñitos.

6. DESARROLLO DE LA GESTION PREDIAL

6.1. AVANCE GESTIÓN PREDIAL DEL PERIODO

Se toma como soporte para este informe, la información allegada por el Contratista mediante mesas de trabajo, comunicaciones y correos electrónicos, en los cuales se informan de las gestiones prediales adelantadas, las cuales se encuentran tabuladas en la sábana predial, tabla en la que se informa la necesidad de intervenir 72 requerimientos entre franjas de terreno y mejoras, las cuales a la fecha se tiene 99% de disponibilidad para las obras, situación informada por el Contratista los cual es congruente con el avance de Obras.

El contratista informa que una vez realizados los ajustes a los estudios se logró la desafectación predial a los que hacían referencia los estudios iniciales en los pasos poblados del corregimiento de Buenos Aires y las Flores en jurisdicción de los municipios de San Pelayo y Lórica, los cuales quedaron desafectados con ocasión a los ajustes de los diseños geométricos del corredor.

6.1.1. IDENTIFICACIÓN PREDIOS POR JURISDICCIÓN MUNICIPAL

A continuación, se grafica la información extraída reportada por el Contratista, la cual corresponde a la cuantificación de predios por jurisdicción territorial.

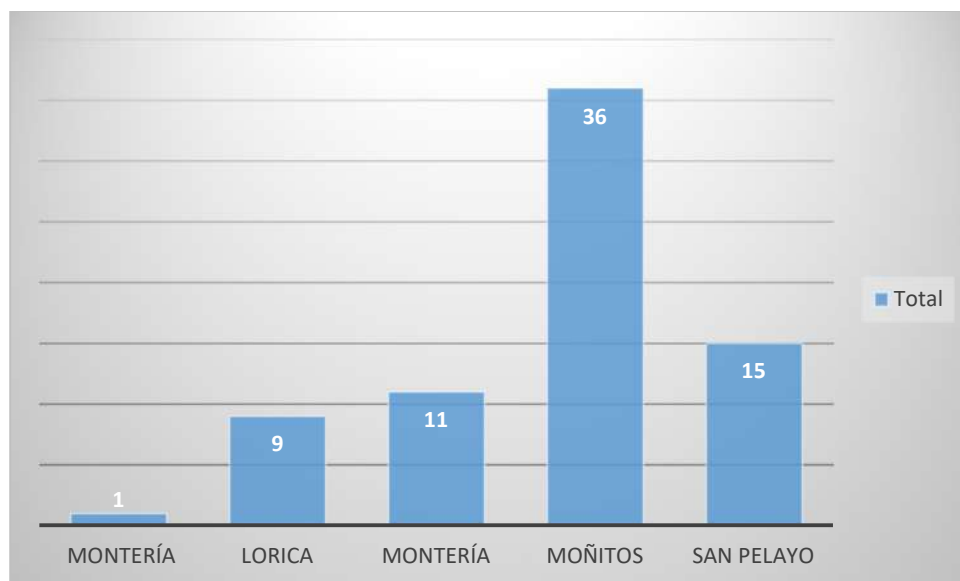


Figura 6.1-1 Numero de Predios por Municipio

De conformidad con lo reportado en la sabana predial del mes de diciembre se identifican 72 predios, de los cuales 7 se relacionan como desafectados, por lo que la necesidad actual seria de 65 requerimientos de fichas prediales entre zonas de terreno y mejoras que se requieren para las obras del proyecto.

Con relación a los predios desafectados, se solicitó al contratista soportes que validaran que el INVIAS y/o la Interventoría hubiesen validado las modificaciones de los diseños que conllevaron la desafectación de los mismos.

De dicha solicitud, y tras un cruce de comunicaciones, se validaron que los predios desafectados tenían soportes técnicos conocidos por el INVIAS y la Interventoría que validaban un cambio o reducción en el alcance de obra y consecuentemente validaban su desafectación.

6.1.2. PREDIOS IDENTIFICADOS COMO BALDÍOS



Figura 6.1-2 Predios Identificados como Baldíos

Respecto de los 17 predios identificados como Baldíos se tiene lo siguiente:

004-D-T3-MSM

- **Responsable:** CONTRATISTA
- **Seguimiento:** INVIAS remitió formatos de solicitud firmados. Conforme a instrucción de INVIAS, el contratista debe organizar la totalidad de los expedientes con sus anexos, formatos firmados y demás entregables según lo indicado por la Agencia Nacional de Tierras, elaborar el oficio y radicar ante la interventoría para aprobación y posterior radicación ante la entidad. Remitido al contratista por correo electrónico el 16-10-2025. El 19 de noviembre INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del Estado, la cual ya se encuentra en poder del contratista.

005-D-T3-MSM

- **Responsable:** CONTRATISTA
- **Seguimiento:** INVIAS remitió formatos de solicitud firmados. El contratista debe realizar la organización de los expedientes con sus anexos y formatos conforme a los lineamientos de la Agencia Nacional de Tierras, elaborar el oficio y radicar ante la interventoría para su aprobación y posterior radicación. Remitido al contratista por correo electrónico el 16-10-2025.

006-D-T3-MSM

- **Responsable:** CONTRATISTA
- **Seguimiento:** INVIAS remitió formatos de solicitud firmados. El contratista debe organizar los expedientes con sus anexos y entregables conforme a la Agencia Nacional de Tierras, elaborar el oficio y adelantar la radicación ante la interventoría y la entidad correspondiente. Remitido al contratista el 16-10-2025. El 19 de noviembre INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del Estado.

007-I-T3-MSM

- **Responsable:** CONTRATISTA
- **Seguimiento:** INVIAS remitió formatos de solicitud firmados. El contratista debe organizar los expedientes con sus anexos conforme a los lineamientos de la Agencia Nacional de Tierras, elaborar el oficio y realizar la radicación ante la interventoría y la entidad. Remitido al contratista por correo electrónico el 16-10-2025. El 19 de noviembre INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del Estado.

008-D-T3-MSM

- **Responsable:** CONTRATISTA
- **Seguimiento:** INVIAS remitió formatos de solicitud firmados. El contratista debe organizar los expedientes con sus anexos, elaborar el oficio y adelantar la radicación ante la interventoría y la entidad competente conforme a la Agencia Nacional de Tierras. Remitido al contratista el 16-10-2025. El 19 de noviembre INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del Estado.

001-I-T4-MSM

- **Responsable:** CONTRATISTA
- **Seguimiento:** INVIAS remitió formatos de solicitud firmados. El contratista debe realizar la organización de los expedientes conforme a la Agencia Nacional de Tierras, elaborar el oficio y radicar ante la interventoría para su aprobación y posterior radicación ante la entidad. Remitido al contratista el 16-10-2025. El 19 de noviembre INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del Estado.

001-D-T7-MSM

- **Responsable:** CONTRATISTA
- **Seguimiento:** INVIAS remitió formatos de solicitud firmados. El contratista debe organizar los expedientes con sus anexos conforme a la Agencia Nacional de Tierras, elaborar el oficio y adelantar la radicación correspondiente. Remitido al contratista el 16-10-2025. El 19 de noviembre INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del Estado.

001-I-T9-MSM

- **Responsable:** CONTRATISTA
- **Seguimiento:** INVIAS remitió formatos de solicitud firmados. El contratista debe organizar los expedientes, elaborar el oficio y radicar ante la interventoría y la entidad conforme a los lineamientos de la Agencia Nacional de Tierras. Remitido al contratista el 16-10-2025. El 19 de noviembre INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del Estado.

002-I-T9-MSM

- **Responsable:** CONTRATISTA
- **Seguimiento:** INVIAS remitió formatos de solicitud firmados. El contratista debe organizar los expedientes y realizar la radicación conforme a la Agencia Nacional de Tierras. Remitido al contratista el 16-10-2025. INVIAS remitió a la interventoría, y esta al contratista, la comunicación para solicitud de adjudicación de baldío a favor del Estado.

004-D-T9-MSM

- **Responsable:** CONTRATISTA
- **Seguimiento:** INVIAS remitió formatos de solicitud firmados. El contratista debe organizar los

expedientes con sus anexos y adelantar la radicación ante la interventoría y la entidad. Remitido al contratista el 16-10-2025. El 19 de noviembre INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del Estado.

005-D-T9-MSM

- **Responsable:** CONTRATISTA
- **Seguimiento:** INVIAS remitió formatos de solicitud firmados. El contratista debe organizar los expedientes y realizar la radicación conforme a los lineamientos de la Agencia Nacional de Tierras. Remitido al contratista el 16-10-2025. El 19 de noviembre INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del Estado.

003-I-T10-MSM

- **Responsable:** CONTRATISTA
- **Seguimiento:** INVIAS remitió formatos de solicitud firmados. El contratista debe organizar los expedientes y adelantar la radicación ante la interventoría y la entidad correspondiente. Remitido al contratista el 16-10-2025. El 19 de noviembre INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del Estado.

004-D-T10-MSM

- **Responsable:** CONTRATISTA
- **Seguimiento:** INVIAS remitió formatos de solicitud firmados. El contratista debe organizar los expedientes conforme a la Agencia Nacional de Tierras y adelantar la radicación correspondiente. Remitido al contratista el 16-10-2025. El 19 de noviembre INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del Estado.

005-I-T10-MSM

- **Responsable:** CONTRATISTA
- **Seguimiento:** INVIAS remitió formatos de solicitud firmados. El contratista debe organizar los expedientes y realizar la radicación conforme a la Agencia Nacional de Tierras. Remitido al contratista el 16-10-2025. El 19 de noviembre INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del Estado. El 10 de diciembre el proceso fue finalizado y se encuentra incluido en la preacta No. 55.

006-D-T10-MSM

- **Responsable:** CONTRATISTA
- **Seguimiento:** INVIAS remitió formatos de solicitud firmados. El contratista debe organizar los expedientes y adelantar la radicación correspondiente. Remitido al contratista el 16-10-2025. El 19 de noviembre INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del Estado.

008-I-T10-MSM

- **Responsable:** CONTRATISTA
- **Seguimiento:** INVIAS remitió formatos de solicitud firmados. El contratista debe organizar los expedientes conforme a la Agencia Nacional de Tierras y realizar la radicación correspondiente. Remitido al contratista el 16-10-2025. El 19 de noviembre INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del Estado.

009-I-T10-MSM

- **Responsable:** CONTRATISTA

• **Seguimiento:** INVIAS remitió formatos de solicitud firmados. El contratista debe organizar los expedientes y adelantar la radicación ante la interventoría y la entidad competente. Remitido al contratista el 16-10-2025. El 19 de noviembre INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del Estado.

6.1.3. PREDIOS CON FICHAS PREDIALES

FICHAS PREDIALES	
EN ELABORACION	0
EN REVISION POR INTERVENTORIA	0
APROBADAS POR INTERVENTORIA	72
APROBADAS POR INVIAS	72
EN APROBACIÓN	0
EN REVISION POR INVIAS	0
TOTAL	72

Figura 6.1-3 Predios con Ficha

Se han reportado en sábana predial por parte del Contratista (72) fichas prediales adelantadas de las en los sectores con aprobación a los diseños geométricos por parte de la Interventoría, de las 72 fichas requeridas se ha presentado 72, se ha dado la aprobación por parte de interventoría, a 72 fichas las cuales todas cuentan con visto bueno de no objeción por parte del Instituto, gestión que representa un 100% en referencia a la cantidad de fichas de predios que se requieren a la fecha.

6.1.4. PREDIOS CON ESTUDIOS DE TÍTULOS

ESTUDIOS DE TITULOS/DIAGNOSTICOS JURIDICOS EN ELABORACION	
ELABORADOS	72
EN ELABORACIÓN Y/O AJUSTE	0
EN REVISION POR INTERVENTORIA	0
APROBADAS POR INTERVENTORIA	72
APROBADAS POR INVIAS	72
EN REVISION POR INVIAS	0
TOTAL	72

Figura 6-4 Gestión de los estudios jurídicos

A la fecha se han recibido por parte del Contratista 72 Estudios jurídicos, los cuales cuentan con fichas prediales con visto de no objeción por parte del Instituto, 72 se encuentran aprobados por la Interventoría y de estos 72 tienen visto de no objeción por parte del Gestor jurídico.

6.1.5. PREDIOS CON AVALÚO

INFORME DE AVALUOS	
NO REQUIERE AVALUO	17
EN ELABORACIÓN	0
ELABORADOS	55
EN CORRECCION	0
EN REVISION POR INTERVENTORIA	0
APROBADAS POR INTERVENTORIA	55
EN REVISION POR INVIAS	0
APROBADAS POR INVIAS	55
TOTAL	55

A la fecha se han recibido por parte del Contratista 55 avalúos de los cuales 55 se encuentran aprobados por la Interventoría y cuentan con visto de no objeción por parte del Instituto.

6.1.5 INDICADORES EN LA GESTIÓN PREDIAL DEL PERIODO

CONCEPTO	Esperado %	Ejecutado %	Pendiente %
NÚMERO DE PREDIOS	72		
1 – Predios con ficha	72	100,00%	0,00%
1.1 – Predios con ficha aprobada por interventoría	72	100,00%	0,00%
1.2 – Predios con ficha aprobada por INVIAS	72	100,00%	0,00%
2 – Predios con avalúo	55	100,00%	0,00%
2.1 – Predios con avalúo aprobado por INVIAS	55	100,00%	0,00%
3 – Predios con estudio de títulos	72	100,00%	0,00%
3.1 – Predios con estudio de títulos aprobado por interventoría	72	100,00%	0,00%
3.2 – Predios con estudio de títulos aprobado por INVIAS	72	100,00%	0,00%

Tabla 6.1-1 Consolidado de avance insumos prediales

En este orden tenemos, que la gestión adelantada en el proceso de adquisición de los predios requeridos, que se tabula en la tabla anterior, muestra que se tienen adelantadas la elaboración y presentación de 72 fichas prediales de las cuales 72 se encuentran revisadas por parte de la Interventoría, asimismo se ha obtenido el Visto Bueno de 72 estudios jurídicos y 55 avalúos (100% de los requeridos).

7.1 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PREDIAL - ACTIVIDADES INTERVENTORÍA – CONTRATISTA

No. FICHA PREDIAL	ESTADO GP	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
001-D-T1-MSM	PARA EXPROPIACIÓN	15 DIC / PARA RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN (02 DICIEMBRE DE 2025) - VENCE: 24 DICIEMBRE DE 2025)
004-I-T1-MSM	PARA EXPROPIACIÓN	15 DIC / Oferta Inscrita - 07/11/2025 Revisión en INVÍAS de la Resolución de Expropiación
001-I-T2-MSM	ESCRITURA PÚBLICA / TERMINADA	15 DIC / Predio a favor del INVÍAS, Pago final Realizado 04/09/2025
001-I-T3-MSM	ESCRITURA PÚBLICA / TERMINADA	15 DIC / Predio a favor del INVÍAS, pendiente Pago final - elaborar oficio IGAC Desenglobe
002-D-T3-MSM	ESCRITURA PÚBLICA	15 DIC / 20-11-2025 - Minuta de escritura Pública radicada en la notaría 3 de montería
003-I-T3-MSM	PARA EXPROPIACIÓN	interventoria remite a INVÍAS reolucion de expropiacion (10 nov) 15 DIC / Resolución de Expropiación (Informe Ejecutivo de Expropiación)

004-D-T3-MSM	BALDÍO	INVIAS remitió formatos de solicitud firmados, se enviarán a Contratista según instrucción DE INVIAS este deberá realizar la organización de todos los expedientes juntos con sus anexos, formatos firmados y demás entregables conforme a lo indicado en los formatos de la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente debe elaborar el oficio y radicar a la interventoría, dar la aprobación y posteriormente radicar a la entidad. Remitidos por correo electrónico al Contratista 16-10-2025 19 Nov/ INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del estado, ya se encuentra en el contratista
004A-D-T3-MSM	MEJORA / TERMINADA	Interventoría requirió radicación de expedientes terminados al contratista
005-D-T3-MSM	BALDÍO	INVIAS remitió formatos de solicitud firmados, se enviarán a Contratista según instrucción DE INVIAS este deberá realizar la organización de todos los expedientes juntos con sus anexos, formatos firmados y demás entregables conforme a lo indicado en los formatos de la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente debe elaborar el oficio y radicar a la interventoría, dar la aprobación y posteriormente radicar a la entidad. Remitidos por correo electrónico al Contratista 16-10-2025
005A-D-T3-MSM	MEJORA / TERMINADA	Interventoría requirió radicación de expedientes terminados al contratista

006-D-T3-MSM	BALDÍO	INVIAS remitió formatos de solicitud firmados, se enviarán a Contratista según instrucción DE INVIAS este deberá realizar la organización de todos los expedientes juntos con sus anexos, formatos firmados y demás entregables conforme a lo indicado en los formatos de la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente debe elaborar el oficio y radicar a la interventoría, dar la aprobación y posteriormente radicar a la entidad. Remitidos por correo electrónico al Contratista 16-10-2025 19 Nov/ INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del estado, ya se encuentra en el contratista
006A-D-T3-MSM	MEJORA / TERMINADA	Interventoría requirió radicación de expedientes terminados al contratista
007-I-T3-MSM	BALDÍO	INVIAS remitió formatos de solicitud firmados, se enviarán a Contratista según instrucción DE INVIAS este deberá realizar la organización de todos los expedientes juntos con sus anexos, formatos firmados y demás entregables conforme a lo indicado en los formatos de la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente debe elaborar el oficio y radicar a la interventoría, dar la aprobación y posteriormente radicar a la entidad. Remitidos por correo electrónico al Contratista 16-10-2025 19 Nov/ INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del estado, ya se encuentra en el contratista
007A-I-T3-MSM	MEJORA / TERMINADA	Interventoría requirió radicación de expedientes terminados al contratista

008-D-T3-MSM	BALDÍO	INVIAS remitió formatos de solicitud firmados, se enviarán a Contratista según instrucción DE INVIAS este deberá realizar la organización de todos los expedientes juntos con sus anexos, formatos firmados y demás entregables conforme a lo indicado en los formatos de la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente debe elaborar el oficio y radicar a la interventoría, dar la aprobación y posteriormente radicar a la entidad. Remitidos por correo electrónico al Contratista 16-10-2025 19 Nov/ INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del estado, ya se encuentra en el contratista
008A-D-T3-MSM	MEJORA / TERMINADA	Interventoría requirió radicación de expedientes terminados al contratista
009A-I-T3-MSM	MEJORA / TERMINADA	Interventoría requirió radicación de expedientes terminados al contratista
010A-I-T3-MSM	MEJORA / TERMINADA	Interventoría requirió radicación de expedientes terminados al contratista
011A-I-T3-MSM	MEJORA / TERMINADA	Interventoría requirió radicación de expedientes terminados al contratista
012-D-T3-MSM	ESCRITURA PÚBLICA	Escritura Pública en Notaria Firmada por el vendedor 14-10-2025, pendiente firma escritura DT INVIAS 15 DIC / ESCRITURA EN PROCESO DE CALIFICACIÓN POR LA ORIP MONTERÍA
014-D-T3-MSM	PARA EXPROPIACIÓN	15 DIC / Notificación por AVISO Surtida - Pendiente Oficio de Inscripción de Oferta en Interventoría

015-A-D-T3-MSM	MEJORA SIN TERMINAR	15 DIC / EN TRAMITE DE PAGO
015-I-T3-MSM	MINUTA ESCRITURA PÚBLICA	Ya se tiene vobo de juridica INVIAS, el contratista esta coadyuva al INVIAS organizando la informacion para remitirla a la DT. 15 DIC / NOTIFICADO Y ACEPTADO
001-I-T4-MSM	BALDÍO	INVIAS remitió formatos de solicitud firmados, se enviarán a Contratista según instrucción DE INVIAS este deberá realizar la organización de todos los expedientes juntos con sus anexos, formatos firmados y demás entregables conforme a lo indicado en los formatos de la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente debe elaborar el oficio y radicar a la interventoría, dar la aprobación y posteriormente radicar a la entidad. Remitidos por correo electrónico al Contratista 16-10-2025 19 Nov/ INVIAS remitió comunicacion de solicitud de baldio a favor del estado, ya se encuentra en el contratista
001A-I-T4-MSM	MEJORA / TERMINADA	SE requirió a contratista remisión de expedientes terminados
002-D-T6-MSM	BALDÍO	19 Nov/ INVIAS remitió comunicacion de solicitud de baldio a favor del estado, ya se encuentra en el contratista 15 DIC / PENDIENTE APROBACIÓN DEL INVÍAS POR MINISTERIO DE LEY
003-I-T6-MSM	OFERTADO-NOTIFICADO	Minuta en revisión de INVIAS 15 DIC / MINUTA DE ESCRITURA EN NOTARÍA DE LORICA (PURISIMA)

004-D-T6-MSM	PARA EXPROPIACIÓN	15 DIC / NOTIFICADO ELECTRONICAMENTE, EN ESPERA DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO (12 DICIEMBRE DE 2025) - ELABORAR CONSTANCIA EJECUTORIA Y DEMANDA DE EXPROPIACIÓN - 18 DICIEMBRE DE 2025
005-D-T6-MSM	MINUTA ESCRITURA PÚBLICA	Pendiente que la propietaria entregue paz y salvo de pago predial para avanzar en suscripción de escritura, fecha plazo 30 de noviembre, si no, proceso de expropiación 15 DIC / ELABORAR RES. DE EXP.
006-D-T6-MSM	OFERTADO-NOTIFICADO	15 DIC / EN RADICACIÓN A LA INTERVENTORÍA DE LOS ALCANCES DE LA OFERTA E INSCRIPCIÓN DE OFERTA
001-D-T7-MSM	BALDÍO	INVIAS remitió formatos de solicitud firmados, se enviarán a Contratista según instrucción DE INVIAS este deberá realizar la organización de todos los expedientes juntos con sus anexos, formatos firmados y demás entregables conforme a lo indicado en los formatos de la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente debe elaborar el oficio y radicar a la interventoría, dar la aprobación y posteriormente radicar a la entidad. Remitidos por correo electrónico al Contratista 16-10-2025 19 Nov/ INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del estado, ya se encuentra en el contratista
001A-D-T7-MSM	MEJORA SIN TERMINAR	21 de octubre invias remitió firmada promesa de compraventa de mejoras, en trámite de pago por el contratista 15 DIC / ENAJENADO
002-D-T7-MSM	MINUTA ESCRITURA PÚBLICA	15 DIC / CONTRATISTA REMITIR MINUTA Y ANEXOS A LA NOTARÍA PURISIMA
003-I-T7-MSM	OFERTADO - SIN NOTIFICAR	15 DIC / ELABORAR RES. DE EXP. - 16 DE DICIEMBRE DE 2025

001-I-T9-MSM	BALDÍO	INVIAS remitió formatos de solicitud firmados, se enviarán a Contratista según instrucción DE INVIAS este deberá realizar la organización de todos los expedientes juntos con sus anexos, formatos firmados y demás entregables conforme a lo indicado en los formatos de la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente debe elaborar el oficio y radicar a la interventoría, dar la aprobación y posteriormente radicar a la entidad. Remitidos por correo electrónico al Contratista 16-10-2025 19 Nov/ INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del estado, ya se encuentra en el contratista
001A-I-T9-MSM	MEJORA / TERMINADA	Se requirió a contratista remisión de expedientes terminados
001B-I-T9-MSM	MEJORA / TERMINADA	Se requirió a contratista remisión de expedientes terminados
002-I-T9-MSM	BALDÍO	INVIAS remitió formatos de solicitud firmados, se enviarán a Contratista según instrucción DE INVIAS este deberá realizar la organización de todos los expedientes juntos con sus anexos, formatos firmados y demás entregables conforme a lo indicado en los formatos de la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente debe elaborar el oficio y radicar a la interventoría, dar la aprobación y posteriormente radicar a la entidad. Remitidos por correo electrónico al Contratista 16-10-2025 INVIAS, remitió a la interventoría, y esta al contratista, la comunicación oficio para solicitud de adjudicación de baldío a favor del estado.

004-D-T9-MSM	BALDÍO	INVIAS remitió formatos de solicitud firmados, se enviarán a Contratista según instrucción DE INVIAS este deberá realizar la organización de todos los expedientes juntos con sus anexos, formatos firmados y demás entregables conforme a lo indicado en los formatos de la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente debe elaborar el oficio y radicar a la interventoría, dar la aprobación y posteriormente radicar a la entidad. Remitidos por correo electrónico al Contratista 16-10-2025 19 Nov/ INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del estado, ya se encuentra en el contratista
005-D-T9-MSM	BALDÍO	INVIAS remitió formatos de solicitud firmados, se enviarán a Contratista según instrucción DE INVIAS este deberá realizar la organización de todos los expedientes juntos con sus anexos, formatos firmados y demás entregables conforme a lo indicado en los formatos de la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente debe elaborar el oficio y radicar a la interventoría, dar la aprobación y posteriormente radicar a la entidad. Remitidos por correo electrónico al Contratista 16-10-2025 19 Nov/ INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del estado, ya se encuentra en el contratista
005A-D-T9-MSM	MEJORA / TERMINADA	Se requirió a contratista remisión de expedientes terminados
001-I-T10-MSM	OFERTADO-NOTIFICADO	15 DIC / En trámite de registro de Alcance de Oferta y de Intención de Saneamiento Automático
002-D-T10-MSM	EN EXPROPIACIÓN	Expropiación, demanda presentada. Pagado y, en etapa de notificación. Ya se ha presentado impulso procesal 15 DIC / DEMANDA DE EXPROPIACIÓN RADICADA EN JUZGADO 5TO C DEL CTO DE BOGOTÁ 11001310300520250025800

003-I-T10-MSM	BALDÍO	INVIAS remitió formatos de solicitud firmados, se enviarán a Contratista según instrucción DE INVIAS este deberá realizar la organización de todos los expedientes juntos con sus anexos, formatos firmados y demás entregables conforme a lo indicado en los formatos de la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente debe elaborar el oficio y radicar a la interventoría, dar la aprobación y posteriormente radicar a la entidad. Remitidos por correo electrónico al Contratista 16-10-2025 19 Nov/ INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del estado, ya se encuentra en el contratista
003A-I-T10-MSM	MEJORA / TERMINADA	SE requirió a contratista remisión de expedientes terminados
004-D-T10-MSM	BALDÍO	INVIAS remitió formatos de solicitud firmados, se enviarán a Contratista según instrucción DE INVIAS este deberá realizar la organización de todos los expedientes juntos con sus anexos, formatos firmados y demás entregables conforme a lo indicado en los formatos de la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente debe elaborar el oficio y radicar a la interventoría, dar la aprobación y posteriormente radicar a la entidad. Remitidos por correo electrónico al Contratista 16-10-2025 19 Nov/ INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del estado, ya se encuentra en el contratista
004A-D-T10-MSM	MEJORA / TERMINADA	SE requirió a contratista remisión de expedientes terminados

005-I-T10-MSM	BALDÍO	INVIAS remitió formatos de solicitud firmados, se enviarán a Contratista según instrucción DE INVIAS este deberá realizar la organización de todos los expedientes juntos con sus anexos, formatos firmados y demás entregables conforme a lo indicado en los formatos de la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente debe elaborar el oficio y radicar a la interventoría, dar la aprobación y posteriormente radicar a la entidad. Remitidos por correo electrónico al Contratista 16-10-2025 19 Nov/ INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del estado, ya se encuentra en el contratista 10 dic, proceso finalizado, viene en preacta 55
005A-I-T10-MSM	MEJORA / TERMINADA	Se requirió a contratista remisión de expedientes terminados
005B-I-T10-MSM	MEJORA SIN TERMINAR	El contratista está pendiente de pago de predio 001-I-T10-MSM (ADIS MACIAS BELLO), para avanzar con el pago de la mejora 15 DIC / PAGADO
006-D-T10-MSM	BALDÍO	INVIAS remitió formatos de solicitud firmados, se enviarán a Contratista según instrucción DE INVIAS este deberá realizar la organización de todos los expedientes juntos con sus anexos, formatos firmados y demás entregables conforme a lo indicado en los formatos de la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente debe elaborar el oficio y radicar a la interventoría, dar la aprobación y posteriormente radicar a la entidad. Remitidos por correo electrónico al Contratista 16-10-2025 19 Nov/ INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del estado, ya se encuentra en el contratista

006A-D-T10-MSM	MEJORA / TERMINADA	Se requirió a contratista remisión de expedientes terminados
007-I-T10-MSM	MINUTA ESCRITURA PÚBLICA	Escritura firmada por las partes, pendientes pagos del trámite notarial 15 DIC / NOTARÍA - MINUTA DE ESCRITURA
007A-I-T10-MSM	MEJORA / TERMINADA	Se requirió a contratista remisión de expedientes terminados
008-I-T10-MSM	BALDÍO	INVIAS remitió formatos de solicitud firmados, se enviarán a Contratista según instrucción DE INVIAS este deberá realizar la organización de todos los expedientes juntos con sus anexos, formatos firmados y demás entregables conforme a lo indicado en los formatos de la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente debe elaborar el oficio y radicar a la interventoría, dar la aprobación y posteriormente radicar a la entidad. Remitidos por correo electrónico al Contratista 16-10-2025 19 Nov/ INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del estado, ya se encuentra en el contratista
008A-I-T10-MSM	MEJORA / TERMINADA	Se requirió a contratista remisión de expedientes terminados
008B-I-T10-MSM	MEJORA / TERMINADA	Se requirió a contratista remisión de expedientes terminados
008C-I-T10-MCM	MEJORA / TERMINADA	Se requirió a contratista remisión de expedientes terminados

009-I-T10-MSM	BALDÍO	INVIAS remitió formatos de solicitud firmados, se enviarán a Contratista según instrucción DE INVIAS este deberá realizar la organización de todos los expedientes juntos con sus anexos, formatos firmados y demás entregables conforme a lo indicado en los formatos de la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente debe elaborar el oficio y radicar a la interventoría, dar la aprobación y posteriormente radicar a la entidad. Remitidos por correo electrónico al Contratista 16-10-2025 19 Nov/ INVIAS remitió comunicación de solicitud de baldío a favor del estado, ya se encuentra en el contratista
009A-I-T10-MSM	MEJORA / TERMINADA	Se requirió a contratista remisión de expedientes terminados
0010-I-T10-MSM	ESCRITURA PÚBLICA	Escritura Pública en Notaria Firmada por el vendedor e INVIAS, se encuentra en registro 31 de octubre. 15 DIC / PENDIENTE CALIFICACIÓN POR LA ORIP LORICA - 30 OCTUBRE DE 2025
0011-D-T10-MSM	OFERTADO - SIN NOTIFICAR	Contratista pendiente de publicación de aviso por parte del INVIAS, se realizara expropiación. 15 DIC / Notificación de Oferta Formal de Compra por AVISO
0012-D-T10-MSM	ESCRITURA PÚBLICA	Escritura Pública firmada por las partes - encuentran en registro desde 31 octubre 15 DIC / PENDIENTE CALIFICACIÓN POR LA ORIP LORICA - 30 OCTUBRE DE 2025
0013-D-T10-MSM	ESCRITURA PÚBLICA	15 DIC / PENDIENTE CALIFICACIÓN POR LA ORIP LORICA - 02 DICIEMBRE DE 2025
0014-I-T10-MSM	MEJORA / TERMINADA	Se requirió a contratista remisión de expedientes terminados

7.1.3. ACTIVIDADES REALIZADAS

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN (Componente técnico)
Reunión	Comité de seguimiento predial realizado el 10 de diciembre.
Revisión	Revisión del componente técnico de la comunicación No. 46820, correspondiente al informe predial mensual.
Revisión	Revisión del componente técnico de la comunicación No. 46868, relacionada con la oferta – Informe 014 D T3.
Revisión	Revisión del componente técnico de la comunicación No. 45398, mediante la cual INVIAS comunica la aprobación de insumos 015A D T3.
Revisión	Revisión del componente técnico de la comunicación No. 46798, relacionada con soportes de desafectación.
Revisión	Revisión del componente técnico de la comunicación No. 446799, relacionada con costos de fichas del gestor catastral.
Revisión	Revisión del componente técnico de la comunicación No. 46922, relacionada con el contrato de compraventa de mejoras – Predio 2D T6.
Revisión	Revisión del componente técnico de la comunicación No. 46845, correspondiente a la Preacta No. 54.
Revisión	Revisión del componente técnico de la comunicación No. 46920, relacionada con la relación de documentos pendientes en INVIAS.
Reunión	Reunión para el 18 de diciembre, con el fin de realizar revisión técnica entre INVIAS, contratista e interventoría, correspondiente a la Preacta Predial No. 55.

7.1.4. RECOMENDACIONES

- Continuar con las gestiones y acercamientos ante el INVIAS, a fin de que se expidan oportunamente los documentos que se encuentran a su cargo (resoluciones, firmas de escrituras, actos administrativos y comunicaciones), los cuales son indispensables para el avance efectivo de la gestión predial del proyecto.
- Organizar, depurar y consolidar los expedientes prediales ya culminados, con el propósito de proceder a su remisión formal a la Interventoría y, posteriormente, al INVIAS para su archivo

definitivo, dando estricto cumplimiento a la normatividad vigente en materia de gestión documental y archivo.

- Adjuntar en los expedientes correspondientes a predios desafectados los soportes documentales validados por la Interventoría que sustentan dicha desafectación, así como, cuando aplique, el folio de matrícula inmobiliaria que evidencie la inexistencia de inscripciones relacionadas con el proyecto vial.
- Mantener y fortalecer las mesas de trabajo semanales con INVIAS, Interventoría y contratista, como mecanismo de seguimiento continuo, articulación institucional y toma oportuna de decisiones frente a los procesos de expropiación, saneamiento automático, escrituración y gestión de mejoras.
- Realizar seguimiento periódico a los procesos en estado de expropiación y saneamiento automático, con el fin de identificar oportunamente cuellos de botella administrativos o jurídicos que puedan afectar el cronograma del proyecto y definir acciones de mitigación.
- Los contratos de los interlocutores de INVIAS finalizan en el mes de diciembre, por lo cual se requiere mantener seguimiento permanente para que, una vez se realicen las nuevas vinculaciones contractuales, se retomen y continúen de manera oportuna las actividades pendientes con dicha entidad



LUIS ARIEL ROMERO PALACIO

C.C. 79960422 de Bogotá

TP. 25222145037CND



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

Se presenta el programa caja –PAC, correspondiente del año 2025, se relaciona los valores de las actas de pago, obra e interventoría de las actividades del mes de diciembre de 2025.

PLAN DE PAGOS AÑO 2025												
INFORME DE SEGUIMIENTO PAC MES DE NOVIEMBRE DE 2025												
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.												
INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL NORTE FECHA DE ELABORACIÓN : DICIEMBRE 2025												
MES EJECUTADO	ACTA#	FECHA RADICADO	No. RADICACIÓN	ACTA	No. FACTURA	VALOR	TOTAL FACTURADO	MES PROGRAMACIÓN PAC	PROGRAMADO PAC (RESERVA)	PROGRAMADO PAC (VIGENCIA)	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN ATRASO - AVANCE
ENERO	44	Enero-2025	7268 DE 18/07/2025	Costos Interventoría	FVL 61	\$ 261.083.486,72	\$ 261.083.486,72	31/03/2025		\$ 169.092.105,25	-\$ 91.991.381,47	Se factura con el personal mínimo para cumplir la vigencia presupuestal 2025.
	43	Diciembre-2024	20488 DE 30/12/2024	Ajuste Provisional		\$ 429.149.084,00	\$ 1.029.185.704,00			\$ 4.536.815.789,50	\$ 3.507.630.085,50	No se alcanza a ejecutar la inversion programada para el mes, No es acorde con el registro presupuestal.
	44	Enero-2025	7258 DE 18/07/2025	Parcial de Obra		\$ 600.036.620,00						
FEBRERO	45	Febrero-2025	7312 DE 21/07/2025	Costos Interventoría	FVL 62	\$ 259.064.328,04	\$ 259.064.328,04	31/03/2025		\$ 169.092.105,25	-\$ 89.972.222,79	Se factura con el personal mínimo para cumplir la vigencia presupuestal 2025.
	45	Febrero-2025	7259 DE 18/07/2025	Parcial de Obra		\$ 741.451.800,00	\$ 741.451.800,00			\$ 4.536.815.789,50	\$ 3.795.363.989,50	No se alcanza a ejecutar la inversion programada para el mes, No es acorde con el registro presupuestal.
MARZO	46	Marzo-2025	7314 DE 21/07/2025	Costos Interventoría	FVL 63	\$ 239.727.455,17	\$ 239.727.455,17	31/03/2025		\$ 169.092.105,25	-\$ 70.635.349,92	Se factura con el personal mínimo para cumplir la vigencia presupuestal 2025.
	46	Marzo-2025	7311 DE 21/07/2025	Parcial de Obra		\$ 859.657.722,00	\$ 859.657.722,00			\$ 4.536.815.789,50	\$ 3.677.158.067,50	No se alcanza a ejecutar la inversion programada para el mes, No es acorde con el registro presupuestal.
ABRIL	47	Abril-2025	7316 DE 21/07/2025	Costos Interventoría	FVL 64	\$ 221.264.389,78	\$ 221.264.389,78	31/05/2025		\$ 169.092.105,25	-\$ 52.172.284,53	Se factura con el personal mínimo para cumplir la vigencia presupuestal 2025.
	47	Abril-2025	7261 DE 18/07/2025	Parcial de Obra		\$ 1.148.083.863,00	\$ 1.148.083.863,00			\$ 4.536.815.789,50	\$ 3.388.731.926,50	No se alcanza a ejecutar la inversion programada para el mes, No es acorde con el registro presupuestal.
MAYO	48	Mayo-2025	7317 DE 21/07/2025	Costos Interventoría	FVL 65	\$ 274.017.346,82	\$ 274.017.346,82	31/05/2025		\$ 169.092.105,25	-\$ 104.925.241,57	Se factura con el personal mínimo para cumplir la vigencia presupuestal 2025.
	48	Mayo-2025	7423 DE 22/07/2025	Parcial de Obra		\$ 885.063.598,00	\$ 885.063.598,00			\$ 4.536.815.789,50	\$ 3.651.752.191,50	No se alcanza a ejecutar la inversion programada para el mes, No es acorde con el registro presupuestal.
JUNIO	49	Junio-2025	11164 DE 03/10/2025	Costos Interventoría	FVL 66	\$ 275.489.046,00	\$ 275.489.046,00	15/06/2025		\$ 212.500.000,00	-\$ 62.989.046,00	Se factura con el personal mínimo para cumplir la vigencia presupuestal 2025.
	42	Noviembre-2024	7340 DE 21/07/2025	Ajuste Definitivo		-\$ 6.980.280,00	\$ 2.462.285.383,00					Se alcanza a ejecutar la inversion programada para el mes, No es acorde con el registro presupuestal.
	43	Diciembre-2024	7340 DE 21/07/2025	Ajuste Definitivo		-\$ 4.743.650,00						
	44	Enero-2025	7340 DE 21/07/2025	Ajuste Definitivo		\$ 290.829.162,00						
	45	Febrero-2025	7341 DE 21/07/2025	Ajuste Definitivo		\$ 185.525.583,00						
	46	Marzo-2025	7342 DE 21/07/2025	Ajuste Definitivo		\$ 369.612.373,00				\$ 912.500.000,00	-\$ 1.549.785.383,00	
	47	Abril-2025	7344 DE 21/07/2025	Ajuste Definitivo		\$ 538.946.854,00						
	48	Mayo-2025	7345 DE 21/07/2025	Ajuste Definitivo		\$ 364.557.219,00						
	49	Junio-2025	9958	Parcial de Obra		\$ 724.538.122,00						
JULIO	50	Julio-2025	11165 DE 03/10/2025	Costos Interventoría	FVL 67	\$ 258.781.703,04	\$ 258.781.703,04	15/07/2025		\$ 212.500.000,00	-\$ 46.281.703,04	Se factura con el personal mínimo para cumplir la vigencia presupuestal 2025.
	49	Junio-2025	9955	Ajuste Definitivo		\$ 278.050.753,00	\$ 820.757.419,00			\$ 912.500.000,00	\$ 91.742.581,00	Se alcanza a ejecutar la inversion programada para el mes, No es acorde con el registro presupuestal.
	50	Julio-2025	9956	Parcial de Obra		\$ 542.706.666,00						
AGOSTO	51	Agosto-2025	11166 DE 03/10/2025	Costos Interventoría	FVL 68	\$ 263.470.046,00	\$ 263.470.046,00	15/08/2025		\$ 212.500.000,00	-\$ 50.970.046,00	Se factura con el personal mínimo para cumplir la vigencia presupuestal 2025.
	50	Julio-2025	9954	Ajuste Definitivo		\$ 203.467.164,00	\$ 820.725.266,00			\$ 912.500.000,00	\$ 91.774.734,00	Se alcanza a ejecutar la inversion programada para el mes, No es acorde con el registro presupuestal.
	51	Agosto-2025	10799 DE 25/09/2025	Parcial de Obra		\$ 617.258.102,00						
SEPTIEMBRE	52	Septiembre-2025	13546 DE 20/11/2025	Costos Interventoría	FVL 69	\$ 260.976.093,98	\$ 260.976.093,98	15/09/2025		\$ 212.500.000,00	-\$ 48.476.093,98	Se factura con el personal mínimo para cumplir la vigencia presupuestal 2025.
	52	Septiembre-2025	12976 DE 10/11/2025	Parcial de Obra		\$ 689.441.740,00	\$ 689.441.740,00			\$ 912.500.000,00	\$ 223.058.260,00	No se alcanza a ejecutar la inversion programada para el mes, se presenta un atraso del 0.211%.

OCTUBRE	53	Octubre-2025	INVIAS-CP-R25-00444 el 17-12-2025	Costos Interventoría		\$ 244.276.627,63	\$ 244.276.627,63	15/10/2025		\$ 212.500.000,00	-\$ 31.776.627,63	Se factura con el personal mínimo para cumplir la vigencia presupuestal 2025
	51	Agosto-2025	EN TRÁMITE	Ajuste Definitivo		\$ 260.148.190,00	\$ 1.136.428.274,00			\$ 912.500.000,00	-\$ 223.928.274,00	No se alcanza a ejecutar la inversion programada para el mes, se presenta un atraso del 0.019%. Lo ejecutado en el mes no es acorde con el registro presupuestal.
	52	Septiembre-2025	14211 DE 01/12/2025	Ajuste Provisional		\$ 201.044.065,00						
	53	Octubre-2025	INVIAS-CP-R25-00444 el 17-12-2025	Parcial de Obra	CI66-162	\$ 675.236.019,00						
NOVIEMBRE	54	Noviembre-2025	EN TRÁMITE	Costos Interventoría		\$ 194.969.190,64	\$ 194.969.190,64	15/11/2025		\$ 212.500.000,00	\$ 17.530.809,36	Se factura con el personal mínimo para cumplir la vigencia presupuestal 2025
	54	Noviembre-2025	EN TRÁMITE	Parcial de Obra		\$ 913.384.974,00	\$ 913.384.974,00			\$ 912.500.000,00	-\$ 884.974,00	No se alcanza a ejecutar la inversión programada para el mes, se presenta un atraso del 4.41%. Lo ejecutado en el mes no es acorde con el registro presupuestal.
DICIEMBRE	55	Diciembre-2025	INVIAS-CP-R25-02194 el 23-12-2025	Costos Interventoría		\$ 194.722.670,24	\$ 194.722.670,24	15/12/2025		\$ 425.000.000,00	\$ 230.277.329,76	Se factura con el personal mínimo para cumplir la vigencia presupuestal 2025
	52	Septiembre-2025	INVIAS-CP-R25-02013 el 22-12-2025	Ajuste Definitivo	CI66 164	-\$ 337.882,00	\$ 3.984.674.463,00			\$ 1.825.000.000,00	-\$ 2.159.674.463,00	No se alcanza a ejecutar la inversión programada. De acuerdo con el programa de inversiones N.º 16 ; se presenta un atraso del 6.65%. La ejecución del mes no es acorde con el registro presupuestal.
	53	Octubre-2025	INVIAS-CP-R25-02013 el 22-12-2025	Ajuste Definitivo	CI66 164	\$ 258.206.218,00						
	54	Noviembre-2025	EN TRÁMITE	Ajuste Provisional		\$ 383.084.156,00						
	55	Diciembre-2025	INVIAS-CP-R25-02178 el 20-12-2025	Parcial de Obra		\$ 3.343.721.971,00						



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

5.5. Informe matriz de riesgos.

A continuación, se presenta la matriz de riesgo con el seguimiento y las acciones que se han venido tomando.

MATRIZ DE RIESGOS																													
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"																													
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO			MONITOREO Y REVISIÓN							
											INVIAS	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABI DAD	IMPACTO	VALORACIO N	CATEGORIA					FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO			¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD	SEGUIMIENTO EN EL PERIODO MES DE DICIEMBRE-2025	MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y RECOMENDACIONES
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Economico	DESABASTECIMIENTO DEL MERCADO. Posible salida del mercado y/o escazes de insumos o materias primas necesarias para la elaboración de las obras objeto del contrato.	Demora en la entrega de las obras.	2	2	4	Riesgo Bajo		X	El contratista deberá ubicar fuentes de suministros alternas que faciliten la continuidad en la ejecución de las obras.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna.	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista			Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual	Se continua con el suministrando de materiales de la cantera VILLA CARMEN. En el mes en curso se han realizado trabajos con mezclas asfálticas suministradas por la Planta CONAMBIEN. La planta del CONSORCIO ISLA 066 es la encargada de abastecer el concreto para las diferentes actividades.	•Durante el periodo se viene utilizando material suministrado por la cantera Villa Carmen. Se realiza seguimiento y control de calidad. •Para la atención de los sitios con severidad moderada se están utilizando mezclas asfálticas suministradas por la planta CONAMBIEN. Se realiza seguimiento y control de calidad. •Se realiza instalación de mezcla MR-40 suministrada por la planta del Consorcio Isla 006 ubicada en el PR4+400 C. Der. Se realiza seguimiento y control de calidad.		
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Economico	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente con el INVIAS. Riesgo que asume INVIAS hasta en los ajustes estipulados contractualmente.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual - generación de solicitudes de reconocimiento económico	3	3	6	Riesgo alto	X	X	Aplicar la fórmula de ajustes determinada por el INVIAS. Vigilar los precios durante la etapa de la ejecución contractual	2	1	3	Riesgo Bajo	si	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista			Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual	Con base en los resultados obtenidos en los valores de las actas de ajustes, se ha evidenciado un alza de los precios no esperados en el contrato. Inicialmente se tenía presupuestada un alza del 13% y se han presentado ajustes por hasta un 41% de los costos directos del acta parcial de obra.	Mensualmente se verifican los índices de cada grupo de ajustes, para calcular el acta definitiva de ajustes.		
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Economico	Riesgos de la salud: Riesgo de generación y propagación de virus y/o enfermedades infecciosas tales como el COVID 19, Zika, Dengue, virus del chikunguña, virus del Nilo occidental.	Impacto negativo en el avance previsto para el cumplimiento del objeto contractual por incremento de ausentismo de personal.	4	3	7	Riesgo Alto.		X	1. Tanto en el proceso de selección de personal así como en la ejecución de las obras, el Contratista deberá implementar todas las medidas necesarias para evitar la propagación de enfermedades infecciosas y/o virus durante los procesos de selección de personal, durante la ejecución de las actividades en los diferentes frentes de trabajo así como en su equipo administrativo y/o directivo, de igual forma, con la comunidad aldeaña a los frentes de obra. 2. El Contratista deberá garantizar la presencia permanente de la totalidad del personal requerido en los frentes de trabajo y en las labores administrativas de la ejecución del mismo, dando estricto cumplimiento en la continuidad del proyecto conforme al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	2	2	4	Riesgo Medio.	SI	Gestores y/o Supervisores, Consorcio Interventor, Consorcio Contratista.			Al inicio de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	La Interventoria deberá verificar la implementación y cumplimiento de las medidas de Bioseguridad y demas necesarias en los distintos frentes de obra.	Diario	* Anilisis y revisión de los conceptos de aptitud medica laboral ingreso, periodicos y egresos de los colaboradores. * Inducción y re-inducción al personal de obra en la implementación del protocolo de bioseguridad. * Seguimiento esquema de vacunación a la población colaboradora. *Divulgación de Política de Vacunación.	* Analizar los conceptos de aptitud medicos laboral de los colaboradores. *Divulgación del Protocolo de Bioseguridad al personal nuevo. *Revisión periódica del esquema de vacunación. *Lavado de manos cuando se sean visiblemente sucias.		
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Economico	Riesgo de limitación en la movilidad: por causa de salubridad pública, restricciones por bloqueos o protestas en los Departamentos, Municipios, Veredas, corregimientos o sectores necesarios para acceder al proyecto o donde se desarrolle el mismo.	Atraso en el cronograma previsto para la ejecución de las obras.	2	2	4	Riesgo Medio.	X	X	1. Tanto contratista como Interventoría deberán garantizar la presencia del personal y de los materiales y/o insumos necesarios para la ejecución de la obra, garantizando la seguridad y existencia de los transportes necesarios para ellos.	1	1	2	Riesgo Bajo.	NO	Gestores y/o Supervisores, Consorcio Interventor, Consorcio Contratista.			Al inicio de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	La interventoría deberá verificar la gestión del Contratista en la planeación e implementación de las formas de acceso a los frentes de obra.	Mensual.	* Verificación de adecuación de accesos seguros de acuerdo a los avances de obra por parte del contratista. *Seguimiento a los reportes meteorológicos del sector basado en el IDEAM. *Monitoreo a los riesgos dinamicos NO contemplados en el Plan de Manejo de Transito, originados por los difernetes actores viales.	* Mantener en todo los frentes de obra senderos para transito temporal del peatón. *Mantener conservación de puntos de acopio para abastecimiento de productos de la región, para distribución al por mayor y definir planes de acción para mitigar impactos negativos. *Plan de Emergencia y Contingencia, se activará en caso de que se requiera y se definiran vías alternas del corredor Santa Lucía - Moñitos en caso de que ser necesario.		

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo de Riesgo	Descripcioin (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO			MONITOREO Y REVISIÓN			
											INVIAS	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABI DAD	IMPACTO	VALORACIO N	CATEGORIA			FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD	SEGUIMIENTO EN EL PERIODO MES DE DICIEMBRE-2025	MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y RECOMENDACIONES
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Economico	Riesgos laborales: Riesgo de demandas laborales y/o civiles y/o administrativas provenientes de personas vinculadas por cualquier medio por el Contratista para el cumplimiento del objeto contractual cuyas causas se atribuyan a enfermedades, enfermedades infecciosas y/o muerte.	Impacto económico al Contratista.	2	2	4	Riesgo Bajo.		X	1. El Contratista deberá implementar todas las medidas necesarias para evitar la propagación de enfermedades infecciosas y/o virus (como el COVID 19), tanto en los frentes de obra, como en su equipo admnistrativo y/o directivo, así como en la comunidad aledaña a los frentes de obra. El Contratista será el único responsable de cualquier consecuencia económica que por este efecto se derive.	1	1	2	Riesgo Bajo.	NO	Gestores y/o Supervisores, Consorcio Interventor, Consorcio Contratista.	Al inicio de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Verificación de la gestión del Contratista para la implementación de las medidas de bioseguridad que eviten la propagación de virus y/o enfermedades infecciosas.	Semanal.	* Se revisa periódicamente la documentación legal como lo es Aportes de Seguridad Social de cada colaborador que se encuentre en la ejecución del proyecto, con sus respectivas novedades de ingreso, retiro, incapacidad, vacaciones determinados en la Ley 100. *Ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se incluye todas las inspecciones, con el objetivos de ser preventivos en todas las actividades que se ejecutan para evitar la ocurrencia de eventos no deseados, para los empleados y la comunidad en general. * Revisión y seguimiento de los indicadores de accidentalidad y ausentismo de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019. *Seguimiento a la ideoneidad humana para ejecutar cada una de las actividades específicas en cada tarea y cargo.	*Realizar cumplimiento del marco normativo aplicable en Colombia y ejecutar las actividades concernientes al SGSST que son ineludible. *Se valida la planillas de aportes de seguridad social de toda la población colaboradora. * Cumplimiento a los lineamientos legales. Programa de Trabajo Seguro en Alturas, los permisos de trabajos para tareas de alto riesgo, diligenciamiento de Analisis de Trabajo Seguro de las demas actividades a ejecutar en el Proyecto de Santa Lucía - Moñitos. * Ejecución de actividades de formación como charlas, capacitación contempladas y surgidas de la Matriz de Identifiación y Valoración de Riesgos, plan de capacitación
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Economico	Riesgo Financiero de alteración del PAC: Riesgo de alteración del PAC por circunstancias no imputables al INSTITUTO o por circunstancias de fuerza mayor o por estados de excepción decretados en el país.	Impacto económico a los flujos financieros del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	X	X	EL INSTITUTO deberá efectuar los trámites admnistrativos que garanticen la disponibilidad de los recursos para la totalidad del plazo del contrato, así como los trámites para contar con el PAC de manera oportuna. Así mismo, se hará monitoreo constante a cualquier circunstancia que impacte la disponibilidad del PAC con el fin de adoptar las medidas que puedan superarlas. Así mismo, el Contratista deberá procesar las cuentas y sus facturas de manera oportuna dando estricto cumplimiento al cronograma de ejecución de obra.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de las condiciones presupuestales del contrato	mensual	El 23 de diciembre de 2025 INVIAS suscribe la PRÓRROGA NÚMERO DOS (02), extendiendo el contrato de obra 923 de 2021 y el contrato de interventoría 1050 de 2021, por 2 meses más. Así las cosas, la nueva fecha de terminación de los contratos sería el 28 de febrero de 2026.	Dentro del informe mensual se reporta seguimiento al PAC del contrato de obra y de interventoría.
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Politicos	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes).	Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto.	2	3	5	Riesgo Medio	X	X	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor- Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Territoriales de INVIAS, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento	En caso de presentarse dicho riesgo se activara los protocolos para la atención oportuna a la situación presentada en el corredor vial. Durante el presente informe se presento una jornada de paro de trasnportadores el día 25 de marzo, la cual impidio que ese día hubiese traslado del personal hacia el sitio de la obra para evitar riesgos	Seguimineto a las activiades de obra que puedan generar afectación a los usuarios de la vía y constante comunicación con la comuidad, con el fin de evitar medidas de hecho a causa de los trabajos que se adelantan en la vía.
8	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente instalación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria y de seguridad industrial, dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de los actores viales en la vía y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.	3	2	5	Riesgo Medio.		X	1. El ente Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación por parte del ente contratista, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	2	2	4	Riesgo Bajo.	NO	Gestores y/o Supervisores, Consorcio Interventor, Consorcio Contratista.	Al inicio de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Inspecciones diarias del ente Interventor, Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos, Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario	*Evaluación y seguimiento a las actualizaciones del contratista al PMT. * Seguimiento al estado de funcionamiento de los dispositivos de canalización vial como son los canecas, barricadas, maletines viales y colombianas. * Inspecciones de equipos de atención de emergencias por brigadistas del Plan de Gestión del Riesgo de Desastre. * Seguimiento y control al cumplimiento del Plan de Manejo del Tránsito del Contratista.	*Inspeccón a la señalización nocturna de acuerdo a los puntos críticos o de mayor riesgo como son las excavaciones en los frentes de obra del corredor vial Santa Lucía Moñitos. *Manterner la Señalización, Demarcación y Delimitación de los frentes de obra. * Formacion de controladores de tránsito en seguridad vial y señalización, demarcación y delimitación de frentes de obra y primeros auxilios. * Realizar inspecciones periódicas en frentes de obra, a la señalización de seguridad vial y dispositivos de canalización.
9	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgos de estudios y diseños: Por Ajuste y/o Actualizacion y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o adecuaciones de estudios y diseños y/o elaboración de estudios realizados por el Contratista: Ocorre cuando se presentan afectaciones que pudieran modificar lo previsto en los estudios y diseños existentes originados por ejemplo en cambios en la naturaleza, en la geología del terreno, intervención Municipal, etc.	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra.	2	2	4	Riesgo Medio		X	Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/O Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor- Contratista	al inicio de la Ajuste y/O Actualizacion y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	al final de la Ajuste y/O Actualizacion y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	la Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Especialistas, al Ajuste y/O Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto.	Semanal en la etapa de Ajuste y/O Actualizacion y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	Se continua con las actividades de ajustes y firma a los estudios y diseños del corredor vial. Del PR2+150 al PR46. Se han presentado diferentes ajustes a los diseños fase III por lo que han surgido mayores cantidades de obras e ítem no previstos.	Con la disposición del equipo de especialistas de la interventoría se ha venido revisando de manera dinámica los ajuste y volúmenes de diseños presentado por el contratista. Buscando alternativas eficientes y económicas que no generen un desequilibrio económico al contrato.

No.	Cíase	Fuente	Etap	Tipo de Riesgo	Descripcíon (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO			MONITOREO Y REVISIÓN							
											INVIAS	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO			¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD	SEGUIMIENTO EN EL PERIODO MES DE DICIEMBRE-2025	MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y RECOMENDACIONES
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo de operación: Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	2	2	4	Riesgo Bajo		X	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	diario	En el mes de diciembre de 2025 no se presentan riesgos de operación.	Mediante la supervisión diaria de la interventoría se verifican y controlan las actividades de obra que se adelantan. En caso de observaciones durante los trabajos, se notifica al contratista para que tome los correctivos del caso.				
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo de Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. INVIAS asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual.	3	3	6	Riesgo Medio	X	X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la ejecución de la obra .	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Análisis y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.	mensual	- La Interventoría aprueba las actividades y las cantidades de obra ejecutadas, basados en los estudios y diseños del proyecto. - En diferentes sectores han surgido nuevas actividades no previstas necesarias para el desarrollo del contrato.	En el presente mes se viene realizando seguimiento a las cantidades ejecutadas de acuerdo con el acta de modificación # 16 y actas de fijación APU NP#1,2,3,4, 5 y 6.				
12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional - Social	Riesgo Expropiación Predial: Se refiere al caso en el que se requiera recurrir al proceso de expropiación. El contratista prestará la colaboración requerida en el proceso de expropiación	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por dificultad en gestión predial que afecta la ejecución del proyecto	3	2	5	Riesgo Bajo	X	X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Seguimiento constante a la actividad de expropiación en caso que se ejecute, diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible.	2	2	4	Riesgo Bajo	Puede afectarla en cuanto depende de procesos legales	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la etapa de adquisición de predios	Al final de la etapa de adquisición de predios	Comites Técnicos, Seguimiento constante al proceso de expropiación, informes de los responsables de la gestión predial, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal	Para el mes de diciembre se reporta 1 predio en proceso de expropiación, sin embargo en comité se identifican posiblemente 5 predios mas que requieren adelantar dicha actuación y que consecuentemente se estan elaborando y gestionando los insumos	predio 002-D-T10-MSM en Expropiación, demanda presentada. Pagado y, en etapa de notificación. El predio se encuentra intervenido, Se debe estar atento a finde realizar la respectiva representacion judicial y acciones que dentro del proceso judicial se requieran y con esto buscar eviatr realizar mayores pagos al determinado en la oferta del bien. Asi mismo, dentro de las medidas de control, se insto al concesionario y al INVIAS a gestionar con celeridad la documentación pendiente para interponer la respectiva demanda.				
13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo de Adquisición Predial: Mayor adquisicion predial por cambios requeridos justificados técnicamente. INVIAS asume el riesgo del costo predial con cargo al contrato; el Contratista efectua la gestion de la adquisicion predial.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por gestión Y costo predial para las nuevas adquisiciones requeridas	2	3	5	Riesgo Medio	X	X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Analizar los cambios de las condiciones técnicas tratando de ajustarlos para que no impacte negativamente el proyecto. Diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible en la adquisición.	2	2	4	Riesgo Bajo	Puede demorar la ejecución en cuanto depende de terceros.	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la etapa de adquisición de predios	Al final de la etapa de adquisición de predios	Comites Técnicos, Seguimiento constante al proceso de adquisición predial, informes de los responsables de la gestión predial, requerimientos escritos- Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal	No se evidencia la necesidad de mayor adquisición por cambios técnicos. Sin embargo, se ha advertido frite a una alta probabilidad de que la gestión predial no se culmine en los tiempos establecidos contractualmente.	Se realizan mesas de trabajo,presenciales y virtuales, entre Contratista, Interventoría e INVIAS, con el fin de avanzar en la revisión y aprobación de insumos.				
14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo de Logística: Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al Contratista verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear.	Impacto económico al Contratista	3	2	5	Riesgo Medio		X	Disponer y asegurar las fuentes de los suministros e los insumos requeridos para la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. Informes de interventoría.	mensual	La verificación de las fuentes de materiales por parte del contratista es un proceso clave para garantizar la calidad, el cumplimiento de plazos y presupuestos, y la viabilidad del proyecto a largo plazo. Este proceso también involucra aspectos legales, ambientales y logísticos que deben ser cuidadosamente evaluados.	Actualizar el plan de manejo ambiental según sea necesario para reflejar los cambios implementados. Se deberá verificar que el contratista cumpla con los requisitos ambientales establecidos en el plan de manejo ambiental actualizad				

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO			MONITOREO Y REVISIÓN			
											INVIAS	PROponente y/o CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA								
24	General	Externo	Ejecución	Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza	Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños	1	4	5	Riesgo Medio	X	X	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con INVIAS el tratamiento contractual al proyecto.	1	3	4	Bajo	SI	Contratista	Etapas precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar	En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento.	Teniendo en cuenta la respuesta del ICANH donde se emite que para el presente corredor vial no es una zona de altamente arqueologica, se realiza el seguimiento para establecer el protocolo de hallazgos fortuitos según la normatividad vigente en aras de implementar estrategias acorde a la directriz para la protección al patrimonio arqueológico y cultural. Durante el periodo no se presento ninguna fuerza mayor no asegurable para el proyecto.	Seguimiento sobre las charlas que se deben realizar a todo el personal que ingresa al proyecto sobre los protocolos de hallazgos fortuitos.

5.6. Información Otros Programas y Aplicativos

Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.: Se viene realizando los levantamientos topográficos respectivos el cual se plasmarán en los planos las coordenadas geográficas del cual se tramitará el correspondiente certificado

CIFRA, se actualiza el avance del proyecto en la plataforma de control de proyectos de infraestructura vial "CIFRA" dando un estado de proceso total 236 reportados.

PAGA Y PMA

Seguimiento a la implementación de los programas y proyectos establecidos en el PAGA durante la ejecución de las obras para mitigar, corregir, compensar y/o eliminar impactos negativos y potenciar los impactos positivos sobre el medio ambiente y el ser humano, generados por las actividades constructivas referidas al contrato de obra.

Programa cívicos guardavías – Veedurías ciudadana.

Durante el periodo no se realizaron actividades con la veeduría ciudadana.

La veeduría ciudadana continúa utilizando los siguientes canales de comunicación: WhatsApp y correo electrónico smveeduriaciudadana2021@gmail.com para notificaciones y demás situaciones que se requieran en atención a la comunidad.

Programa rodando en la vía

Se informa que esta interventoría creó el canal en YouTube, para mantener informada a la comunidad en lo referente al avance de obra, se carga video del avance correspondiente al mes de diciembre de 2025.

Canal ConsorcioVialNorte

Periodo	Link
Junio-21	https://www.youtube.com/watch?v=jMvnAk3_iU&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Julio-21	https://www.youtube.com/watch?v=9D4t7KfdsWM&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Agosto-21	https://www.youtube.com/watch?v=Z8FMpN238hI&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Septiembre-21	https://www.youtube.com/watch?v=PB-CNeKmEQo&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Octubre-21	https://www.youtube.com/watch?v=BDsTqkgm8MA&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Noviembre-21	https://www.youtube.com/watch?v=iLZDsKKnSOA&ab_channel=ConsorcioVialNorte

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Periodo	Link
Diciembre-21	https://www.youtube.com/watch?v=M9eYG4IFbWo&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Enero-22	https://www.youtube.com/watch?v=ZAJ-EgurycM
Febrero-22	https://www.youtube.com/watch?v=UnXQeVGlu10&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Marzo-22	https://www.youtube.com/watch?v=V0Awuehno_Y&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Abril-22	https://www.youtube.com/watch?v=ZZb4OnXfJz4
Mayo-22	https://www.youtube.com/watch?v=FE-gVbuzPBQ&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Junio-22	https://www.youtube.com/watch?v=C6ESRRULMmA&feature=youtu.be&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Julio-22	https://www.youtube.com/watch?v=xFLJdw3pcs4
Agosto-22	https://www.youtube.com/watch?v=zIPlyZmkIWM&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Septiembre-22	https://www.youtube.com/watch?v=4vqpn500RBc&ab_channel=ConsorcioVialNorte
Octubre-22	https://www.youtube.com/watch?v=vDioqaUWrZk
Noviembre-22	https://www.youtube.com/watch?v=OiEQo-zCKg
Diciembre-22	https://www.youtube.com/watch?v=Zc1LP4RsZVQ
Enero-23	https://www.youtube.com/watch?v=Krm3b-QZ6E
Febrero-23	https://www.youtube.com/watch?v=FFbbYlu4n60
Marzo-23	https://www.youtube.com/watch?v=Uv-4Z9FSGS0
Abril-23	https://www.youtube.com/watch?v=ObM3DFGyRu4
Mayo-23	https://www.youtube.com/watch?v=Z9bQrcS0un0
Junio-23	https://www.youtube.com/watch?v=XoNnDqylZxw
Julio-23	https://www.youtube.com/watch?v=4HgmFVbuQLw
Agosto-23	https://www.youtube.com/watch?v=nigsZGADp1I
Septiembre-23	https://www.youtube.com/watch?v=0ziaYC6GGsY

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Periodo	Link
Octubre-23	https://www.youtube.com/watch?v=D2Cj-r1f1Aw
Noviembre-23	https://www.youtube.com/watch?v=iaRIMdnVSEE
Diciembre-23	https://www.youtube.com/watch?v=52vHt2rLsg4
Enero-24	https://www.youtube.com/watch?v=kGYKGV03LKo
Febrero-24	https://www.youtube.com/watch?v=qoCo6J8S7sl
Marzo - 24	https://www.youtube.com/watch?v=w61s7KqXkd8 parte I https://youtu.be/aoTr3Pg2ny4 parte II
Abril- 24	https://www.youtube.com/watch?v=PhKsWXeP4hg
Mayo-24	https://www.youtube.com/watch?v=5k5lsFrR8dc
Junio-24	https://www.youtube.com/watch?v=Wj2KYrxyc
Julio-24	https://www.youtube.com/watch?v=CT-4D6ccM7g
Agosto-24	https://www.youtube.com/watch?v=HAK4nNm0scg
Septiembre-24	https://www.youtube.com/watch?v=mHSw_5tzVJQ
Octubre-24	https://www.youtube.com/watch?v=EIWNVUvrZU
Noviembre-24	https://www.youtube.com/watch?v=1Px2Fj-SepU
Diciembre-24	https://www.youtube.com/watch?v=XUnIJ3CDUJA
Enero-25	https://www.youtube.com/watch?v=20DGHQ3qjxU
Febrero-25	https://www.youtube.com/watch?v=mxAXamejiSM
Marzo - 25	https://www.youtube.com/watch?v=gGLIRMTY3Ck
Abril- 25	https://www.youtube.com/watch?v=whEdToNggFE
Mayo-25	https://www.youtube.com/watch?v=7JanW4vxPbg
Junio-25	https://www.youtube.com/watch?v=-cjyG6JTqmU
Julio-25	https://www.youtube.com/watch?v=VAJKnXuuXOs

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Periodo	Link
Agosto-25	https://www.youtube.com/watch?v=nigsZGADp1I
Septiembre-25	https://www.youtube.com/watch?v=ZdEDlw9v9G4
Octubre-25	https://www.youtube.com/watch?v=k0hN-xsEPHk
Noviembre-25	https://www.youtube.com/watch?v=0VUKdaH8myM
Diciembre-25	https://www.youtube.com/watch?v=ZGn0gRzNSwE

Programa de reincorporación

En el mes de diciembre de 2025 no se presentó vinculación de personal por reincorporación.

Continúa activa la consulta realizada por el contratista y la interventoría desde el inicio del contrato solicito ante la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN un listado de personas que presentaran esta condición para realizar la vinculación siendo negativa la respuesta según comunicado No OFI21-019233 / IDM 112000, donde informaron que para el Contrato de Obra No 923 de 2021 y Contrato de Interventoría No 1050 de 2021, no existen personas inscritas en dicha condición.

Programa de generación de empleo

En cuanto a la generación de empleo se continúa dando cumplimiento a lo enunciado en el pliego de condiciones donde la interventoría realiza verificación al cumplimiento:

A continuación, se relaciona el personal que se encuentra dentro del programa de generación de empleo:

Tabla 10. Relación personal Programa Generación de Empleo

CATEGORIA	CONTRATISTA	INTEVENTORÍA
Mujeres vinculadas al proyecto	6	9
Hombre /mujeres cabeza de familia	3	1
Reinsertados	0	0
Jóvenes entre 18 y 28 años	13	1

Fuente. Elaboración del Consorcio Vial Norte

Vinculación madres cabeza de familia y/o víctimas.

Para el presente periodo el Contratista consorcio Isla 066 de 2020 tiene vinculados en su equipo de trabajo 06 mujeres al proyecto, de las cuales 3 son del área operativa y 3 del área administrativa. de las cuales 03 son madres cabeza de familia.

Por parte de la Interventoría se tienen vinculadas 9 mujeres de las cuales 1 es del área operativa y 8 son del área administrativa. De las cuales 1 es madre cabeza de familia.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6.1. Equipo Contrato de Interventoría

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

	FECHA	5/01/2026 (Día / Mes / Año)
--	-------	---

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
-------------------------------	--------------------------------

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																															
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: dic-25 CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1050 de 2021 CONTRATO DE OBRA No. 923 de 2021	PROYECTO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030": MÓDULO 3 INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL NORTE CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020																														

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA	PLACA JXS 557, NISSAN FRONTIER, 2.488CC, MODELO 2022	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMIONETA	PLACA KWL189, NISSAN FRONTIER, 2.488CC, MODELO 2022	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ESTACIÓN TOTAL	Geomax ZIPP10RPRO Serie 2107095	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
NIVEL AUTOMÁTICO	Geomax ZAL132 Serie 303673	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	


CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

 (Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
 (Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:
 ESTACIÓN TOTAL Geomax ZIPP10RPRO Serie 2107095 PRÓXIMA FECHA DE CALIBRACIÓN 23 de ENERO de 2026
 NIVEL AUTOMÁTICO Geomax ZAL132 Serie 303673 PRÓXIMA FECHA A CALIBRAR 07 DE MAYO DE 2026
 CAMIONETA PLACA JXS557 VIGENCIA DE SOAT HASTA 08/09/2026
 CAMIONETA PLACA KWL189 VIGENCIA DE SOAT HASTA 02/12/2026

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.
NOTAS:
 1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
 2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
 3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
 4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma 

Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS GARCIA
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 2520203053 CND

Firma 

Nombre: EILEEN OBEIMAR ALCARDY GALEANO
 Supervisor del Contrato de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de

Interventoría

MEPI-MN1-IN-15-FR-7



VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL	
---	--

El Interventor adjunta la certificación de fecha a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

La responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

Es responsabilidad del Supervisor del contrato de Interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal promite aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.

El Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

El Interventor es el responsable de verificar que los contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

0. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-9							
				VERSIÓN	1							
				PÁGINA	1 DE 2							
				FECHA		diciembre 2025 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021				INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE								
MES INFORME MENSUAL: dic-25				INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". PROYECTO: MÓDULO 3								
CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021				CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066 - 2020								
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2021	432821	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	Nación	principal	\$ 1.500.000.000,00	\$ -					
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	Nación	principal	\$ 78.935.467,00	\$ -					
		TOTAL				\$ 1.578.935.467,00	\$ -					
2022	100522	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	Nación	principal	\$ 2.023.610.025,00	\$ -					
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	Nación	principal	\$ 162.914.989,00	\$ -					
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	Nación	principal	\$ 24.001.302,00	\$ -					
		TOTAL				\$ 2.210.526.316,00	\$ -					
2023	103523	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	Nación	principal	\$ 2.890.871.463,00	\$ -					
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	Nación	principal	\$ 232.735.700,00	\$ -					
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	Nación	principal	\$ 34.287.574,00	\$ -					
2024	1341923	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	Nación	principal	\$ 542.000.000,00	\$ -					
		TOTAL				\$ 3.699.894.737,00	\$ -					
		C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	11	Nación	principal	\$ 2.890.871.464,00	\$ -					
2024	158824	C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	11	Nación	principal	\$ 232.735.699,00	\$ -					
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	Nación	principal	\$ 34.287.574,00	\$ -					
		TOTAL				\$ 3.157.894.737,00	\$ -					
2025	139925	C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	11	Nación	principal	\$ 1.106.253.821,00	\$ -					
		C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	11	Nación	principal	\$ 214.832.953,00	\$ -					
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	Nación	principal	\$ 31.650.068,00	\$ -					
2025	388125	C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	Nación	Adición No.1	\$ 377.694.415,00	\$ -					
		C-2401-0600-96-51102D-2401029-02	11	Nación	Adición No.1	\$ 1.322.305.585,00	\$ 346.382.885,82					
		TOTAL				\$ 3.052.736.842,00	\$ 346.382.885,82					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 13.699.988.099,00												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	JUNIO DE 2021	\$ 5.567.240,00	\$ 1.057.776,00	\$ 6.625.016,00	\$ -	\$ 6.625.016,00		432821 De 26/05/2021	\$ 1.572.310.451,00	\$ 11.993.363.083,00	105875 DE 10/11/2021	
2	JULIO DE 2021	\$ 39.902.600,00	\$ 7.581.494,00	\$ 54.109.110,00	\$ -	\$ 47.484.094,00		432821 De 26/05/2021	\$ 1.524.826.357,00	\$ 11.945.878.989,00	87252 DE 21/09/2021	
	ANTICIPO 1			\$ 504.201.181,00		\$ 504.201.181,00		432821 De 26/05/2021	\$ 1.020.625.176,00		73470 DE 18/08/2021	
3	AGOSTO DE 2021	\$ 91.462.600,00	\$ 17.377.894,00	\$ 162.949.604,00	\$ 10.289.820	\$ 98.550.674,00	\$ 493.911.361	432821 De 26/05/2021	\$ 922.074.502,00	\$ 11.837.038.495,00	87851 DE 23/09/2021	
4	SEPTIEMBRE DE 2021	\$ 133.582.560,00	\$ 25.380.686,00	\$ 321.912.850,00	\$ 10.289.820	\$ 148.673.426,00	\$ 483.621.541	432821 De 26/05/2021	\$ 773.401.076,00	\$ 11.678.075.249,00	113728 DE 29/11/2021	
5	OCTUBRE DE 2021	\$ 138.358.540,00	\$ 26.288.123,00	\$ 486.559.513,00	\$ 10.289.820	\$ 154.356.843,00	\$ 473.331.721	432821 De 26/05/2021	\$ 619.044.233,00	\$ 11.513.428.586,00	119350 DE 13/12/2021	
6	NOVIEMBRE DE 2021	\$ 144.901.920,00	\$ 27.531.365,00	\$ 658.992.798,00	\$ 10.289.820	\$ 162.143.465,00	\$ 463.041.901	432821 De 26/05/2021	\$ 456.900.768,00	\$ 11.340.995.301,00	121243 DE 15/12/2021	
7	DICIEMBRE DE 2021	\$ 149.210.600,00	\$ 28.350.014,00	\$ 836.553.412,00	\$ 10.289.820	\$ 167.270.794,00	\$ 452.752.081	432821 De 26/05/2021	\$ 289.629.974,00	\$ 11.163.434.687,00	123536 DE 20/12/2021	
	ANTICIPO 2			\$ 289.629.974,00		\$ 742.382.055		432821 De 26/05/2021	\$ -		124265 DE 21/12/2021	Adición de Anticipo por valor de \$289.629.974
8	ENERO DE 2022	\$ 162.413.940,00	\$ 30.858.649,00	\$ 1.029.826.001,00	\$ 61.865.171	\$ 131.407.418,00	\$ 680.516.884	100522 De 25/01/2022	\$ 2.079.118.898,00	\$ 10.970.162.098,00	31855 DE 31/03/2022	
9	FEBRERO DE 2022	\$ 180.968.470,00	\$ 34.384.009,00	\$ 1.245.178.480,00	\$ 61.865.171	\$ 153.487.308,00	\$ 618.651.713	100522 De 25/01/2022	\$ 1.925.631.590,00	\$ 10.754.809.619,00	48853 DE 12/05/2022	
10	MARZO DE 2022	\$ 193.215.780,00	\$ 36.710.998,00	\$ 1.475.105.258,00	\$ 61.865.171	\$ 168.061.607,00	\$ 556.786.542	100522 De 25/01/2022	\$ 1.757.569.983,00	\$ 10.524.882.841,00	56306 DE 01/06/2022	
11	ABRIL DE 2022	\$ 191.876.600,00	\$ 36.456.554,00	\$ 1.703.438.412,00	\$ 61.865.171	\$ 166.467.983,00	\$ 494.921.371	100522 De 25/01/2022	\$ 1.591.102.000,00	\$ 10.296.549.687,00	63442 DE 16/06/2022	
12	MAYO DE 2022	\$ 192.814.400,00	\$ 36.634.736,00	\$ 1.932.887.548,00	\$ 61.865.171	\$ 167.583.965,00	\$ 433.056.200	100522 De 25/01/2022	\$ 1.423.518.035,00	\$ 10.067.100.551,00	79077 de 28/07/2022	
13	JUNIO DE 2022	\$ 182.577.340,00	\$ 34.689.695,00	\$ 2.150.154.583,00	\$ 61.865.171	\$ 155.401.864,00	\$ 371.191.029	100522 De 25/01/2022	\$ 1.268.116.171,00	\$ 9.849.833.516,00	83154 de 05/08/2022	
14	JULIO DE 2022	\$ 210.409.238,00	\$ 39.977.755,00	\$ 2.400.541.576,00	\$ 61.865.171	\$ 188.521.822,00	\$ 309.325.858	100522 De 25/01/2022	\$ 1.079.594.349,00	\$ 9.599.446.523,00	105106 de 29/09/2022	
15	AGOSTO DE 2022	\$ 245.014.853,00	\$ 46.552.822,00	\$ 2.692.109.251,00	\$ 77.331.464	\$ 214.236.211,00	\$ 231.994.394	100522 De 25/01/2022	\$ 865.358.138,00	\$ 9.307.878.848,00	115036 de 24/10/2022	
16	SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 250.320.022,00	\$ 47.560.804,00	\$ 2.989.990.077,00	\$ 77.331.464	\$ 220.549.362,00	\$ 154.662.930	100522 De 25/01/2022	\$ 644.808.776,00	\$ 9.009.998.022,00	138511 de 16/12/2022	
17	OCTUBRE DE 2022	\$ 225.220.976,00	\$ 42.791.985,00	\$ 3.258.003.038,00	\$ 77.331.464	\$ 190.681.497,00	\$ 77.331.466	100522 De 25/01/2022	\$ 454.127.279,00	\$ 8.741.985.061,00	142278 de 22/12/2022	
18	NOVIEMBRE DE 2022	\$ 225.561.554,00	\$ 42.856.695,00	\$ 3.526.421.287,00	\$ 77.331.466	\$ 191.086.783,00	\$ -	100522 De 25/01/2022	\$ 263.040.496,00	\$ 8.473.566.812,00	143712 de 27/12/2022	
19	DICIEMBRE DE 2022	\$ 221.042.434,00	\$ 41.998.062,00	\$ 3.789.461.783,00	\$ -	\$ 263.040.496,00	\$ -	100522 De 25/01/2022	\$ -	\$ 8.210.526.316,00	145181 de 30/12/2022	
20	ENERO DE 2023	\$ 226.245.288,00	\$ 42.986.605,00	\$ 4.058.693.676,00	\$ -	\$ 269.231.893,00	\$ -	103523 De 02/02/2023	\$ 2.888.662.844,00	\$ 7.941.294.423,00	37849 de 18/04/2023	
21	FEBRERO DE 2023	\$ 227.817.467,00	\$ 43.285.319,00	\$ 4.329.796.462,00	\$ -	\$ 271.102.786,00	\$ -	103523 De 02/02/2023	\$ 2.617.560.058,00	\$ 7.670.191.637,00	37860 de 18/04/2023	
22	MARZO DE 2023	\$ 241.617.586,00	\$ 45.907.341,00	\$ 4.617.321.389,00	\$ -	\$ 287.524.927,00	\$ -	103523 De 02/02/2023	\$ 2.330.035.131,00	\$ 7.382.666.710,00	47662 de 15/05/2023	
23	ABRIL DE 2023	\$ 236.634.785,00	\$ 44.960.609,00	\$ 4.898.916.783,00	\$ -	\$ 281.595.394,00	\$ -	103523 De 02/02/2023	\$ 2.048.439.737,00	\$ 7.101.071.316,00	64743 de 05/07/2023	
24	MAYO DE 2023	\$ 238.393.965,00	\$ 45.294.853,00	\$ 5.182.605.601,00	\$ -	\$ 283.688.818,00	\$ -	103523 De 02/02/2023	\$ 1.764.750.919,00	\$ 6.817.382.498,00	64341 de 04/07/2023	

25	JUNIO DE 2023	\$ 237.303.290,00	\$ 45.087.625,00	\$ 5.464.996.516,00	\$ -	\$ 282.390.915,00	\$ -	103523 De 02/02/2023	\$ 1.482.360.004,00	\$ 6.534.991.583,00	75671 de 04/08/2023	
26	JULIO DE 2023	\$ 272.724.036,00	\$ 51.817.567,00	\$ 5.789.538.119,00	\$ -	\$ 324.541.603,00	\$ -	103523 De 02/02/2023	\$ 1.157.818.401,00	\$ 6.210.449.980,00	82281 de 27/09/2023	
27	AGOSTO DE 2023	\$ 274.355.362,00	\$ 52.127.519,00	\$ 6.116.021.000,00	\$ -	\$ 326.482.881,00	\$ -	103523 De 02/02/2023	\$ 831.335.520,00	\$ 5.883.967.099,00	82161 de 25/09/2023	
28	SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 274.487.317,00	\$ 52.152.590,23	\$ 6.442.660.907,23	\$ -	\$ 326.639.907,23	\$ -	103523 De 02/02/2023	\$ 504.695.612,77	\$ 5.557.327.191,77	83955 el 31/10/2023 84803 el 14/11/2023	
29	OCTUBRE DE 2023	\$ 285.151.833,00	\$ 54.178.848,27	\$ 6.781.991.588,50	\$ -	\$ 339.330.681,27	\$ -	103523 De 02/02/2023	\$ 165.364.931,50	\$ 5.217.996.510,50	85473 el 22/11/2023	
30	NOVIEMBRE DE 2023	\$ 295.129.167,00	\$ 56.074.541,73	\$ 7.133.195.297,23	\$ -	\$ 351.203.708,73	\$ -	103523 De 02/02/2023	\$ 356.161.222,77	\$ 4.866.792.801,77	88322 el 13/12/2023	
31	DICIEMBRE DE 2023	\$ 292.316.877,00	\$ 55.540.206,63	\$ 7.481.052.380,86	\$ -	\$ 347.857.083,63	\$ -	103523 De 02/02/2023	\$ 8.304.139,14	\$ 4.518.935.718,14	88347 el 13/12/2023	
32	ENERO DE 2024	\$ 257.348.986,00	\$ 48.896.307,34	\$ 7.787.297.674,20	\$ -	\$ 306.245.293,34	\$ -	103523 De 02/02/2023	\$ -	\$ 4.212.690.424,80		
								158824 De 07/03/2024	\$ 2.859.953.582,80		2340 de 10/04/2024	
33	FEBRERO DE 2024	\$ 265.142.429,00	\$ 50.377.061,51	\$ 8.102.817.164,71	\$ -	\$ 315.519.490,51	\$ -	158824 De 07/03/2024	\$ 2.544.434.092,29	\$ 3.897.170.934,29	2339 de 10/04/2024	
34	MARZO DE 2024	\$ 262.284.000,00	\$ 49.833.960,00	\$ 8.414.935.124,71	\$ -	\$ 312.117.960,00	\$ -	158824 De 07/03/2024	\$ 2.232.316.132,29	\$ 3.585.052.974,29	3673 de 06/05/2024	
35	ABRIL DE 2024	\$ 258.435.126,00	\$ 49.102.673,94	\$ 8.722.472.924,65	\$ -	\$ 307.537.799,94	\$ -	158824 De 07/03/2024	\$ 1.924.778.332,35	\$ 3.277.515.174,35	5248 de 04/06/2024	
36	MAYO DE 2024	\$ 262.407.993,00	\$ 49.857.518,67	\$ 9.034.738.436,32	\$ -	\$ 312.265.511,67	\$ -	158824 De 07/03/2024	\$ 1.612.512.820,68	\$ 2.965.249.662,68	6473 de 26/06/2024	
37	JUNIO DE 2024	\$ 207.696.294,00	\$ 39.462.295,86	\$ 9.281.897.026,18	\$ -	\$ 247.158.589,86	\$ -	158824 De 07/03/2024	\$ 1.365.354.230,82	\$ 2.718.091.072,82	7753 de 24/07/2024	
38	JULIO DE 2024	\$ 197.049.904,00	\$ 37.439.481,76	\$ 9.516.386.411,94	\$ -	\$ 234.489.385,76	\$ -	158824 De 07/03/2024	\$ 1.130.864.845,06	\$ 2.483.601.687,06	10766 de 10/09/2024	
39	AGOSTO DE 2024	\$ 183.046.953,00	\$ 34.778.921,07	\$ 9.734.212.286,01	\$ -	\$ 217.825.874,07	\$ -	158824 De 07/03/2024	\$ 913.038.970,99	\$ 2.265.775.812,99	12061 de 01/10/2024	
40	SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 153.983.734,00	\$ 29.256.909,46	\$ 9.917.452.929,47	\$ -	\$ 183.240.643,46	\$ -	158824 De 07/03/2024	\$ 729.798.327,53	\$ 2.082.535.169,53	16341 de 21/11/2024	
41	OCTUBRE DE 2024	\$ 232.363.242,00	\$ 44.149.015,98	\$ 10.193.965.187,45	\$ -	\$ 276.512.257,98	\$ -	158824 De 07/03/2024	\$ 453.286.069,55	\$ 1.806.022.911,55	17111 de 04/12/2024	
42	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 215.125.218,00	\$ 40.873.791,42	\$ 10.449.964.196,87	\$ -	\$ 255.999.009,42	\$ -	158824 De 07/03/2024	\$ 197.287.060,13	\$ 1.550.023.902,13	19161 de 16/12/2024	
43	DICIEMBRE DE 2024	\$ 165.787.445,49	\$ 31.499.614,64	\$ 10.647.251.257,00	\$ -	\$ 197.287.060,13	\$ -	158824 De 07/03/2024	\$ -	\$ 1.352.736.842,00	20418 de 30/12/2024	
44	ENERO DE 2025	\$ 219.397.888,00	\$ 41.685.598,72	\$ 10.908.334.743,72	\$ -	\$ 261.083.486,72	\$ -	139925 De 10/03/2025	\$ 2.791.653.355,28	\$ 1.091.653.355,28	7268 de 18/07/2025	
45	FEBRERO DE 2025	\$ 196.773.580,00	\$ 37.386.980,20	\$ 11.142.495.303,92	\$ -	\$ 234.160.560,20	\$ -	139925 De 10/03/2025	\$ 2.557.492.795,08	\$ 857.492.795,08	7312 de 21/07/2025	
46	MARZO DE 2025	\$ 183.080.223,00	\$ 34.785.242,37	\$ 11.360.360.769,29	\$ -	\$ 217.865.465,37	\$ -	139925 De 10/03/2025	\$ 2.339.627.329,71	\$ 639.627.329,71	7314 de 21/07/2025	
47	ABRIL DE 2025	\$ 185.936.462,00	\$ 35.327.927,78	\$ 11.581.625.159,07	\$ -	\$ 221.264.389,78	\$ -	139925 De 10/03/2025	\$ 2.118.362.939,93	\$ 418.362.939,93	7316 de 21/07/2025	
	ADICIÓN No.1							388125 De 21/05/2025	\$ 1.700.000.000,00	\$ 2.118.362.939,93		
48	MAYO DE 2025	\$ 230.266.678,00	\$ 43.750.668,82	\$ 11.855.642.505,89	\$ -	\$ 274.017.346,82	\$ -	139925 De 10/03/2025	\$ 1.844.345.593,11	\$ 1.844.345.593,11	7317 de 21/07/2025	
								388125 De 21/05/2025	\$ 1.700.000.000,00			
49	JUNIO DE 2025	\$ 231.503.400,00	\$ 43.985.646,00	\$ 12.131.131.551,89	\$ -	\$ 275.489.046,00	\$ -	139925 De 10/03/2025	\$ -	\$ 1.568.856.547,11	11164 de 03/10/2025	
								388125 De 21/05/2025	\$ 3.268.856.547,11			
50	JULIO DE 2025	\$ 217.463.616,00	\$ 41.318.087,04	\$ 12.389.913.254,93	\$ -	\$ 258.781.703,04	\$ -	388125 De 21/05/2025	\$ 3.010.074.844,07	\$ 1.310.074.844,07	11165 de 03/10/2025	
51	AGOSTO DE 2025	\$ 221.403.400,00	\$ 42.066.646,00	\$ 12.653.383.300,93	\$ -	\$ 263.470.046,00	\$ -	388125 De 21/05/2025	\$ 2.746.604.798,07	\$ 1.046.604.798,07	11166 de 03/10/2025	
52	SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 219.307.642,00	\$ 41.668.451,98	\$ 12.914.359.394,91	\$ -	\$ 260.976.093,98	\$ -	388125 De 21/05/2025	\$ 2.485.628.704,09	\$ 785.628.704,09	13546 de 20/11/2025	
53	OCTUBRE DE 2025	\$ 205.274.477,00	\$ 39.002.150,63	\$ 13.158.636.022,54	\$ -	\$ 244.276.627,63	\$ -	388125 De 21/05/2025	\$ 2.241.352.076,46	\$ 541.352.076,46		
54	NOVIEMBRE DE 2025	\$ 163.839.656,00	\$ 31.129.534,64	\$ 13.353.605.213,18	\$ -	\$ 194.969.190,64	\$ -	388125 De 21/05/2025	\$ 2.046.382.885,82	\$ 346.382.885,82		
55	DICIEMBRE DE 2025	\$ 163.632.496,00	\$ 31.090.174,24	\$ 13.548.327.883,42	\$ -	\$ 194.722.670,24	\$ -	388125 De 21/05/2025	\$ 1.851.660.215,58	\$ 151.660.215,58		
TOTALES		\$ 11.385.149.482,49	\$ 2.163.178.400,93	\$ 13.548.327.883,42	\$ 793.831.155,00	\$ 13.548.327.883,42						

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* Valor total básico (C) = (A) + (B)	\$ 11.385.149.482,49	\$ 2.163.178.400,93	\$ 13.548.327.883,42
*	\$ -	\$ -	\$ -
*	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 11.385.149.482,49	\$ 2.163.178.400,93	\$ 13.548.327.883,42

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

- Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
- Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: MARCO ANGELO OLIVEROS GARCIA
Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 2520203053 CND

Firma

Nombre: LLEN OBEMAR ACASO GALEANO
Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 3	

FECHA		5/01/2026 (Día / Mes / Año)
-------	--	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	SMCN – GERENCIA NORTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	-----------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1050 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NORTE
--------------------------------	--------------	--------------	----------------------

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3

FECHA DE INICIO:	23/06/2021
PLAZO INICIAL:	50,2 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	28/02/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 11.999.988.099,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 13.699.988.099,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10	\$ 1.199.998.810,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.399.997.620,00
Calidad del servicio	30	\$ 3.599.996.430,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
21	5	2021	28	2	2026
21	5	2021	28	2	2026
21	5	2021	31	8	2028
31	8	2025	31	8	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100164507
Certificado de modificación o anexo No.: 0 Y 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/06/2021

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10	\$ 1.199.998.810,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.399.997.620,00
Calidad del servicio	30	\$ 3.599.996.430,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
23	6	2021	3	4	2026
23	6	2021	3	4	2026
23	6	2021	3	10	2028
3	10	2025	3	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100164507
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2 DE 3		

FECHA

5/01/2026
(Día / Mes / Año)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

8/08/2022

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	\$ 1.199.998.810,00	21	5	2021	3	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00	21	5	2021	3	4	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.399.997.620,00	21	5	2021	3	10	2028
Calidad del servicio	30	\$ 3.599.996.430,00	3	10	2025	3	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No.:

3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

8/08/2022

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	\$ 1.199.998.810,00	21	5	2021	3	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00	21	5	2021	3	4	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.399.997.620,00	21	5	2021	3	10	2028
Calidad del servicio	30	\$ 3.599.996.430,00	3	10	2025	3	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No.:

4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

12/01/2024

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	\$ 1.369.998.809,90	10	5	2025	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00	10	5	2025	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.739.997.619,80	10	5	2025	31	12	2028
Calidad del servicio	30	\$ 4.109.996.429,70	30	12	2025	30	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No.:

5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

8/07/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA		5/01/2026
		(Día / Mes / Año)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10	\$ 1.369.998.809,90
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40	\$ 5.999.994.050,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.739.997.619,80
Calidad del servicio	30	\$ 4.109.996.429,70

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	12	2025	31	8	2026
29	12	2025	31	8	2026
29	12	2025	1	3	2029
28	2	2026	28	2	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/12/2026

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma		Firma	
Nombre:	MARCO AURELIO OLIVEROS GARCIA	Nombre:	ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Director de Interventoría		Supervisor del Contrato de Interventoría	
Matrícula Profesional No.:	2520203053 CND	Matrícula Profesional No.:	13202-47439 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 2

FECHA

5/01/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

FECHA DE INICIO: 23/06/2021
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 56,2 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☒ NO ☐ VERSIÓN No. 1

FECHA DE VERSIÓN: 14/09/2021

OBSERVACIONES:
SE RADICA PLAN DE CALIDAD AL INVIAS MEDIANTE OFICIO 49980-CE-0112; SE APRUEBA MEDIANTE OFICIO DT-COR17756.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☒ NO ☐

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 3

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: 5/06/2025

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ☐ NO ☐

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 3

FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ☒ NO ☐

APROBADO: SI ☒ NO ☐

FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 106

No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 106

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:
El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
A LA FECHA NO SE CUENTA CON NO CONFORMIDADES

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 148

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 2

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 146

OBSERVACIONES:
☐ PQR N.º143. La señora Camila Galván solicitó instalar señal informativa con el nombre de la vereda Villa Concepción.
☐ PQR N.º145. El señor Álvaro Hernández Cruz manifiesta que, debido a las lluvias presentadas en el sector, el puente construido en proximidades de su vivienda no tiene la capacidad para el flujo de agua que circula. Ocasionado que esta se retorne e inunde su potrero, situación que lo afecta enormemente dañando todas la madera y maquinaria que el utiliza en su oficio de carpintería. Solicita que:
1)Cebarr más profundo la quebrada para que así pueda pasar mas agua por el puente.
2)Se le reconozcan los daños causados por los hechos mencionados, los cuales superan los \$20.000.000 millones de pesos.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	72%	El 2 de agosto-22, el gestor técnico del proyecto diligencia encuesta de satisfacción
IG2: Índice de gestión 2 =	100%	Se remite informe mensual # 55 y los semanales 233, 234, 235 y 236.
IG3: Índice de gestión 3 =	100%	Se realizan ensayos de verificación de los materiales. Se reportan en resumen ensayos de laboratorio

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

EL CONTRATO CONTINUAN CON LA REVISIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, SE ALCANZARON A REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE MATERIALES GRANULARES, MEZCLA ASFALTICA, PAVIMENTO MR-40, ADEMAS ,ITEMS PARA LA CONSTRUCCIONES DE OBRAS HIDRAÚLICAS.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACIÓN TOTAL	GEOMAX	2107095	24/07/2025	2327	23/01/2026	
2	NIVEL AUTOMÁTICO	GEOMAX	303673	8/11/2025	2540	7/05/2026	
3	TERMÓMETRO BIMETALICO	MENGTE	265	13/08/2025	TC-30686	13/08/2026	
4	TERMÓMETRO BIMETALICO	WINTERS	A3429	25/08/2025	TC-31029	25/08/2026	
5	MÁQUINA DE ENSAYO MARSHALL / CBR	Pinzuar	298	12/08/2025	F-35106-003 R0	12/08/2026	
6	PRENSA DOBLE RANGO PARA ENSAYO A FLEXION Y COMPRESION	Pinzuar	211	13/08/2025	F-35106-002 R0	13/08/2026	
7	COMPARADOR DE CARÁTULA	MOORE& WRIGHT	9916624	1/09/2025	L-35250-001 R0	1/09/2026	
8	COMPARADOR DE CARÁTULA	BAKER	FDF458	1/09/2025	NA-35250-002 R0	1/09/2026	
9	COMPARADOR DE CARÁTULA	BAKER	FDF564	19/09/2025	NA-35250-003 R0	19/09/2026	
10	BALANZA 300 g	LEXUS	YS132405	13/08/2025	M-35106-004 R0	13/08/2026	
11	BALANZA 30 Kg	Lexus	YS136366	12/08/2025	M-35106-005 R0	12/08/2026	
12	BALANZA 30 Kg	Lexus	YS136292	13/08/2025	M-35106-006 R0	13/08/2026	
13	BALANZA 6000 g	Lexus	5124011095	13/08/2025	M-35106-007 R0	13/08/2026	
14	HORNO	Pinzuar	180	12/08/2025	T-35106-008 R0	12/08/2026	
15	HORNO ELÉCTRICO	Pinzuar	SN1467	13/08/2025	T-35106-009 R0	13/08/2026	

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre: Marco Aurelio Oliveros García

Director de Interventoría

Matrícula No. 2520203053 CND

Firma

Nombre: Amaury Javier Guzmán Vidal

Residente de Interventoría

Matrícula No.: 22202149534 COR

Firma

Nombre: Elen Obeiman Alcardy Galeano

Supervisor Contrato de Interventoría

Matricula No.: 13202-47439 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

6.6. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del Anticipo. Se dio cierre a la cuenta del anticipo en el mes de noviembre de 2022. El informe final de inversión y buen manejo del anticipo se adjunto en el informe mensual de interventoria del mes de noviembre 2022.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

- Plan de cargas

Original: Archivo de Gestión del IN/IAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE VIA
PROCESO MISIÓN: LIGACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
NOMBRE INTERVENIENTOS: MANIPULACIÓN
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEP-AMI-IN-6-FRS-2
VERSION	1
PAGINA	5
FECHA	15/07/2021 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS - SEVOP

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PLAN DE CARGAS INICIAL
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
(La reprogramación de este Plan de Cargas se realiza conforme al Acto de Modificación de Cargas respectivo)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 1990-2021

PLAZO INICIAL: 31 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31 MESES
(En meses según las prórrogas en suspenso)

OBJETO:
RECONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN FISCAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MONTE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS DE LA VÍA PARA LA ECONOMÍA LOCAL (PEL-EL) - 1443-2017 - 0033-03

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/09/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2021
(Indique día/mes/año)

INTERVENIOR: CONSEJO VALLECA

FECHA DE RENOVACIÓN: NA
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acto)

FECHA DE RENOVACIÓN: NA
(Indique día/mes/año)

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENIENTE: JULIAN DREWE AGUIRRE GONZALEZ

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 11.999.999.000,00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 1.700.000.000,00

RESOLUCIÓN No.: N-1860 DE 4/05/2021
(Según documento)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=4+B): \$ 13.699.999.000,00

CONTRATO DE OBRA No.: 623-2021

CONTRATISTA: CONSEJO DE LA RIE-2020

No. de Orden	Cantida d	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS				CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 4 de fecha 27/09/2021				2022												2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Delicador (Prima West)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (R-mes)	Valor Total (\$)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIÓN LIGERON DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MISIÓN DE INTERVENCIÓN Y REACTIVACIÓN
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEP-AMI-IN-6-FRS-2
VERSION	1
PÁGINA	6
FECHA	15/07/2021 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE VIALIDAD Y MOVILIDAD DE CARRETERAS DEL ECUADOR - SECVIAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PLAN DE CARGAS INICIAL
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
(La reprogramación de este Plan de Cargas se realiza conforme al Acta de Modificación de Cargas respectiva)

CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°: 1999-2021

PLAZO INICIAL: 31 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/09/2021
(Indique el mes según el contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23/09/2021
(Indique los suspensiones, indique el mes)

OBJETO: REACTIVACIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN FISCAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MONTE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS DE VIALIDAD Y MOVILIDAD DE CARRETERAS DEL ECUADOR (MEVIM) 2017 - 2021, (MDS)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE RENOVACIÓN: NA
(Indique el día/mes/año)

INTERVENIOR: CONSEJO VIAL ECUATORIANO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENCIÓN: JUAN CRISTÓBAL AGUIRRE GARCIA
RESOLUCIÓN N°: N-189 DE 4/05/2021
(Indique el día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 11.999.999.000,00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 1.700.000.000,00
(Según contrato principal)

CONTRATO DE OBRAS N°: 693-2021

CONTRATISTA: CONSEJO VIAL ECUATORIANO

No. de Orden	Cantidad d	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPOSTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS				CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 6 de fecha 27/09/2023												junio		julio		agosto		2022 septiembre		octubre		noviembre		diciembre		enero		febrero		2023 marzo		abril		mayo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recursos (Hombres-Mes)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (H-mes)	Valor Total (\$)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
18		Abogado	\$ 6.900.000,00		5,00	\$ 27.000.000,00	\$ 6.900.000,00		5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 27.000.000,00	5,00	\$ 2



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIÓN, LIGACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
NOMBRE INTERVENIENTOS/EMPRESA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEP-AM-06-6-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	7
FECHA	15/07/2021 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE OBRAS PÚBLICAS - CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

PLAN DE CARGAS INICIAL
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
Nº: 7
(La numeración de este libro de horas constructiva conforme al Acta de Modificación de Cargas respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°: 1990-2021

PLAZO INICIAL: 31 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31 MESES
(En meses según las prórrogas en suspenso)

OBJETO:
RECONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, GESTIÓN FISCAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MONTE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS "VIA PARA LA LEJANÍA" LA REACTIVACIÓN (PMU 2017 - 2021.02.02)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/09/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 21/12/2021
(Indique las suspensiones, indique día/mes/año)

INTERVENIENTOR: CONSORCIO VALLE DEL CAÑO

FECHA DE RENUNCIACIÓN: NA
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acto)

FECHA DE RENUNCIACIÓN: NA
(Indique día/mes/año)

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENIENTOR: JULIO CESAR AGUIRRE GARCIA

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 11.269.988.000,00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 1.700.000.000,00
(Indique día/mes/año)


RESOLUCIÓN N°: N-1480


VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=H+B): \$ 13.000.000.000,00


CONTRATO DE OBRA N°: 023-2021


CONTRATISTA: CONSORCIO DE LA 98-2020


No. de Orden	Cantida d	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUUESTA ECONOMICA APROBADA		ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS N° 4 de fecha 27/09/2021		2022												2023						
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Beneficiario Recurso (Prima+MSS)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (H-mes)	Valor Total (\$)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M
300		Centonales a Campero de más de 2000 c.c. (1) 4x4 (incluye pasaje y Combustible) El monto del vehículo afectado deberá corresponder a montos 2015 o superior.				\$ 6.700.000,00	\$ -	20,00	\$ 180.000.000,00																		
302		Centonales a Campero de más de 2000 c.c. (1) 4x4 (incluye pasaje y Combustible) El monto del vehículo afectado deberá corresponder a montos 2015 o superior.				\$ 7.000.000,00	\$ -																				
31		Valor de pasajes (Entre 6 y 10 personas) (incluye pasaje y Combustible) El monto del vehículo afectado deberá corresponder a montos 2015 o superior.	\$ 5.000.000,00	100	50,00	\$ 280.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ -	0,00	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
314		Valor de pasajes (Entre 6 y 10 personas) (incluye pasaje y Combustible) El monto del vehículo afectado deberá corresponder a montos 2015 o superior.	\$ 5.000.000,00	100	50,00	\$ 280.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
318		Valor de pasajes (Entre 6 y 10 personas) (incluye pasaje y Combustible) El monto del vehículo afectado deberá corresponder a montos 2015 o superior.	\$ 5.000.000,00	100	50,00	\$ 280.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ -	0,00	\$ -																
319		Valor de pasajes (Entre 6 y 10 personas) (incluye pasaje y Combustible) El monto del vehículo afectado deberá corresponder a montos 2015 o superior.	\$ 5.000.000,00	100	50,00	\$ 280.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ -	0,00	\$ -																
320		Valor de pasajes (Entre 6 y 10 personas) (incluye pasaje y Combustible) El monto del vehículo afectado deberá corresponder a montos 2015 o superior.	\$ 5.000.000,00	100	50,00	\$ 280.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ -	0,00	\$ -																
32		Equipo completo de topografía	\$ 2.000.000,00	100	100,00	\$ 100.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 16,76	\$ 30.020.000,00	2,00	\$ 4.000.000,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
324		Equipo completo de topografía	\$ 2.000.000,00	100	100,00	\$ 100.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 20,77	\$ 50.030.000,00			1,77	\$ 3.007.910,00	2,00	\$ 4.000.000,00	2,00	\$ 4.000.000,00	2,00	\$ 4.000.000,00	2,00	\$ 4.000.000,00	2,00	\$ 4.000.000,00	2,00	\$ 4.000.000,00	2,00	\$ 4.000.000,00
326		Equipo completo de topografía	\$ 2.000.000,00	100	100,00	\$ 100.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 20,00	\$ 40.000.000,00																		
328		Equipo completo de topografía	\$ 2.000.000,00	100	100,00	\$ 100.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 16,00	\$ 30.000.000,00																		
330		Equipo completo de topografía	\$ 2.000.000,00	100	100,00	\$ 100.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -																		
332		Equipo completo de topografía	\$ 2.000.000,00	100	100,00	\$ 100.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -																		
33		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concreto	\$ 2.000.000,00	100	100,00	\$ 100.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 7,07	\$ 14.140.000,00	1,00	\$ 2.000.000,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
334		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concreto	\$ 2.000.000,00	100	100,00	\$ 100.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 11,89	\$ 23.760.000,00			0,88	\$ 1.802.840,00	1,00	\$ 2.000.000,00	1,00	\$ 2.000.000,00	1,00	\$ 2.000.000,00	1,00	\$ 2.000.000,00	1,00	\$ 2.000.000,00	1,00	\$ 2.000.000,00	1,00	\$ 2.000.000,00
336		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concreto	\$ 2.000.000,00	100	100,00	\$ 100.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 14,80	\$ 27.027.000,00																		
338		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concreto	\$ 2.000.000,00	100	100,00	\$ 100.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 10,00	\$ 20.000.000,00																		
340		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concreto	\$ 2.000.000,00	100	100,00	\$ 100.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -																		
342		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 10,23	\$ 20.027.000,00	2,00	\$ 4.000.000,00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
344		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -			2,00	\$ 4.000.000,00	2,00	\$ 4.000.000,00	2,00	\$ 4.000.000,00	2,00	\$ 4.000.000,00	2,00	\$ 4.000.000,00	2,00	\$ 4.000.000,00	2,00	\$ 4.000.000,00	2,00	\$ 4.000.000,00
346		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 30,00	\$ 70.000.000,00																		
348		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 20,11	\$ 40.150.000,00																		
350		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
352		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
354		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
356		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
358		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
360		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
362		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
364		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
366		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
368		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
370		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
372		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
374		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
376		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
378		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
380		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
382		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
384		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
386		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
388		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
390		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
392		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
394		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
396		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
398		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
400		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
402		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
404		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
406		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
408		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
410		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
412		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
414		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
416		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
418		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		
420		Oficina/Carpetante (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.000.000,00	100	100,00	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -																		

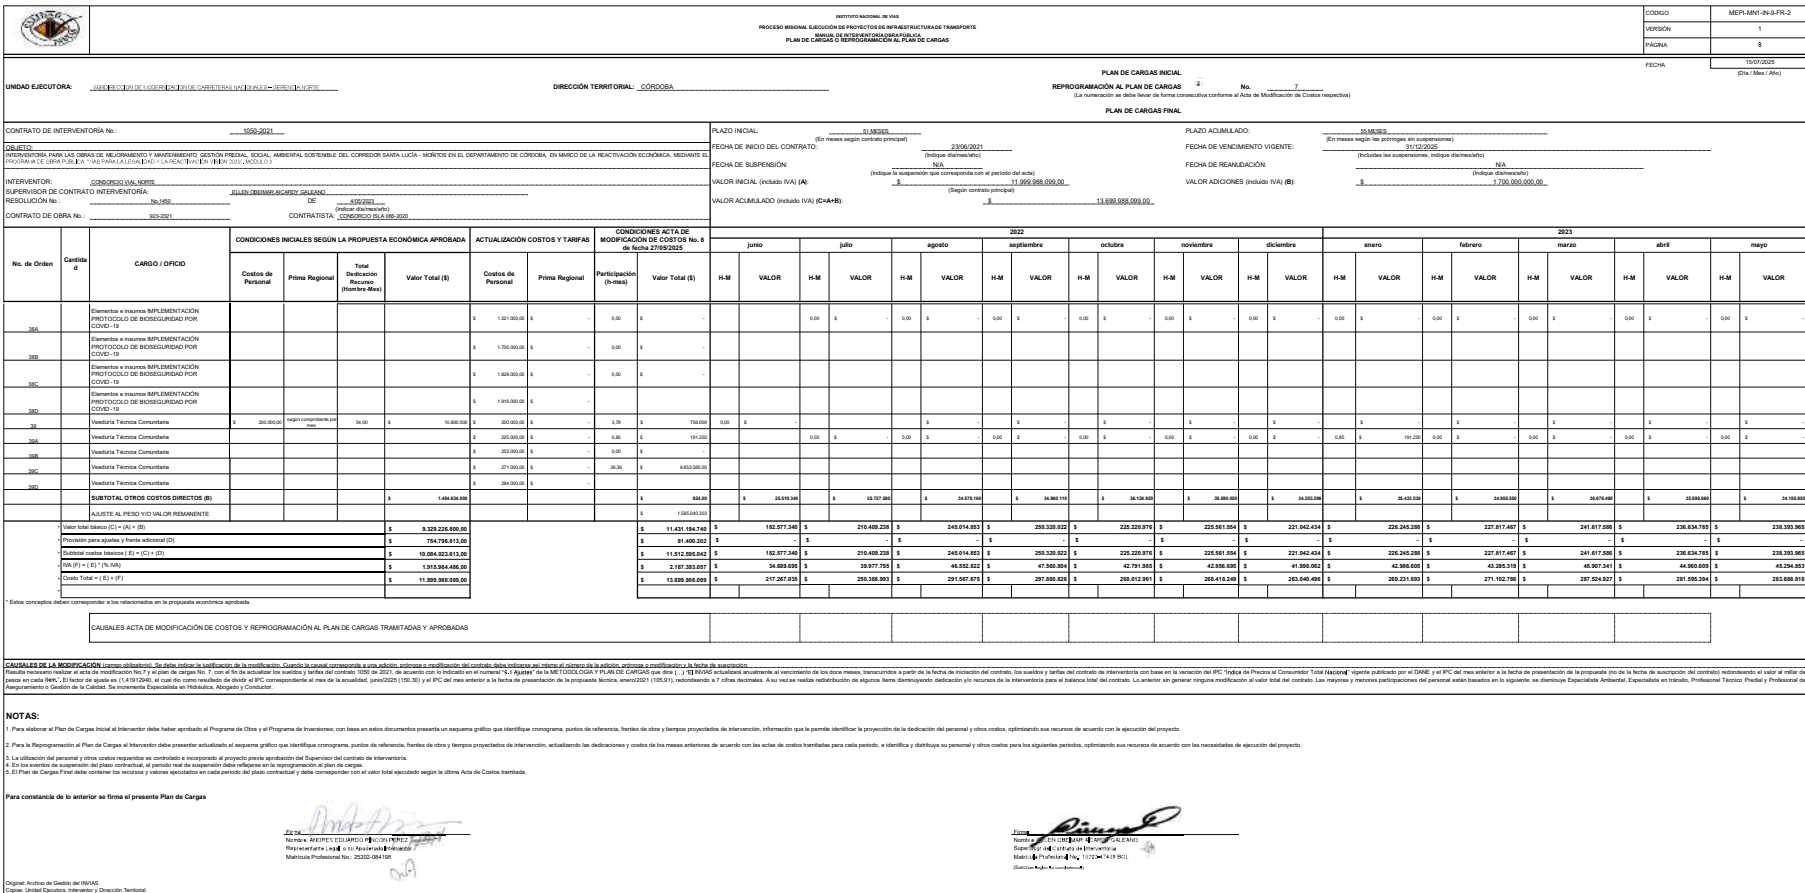

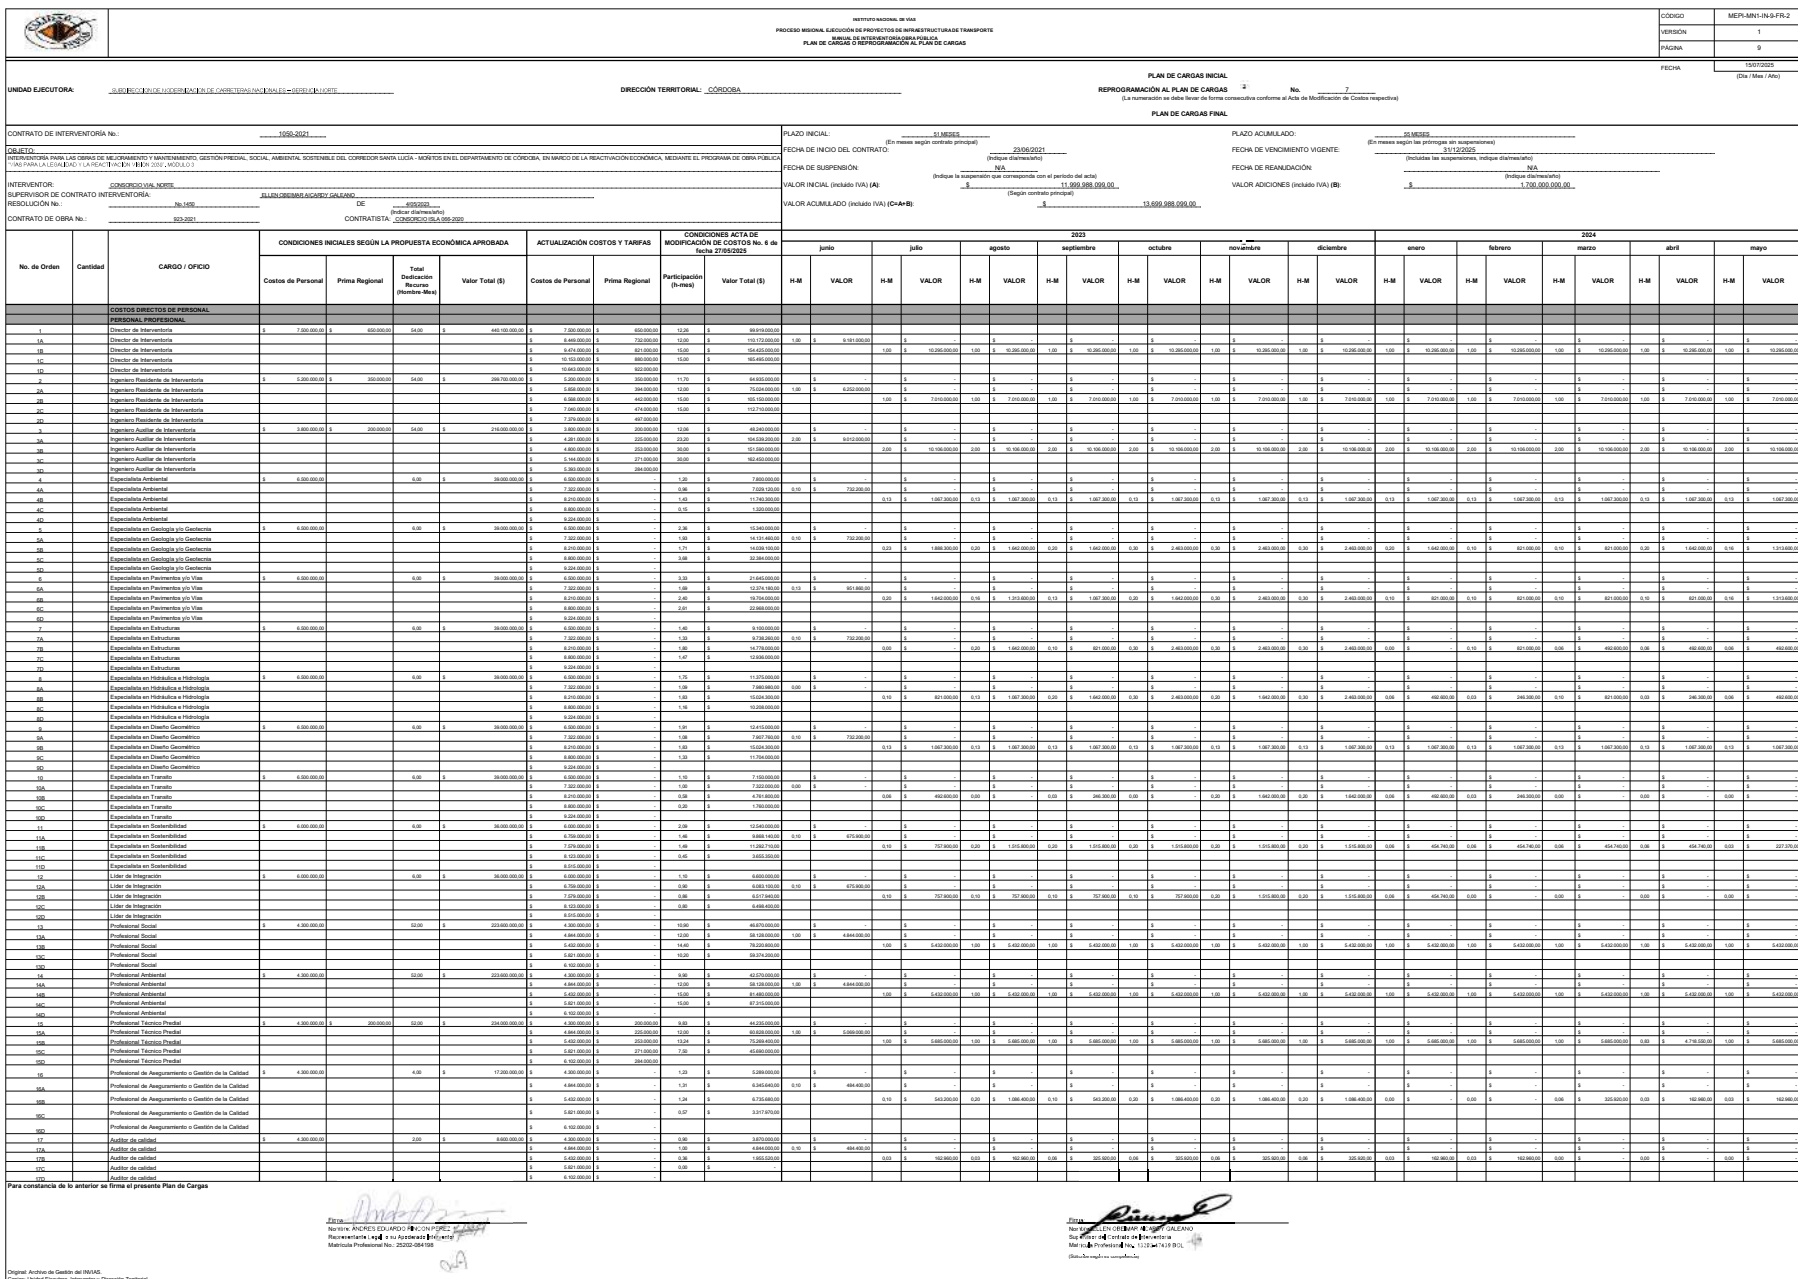

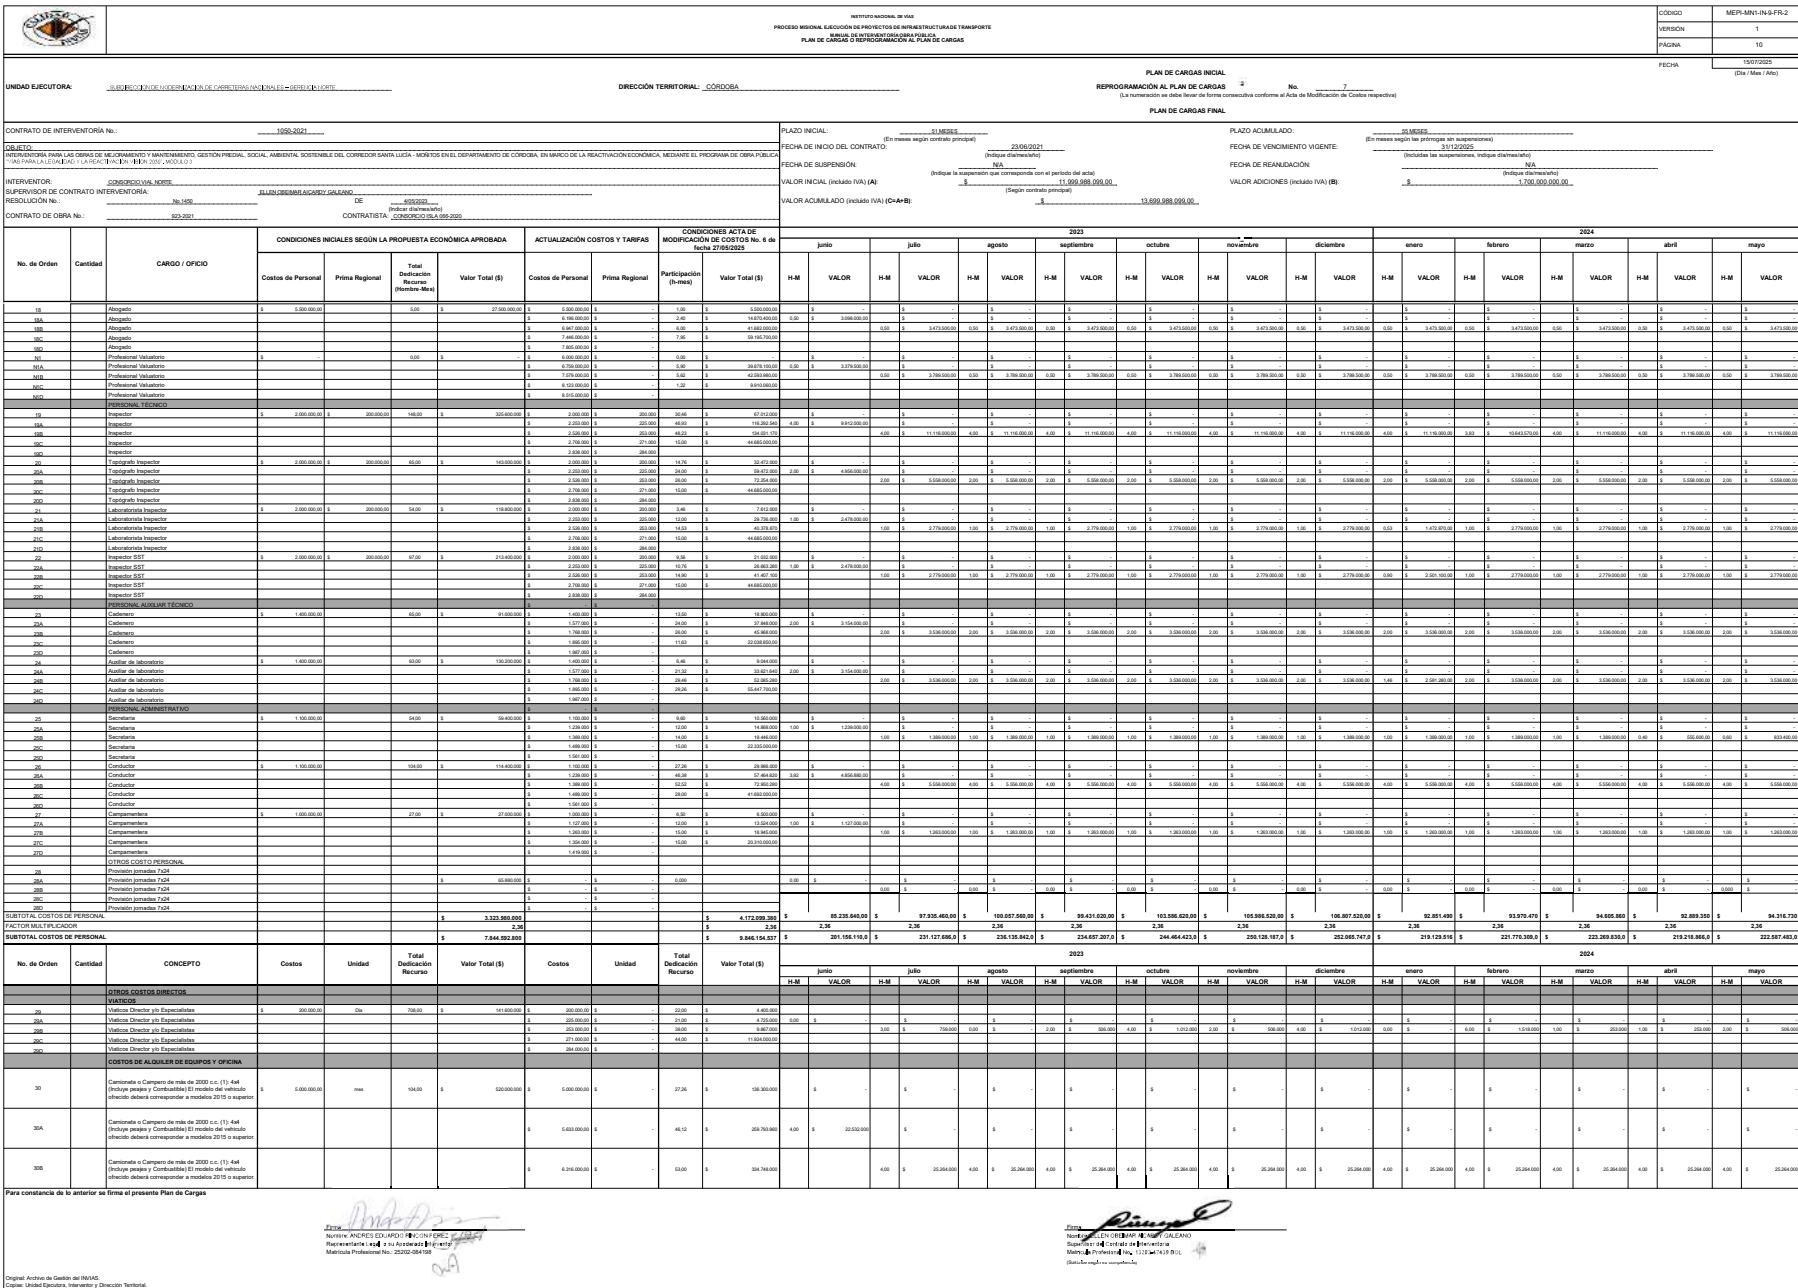

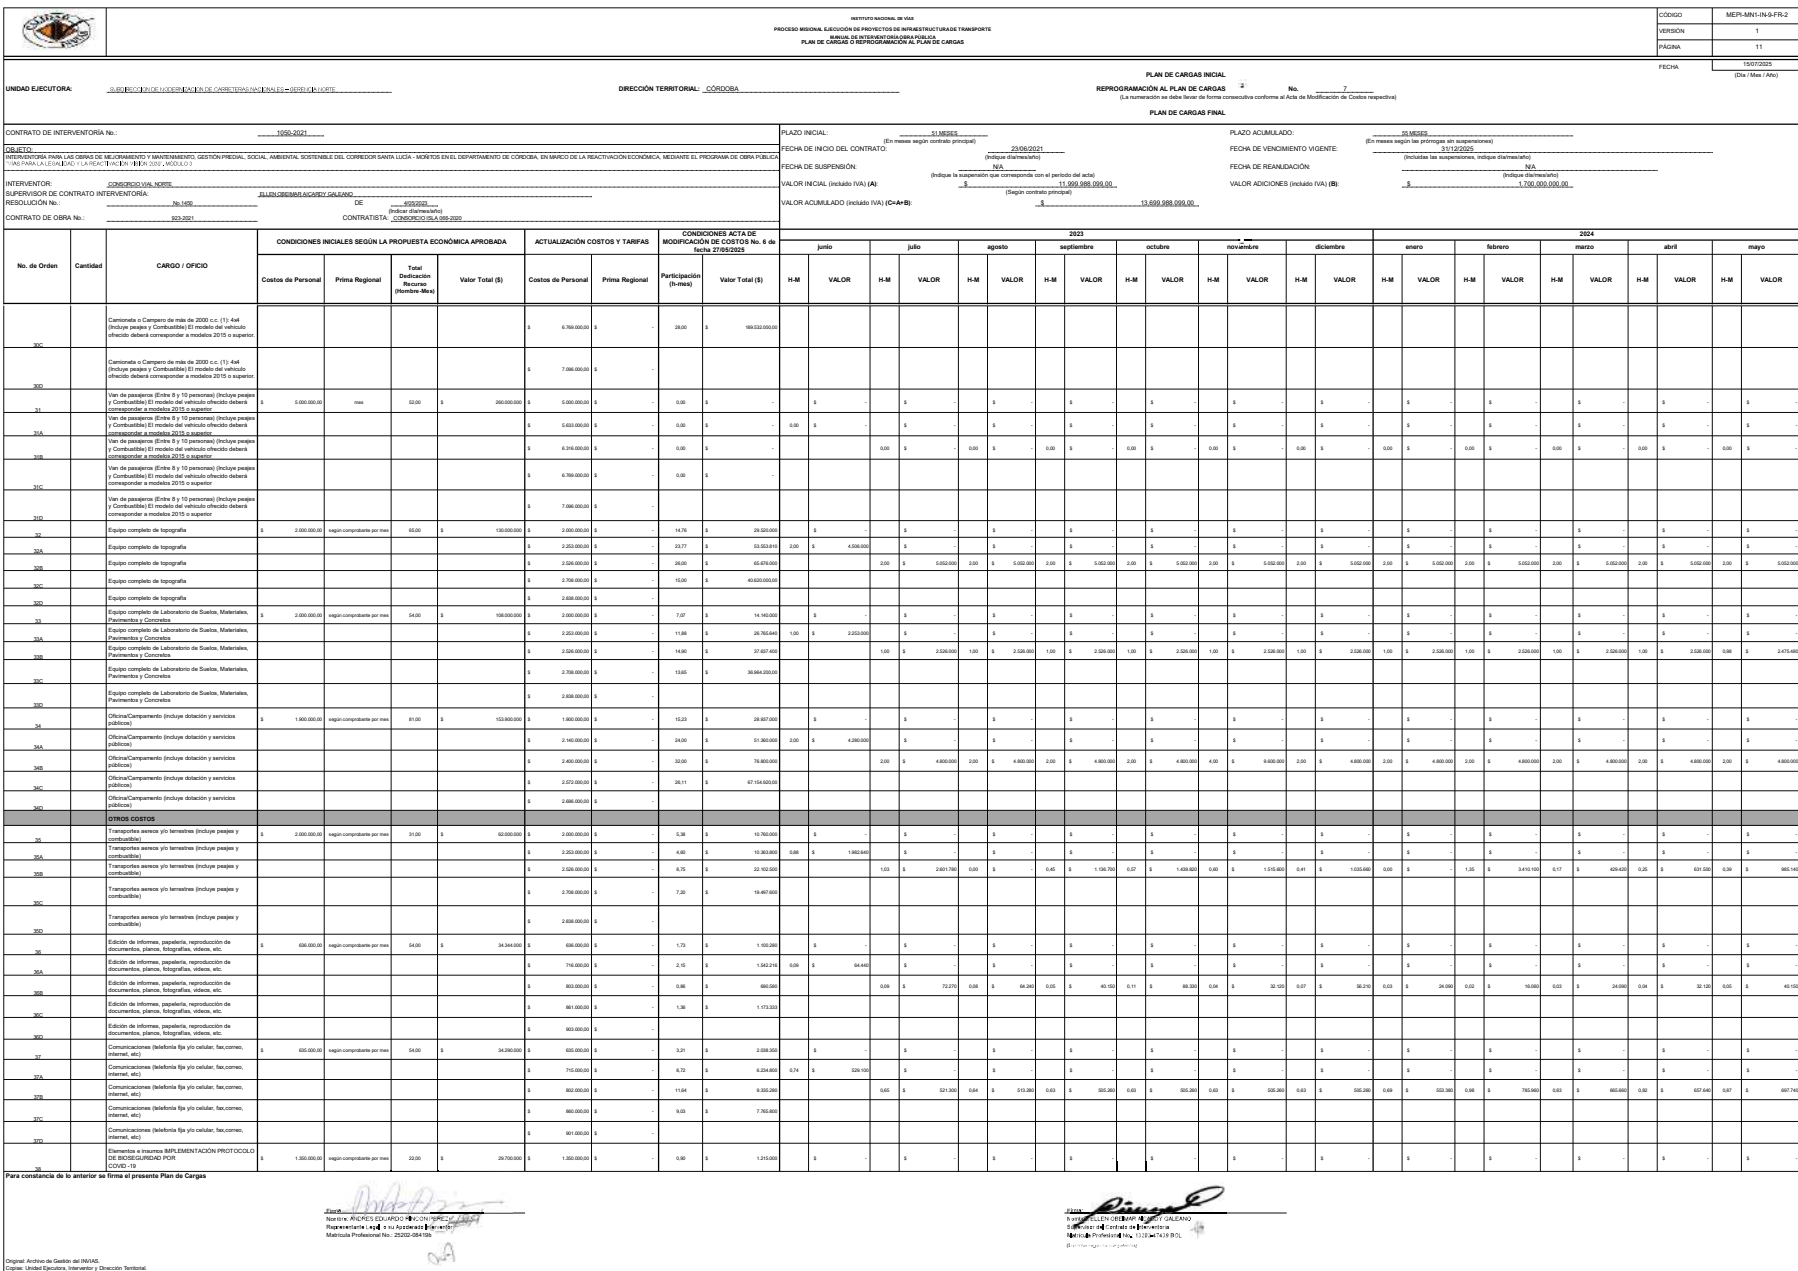

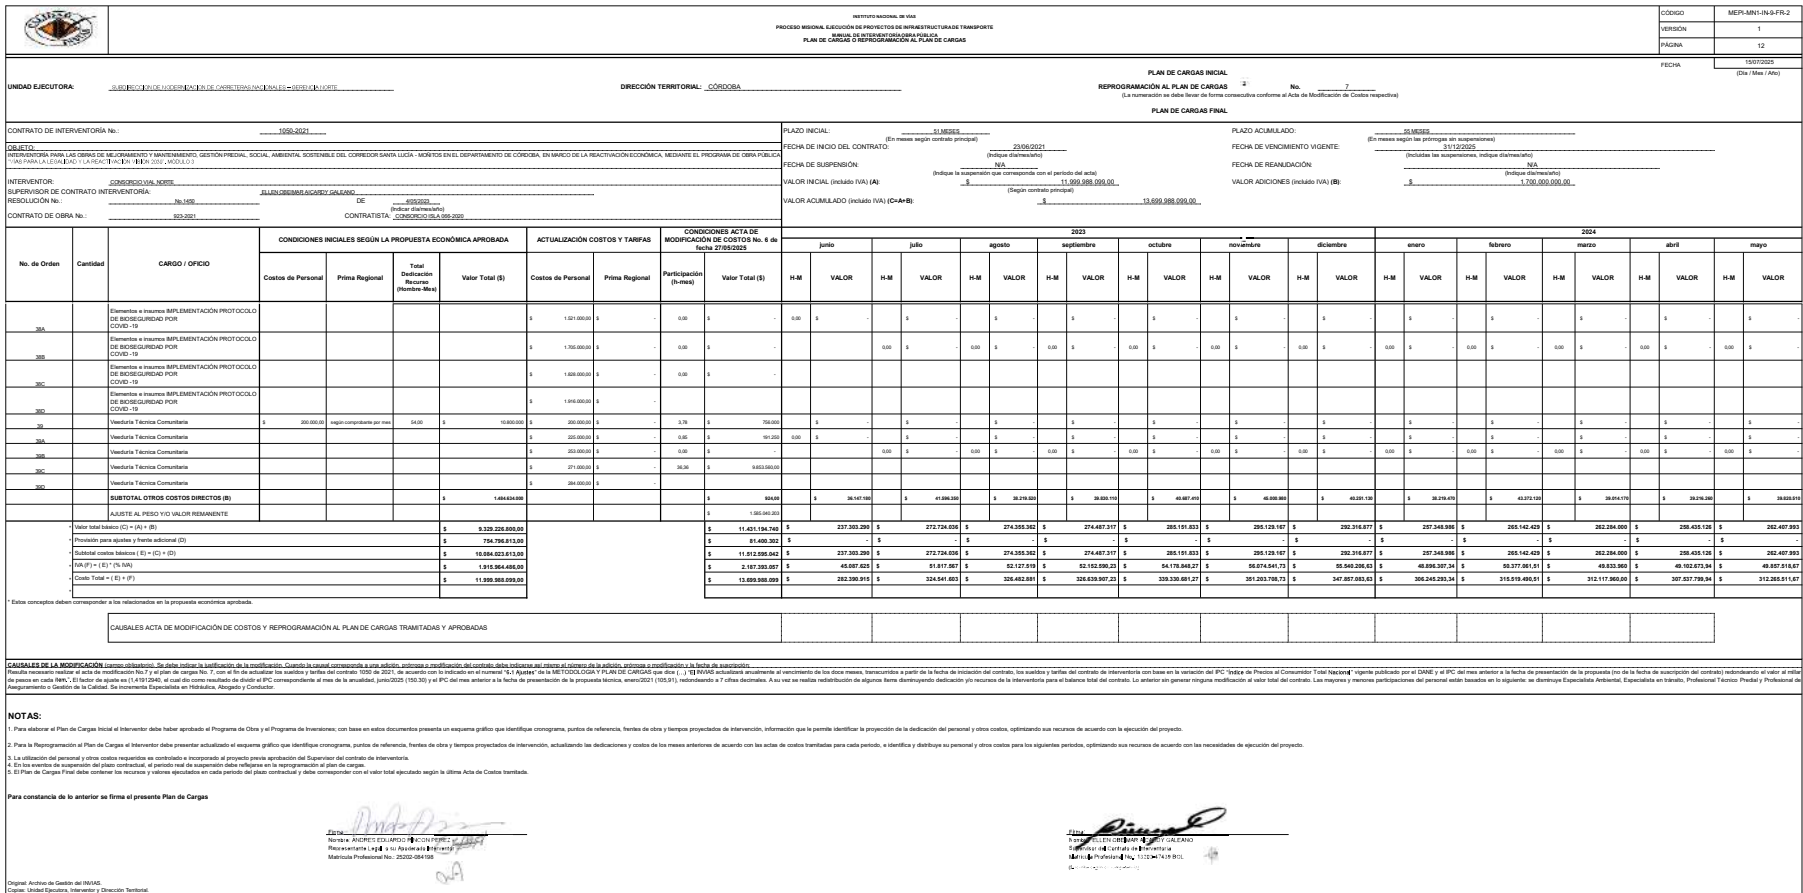



UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PROCESO MISAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

PLAN DE CARGAS INICIAL

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

PLAN DE CARGAS FINAL

CÓDIGO: MEPLMNT-NS-PR-2
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 13

FECHA: 15/07/2021

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 5095-2021

OBJETO: RECONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MORTOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS (PROYECTO EJECUTIVO LA REACTIVACIÓN) - EJE 1001-2021, 1002-2021

INTERVENIOR: CONSEJO VALLE DEL CAQUETÉ

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENCIÓN: JOHAN PEDRAZACABRERA GARCIA

RESOLUCIÓN No. 4052003 DE 04/05/2021 (Por el director)

CONTRATISTA: CONSORCIO USA 995-2020

PLAZO INICIAL: 15 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/09/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 1.999.999.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)+(A): 13.699.999.000,00

PLAZO ADICIONAL: 15 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 01/07/2022

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 1.700.000.000,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS				CONDICIONES ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS No. 6 de fecha 27/05/2025				2024												2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Costos de Personal		Prima Regional	Total Dedicación Recursos (Personas)	Valor Total (\$)	Costos de Personal		Prima Regional	Participación (I-M)	Valor Total (\$)	H-M		VALOR	H-M		VALOR	H-M		VALOR	H-M		VALOR	H-M		VALOR	H-M		VALOR	H-M		VALOR	H-M		VALOR	H-M		VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PLAN DE CARGAS INICIAL
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
(La reprogramación de esta línea de items consecutivos conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

CÓDIGO: MEPLMVI-IN-9-FR-2
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 14

FECHA: 15/01/2025
(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 309-2021
OBJETO: INTERVENCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MORTOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA (PROBOP) ALIADO A LA REACTIVACIÓN (PROBOP-REACTIVACIÓN)
INTERVENIOR: CONSEJO VALLE DEL CAQUETÉ
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENCIÓN: JOHN EDUARDO RIVERA GARCÍA
RESOLUCIÓN No.: 160-2021 DE 14/02/2021 (Fecha de expedición)
CONTRATISTA: CONSORCIO USA 999-2020

PLAZO INICIAL: 12 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/09/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el parámetro del acto)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 1.999.999.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=H+B): 13.699.999.000,00

PLAZO ADICIONAL: 0 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 1.700.000.000,00

No. de Orden		Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUUESTA ECONOMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS No. 6 de fecha 27/05/2025												2024												2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recursos (Personas-Mes)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (0-100%)	Valor Total (\$)	junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre		enero		febrero		marzo		abril		mayo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
18		Altopista	\$	0,00	0,00	\$	27.000.000,00	\$	0,00	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$</



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISGAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ÁREA DE INTERVENCIÓN EN PAVIMENTACIÓN
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO MEPLMVI-IN-9-FR-2
VERSIÓN 1
PÁGINA 15
FECHA 15/01/2021
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN NACIONAL - SUBDIRECCIÓN

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

PLAN DE CARGAS INICIAL
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
(La reprogramación de esta línea de items consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos (previsión))

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: 1000-2021

PLAZO INICIAL: 12 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/09/2021
(Indique la fecha de inicio del contrato)

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2021
(Indique la fecha de vencimiento del contrato)

OBJETO: INTERVENCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRELAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SANEAMIENTO DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MORTOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA (OBRAS ALTERNATIVAS) LA REACTIVACIÓN (EPR-2021, MOD-3)
INTERVENCIÓN: CORDOBA VALLE DEL CAÑO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENCIÓN: JELLY DREVER JACARDO CALVO
RESOLUCIÓN No: 180 DE 4/05/2021 DE (Indique la resolución)
CONTRATISTA: CONSORCIO USA 999-2020


FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 11.899.999.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (CHAB): \$ 13.699.999.000,00
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 1.700.000.000,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS				CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 6 de fecha 27/05/2025				2024				2025												
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recursos (Personas, Meses)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (0-miles)	Valor Total (\$)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	
		Carroneta a Campero de más de 2000 c.c. (1) 44 (Incluye pasaje y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior			\$ 6.780.000,00	\$ -	28,00	\$ 188.028.000,00			\$ -		\$ -	2,00	\$ 13.038.000	2,00	\$ 13.038.000	2,00	\$ 13.038.000	2,00	\$ 13.038.000	2,00	\$ 13.038.000	2,00	\$ 13.038.000	2,00	\$ 13.038.000	2,00	\$ 13.038.000		
300		Carroneta a Campero de más de 2000 c.c. (1) 44 (Incluye pasaje y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior			\$ 7.086.000,00	\$ -	-																								
301		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye pasaje y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior	\$ 5.000.000,00	none	50,00	\$ 360.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ -	0,00	\$ -				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
30A		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye pasaje y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior				\$ 5.000.000,00	\$ -	0,00	\$ -					\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
30B		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye pasaje y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior				\$ 6.734.000,00	\$ -	0,00	\$ -	10,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
30C		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye pasaje y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior				\$ 6.780.000,00	\$ -	0,00	\$ -					\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00		
30D		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye pasaje y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior				\$ 7.086.000,00	\$ -	-						\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00		
31		Equipo completo de topografía	\$ 2.000.000,00	según cumplimiento por mes	60,00	\$ 180.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	16,76	\$ 28.200,00				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
31A		Equipo completo de topografía				\$ 2.000.000,00	\$ -	20,77	\$ 53.000,00					\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
31B		Equipo completo de topografía				\$ 2.000.000,00	\$ -	20,00	\$ 50.000,00	1,00	\$ 2.000.000	1,00	\$ 2.000.000	1,00	\$ 2.000.000	1,00	\$ 2.000.000	1,00	\$ 2.000.000	1,00	\$ 2.000.000	1,00	\$ 2.000.000	1,00	\$ 2.000.000	1,00	\$ 2.000.000	1,00	\$ 2.000.000	1,00	\$ 2.000.000
31C		Equipo completo de topografía				\$ 2.700.000,00	\$ -	10,00	\$ 40.000.000,00					\$ -	1,00	\$ 2.700.000	1,00	\$ 2.700.000	0,00	\$ 1.604.880	1,40	\$ 3.791.360	1,00	\$ 2.700.000	1,00	\$ 2.700.000	1,00	\$ 2.700.000	1,00	\$ 2.700.000	
32		Equipo completo de topografía				\$ 2.000.000,00	\$ -	-						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
32A		Equipo completo de topografía				\$ 2.000.000,00	\$ -	7,07	\$ 14.140,00					\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
32B		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Puentes y Concrete	\$ 2.000.000,00	según cumplimiento por mes	50,00	\$ 100.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	11,88	\$ 26.760,00				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
32C		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Puentes y Concrete				\$ 2.000.000,00	\$ -	14,80	\$ 27.027,40	0,08	\$ 2.475.480	0,08	\$ 2.475.480	0,08	\$ 2.475.480	0,08	\$ 2.475.480	0,08	\$ 2.475.480	0,08	\$ 2.475.480	0,08	\$ 2.475.480	0,08	\$ 2.475.480	0,08	\$ 2.475.480	0,08	\$ 2.475.480	0,08	\$ 2.475.480
32D		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Puentes y Concrete				\$ 2.700.000,00	\$ -	10,00	\$ 30.000.000,00					\$ -	0,01	\$ 2.464.280	0,01	\$ 2.464.280	0,01	\$ 2.464.280	0,01	\$ 2.464.280	0,01	\$ 2.464.280	0,01	\$ 2.464.280	0,01	\$ 2.464.280	0,01	\$ 2.464.280	
33		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Puentes y Concrete				\$ 2.000.000,00	\$ -	-						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
34		Oficina/Campamento (Incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.900.000,00	según cumplimiento por mes	60,00	\$ 180.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ -	10,20	\$ 20.400,00				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
34A		Oficina/Campamento (Incluye dotación y servicios públicos)				\$ 2.140.000,00	\$ -	24,00	\$ 51.360,00					\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
34B		Oficina/Campamento (Incluye dotación y servicios públicos)				\$ 2.400.000,00	\$ -	30,00	\$ 78.000,00	2,00	\$ 4.800.000	2,00	\$ 4.800.000	2,00	\$ 4.800.000	2,00	\$ 4.800.000	2,00	\$ 4.800.000	2,00	\$ 4.800.000	2,00	\$ 4.800.000	2,00	\$ 4.800.000	2,00	\$ 4.800.000	2,00	\$ 4.800.000	2,00	\$ 4.800.000
34C		Oficina/Campamento (Incluye dotación y servicios públicos)				\$ 2.170.000,00	\$ -	26,11	\$ 67.158.000,00					\$ -	2,00	\$ 5.144.000	2,00	\$ 5.144.000	2,00	\$ 5.144.000	2,00	\$ 5.144.000	2,00	\$ 5.144.000	1,79	\$ 4.603.880	1,48	\$ 3.602.280	1,44	\$ 3.700.000	
34D		Oficina/Campamento (Incluye dotación y servicios públicos)				\$ 2.000.000,00	\$ -	-						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
OTROS COSTOS					\$ -	\$ -																									
35		Transporte servicio y/o terminales (Incluye pasaje y combustible)	\$ 2.000.000,00	según cumplimiento por mes	30,00	\$ 60.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	6,30	\$ 10.760,00				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
35A		Transporte servicio y/o terminales (Incluye pasaje y combustible)				\$ 2.000.000,00	\$ -	6,40	\$ 16.350,00					\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
35B		Transporte servicio y/o terminales (Incluye pasaje y combustible)				\$ 2.000.000,00	\$ -	6,75	\$ 22.100.000	1,08	\$ 3.480.880	1,08	\$ 3.780.880	0,01	\$ 1.280.280	0,14	\$ 333.840														
35C		Transporte servicio y/o terminales (Incluye pasaje y combustible)				\$ 2.700.000,00	\$ -	7,20	\$ 16.407.800					\$ -	0,44	\$ 1.041.020	0,14	\$ 376.120	0,00	\$ -											
35D		Transporte servicio y/o terminales (Incluye pasaje y combustible)				\$ 2.000.000,00	\$ -	-						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
36		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	\$ 600.000,00	según cumplimiento por mes	50,00	\$ 34.260,00	\$ 600.000,00	\$ -	1,70	\$ 1.000,00				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
36A		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.				\$ 780.000,00	\$ -	2,15	\$ 1.542.274					\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
36B		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.				\$ 800.000,00	\$ -	0,88	\$ 880.000	0,14	\$ 152.400	0,05	\$ 28.080	0,00	\$ 28.080	0,00	\$ 40.160														
36C		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.				\$ 801.000,00	\$ -	0,38	\$ 1.170.000					\$ -	0,01	\$ 8.880	0,08	\$ 51.840	0,17	\$ 169.000,04	0,00	\$ -		\$ -	0,01	\$ 6.891	0,00	\$ 17.280	0,04	\$ 34.440	
36D		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.				\$ 800.000,00	\$ -	-						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
37		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	\$ 600.000,00	según cumplimiento por mes	50,00	\$ 34.260,00	\$ 600.000,00	\$ -	5,21	\$ 2.000.000				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
37A		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)				\$ 710.000,00	\$ -	6,70	\$ 424.000					\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
37B		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)				\$ 800.000,00	\$ -	11,84	\$ 6.000.000	0,04	\$ 733.880	0,06	\$ 737.880	0,00	\$ 701.880	0,00	\$ 680.880														
37C		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)				\$ 800.000,00	\$ -	6,00	\$ 7.760.800					\$ -	0,77	\$ 600.000	0,77	\$ 600.000	0,77	\$ 602.280	0,36	\$ 481.680	0,36	\$ 481.680	0,36	\$ 481.680	0,36	\$ 481.680	0,36	\$ 481.680	
37D		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)				\$ 801.000,00	\$ -	-						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
38		Revisión e Insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 1.000.000,00	según cumplimiento por mes	20,00	\$ 20.760,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	0,80	\$ 1.210.000,00				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Notario: RICHARD EDUARDO ROYAL
Representante: RICHARD EDUARDO ROYAL
Matrícula Profesional No.: 25202-084-188

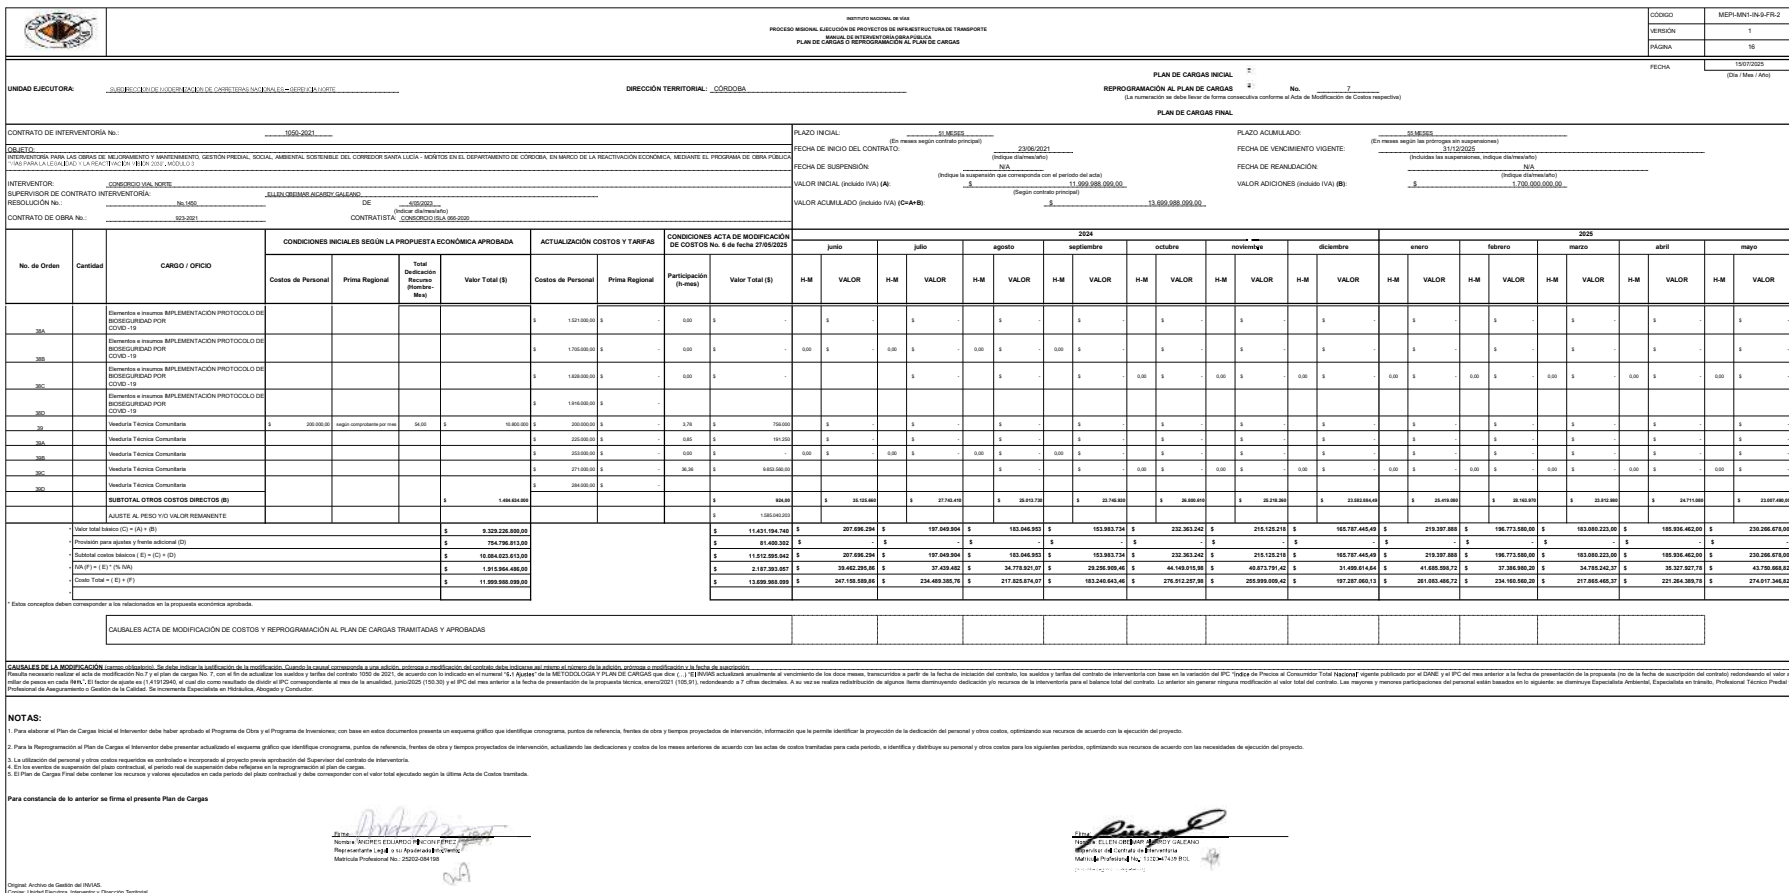Notario: RICHARD EDUARDO ROYAL
Representante: RICHARD EDUARDO ROYAL
Matrícula Profesional No.: 25202-084-188





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENCIÓN AEROPÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	17

UNIDAD EJECUTORA: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIACIÓN DE CASEROS Y TURISMO - VICERRECTORÍA</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CORDOBA</u>		PLAN DE CARGAS INICIAL		FECHA: <u>18/07/2024</u>	
				REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS		No. <u>7</u>	


CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°: _____ 1000-2021		PLAZO INICIAL: _____ 11/06/2021 (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: _____ 11/06/2021 (En meses según la primera adición a sujeción)
OBJETO: REACTIVACIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PISCICOLA, SANEAMIENTO AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUISA - MORTERO EN EL DEPARTAMENTO DE CONCORDIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA N°1 PARA LA LUISA EN LA REACTIVACIÓN (R-001) 2021, MÓDULO 1		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _____ 23/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: _____ 31/12/2025 (Indique la sujeción, indique día/mes/año)
INTERVENIOR: LORDOPEL CON SUITE		FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ N/A (Indique la suspensión que corresponde con el período del acto)	FECHA DE REANUDACIÓN: _____ N/A (Indique día/mes/año)
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENIOR: ALLEN CREMARE AGUIRRE GILANO		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _____ \$ 13.999.988.000,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _____ \$ 1.700.000.000,00 (Indique día/mes/año)
RESOLUCIÓN N°: _____	N° 1000 DE _____ 6/02/2021 (Indique día/mes/año)	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A)+(B): _____ \$ 13.999.988.000,00	
CONTRATO DE OBRA N°: _____ 003-2021	CONTRATISTA: CONCORDIO S.A 100-2021		


No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 6 de fecha 27/05/2025				junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre		enero		febrero		marzo		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación (promedio Mes)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (4-mes)	Valor Total (\$)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																		
PERSONAL PROFESIONAL																																		
1		Director de Inversión	1	2.000.000,00	0	600.000,00	50,00	0	484.100.000,00	0	7.000.000,00	0	600.000,00	12,00	0	593.910.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1A		Director de Inversión	1	6.000.000,00	0	1.800.000,00	15,00	0	5.939.100,00	0	70.000,00	0	1.800.000,00	12,00	0	5.939.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1B		Director de Inversión	1	6.000.000,00	0	1.800.000,00	15,00	0	5.939.100,00	0	70.000,00	0	1.800.000,00	12,00	0	5.939.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1C		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1D		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1E		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1F		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1G		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1H		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1I		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1J		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1K		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1L		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1M		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1N		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1O		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1P		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1Q		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1R		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1S		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1T		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1U		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1V		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1W		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1X		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1Y		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1Z		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AA		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AB		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AC		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AD		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AE		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AF		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AG		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AH		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AI		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AJ		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AK		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AL		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AM		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AN		Director de Inversión	1	10.000.000,00	0	3.000.000,00	25,00	0	9.969.100,00	0	110.000,00	0	3.000.000,00	20,00	0	9.859.100,00	0	0	0	0	0</													


1772	Auditor de calidad
Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Carga	

Firma: 
Nombre: ANDRES EDUARDO RIVCON PEREZ
Representante Legal o su Apoderado: Intervallor
Matricula Profesional No.: 25202-054198

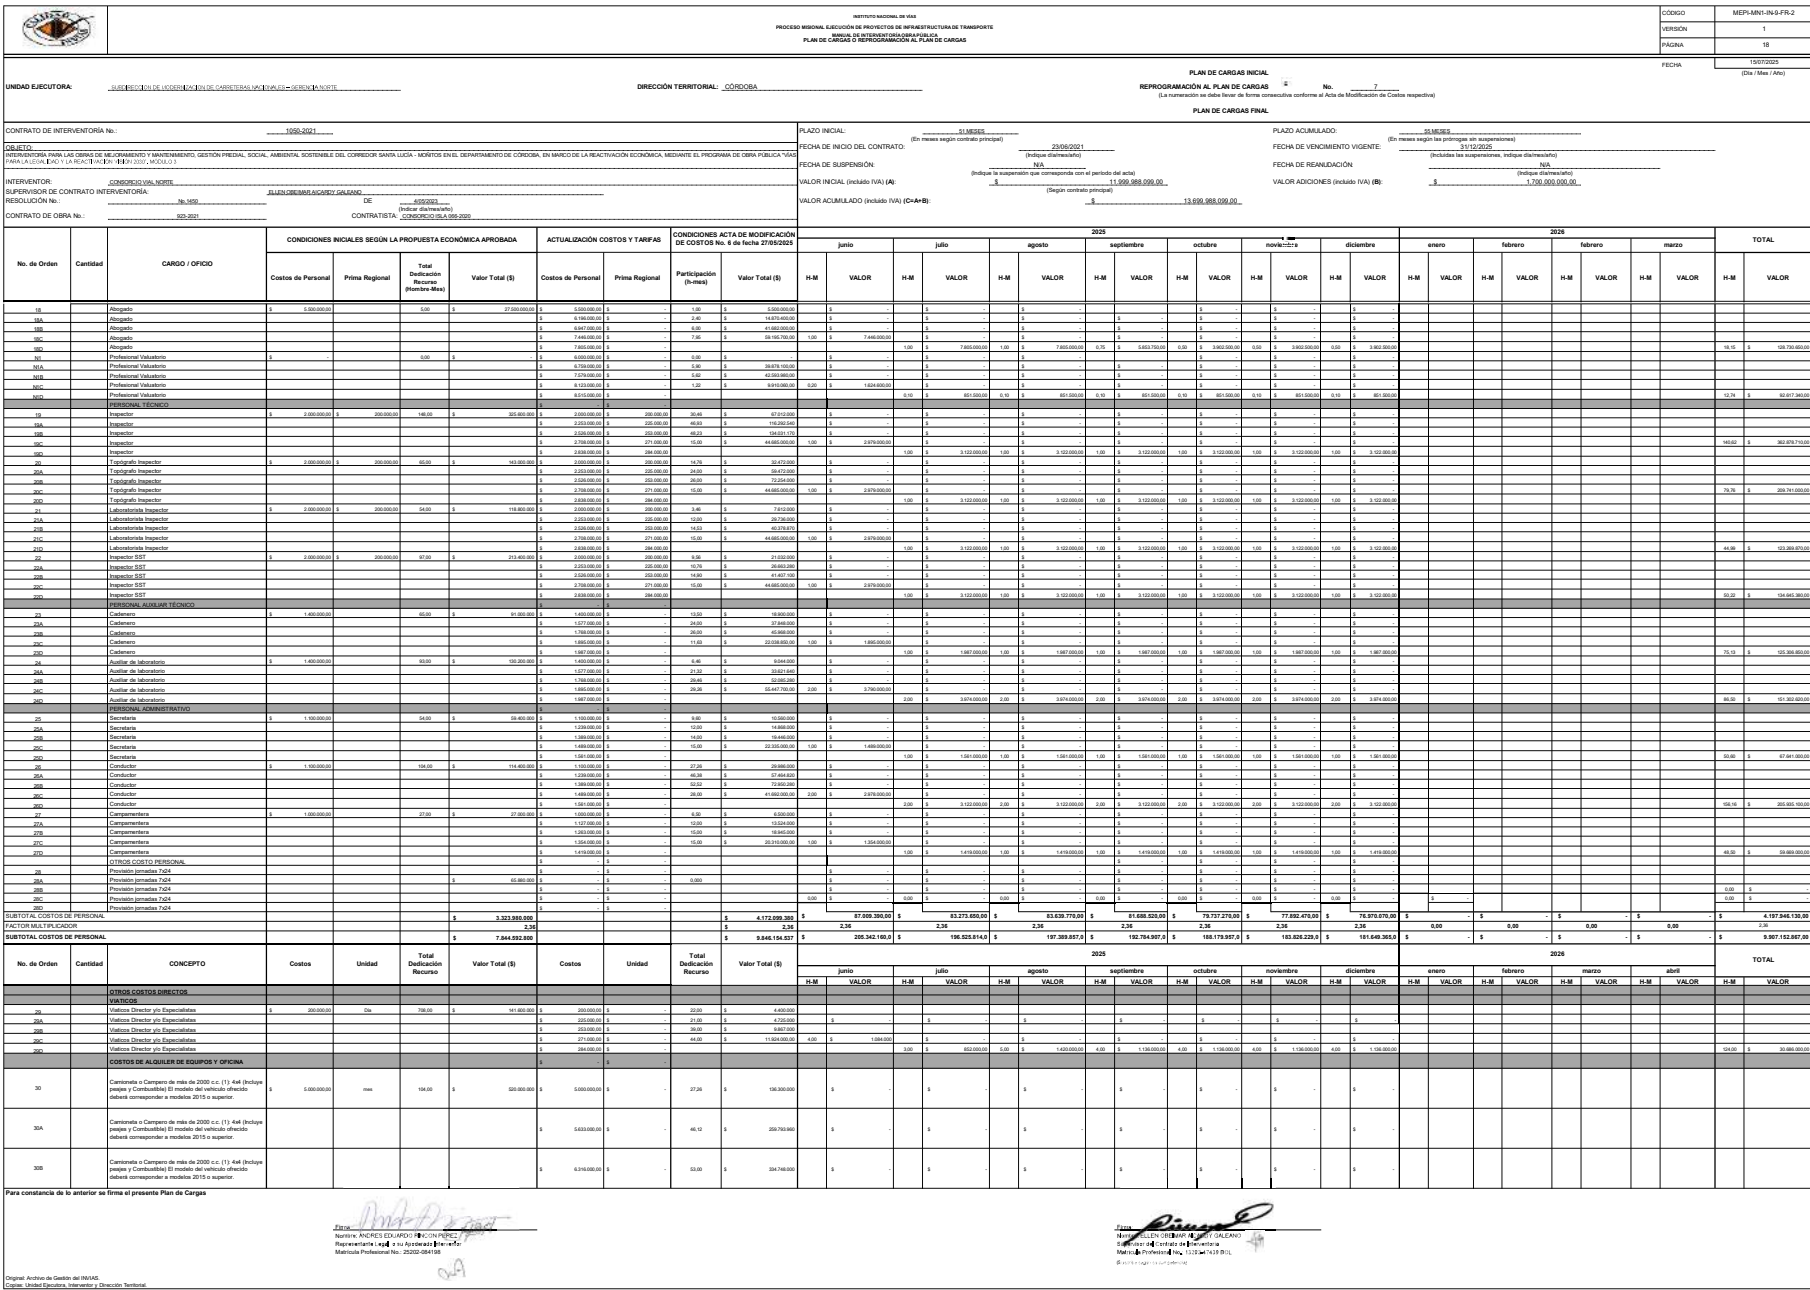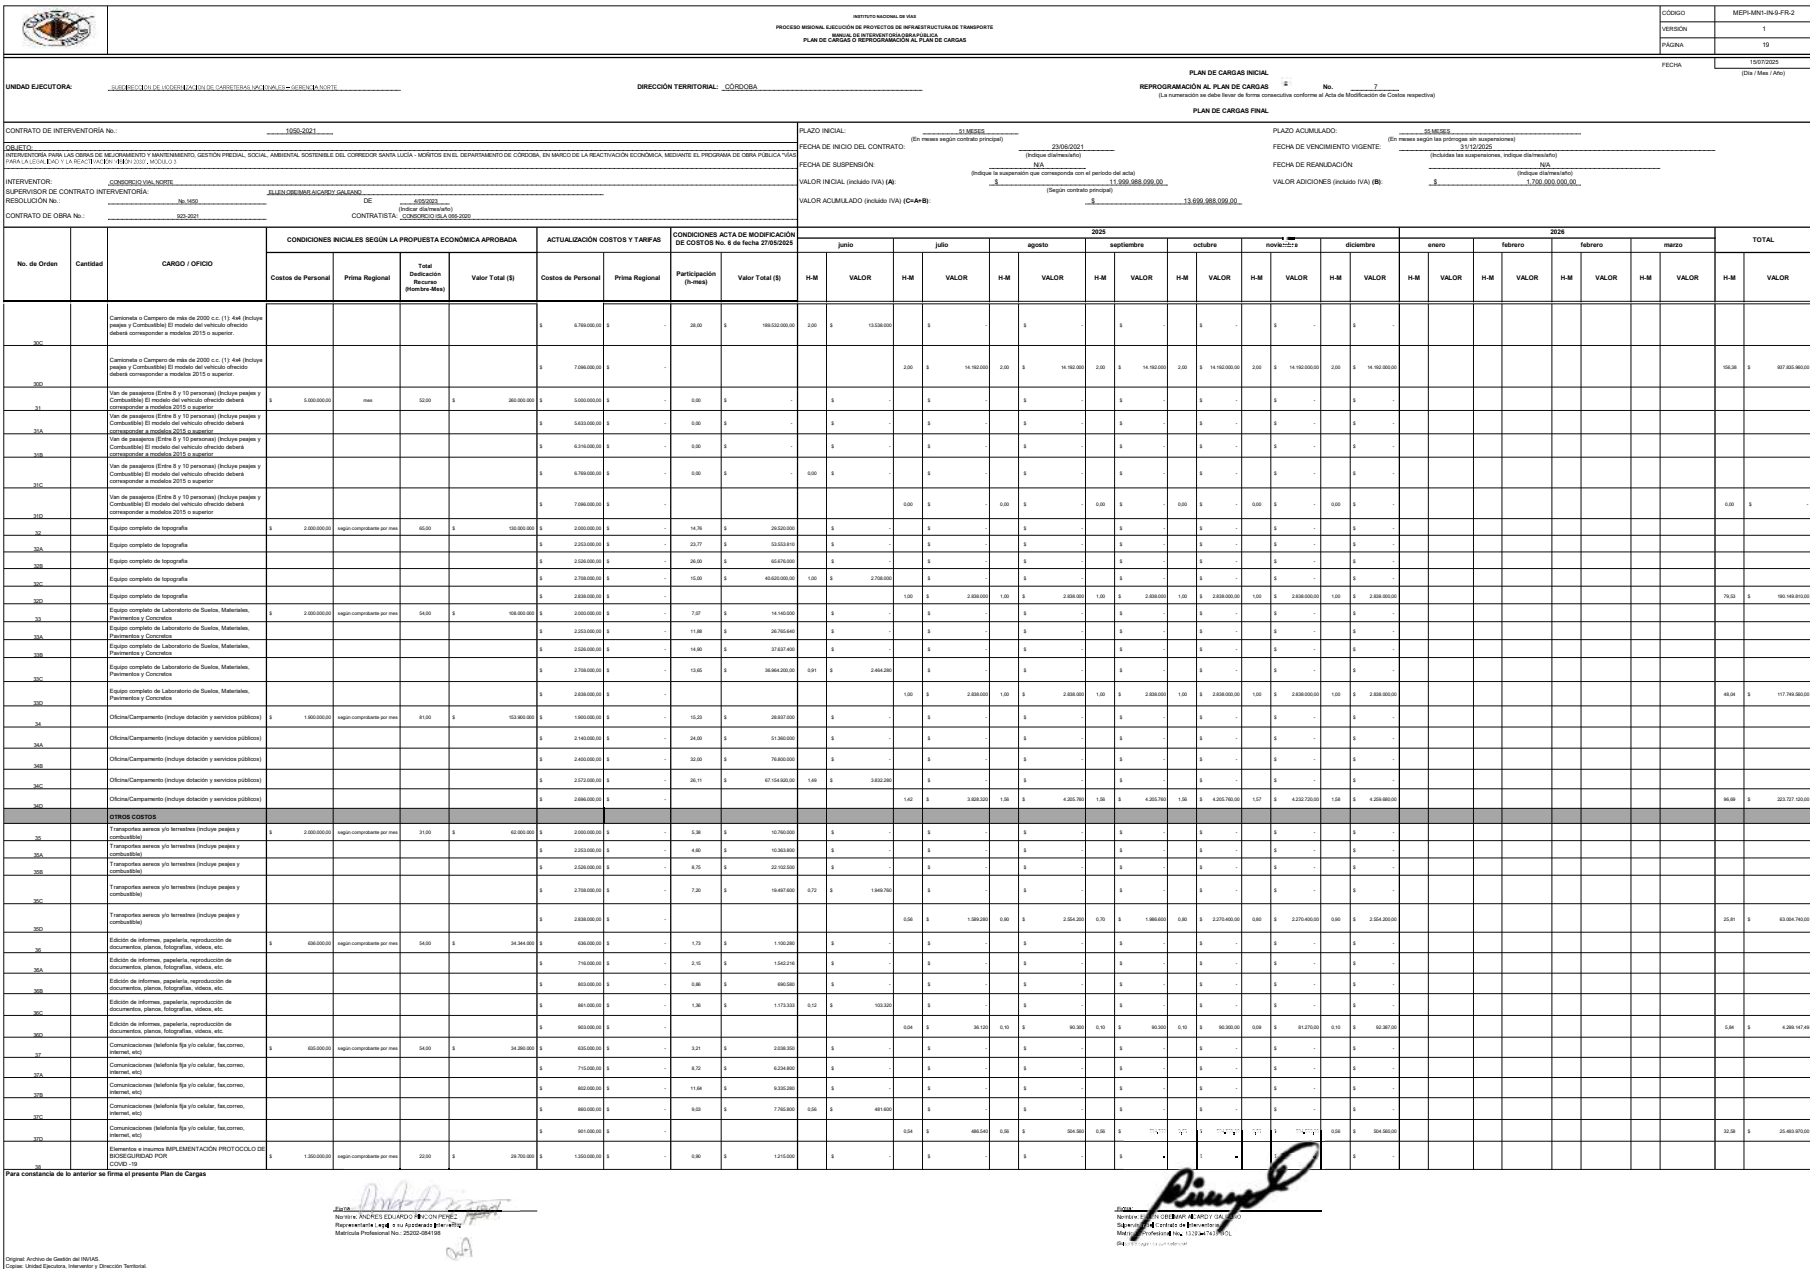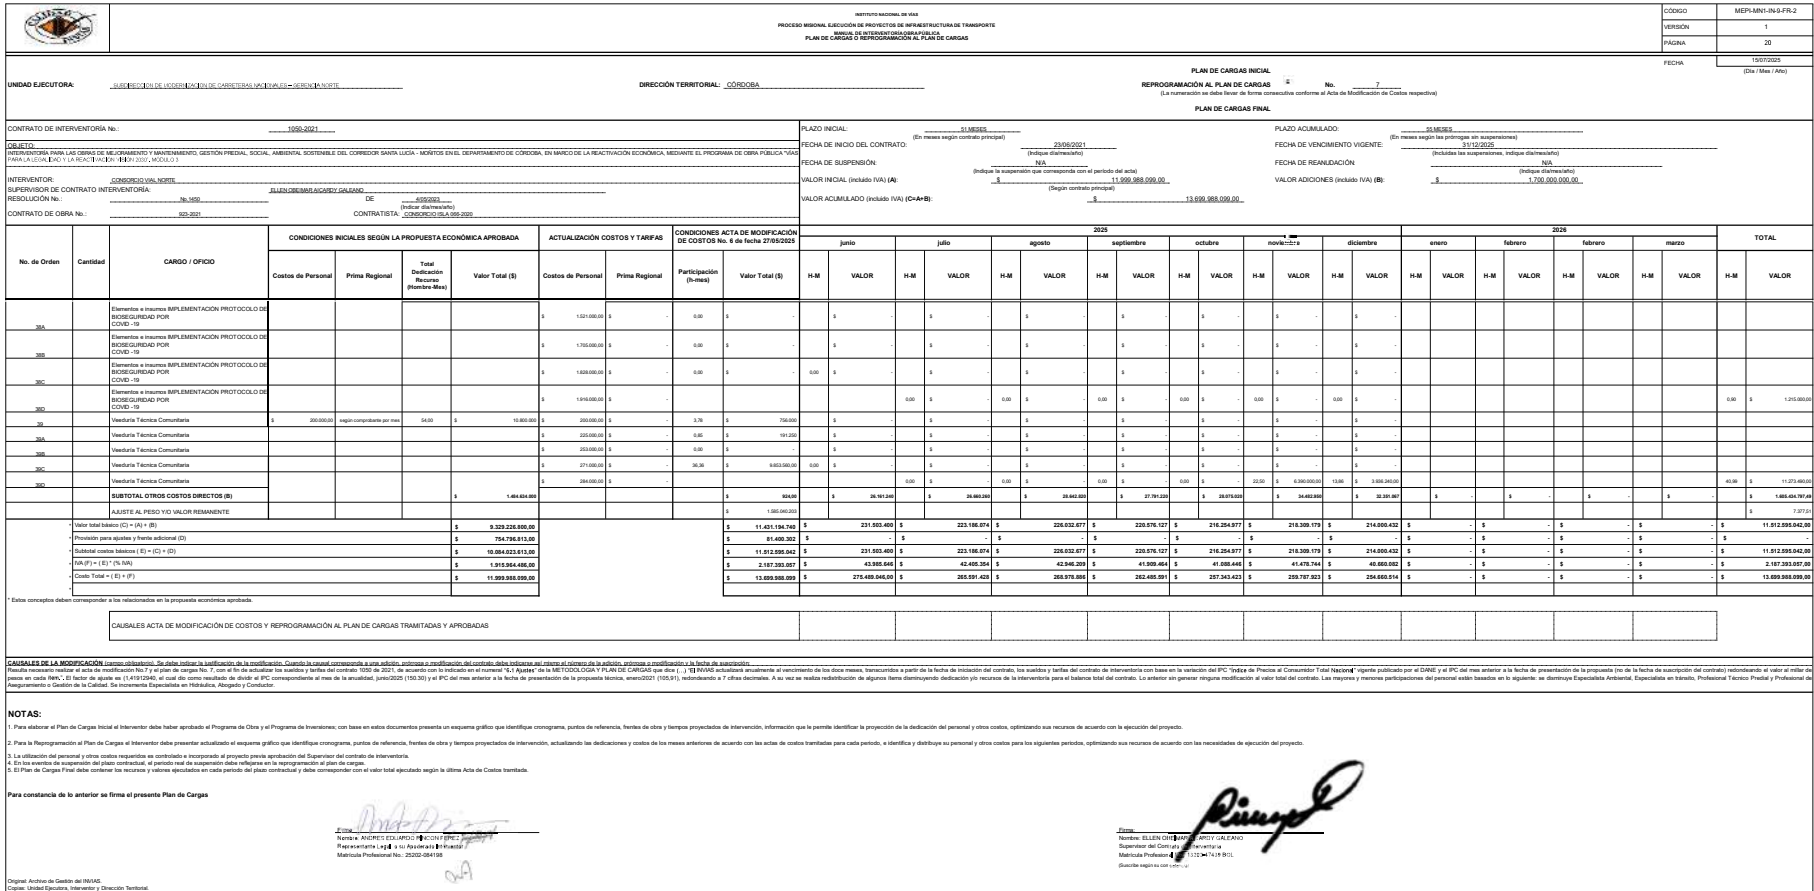Nombre: **ELLEN CIBEIRAC ALARIN GALEANO**
Supervisor de Control de Inventario
Matrícula Profesional No. 132974739 BOL







																		CÓDIGO		MEP/ANI-INI-FR-2		
																		VERSION		1		
																		PÁGINA		1		
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS																						
No. de Orden	Cantida d	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y FARRAS				CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA											
			CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA											
			CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA											
			CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA											
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				
CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA		CONDICIONES ACTUALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA						

|--|

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS																		CÓDIGO	MEPL-MN1-IN-9-FR-2																	
																		VERSION	1																	
																		PÁGINA	1																	
No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA			ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 6 de fecha 27/09/2023														TOTAL														
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Empleado/Recursos (Personas-Mes)	Valor Total (\$)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (Pctos)	Valor Total (\$)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR								
33		Equipo completo de Laboratorio de Suave, Materiales, Pavimentos y Concreto	\$	2,000,000.00	según complementos por mes	54.00	\$	108,000.00	\$	2,000,000.00	\$	-	7.07	\$	14,140.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
33A		Equipo completo de Laboratorio de Suave, Materiales, Pavimentos y Concreto					\$	2,000,000.00	\$	-	11.88	\$	26,360.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
33B		Equipo completo de Laboratorio de Suave, Materiales, Pavimentos y Concreto					\$	2,000,000.00	\$	-	14.00	\$	37,637.40	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			
36C		Equipo completo de Laboratorio de Suave, Materiales, Pavimentos y Concreto					\$	2,700,000.00	\$	-	10.65	\$	30,865.00	0.91	\$	2,460.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
36D		Equipo completo de Laboratorio de Suave, Materiales, Pavimentos y Concreto					\$	2,800,000.00	\$	-			0.97	\$	2,480.00	1.00	\$	2,800.00	1.00	\$	2,800.00	1.00	\$	2,800.00	1.00	\$	2,800.00					47.04	\$	117,380.00		
36E		Oficina/Compuesto (incluye dotación y servicios públicos)	\$	1,800,000.00	según complementos por mes	81.00	\$	102,000.00	\$	-	10.20	\$	38,607.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36F		Oficina/Compuesto (incluye dotación y servicios públicos)					\$	2,140,000.00	\$	-	24.00	\$	51,360.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36H		Oficina/Compuesto (incluye dotación y servicios públicos)					\$	2,400,000.00	\$	-	30.00	\$	76,800.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36I		Oficina/Compuesto (incluye dotación y servicios públicos)					\$	2,070,000.00	\$	-	26.11	\$	47,154.80	0.96	\$	3,893.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
36J		Oficina/Compuesto (incluye dotación y servicios públicos)					\$	2,880,000.00	\$	-			1.01	\$	3,861.00	1.00	\$	3,860.00	1.00	\$	4,200.00	1.01	\$	4,200.00	1.00	\$	4,200.00					90.07	\$	222,004.00		
OTROS COSTOS																																				
36		Transportes aéreos y/o terrestres (incluye pagaré y contribución)	\$	2,000,000.00	según complementos por mes	81.00	\$	42,000.00	\$	-	0.30	\$	10,760.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36A		Transportes aéreos y/o terrestres (incluye pagaré y contribución)					\$	2,200,000.00	\$	-	4.00	\$	10,360.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36B		Transportes aéreos y/o terrestres (incluye pagaré y contribución)					\$	2,000,000.00	\$	-	6.75	\$	30,160.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36C		Transportes aéreos y/o terrestres (incluye pagaré y contribución)					\$	2,700,000.00	\$	-	7.30	\$	19,407.40	0.72	\$	1,640.70	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
36D		Transportes aéreos y/o terrestres (incluye pagaré y contribución)					\$	2,800,000.00	\$	-			0.80	\$	1,004.14	1.00	\$	3,000.00	1.07	\$	3,000.00	0.80	\$	3,000.00	0.80	\$	3,000.00					94.19	\$	30,407,160.00		
36E		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	\$	600,000.00	según complementos por mes	54.00	\$	34,344.00	\$	-	1.70	\$	1,100.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36F		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					\$	740,000.00	\$	-	2.35	\$	1,640.24	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36G		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					\$	800,000.00	\$	-	0.80	\$	800.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36H		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					\$	800,000.00	\$	-	1.36	\$	1,170.00	0.72	\$	100.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
36I		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					\$	100,000.00	\$	-			0.04	\$	30.10	0.07	\$	40.210	0.10	\$	40.00	0.01	\$	10.000	0.00	\$	10.000					0.07	\$	4,000,000.00		
36J		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	\$	600,000.00	según complementos por mes	81.00	\$	600,000.00	\$	-	3.77	\$	2,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36K		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)					\$	700,000.00	\$	-	8.70	\$	8,004.80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36L		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)					\$	800,000.00	\$	-	11.64	\$	9,400.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36M		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)					\$	800,000.00	\$	-	9.00	\$	7,700.00	0.06	\$	400.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
36N		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)					\$	800,000.00	\$	-			0.04	\$	100.00	0.00	\$	120.00	0.04	\$	100.00	0.00	\$	100.00	0.00	\$	100.00					90.00	\$	20,000,000.00		
36O		Elementos e insumos IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$	1,500,000.00	según complementos por mes	22.00	\$	28,700.00	\$	-	0.40	\$	1,210.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36P		Elementos e insumos IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19					\$	1,000,000.00	\$	-	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36Q		Elementos e insumos IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19					\$	1,700,000.00	\$	-	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36R		Elementos e insumos IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19					\$	1,600,000.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
36S		Elementos e insumos IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19					\$	1,900,000.00	\$	-			0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-
36T		Verdulería Tercera Comensalía	\$	200,000.00	según complementos por mes	64.00	\$	16,000.00	\$	-	0.76	\$	700.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36U		Verdulería Tercera Comensalía					\$	200,000.00	\$	-	0.80	\$	90.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36V		Verdulería Tercera Comensalía					\$	200,000.00	\$	-	0.80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
36W		Verdulería Tercera Comensalía					\$	270,000.00	\$	-	36.36	\$	9,600.00	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
36X		Verdulería Tercera Comensalía					\$	284,000.00	\$	-			0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)																																				
AJUSTE AL PRECIO Y/O VALOR REMANENTE																																				
Valor total ítem (C) = (B) + (E)																																				
Provisión para ajustes y fondo adicional (F)																																				
Subtotal costos ítem (G) = (C) + (F)																																				
Sub (F) = (E) * (F) IVA																																				
Costo Total = (G) + (F)																																				

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estado de la ejecución del proyecto al periodo del presente mes se encuentra en una inversión básica de obra del 96.25 %, equivalente a \$133 229 165 067 millones de pesos que comparando con el programado del 103.11% que corresponde a \$142 725 952 599 millones de pesos. Se presenta un atraso del 6.65% a corte del presente informe, por lo cual el contratista se encuentra incumpliendo el programa de inversión aprobado. No obstante, se estaba tramitando la solicitud de la prórroga N.º 2 por dos meses, es decir, hasta el 28 de febrero de 2026; dicha prórroga fue suscrita por el instituto el 23 de diciembre de 2025.

Seguidamente, se procedió con la radicación del acta de modificación de cantidades y la reprogramación al programa de inversión N.º 17, la cual fue remitida a la dirección territorial para el respectivo seguimiento de las actas de obra que se generen durante los meses de enero y febrero de 2026.

En cuanto a las actividades en obra, se realizó la renivelación con MDC-10 para el tramo con severidad moderada del PR8+795 al PR9+300 y la instalación de sobrecarpeta en MSC-19 con GCR en el mismo tramo. Asimismo, se ejecutó la construcción de losas para cierre de broche del PR25+699.45 al PR25+750 (costado derecho) y la costura de losas de pavimento MR-40 en el PR31+100.

Se realizan actividades de perforación e inyección de lechada para la protección de taludes del PR10+650 al PR10+670, del PR10+682 al PR10+717, y del PR10+768 al PR10+797 (costado derecho), así como en el PR12+800. Se incluyó la instalación de manto TRM-500 del PR10+768 al PR10+798 y de malla de triple torsión con geomanto en los sectores del PR10+650 al PR10+798 (costado derecho).

En el PR28+200 se lleva a cabo la construcción de geogaviones. Asimismo, se realiza el traslado de la tubería de acueducto en el PR40+200 (margen derecha). En cuanto al muro del PR40+200, se ejecutan actividades de corte, perfilado de talud y mejoramiento con losas demolidas para la ampliación del carril izquierdo, además de la excavación y el retiro de material para la cimentación del muro. Finalmente, se procedió con la fundida de 1.20 m de concreto ciclópeo (para reposición) en el módulo 3.

Finalmente, los puentes del PR6+970, PR34+500, PR45+300 y PR45+700 se encuentran terminados y habilitados para la circulación del tráfico vehicular.

Durante el mes de noviembre 2025 se realiza seguimiento a las actividades de reparación paliativa mediante el método de costura cruzada.

En cuanto a la modificación y ajuste de los diseños, al corte del 31 de diciembre de 2025 se vienen realizando los ajustes necesarios entre el PR2+150 al PR46+000. Se han presentado diferentes ajustes a los diseños fase III por lo que han surgido mayores cantidades de obras y ítem no previstos. Se han identificado sitios con riesgos menores los cuales requieren tratamiento que se encuentran en estudio de los especialistas.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Se presenta acta parcial de obra # 55 correspondiente a las actividades realizadas en el mes de diciembre 2025.

La inversión total ejecutada acumulada en el contrato de obra a corte del 31 de diciembre de 2025 es de \$ 163.476.012.053 millones de pesos, equivalente al 91.44% con respecto al valor del contrato.

Para el contrato de obra se otorgó en el mes de agosto de 2021 un valor de \$ 8.225.125.125 como anticipo, en el mes de diciembre-21 se tramitó un segundo anticipo por valor de \$2.747.414.331 y en el mes de agosto-23 se tramitó un tercer anticipo por valor de \$3.371.395.812 para un valor total de anticipo de \$14.343.935.268, de los cuales con el acumulado del acta de obra # 55 se alcanzó a amortizar el 100%. (\$14.343.935.268 millones de pesos).

Para el contrato de interventoría se otorgó en el mes de agosto-21 \$ 504.201.181 como anticipo y en el mes de diciembre de 2021 se tramitó un segundo anticipo de \$289.629.974, de los cuales con el acta de costo # 18 correspondiente al mes de noviembre de 2022 se terminó de amortizar el anticipo al 100%.

Durante el mes de diciembre 2025 se realiza seguimiento a las actividades de costura cruzada.

Durante el mes de diciembre 2025 se realiza seguimiento a las actividades de reparación en el sector con severidad moderada PR8+795 al PR9+300.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

8. ANEXOS

8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Correspondencia enviada diciembre de 2025

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3971	49980-CE-3971	3/12/2025		RESPUESTA RADICADO 46617-DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN CON BARRERA DE TRÁFICO K41+150 CI
3972	49980-CE-3972	3/12/2025		REMISIÓN COMUNICACIÓN 2025S-VBOG-091929 – RESPUESTA RADICADO 46530 “REMISIÓN PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL V7”
3973	49980-CE-3973	3/12/2025	2025E-VUVRAZ-138202	RESPUESTA A SOLICITUD DE DONACIÓN MATERIAL FRESADO Y CUSCO PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN VÍAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA
3974	49980-CE-3974	3/12/2025		RADICADO 46831-RESPUESTA OBSERVACIONES DE GEOTECNIA MURO K31+350
3975	49980-CE-3975	3/12/2025	2025E-VUVRAZ-138215	REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL DE INTERVENTORÍA DEL COMPONENTE DE SOSTENIBILIDAD #16
3976	49980-CE-3976	3/12/2025	2025E-VUVRAZ-138217	RESPUESTA A OFICIO INVIAS 2025S-VBOG-082641DEL 31-10-2025
3977	49980-CE-3977	3/12/2025	2025E-VUVRAZ-138226	REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL DE INTERVENTORÍA DEL COMPONENTE DE SOSTENIBILIDAD #17
3978	49980-CE-3978	3/12/2025		REMISIÓN DE COMUNICACIONES EMITIDAS POR INVIAS EN CUANTO A LA INSCRIPCIÓN DE OFERTA DEL PREDIO 004-I-T1-MSM
3979	49980-CE-3979	3/12/2025	2025E-VUVRAZ-138229	REMISIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN DEL EXPEDIENTE PREDIAL N°001-I-T10-MSM ADIS MACIAS BELLO
3980	49980-CE-3980	3/12/2025	2025E-VUVRAZ-138350	REMISIÓN DE INSCRIPCIÓN DE OFERTA PARA EL PREDIO 003-I-T7-MSM

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3981	49980-CE-3981	3/12/2025	2025E-VUVRAZ-138351	REMISIÓN DE INSCRIPCIÓN DE OFERTA PARA EL PREDIO 014-D-T3-MSM
3982	49980-CE-3982	4/12/2025	2025E-VUVRAZ-139053	REMISION RADICADO CVS 20252118740 – REDUCCION TASA APROVECHAMIENTO FORESTAL
3983	49980-CE-3983	15/12/2025		CONCEPTO FAVORABLE RESPECTO SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA No 2 - HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026
3984	49980-CE-3984	15/12/2025		SOLICITUD PRÓRROGA # 2 - CONSISTENTE EN LA SOLICITUD DE UNA PRÓRROGA HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026 PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1050 DE 2021
3985	49980-CE-3985	4/12/2025		RESPUESTA RADICADO 46644- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3772– ATENCIÓN OBSERVACIONES SITIOS K41+130
3986	49980-CE-3986	4/12/2025		RADICADO 46844– RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3932 - SEÑALIZACIÓN VIAL – APREMIO
3987	49980-CE-3987	9/12/2025		RADICADO 46921- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3921 REQUERIMIENTO PAGO SELLO DE CUNETAS – PAVIMENTO MR 40
3988	49980-CE-3988	5/12/2025		SOLICITUD DE INFORME PARA EL PREDIO 003-I-T3-MSM - RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN
3989	49980-CE-3989	9/12/2025	2025E-VUVRAZ-140110	RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025S-VBOG-093761 – “INFORME TRIMESTRAL AMBIENTAL No. 16”
3990	49980-CE-3990	5/12/2025		RESPUESTA RADICADO 46687- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3806– ENTREGA DISEÑO Y MEMORIA GEOTÉCNICA MURO DE CONTENCIÓN K41+865 AL K41+882 CARRIL IZQUIERDO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
3992	49980-CE-3992	9/12/2025		RESPUESTA RADICADO 46945 - INFORME AMBIENTAL NOVIEMBRE 2025
3993	49980-CE-3993	11/12/2025		RESPUESTA COMUNICADO 46985 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025- APROBACIÓN INFORME ACTIVIDADES SOCIALES N°54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025
3994	49980-CE-3994	11/12/2025		SOLICITUD CONCEPTO DE NO OBJECCIÓN DE UNA (1) FICHA SOCIO ECONÓMICA
3995	49980-CE-3995	11/12/2025		RADICADO 46986- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3938 - ENTREGA NOTA TECNICA PARA VERIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL BOX CULVERT K23+940
3996	49980-CE-3996	11/12/2025		RADICADO 46987- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3936 - ENTREGA CONCEPTO TÉCNICO HIDRÁULICO CONTROL DE SOCAVACIÓN SITIO CRITICO K24+630 AL K24+480 CARRIL DERECHO
3997	49980-CE-3997	17/12/2025		RESPUESTA COMUNICADO 46768 – ASUNTO: “RESPUESTA RADICADO 46419- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3768- PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS FUNCIONALES PARA INTERVENCIÓN DE LOSAS CON AFECTACIONES” - MEM-0188
3998	49980-CE-3998	11/12/2025		RESPUESTA RADICADO 46844- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3932 SEÑALIZACIÓN VIAL – APREMIO
3999	49980-CE-3999	11/12/2025		RESPUESTA A OFICIO INVIAS 2024S-VBOG-042094 ATENCIÓN OBSERVACIONES AL INFORME TRIMESTRAL DE SOSTENIBILIDAD
4000	49980-CE-4000	11/12/2025		RESPUESTA RADICADO 46688- RESPUESTA A COMUNICADO 49980-CE-3909- APREMIO CONSTRUCCIÓN DEL MURO PR8+450

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4001	49980-CE-4001	11/12/2025		RESPUESTA A OFICIO INVÍAS 2024S-VBOG-035249, ATENCIÓN OBSERVACIONES AL INFORME TRIMESTRAL DE SOSTENIBILIDAD No. 10
4002	49980-CE-4002	11/12/2025		RESPUESTA COMUNICADO 46984 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025. OBSERVACIONES PROPUESTA OBRA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "ADECUACIÓN DEL COMEDOR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAJO BLANCO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS"
4003	49980-CE-4003	12/12/2025		RESPUESTA RADICADO 47049- RESPUESTA A COMUNICADO 49980-CE-3970 - ENTREGA DE DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN PARA TALUD DEL K40+260
4004	49980-CE-4004	12/12/2025		REMISIÓN DE 4 CANCELACIONES DE OFERTA CORRESPONDIENTES A LAS FICHAS PEDIALES
4005	49980-CE-4005	12/12/2025		EMITIR RESPUESTA AL RADICADO 47048 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2025, REMISIÓN DE COMUNICACIÓN EMITIDA POR INVÍAS EN CUANTO A LA INSCRIPCIÓN DE OFERTA DEL PREDIO 004-I-T1-MSM
4006	49980-CE-4006	15/12/2025		RADICADO 47055- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3865 INFORME RECORRIDO OBRA RECORRIDO DE INSPECCIÓN PAVIMENTOS EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
4007	49980-CE-4007	12/12/2025		RADICADO 47088 - CANTIDADES PARA LA DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y TACHAS REQUERIDAS EN EL TRAMO DEL K46+520 AL K51+830
4008	49980-CE-4008	15/12/2025		RESPUESTA A COMUNICACIÓN 46798 RELACIONADA CON REMISION DE INFORMES DE DESAFECTACION
4009	49980-CE-4009	17/12/2025		REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) – MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS INDUSTRIALES

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4010	49980-CE-4010	17/12/2025		RESPUESTA RADICADO 46768- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3937- PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS FUNCIONALES PARA INTERVENCIÓN DE LOSAS CON AFECTACIONES"
4011	49980-CE-4011	17/12/2025		RESPUESTA RADICADO 47055- RESPUESTA A COMUNICADO 49980-CE-3865- INFORME RECORRIDO DE INSPECCIÓN PAVIMENTOS EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
4012	49980-CE-4012	19/12/2025		DEVOLUCIÓN DEL INFORME DE TRAZABILIDAD PARA EL PREDIO 003-I-T3-MSM
4013	49980-CE-4013	19/12/2025		INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES PR8+795 AL PR9+300 CALZADA- REPARACIONES SECTOR CON SEVERIDAD MODERADA
4014	49980-CE-4014	19/12/2025		RESPUESTA RADICADO 46987- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3936- ENTREGA CONCEPTO TÉCNICO HIDRÁULICO CONTROL DE SOCAVACIÓN SITIO CRITICO K24+630 AL K24+480 CARRIL DERECHO
4015	49980-CE-4015	19/12/2025		RESPUESTA RADICADO 46986- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3938 - ENTREGA NOTA TECNICA PARA VERIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL BOX CULVERT K23+940
4016	49980-CE-4016	19/12/2025		RESPUESTA A OFICIO INVIAS 2025S-VBOG-054868 DEL 01-08-2025
4017	49980-CE-4017	19/12/2025		RESPUESTA A OFICIO INVIAS 2025S-VBOG-08264 del 31-10-2025
4018	49980-CE-4018	19/12/2025		RESPUESTA RADICADO 47088- CANTIDADES PARA LA DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y TACHAS REQUERIDAS EN EL TRAMO DEL K46+520 AL K51+830
4019	49980-CE-4019	19/12/2025		RESPUESTA COMUNICADO 47216- ENTREGA SOPORTES ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD NOVIEMBRE 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4020	49980-CE-4020	19/12/2025		RADICADO 47226- RESPUESTA COMUNICADOS 49980-CE-4003 Y 49980-CE-3970 - ENTREGA DE DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN PARA TALUD DEL K40+260
4021	49980-CE-4021	22/12/2025		RESPUESTA RADICADO 47215- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE FORMATO F-CO-03-01
4022	49980-CE-4022	22/12/2025		REMISIÓN DE LA PRE-ACTA NO 55 DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Correspondencia recibida diciembre de 2025.

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4853	49980-CR-4853	1/12/2025	D138-25	COMUNICACIÓN INTERNA 49980-CE-3968. RADICADO 46617- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3844-DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN CON BARRERA DE TRÁFICO K41+150 CI
4854	49980-CR-4854	1/12/2025	2025S-VBOG-091929	RESPUESTA AL RADICADO 2025E-VUVRAZ-129789 PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL VERSIÓN 7
4855	49980-CR-4855	1/12/2025	46827	RESPUESTA A RADICADO 335022 COMUNICADO 49980-CE-3957 RESPUESTA RADICADO 46591 DE ASUNTO ENTREGA DOCUMENTOS DENSIMETRO NUCLEAR MODELO 3430 E INTENSIMETRO MODELO 3105 B
4856	49980-CR-4856	1/12/2025	46830	RESPUESTA A RADICADO 335505 COMUNICADO 49980-CE-3966 SOLICITUD DE DONACIÓN MATERIAL FRESADO Y/O DEMOLICIÓN PLACAS MR
4857	49980-CR-4857	1/12/2025	46831	RESPUESTA A RADICADO 333961 COMUNICADO 49980-CE-3924 RESPUESTA RADICADO 46271- RESPUESTA OBSERVACIONES DE GEOTECNIA MURO K31+350
4858	49980-CR-4858	1/12/2025	46832	ENTREGA DE INFORME MEPI SG-SST
4859	49980-CR-4859	1/12/2025	46833	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN SOCIO PREDIAL- PREDIOS 005B-I-T10 LESVIA INÉS CASTRO PADILLA
4860	49980-CR-4860	1/12/2025	46834	RESPUESTA A RADICADO 334841 COMUNICADO 49980-CE-3933 RESPUESTA RADICADO 46269 DE ASUNTO SITIOS CRITICOS PARA INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE CONTENCIÓN
4861	49980-CR-4861	1/12/2025	CORREO _ 2025I-VBOG-096215	OFICIO A TERRITORIAL, 2025I-VBOG-096215 _REMISIÓN PARA FIRMA DE MINUTA 003-I-T6-MSM
4862	49980-CR-4862	1/12/2025	MEMORANDO -048-2025	INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTA EN VÍAS PERIODO NOVIEMBRE DE 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4863	49980-CR-4863	1/12/2025	CORREO _ 2025I-VBOG- 096215	FICIO A TERRITORIAL, 2025I-VBOG-096215 _REMISIÓN PARA FIRMA DE MINUTA 003-I-T6-MSM
4864	49980-CR-4864	1/12/2025	46844	RESPUESTA A RADICADO 334506 COMUNICADO 49980-CE-3932 RESPUESTA RADICADO 46417- ALCANCE A RADICADO 46336 RESPUESTA A RADICADO 332774 COMUNICADO 49980-CE-3897 SEÑALIZACIÓN VIAL – APREMIO
4865	49980-CR-4865	1/12/2025	46820	REMISIÓN DE INFORME MENSUAL PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025
4866	49980-CR-4866	1/12/2025	46845	REMISIÓN DE PREACTA PREDIAL NO 54 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025
4867	49980-CR-4867	2/12/2025	CORREO	CONTESTACIÓN OFERTA FORMAL DE COMPRA CON RADICADO N° 2025S-VBOG- 056696 DEL 8 DE AGOSTO DE 2025, PREDIO IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRÍCULA 140-86245, 004-I-T1-MSM
4868	49980-CR-4868	2/12/2025	CORREO	CONTESTACIÓN OFERTA FORMAL DE COMPRA CON RADICADO N° 2025S-VBOG- 056696 DEL 8 DE AGOSTO DE 2025, PREDIO IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRÍCULA 140-86245, 004-I-T1-MSM
4869	49980-CR-4869	2/12/2025		INFORME MENSUAL PREDIAL
4870	49980-CR-4870	2/12/2025	CORREO	RECURSO DE REPOSICION ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCION 4749 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2025
4871	49980-CR-4871	2/12/2025	CORREO	RECURSO DE REPOSICION ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCION 4749 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2025
4872	49980-CR-4872	2/12/2025	46868	REMISIÓN DE UN 01 INSUMO PREDIAL CONSISTENTE EN INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA DEL EXPEDIENTE PREDIAL N°014-D-T3-MSM ANDRÉS CEFERINO COHEN NARVÁEZ QEPD Y OTROS
4873	49980-CR-4873	2/12/2025	CORREO	003-I-T3-MSM - RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4874	49980-CR-4874	2/12/2025	46870	REMISIÓN DE UN (01) INSUMO PREDIAL CONSISTENTE EN INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA DEL EXPEDIENTE PREDIAL N°003-I-T7-MSM (ORLANDO ANICHIARICO MORALES (Q.E.P.D.) - PROPIETARIO Y/O HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS Y OTROS).
4875	49980-CR-4875	3/12/2025	2025S-VBOG-092970	RESPUESTA AL RADICADO NO 2025E-VUVRAZ-105252
4876	49980-CR-4876	3/12/2025	46873	REMISIÓN DE UN 01 RECURSO DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN DEL EXPEDIENTE PREDIAL N°001-I-T10-MSM ADIS MACIAS BELLO
4877	49980-CR-4877	5/12/2025	46920	INSUMOS PREDIALES RADICADOS EN EL INVÍAS EN EL MES DE AGOSTO 2025
4878	49980-CR-4878	5/12/2025	46921	RESPUESTA A RADICADO 333936 COMUNICADO 49980-CE-3921 REQUERIMIENTO SELLO DE CUNETAS – PAVIMENTO MR 40
4879	49980-CR-4879	5/12/2025	CORREO	ENTREGA CONTRATO MEJORAS 015-A-D-T3-MSM
4880	49980-CR-4880	5/12/2025	CORREO	ENTREGA CONTRATO MEJORAS 015-A-D-T3-MSM
4881	49980-CR-4881	5/12/2025	CORREO	003-I-T3-MSM - RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN
4882	49980-CR-4882	5/12/2025	2025S-VBOG-093761	RESPUESTA AL RADICADO 2025E-VUVRAZ-075276 INFORME ESTADO AMBIENTAL CO 923 2021 CI 1050 2021
4883	49980-CR-4883	5/12/2025		RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3955 CUYO ASUNTO SE REFERENCIA COMO “RADICADO 46687- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3806– ENTREGA DISEÑO Y MEMORIA GEOTÉCNICA MURO DE CONTENCIÓN K41+865 AL K41+882 CARRIL IZQUIERDO”.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4884	49980-CR-4884	5/12/2025	46922	REMISIÓN DE UN (01) INSUMO PREDIAL CONSISTENTE EN CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y/O INFORME TÉCNICO - JURÍDICO DEL EXPEDIENTE PREDIAL N°002-D-T6-MSM (HONORIA DEL CARMEN DE VARGAS BURGOS)
4885	49980-CR-4885	5/12/2025	46942	REMISIÓN NOTIFICACIÓN CVS NO 20252118740
4886	49980-CR-4886	5/12/2025	46945	REMISIÓN INFORME AMBIENTAL CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2025
4887	49980-CR-4887	5/12/2025	46954	REMISIÓN DE DOS (02) INSUMOS PREDIALES CONSISTENTE EN ALCANCE DE OFERTA DE COMPRA Y ALCANCE DE INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA DEL EXPEDIENTE PREDIAL N°006-D-T6-MSM (ROBINSON MIGUEL AGAMEZ LAMBERTINEZ)
4888	49980-CR-4888	5/12/2025	46957	ENTREGA INFORME MENSUAL SG-SST NOVIEMBRE 2025
4889	49980-CR-4889	9/12/2025		INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2025
4890	49980-CR-4890	9/12/2025	46984	REMISIÓN PROPUESTA OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA OPC "ADECUACIÓN DEL COMEDOR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAJO BLANCO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS"
4891	49980-CR-4891	9/12/2025	46985	REMISIÓN INFORME SOCIAL N°54 - NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025
4892	49980-CR-4892	9/12/2025	46986	RESPUESTA A RADICADO 334519 COMUNICADO 49980-CE-3938 RESPUESTA RADICADO 46298- ENTREGA NOTA TECNICA PARA VERIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL BOX CULVERT K23+940

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4893	49980-CR-4893	9/12/2025	46987	RESPUESTA A RADICADO 334529 COMUNICADO 49980-CE-3936 RESPUESTA RADICADO 46270- ENTREGA CONCEPTO TÉCNICO HIDRÁULICO CONTROL DE SOCAVACIÓN SITIO CRITICO K24+630 AL K24+480 CARRIL DERECHO
4894	49980-CR-4894	9/12/2025		RESPUESTA 49980-CE-3986 CON ASUNTO: RADICADO 46844- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3932 -SEÑALIZACIÓN VIAL – APREMIO
4895	49980-CR-4895	9/12/2025		RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3956 CUYO ASUNTO SE REFERENCIA COMO “RADICADO 46688- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3909-APREMIO CONSTRUCCIÓN DEL MURO PR8+450.”
4896	49980-CR-4896	11/12/2025	2025S-VBOG-094644	TRASLADO RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCION 4749 DEL 2025,FP 001-D-T1-MSM
4897	49980-CR-4897	11/12/2025	CORREO	SMCN GNOR ACTA DE AJUSTES DE OBRA PROVISIONAL No. 52 SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 923 DE 2021 - CONSORCIO ISLA 066-2020, NIT 901.479.090-8 RP 118225;11;201044065 SANTA LUCIA - MOÑITOS
4898	49980-CR-4898	11/12/2025	CORREO	ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS #6 COT 923-2021
4899	49980-CR-4899	11/12/2025	CORREO	RESOLUCION 5185 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 _006-D-T10-MSM SANEAMIENTO POR MINISTERIO DE LA LEY
4900	49980-CR-4900	11/12/2025	CORREO	RESOLUCIÓN EXPROPIACIÓN PREDIO 016DTU-MCPT REITERACION CORRECONES
4901	49980-CR-4901	11/12/2025	47048	RADICADO NO 336380 COMUNICADO 49980-CE-3978 RESPUESTA. CON ASUNTO “REMISIÓN DE COMUNICACIONES EMITIDAS POR INVÍAS EN CUANTO A LA INSCRIPCIÓN DE OFERTA DEL PREDIO 004-I-T1-MSM”
4902	49980-CR-4902	11/12/2025	47049	RESPUESTA A RADICADO 335810 COMUNICADO 49980-CE-3970 RESPUESTA RADICADO 46642-- ENTREGA DE DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN PARA TALUD DEL K40+260

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4903	49980-CR-4903	11/12/2025	47052	REMISIÓN DE ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE
4904	49980-CR-4904	11/12/2025	47053	REMISIÓN INFORME SOCIAL N°54 - NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2025
4905	49980-CR-4905	11/12/2025	47055	RESPUESTA A RADICADO 331332 INFORME RECORRIDO OBRA RECORRIDO DE INSPECCIÓN PAVIMENTOS EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
4906	49980-CR-4906	11/12/2025	47056	ALCANCE AL COMUNICADO DE SALIDA N°46868 DE FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 - REMISIÓN DE UN (01) INSUMO PREDIAL CONSISTENTE EN INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA DEL EXPEDIENTE PREDIAL N°014-D-T3-MSM (ANDRÉS CEFERINO COHEN NARVÁEZ (Q.E.P.D.) Y OTROS).
4907	49980-CR-4907	12/12/2025	47057	REMISIÓN DE CUATRO (04) INSUMOS PEDIALES CONSISTENTE EN CANCELACIÓN DE OFERTA DE COMPRA DE LOS EXPEDIENTES PEDIALES N°002-D-T3-MSM; 015I-T3-MSM; 003-I-T3-MSM; 002-D-T7-MSM.
4908	49980-CR-4908	12/12/2025	47088	CANTIDADES PARA LA DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y TACHAS REQUERIDAS EN EL TRAMO DEL K46+520 AL K51+830
4909	49980-CR-4909	12/12/2025	47089	ACTA DE OBRA NO54 NOVIEMBRE DE 2025
4910	49980-CR-4910	17/12/2025		INFORME PREDIAL NOVIEMBRE DE 2025
4911	49980-CR-4911	15/12/2025	46880	SOLICITUD PRÓRROGA NO 2 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026
4912	49980-CR-4912	15/12/2025	47127	LISTADO DE PERSONAL DISPONIBLE POR CESE DE ACTIVIDADES TEMPORADA DE FIN DE AÑO 2025 E INICIO AÑO 2026
4913	49980-CR-4913	18/12/2025	47201	REPORTE DE AFECTACIÓN AL AVANCE DE OBRA FIN DE AÑO POR ALTERACIONES DE ORDEN PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4914	49980-CR-4914	19/12/2025	INVIAS-DTCOR-OS-R25-0001	RESPUESTA RIDICADO 49980-CE-4007 12-12-2025
4915	49980-CR-4915	19/12/2025	47215	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE FORMATO F-CO-03-01
4916	49980-CR-4916	19/12/2025	47216	ENTREGA SOPORTES ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD NOVIEMBRE 2025
4917	49980-CR-4917	19/12/2025	47217	RADICADO NO 337594 COMUNICADO 49980-CE-3988 RESPUESTA. CON ASUNTO "SOLICITUD DE INFORME PARA EL PREDIO 003-I-T3-MSM - RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN"
4918	49980-CR-4918	19/12/2025	47226	RESPUESTA A RADICADO 338187 COMUNICADO 49980-CE-4003 RESPUESTA RADICADO 47049- RESPUESTA A COMUNICADO 49980-CE- 3970 - ENTREGA DE DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN PARA TALUD DEL K40+260
4919	49980-CR-4919	19/12/2025	47234	REMISIÓN INFORME SOCIAL N°55 - DICIEMBRE 1 AL 31 DE 2025
4920	49980-CR-4920	19/12/2025	47236	RADICADO ACTA DE AJUSTES DEFINITIVOS No.52 (SEPTIEMBRE), No.53 (OCTUBRE) Y PROVISIONAL No.54 (NOVIEMBRE)
4921	49980-CR-4921	22/12/2025	47282	ACTA DE OBRA No.55 (DICIEMBRE DE 2025)
4922	49980-CR-4922	19/12/2025	CORREO	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.53 (octubre-25)
4923	49980-CR-4923	19/12/2025	CORREO	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.54 (noviembre-25)
4924	49980-CR-4924	22/12/2025	47284	ACTA DE AJUSTES PROVISIONALES No.55-A (DICIEMBRE DE 2025)

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4925	49980-CR-4925	22/12/2025	47286	ENTREGA DE SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL QUE INGRESA A ACTIVIDAD DE PINTURA VIAL
4926	49980-CR-4926	22/12/2025	47287	REMISIÓN INFORME SOSTENIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
4927	49980-CR-4927	23/12/2025	47297	REMISIÓN DE UNA 01 RESOLUCIÓN QUE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE PREDIAL NÚMERO 001-D-T1-MSM
4928	49980-CR-4928	23/12/2025	CORREO	REQUERIMIENTO DE RESPUESTA A RECURSO DE REPOSICION ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCION 4749 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2025
4929	49980-CR-4929	23/12/2025	D156-25	RESPUESTA 49980-CE-4020 CON ASUNTO: RADICADO 47226- RESPUESTA COMUNICADOS 49980-CE-4003 Y 49980-CE- 3970 - ENTREGA DE DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN PARA TALUD DEL K40+260
4930	49980-CR-4930	29/12/2025	47311	REMISIÓN DE UNA 01 RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN DEL EXPEDIENTE PREDIAL NÚMEROS 003-I-T7-MSM
4931	49980-CR-4931	29/12/2025	47313	RESPUESTA RADICADO 338227- COMUNICACIÓN 49980-CE-4002. OBSERVACIONES PROPUESTA OBRA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "ADECUACIÓN DEL COMEDOR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAJO BLANCO" DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS
4932	49980-CR-4932	29/12/2025	47314	RESPUESTA RADICADO 336445 COMUNICADO 49980-CE-3985 RESPUESTA RADICADO 46644 - RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE- 3772- ATENCIÓN OBSERVACIONES SITIOS K41+130.
4933	49980-CR-4933	29/12/2025	CORREO	RESOLUCION 5581 DEL 24 DE DICIEMBRE 2025 RESUELVE RECURSO REPOSICION
4934	49980-CR-4934	29/12/2025	CORREO	RESOLUCION 5581 DEL 24 DE DICIEMBRE 2025 RESUELVE RECURSO REPOSICION
4935	49980-CR-4935	29/12/2025	CORREO	RESOLUCION 5431 DEL 2025_ FP 004-I-T1-MSM

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Conse	Nombre	Fecha	N° Radicado	Asunto
4936	49980-CR-4936	29/12/2025	47325	RESPUESTA A RADICADO 334586 COMUNICADO 49980- CE-3942 RESPUESTA RADICADO 46364- RESPUESTA RADICADO 49980-CE-3855 VERIFICACIÓN Y NOTA TÉCNICA DE GEOTÉCNIA PARA MURO DE CONTENCIÓN EN EL K40+260
4937	49980-CR-4937	29/12/2025	47326	RESPUESTA RADICADO 334054 - 49980-CE-3927 RESPUESTA RADICADO 45439- ENTREGA DE DISEÑO GEOTÉCNICO MURO DE CONTENCIÓN PARA TALUD DEL K41+050
4938	49980-CR-4938	29/12/2025	47327	REMISIÓN DE DIECINUEVE 19 EXPEDIENTES PEDIALES PARA ARCHIVO EN LA ENTIDAD ADQUIRENTE
4939	49980-CR-4939	29/12/2025	47312	REMISIÓN DE UNA 01 RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN DEL EXPEDIENTE PREDIAL NÚMERO 005-D-T6-MSM

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

8.2. Registro Fotográfico.



Muestreo SBG acopiada y mejorada para el PR 8+506/589 CD.



Perforaciones en el talud del PR 10+750, margen derecha.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Malla triple torsión en el PR 10+650 lado derecho.



Ampliación en carril izquierdo del PR 40+200 con residuos de demolición de losas de concreto.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Densidades y humedades a la subrasante estabilizada con cal PR 8+506 al PR 8+590 der



Imprimación PR 8+800 hacia mayores carril derecho

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Instalación de mezcla asfáltica MDC10 PR 8+800 carril derecho



Instalación de mezcla asfáltica MDC 10 del PR 8+800 al PR 8+868-carril derecho

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Instalación MR40 PR 8+589 a menores



Instalación de carpeta de nivelación asfáltica MDC10 PR 8+868 hacia mayores carril derecho

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Toma de densidades a la capa de nivelación MDC10 con densímetro nuclear



Toma de muestras de mezcla asfáltica MDC10 para ensayos de laboratorio PR 9+169 hacia mayores carril derecho

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Instalación capa de nivelación MDC10 PR 9+169 carril derecho



Instalación mezcla asfáltica MDC10 carril izquierdo PR 8+795 carril izquierdo

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Instalación de Bituflex PR 11+000 a mayores



Preparación terrena para fundida de concreto ciclópeo del tercer módulo del muro del PR 40+200 lado derecho.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Perforaciones en el PR 12+530 a mayores, lado izquierdo.



Instalación Geomalla Pavimentos Asfálticos anclada con grapas aceradas.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Extendida MDC 19 modificada con GCR PR 8+700 carril derecho



Pintura resalto tipo Pompeyano del PR 27+870 carril izquierdo.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Instalación de mezcla asfáltica MSC19 GCR del PR9+058 hacia mayores carril derecho



Toma de muestras asfáltica MSC19 GCR para ensayos de laboratorio del PR 9+085 hacia mayores carril derecho

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Perforaciones en el PR 12+680 al PR 12+710 margen izquierda.



Fundida de resaltó tipo Pompeyano en el PR 27+577 carril derecho.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Malla triple torsión en el PR 12+558



Toma de densidades a la segunda capa de la mezcla asfáltica MSC19 con densímetro nuclear del PR 8+795 al PR 9+150 carril izquierdo

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Instalación de Defensa metálica PR 41+800



Instalación de mezcla asfáltica MSC19 GCR del PR 9+058 al PR 9+221 carril derecho

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3



Instalación de malla triple torsión en el talud del PR 12+530/550 margen izquierda.



Mezcla asfáltica MSC19 GCR del PR9+058 al PR9+221

8.3. Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales.

	
Foto 1. Limpieza plantación PR 8+370	Foto 2. Limpieza plantación PR 8+370
	
Foto 3. Instalación de malla triple torsión PR 10+700 CD	Foto 4. Instalación de malla triple torsión PR 10+700 CD
 Network time is not synchronized Local: 4/12/2025 9:16:36 a. m. COT 8°56'35.75213"N 76°2'33.5087"W 26° NE Altitud: 125.0msnm Velocidad: 7.0km/h Remark: PR 4+400 Número de índice: 177	 Network: 3/12/2025 9:41:04 a. m. COT Local: 3/12/2025 9:41:03 a. m. COT 8°51'54.45484"N 76°30'31.843"W 340° N Altitud: 84.0msnm Velocidad: 0.0km/h Remark: PR 4+400 Número de índice: 97
Foto 5. Monitoreo epifitas PR 14+100 LD	Foto 6. Mantenimiento plantación "La Pajuila"

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Campaña vial



OPC Moñitos urbano- unidades sanitarias





INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 55

Contrato número 1050 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

8.4. BITÁCORA

29 de noviembre 2025 (sábado)


- Instalación pernos anclaje talud PR 10+768/797 c. der.
- Sello lateral entre cuneta y pavimento MR 40 PR 8+825/890 lado izq.
- Adecuación de losas pavimento MR 40 con costura módulos

#1040 y 1043 PR 12+627 c. der.

- Estado del tiempo = Lluvia durante la madrugada y mañana


Interventor

Amaury Guzman - Ing. Residente


Contratista

Jaime Sanchez - Ing. Residente

1 de diciembre 2025 (lunes)

- Perforaciones para pernos anclaje talud PR 10+768/797 lado der.
- Sello lateral entre cuneta y pavimento PR 8+995/91030 lado izq.
- Adecuación de losas pavimento MR 40 con costura módulos


1704 y 1705 PR 31+060 c. der.

#1046, 1047, 1048 PR 12+627 c. der.

- Estado del tiempo = Fuertes lluvias a partir del mediodía
- Excavación manual traslado tubería acueducto 2" y 3" PR 40+200


Interventor

Amaury Guzman - Ing. Residente


Contratista

Jaime Sanchez - Ing. Residente

2 de diciembre 2025 (martes)

- Perforaciones pernos anclaje talud PR 10+768/797 lado der.
- Se realiza retiro material deslizamientos por las lluvias del día anterior PR 12+553/565


- Adecuación de losas pavimento MR 40

1702, 1704, 1707, 1708, 1709, 1710 PR 31+060/090 c. der.

Estado del tiempo = Nublado


Interventor

Amaury Guzman - Ing. Residente


Contratista


Jaime Sanchez - Ing. Residente

3 de diciembre 2025 (miércoles)

- Instalación malla triple torsión PR 10+768/790 lado der
 - Perforaciones pernos anclaje talud PR 10+650/670 lado der.
 - Se funde 6 losas pavimento MR 40 PR 25+699/730 c. der.
 - Adecuación de losas pavimento MR 40 con costura en módulos #1030 a la 1034, 1036 PR 12+580 c. izq.
 - #1705, 1706, 1707 PR 31+040/105 c. izq.
 - Estabilización de sobre ancho (hombro) con concreto de las demoliciones PR 40+200 c. izq.
 - Retiro subbase por saturación con las lluvias PR 8+506/590 c. der.
- Estado del tiempo = Lluvias en la mañana


Interventoría

Amaury Guzman - Ing. Residente


Contratista


Jaime Sanchez - Ing. Residente

4 de diciembre 2025 (jueves)


- Instalación mezcla asfáltica MDC-10 proveniente planta de asfalto Caucasía en tramo moderado PR 8+795/868 c. der.
- Perforaciones para pernos anclaje e instalación de geomanto PR 10+775/790 c. der
- Sello lateral cuneta y pavimento PR 10+020/040 c. izq. y PR 10+070/100 c. der
- Adecuación de losas pavimento MR 40 con costura módulos #1708, 1709, 1711, 1712 PR 31+105 c. izq.

Estado del tiempo = 2 horas de lluvia

Extensión de mezcla asfáltica en horario nocturno. Se solicita programarla de día para acabado


Interventoría

Amaury Guzman - Ing. Residente


Contratista

Jaime Sanchez - Ing. Residente

5 de diciembre 2025 (viernes)

- Instalación de mezcla asfáltica MDC-10 proveniente de Caucasía en tramo moderado PR 8+868/9+169 c. der. (5 viajes)
- Se realizó adecuación de losas pavimento MR 40 con costura módulos #1713, 1714, 1715, 1716 PR 31+124/145 c. izq.
- Continúa ampliación carril izq. PR 40+200 (muro)
- Se inicia fundido losas pavimento MR 40 PR 8+589 a menores (8 módulos)

Estado del tiempo = Nublado

Interventoría

Amoury Guzman - Ing. Residente

Contratista

Jaime Sanchez - Ing. Residente

6 de diciembre 2025 (sábado)

- Se funde pavimento MR 40 PR 8+541/8+506 c. der.
- Instalación HDC-10 proveniente de Cauca PR 9+169/304 c. der.
- PR 8+795/905 c. izq. tramo moderado. Se solicita al contratista tomar los correctivos donde se observa fisuras de borde.
- Ampliación de calzada PR 40+200 lado izq. (moro)
- Perforación para pernos anclaje talud PR 10+780 lado der.
- Adecuación de losas pavimento MR 40 con costura módulos #1002 PR 31+155 c. der.

Estado del tiempo = Seco

Interventoría

Amoury Guzman - Ing. Residente

Contratista

Jaime Sanchez - Ing. Residente

9 de diciembre 2025 (martes)

- Instalación de pernos anclaje talud PR 10+780/790 lado der.
- Excavación para construcción muro PR 40+200 lado der. ✓
- Adecuación de losas pavimento MR 40 con costura en módulos ✓
- # 1716 PR 31+155 c. der.
- Instalación de sello lateral PR 8+500
- Se realiza fuerza de desprendimiento de malla pavimento asfáltico 110Kn/m ✓

Estado del tiempo = Seco

- No se instala mezcla asfáltica HDC-10 ✓

Interventoría

Amoury Guzman - Ing. Residente

Contratista

Jaime Sanchez - Director de Obra

10 de diciembre 2025 (miércoles)

- Instalación sello lateral PR 10+140/445 lado der.
- Instalación de pernos anclaje talud PR 70+780 lado der y PR 12+530 lado izq.
- Excavación construcción muro PR 40+200 lado der.
- Instalación mezcla asfáltica MDC-10 lado Izq.

Estado del tiempo = Seco

Interventoría

Amaury Guzman - Ing. Residente

Contratista

Jaime Sanchez - Director de Obra

11 de diciembre 2025 (jueves)

- Sello lateral pavimento HR 40 y caneta con bitulux PR 79 lado der.
- Instalación pernos anclaje talud PR 530 lado izq.
- Excavación para muro PR 40+200 lado derecho
- Instalación mezcla asfáltica MDC-10 lad. izq PR 9+225/268
- Demolicion de losa para construcción de resalto PR 27+20

Estado del tiempo = Seco

Interventoría

Amaury Guzman - Ing. Residente

Contratista

Jaime Sanchez - Director de Obra

12 de diciembre 2025 (viernes)

- Instalación pernos anclaje talud PR 12+530 lado izq.
 - Mejoramiento soporte módulo #3 muro PR 40+200 con ciclopeo
 - Adecuación de losas pavimento HR 40 con costura módulos
- #1741, 1742, 1743, 1745, 1747, 1748 PR 31+260 c. der.

Estado del tiempo = Seco

No se instala mezcla asfáltica MDC-10

Interventoría

Amaury Guzman - Ing. Residente

Contratista

Jaime Sanchez - Director de Obra

13 de diciembre 2025 (sábado)

- Instalación de mezcla asfáltica MDC-10 PR 9+268/304 c. 129.
- Se funde resalto pompeyano PR 27+590 c. 129.
- Perforaciones para pernos anclaje talud PR 12+530/550 c. 129.
- No se realiza adecuación de losas pavimento MR40 con costura

Estado del tiempo: Seco

Interventoría

Amoury Guzman - Ing. Residente

Contratista

Jaime Sanchez - Director de Obra

14 de diciembre 2025 (domingo)

- Instalación geomalla pavimento asfáltico 110xN/m anclado con grapas aceradas PR 8+800 a mayores c. der. La nota técnica recomienda clavos con arandelas
- Riego de imprimación para extensión mezcla asfáltica MSC-19 grano caucho PR 8+795 a mayores c. der / 9+058

Estado del tiempo: Seco

Interventoría

Amoury Guzman - Ing. Residente

Contratista


Jaime Sanchez - Director de Obra

15 de diciembre 2025 (lunes)

- Instalación mezcla asfáltica MSC-19 grano caucho PR 9+058/213 c. der.
- Se evidencia segregación de mezcla asfáltica MSC-19 grano caucho, compactación deficiente de los bordes adyacentes a las conetas
- La geomalla pavimento asfáltico 110xN/m del c. der no cuenta con el traslape de 20 cm para empalmar con el c. 129, (ISLA Se visualizan Corros para Corroshear)
- Se evidencia presencia de material vegetal en mezcla asfáltica MSC-19 Traslape
- Se evidencia fisuración de mezcla asfáltica MSC-19 con 6CR entre el PR 8+800/9+058
- Se realizan los chequeos topográficos a la copa de rodadura instalada entre el PR 8+800/9+508 c. der, la cual no cuenta con el espesor requerido
- Perforaciones para pernos anclaje talud PR 12+530/550 c. der 129
- Instalación de geomanto y malla triple torsión PR 12+555 c. 129
- Instalación pintura de tráfico resalto pompeyano PR 27+575 c. 129
- Adecuación de losas pavimento MR 40 con costura módulos


#1743, 1747 a la 1752 PR 31+260/300 c.129.

Estado del tiempo = Lluvias



Interventora

Amaury Guzman - Ing. Residente



Contratista

Jaime Sanchez - Director de Obra

16 de diciembre 2025 (martes)


- Perforaciones para pernos anclaje talud PR 12+530/12+550 c.129. y talud PR 12+680/710 c.129.
- Instalación defensas metálicas PR 41+510/570 c.der; PR 41+522/550 c.129.
- No hay suministro de mezcla asfáltica (ISLA. Pano Armado ELN).
- Se realizan los cortes en el eje de la mezcla asfáltica para descubrir los 20 cm de traslapo de la geomalla ✓

Estado del tiempo = Seco



Interventora

Amaury Guzman - Ing. Residente



Contratista

Jaime Sanchez - Director de Obra

17 de diciembre 2025 (miercoles)


- Instalación pavimento HR40 resalto pompeyano PR 29+590 c.der. ✓
- Perforaciones para pernos anclaje talud PR 12+700/710 c.129. ✓
- No hay suministro mezcla asfáltica (ISLA Pano Armado ELN)
- Se observa desprendimiento de las grapas para anclar la geomalla asfáltica. ✓
- Se solicita al Contratista acatar recomendación de la nota de anclaje con clavos

Estado del tiempo = Seco



Interventora

Amaury Guzman - Ing. Residente



Contratista


Jaime Sanchez - Director de Obra

18 de diciembre 2025 (jueves)


- Perforaciones para pernos anclaje talud PR 12+700/710 c.129 ✓
- Instalación malla triple torsión talud PR 12+530/550 c.129. ✓
- Instalación defensas metálicas PR 41+858/870 ; PR 41+946/954 c.129 ✓

- No hay suministro de mezcla asfáltica (PDA Pano Asunado ELN)

Estado del tiempo = Seco


Interventora


Amaury Guzman - Ing. Residente


Contratista


Jaime Sanchez - Director de Obra

19 de diciembre 2025 (Viernes)

- Instalación geomalla asfáltica PR 9+000/9+150 c. 129.
 - Instalación mezcla asfáltica HSC-19 con 6CR PR 9+213/305 c. der; PR 8+800/9+931 c. der;
 - Instalación pintura de tráfico resalta pompeyano PR 27+575 c. der; PR 27+870 c. der; PR 47+465 c. der; PR 47+665 c. der.
 - Perforaciones para pernos PR 12+690/710 c. 129. y se instala geomanto
 - Instalación defensas metálicas PR 45+736/748 c. 124
 - Se solicita al Contratista respetar la distancia de separación entre los girones de fijación de la geomalla. Retiro de la geomalla sobrante sobre las cunetas. Limpieza del material segregado sobre las cunetas alrededor de la ODT del PR 8+856.
- Estado del tiempo = Seco


Interventora

Amaury Guzman - Ing. Residente



Contratista

Jaime Sanchez - Director de Obra

20 de diciembre 2025 (Sábado)

- El Contratista se encuentra realizando actividades de orden y limpieza, así como organizando la finalización necesaria a lo largo del Corredor Vial para el receso de actividades de fin de año.
- Estado del tiempo: Seco.


Interventora


Contratista

22 de diciembre 2025 - Lunes

Se realiza recorrido de obra por parte del equipo CUN donde se observa total normalidad en el corredor vial, el contratista implementa de manera satisfactoria

todo lo referente al plan de manejo de tráfico

Interventoría

Amory Gorman - Ing. Residente

Contratista

Jaime Sanchez - Director de Obra

23 de diciembre 2025 - Martes

Se realiza recorrido de obra por parte del equipo de trabajo CUN donde se observa total normalidad en el corredor vial, el contratista implementa de manera satisfactoria todo lo referente al plan de manejo de tráfico

Interventoría

Amory Gorman - Ing. Residente

Contratista

Jaime Sanchez - Director de Obra

24 de diciembre 2025 - Miércoles

Se realiza recorrido de obra por parte del equipo de trabajo CUN donde se observa total normalidad en el corredor vial, el contratista implementa de manera satisfactoria todo lo referente al plan de manejo de tráfico

Interventoría

Amory Gorman - Ing. Residente

Contratista

Jaime Sanchez - Director de Obra

26 de diciembre 2025 - Viernes

Se realiza recorrido de obra por parte del equipo de trabajo CUN donde se observa total normalidad en el corredor vial, el contratista implementa de manera satisfactoria todo lo referente al plan de manejo de tráfico

Interventoría

Amory Gorman - Ing. Residente

Contratista

Jaime Sanchez - Director de Obra

27 de diciembre 2025 - Sábado

Se realiza recorrido de obra por parte del equipo CUN donde se observa total normalidad en el corredor vial, el Contratista implementa de manera satisfactoria todo lo referente al plan de manejo de tráfico

[Signature]

Interventoría

Amory Gorman - Ing Residente

[Signature]
Contratista

Jaime Sanchez - Director de Obra

29 de diciembre 2025 - Lunes

Se realiza recorrido de Obra por parte del equipo CUN donde se observa total normalidad en el corredor vial, el Contratista implementa de manera satisfactoria todo lo referente al plan de manejo de tráfico

[Signature]

Interventoría

Amory Gorman - Ing Residente

[Signature]
Contratista

Jaime Sanchez - Director de Obra

30 de diciembre 2025 - Martes

Se realiza recorrido de Obra por parte del equipo CUN donde se observa total normalidad en el corredor vial, el Contratista implementa de manera satisfactoria todo lo referente al plan de manejo de tráfico

[Signature]

Interventoría

Amory Gorman - Ing Residente

[Signature]
Contratista

Jaime Sanchez - Director de Obra


31 de diciembre 2025 - Miércoles

Se realiza recorrido de obra por parte del equipo CUN donde se observa total normalidad en el corredor vial, el contratista implementa de manera satisfactoria todo lo referente al plan de manejo de tráfico



Interventoria

Amaury Gogman - Ing. Residente




Contratista

Jaime Sanchez - Director de Obra


2 de enero 2026 - Viernes

Se realiza recorrido de Obra por parte del equipo CUN donde se observo total normalidad en el corredor vial, el Contratista implementa de manera satisfactoria todo lo referente al plan de manejo de trafico



Interventoria

Amaury Gogman - Ing. Residente




Contratista

Jaime Sanchez - Director de Obra


3 de enero 2026 - Sabado

Se realiza recorrido de Obra por parte del equipo CUN donde se observa total normalidad en el corredor vial, el Contratista implementa de manera satisfactoria todo lo referente al plan de manejo de trafico



Interventoria

Amaury Gogman - Ing. Residente




Contratista

Jaime Sanchez - Director de Obra


5 de enero 2026 - Lunes

Se realiza recorrido de obra por parte del equipo CUN donde se observa total normalidad en el corredor vial. El Contratista implementa de manera satisfactoria todo lo relacionado al Plan de Manejo de Trafico.



Interventoria

Amaury Gogman - Ing. Residente



Contratista

Jaime Sanchez - Director de Obra
