



Alcaldía de
IBAGUÉ



INFORME MENSUAL

No. 4009 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO

CONTRATAR CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

IBAGUÉ-TOLIMA

Julio del 2025

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	4
2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	4
2.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	4
2.1.2 CONDICIONES INICIALES.....	4
2.1.3 ALCANCE DEL PROYECTO	5
3. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5
3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO.....	5
3.1.1 GENERALIDADES.....	5
3.1.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA	6
3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS	6
3.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS	8
3.3 PLAZO CONTRACTUAL	10
3.4 GARANTÍAS DEL CONTRATO	10
4. CONCLUSIONES	12
5. ANEXOS.....	13
ANEXOS.....	14



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual tiene como finalidad documentar y evaluar el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el mes de enero en el marco del contrato suscrito para la prestación de servicios de mano de obra calificada y no calificada en el mejoramiento y optimización de la infraestructura vial urbana del municipio de Ibagué.

Durante el periodo reportado, se han llevado a cabo diversas actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos contractuales, garantizando el adecuado mantenimiento, rehabilitación y optimización de la red vial urbana. En este sentido, este informe detalla las labores realizadas, los avances alcanzados, las dificultades presentadas y las estrategias implementadas para la continuidad eficiente del proyecto.

Asimismo, se incluyen registros fotográficos, cantidades ejecutadas asegurando la transparencia y trazabilidad de las actividades ejecutadas.


Con este informe, se busca proporcionar una visión clara y detallada de la gestión realizada, en cumplimiento de las condiciones contractuales y los lineamientos establecidos por la entidad competente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

2.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Ibagué se encuentra ubicado en el centro-occidente de Colombia, sobre la cordillera central de los andes entre el cañón del Combeima y el valle del Magdalena en cercanías del nevado del Tolima, con coordenadas: Longitud 75°12'02"- Latitud 4°26'16"N. K4+850 a K5+750

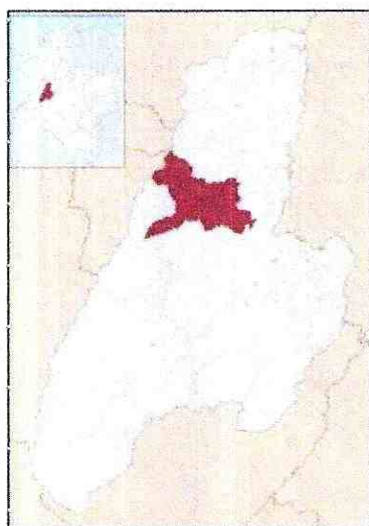

2.1.2 CONDICIONES INICIALES

En vista del crecimiento urbano y considerando las necesidades de mejoramiento de la infraestructura vial en el municipio de Ibagué, se identifican sectores que requieren intervención para garantizar una movilidad segura y eficiente. Actualmente, algunas vías presentan deterioro significativo, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo económico de la región.

Por lo anterior, la Administración Municipal contempla la contratación de una entidad sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de mano de obra calificada y no calificada, con el propósito de ejecutar actividades orientadas al mejoramiento y optimización de la infraestructura vial urbana, contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la conectividad del municipio.



2.1.3 ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto contempla todas las intervenciones necesarias para la ejecución de las distintas fases del proyecto que involucran las actividades relacionadas con el mejoramiento y optimización de la infraestructura vial urbana del municipio de Ibagué.

Se hace necesaria la intervención en las diferentes fases o frentes del proyecto para dar mejor calidad de vida a cada uno de los transeúntes de la ciudad de Ibagué

3. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

3.1.1 GENERALIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATISTA	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS
OBJETO	CONTRATAR CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
VALOR	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$656.229.349) MCTE IVA INCLUIDO SOBRE COSTOS INDIRECTOS
PLAZO	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No. 1	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

DOCUMENTOS GENERADOS DENTRO DEL CONTRATO	
ACTA DE INICIO	23 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	30 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE REINICIO No.1	15 DE ENERO DE 2025
PRORROGA No.1	15 DE ENERO DE 2025
PRORROGA No.2	14 DE MARZO DE 2025
PRORROGA No.3	15 DE MAYO DE 2025


3.1.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA

- Un (1) director del Proyecto.
- Un (1) residente de obra.
- Un (1) auxiliar de ingeniería.
- Un (1) conductor.
- Un (1) Inspector topógrafo.
- Un (1) SST.
- Tres (3) cuadrillas: Conformadas por dos (2) oficiales, seis (6) y/o siete (7) ayudantes de obra
- Una (1) cuadrilla: Conformada por un (1) maestro y un (1) ayudante)

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista ejecuto la intervención de diferentes puntos de la ciudad de acuerdo a las directrices del Ingeniero asignado por la secretaria de infraestructura, aparte de esto se realizaron actividades de apoyo como lo fue el acompañamiento de la aplicación de la mezcla asfáltica en el barrio el Restrepo Cll.39 con 6B y el cajeo en el cruce de la Av. Ambala X Cll. 64

- BARRIO RESTREPO:

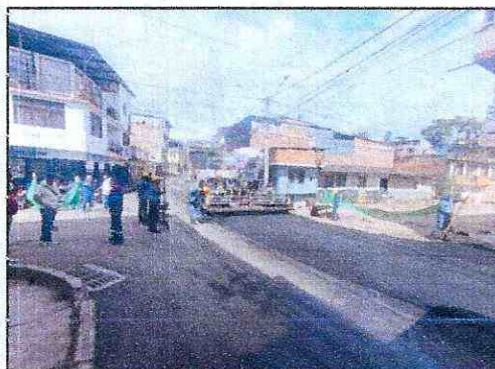



Alcaldía de
IBAGUÉ



- AV. AMBALA x CLL. 64



A continuación, se presenta la relación semanal de lo ejecutado:

- Semana del 1 al 5 julio
Área cajeo: 644,697 m²
Área nivelaciones: 34,514 m²
Volumen asfalto suelto: 70,98 m³
Viajes de escombros: 22
- Semana del 7 al 12 julio
Área cajeo: 229,902 m²
Área nivelaciones: 396,186 m²
Volumen asfalto suelto: 59,28 m³
Viajes de escombros: 25
- Semana del 14 al 19 julio
Área cajeo: 372,729 m²
Área nivelaciones: 87,04 m²
Volumen asfalto suelto: 41,40 m³
Viajes de escombros: 7

Se anexa Excel con las áreas, volúmenes y cantidades ejecutadas (Ver anexo III).

3.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS

En cumplimiento de la ejecución del contrato, la Secretaría de Infraestructura pone a disposición del contratista, en la obra, los equipos necesarios para la ejecución de las actividades que requiere el proyecto, tales como:

- Un (1) retroexcavadora.
- Cuatro (4) volquetas.
- Un (1) vibrocompactador.
- Dos (2) cortadoras de pavimento.
-

Por su parte, el contratista pone a disposición en la obra la siguiente herramienta:

- Herramienta menor.
- Dos (1) benetón.

Los tiempos que se utilizaron esta maquinaria se encuentran en el anexo III



Alcaldía de
IBAGUÉ



3.3 PLAZO CONTRACTUAL

PLAZO		DÍAS
INICIAL		8
PRORROGA No. 1		60
PRORROGA No. 2		60
PRORROGA No. 3		120
PLAZO TOTAL		248
ACTA	FECHA	DÍAS EJECUTADOS
INICIO	23/12/2024	
SUSPENSIÓN No.1	30/12/2024	8
REINICIO No.1	15/01/2025	8
FECHA ACTUAL	21/07/2025	196
TOTAL		52

3.4 GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZAS				
AMPAROS	No. PÓLIZA	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	I-100039457	\$65,622,934.90	15/05/2025-21/04/2026	SEGUROS MUNDIAL
PRESTACIONES SOCIALES	I-100039457	\$98,434,402.35	15/05/2025- 21/10/2028	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD DEL SERVICIO	I-100039457	\$65,622,934.90	15/05/2025-21/04/2026	SEGUROS MUNDIAL
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	I-100009683	\$260,000,000.00	16/01/2024-21/10/2025	SEGUROS MUNDIAL



3.5 PERSONAL EN OBRA

	CARGO	NOMBRE
FRENTE MOVIL	MAESTRO	JUAN CARLOS ALBA QUINTERO
	AYUDANTE	GONZALO SALGUERO SAENZ
FRENTE No.1	OFICIAL RASTRILLERO	SERGIO CASTELLANOS
	OFICIAL RASTRILLERO	ANDRÉS FABIAN GARZÓN
	OFICIAL	JOSÉ EMILIO FIGUEROA
	AYUDANTE	CESAR AUGUSTO PÉREZ
	AYUDANTE	JUAN CARLOS FLORES MARTÍNEZ
	AYUDANTE	HERNEL ARTURO GONZALES CHAGUALA
	AYUDANTE	BRANDON STIVEN DIAZ BOBADILLA
FRENTE No.2	OFICIAL RASTRILLERO	LUIS ALBERTO BOBADILLA
	OFICIAL RASTRILLERO	ENALBER LEAL MORENO
	AYUDANTE	JUNIOR RAFAEL PERDONOMO AGUILAR
	AYUDANTE	GUILLERMO LEÓN HERNÁNDEZ
	AYUDANTE	DOMINGO OLMOS
	AYUDANTE	OSCAR ALEJANDRO ECHAVARRIA MARTINEZ
	AYUDANTE	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ NARANJO
FRENTE No.3	AYUDANTE	LUIS EDUARDO SANCEDO
	OFICIAL RASTRILLERO	JOSÉ ALFREDO GIRALDO BEDOLLA
	AYUDANTE	ALONSO GUZMÁN BELTRÁN
	AYUDANTE	RAMIRO VARÓN CABIEDES
	AYUDANTE	EDUARD FABIAN LEAL
	AYUDANTE	ANDREAL JELINECK QUINTANA MARIN
	AYUDANTE	OSCAR NARANJO RUIZ
	AYUDANTE	GABRIEL QUINAJÓ GARCIA
	AYUDANTE	JUAN DIEGO RIVERA
PERSONAL ADMINISTRATIVO	AYUDANTE	JHOBANY ALBA HERNANDEZ
	DIRECTOR OBRA	FERNANDO SANCHEZ
	ING. RESIDENTE	JORGE ALBERTO LLANO
	CONDUCTOR	JOSE POLICARPO QUINTERO CRUZ
	ING. AUXILIAR	LAURA JULIANA AROCA
	INSPECTOR TOPOGRAFO	ANDRES MAURICIO CALDERON
	PROFESIONAL SST	CRISTIAN RAMIREZ



3.6 GRÁFICOS DE AVANCE



4. CONCLUSIONES

- El contratista, contrato el personal profesional, técnico y operativo y administrativo requerido para dar cumplimiento al proyecto.
- EL contratista da cumplimiento a las instrucciones impartidas por la alcaldía por medio de la supervisión del ingeniero asignado por secretaria de infraestructura.
- El contratista cuenta con una oficina administrativa y campamentos móviles en sitio.



Alcaldía de
IBAGUÉ



5. ANEXOS

- I. Estado del tiempo.
- II. Informe SST.
- III. Excel de cantidades mensuales.

ING. FERNANDO SANCHEZ CARDOZO
Director De Obra

ANEXOS

I. Estado del tiempo

REGISTRO CLIMATICO DIARIO							
JULIO							
Obra:	CUADRILLAS 2025						
Fecha	Estado Climático	Horario		Intensidad			Observaciones
		AM	PM	Baja	Media	Alta	
1/07/2025	SOLEADO						
2/07/2025	SOLEADO						
3/07/2025	SOLEADO						
4/07/2025	SOLEADO						
5/07/2025	SOLEADO						
6/07/2025	SOLEADO						
7/07/2025	SOLEADO						
8/07/2025	SOLEADO						
9/07/2025	SOLEADO						
10/07/2025	SOLEADO						
11/07/2025	SOLEADO						
12/07/2025	SOLEADO						
13/07/2025	SOLEADO						
14/07/2025	SOLEADO						
15/07/2025	SOLEADO						
16/07/2025	SOLEADO						
17/07/2025	SOLEADO						
18/07/2025	SOLEADO						

II. Se anexa informe en modelo de EXCEL con el nombre "INFORME MENSUAL SST JULIO"

III. Se anexa informe en modelo de EXCEL con el nombre "INFORME MENSUAL JULIO"

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		FECHA SEMANA: 1 al 19 de Julio del 2025								
FRENTE 1, 2,3 y Cuadrilla de Apoyo										
EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS										
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA		ELABORADO POR: Cristian Ramirez Castaño								
PERIODO: 1		FECHA ELABORACION: 28 de Julio de 2025								
1. ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD										
INGENIERO TRABAJADOR	HORAS HOMER TRABAJADAS	No ACCIDENTES		DIAS PERDIDOS POR AT		INDICE DE FRECUENCIA		INDICE DE SEVERIDAD		INDICE DE LESION INCAPACITANTE
		PERO	ACUMULADO	JUNIO	ACUMULADO	PERO	ACUMULADO	PERO	ACUMULADO	
17	1.102	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. PERSONAL EN OBRA.										
FRENTE 1										
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA								
Bobadilla Gomez Luis Alberto	Oficial	Sociedad Tolimense de ingenieros								
Hernandez Guillermo León	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros								
Salsedo Rodriguez Luis Eduardo	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros								
Rafael Perdomo Junior	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros								
Garzon Andres Fabian	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros								
Leal Eduardo Fabian	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros								
Rivera Rodriguez Juan Diego	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros								
FRENTE 2										
José Alfredo Giraldo Bedoya	Oficial	Sociedad Tolimense de ingenieros								
Varón Cabiedes Ramiro	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros								
Quintana Marín Andrea Jelineck	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros								
Leal Enalber	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros								
Quijano Garcia Gabriel	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros								
Arturo Gonzalez Hernel	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros								
Naranjo Oscar	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros								
Oscar Alejandro Echavarria	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros								
CUADRILLA DE APOYO										
Alba Quintero Juan Carlos	Maestro	Sociedad Tolimense de Ingenieros								
Alba Jhobany	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros								
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO OPERATIVO										
Uano Gomez Jorge Alberto	Ingeniero Residente	Sociedad Tolimense de ingenieros								
Vidales Andrade Sergio Orley	Conductor	Sociedad Tolimense de ingenieros								
Aroca Laguna Laura Juliana	Ingeniera Auxiliar	Sociedad Tolimense de ingenieros								
Calderón Andrés Mauricio	Inspector Topógrafo	Sociedad Tolimense de ingenieros								
Ramirez Castaño Cristian	Profesional SST	Sociedad Tolimense de ingenieros								
Sanchez Cardozo Fernando	Director de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros								

INGRESO DE PERSONAL						
NO SE PRESENTA INGRESO DE PERSONAL EN LA SEMANA						
RETIROS EN EL PERIODO						
FECHA DE RETIRO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	AREA			
AUSENTISMOS						
NOMBRES	CARGO	AREA	CAUSAS Y/O DUAGNOSTICO	TIEMPO		ACUMULADO
				DIAS	FECHA INCAPACIDAD	
JUAN DIEGO RIVERA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	FRENTE 1	F329 - ENFERMEDAD GENERAL	2	11/07/25 AL 12/07/25	2
JUAN DIEGO RIVERA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	FRENTE 1	J06.9 - ENFERMEDAD GENERAL	2	15/07/25 AL 16/07/25	2
LUIS ALBERTO BOBADILLA GOMEZ	OFICIAL	FRENTE 1	K52.9 - ENFERMEDAD GENERAL	1	15/07/2025	1
LLAMADOS DE ATENCION						
NOMBRES	CARGO	AREA	OBSERVACION	NUMERO DE LLAMADOS DE ATENCION	ACUMULADO	
No se presentaron llamados de atención						
RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PERIODO						
ACTIVIDAD	TEMA	CONTRATISTA	Controles para Eliminar Reducir los Riesgos			
INSPECCIONES DE SEGURIDAD	HERRAMIENTAS MANUALES	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE VERIFICAN LAS HERRAMIENTAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO[BARRAS, PICAS, PALAS, CEPILLOS, RASTRILLOS,NIVELETES, CARRETILLAS EN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE LA SEMANA. SE LES HACE LA OBSERVACIÓN A LA CUADRILLAS CONFORMADAS QUE SON RESPONSABLES DE LOS ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS CON LA QUE CUENTAN A DIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS LABORES DE IGUAL MANERA REPORTAR DAÑOS PARA SU RESPECTIVO CAMBIO O MANTENIMIENTO			
	SEÑALIZACION	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE REALIZA LA UBICACIÓN PERTINENTE EN LOS FRENTES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INTERVENCIÓN (Ibague 2000 ambala, los angeles ambala).			
ENTREGA DE EPP	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE REALIZA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES QUE PRESENTAN DETERIORO COMO LO SON: GUANTES CON PALMA DE NITRILO, GUANTES DE VAQUETA, GAFAS TRANSPARENTES Y MASCARILLAS.			
HIDRATACION	ENTREGA DE HIDRATACIÓN PERSONAL DE OBRA	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE HACE ENTREGA TODOS LOS DÍAS EN LOS FRENTES DE TRABAJO 1 VEZ AL DÍA PARA SU RESPECTIVA HIDRATACIÓN DURANTE SU JORNADA LABORAL , SE LES INDICA A TODO EL PERSONAL LA IMPORTANCIA DE HACERLO PARA EVITAR ENFERMEDADES RELACIONADAS A GOLPES DE CALOR , PREVENCIÓN DE CALAMBRES MUSCULARES ENTRE OTROS.			
8. ENTREGA DE DOTACION						
TRABAJADORES QUE INGRESARON EN EL PERIODO	TRABAJADORES QUE RECIBIERON DOTACION		COBERTURA %			
	NUEVOS	ANTIGUOS				
0	0	0				

CONTROL PROGRAMACIÓN DEL PERIODO			
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DD/MM/AA
INGRESO DE OBRA: SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL PERSONAL SEGÚN COMFORMACION DE LAS CUADRILLAS. SE INDICA PASOS A SEGUIR EN TEMAS SST.	LLEVAR CONTROL DE ASISTENCIA EN OBRA	SI	1 AL 19 DE JULIO DE 2025
VERIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y MECÁNICAS SEGÚN LA NECESIDAD DE LOS FRENDES DE TRABAJO	VERIFICACIÓN DEL USO DE HERRAMIENTAS	SI	1 AL 19 DE JULIO DE 2025
SE ORGANIZA LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN.	SE HACE SEÑALIZACIÓN DEL AREA EN OBRA.	SI	1 AL 19 DE JULIO DE 2025
SE REALIZA ORDEN Y ASEO, CARGUE DE SEÑALIZACIÓN Y HERRAMIENTAS EN CADA FRENTE DE TRABAJO.	SE REALIZA JORNADA DE ASEO SE RECOGE EL ESCOMBRO, SE LLEVA AL CENTRO DE ACOPIO	SI	1 AL 19 DE JULIO DE 2025
SE ACTIVAN LAS VÍAS PROPUESTAS PARA EL CUMPLIR PROYECTO PERIODO			
ACCIONES Y/O PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PERIODO SIGUIENTE (En este espacio se deben plasmar las acciones de mejora de acuerdo a su frente de trabajo.)			REVISION
ORGANIZACIÓN Y VERIFICACIÓN EN CADA FRENTE DE TRABAJO DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR TALES COMO: SEÑALIZACIÓN Y HERRAMIENTAS QUE SON UTILIZADAS AL INICIO Y FINAL DE LA JORNADA LABORAL			DIARIO
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE CHARLAS DE SEGURIDAD EN CADA FRENTE DE TRABAJO CON LOS LÍDERES DE CUADRILLA Y CUMPLIMIENTO DE LA TAREA ASIGNADA DENTRO DEL PROCESO SST			DIARIO
TEMA: SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL FRENTE 1			
      			
FRENTE 2			
      			
ELABORADO POR  CRISTIAN RAMIREZ CASTANO PROFESIONAL SST Sociedad Tollimense de Ingenieros			

	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS						
	CONVENIO N° 4009 ALCALDIA DE IBAGUE						
	CUADROS DE CAJEO CUADRILLAS MENSUAL JULIO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009						
FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA TOTAL	PROFUNDIDADES	VOLUMEN CAJEO
1/07/2025	CRA 6 ENTRE CLL 30 Y 31	1	1,05	1,25	1,31	0,09	0,12
		SUBTOTAL			1,31		0,12
		2	0,94	3,10	2,91	0,09	0,26
			5,46	4,50	24,57	0,09	2,21
			4,50	4,40	19,80	0,09	1,78
			4,68	1,57	7,35	0,09	0,66
			5,52	5,74	31,68	0,09	2,85
		SUBTOTAL			86,32		7,77
	CLL 19 ENTRE CRA 4 Y 5	3	5,30	6,70	35,51	0,12	4,26
			4,22	6,84	28,86	0,12	3,46
		SUBTOTAL			64,37		7,72
	CLL 61C ENTRE CRA 20 Y 24	4	5,70	4,63	26,39	0,08	2,11
			SUBTOTAL			26,39	
		5	1,12	3,95	4,47	0,10	0,44
			SUBTOTAL			4,42	
2/07/2025		CLL 61C ENTRE CRA 20 Y 24	6	4,25	5,40	22,95	0,07
	SUBTOTAL			22,95		1,61	
	7		1,25	7,44	9,30	0,06	0,56
			SUBTOTAL			9,30	
	8		4,40	3,95	17,38	0,08	1,39
			1,12	3,38	3,79	0,08	0,30
			1,10	1,02	1,12	0,08	0,09
			1,62	3,90	6,32	0,08	0,51
			1,27	3,72	4,72	0,08	0,38
			2,26	1,00	2,26	0,08	0,18
			2,52	9,63	24,27	0,08	1,94
			1,55	2,90	4,50	0,08	0,36
	SUBTOTAL			64,35		5,15	
	CLL19 ENTRE CRA 4 Y 6	9	4,70	10,86	51,04	0,14	7,15
			SUBTOTAL			51,04	
		10	2,25	2,10	4,73	0,08	0,38
			2,93	8,60	25,20	0,08	2,02
		SUBTOTAL			29,92		2,39
	CRA 6 ENTRE CLL 30 Y 31	11	2,10	4,42	9,28	0,08	0,74
			5,06	6,12	30,97	0,08	2,48
			2,10	8,33	17,49	0,08	1,40
			2,10	2,88	6,05	0,08	0,48
			4,25	3,14	13,35	0,08	1,07
			6,20	3,87	23,99	0,08	1,92
			4,65	22,00	102,39	0,08	8,19
		SUBTOTAL			203,52		16,28
3/07/2025	CLL 69 CON AV. GUABINAL	12	3,30	2,64	8,71	0,07	0,61
			5,05	6,00	30,30	0,07	2,12
			4,48	8,80	39,42	0,08	3,15
		SUBTOTAL			78,44		5,88
4/07/2025	CLL 69 CON AV. GUABINAL	13	1,15	2,05	2,36	0,09	0,21
			SUBTOTAL			2,36	

	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS						
	CONVENIO N° 4009 ALCALDIA DE IBAGUE						
	CUADROS DE CAJEO CUADRILLAS MENSUAL JULIO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009						
FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA TOTAL	PROFUNDIDADES	VOLUMEN CAJEO
SEMANA 7-12							
9/07/2025	CRA 6 ENTRE CLL 30 Y 31	1	1,40	4,00	5,60	0,08	0,45
		SUBTOTAL			5,60		0,45
	CLL 61C ENTRE CRA 20 Y 21	2	1,30	7,50	9,75	0,08	0,80
			SUBTOTAL			9,75	0,80
10/07/2025	CRA 17 ENTRE CALLE 62 Y 64	3	6,08	23,00	139,84	0,09	12,94
			3,30	1,78	5,87	0,09	0,53
		SUBTOTAL			145,71		13,46
		4	6,00	2,70	16,20	0,10	1,62
		SUBTOTAL			16,20		1,62
		5	0,85	19,55	16,62	0,12	1,99
		SUBTOTAL			16,62		1,99
		6	3,40	2,65	9,01	0,08	0,72
		SUBTOTAL			9,01		0,72
11/07/2025	CRA 6 ENTRE CLL 37 Y 38	7	2,15	1,90	4,09	0,07	0,29
		SUBTOTAL			4,09		0,29
		8	1,65	0,79	1,30	0,07	0,09
			0,98	0,90	0,88	0,07	0,06
		SUBTOTAL			2,19		0,15
		9	2,35	1,90	4,47	0,07	0,31
	3,05		2,80	8,54	0,07	0,60	
	SUBTOTAL			13,01		0,91	
	CRA 6 ENTRE CLL 46 Y 49	10	5,35	0,70	3,75	0,07	0,26
		SUBTOTAL			3,75		0,26
	CRA 6 ENTRE CLL 49 Y 60	11	1,20	0,85	1,02	0,08	0,08
		SUBTOTAL			1,02		0,08
		12	1,65	1,80	2,97	0,08	0,24
SUBTOTAL			2,97		0,24		
13		3,30	0,60	1,98	0,08	0,16	
SUBTOTAL			1,98		0,16		
SEMANA 14-19							
14/07/2025	CLL 61C ENTRE CRA 17 Y 22	1	3,17	2,20	6,97	0,10	0,70
			4,00	6,00	24,00	0,10	2,40
		SUB-TOTAL			30,97		3,10
		2	1,47	21,50	31,61	0,10	3,16
	SUB-TOTAL			31,61		3,16	
	CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 17	3	3,83	2,08	7,97	0,10	0,80
		SUB-TOTAL			7,97		0,80
		4	1,37	2,60	3,56	0,10	0,36
		SUB-TOTAL			3,56		0,36
		5	5,15	4,87	25,08	0,10	2,51
			4,85	1,60	7,76	0,10	0,78
			2,54	3,88	9,86	0,10	0,99
		SUB-TOTAL			42,70		4,27
		6	0,65	1,35	0,88	0,10	0,09
			1,95	5,40	10,53	0,10	1,05
2,10			5,35	11,24	0,10	1,12	
1,75	6,45		11,29	0,10	1,13		
SUB-TOTAL			38,93		3,89		
CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 17	7	2,31	2,15	4,97	0,11	0,55	
		2,00	1,15	2,30	0,11	0,25	
	SUB-TOTAL			7,27		0,80	
	8	2,70	4,40	11,88	0,10	1,19	
	SUB-TOTAL			15,00		1,19	
	9	2,35	3,00	7,05	0,10	0,71	
	SUB-TOTAL			7,05		0,71	
	10	2,00	4,00	8,00	0,10	0,80	
SUB-TOTAL			8,00		0,80		

		SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO N° 4009 ALCALDIA DE IBAGUE					
CUADROS DE ASFALTO CUADRILLAS MENSUAL JULIO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009							
FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	AREA TOTAL	VOLUMEN CAJEO	VOLUMEN ASFALTO SUELTO	VOLUMEN INSTALADO	VOLUMEN ACUMULADO
1/07/2025	CRA 6 ENTRE CLL 30 Y 31	1	1,31	0,12	0,15	0,15	0,15
		2	86,32	7,77	9,71	8,28	8,43
	CLL 19 ENTRE CARRERA 4 Y 5	15	42,80	4,28	5,35	0,72	5,15
				CAJEO SEMANA 23-28 DE JUNIO			
		3	64,37	7,72	9,66	6,10	15,25
	CLL 61C ENTRE CRA 20 Y 24			CAJEO SEMANA 30-05 DE JULIO			
		8	194,30	17,49	21,86	14,19	29,44
		CAJEO SEMANA 23-28 DE JUNIO					
3/07/2025	CLL19 ENTRE CRA 4 Y 6	5	4,42	0,44	0,55	0,55	29,99
		3	64,37	7,72	9,66	3,56	33,55
		9	51,04	7,15	8,93	5,65	39,20
	CRA 6 ENTRE CLL 30 Y 31	11	203,52	16,28	20,35	6,93	46,13
	CLL 69 CON AV. GUABINAL	12	78,44	5,88	7,36	6,09	52,22
4/07/2025	CLL19 ENTRE CRA 4 Y 6	9	51,04	7,15	8,93	3,15	55,37
		10	29,97	2,39	2,99	2,99	58,36
		CRA 6 ENTRE CLL 30 Y 31	11	203,52	16,28	20,35	6,08
	CLL 69 CON AV. GUABINAL Y CLL 61C ENTRE CRA 20 Y 24	7	9,30	0,56	0,70	0,70	65,14
		8	64,35	5,15	6,44	2,22	67,36
		12	78,44	5,88	7,36	1,27	68,63
		13	2,36	0,21	0,27	0,27	69,90
SEMANA 7-12							
9/07/2025	CRA 6 ENTRE CLL 30 Y 31	1	5,60	0,45	0,56	0,56	69,46
				CAJEO SEMANA 30-05 DE JULIO			
		2	86,32	7,77	9,71	1,30	70,76
				CAJEO SEMANA 30-05 DE JULIO			
	CLL 61C ENTRE CRA 20 Y 24	11	203,52	16,28	20,35	7,34	78,10
				CAJEO SEMANA 23-28 DE JUNIO			
		6	124,09	11,17	13,96	0,73	78,83
				CAJEO SEMANA 30-05 DE JULIO			
		4	26,39	2,11	2,64	2,64	81,47
				CAJEO SEMANA 30-05 DE JULIO			
11/07/2025	CRA 17 ENTRE CALLE 62 Y 64	6	22,95	1,61	2,01	2,01	83,48
				CAJEO SEMANA 23-28 DE JUNIO			
		8	194,30	17,49	21,86	3,93	87,41
		2	9,75	0,80	1,00	1,00	88,41
		3	145,71	13,46	16,83	16,83	105,24
		4	16,20	1,62	2,03	2,03	107,26
	CRA 6 ENTRE CLL 32 Y 60	5	16,62	1,99	2,49	2,49	109,76
		6	9,01	0,72	0,90	0,90	110,66
		7	4,09	0,29	0,36	0,36	111,01
		8	2,19	0,15	0,19	0,19	111,21
		9	13,01	0,91	1,14	1,14	112,34
		10	3,75	0,26	0,33	0,33	112,67
		11	1,02	0,08	0,10	0,10	112,77
		12	2,97	0,24	0,30	0,30	113,07
		13	1,98	0,16	0,20	0,20	113,27
SEMANA 14-19							
16/07/2025	CLL 61C ENTRE CRA 17 Y 22	1	30,97	3,10	3,87	3,87	117,14
		2	31,61	3,16	3,95	3,95	121,09
	CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 17	3	7,97	0,80	1,00	1,00	122,09
		4	3,56	0,36	0,45	0,45	122,53
		5	42,70	4,27	5,34	5,34	127,87
		6	38,93	3,89	4,87	4,87	132,73
	CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 17	7	7,27	0,80	1,00	1,00	133,73
		8	15,00	1,19	1,49	1,49	135,22
		9	7,05	0,71	0,88	0,88	136,10
		10	8,00	0,80	1,00	1,00	137,10
		11	0,71	0,06	0,08	0,08	137,18
		12	1,32	0,26	0,33	0,33	137,51
	CLL 61C ENTRE CRA 17 Y 22	13	0,57	0,06	0,07	0,07	137,58
		14	0,84	0,05	0,06	0,06	137,64
		15	0,59	0,05	0,06	0,06	137,70
		16	5,25	0,53	0,66	0,66	138,36
		17	0,51	0,06	0,08	0,08	138,44
		CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 17	18	26,84	2,68	3,36	3,36
19/07/2025	CRA 17 ENTRE CLL 64 Y 65	19	25,26	2,10	2,63	1,64	143,43
		20	3,51	0,21	0,26	0,26	143,70
		21	23,41	1,64	2,05	2,05	145,74
		22	21,34	2,77	3,47	2,13	147,87
	CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y 21	24	13,85	1,11	1,39	0,87	148,74
		25	10,43	1,04	1,30	1,30	150,05
	TOTAL			1910,0490 m2		150,0471 m3	150,0471 m3
Total Cajeo 3 semana Julio (14-19)					36,77914875 m3		
Total Cajeo 2 semana Julio (7-12)					44,37224375 m3		
Total Cajeo 1 semana Julio (1-6)					68,895625 m3		
Total Acumulado					150,0470675 m3		



INFORME DE OBRA

FECHA:

1 JULIO 2025
18 JULIO 2025

VERSION: 01

PAGINA: 1 DE

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONTRATO N°:

4009

INTERVETOR


FREDY RINCON

SUPERVISOR :

JULIO

MES:


1. CRA 6 ENTRE CLL 30 Y 31



2. CRA 6 ENTRE CLL 30 Y 31




3. CLL 19 ENTRE CRA 4 Y 5



4. AV GUABINAL CON CLL 72




5. AV GUABINAL CON CLL 72




6. CLL 61C ENTRE CRA 20 Y 24




7. CLL 61C ENTRE CRA 20 Y 24



8. CLL 61C ENTRE CRA 20 Y 24




9. CLL 19 ENTRE CRA 4 Y 6



10. CLL 19 ENTRE CRA 4 Y 6



11. CRA 6 ENTRE CLL 30 Y 31



12. CLL 69 CON AV. GUABINAL



13. CLL 69 CON AV. GUABINAL




SEMANA 7-12

1. CRA 6 ENTRE CLL 30 Y 31




2. CLL 61C ENTRE CRA 20 Y 21



3. CRA 17 ENTRE CALLE 62 Y 64




4. CRA 17 ENTRE CALLE 62 Y 64




5. CRA 17 ENTRE CALLE 62 Y 64




6. CRA 17 ENTRE CALLE 62 Y 64




7. CRA 6 ENTRE CLL 37 Y 38




8. CRA 6 ENTRE CLL 37 Y 38




9. CRA 6 ENTRE CLL 37 Y 38



10. CRA 6 ENTRE CLL 46 Y 49




11. CRA 6 ENTRE CLL 49 Y 60



12. CRA 6 ENTRE CLL 49 Y 60



13. CRA 6 ENTRE CLL 49 Y 60




SEMANA 14-19


1. CLL 61C ENTRE CRA 17 Y 22



2. CLL 61C ENTRE CRA 17 Y 22




3. CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 17




4. CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 17




5. CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 17



6. CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 17



7. CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 17



8. CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 17




9 Y 10. CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 17



11. CLL 61C ENTRE CRA 17 Y 22



12. CLL 61C ENTRE CRA 17 Y 22



13. CLL 61C ENTRE CRA 17 Y 22





14. CLL 61C ENTRE CRA 17 Y 22



15. CLL 61C ENTRE CRA 17 Y 22




16. CLL 61C ENTRE CRA 17 Y 22




17. CLL 61C ENTRE CRA 17 Y 22




18. CLL 64 ENTRE AV. AMARAL Y CRA 17




19. CRA 17 ENTRE CLL 64 Y 65




20. CRA 17 ENTRE CLL 64 Y 65




21. CRA 17 ENTRE CLL 64 Y 65




22. CRA 17 ENTRE CLL 64 Y 65




23. CRA 16 ENTRE CLL 64 Y 65



24. CLL 04 ENTRE AV. AMBALA Y 21



25. CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y 21



	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS							
	CONVENIO N° 4009 ALCALDIA DE IBAGUE							
	CUADROS DE NIVELACION MENSUAL JULIO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009							
FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	VOLUMEN TOTAL SUELTO
1/07/2025	CLL 61C ENTRE CRA 20 Y 24	1	2,30	3,62	8,33	0,05	0,42	0,52
4/07/2025	CLL 69 CON AV. GUARINAI	2	1,65	4,85	8,00	0,05	0,40	0,50
		3	4,45	3,65	16,24	0,05	0,81	1,02
		3	1,05	1,85	1,94	0,05	0,10	0,12
SEMANA 7-12								
9/07/2025	CRA 6 ENTRE CLL 30 Y 31	11			203,32	0,03	6,11	7,63
		2			86,32	0,03	2,95	3,69
11/07/2025	CRA 6 ENTRE CLL 37 Y 38	3	2,80	1,10	3,08	0,03	0,09	0,12
		4	1,40	4,50	6,30	0,03	0,19	0,24
		5	4,70	3,98	18,71	0,03	0,51	0,63
	CRA 6 ENTRE CLL 46 y 49	6	5,30	5,20	27,56	0,03	0,83	1,03
		7	1,50	2,00	3,00	0,03	0,09	0,11
	CRA 6 CON CLL 32	7	5,30	9,00	47,70	0,03	1,19	1,49
SEMANA 14-20								
16/07/2025	CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 17	1	1,50	1,30	1,95	0,05	0,10	0,12
		2	1,40	0,25	0,35	0,05	0,02	0,02
		3	1,30	0,75	0,98	0,05	0,05	0,06
		4	1,30	1,60	2,08	0,05	0,10	0,13
		5	2,55	1,90	4,85	0,05	0,24	0,30
	CLL 61C ENTRE CRA 17 Y 22	6	1,40	1,30	1,82	0,05	0,09	0,11
		7	7,00	0,75	5,25	0,05	0,26	0,33
		8	1,10	5,45	6,00	0,05	0,30	0,37
		9	1,65	5,60	9,24	0,05	0,46	0,58
		10	2,22	1,30	2,89	0,05	0,14	0,18
		11	1,95	1,42	2,77	0,05	0,14	0,17
		12	2,15	2,00	4,30	0,05	0,22	0,27
		13	1,20	1,45	1,74	0,05	0,09	0,11
		14	4,20	10,20	42,84	0,05	2,14	2,68
TOTAL							517,7395 m3	22,53897625 m3
Total renivelaciones 3 semana Julio (14-19) m2							87,04 m2	
Total renivelaciones 2 semana Julio (7-12) m2							396,186 m2	
Total renivelaciones 1 semana Julio (1-5) m2							34,5135 m2	
Total renivelaciones mes de Junio (M2)							1606,65 m2	
Total renivelaciones mes de MAYO (M2)							19,28 m2	
Total renivelaciones mes de Abril (M2)							266,33184 m2	
Total renivelaciones mes de Marzo (M2)							383,3395 m2	
Total renivelaciones mes de Febrero (M2)							1737,37463 m2	
Total renivelaciones mes de Enero (M2)							1001,66155 m2	
Total Acumulado							2143,6695 m2	



INFORME DE OBRA

FECHA:

1 JULIO 2025

18 JULIO 2025

VERSIÓN: 01


PAGINA: 1 DE

INFORMACION DEL CONTRATO


CONTRATISTA:	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS
CONTRATO N°:	4008
INTERVETOR	
SUPERVISOR :	FREDY RINCON
MES:	JULIO

REGISTRO FOTOGRAFICO


1. CLL 61C ENTRE CRA 20 Y 24



2. CLL 69 CON AV. GUABINAL




3. CLL 69 CON AV. GUABINAL



SEMANA 7-12

1. CRA 6 ENTRE CLL 30 Y 31



2. CRA 6 ENTRE CLL 30 Y 31




3. CRA 6 ENTRE CLL 37 Y 38






4. CRA 6 ENTRE CLL 37 Y 38



5. CRA 6 ENTRE CLL 37 Y 38



6. CRA 6 ENTRE CLL 40 Y 42



7. CRA 6 CON CLL 32



SEMANA 14-19

1. CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 17



2y3. CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 17




4. CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 17



5. CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 17




6. CRA 6 ENTRE CLL 46 Y 49




7. CRA 6 CON CLL 32




8. CLL 61C ENTRE CRA 17 Y 22



9. CLL 61C ENTRE CRA 17 Y 22



10. CLL 61C ENTRE CRA 17 Y 22



11. CLL 61C ENTRE CRA 17 Y 22



12. CLL 61C ENTRE CRA 17 Y 22





SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS



CONVENIO Nº 4009 AL CALDIA DE IRAGUIE

CANTIDAD ASFALTO MENSUAL JULIO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009

FECHA	UBICACIÓN	PLACA	EMULSION	CANTIDAD	TOTAL
1/07/2025	CRA 3 ENTRE CLL 30 Y 31	OTE 038	1	8,43	30,51
	CLL 19 ENTRE CRA 4 Y 6	OTD 916		6,82	
	CLL 61C ENTRE CRA 20 Y 24	SZO 373	1	15,26	
3/07/2025	CLL19 ENTRE CRA 4 Y 6	OTE 038	1	9,21	22,23
	CRA 6 ENTRE CLL 30 Y 31	OTD 916		6,93	
	CLL 69 CON AV. GUABINAL	OTD 875		6,09	
4/07/2025	CLL19 ENTRE CRA 4 Y 6	OTE 038		6,08	18,24
	CRA 6 ENTRE CLL 30 Y 31	OTD 916	1	6,08	
	CLL 69 CON AV. GUABINAL Y CLL 61C ENTRE CRA 20 Y 24	OTD 875	1	6,08	
SEMANA 7-12					
9/07/2025	CRA 6 ENTRE CLL 30 Y 31	USC112		8,29	30,83
	CRA 6 ENTRE CLL 30 Y 31	OTD875	1	6,08	
	CRA 6 ENTRE CLL 30 Y 31	OTD 916		6,88	
	CLL 61C ENTRE CRA 20 Y 21	OTE 038	1	9,58	
11/07/2025	CRA 17 ENTRE CALLE 62 Y 64	SVB045	1	14,24	28,45
	CRA 17 ENTRE CALLE 62 Y 64	USC112		7,96	
	CRA 6 ENTRE CLL 32 Y 60	OTD 875		6,25	
SEMANA 14-19					
16/07/2025	CLL 61C ENTRE CRA 17 Y 22/CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y CRA 17	USC112	1	8,16	31,1
		OTD875		6,54	
		OTE 038	1	9,27	
		OTD 916		7,13	
19/07/2025	CRA 17 ENTRE CLL 64 Y 65/CLL 64 ENTRE AV. AMBALA Y 21	OTD 916		5,25	10,3
		OTD 875		5,05	
TOTAL M3			5		171,66
Total 3 semana (14-19) Julio (m2)					41,40
Total 2 semana (7-12) Julio (m2)					59,28
Total 1 semana (1-5) Julio (m2)					70,98
TOTAL ASFALTO MES DE JUNIO (m2)					402,44
TOTAL ASFALTO MES DE MAYO (m2)					368,49
TOTAL ASFALTO MES DE ABRIL (m2)					344,08
TOTAL ASFALTO MES DE MARZO (m2)					396,91
TOTAL ASFALTO MES DE FEBRERO (m2)					543,91
TOTAL ASFALTO MES DE ENERO (m2)					481,73
Total Acumulado					2709,22 m3

		SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS			
CONVENIO N° 4009 ALCALDIA DE IBAGUE					
RECOLECCION ESCOMBRO MENSUAL JULIO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009					
FECHA		VEHICULO		CANTIDAD	
1/07/2025		OTE 038		1	
2/07/2025		OTD 916		3	
3/07/2025		OTE 038		3	
4/07/2025		OTD 875		1	
5/07/2025		OTD 875		5	
		OTE 038		4	
		OTD 916		5	
SEMANA 7-12					
7/07/2025		OTE 038		5	
		OTD 875		5	
		OTD 916		4	
8/07/2025		OTE 038		3	
		OTD 875		3	
		OTD 916		2	
11/07/2025		OTD 916		3	
SEMANA 14-19					
14/07/2025		OTD 875		1	
		OTE 038		1	
		OTD 916		1	
16/07/2025		OTE 038		1	
		OGL 050		1	
19/07/2025		OTE 038		2	
TOTAL VIAJES				54	
Total escombros 3 semana Julio (14-19) m2				7,00	
Total escombros 2 semana Julio (7-12) m2				25,00	
Total escombros 1 semana Julio (1-5) m2				22,00	
TOTAL ESCOMBRO MES DE JUNIO (m2)				43,00	
TOTAL ESCOMBRO MES DE MAYO (m2)				52,00	
TOTAL ESCOMBRO MES DE ABRIL (m2)				27,00	
TOTAL ESCOMBRO MES DE MARZO (m2)				44,00	
TOTAL EsSCOMBRO MES DE FEBRERO (m2)				55,00	
TOTAL ESCOMBRO MES DE ENERO (m2)				54,00	
Total Acumulado				329 Viajes	



Sociedad Tolimense de Ingenieros

REGIONAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
ORGANO CONSULTIVO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL
NIT. 890.700.857-8

RELACION PERSONAL 1 AL 21 DE JULIO

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	
MAESTRO	JUAN CARLOS ALBA QUINTERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		18
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
OFICIAL RASTRILLERO	SERGIO CASTELLANOS	1	1	1	1																
OFICIAL RASTRILLERO	ANDRÉS FABIAN GARZÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
OFICIAL RASTRILLERO	LUIS ALBERTO BOBADILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	80
OFICIAL RASTRILLERO	ENALBER LEAL MORENO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
OFICIAL RASTRILLERO	JOSÉ ALFREDO GIRALDO BEDOLLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
OFICIAL	JOSÉ EMILIO FIGUEROA	1	1	1	1																4
		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AYUDANTE	GONZALO SALGUERO SAENZ	1	1	1	1	1															
AYUDANTE	ALONSO GUZMÁN BELTRÁN	1	1	1	1																
AYUDANTE	RAMIRO VARÓN CABIEDES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE	EDUARD FABIAN LEAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE	ANDREAL JELINECK QUINTANA MARIN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE	OSCAR NARANJO RUIZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE	GABRIEL QUINAJA GARCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE	JHOBANY ALBA HERNANDEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE	CESAR AUGUSTO PÉREZ	1	1	1	1																
AYUDANTE	JUAN CARLOS FLORES MARTÍNEZ	1	1	1	1																
AYUDANTE	HERNEL ARTURO GONZALES CHAGUALA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	251
AYUDANTE	BRANDON STIVEN DIAZ BOBADILLA	1	1	1	1																
AYUDANTE	JUNIOR RAFAEL PERDONOMO AGUILAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE	GUILLERMO LEÓN HERNÁNDEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE	DOMINGO OLMOS	1	1	1	1																
AYUDANTE	OSCAR ALEJANDRO ECHAVARRIA MARTINEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ NARANJO	1	1	1	1																
AYUDANTE	LUIS EDUARDO SALCEDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE	JUAN DIEGO RIVERA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		19	19	19	19	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	



@STI890700

IBAGUE, CARRERA 7a. NUMERO 9-43 - TELEFAX 2732268 TELEFONO 2731106
www.sti.org.co - E-mail: sociedadtolimensedeingenieros@gmail.com



Sociedad Tolimense
de Ingenieros
