
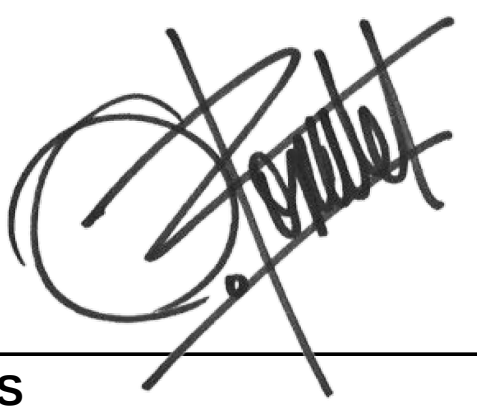


	CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734			Versión: 1	
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL			CÓDIGO:	
	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			ATC-FR-002 Página 1 de 2	
SEMANA N°:	8	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:		PLAZO TOTAL:	6 meses
INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (16) DE (10) DE (20) AL (22) DE (10) DE (20)					
1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA					
CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753					
SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS					
Valor del Contrato:		\$ 186.472.567			
Nombre del Gestor Territorial:		Ing. Jairo Corrales		Nombre del Director de Interventoría: Ing. Carlos Bolaños Gonzalez	
Plazo de Ejecución:		184 días		Fecha de Inicio: 25/08/2020	
				Fecha de Terminación: 24/02/2021	
2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA					
OBJETO: “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3”					
Informe N°		8		Fecha de informe: Del 16/10/2020 HASTA 22/10/2020	
INFORMACIÓN GENERAL			SEGUIMIENTO DE OBRA		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN			AVANCE FÍSICO (%)		
JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ					
Valor Contrato obra:		\$ 1.212.305.529	Avance	Acum. Anterior	Semana N° 8
Valor Adicional:		\$ -	% Programado	13.63%	3.40%
Valor Total:		\$ 1.212.305.529	% Ejecutado	40.80%	17.03%
Fecha de Inicio		25/08/2020	Diferencia	27.17%	43.88%
Suspensión N°		N/A		-0.32%	26.85%
Reinicio:		N/A	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)		
Prórroga N° :		N/A			En %
Plazo actualizado:		184 días	Programado(%)	\$ 165.237.243.60	\$ 41.218.387.99
			Ejecutado (%)	\$ 494.620.655.83	\$ 37.282.094.13
			Diferencia	\$ 329.383.412.23	\$ 531.902.749.96
				-\$ 3.936.293.85	\$ 325.447.118.38
			Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		
CINCO SAS			Interventoría: 1 ing residente, 2 inspectores		
Valor Contrato:		\$ 186.472.567	Contratista: 2 residentes, 1 oficial, 6 ayudantes, 1 operador de minicargador		
Valor Adicional:		\$ -	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA		
Valor Total:		\$ 186.472.567.00	Herramientas menores, 1 minicargador CAT, 1 vibro compactador, martillo percutor electrico		
Fecha de Inicio		19/08/2020	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES		
Suspensión N°		N/A	VERIFICADO POR		S/N/A
Reinicio:		N/A	INTERVENTORIA		S
Prórroga N° :		N/A	INTERVENTORIA		S
Plazo actualizado:			INTERVENTORIA		S
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
Foto 1: Remate placa contrapiso acceso colegio - Colegio Villemar c		Foto 2: Remates andenes - Colegio Villemar El Carmen Sede B		Foto 3: Remates andenes - Colegio Villemar El Carmen Sede B	
					
Foto 4: Comité con profesional pintuco - Colegio Villemar El Carmen Sede B		Foto 5: Pintura de canales - Colegio Silveria Espinosa		Foto 6: Aseo General - Colegio Silveria Espinosa	
					
Foto 7: Instalaciones cajas de inspección aguas negras - Colegio Integrado De Fontibon		Foto 8: Demolición muro para ventana - Colegio Integrado De Fontibon		Foto 9: Retiro de ventana - Colegio Integrado De Fontibon	

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734		Versión: 1
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL		CÓDIGO:
	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		ATC-FR-002
INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			Página 1 de 2
			
Foto 10: Acopio de material (enchape piso) - Colegio Integrado de Fontibon	Foto 11: Fundida de placa contrapiso baños - Colegio Integrado de Fontibon	Foto 12: Trasciego de material - Colegio Andres Bello	

<div><div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div>Secretaría de Educación</div></div></div></div>	CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734		Versión: 1
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL		CÓDIGO:
	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		ATC-FR-002
	INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		Página 1 de 2
			
Foto 13: Charla con profesional SISO - Colegio Andres Bello	Foto 14: Retiro de manto impermeabilizante existente - Colegio Andres Bello	Foto 15: Acopio de material (Recebo) - Colegio Benjamin Herrera Sede B	
			
Foto 13: Demolición de placa contrapiso - Colegio Benjamin Herrera Sede B	Foto 14: Desmonte sanitarios - Colegio Julio Garavito	Foto 15: Demolición muros baños - Colegio Julio Garavito	
			
Foto 13: Demolición Lavamanos - Colegio Julio Garavito	Foto 14: Escarificado de muros - Colegio Julio Garavito		
COLEGIO 1: COLEGIO VILLEMAR ELCARMEN SEDE C			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO		ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR	
Remate rampa acceso colegio		Instalación de cerramiento (malla)	
		Aplicación de pintura coraza muro	
COLEGIO 2: COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN, SEDE B			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO		ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR	
Comité con profesional pintuco		Instalación de los marcos cancha multiple	
COLEGIO 3: COLEGIO SILVERIA ESPINOSA			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO		ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR	
Pintura de canales		Aseo general	
Aseo general			
COLEGIO 4: COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE A			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO		ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR	
Instalción de caja de inspección aguas negras		Instalación de tubería hidráulica	
acopio de material en obra (enchape piso)			
Demolición y desmonte de ventana baños			
Fundida de placa contrapiso baños			
COLEGIO 5: COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO		ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR	
		Pintura sobre muro de cambio de tablero	
		Entrega de luminarias al colegio	
COLEGIO 6: COLEGIO RODRIGO ARENAS SEDE B			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO		ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR	
Instalación de tanques		Instalación de tubería EMT	
		Impermeabilización de canal con producto sikafill power	

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734		Versión: 1
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL		CÓDIGO:
	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		ATC-FR-002
	INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		Página 1 de 2
COLEGIO 7: COLEGIO ANDRES BELLO			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO		ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR	
Trasciego de material		Afinado de pisos	
Retiro de manto existente		Filos y dilataciones	
Comite de obra el día sabado 24		Aplicación de imprimante e Instalación de manto impermeabilzante	
		Retiro de material Tejas de asbsesto	
COLEGIO 8: COLEGIO BENJAMIN HERRERA SEDE B			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO		ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR	
Acopio de material en obra (Recebo)		Compactación y extendido de base granular	
Demolición de placa existente			
COLEGIO 9: COLEGIO JULIO GARAVITO			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO		ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR	
Desmonte santarios		Demolición de enchape baño	
Demolición de muros existentes		Retiro de material demolición	
escarificación de muros		Demolición de placa de contrapiso	
LOGROS Y/O DIFICULTADES			
1. Cronograma:			
2. Disponibilidad de Recursos:			
EL contratsita cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas			
3. Ejecución Financiera:			
El proyecto presenta una ejecución financiera de:		\$ 531.902.749.96	
4. Calidad de los trabajos:			
Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos.			
5. Manejo Ambiental:			
Disposición final de residuos			
6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se ceunta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimeinto al protocolo de bioseguridad			
El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación repectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.			
7. Programa salud ocupacional (si aplica): E el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad			
8. Aspectos sociales:			
La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.			
OBSERVACIONES			
COLEGIO BENJAMIN HERRERA B - EN ESTA SEMANA FUERON RETIRADOS LOS MARCOS DE LA CANCHA, SIN EMBARGO LOS DOS TABLEROS ESTAN PARTIDOS Y FRAGMENTADOS. UNO DE ESTOS PRESENTABA UNA FISURA Y AL MOMENTO DE SER RETIRADO SE ROMPIO EL ACRILICO. MIENTRAS QUE EL TABLERO RESTANTE FUE DAÑADO POR UNA VOLQUETA A LA HORA DE HACER RETIROS DE MATERIAL (MATERIAL DE EXCAVACIÓN).			
ELABORO:	REVISO:	APROBO:	
			
NOMBRE: CANDELARIA MENDOZA OVIEDO	NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS	JAIRO CORRALES	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE	
