



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 988 de 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☒	25D
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	1 a 31 de julio de 2023
		OTRO	☐	
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 107923	RUBRO No. C-2401-0600-72-0-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO \$ 147,142,379.00
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
TOTAL ACTA			\$ 147,142,379.00


Firmado digitalmente
por LEONEL VALERO
ESCALANTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula No. 54202-088055 NTS

RP107923;11;147142379

SMCN GC - ACTA DE AJUSTES No.25D CONT 988 CVC063 NIT: 901476429

SMCN GC - ACTA DE AJUSTES No.25D CONT 988 CVC063 NIT: 901476429RP107923;11;147142379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	


			FECHA	22/08/2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO CENTRO	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	NORTE DE SANTANDER	PERIODO MES:	1 a 31 de julio de 2023
ACTA PARCIAL DE OBRA No.	25 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.	25D (Indique el número del acta)
			VALOR BÁSICO ACTA:	\$	146,074,908.00

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	25-ago-23	JORGE MARTÍN			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	22-ago-23	ROCIO CIRO			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	25-ago-23	JORGE MARTÍN			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	26-ago-23	JORGE MARTÍN			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	31-ago-23	LEONEL VALERO			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	31-ago-23	LEONEL VALERO			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL					
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	08-sep-2023	DIANA PEREZ			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	14/09/23	LUIS DIAZ			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
CONTRATO DE OBRA No.:	988 DE 2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANÍA (LA LEJÍA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACÁ Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 2
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	LUIS JAIME DIAZ PEREZ
	AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 147,142,379.00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	25D
DEL PERIODO	1 a 31 de julio de 2023
y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.	
Firma Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE Matrícula profesional No.: 54202-089055 NTS SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE Matrícula profesional No.: 54202-089055 NTS DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)
Firma Nombre: DIANA MARCELA PEREZ LIZCANO Gestor Técnico de Proyecto Matrícula No: 70202-136686 Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Ordenador del pago Matrícula Profesional No.: 22202-273807 Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA	1	DE	1
--------	---	----	---

Acta N°: <u>25D</u>	Valor basico : \$ <u>146,074,908.00</u>	Período : <u>1 a 31 de julio de 2023</u>
Valor Incluido Iva :	\$ <u>147,142,379.00</u>	

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios y Diseños	Valor incluido IVA (Gestion social, predial y ambiental)	Valor incluido IVA Provision implementación protocolo de bioseguridad	Subtotal
1	6604	CORREDOR DE LA SOBERANIA	\$ 147,142,379.00				\$ 147,142,379.00
TOTALES			\$ 147,142,379.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147,142,379.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.007.652-6	MUNICIPIO 1		PAMPLONA	\$ 104,650,250.00	\$ 103,891,045.00
890.503.680-7	MUNICIPIO 2		LABATECA	\$ 679,782.00	\$ 674,851.00
890.501.362-0	MUNICIPIO 3		TOLEDO	\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1				\$ 105,330,032.00	\$ 104,565,896.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.099.196-2	MUNICIPIO 4	CUBARA	\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ -	\$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3	ARAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.102.799-6	MUNICIPIO 5	SARAVENA	\$ 41,812,347.00	\$ 41,509,012.00
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ 41,812,347.00	\$ 41,509,012.00

VALOR TOTAL	\$ 147,142,379.00	\$ 146,074,908.00
-------------	-------------------	-------------------

JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (S)
 Matricula No.: 215422 CSJ
 Contratista CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063

OSCAR JIMÉNEZ CELY
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
 Matricula No.: 25202-34513 CND
 Interventor CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE								CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
									VERSIÓN	1
									PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA:SMCN - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.25

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:1 a 31 de julio de 2023

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 25D (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No :988 de 2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:110 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:110 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANÍA (LA LEJÍA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 2

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:1/07/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:31/08/2030
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA:CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063

FECHA DE SUSPENSIÓNN.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:N.A.
(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:1013 DE 2021
(Indique número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

VALOR INICIAL (incluido I.V.)\$362,133,900,815.00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA):\$27,040,662,599.00

VALOR ACUMULADO\$389,174,563,414.00
(incluido IVA):

DATOS ESPECÍFICOS									
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:\$33,857,298,089.95									
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:\$26,343,446,175.00									

GRUPO DE AJUSTE CON INDICES ICCP	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ICCP FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ICCP DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I _o	I	I / I _o	(A)	(B)	P _o =A-B	P _i =P _o *(I/I _o)	P _i -P _o	
1 - Obras de Explanación	101.14	103.21	1.02047	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,048,804.00
2 - Sub-bases y bases	100.76	102.43	1.01657	\$ 14,678,000.00	\$ 1,034,968.00	\$ 13,643,032.00	\$ 13,869,097.00	\$ 226,065.00	\$ 22,239,478.00
3 - Transporte de materiales	100.39	100.89	1.00498	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,845,566.00
4 - Aceros y elementos metálicos	103.72	108.28	1.04396	\$ 177,319,780.00	\$ 12,503,091.00	\$ 164,816,689.00	\$ 172,062,031.00	\$ 7,245,342.00	\$ 102,013,780.00
5 - Concretos, morteros y obras varias	101.91	104.30	1.02345	\$ 394,348,874.00	\$ 27,806,146.00	\$ 366,542,728.00	\$ 375,138,155.00	\$ 8,595,427.00	\$ 249,160,446.00
6 - Concreto para estructuras de puentes	101.21	99.33	0.98142	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (139,207.00)
7 - Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.13	104.67	1.04534	\$ 150,418,602.00	\$ 10,606,247.00	\$ 139,812,355.00	\$ 146,151,447.00	\$ 6,339,092.00	\$ 198,651,297.00
TOTALES				\$ 736,765,256.00	\$ 51,950,452.00	\$ 684,814,804.00	\$ 707,220,730.00	\$ 22,405,926.00	\$ 624,820,164.00


PORCENTAJE AMORTIZADO:7.051% (tres decimales)

VALOR AJUSTE\$22,405,926.00

VALOR IVA\$163,736.00

VALOR TOTAL\$22,569,662.00

GRUPO DE AJUSTE CON INDICES ICOCIV	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ICOCIV FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ICOCIV ABRIL 2023	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I _o	I	I / I _o	(A)	(B)	P _o =A-B	P _i =P _o *(I/I _o)	P _i -P _o	
11601 - Preliminares y explanación	103.28	119.53	1.15734	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,697,221.00
11602 - Afirmados, subbases y bases	102.44	120.52	1.17649	\$ 14,678,000.00	\$ 1,034,968.00	\$ 13,643,032.00	\$ 16,050,891.00	\$ 2,407,859.00	\$ 308,076,685.00
11603 - Pavimentos asfálticos / concreto	104.35	132.85	1.27312	\$ 150,418,602.00	\$ 10,606,247.00	\$ 139,812,355.00	\$ 177,997,905.00	\$ 38,185,550.00	\$ 739,726,412.00
11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes	109.42	125.48	1.14677	\$ 279,258,036.00	\$ 19,690,914.00	\$ 259,567,122.00	\$ 297,663,788.00	\$ 38,096,666.00	\$ 339,817,847.00
11605 - Obras de urbanismo	105.35	124.28	1.17969	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,027,809.00
11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.95	126.98	1.16549	\$ 292,410,618.00	\$ 20,618,323.00	\$ 271,792,295.00	\$ 316,771,202.00	\$ 44,978,907.00	\$ 819,205,982.00
11607 - Señalización y control de tránsito	102.36	132.24	1.29191	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,643,109.00
11608 - Transporte y sobre acarreo	100.89	113.11	1.12112	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,123,597.00
14102 - Subestructura y cimentación	102.82	124.71	1.21290	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.58	129.78	1.26516	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES				\$ 736,765,256.00	\$ 51,950,452.00	\$ 684,814,804.00	\$ 808,483,786.00	\$ 123,668,982.00	\$ 2,290,318,662.00

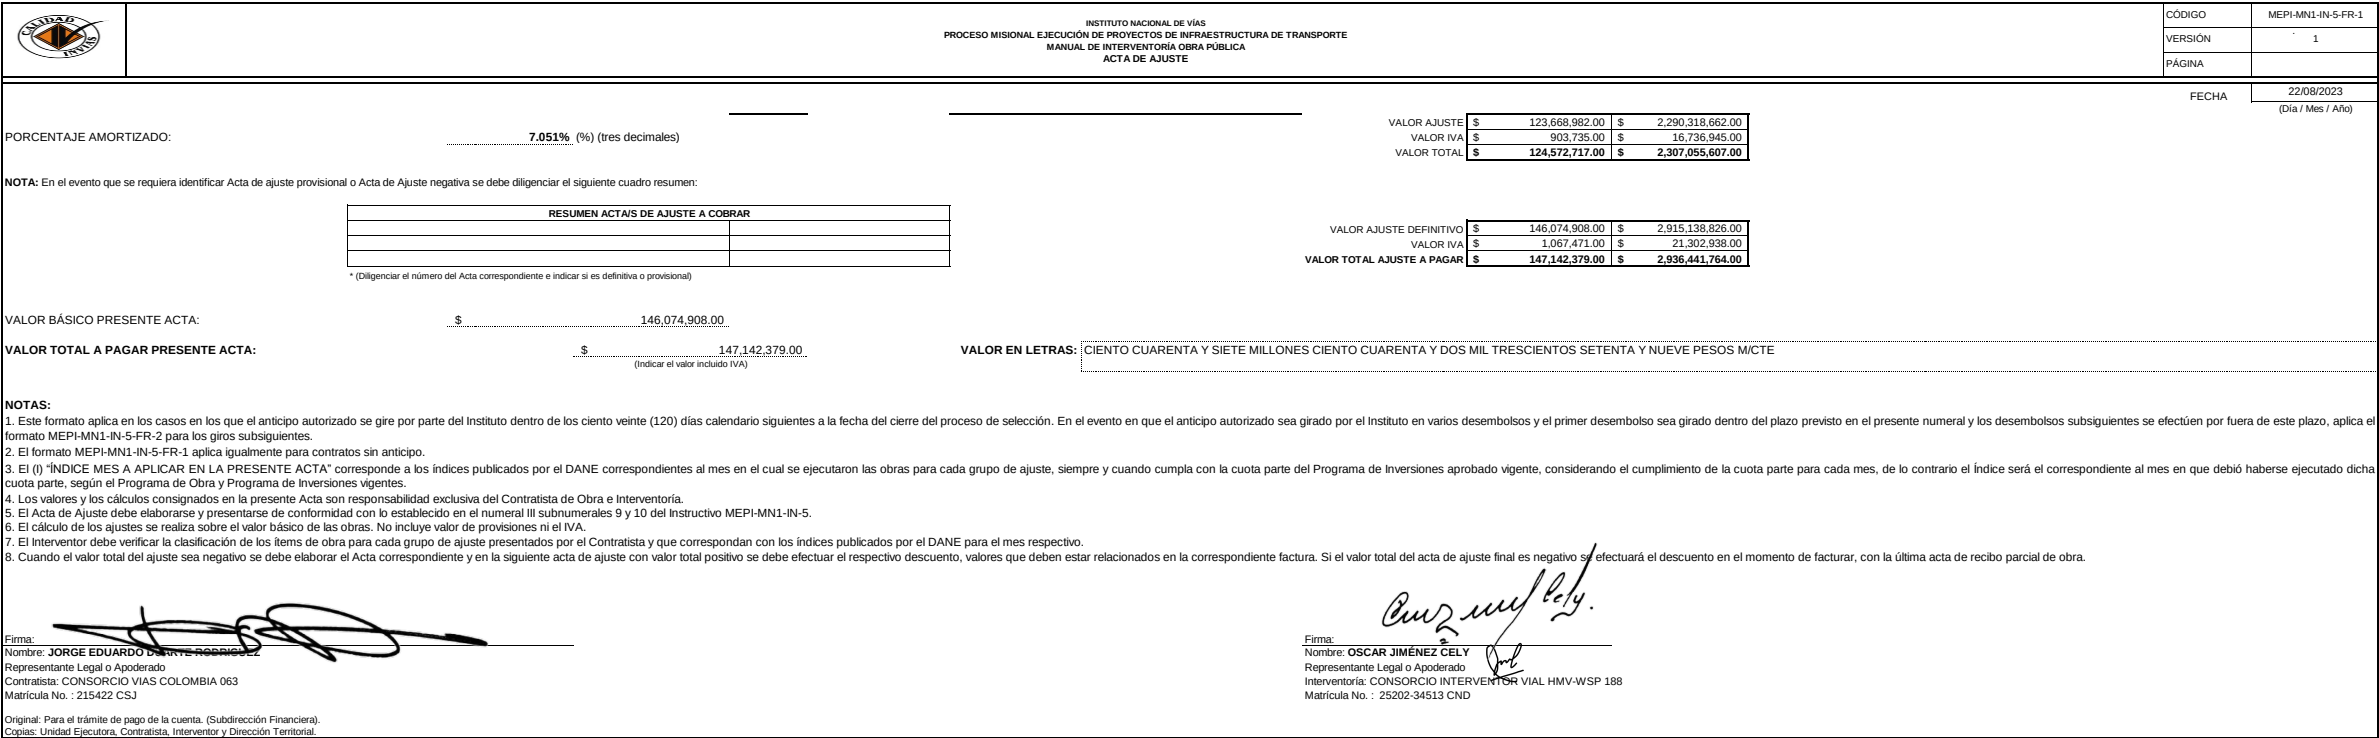

[illegible]

FECHA	22/08/2023
-------	------------

UNIDAD EJECUTORA: **SMCN - GRUPO CENTRO**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 988 de 2021

CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 05
PROYECTO:	MEJORAMIENTO, GESTIÓN PRECITAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANÍA (LA LEMA - SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACÁ Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1013 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMY-WSP 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propio)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	424441	C-2401-0000-72-2-2401008-02	54	Nación	988 de 2021	\$	-
2021	424441	C-2401-0000-72-2-2401008-02	54	Nación	988 de 2021	\$	2,203,862,612.00
2021	1065441	C-2401-0000-72-2-2401008-02	54	Nación	988 de 2021	\$	245,730,866.00
2021	1065441	C-2401-0000-72-2-2401008-02	54	Nación	988 de 2021	\$	5,839,076,366.00
2021	1071301	C-2401-0000-72-2-2401008-02	54	Nación	988 de 2021	\$	16,201,989,433.00
2021	1065441	C-2401-0000-72-2-2401008-02	13	Nación	988 de 2021	\$	9,639,477,765.22
2022	136022	C-2401-0000-72-2-2401032-03	13	Nación	988 de 2021	\$	157,631,464.78
2022	1065622	C-2401-0000-72-2-2401008-02	20	Nación	988 de 2021	\$	5,000,000,000.00
2023	107923	C-2401-0000-72-2-2401008-02	11	Extranjero	988 de 2021	\$	27,465,979,663.00
2023	107923	C-2401-0000-72-2-2401008-02	11	Nación	988 de 2021	\$	477,717,486.00
				TOTAL		\$	66,663,991,736.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$ 389.174.563.414,00
-------------------------------	-----------------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar IVA/AS	Indicar pago según registro SI NO	Observaciones	
1	OBRA	julio 2021	\$ 104.318.800,00	\$ 762.330,00	\$ 105.081.130,00		\$ 105.081.130,00		424421 (24/05/2021)	\$ 2.098.611.482,00	\$ 362.028.818.685,00	90869 (30/09/2021)		PAGADO	
2	OBRA	agosto 2021	\$ 386.438.357,00	\$ 2.823.973,00	\$ 389.262.330,00		\$ 389.262.330,00		424421 (24/05/2021)	\$ 1.709.349.152,00	\$ 361.639.557.355,00	100299 (26/10/2021)		PAGADO	
3	OBRA	septiembre 2021	\$ 401.826.037,00	\$ 2.936.421,00	\$ 404.762.458,00		\$ 404.762.458,00		424421 (24/05/2021)	\$ 1.304.586.694,00	\$ 361.234.794.897,00	111922 (24/11/2021)		PAGADO	
1	AJUSTE	julio 2021	\$ 907.070,00	\$ 6.634,00	\$ 914.504,00		\$ 914.504,00		424421 (24/05/2021)	\$ 1.503.672.190,00	\$ 361.233.880.393,00	111911 (24/11/2021)		PAGADO	
2	AJUSTE	agosto 2021	\$ 3.763.638,00	\$ 2.550.143,00	\$ 6.313.781,00		\$ 6.313.781,00		424421 (24/05/2021)	\$ 1.390.234.017,00	\$ 361.233.621.250,00	126713 (23/12/2021)		PAGADO	
3	AJUSTE	septiembre 2021	\$ 7.792.715,00	\$ 56.947,00	\$ 7.849.662,00		\$ 7.849.662,00		424421 (24/05/2021)	\$ 1.292.444.385,00	\$ 361.232.652.580,00	125690 (23/12/2021)		PAGADO	
4	OBRA	octubre 2021	\$ 1.311.051.125,00	\$ 9.580.758,00	\$ 1.292.444.385,00		\$ 1.292.444.385,00		424421 (24/05/2021)		\$ 359.930.208.203,00	121190 (15/12/2021)		PAGADO	
5	OBRA	noviembre 2021	\$ 184.728.592,00	\$ 1.349.940,00	\$ 186.078.532,00		\$ 186.078.532,00		424421 (24/05/2021)	\$ 217.602.098,00	\$ 359.902.200.705,00	-		PAGADO	
4	AJUSTE	octubre 2021	\$ 24.246.162,00	\$ 177.183,00	\$ 24.423.345,00		\$ 24.423.345,00		424421 (24/05/2021)	\$ 31.523.566,00	\$ 359.715.942.173,00	121179 (15/12/2021)		PAGADO	
5	AJUSTE	noviembre 2021	\$ 3.418.424,00	\$ 24.981,00	\$ 3.443.405,00		\$ 3.443.405,00		424421 (24/05/2021)	\$ 3.656.816,00	\$ 359.688.075.423,00	125784 (23/12/2021)		PAGADO	
6	OBRA	diciembre 2021	\$ 2.149.120.516,00	\$ 15.705.111,00	\$ 3.656.816,00		\$ 3.656.816,00		424421 (24/05/2021)		\$ 359.684.418.007,00	126761 (26/12/2021)		PAGADO	
6	AJUSTE	diciembre 2021	\$ 39.651.274,00	\$ 289.789,00	\$ 39.941.033,00		\$ 39.941.033,00		105541 (21/12/2021)	\$ 3.677.907.545,00	\$ 361.232.795.061,00	126770 (26/12/2021)		PAGADO	
	Anticipo	diciembre 2021			\$ 3.637.966.512,00		\$ 3.637.966.512,00		105541 (21/12/2021)	\$ 3.637.966.512,00	\$ 361.232.795.061,00	126774 (26/12/2021)		PAGADO	
					\$ 16.201.586.243,00		\$ 16.201.586.243,00	\$ 19.839.552.755,00	1071921 (22/12/21)		\$ 375.923.571.362,00			DESEMBOLSADO	
7	OBRA	enero 2022	\$ 613.379.000,00	\$ 4.482.385,00	\$ 617.861.385,00		\$ 617.861.385,00		136222 (28/01/2022)	\$ 6.601.227.835,00	\$ 378.906.109.977,00	304018 (28/03/2022)		PAGADO	
8	OBRA	febrero 2022	\$ 181.296.605,00	\$ 1.324.860,00	\$ 182.621.465,00		\$ 182.621.465,00	\$ 9.562.074,00	136222 (28/01/2022)	\$ 8.428.168.445,00	\$ 378.912.488.512,00	36107 (08/04/2022)	X	PAGADO	
9	OBRA	marzo 2022	\$ 241.400.894,00	\$ 1.712.226,00	\$ 243.113.120,00		\$ 243.113.120,00	\$ 230.767.494,00	136222 (28/01/2022)	\$ 8.197.400.951,00	\$ 378.927.970.392,00	36099 (08/04/2022)	X	PAGADO	
10	OBRA	abril 2022	\$ 271.877.166,00	\$ 5.761.334,00	\$ 277.638.500,00		\$ 277.638.500,00	\$ 19.787.805.398,00	136222 (28/01/2022)	\$ 7.939.197.127,00	\$ 378.930.311.872,00	62998 (14/06/2022)		PAGADO	
11	OBRA	mayo 2022	\$ 37.285.960,00	\$ 2.800.840,00	\$ 40.086.800,00		\$ 40.086.800,00	\$ 19.772.939.680,00	136222 (28/01/2022)	\$ 7.934.316.880,00	\$ 378.942.246.292,00	36107 (08/04/2022)		PAGADO	
12	OBRA	julio 2022	\$ 472.693.865,00	\$ 35.006.072,00	\$ 507.729.932,00		\$ 507.729.932,00	\$ 472.188.837,00	136222 (28/01/2022)	\$ 7.132.127.843,00	\$ 378.934.515.438,00	77498 (25/07/2022)		PAGADO	
13	OBRA	julio 2022	\$ 493.420.086,00	\$ 3.606.762,00	\$ 497.025.848,00		\$ 497.025.848,00	\$ 34.791.809,00	136222 (28/01/2022)	\$ 6.669.893.804,00	\$ 378.837.489.590,00	87648 (17/08/2022)		PAGADO	
50	AJUSTE	noviembre 2021	\$ (353.028,00)	\$ (2.580,00)	\$ (355.608,00)	-	\$ (355.608,00)	\$ 19.702.266.399,00	136222 (28/01/2022)	\$ 6.670.249.412,00	\$ 378.837.845.198,00	85199 (10/08/2022)		PAGADO	
50	AJUSTE	diciembre 2021	\$ (4.040.347,00)	\$ (29.525,00)	\$ (4.069.872,00)	-	\$ (4.069.872,00)	\$ 19.702.266.399,00	136222 (28/01/2022)	\$ 6.671.319.284,00	\$ 378.841.915.070,00	85199 (10/08/2022)		PAGADO	
14	OBRA	agosto 2022	\$ 1.235.515.349,00	\$ 46.268.759,00	\$ 1.281.784.108,00		\$ 89.724.958,00	\$ 1.192.060.150,00	19.612.541.100,00	136222 (28/01/2022)	\$ 5.482.259.134,00	\$ 375.950.129.962,00	92021 (14/09/2022)		PAGADO
15	OBRA	septiembre 2022	\$ 1.194.484.338,00	\$ 8.728.924,00	\$ 1.203.213.262,00		\$ 84.224.928,00	\$ 1.118.988.334,00	19.528.316.513,00	136222 (28/01/2022)	\$ 9.363.270.800,00	\$ 375.956.918.700,00	113796 (20/10/2022)		PAGADO
15	OBRA	septiembre 2022	\$ 1.194.484.338,00	\$ 8.728.924,00	\$ 1.203.213.262,00		\$ 84.224.928,00	\$ 1.118.988.334,00	19.528.316.513,00	136222 (28/01/2022)	\$ 9.363.270.800,00	\$ 375.956.918.700,00	113796 (20/10/2022)		PAGADO
7	OBRA	enero 2022	\$ 613.379.000,00	\$ 4.482.385,00	\$ 617.861.385,00		\$ 617.861.385,00	\$ 19.528.316.513,00	136222 (28/01/2022)	\$ 9.363.270.800,00	\$ 375.956.918.700,00	113796 (20/10/2022)		PAGADO	
8	OBRA	febrero 2022	\$ 5.025.847,00	\$ 36.727,00	\$ 5.062.574,00		\$ 5.062.574,00	\$ 19.528.316.513,00	136222 (28/01/2022)	\$ 9.375.465.933,00	\$ 378.973.091.363,00	138380 (16/11/2022)		PAGADO	
9	AJUSTE	marzo 2022	\$ 6.131.440,00	\$ 44.807,00	\$ 6.176.247,00		\$ 6.176.247,00	\$ 19.528.316.513,00	136222 (28/01/2022)	\$ 9.373.298.216,00	\$ 375.956.915.116,00	138380 (16/11/2022)		PAGADO	
10	AJUSTE	abril 2022	\$ 9.649.728,00	\$ 70.518,00	\$ 9.720.246,00		\$ 9.720.246,00	\$ 19.528.316.513,00	136222 (28/01/2022)	\$ 9.363.548.972,00	\$ 378.957.194.872,00	138380 (16/11/2022)		PAGADO	
16	OBRA	octubre 2022	\$ 1.730.238.866,00	\$ 39.951.751,00	\$ 1.764.190.617,00		\$ 123.493.343,00	\$ 1.640.697.274,00	19.404.823.170,00	136222 (28/01/2022)	\$ 7.722.851.698,00	\$ 377.953.004.255,00	137834 (16/11/2022)	X	RADICADO
11	AJUSTE	mayo 2022	\$ 3.907.110,00	\$ 28.552,00	\$ 3.935.662,00		\$ 3.935.662,00	\$ 19.404.823.170,00	136222 (28/01/2022)	\$ 7.718.916.036,00	\$ 377.580.686.593,00	138380 (16/11/2022)	X	PAGADO	
12	AJUSTE	julio 2022	\$ 20.926.274,00	\$ 152.923,00	\$ 21.079.197,00		\$ 21.079.197,00	\$ 19.404.823.170,00	136222 (28/01/2022)	\$ 7.697.836.839,00	\$ 377.567.989.396,00	138380 (16/11/2022)	X	PAGADO	
13	AJUSTE	julio 2022	\$ 33.047.370,00	\$ 242.669,00	\$ 33.450.039,00		\$ 33.450.039,00	\$ 19.404.823.170,00	136222 (28/01/2022)	\$ 7.664.386.800,00	\$ 377.534.539.357,00	139392 (16/11/2022)		PAGADO	
14	OBRA	agosto 2022	\$ 141.446.295,00	\$ 1.039.746,00	\$ 142.476.041,00		\$ 142.476.041,00	\$ 19.404.823.170,00	136222 (28/01/2022)	\$ 7.596.969.899,00	\$ 377.524.091.412,00	139463 (16/11/2022)		PAGADO	
15	AJUSTE	septiembre 2022	\$ 118.846.633,00	\$ 866.495,00	\$ 119.713.128,00		\$ 119.713.128,00	\$ 19.404.823.170,00	136222 (28/01/2022)	\$ 7.402.191.731,00	\$ 377.524.344.288,00	137807 (15/11/2022)		PAGADO	
16	AJUSTE	octubre 2022	\$ 152.710.828,00	\$ 1.116.402,00	\$ 153.827.230,00		\$ 153.827.230,00	\$ 19.404.823.170,00	136222 (28/01/2022)	\$ 7.248.304.501,00	\$ 377.416.457.058,00	137838 (15/11/2022)	X	RADICADO	
17	OBRA	noviembre 2022	\$ 2.504.414.653,00	\$ 61.525.879,00	\$ 2.565.940.532,00		\$ 2.386.324.695,00	\$ 19.225.207.333,00	136222 (28/01/2022)	\$ 4.861.979.806,00	\$ 374.552.516.526,00	138529 (16/12/2022)	X	PAGADO	
17P	OBRA	noviembre 2022	\$ 248.408.211,00	\$ 1.815.291,00	\$ 250.223.502,00		\$ 250.223.502,00	\$ 19.225.207.333,00	1006552 (27/07/2022)	\$ 4.611.756.304,00	\$ 374.302.293.024,00	138541 (16/12/2022)	X	PAGADO	
18	OBRA	diciembre 2022	\$ 3.096.354.294,00	\$ 22.627.205,00	\$ 3.118.981.509,00		\$ 218.328.706,00	\$ 2.900.652.803,00	19.006.878.627,00	1006552 (27/07/2022)	\$ 1.711.103.501,00	\$ 371.183.311.515,00	138531 (16/12/2022)		PAGADO
18P	OBRA	diciembre 2022	\$ 415.687.092,00	\$ 3.037.715,00	\$ 418.725.007,00		\$ 418.725.007,00	\$ 19.006.878.627,00	1006552 (27/07/2022)	\$ 1.292.376.494,00	\$ 370.714.586.508,00	138545 (16/12/2022)		PAGADO	
170	OBRA	febrero 2023	\$ 1.942.766.765,00	\$ 14.939.746,00	\$ 1.957.706.511,00		\$ 754.524.018,00	\$ 1.203.182.493,00	19.06552 (27/07/2022)	\$ 1.281.926.018,00	\$ 370.251.093.411,00	138589 (16/02/2023)		PAGADO	
180	OBRA	diciembre 2022	\$ 8.164.107,00	\$ 59.660,00	\$ 8.223.767,00		\$ 8.223.767,00	\$ 19.006.878.627,00	1006552 (27/07/2022)	\$ 1.283.400.251,00	\$ 370.755.606.255,00	20410 (20/02/2023)		PAGADO	
19	OBRA	enero 2023	\$ 501.834.596,00	\$ 3.667.253,00	\$ 505.501.849,00	\$ 35.385.129,00	\$ 470.116.720,00	\$ 18.971.493.498,00	1006552 (27/07/2022)	\$ 1.283.400.251,00	\$ 370.755.606.255,00	20832 (03/03/2023)		PAGADO	
190	AJUSTE	enero 2023	\$ 48.089.556,00	\$ 351.423,00	\$ 48.440.929,00		\$ 48.440.929,00	\$ 18.971.493.498,00	1006552 (27/07/2022)	\$ 764.842.602,00	\$ 370.201.665.487,00	28642 (23/03/2023)	X	PAGADO	
20	OBRA	febrero 2023	\$ 1.354.272.064,00	\$ 38.598.714,00	\$ 1.392.860.778,00		\$ 764.842.602,00	\$ 18.971.493.498,00	1006552 (27/07/2022)	\$ 764.842.602,00	\$ 369.436.822.885,00	28651 (23/03/2023)		PAGADO	
20	OBRA	febrero 2023	\$ 1.354.272.064,00	\$ 38.598.714,00	\$ 1.392.860.778,00		\$ 764.842.602,00	\$ 18.971.493.498,00	1006552 (27/07/2022)	\$ 764.842.602,00	\$ 369.436.822.885,00	28651 (23/03/2023)		PAGADO	
20P	OBRA	febrero 2023	\$ 111.493.862,00	\$ 841.368,00	\$ 112.254.230,00		\$ 112.254.230,00	\$ 18.873.992.544,00	107923 (20/03/2023)	\$ 27.412.329.921,00	\$ 368.696.794.709,00	28651 (23/03/2023)		PAGADO	
20P	OBRA	febrero 2023	\$ 111.493.862,00	\$ 841.368,00	\$ 112.254.230,00		\$ 112.254.230,00	\$ 18.873.992.544,00	107923 (20/03/2023)	\$ 27.412.329.921,00	\$ 368.696.794.709,00	28651 (23/03/2023)		PAGADO	
21	OBRA	marzo 2023	\$ 1.942.766.765,00	\$ 14.939.746,00	\$ 1.957.706.511,00		\$ 1.949.413,00	\$ 18.873.992.544,00	107923 (20/03/2023)	\$ 25.480.681.944,00	\$ 366.193.093.411,00	28651 (23/03/2023)		PAGADO	
210	AJUSTE	marzo 2023	\$ 275.964.765,00	\$ 2.016.660,00	\$ 277.981.425,00		\$ 277.981.425,00	\$ 18.737.047.423,00	107923 (20/03/2023)	\$ 25.202.680.513,00	\$ 366.193.093.411,00	48159 (15/05/2023)		PAGADO	
22	OBRA	abril 2023	\$ 1.550.767.090,00	\$ 11.332.530,00	\$ 1.562.099.620,00		\$ 1.452.752.795,00	\$ 18.627.700.438,00	107923 (20/03/2023)	\$ 23.749.927.718,00	\$ 364.900.100.400,00	48159 (15/05/2023)		PAGADO	
220	AJUSTE	abril 2023	\$ 293.642.095,00	\$ 2.145.848,00	\$ 295.788.243,00		\$ 295.788.243,00	\$ 18.627.700.438,00	107923 (20/03/2023)	\$ 23.454.139.475,00	\$ 364.904.312.157,00	51799 (25/05/2023)		PAGADO	
23	OBRA	mayo 2023	\$ 2.622.744.393,00	\$ 19.229.510,00	\$ 2.641.973.603,00	\$ 184.938.152,00	\$ 2								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 26,343,446,175.24	\$ 192,509,799.00	\$ 26,535,955,974.24
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		\$	-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN		\$	-
AJUSTES	\$ 2,915,138,826.00	\$ 21,302,938.00	\$ 2,936,441,764.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 902,858,340.00	\$ 171,543,085.00	\$ 1,074,401,425.00
GESTIÓN PREDIAL (PREFACTA)	\$ 6,237,000.00	\$ 1,185,030.00	\$ 7,422,030.00
GESTIÓN SOCIAL (PREFACTA)	\$	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREFACTA)	\$	\$ -	\$ -
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 1,932,990.00	\$ 967,268.00	\$ 2,900,258.76
VALOR TOTAL	\$ 30,165,113,923.24	\$ 285,388,191.00	\$ 30,550,521,452.00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma ROCIO DEL PILAR CIRO BASTO
Directora de Obra
Matrícula No.: 25202-122652CND
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063

Firma
JORGE HÉCTOR MARTÍN CORTÉS
Director de Inventoría
Matrícula No.: 25202-10799 CND
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 198

CONTRATO: 988 DE 2021												
CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063										
OBJETO:		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJIA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 2										
ACTA	MES	VALORES ACUMULADOS		VALORES PARCIALES		VALOR DE AJUSTE	AÑO	MES	SALDO POR	PROPORCIÓN MES		OBSERVACIONES
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO				EJECUTAR	%	VALOR AJUSTE	
1	JULIO	\$ 60,139,825.38	\$ 104,318,800.00	\$ 60,139,825.38	\$ 104,318,800.00	\$ 104,318,800.00	2021	JULIO	\$ (44,178,974.62)	100.00%	\$ 1,043,188.00	
2	AGOSTO	\$ 285,840,997.38	\$ 490,757,157.00	\$ 225,701,172.00	\$ 386,438,357.00	\$ 386,438,357.00		AGOSTO	\$ (204,916,159.62)	100.00%	\$ 386,438,357.00	
3	SEPTIEMBRE	\$ 585,098,237.38	\$ 892,583,194.00	\$ 299,257,240.00	\$ 401,826,037.00	\$ 401,826,037.00		SEPTIEMBRE	\$ (307,484,956.62)	100.00%	\$ 401,826,037.00	
4	OCTUBRE	\$ 773,972,837.38	\$ 2,203,634,319.00	\$ 188,874,600.00	\$ 1,311,051,125.00	\$ 1,311,051,125.00		OCTUBRE	\$ (1,429,661,481.62)	100.00%	\$ 1,311,051,125.00	
5	NOVIEMBRE	\$ 947,269,369.57	\$ 2,388,362,911.00	\$ 173,296,532.19	\$ 184,728,592.00	\$ 184,728,592.00		NOVIEMBRE	\$ (1,441,093,541.43)	100.00%	\$ 184,728,592.00	
6	DICIEMBRE	\$ 4,537,483,427.00	\$ 4,537,483,427.00	\$ 2,149,120,516.00	\$ 2,149,120,516.00	\$ 2,149,120,516.00		DICIEMBRE	\$ -	100.00%	\$ 2,149,120,516.00	Reprogramación No. 1
7	ENERO	\$ 5,629,530,779.29	\$ 5,150,862,427.00	\$ 1,092,047,352.29	\$ 613,379,000.00	\$ 613,379,000.00	2022	ENERO	\$ 478,668,352.29	100.00%	\$ 613,379,000.00	
8	FEBRERO	\$ 6,832,410,119.58	\$ 5,332,159,032.00	\$ 1,202,879,340.29	\$ 181,296,605.00	\$ 181,296,605.00	2022	ENERO	\$ 297,371,747.29	100.00%	\$ 181,296,605.00	Desembolso anticipado
9	MARZO	\$ 8,580,879,228.48	\$ 5,571,626,935.00	\$ 1,748,469,108.80	\$ 239,467,903.00	\$ 239,467,903.00	2022	FEBRERO	\$ 1,202,879,340.29			
							2022	ENERO	\$ 57,903,844.29	100.00%	\$ 239,467,903.00	
							2022	FEBRERO	\$ 1,202,879,340.29			
							2022	MARZO	\$ 1,748,469,108.80			
10	ABRIL	\$ 10,408,137,683.67	\$ 5,822,843,352.00	\$ 1,827,258,455.18	\$ 251,216,417.00	\$ 251,216,417.00	2022	ENERO	\$ 57,903,844.29	23.05%	\$ 57,903,844.29	
		\$ 4,585,294,331.67	\$ 218,118,834.82				2022	FEBRERO	\$ 1,009,566,767.59	76.95%	\$ 193,312,572.71	
							2022	MARZO	\$ 1,748,469,108.80			
Reprogramación No. 2												
11	MAYO	\$ 6,420,978,712.06	\$ 6,179,089,512.00	\$ 250,000,000.00	\$ 356,246,160.00	\$ 348,135,360.06	2022	ABRIL	\$ -	97.72%	\$ 348,135,360.00	
		Atraso May - repro No. 2	\$ 241,889,200.06			\$ 8,110,799.94	2022	MAYO	\$ 241,889,200.06	2.28%	\$ 8,110,800.00	
12	JUNIO	\$ 6,733,478,712.06	\$ 6,478,914,767.00	\$ 312,500,000.00	\$ 299,825,255.00	\$ 241,889,200.06	2022	MAYO	\$ -	69.48%	\$ 241,889,200.00	
		Atraso jun - repro No. 2	\$ 254,563,945.06			\$ 57,936,054.94	2022	JUNIO	\$ 254,563,945.06	16.64%	\$ 57,936,055.00	
Reprogramación No. 3												
13	JULIO	\$ 7,161,905,186.04	\$ 6,972,334,853.00	\$ 428,426,473.98	\$ 493,420,086.00	\$ 254,563,945.06	2022	JUNIO	\$ -	51.59%	\$ 254,563,945.00	
		Atraso jul - repro No. 3	\$ 189,570,333.04			\$ 238,856,140.94	2022	JULIO	\$ 189,570,333.04	48.41%	\$ 238,856,141.00	
14	AGOSTO	\$ 7,764,491,846.29	\$ 8,004,004,764.00	\$ 602,586,660.25	\$ 1,031,669,911.00	\$ 189,570,333.04	2022	JULIO	\$ -	18.38%	\$ 189,570,333.00	
						\$ 842,099,577.96	2022	AGOSTO	\$ (239,512,917.71)	81.62%	\$ 842,099,578.00	
Reprogramación No. 4												
15	SEPTIEMBRE	\$ 9,784,986,396.98	\$ 9,198,489,102.00	\$ 2,020,494,550.69	\$ 1,194,484,338.00	\$ 1,433,997,255.71	2022	SEPTIEMBRE	\$ 586,497,294.98	100.00%	\$ 1,433,997,256.00	
		Atraso sep - repro No. 3	\$ 586,497,294.98									
Reprogramación No. 5 - Reprogramación No. 6												
16	OCTUBRE	\$ 12,770,563,828.75	\$ 10,812,096,360.00	\$ 2,985,577,431.77	\$ 1,613,607,258.00	\$ 586,497,294.98	2022	SEPTIEMBRE	\$ -	36.35%	\$ 586,497,295.00	
		Atraso oct - repro No. 5 - 6	\$ 1,958,467,468.75			\$ 1,027,109,963.02	2022	OCTUBRE	\$ 1,958,467,468.75	63.65%	\$ 1,027,109,963.00	
17	NOVIEMBRE	\$ 15,506,924,082.99	\$ 13,079,914,366.00	\$ 2,736,360,254.24	\$ 2,267,818,006.00	\$ 1,958,467,469.00	2022	OCTUBRE	\$ -	86.36%	\$ 1,958,467,469.00	
		Atraso nov - repro No. 5 - 6	\$ 2,427,009,716.99			\$ 309,350,537.00	2022	NOVIEMBRE	\$ 2,427,009,716.99	13.64%	\$ 309,350,537.00	
18	DICIEMBRE	\$ 18,122,721,111.03	\$ 16,176,268,670.00	\$ 2,615,797,028.05	\$ 3,096,354,304.00	\$ 2,427,009,717.00	2022	NOVIEMBRE	\$ -	78.38%	\$ 2,427,009,717.00	
		Atraso dic - repro No. 5 - 6	\$ 1,946,452,441.03			\$ 669,344,587.00	2022	DICIEMBRE	\$ 1,946,452,441.03	21.62%	\$ 669,344,587.00	
Reprogramación No. 7												
19	ENERO	\$ 19,582,138,081.48	\$ 16,678,103,266.00	\$ 1,459,416,970.03	\$ 501,834,596.00	\$ 501,834,596.00	2022	DICIEMBRE	\$ 1,444,617,845.03	100.00%	\$ 501,834,596.00	
		Atraso ene - repro No. 7	\$ 2,904,034,815.48				2023	ENERO	\$ 1,459,416,970.03	0.00%	\$ -	
20	FEBRERO	\$ 21,693,322,999.04	\$ 17,875,269,042.00	\$ 2,111,184,917.56	\$ 1,197,165,776.00	\$ 1,197,165,776.00	2022	DICIEMBRE	\$ 247,452,069.03	100.00%	\$ 1,197,165,776.00	
		Atraso feb - repro No. 7	\$ 3,818,053,957.04				2023	ENERO	\$ 1,459,416,970.03	0.00%	\$ -	
							2023	FEBRERO	\$ 2,111,184,917.56	0.00%	\$ -	
21	MARZO	\$ 23,755,039,171.77	\$ 19,817,435,158.00	\$ 2,061,716,172.73	\$ 1,942,166,116.00	\$ 1,942,166,116.00	2022	DICIEMBRE	\$ -	12.74%	\$ 247,452,069.00	
		Atraso mar - repro No. 7	\$ 3,937,604,013.77				2023	ENERO	\$ -	75.14%	\$ 1,459,416,970.00	
							2023	FEBRERO	\$ 1,875,887,841.00	12.12%	\$ 235,297,077.00	
							2023	MARZO	\$ 2,061,716,172.73	0.00%	\$ -	
22	ABRIL	\$ 26,356,271,169.87	\$ 21,368,202,408.00	\$ 2,601,231,998.10	\$ 1,550,767,250.00	\$ 1,550,767,250.00	2023	FEBRERO	\$ 325,120,591.00	100.00%	\$ 1,550,767,250.00	
		Atraso mar - repro No. 7	\$ 4,988,068,761.87				2023	MARZO	\$ 2,061,716,172.73	0.00%	\$ -	
							2023	ABRIL	\$ 2,601,231,998.10	0.00%	\$ -	
23	MAYO	\$ 29,135,619,839.23	\$ 23,990,600,001.00	\$ 2,779,348,669.36	\$ 2,622,397,593.00	\$ 2,622,397,593.00	2023	FEBRERO	\$ -	12.40%	\$ 325,120,591.00	
		Atraso mar - repro No. 7	\$ 5,145,019,838.23				2023	MARZO	\$ -	78.62%	\$ 2,061,716,173.00	
							2023	ABRIL	\$ 2,365,671,169.10	8.98%	\$ 235,560,829.00	
							2023	MAYO	\$ 2,779,348,669.36	0.00%	\$ -	
24	JUNIO	\$ 31,817,838,372.63	\$ 25,606,680,919.00	\$ 2,682,218,533.40	\$ 1,616,080,918.00	\$ 1,616,080,918.00	2023	ABRIL	\$ 749,590,251.10	100.00%	\$ 1,616,080,918.00	
		Atraso mar - repro No. 7	\$ 6,211,157,453.63				2023	MAYO	\$ 2,779,348,669.36	0.00%	\$ -	
							2023	JUNIO	\$ 2,682,218,533.40	0.00%	\$ -	
25	JULIO	\$ 33,857,298,089.95	\$ 26,343,446,175.00	\$ 2,039,459,717.33	\$ 736,765,256.00	\$ 736,765,256.00	2023	ABRIL	\$ 12,824,995.10	100.00%	\$ 736,765,256.00	
		Atraso mar - repro No. 7	\$ 7,513,851,914.95				2023	MAYO	\$ 2,779,348,669.36	0.00%	\$ -	
							2023	JUNIO	\$ 2,682,218,533.40	0.00%	\$ -	
							2023	JULIO	\$ 2,039,459,717.33	0.00%	\$ -	

Bogotá D. C., 15 de Febrero del 2023

Señores
A QUIEN CORRESPONDA
Ciudad

Asunto: Referencia Bancaria

Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063** Identificada con el **Nit. 901476429** se encuentra vinculada a **BANCOLOMBIA** a través de la Cuenta **CORRIENTE No. 30400001203** desde el **4/21/21 (M/D/A)** la cual se denomina **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063**, en este momento se encuentra **ACTIVA** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo con las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por el Gerente de Cuenta, **CRISTINA JIMENEZ GAUNA**.

Atentamente,



Héctor Pastor Bautista

Oficina de Servicio Empresarial Bogotá

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

A16.3. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																																
Tipología de obra	agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2021												2022												2023			
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril
					Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	100.73	101.15	101.42	101.50	101.86	102.09	102.72	102.92	102.98	103.14	103.21	103.28	104.36	105.59	106.33	107.22	108.07	108.34	109.12	109.17	109.40	110.04	110.42	110.31	115.70	118.02	118.78	119.53
Vías interurbanas	11602	02	Almadrós, subbases y bases	18.69	100.70	100.76	101.46	101.62	101.60	101.56	102.24	102.18	102.24	102.21	102.42	102.44	103.71	104.89	105.19	105.76	106.58	107.02	108.07	107.64	107.65	108.53	108.75	108.89	114.45	117.80	119.71	120.52
Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38.51	100.90	101.20	102.53	102.02	102.91	103.25	104.31	104.29	103.81	103.50	103.66	104.35	106.80	109.36	110.34	113.44	114.11	113.62	116.71	116.86	116.76	118.63	119.18	118.60	126.71	131.73	132.21	132.85
Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.89	101.50	102.14	103.95	105.33	104.53	107.48	108.56	109.28	108.78	108.61	109.16	109.42	110.96	111.37	114.49	117.49	118.65	118.22	118.79	118.45	118.42	119.33	119.69	119.27	123.17	125.88	125.23	126.48
Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	100.69	101.17	101.67	102.42	102.53	102.97	104.54	104.39	104.56	104.88	104.98	105.35	107.61	110.00	110.71	111.38	112.36	113.02	113.11	113.07	113.09	113.49	113.64	113.75	121.13	123.23	123.96	124.28
Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	4.07	101.36	101.84	102.86	104.40	105.05	105.45	107.62	107.99	108.14	108.36	108.49	108.95	111.12	112.85	113.76	114.86	115.31	115.13	116.29	116.39	116.62	118.44	118.64	118.22	125.51	125.76	126.98	
Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	4.40	100.57	101.84	101.43	102.12	103.42	103.81	101.71	101.20	102.19	101.70	102.00	103.36	105.12	106.29	106.98	109.61	110.03	110.83	111.64	113.69	112.65	114.40	116.28	114.26	128.39	131.60	130.88	132.54
Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobreaceras	4.22	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89	101.56	101.84	102.77	103.21	104.21	104.62	105.41	105.48	105.50	105.53	105.53	105.74	108.97	111.19	111.07	113.11
Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51.10	101.47	102.05	101.77	102.07	102.36	102.62	103.15	103.28	102.95	102.53	102.34	102.82	105.24	106.43	108.23	109.74	110.70	110.82	111.36	111.40	111.30	112.16	112.35	111.60	120.56	123.76	124.25	124.71
Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura	15.73	101.10	101.28	101.15	100.84	101.07	101.66	102.16	102.31	102.30	101.90	101.84	102.58	105.35	107.06	108.69	110.41	111.48	111.70	113.46	113.98	114.03	115.39	115.54	115.29	124.33	128.77	129.39	129.78

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ, identificado con C.C. N° **1.015.396.432** de **Bogotá D.C.**, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063** identificado con NIT **901.476.429-7**, debidamente inscrito ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la documentación.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de agosto del dos mil veintitrés (2023)



JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
C.C. 1.015.396.432 de Bogotá D.C.
Representante Legal



DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER.....

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 DE 1 a 11 de julio de 2023

SECUESTRO No. 25

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

CONTRATO Nº: _____ de 2021.

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN FISCAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANÍA (LA LEJÍA - SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MÓDULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063.....

INTERVENOR: CONSORCIO INTERVENOR VIAL HMV/WSP 188

PLAZO INICIAL: 110 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:
Indique la suspensión que corresponda:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 2.000.000

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP.)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Mes y año		(N) OBRA PROGRAMADA		(N) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		% Programado																					
							% Ejecutado																					
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Mes y año	(N) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Mes y año	(N) TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Ejecutado																							
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23
EXPLICACIONES																												
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.																												
2	27.721.427,78	58.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	2.721.427,78	5.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	24.000.000,51	52.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SUBSIDIOS Y AYUDAS (Items 10, 11, 12)																												
5	30.000.400,51	63.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	18.000.130,00	37.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	12.000.270,00	25.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8	10.000.190,00	21.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9	80.422.508,52	170.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	88.989.439,02	190.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11	88.989.439,02	190.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12	88.989.439,02	190.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
13	88.989.439,02	190.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	88.989.439,02	190.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
15	88.989.439,02	190.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
16	88.989.439,02	190.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
17	88.989.439,02	190.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
18	88.989.439,02	190.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
19	88.989.439,02	190.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
20	88.989.439,02	190.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92)																												
21	121.405.609,48	27.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
22	12.140.560,95	2.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
23	10.925.569,85	2.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
24	1.092.556,99	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25	9.833.012,86	2.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
26	983.301,29	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
27	8.849.711,57	1.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
28	884.971,16	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
29	7.964.740,41	1.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%</										

[illegible]

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

NOT A:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y refleja la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprobado _____
 Nombre: **JORGE EDUARDO DOMESTICO RODRIGUEZ**
 Representante legal o apoderado del Contratista
 Matricula Profesional No: 22662 C/SJ

Aprobado _____
 Nombre: **OSCAR JIMENEZ CELY**
 Representante legal o apoderado del Interventor
 Matricula Profesional No: 25282-34513 CHD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contralista, Interventor y Dirección Territorial.

[illegible]

FECHA	01/08/2023 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------
