

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 49 INVIAS-IM – 0971-2021 JUNIO DE 2025	

Anexo No.1.

Informes Semanales



INVIAS



Remite: CONSORCIO ICEACSA - TPF <consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com>

Fecha: 2025-06-05 20:21:21

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: C971 4334 2025 Informe semanal de Interventoria No 207

Adjuntos: 03

Radicado: 2025E-VUVRAZ-060764

Fecha Radicación: 2025-06-06 08:29:40

Cc:



Zipaquirá (Cundinamarca), 05 de junio de 2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo

Supervisor del Contrato de Interventoría

Dirección Territorial Cundinamarca

Fontibón

Ref.: Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”.

Asunto: Informe semanal de Interventoría No 207

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Zipaquirá (Cundinamarca), 05 de junio de 2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo

Supervisor del Contrato de Interventoría

Dirección Territorial Cundinamarca

Fontibón

Ref.: Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”.

Asunto: Informe semanal de Interventoría No 207

Respetado Señor,

El Consorcio ICEACSA - TPF en cumplimiento de sus obligaciones contractuales del contrato citado en la referencia, se permite remitir el Informe Semanal No 207 del periodo comprendido entre el 30 de mayo a 05 de junio de 2025 de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría en su instructivo MINFRA-MN-IN-15.

Cordialmente,




LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Director de interventoría

Elaboro: Área Técnica

Aprobó: Luis Antonio Rueda Rueda

Copia: Ing. Luis Eduardo Garzón Charum –SMDC - INVIAS
Archivo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE ALIQUOTACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD PÚBLICA VERSIÓN 2.0 (2018)		VERSIÓN 1
	AUTORIZACIÓN 1		FECHA 1
	AUTORIZACIÓN 1		
4. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES			
			
El presente plan de gestión de calidad es un documento de carácter público y de acceso libre, que se encuentra en la página web del Instituto Nacional de Vías, en la sección de Gestión de Calidad.			
Al. Nombre del Proponente			
			
El presente plan de gestión de calidad es un documento de carácter público y de acceso libre, que se encuentra en la página web del Instituto Nacional de Vías, en la sección de Gestión de Calidad.			
Al. Nombre del Proponente			



INVIAS



Remite: CONSORCIO ICEACSA - TPF <consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com>

Fecha: 2025-06-13 07:48:43

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: C971 4378 2025 Informe semanal de Interventoria No 208

Adjuntos: 04

Radicado: 2025E-VUVRAZ-064019

Fecha Radicación: 2025-06-13 09:35:11

Cc:



Zipaquirá (Cundinamarca), 13 de junio de 2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo

Supervisor del Contrato de Interventoría

Dirección Territorial Cundinamarca

Fontibón

Ref.: Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”.

Asunto: Informe semanal de Interventoría No 208

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Zipaquirá (Cundinamarca), 13 de junio de 2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo

Supervisor del Contrato de Interventoría

Dirección Territorial Cundinamarca

Fontibón

Ref.: Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”.

Asunto: Informe semanal de Interventoría No 208

Respetado Señor,

El Consorcio ICEACSA - TPF en cumplimiento de sus obligaciones contractuales del contrato citado en la referencia, se permite remitir el Informe Semanal No 207 del periodo comprendido entre el 06 a 13 de junio de 2025 de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría en su instructivo MINFRA-MN-IN-15.

Cordialmente,



LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Director de interventoría

Elaboro: Área Técnica

Aprobó: Luis Antonio Rueda Rueda

Copia: Jessica Lorena Rodríguez Delgado—Subdirección de Modernización de Carreteras – GRUPO ORIENTE - INVIAS
Archivo.

Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante instalación de señales verticales y/o demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito.
Terminar la construcción de la obra de transición entre los dos tramos de arco metálico ya construidos. Ejecutar el sellado entre las placas alveolares y realizar las reparaciones de algunos daños en algunas de estas placas.
Continuar la construcción de cunetas reventadas en concreto a lo largo del perímetro externo de la glorieta de Ave Colombiana y las fallantes en las conectantes de la glorieta con la calle 8 y la vía a Barandillas. Continuar los trabajos de urbanismo en la glorieta de Ave Colombiana.
Tramo 2: Continuar las actividades de descapote, excavación y construcción de capas de mejoramiento con material de terrapén y construcción de capa de subbase, continuar la excavación y adecuación de terreno para construcción del muro K44+392. Igualmente iniciar la construcción de la obra hidráulica No. 32 en tubería de concreto reforzado diámetro 0.90 m. Iniciar la construcción de los muros en concreto reforzado del K44+400.
Continuar con la actividad de pintura de líneas de demarcación y marcas viales en los sectores ya establecidos en las rutas 45A04, 45A05, y 45A06 así como el sellado de fisuras como medida provisional, evitando que el agua penetre a la carpeta asfáltica, y se produzcan daños aún mayores a la superficie.
Continuar las actividades de mantenimiento de la carpeta asfáltica mediante Tapa huecos, parcheos técnico y Bacheos en los sectores de Zipaquirá - Ubaté, Ubaté - Chiquiquirá, Saboya - Puente Nacional - Olba - Socorro - San Gil Peaje Cuttí, para atender compromisos adquiridos con la comunidad en las reuniones de Socorro, Saboyá, Cuttí
Continuar con los trabajos de adecuación de camamento en el K44+200 para las actividades constructivas del tramo 2.
Intensificar actividades de gestión predial en los primeros 7 km. del tramo Peaje de Casablanca - Ubaté para lograr permisos de intervención y así dar inicio en los próximos meses, la construcción de la segunda calzada en este tramo.

El diagrama muestra el avance de las obras programadas y ejecutadas en la Ruta 45400, con un presupuesto asignado de \$1.000.000.000. Las obras se detallan en tres secciones: Esquema No 1 Tramo 1, Esquema No 2 y Esquema No 3 Tramo 2.

Esquema No 1 Tramo 1: Incluye obras como el mantenimiento de la Ruta 45400, la intervención según el Esquema No 2, y la intervención según el Esquema No 3. Las obras programadas y ejecutadas se detallan en la siguiente tabla:

Programado	Ejecutado
K 0+470	K 0+470
K 0+580	K 0+580
K 0+650	K 0+650
K 2+660	K 2+660
K 2+770	K 2+770
K 3+000	K 3+000
K 3+400	K 3+400
K 4+320	K 4+320
K 0+016 C	K 0+016 C

Esquema No 2: Incluye obras como el mantenimiento de la Ruta 45400, la intervención según el Esquema No 2, y la intervención según el Esquema No 3. Las obras programadas y ejecutadas se detallan en la siguiente tabla:

Programado	Ejecutado
K 0+470	K 0+470
K 0+600	K 0+600
K 2+660	K 2+660
K 3+000	K 3+000
K 7+050	K 7+050




Esquema No 3 Tramo 2: Incluye obras como el mantenimiento de la Ruta 45400, la intervención según el Esquema No 2, y la intervención según el Esquema No 3. Las obras programadas y ejecutadas se detallan en la siguiente tabla:

Programado	Ejecutado
K 44+000	K 44+000
K 44+100	K 44+100
K 44+130	K 44+130
K 44+140	K 44+140
K 44+210	K 44+210
K 44+300	K 44+300
K 44+310	K 44+310
K 44+330	K 44+330
K 44+370	K 44+370
K 44+385	K 44+385
K 44+400	K 44+400
K 44+450	K 44+450
K 44+500	K 44+500

Las obras se detallan en la siguiente tabla:

Programado	Ejecutado
K 0+470	K 0+470
K 0+580	K 0+580
K 0+650	K 0+650
K 2+660	K 2+660
K 2+770	K 2+770
K 3+000	K 3+000
K 3+400	K 3+400
K 4+320	K 4+320
K 0+016 C	K 0+016 C

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contralista, Interventor y Dirección Territorial

NOMBRE: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STD

Luigi Ruda.



INVIAS



Remite: CONSORCIO ICEACSA - TPF <consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com>

Fecha: 2025-06-20 08:45:06

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: C971 4403 2025 Informe semanal de Interventoria No 209

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-067054

Fecha Radicación: 2025-06-20 09:21:39

Cc:



Zipaquirá (Cundinamarca), 20 de junio de 2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo

Supervisor del Contrato de Interventoría

Dirección Territorial Cundinamarca

Fontibón

Ref.: Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”.

Asunto: Informe semanal de Interventoría No 209

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Zipaquirá (Cundinamarca), 20 de junio de 2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo

Supervisor del Contrato de Interventoría

Dirección Territorial Cundinamarca

Fontibón

Ref.: Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”.

Asunto: Informe semanal de Interventoría No 209

Respetado Señor,

El Consorcio ICEACSA - TPF en cumplimiento de sus obligaciones contractuales del contrato citado en la referencia, se permite remitir el Informe Semanal No 209 del periodo comprendido entre el 13 a 19 de junio de 2025 de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría en su instructivo MINFRA-MN-IN-15.

Cordialmente,



LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Director de interventoría

Elaboro: Área Técnica

Aprobó: Luis Antonio Rueda Rueda

Copia: Jessica Lorena Rodríguez Delgado—Subdirección de Modernización de Carreteras – GRUPO ORIENTE - INVIAS
Archivo.

Se encuentran ejecutadas las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá : Descapote: 6.58Km, Excavación de explanación 6.58Km, pedraplén 6.58Km, Terraplén 6.58Km, Subbase SGB-38 6.58Km, BTA 6.58Km, MSC-25 6.58Km y MDC-19 6.54Km. De la longitud ejecutada de terraplén se encuentra en corona 6.57Km
Se encuentran ejecutadas las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada de Tramo 2, Peaje Casablanca hacia Ubaté : Descapote: 0.32Km, Excavación de explanación 0.32Km, Terraplén 0.25Km, Subbase SGB-38 0.16Km, BTA 0.16Km, MSC-25 0.16Km y MDC-19 0Km. De la longitud ejecutada de terraplén se encuentra en corona 0.16Km.
Durante la semana disminuyen las precipitaciones de alta intensidad en el área de los trabajos, sin embargo, los materiales se encuentran saturados y no permiten un desarrollo normal en las actividades de obra en la variante de Zipaquirá sector Aye Colombia como relleno en paños, instalación de concreto estampado en la zona de espacio público, así como relleno de juntas del puente peatonal. Así mismo, en el Tramo 2, en la excavación e instalación material de pedraplén, terraplén y construcción del muro S-25.
La Interventoría registra el siguiente equipo en campo, incluyendo el mínimo requerido y el adicional para el cumplimiento de las metas físicas: (2) Bulldozer, (1) Cargador, (1) Motoniveladora, (3) Minicargador, (4) Vibracompactor, (1) Compactor de lanta, (2) Benlín, (1) Dumper, (2) Volquetes, (2) Bomba de concreto, (1) Autohormigonera, (1) Camabaja, (2) Torre de iluminación, (1) Finisher, (2) Camión irrigador, (1) Compresor, (2) Carroquero de agua, (1) Grúa telescópica, (1) Barredora, (1) Fresadora, (1) Camión, (4) Camionetas, (3) Microbus, (1) Clasificador de granulados, (1) Planta de asfalto, (1) Encofrados de concreto en los frentes de obra del proyecto
Dentro del control de calidad: La interventoría ha realizado la toma de muestra de los diferentes materiales para realizar el control de los ensayos a través de un laboratorio externo. Durante el proceso de instalación de las mezclas asfálticas se lleva a cabo los controles de temperatura de BTA, MDC 25, MDC-19. En el caso de concretos se realiza la toma de asentamiento con el cono slump, toma de muestras en cilindros de concreto para posterior evaluación de resistencia a la compresión y en el caso de los pilotes se lleva a cabo pruebas de integridad. Se verifican para las actividades de demarcación de borde y eje los espesores secos y la reflectividad. Adicionalmente se realizan ensayos de control de calidad a los materiales en conjunto Interventoría y contratista en el laboratorio implementado por el contratista en el campamento ubicado en la intersección de Aye Colombia, así como el campamento semanal en la ejecución de ensayos de control de mezclas y materiales el laboratorio de la planta de producción de asfaltos CMOP.
En cuanto a las actividades de Estudios y Diseños Según informe semanal No. 206 de estudios y diseños radicado el 16 de junio de 2025 se estableció: -El Contratista radica el oficio D-000005720, se da respuesta a las observaciones dadas por la Interventoría de los entregables VOLUMEN IV, ESTUDIO DE SUELOS PARA FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN TRAMO CASABLANCA – UBATÉ Tramo K4+070 - K47+300 en Versión D. -El Contratista radica el oficio D-000005734, con el cual se atienden punto a punto las observaciones emitidas por Interventoría mediante el oficio C971-4184-2025 (R-000003294) el 4 de abril de 2025 y C971-4350-2025 (R-000003421) el 6 de junio de 2025 haciendo referencia al estado geotécnico del muro 02 (K44+392 a K44+443). -El Contratista radica el oficio D-000005736, con el cual se atienden las observaciones emitidas por Interventoría mediante el oficio C971-4330-2025 (R-000003407) el 3 de junio de 2025 haciendo referencia a la entrega del complementario a COMPONENTE DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN del tramo K4+070 – K47+300.

Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y/o demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito.

Intensificar actividades de gestión predial en los primeros 7 km. del tramo Peaje de Casablanca - Ubaté para lograr permisos de intervención y así dar inicio en los próximos meses, la construcción de la segunda calzada en este tramo.

[illegible]

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

BACHEO RUTA 45 A 05, PUENTE NACIONAL, PR83+0550 - PR83+0713, FRESADO E INSTALACIÓN DE MDC-19

TRAMO 2, MURO S-25, FUNDIDA DE DENTELLÓN Y ZARPA DE MÓDULOS 6 Y 7

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN PAÑO 21

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA 400mm ENTRE SUMIDERO SP1 Y SP2 CONECTANTE ORIENTAL

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, CERO DE MATERIAL DE TERRAPLEN EN PAÑO 20

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, PUENTE PEATONAL, FUNDIDA EN SITIO DE LOSAS EN RAMPA 1

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO CONECTANTE NORTE

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, GLORIETA, INSTALACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN EN ESPALDAR DE CUNETA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MEPLAN-IN-15-FR-3 VERSIÓN 1 PÁGINA
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
SE REALIZÓ CONTROL, SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DE LA CARPETA ASFÁLTICA QUE SE VIENE EJECUTANDO EN LOS CORREDORES OBJETO DEL CONTRATO CON EL FIN DE MITIGAR LA SINISTRALIDAD VIAL. ASÍ MISMO SE REALIZÓ RECORRIDO EN LOS SECTORES ENTREOIBA - OLIVAR, PARA DEFINIR LOS SECTORES Y TRAMOS A INTERVENIR.		
SE REALIZÓ CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA QUE SE VIENE EJECUTANDO EN EN EL SECTOR DE LA RUTA RUTA 45 A 06 OIBA, RUTA 45 A 07 SAN GIL, PEAJE CURITI.		
CON OFICIO C971-3729-2024 SE REITERA AL CONTRATISTA LA DEMARCACIÓN VIAL Y SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LOS SECTORES DEL CORREDOR QUE ASÍ LO REQUIEREN		
		FIRMA:
		NOMBRE: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
		Matrícula Profesional No.: 66202-16905 STD
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVAE. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial		



INVIAS



Remite: CONSORCIO ICEACSA - TPF <consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com>

Fecha: 2025-06-26 18:11:48

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: C971 4416 2025 Informe semanal de Interventoria No 210

Adjuntos: 02

Radicado: 2025E-VUVRAZ-069514

Fecha Radicación: 2025-06-27 08:23:02

Cc:



Zipaquirá (Cundinamarca), 26 de junio de 2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo

Supervisor del Contrato de Interventoría

Dirección Territorial Cundinamarca

Fontibón

Ref.: Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”.

Asunto: Informe semanal de Interventoría No 210

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Zipaquirá (Cundinamarca), 26 de junio de 2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atn.: Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo

Supervisor del Contrato de Interventoría

Dirección Territorial Cundinamarca

Fontibón

Ref.: Contrato No 971 de 2021 “Interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”.

Asunto: Informe semanal de Interventoría No 210

Respetado Señor,

El Consorcio ICEACSA - TPF en cumplimiento de sus obligaciones contractuales del contrato citado en la referencia, se permite remitir el Informe Semanal No 210 del periodo comprendido entre el 20 a 27 de junio de 2025 de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría en su instructivo MINFRA-MN-IN-15.

Cordialmente,




LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Director de interventoría

Elaboro: Área Técnica

Aprobó: Luis Antonio Rueda Rueda

Copia: Jessica Lorena Rodríguez Delgado—Subdirección de Modernización de Carreteras – GRUPO ORIENTE - INVIAS
Archivo.



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-
VERSIÓN	1
PÁGINA	

- Instalación y corte de exceso de espuma de poliuretano en sello de juntas de placas alveolares
- Personal de Titán realiza resanes a losas alveolares.

TRAMO 2: continúa la construcción de la doble calzada de Peaje Casablanca hacia Ubaté

Muro S-25:
-Armado de acero y fundida de 2 secciones de vástago de módulos 6 y 7.
-Fundida de concreto ciclópeo de módulo 5.
-Punto K44+400.
-Conformación de plataforma para ubicar piloteadora.
-Perforación de pilote No 1, estribo No 1.

Bacheo Ruta 45 A 05
-Punto Nacional: abarcano entre PR82+0925 y PR83+0549, fresa e instalación de MDC-19

En la semana se ejecutaron las siguientes cantidades aproximadamente: MDC-19: 393m3; Fresado: 393m3; Sello de fisuras: 300m.

En la semana se ejecutaron cantidades de Concreto hidráulico: Concreto ciclópeo: 30.0 m3; Concreto estampado: 330.0 m2.

Se encuentran ejecutadas las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá : Descapote: 6.58Km, Excavación de explanación 6.58Km, pedraplén 6.58Km, Terraplén 6.58Km, Subbase SGB-38 6.58Km, BTA 6.58Km, MSC-25 6.58Km y MDC-19 6.54Km. De la longitud ejecutada de terraplén se encuentra en corona 6.57Km

Se encuentran ejecutadas las siguientes longitudes acumuladas por actividades en la construcción de la segunda calzada de Tramo 2, Peaje Casablanca hacia Ubaté : Descapote: 0.32Km, Excavación de explanación 0.32Km, Terraplén 0.28Km, Subbase SGB-38 0.16Km, BTA 0.16Km, MSC-25 0.16Km y MDC-19 0.9Km. De la longitud ejecutada de terraplén se encuentra en corona 0.16Km.

Durante la semana aumentan las precipitaciones de alta intensidad en el área de los trabajos, por lo tanto, los materiales se encuentran saturados y no permiten un desarrollo normal en las actividades de obra en la variante de Zipaquirá sector Ave Colombiana como relleno en paños, instalación de concreto estampado en la zona de espacio público, así como sello de juntas del puente peatonal. Así mismo, en el Tramo 2, en la excavación e instalación material de pedraplén, terraplén, construcción del muro S-25 y actividades de pilotaje.

La Interventoría registra el siguiente equipo en campo, incluyendo el mínimo requerido y el adicional para el cumplimiento de las metas físicas : (3) Retrocargador, (2) Buldozer, (1) Cargador, (1) Motoniveladora, (3) Minicargador, (4) Vibrocompactador, (1) Compactador llanta, (1) Benlín, (15) Volquetas, (2) Bomba de concreto, (1) Autohormigonera, (1) Camabaja, (2) Torre de iluminación, (1) Finisher, (2) Camión irrigador, (1) Compresor, (2) Carrotaque de agua, (1) Grúa telescópica, (1) Barredora, (1) Fresadora, (1) Camión, (4) Camionetas, (3) Microbus, (1) Clasificadora de granuladas, (1) Planta de asfalto, (1) Encofradora de concreto, (1) Piloteadora XCMG en los frentes de obra del proyecto

Dentro del control de calidad: La interventoría ha realizado la toma de muestra de los diferentes materiales para realizar el control de los ensayos a través de un laboratorio externo. Durante el proceso de instalación de las mezclas asfálticas se lleva a cabo los controles de temperatura de BTA, MDC 25, MDC -19. En el caso de concretos se realiza la toma de asentamiento con el cono slump, toma de muestras en cilindros de concreto para posterior evaluación de resistencia a la compresión y en el caso de los pilotes se lleva a cabo pruebas de integridad. Se verifican para las actividades de demarcación de borde y eje los espesores secos y la reflectividad. Adicionalmente se realizan ensayos de control de calidad a los materiales en conjunto interventoría y contratista en el laboratorio implementando por el contratista en el campamento ubicado en la intersección de Ave Colombiana, así como el acompañamiento semanal en la ejecución de ensayos de control de mezclas y materiales el laboratorio de la planta de producción de asfaltos CMOP.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el reforzamiento de señalización en sitios críticos de accidentalidad, mediante la instalación de señales verticales y/o demarcación, de acuerdo con los inventarios y esquemas realizados por parte de los especialistas de tránsito.

Terminar la construcción de la obra de transición entre los dos tramos de arco metálico ya construidos. Ejecutar el sello entre las placas alveolares y realizar las reparaciones de algunos daños en algunas de estas placas.


Continuar la construcción de cunetas revestidas en concreto a lo largo del perímetro externo de la gorieta de Ave Colombiana y las faltantes en las conectantes de la gorieta con la calle 8 y la vía a Barandillas. Continuar los trabajos de urbanismo en la gorieta de Ave Colombiana.

Tramo 2: Continuar las actividades de descapote, excavación y construcción de capas de mejoramiento con material de terraplén y construcción de capa de subbase, continuar la excavación y construcción de módulos del muro S-25 K44+392. Igualmente iniciar la construcción de la obra hidráulica No. 32 en tubería de concreto reforzado diámetro 0.30 m. Iniciar la construcción de los muros en concreto reforzado del K44+400.

Continuar con la actividad de pintura de líneas de demarcación y marcas viales en los sectores ya establecidos en las rutas 45A04, 45A05, y 45A06 así como el sello de fisuras como medida provisional, evitando que el agua penetre a la carpeta asfáltica, y se produzcan daños aún mayores a la superficie.

Continuar las actividades de mantenimiento de la carpeta asfáltica mediante Tapa huecos, parcheos técnico y Bacheos en los sectores de Zipaquirá - Ubaté, Ubaté -Chiquinquirá, Saboya - Puente Nacional - Oiba - Socorro - San Gil Peaje Curtil, para atender compromisos adquiridos con la comunidad en las reuniones de Socorro, Saboyá, Curtil

Intensificar actividades de gestión predial en los primeros 7 km. del tramo Peaje de Casablanca - Ubaté para lograr permisos de intervención y así dar inicio en los próximos meses, la construcción de la segunda calzada en este tramo.

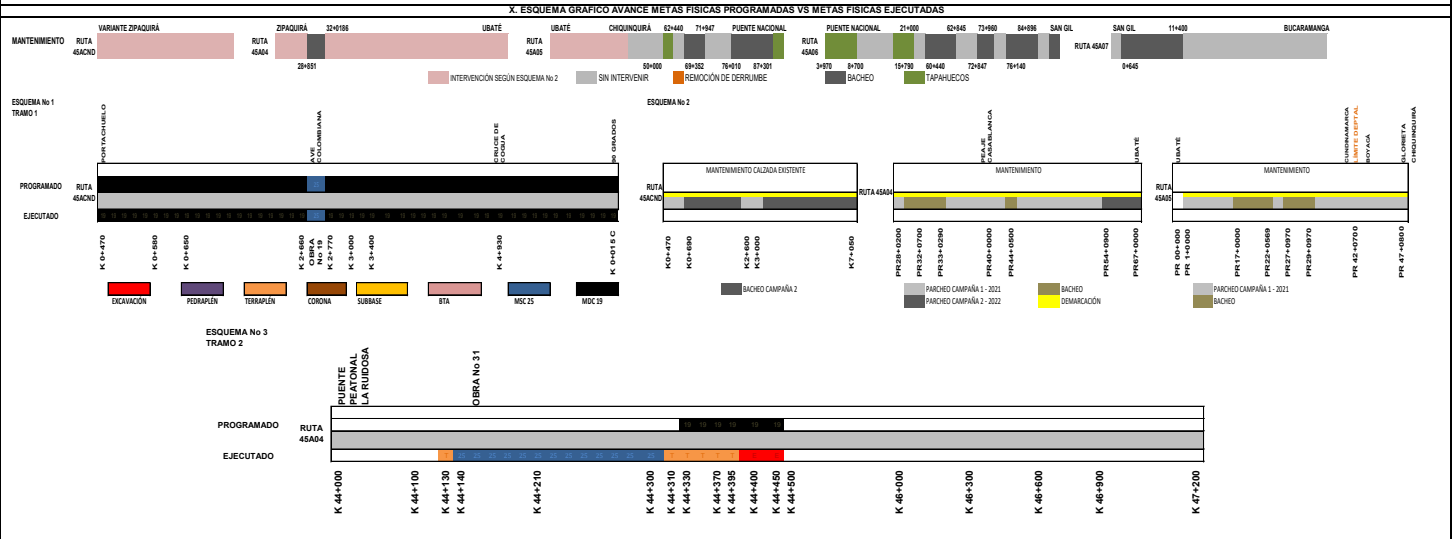

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN AL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO MEPLAN-IN-15-FR-3	
		VERSIÓN 1	
		PÁGINA	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
SE REALIZÓ CONTROL, SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE PARCHEO/BACHEO, QUE SE VIENE EJECUTANDO EN EL SECTOR DE PUENTE NACIONAL, RUTA 45 A05.			
PARTICIPACION EN LAS MESAS DE TRABAJO PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS ACONTECIDAS POR LA OLA INVERNAL EN LOS SITIOS CRITICOS LOCALIZADOS EN LOS PR 22+000 (GUEPSA - SAN JOSE DE PARE), PR 26+400, PR26+900, PR 35+000 (SANTANA) EN EL CORREDOR DE LA RUTA 45 A 06.			
		FIRMA:	
		NOMBRE:	LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
		Matrícula Profesional No.:	66202-16905 STD
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVAES.			
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial			

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 48 INVIAS-IM – 0971-2021 JUNIO DE 2025	

Anexo No 2.

MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y equipo contrato de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-4
			VERSIÓN 1
			PÁGINA
			FECHA 5/07/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA			
PERIODO / MES INFORME MENSUAL:	jun-25		PROYECTO: RUTA DE LOS COMUNEROS
CONTRATO No.	989 DE 2021		CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	971 DE 2021		INTERVENTORÍA: CONSORCIO ICEACSA-TPF
MAQUINARIA Y EQUIPO			
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN
Retroexcavadora de oruga	Kobelco SK 350 No 5		Variante Zipaquirá
Retroexcavadora de oruga	Volvo EC460BLC No 13 - 2009		Casablanca - Ubaté
Retrocargador	CAT 428 No 66 - Negro		Variante Zipaquirá
Retrocargador	CAT 428 E No 70		Casablanca - Ubaté
Retrocargador	CAT 428 E No 66 - blanco		Variante Zipaquirá
Bulldozer sobre oruga	Caterpillar No 24		Casablanca - Ubaté
Bulldozer sobre oruga	Caterpillar No 26	D6N	Variante Zipaquirá
Motoniveladora	Caterpillar 120 k No 33	767	Casablanca - Ubaté
Minicargador	Cat No 45		Variante Zipaquirá/Puente nacional
Minicargador	Volvo 02		Variante Zipaquirá
Minicargador	New Holland I223		Variante Zipaquirá
Vibro compactador de rodillo	Caterpillar CS533E No 36 - 2009	12 Ton	Casablanca - Ubaté
Vibro compactador de rodillo	Caterpillar No 35		Variante Zipaquirá
Vibro compactador mixto	Ham H075 (23)		Variante Zipaquirá
Vibro compactador mixto	Ham H075 (25)		Puente nacional
Benitín	Dynapac CC 1200 No 15		Variante Zipaquirá
Benitín	Caterpillar 36		Casablanca - Ubaté
Benitín	Caterpillar CB24 35		Casablanca - Ubaté
Benitín	34		Casablanca - Ubaté
Volqueta Tipo Dumper	Volvo No 39	15 m3	Casablanca - Ubaté
Volqueta doble Troque	Mack No 73	14m3	Variante Zipaquirá
Volqueta doble Troque	Mack No 76	14m3	Variante Zipaquirá
Volqueta doble Troque	No 77	14m3	Puente nacional
Volqueta doble Troque	Dina Internacional No 85	14m3	Casablanca - Ubaté
Volqueta doble Troque	Dina Internacional No 90	14m3	Puente nacional
Volqueta doble Troque	Dina SKH 571 (88)	14m3	Variante Zipaquirá
volqueta sencilla			
Volqueta doble Troque	No 92		Puente nacional
Piloteadora	XR180DII		Casablanca - Ubaté
Auto hormigonera	Dieci No 12 - 2011	2m3	Variante Zipaquirá
Auto hormigonera	Pinci		
Camabaja	SKI 220 No 50		Variante Zipaquirá
Carro tanque de agua (ballenera)	Caterpillar 613B No 22	5000 Galones	Variante Zipaquirá
Bomba de concreto	PUTZMEISTER		Variante Zipaquirá
Bomba de concreto	SCHWING		Variante Zipaquirá
Compresor	Atlas Copco		Variante Zipaquirá
Compresor	1		Variante Zipaquirá
Martillo compresor			Puente nacional
Cortadora			Puente nacional
Tractor			Variante Zipaquirá
Equipo de demarcación			Zipaquirá - Chiquinquirá - Puente Nacional
Grúa telescópica	Telehandler Merlo	Roto 3816	Variante Zipaquirá
Clasificadora	Wacker Neuson		Variante Zipaquirá
Extendidora de concreto	Wacker Neuson	SP-15	Variante Zipaquirá
Finisher	Dynapac 2500 C No 03		Puente nacional
Finisher	Dynapac No 04		Puente nacional
Finisher	ATLAS COPCO No 04		Variante Zipaquirá

[illegible][illegible]

2) Retrocargador CAT 428 E No 70: Daño en botella y manguera.

6) Benitín Dynapac CC 1200 No 15: Daño en ventilador

8) Caterpillar CB24 35: Daño en batería

10) Compreso atlas copco: Problemas de recalentamiento.

12) Fresadora Wirtgen W1000 (01) : Daño en la bomba

14) Volqueta sencilla : Daño electrico

16) Fresadora P R 450C - No. 32 : Daños en el alternador

1) El anexo técnico del contrato establezca dentro del equipo mínimo una perforadora, lumbo (3 Brazos), perforadora, lumbo (2 Brazos) y Bomba de Inyección Lchada (2m³/h), sin embargo acorde al alcance y necesidades del contrato, la anterior maquinaria no se requiere por el momento

2) Se registra el ingreso de la siguiente maquinaria: Motociclovadora de cadena VOLT 2500CC No 10 - 2009, minicargadora NEW HOLLAND L220, Bomba hidráulica 50, varqueta tipo Bamber VOLT 1800 cc, varqueta sobre trípode Bina Internacional No 50, compresor

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran en REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

- [illegible]

Firma LUIS FELIPE MORENO BRAVO	Firma MARTHA LUCIA CORTES BUILO
--	---

Residência de São Paulo
Matrícula No. : 25202-05870 CND

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 49 INVIAS-IM – 0971-2021 JUNIO DE 2025	

Anexo No 3.

MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal de obra

CAJADINVS		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS																												CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE																												VERSIÓN		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA																												PÁGINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																														FECHA		04/07/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE															DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CONTRATO DE OBRA No: 989-2021															CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
															MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Jun-25															PROYECTO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021															CONSORCIO ICEACSA TPF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NOMBRE ARL: SURA															NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	1. SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

CAJADIA INVS		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				VERSIÓN	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				PÁGINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				FECHA	04/07/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CUNDINAMARCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CONTRATO DE OBRA No:		989-2021		CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAL MHC 063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		Jun-25		PROYECTO:		MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		971 de 2021		INTERVENTOR:		CONSORCIO ICEACSA TPF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NOMBRE ARL:		SURA		NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:		COLSUBSIDIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	1. SEGURIDAD SOCIAL				PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			


CAJADINVER		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS																																								CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE																																								VERSIÓN	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA																																								PÁGINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																										FECHA		04/07/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UNIDAD EJECUTORA:										SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE																				DIRECCIÓN TERRITORIAL:										CUNDINAMARCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CONTRATO DE OBRA No:										989-2021										CONTRATISTA:										CONSORCIO VIAL MHC 063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:										Jun-25										PROYECTO:										MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:										971 de 2021										INTERVENTOR:										CONSORCIO ICEACSA TPF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NOMBRE ARL:										SURA										NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:										COLSUBSIDIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No.	Nombres y Apellidos		C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	1. SEGURIDAD SOCIAL				PARAFISCALES				Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA															CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																	VERSIÓN		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																	PÁGINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																	FECHA		04/07/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE															DIRECCIÓN TERRITORIAL:					CUNDINAMARCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CONTRATO DE OBRA No:		989-2021															CONTRATISTA:										CONSORCIO VIAL MHC 063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		Jun-25															PROYECTO:										CONSORCIO ICEACSA TPF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		971 de 2021															INTERVENTOR:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NOMBRE ARL:		SURA															NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:										COLSUBSIDIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	1. SEGURIDAD SOCIAL				PARAFISCALES				Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS																												CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-6																							
		PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE																												VERSIÓN		1																							
		MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA																												PÁGINA																									
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																																																							
																												FECHA		04/07/2025 (Día / Mes / Año)																									
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE																												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA																											
CONTRATO DE OBRA No: 989-2021																												CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063																											
																												MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 1																											
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Jun-25																												PROYECTO:																											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021																												INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA TPF																											
NOMBRE ARL: SURA																												NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO																											
No.	Nombres y Apellidos		C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	1. SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF								
109	FAJARDO CASTELLANOS CRISTIAN DAVID		1077085173	CONDUCTOR MICROBUS 5 TSM -434	\$ 2,300,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,817,500	\$ 122,600	IV	FAMISANAR EPS	1073785556	\$ 112,700	PORVENIR	1073785556	\$ 450,800	\$ 112,700	\$ -	\$ -							
110	GUTIERREZ MAHECHA DAVINSON		1077972031	OPERADOR LANZADORA DE CONCRETO	\$ 2,300,000	D	F	LR	LR	LR	LR	LR	LR	LR	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,360,834	\$ 125,400	V	EPS SANITAS	1073785556	\$ 94,500	PORVENIR	1073785556	\$ 377,800	\$ 93,600	\$ -	\$ -	icia Remunerada03/06/2025 al 09/06/2025						
111	PRADA VELASQUEZ HERNAN DARIO		1078369090	AYUDANTE GENERAL OBRA	\$ 1,423,500	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 1,438,972	\$ 100,200	V	NUEVA EPS S.A.	1073785556	\$ 57,600	COLPENSIONE	1073785556	\$ 230,300	\$ 57,600	\$ -	\$ -							
112	NARVAEZ GARCIA ANA CASIMIRA		1085225826	RESIDENTE JURIDICO PREDIAL	\$ 6,000,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 6,000,000	\$ 417,600	V	SALUD TOTAL EPS	1073785556	\$ 240,000	PORVENIR	1073785556	\$ 960,000	\$ 240,000	\$ -	\$ -							
113	BELTRAN DUARTE OSCAR IVAN		1090368350	AYUDANTE CONTROLADOR TRANSITO	\$ 1,423,500	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 1,969,073	\$ 137,100	V	EPS SURA	1073785556	\$ 78,800	PORVENIR	1073785556	\$ 315,100	\$ 78,800	\$ -	\$ -							
114	LAMUS GOMEZ LUIS LEONARDO		1095934443	MAESTRO OBRA	\$ 2,800,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 3,058,696	\$ 212,900	V	NUEVA EPS S.A.	1073785556	\$ 122,400	PORVENIR	1073785556	\$ 489,400	\$ 122,400	\$ -	\$ -							
115	CASTILLO GOMEZ SERGIO ALEXANDER		1098610928	COORDINADOR DISEÑOS	\$ 8,000,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	VAC	VAC	VAC	VAC	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 8,000,001	\$ 482,600	V	EPS SURA	1073785556	\$ 320,100	PORVENIR	1073785556	\$ 1,280,100	\$ 320,100	\$ -	\$ -	Vacaciones 24/06/2025 al 27/06/2025						
116	VARGAS CARREÑO MARIA LORENA		1098797292	RESIDENTE CALIDAD MATERIALES	\$ 4,000,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	LR	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 4,043,479	\$ 272,200	V	EPS SANITAS	1073785556	\$ 161,900	COLPENSIONE	1073785556	\$ 647,100	\$ 161,900	\$ -	\$ -	Licencia Remunerada11/06/2025						
117	TORRES GALVAN TOMAS VIDAL		1099960224	OPERADOR EXTENDEDORA CONCRETO SP 15	\$ 2,600,000	D	F	INC	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	VAC	VAC	VAC	VAC	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,712,410	\$ 160,700	V	SALUD TOTAL EPS	1073785556	\$ 108,700	PORVENIR	1073785556	\$ 434,100	\$ 106,300	\$ -	\$ -	Remunerada menor o igual 90 días 03/06/2025 Vacaciones 24/06/2025 al 27/06/2025						
118	ALCAZAR DIAZ MAURIS		1101453229	AYUDANTE FINISHER	\$ 1,500,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,229,782	\$ 155,200	V	SALUD TOTAL EPS	1073785556	\$ 89,200	PORVENIR	1073785556	\$ 356,800	\$ 89,200	\$ -	\$ -							
119	MARTINEZ PINTO DAVID ANDRES		1104070710	RESIDENTE TECNICO PREDIAL	\$ 5,500,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 5,500,000	\$ 382,800	V	NUEVA EPS S.A.	1073785556	\$ 220,000	COLPENSIONE	1073785556	\$ 880,000	\$ 220,000	\$ -	\$ -							
120	GONZALEZ VARGAS JOSE		1104700791	AUXILIAR LABORATORIO MHC	\$ 1,800,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,685,523	\$ 187,000	V	COMPENSAR EPS	1073785556	\$ 107,500	PORVENIR	1073785556	\$ 429,700	\$ 107,500	\$ -	\$ -							
121	ORJUELA ESPEJO FRANCO DAVID		1105672175	AYUDANTE FINISHER	\$ 1,500,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	INC	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,152,807	\$ 138,600	V	EPS SANITAS	1073785556	\$ 83,500	PROTECCION	1073785556	\$ 341,900	\$ 79,700	\$ -	\$ -	EG/Ambulatoria Menor o igual 90 días25/06/2025 al 26/06/2025						
122	MAHECHA GIRALDO JEFFRY		1105785152	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 81 SOA-800	\$ 2,500,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 3,289,022	\$ 229,000	V	EPS SURA	1073785556	\$ 131,600	PORVENIR	1073785556	\$ 526,300	\$ 131,600	\$ -	\$ -							
123	VASQUEZ RODRIGUEZ NEYLA YISSETH		1105786307	ASISTENTE PREDIAL	\$ 2,800,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,800,000	\$ 194,900	V	EPS SANITAS	1073785556	\$ 112,000	COLPENSIONE	1073785556	\$ 448,000	\$ 112,000	\$ -	\$ -							
124	PINZON CAICEDO LUIS EDUARDO		1109386847	OPERADOR FINISHER DYNAPAC SD2500C 4	\$ 2,800,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 3,882,262	\$ 270,300	V	SALUD TOTAL EPS	1073785556	\$ 155,300	PORVENIR	1073785556	\$ 621,200	\$ 155,300	\$ -	\$ -							
125	SIERRA ORDUZ MIGUEL ANGEL		1116871736	OPERADOR FRESADORA WIRTGEN 2100 DC N 2	\$ 3,000,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 3,821,739	\$ 266,000	V	COMPENSAR EPS	1073785556	\$ 152,900	PORVENIR	1073785556	\$ 611,500	\$ 152,900	\$ -	\$ -							
126	ZAMORA SUAREZ ANGIE CAROLINA		1233899380	AUXILIAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$ 2,100,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,100,000	\$ 146,200	V	NUEVA EPS S.A.	1073785556	\$ 84,000	PORVENIR	1073785556	\$ 336,000	\$ 84,000	\$ -	\$ -							
127	AGUILAR ROJAS OLGA YADIRA		35423836	INSPECTOR SST	\$ 2,200,000	RET	F					S	D						S	D					S	D							S	D	F	YRM INGENIEROS S.A.S	\$2,200,000	\$ 40,900	V	SURA EPS	9487693316	\$ 23,500	COLFONDOS	9487693316	\$ 93,900	\$ 23,500	\$ -	\$ -	Retiro por traslado 01/06/2025 Fecha de pago 21/07/2025						
128	CERVANTES VARGAS JESUS ALBERTO		1042351213	MAESTRO DE OBRA	\$ 1,423,500	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	F	YRM INGENIEROS S.A.S	\$1,423,500	\$ 99,100	V	NUEVA EPS	9487693316	\$ 57,000	PORVENIR	9457693316	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -	Fecha de pago 21/07/2025							
129	GUTIERREZ MARTINEZ JESUS MIGUEL		1010146394	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1,423,500	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X</																																					

CAJAL INVS		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS																														CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-6															
		PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE																														VERSIÓN		1															
		MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA																														PÁGINA																	
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																																																	
																																								FECHA		04/07/2025 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA																													
CONTRATO DE OBRA No: 989-2021																				CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063																													
																				MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 1																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Jun-25																				PROYECTO: CONSORCIO ICEACSA TPF																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021																				INTERVENTOR: COLSUBSIDIO																													
NOMBRE ARL: SURA																				NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO																													
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	1. SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF		
136	ALVEAR CALDERON JESUS ANDRES	1005776321	VIGILANTE	\$ 1,423,500	X	X	X		X		X	X	X		X		X	S	D		X		X		X	X	X		X		X	X	X	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	\$ 1,823,500	\$ 127,000	V	NUEVA EPS	1073026895	\$ 73,000	PORVENIR	1073026895	\$ 291,800	\$ 73,000	\$ -	\$ -	Fecha de pago 22/07/2025		
137	DÍAZ ROMERO REINALDO	72176528	VIGILANTE	\$ 1,423,500	X	X	X		X		X	X	X		X		X	S	D		X		X		X	X	X		X		INC	INC	INC	X	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	\$ 1,823,500	\$ 127,000	V	COMPENSAR EPS	1073026895	\$ 73,000	COLPENSIONES	1073026895	\$ 291,800	\$ 73,000	\$ -	\$ -	Incapacidad 27/06/2025 al 29/06/2025 Fecha de pago 22/07/2025	
138	SIEMPIRA AMADO HECTOR WILMAN	80854212	VIGILANTE	\$ 1,423,500		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	\$ 1,823,500	\$ 127,000	V	FAMISANAR EPS	1073026895	\$ 73,000	PROTECCION	1073026895	\$ 291,800	\$ 73,000	\$ -	\$ -	Fecha de pago 22/07/2025	
139	RIASCOS SINISTERRA JHON EDINSON	1007795935	VIGILANTE	\$ 1,423,500	X	X		X		X	X	X	X		X		X	X	X		X		X	X	X		X		X	X	X	X	X	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	\$ 1,823,500	\$ 127,000	V	NUEVA EPS	1073026895	\$ 73,000	PORVENIR	1073026895	\$ 291,800	\$ 73,000	\$ -	\$ -	Fecha de pago 22/07/2025		
140	MONTAÑO CORTES JOSE CRISTOBAL	79166821	VIGILANTE	\$ 1,423,500	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	\$ 1,043,900	\$ 72,700	V	NUEVA EPS	1073026895	\$ 41,800	COLPENSIONES	1073026895	\$ 167,100	\$ 41,800	\$ -	\$ -	Fecha de pago 22/07/2025		
141	PARDO BARRERA FABIAN ERNESTO	1099212188	VIGILANTE	\$ 1,423,500	X	X		X	X		X		X	X			X		X			X	X		X		X		X		X		X	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	\$ 1,043,900	\$ 72,700	V	NUEVA EPS	1073026895	\$ 41,800	PORVENIR	1073026895	\$ 167,100	\$ 41,800	\$ -	\$ -	Fecha de pago 22/07/2025		
142	GOMEZ CORTES BIBIAN MAURICIO	7318256	VIGILANTE	\$ 1,423,500		X	X			X		X			X	X		X		X		X		X	X	X	X		X		X		X	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	\$ 1,043,900	\$ 72,700	V	NUEVA EPS	1073026895	\$ 41,800	PROTECCION	1073026895	\$ 167,100	\$ 41,800	\$ -	\$ -	Fecha de pago 22/07/2025		
143	PRADA JOSE MAURICIO	80541432	VIGILANTE	\$ 1,423,500	X	X		X		X	X	X		X		X	X	X		X		X		X	X	X	X		X		X	X	X	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	\$ 1,043,900	\$ 72,700	V	SANITAS EPS	1073026895	\$ 41,800	COLPENSIONES	1073026895	\$ 167,100	\$ 41,800	\$ -	\$ -	Fecha de pago 22/07/2025		
144	RODRIGUEZ VILLAMIL DIEGO ALEXANDER	1007401897	VIGILANTE	\$ 1,423,500			ING		X		X	X		X		X	X	X		X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	\$ 1,043,900	\$ 72,700	V	SANITAS EPS	Afiliaciones	\$ 41,800	PORVENIR	Afiliaciones	\$ 167,100	\$ 41,800	\$ -	\$ -	Ingreso 03/06/2025 Fecha de pago 22/07/2025		
145	LOPEZ CANEDO KEINER DAVID	1082491197	VIGILANTE	\$ 1,423,500																							ING		X		X	X	X	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	\$ 1,043,900	\$ 72,700	V	SANITAS EPS	Afiliaciones	\$ 41,800	PORVENIR	Afiliaciones	\$ 167,100	\$ 41,800	\$ -	\$ -	Ingreso 26/06/2025 Fecha de pago 22/07/2025		
146	RODRIGUEZ CUSBA MIGUEL ANGEL	1070963839	VIGILANTE	\$ 1,423,500	X	X	X		X		X	X	X		X		X		X		X		X	X	X		X		X	X	X	X	X	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	\$ 1,856,500	\$ 129,300	V	FAMISANAR EPS	1073026895	\$ 129,300	PORVENIR	1073026895	\$ 297,100	\$ 129,300	\$ -	\$ -	Permiso no remunerado 14/06/2025 Fecha de pago 22/07/2025		
147	RUBEN DARIO RODRIGUEZ CASTILLO	1075681994	VIGILANTE	\$ 1,423,500	X	X		X	X			X	X	X		X		X	X	X		X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	\$ 1,856,500	\$ 129,300	V	SURA EPS	1073026895	\$ 129,300	PORVENIR	1073026895	\$ 297,100	\$ 129,300	\$ -	\$ -	Fecha de pago 22/07/2025	
148	JOJOA MAYA EMIR ANDRES	1069099603	SUPERVISOR	\$ 1,423,500		X		X		X	X	X		X		X	X	X		X		X	X	X		X		X		X	X	X	X	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	\$ 1,361,433	\$ 94,800	V	FAMISANAR EPS	1073026895	\$ 54,500	PROTECCION	1073026895	\$ 217,900	\$ 54,500	\$ -	\$ -	Inasistencia 01/06/2025 Fecha de pago 22/07/2025		
149	GUZMAN FLORIAN HUBERT YESID	1050457497	SUPERVISOR	\$ 1,423,500	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	\$ 1,856,500	\$ 129,300	V	FAMISANAR EPS	1073026496	\$ 129,300	COLPENSIONES	1073026895	\$ 297,100	\$ 129,300	\$ -	\$ -	Fecha de pago 22/07/2025		
150	LOZANO BETANCOURT ELIBERTO	93451084	SUPERVISOR	\$ 1,423,500						X	X	D				X	X							X	X				X	X				SEGURIDAD ARMY VIG LTDA	\$ 1,856,500	\$ 129,300	V	NUEVA EPS	1073026496	\$ 129,300	COLFONDOS	1073026895	\$ 297,100	\$ 129,300	\$ -	\$ -	Fecha de pago 22/07/2025		
151	CARRILLO JOSE GONZALO*	2989413	CONDUCTOR	\$ 1,423,500	D		X	X			S	D					S	D			X	X	S	D		X					S	D	F	CONSTRUCCIONES DYG/JOSE GONZALO CARRILLO	\$ 1,423,500	\$ 62,000	V	NUEVA EPS	9487899989	\$ 178,000	COLPENSIONES	9487899989	\$ 227,800	\$ -	\$ -	\$ -			
152	SANCHEZ VILLAMIL USMAN FIOBAN*	1075672239	CONDUCTOR	\$ 1,423,500	D		X	X	RET		S	D					S	D						S	D						S	D	F	CONSTRUCCIONES DYG/ USMAN FIOBAN SANCHEZ VILLAMIL	\$ 1,423,500	\$ 62,000	IV	SURA EPS	87190801	\$ 178,000	PROTECCION	87190801	\$ 227,800	\$ -	\$ -	\$ -	Retiro por traslado 05/06/2025		
153	CARRILLO GRANDE IVAN ANDRES	1077340189	CONDUCTOR	\$ 1,423,500	D		X	X			S	D					S	D			X	X	S	D		X				S	D	F	CONSTRUCCIONES DYG/TRANSCARBONES	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	NUEVA EPS	9488527451	\$ 57,000	COLPENSIONES	9488527451	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -				
154	ORTIZ MAURICIO ANDRES	80544027	CONDUCTOR	\$ 1,423,500	RET						S	D					S	D						S	D					S	D	F	MAVITOURS	\$ 1,423,500	\$ 57,012	IV	SALUD TOTAL	78928327	\$ 57,012	PORVENIR	78928327	\$ 208,000	\$ 57,012	\$ -	\$ -	Retiro 01/06/2025			
155	JOYA BARRERO WILSON ESTIVEN	1023962411	INSPECTOR SGI	\$ 2,500,000	D	F				X	S	D					S	D						S	D			RET			S	D	F	EHU INGENIERIA S.A.S	\$ 2,333,334	\$ 162,400	V	SURA EPS	1073074877	\$ 93,333	PORVENIR	1073074877	\$ 373,333	\$ 93,333	\$ -	\$ -	Retiro 25/06/2025 Fecha de pago 11/07/2025		
156	CABEZAS GUTIÉRREZ ANDERSSON	1033735991	TÉCNICO ELECTRICISTA	\$ 2,000,000	D	F				X	S	D					S	D						S	D					S	D	F	EHU INGENIERIA S.A.S	\$ 2,000,000	\$ 139,200	V	COMPENSAR EPS	1073074877	\$ 80,000	PROTECCION	1073074877	\$ 320,000	\$ 80,000	\$ -	\$ -	Fecha de pago 11/07/2025			
157	PEREZ MORENO L																																																

CAJAD INVS		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS																							CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																									PÁGINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																							FECHA		04/07/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE																							DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CONTRATO DE OBRA No: 989-2021																							CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CONSORCIO ICEACSA TPF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Jun-25																							PROYECTO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021																							INTERVENTOR:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NOMBRE ARL: SURA																							NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	1. SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

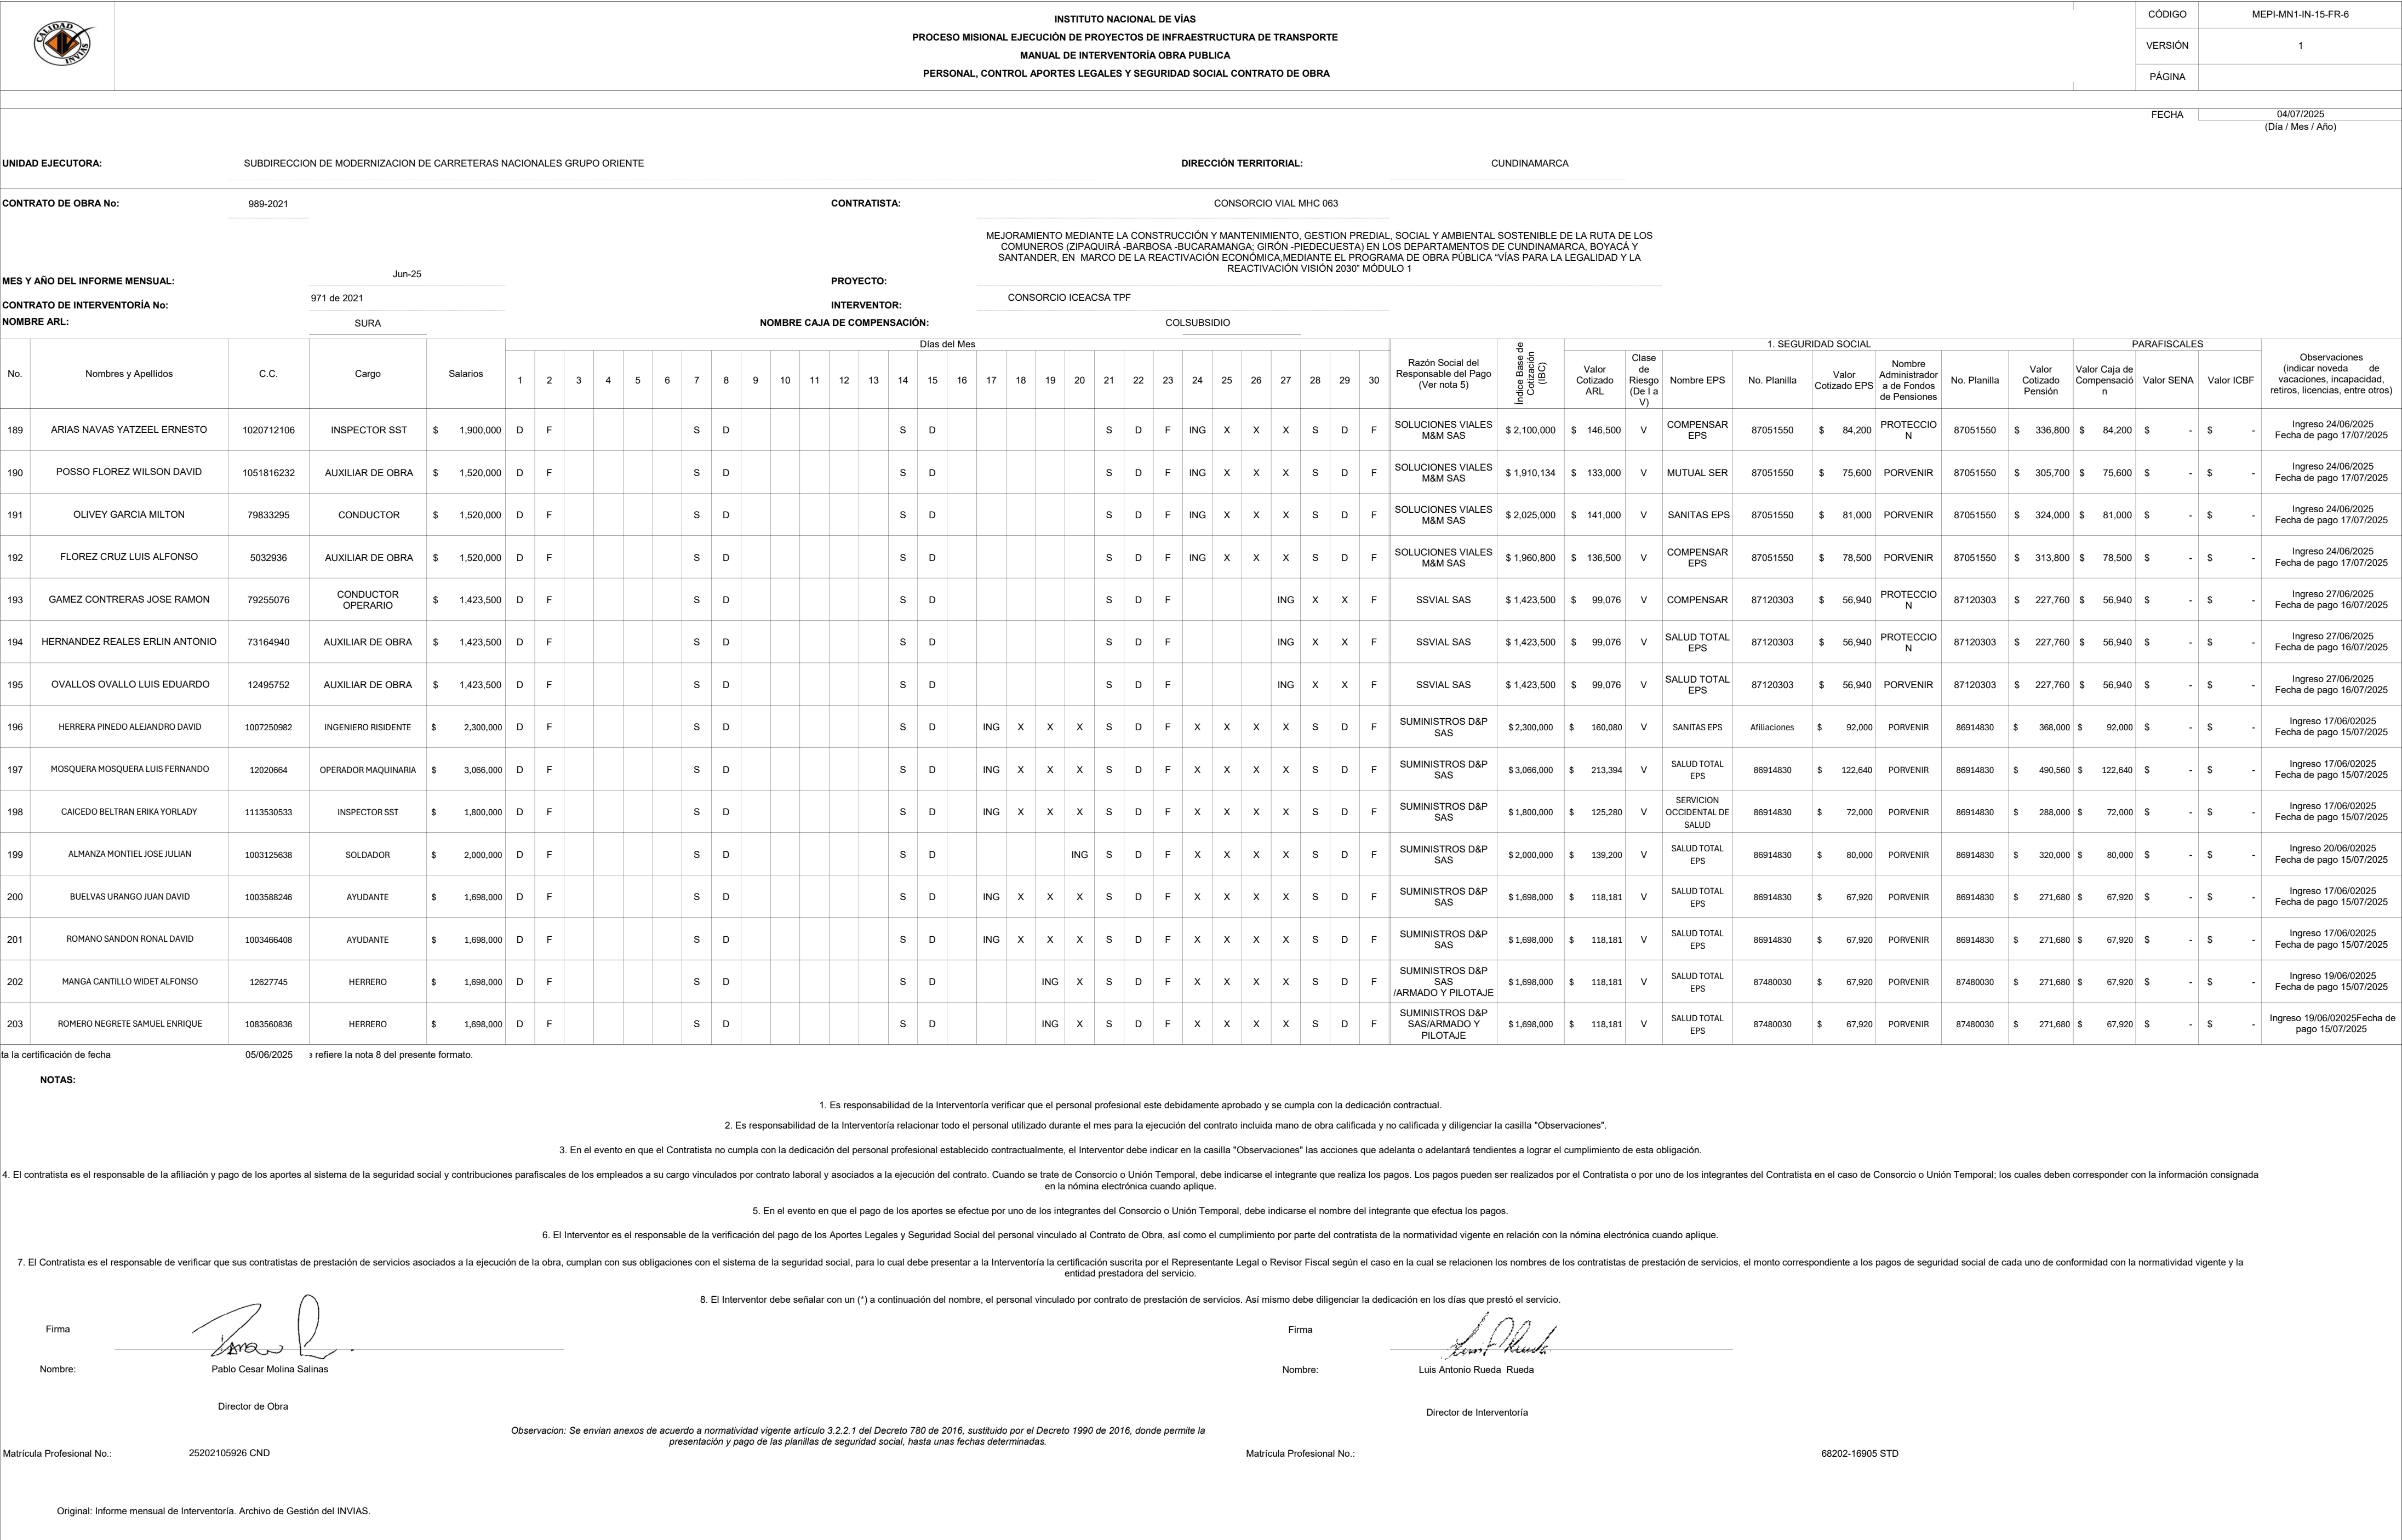

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 49 INVIAS-IM – 0971-2021 JUNIO DE 2025	

Anexo No 4.

MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Informe financiero

CAJAL INVS		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS																						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE																						VERSIÓN	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA																						PÁGINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																						FECHA		04/07/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL:										CUNDINAMARCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CONTRATO DE OBRA No:		989-2021										CONTRATISTA:										CONSORCIO VIAL MHC 063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		Jun-25										PROYECTO:										MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		971 de 2021										INTERVENTOR:										CONSORCIO ICEACSA TPF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NOMBRE ARL:		SURA										NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:										COLSUBSIDIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	1. SEGURIDAD SOCIAL				PARAFISCALES				Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

CALIDAD INVS		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				VERSIÓN	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				PÁGINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				FECHA	04/07/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CUNDINAMARCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CONTRATO DE OBRA No:		989-2021		CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAL MHC 063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		Jun-25		PROYECTO:		MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		971 de 2021		INTERVENTOR:		CONSORCIO ICEACSA TPF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NOMBRE ARL:		SURA		NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:		COLSUBSIDIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	1. SEGURIDAD SOCIAL				PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6																							
																								VERSIÓN	1																							
																								PÁGINA																								
																																															FECHA	04/07/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE																		DIRECCIÓN TERRITORIAL:			CUNDINAMARCA																									
CONTRATO DE OBRA No:		989-2021																		CONTRATISTA:			CONSORCIO VIAL MHC 063																									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		Jun-25																		PROYECTO:			MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 1																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		971 de 2021																		INTERVENTOR:			CONSORCIO ICEACSA TPF																									
NOMBRE ARL:		SURA																		NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:			COLSUBSIDIO																									
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	1. SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
55	GARCIA SIERRA LUIS ALFONSO	80548125	AYUDANTE VIGILANCIA	\$ 1,423,500	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 1,802,585	\$ 125,500	V	FAMISANAR EPS	1073785556	\$ 72,200	PORVENIR	1073785556	\$ 288,500	\$ 72,200	\$ -	\$ -	
56	RIAÑOS GUZMAN FREDY GIOVANI	80758274	AYUDANTE TOPOGRAFIA	\$ 1,423,500	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 1,702,011	\$ 118,500	V	SALUD TOTAL EPS	1073785556	\$ 68,100	PORVENIR	1073785556	\$ 272,400	\$ 68,100	\$ -	\$ -	
57	PINZON MIRANDA LUIS EZEQUIEL	81720239	OPERADOR AUTOHORMIGONERO DIECI 12	\$ 2,400,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,726,087	\$ 189,800	V	COMPENSAR EPS	1073785556	\$ 109,100	PORVENIR	1073785556	\$ 436,200	\$ 109,100	\$ -	\$ -	
58	SUAZA CASTRO JULIO ESNEYDER	83090711	MECANICO	\$ 2,700,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 3,316,303	\$ 230,900	V	EPS SANITAS	1073785556	\$ 132,700	PROTECCION	1073785556	\$ 530,700	\$ 132,700	\$ -	\$ -	
59	CUADROS ALMEIDA JHON JAIRO	91510564	OPERADOR CARGADOR HYUNDAI HL740 60	\$ 3,200,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 3,200,000	\$ 222,800	V	FAMISANAR EPS	1073785556	\$ 128,000	PORVENIR	1073785556	\$ 512,000	\$ 128,000	\$ -	\$ -	
60	TINOCO ANGEL CARLOS AUGUSTO	93340776	CONDUCTOR 2.TROQ. MACK 80 FSC-557	\$ 2,500,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	RET							MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,288,913	\$ 159,400	V	SALUD TOTAL EPS	1073785556	\$ 91,600	COLPENSIONE	1073785556	\$ 366,300	\$ 144,100	\$ -	\$ -	Retiro 24/06/2025
61	ZAMORA MORA WILSON	93363609	DIRECTOR DE TOPOGRAFIA DE CAMPO	\$ 8,800,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 8,800,001	\$ 530,900	V	NUEVA EPS S.A.	1073785556	\$ 352,100	COLPENSIONE	1073785556	\$ 1,408,100	\$ 352,100	\$ -	\$ -	
62	ALVAREZ VIVAS DIEGO MAURICIO	94482582	OPERADOR MOTO CAT 14G 33	\$ 3,600,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 4,069,565	\$ 283,300	V	NUEVA EPS S.A.	1073785556	\$ 162,800	COLPENSIONE	1073785556	\$ 651,200	\$ 162,800	\$ -	\$ -	
63	PEREZ LABIOSA ANDRES FERNANDO	1002093749	OPERADOR TRACTOR FORD 5000	\$ 1,900,000	LP	F	LP	LP	LP	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 1,917,211	\$ 88,200	V	NUEVA EPS S.A.	1073785556	\$ 76,800	PORVENIR	1073785556	\$ 306,800	\$ 63,400	\$ -	\$ -	Licencia de Paternidad01/06/2025 al 05/06/2025 Vacaciones 06/06/2025 al
64	VIANA LARA DEIBIS JOSE	1002326435	AYUDANTE FINISHER	\$ 1,423,500	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,088,832	\$ 145,400	V	EPS SURA	1073785556	\$ 83,600	COLFONDOS	1073785556	\$ 334,300	\$ 83,600	\$ -	\$ -	
65	GOMEZ PELAYO JUAN DANIEL	1002548316	AYUDANTE GENERAL OBRA	\$ 1,423,500	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 1,477,655	\$ 102,900	V	NUEVA EPS S.A. CM	1073785556	\$ 59,200	PORVENIR	1073785556	\$ 236,500	\$ 59,200	\$ -	\$ -	
66	CALDERON MONTES SANTIAGO	1003882515	CADENERO SEGUNDO	\$ 1,900,000	D	F	X	X	X	X	S	D	INC	INC	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 1,868,234	\$ 119,100	V	EPS SURA	1073785556	\$ 72,200	COLPENSIONE	1073785556	\$ 296,500	\$ 68,400	\$ -	\$ -	EG/Ambulatoria Menor o igual 90 días 09/06/2025 EG/Ambulatoria Menor o igual 90 días 10/06/2025
67	TORRES GALVAN CHRISTYAN DAVID	1005387314	AYUDANTE EXTENDEDORA CONCRETO	\$ 1,500,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	VAC	VAC	VAC	VAC	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 1,704,891	\$ 104,700	V	NUEVA EPS S.A.	1073785556	\$ 68,300	PROTECCION	1073785556	\$ 272,900	\$ 68,200	\$ -	\$ -	Vacaciones 24/06/2025 al 27/06/2025
68	BOLAÑO CARRANZA STENVENSON JOSE	1007162360	AYUDANTE EXTENDEDORA CONCRETO	\$ 1,500,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 1,795,109	\$ 125,000	V	SALUD TOTAL EPS	1073785556	\$ 71,900	PORVENIR	1073785556	\$ 287,300	\$ 71,900	\$ -	\$ -	
69	CHAVES ANGARITA DIEGO ALEXANDER	1007341923	AYUDANTE CONTROLADOR TRANSITO	\$ 1,423,500	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 1,907,800	\$ 132,800	V	FAMISANAR EPS	1073785556	\$ 76,400	PORVENIR	1073785556	\$ 305,300	\$ 76,400	\$ -	\$ -	
70	MANJARREZ TRIANA DIEGO ALEJANDRO	1007534795	TORNILLERO EXTENDEDORA ASFALTO	\$ 2,100,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 3,110,283	\$ 216,500	V	EPS SANITAS	1073785556	\$ 124,500	PORVENIR	1073785556	\$ 497,700	\$ 124,500	\$ -	\$ -	
71	BOLAÑO CARRANZA DANIEL DAVID	1007833311	AYUDANTE EXTENDEDORA CONCRETO	\$ 1,500,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 1,922,282	\$ 133,800	V	NUEVA EPS S.A.	1073785556	\$ 76,900	PORVENIR	1073785556	\$ 307,600	\$ 76,900	\$ -	\$ -	
72	RIOS ALFONSO JOHAN NICOLAS	1007861118	GESTOR ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS OBRA	\$ 2,000,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,000,000	\$ 139,200	V	EPS SANITAS	1073785556	\$ 80,000	COLPENSIONE	1073785556	\$ 320,000	\$ 80,000	\$ -	\$ -	
73	VALLEJO TICORA GERMAN ANDRES	1010242603	ARQUEOLOGO	\$ 3,500,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	RET																				MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 1,400,000	\$ 97,500	V	EPS SANITAS	1073785556	\$ 56,000	COLFONDOS	1073785556	\$ 224,000	\$ 92,200	\$ -	\$ -	Retiro 11/06/2025
74	GUERRERO OCAMPO DUBAN FERNANDO	1012347107	OPERADOR BULLDOZER CAT D6N 23	\$ 2,500,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,684,782	\$ 186,900	V	FAMISANAR EPS	1073785556	\$ 107,400	PORVENIR	1073785556	\$ 429,600	\$ 107,400	\$ -	\$ -	
75	HUERTAS SANCHEZ JUAN GABRIEL	1012351697	OFICIAL EXTENDEDORA CONCRETO	\$ 2,300,000	D	F	X	X	LR	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,425,418	\$ 163,500	V	COMPENSAR EPS	10								

CALIDAD INVS		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS																												CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-6																		
		PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE																												VERSIÓN		1																		
		MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA																												PÁGINA																				
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																																																		
																														FECHA		04/07/2025 (Día / Mes / Año)																		
UNIDAD EJECUTORA:										SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL:										CUNDINAMARCA																				
CONTRATO DE OBRA No:										989-2021										CONTRATISTA:										CONSORCIO VIAL MHC 063																				
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:										Jun-25										PROYECTO:										MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 1																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:										971 de 2021										INTERVENTOR:										CONSORCIO ICEACSA TPF																				
NOMBRE ARL:										SURA										NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:										COLSUBSIDIO																				
No.	Nombres y Apellidos		C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	1. SEGURIDAD SOCIAL				PARAFISCALES				Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF			
82	MORALES MORENO JAVIER ANDRES	1049630363	OPERADOR CILINDRO	\$ 2,600,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,780,869	\$ 193,600	V	EPS SANITAS	1073785556	\$ 111,300	PORVENIR	1073785556	\$ 445,000	\$ 111,300	\$ -	\$ -		
83	GALVEZ VERGARA YOMARA	1054988888	RESIDENTE TECNICO PREDIAL	\$ 5,500,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 5,500,000	\$ 382,800	V	EPS SURA	1073785556	\$ 220,000	PORVENIR	1073785556	\$ 880,000	\$ 220,000	\$ -	\$ -		
84	LARGO HERNEY	1054994349	AYUDANTE EXTENDEDORA CONCRETO	\$ 1,500,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 1,597,826	\$ 111,300	V	SALUD TOTAL EPS	1073785556	\$ 64,000	PORVENIR	1073785556	\$ 255,700	\$ 64,000	\$ -	\$ -		
85	VEGA SUAREZ EDWIN JAVIER	1057581418	INSPECTOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$ 3,300,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	RET				MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 4,860,087	\$ 338,300	V	EPS SANITAS	1073785556	\$ 194,500	COLPENSIONE	1073785556	\$ 777,700	\$ 217,900	\$ -	\$ -	Retiro 27/06/2025	
86	MORA CEPEDA PAULA DANIELA	1057607448	ASISTENTE TALENTO HUMANO OBRA	\$ 2,500,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,500,000	\$ 174,000	V	NUEVA EPS S.A. CM	1073785556	\$ 100,000	PORVENIR	1073785556	\$ 400,000	\$ 100,000	\$ -	\$ -		
87	ZABALA BERROCAL OSCAR DARIO	1067859959	OFICIAL EXTENDEDORA CONCRETO	\$ 2,600,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 3,059,348	\$ 213,000	V	NUEVA EPS S.A.	1073785556	\$ 122,400	PROTECCION	1073785556	\$ 489,500	\$ 122,400	\$ -	\$ -		
88	JIMENEZ MONTERO EDWIN DAVID	1069100434	ASISTENTE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2,500,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,564,348	\$ 178,500	V	EPS SURA	1073785556	\$ 102,600	PORVENIR	1073785556	\$ 410,300	\$ 102,600	\$ -	\$ -		
89	MOLINA NIÑO NESTOR JULIAN	1069100660	CADENERO SEGUNDO	\$ 1,900,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,245,304	\$ 156,300	V	COMPENSAR EPS	1073785556	\$ 89,900	PORVENIR	1073785556	\$ 359,300	\$ 89,900	\$ -	\$ -		
90	RAMOS ARRIETA YISETH PAOLA	1069497814	INGENIERO AUXILIAR DIRECCION	\$ 3,000,000	D	F	X	LR	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	RET				MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 3,635,877	\$ 245,300	V	NUEVA EPS S.A. CM	1073785556	\$ 145,500	PORVENIR	1073785556	\$ 581,900	\$ 222,000	\$ -	\$ -	Licencia Remunerada04/06/2025 Retiro 27/06/2025	
91	VILLAMIZAR VILLAMIZAR JOSE EVANGELISTA	1070943492	OPERADOR GRUA TELESCOPICA MERLE No 5	\$ 3,000,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 3,000,000	\$ 208,800	V	FAMISANAR EPS	1073785556	\$ 120,000	COLPENSIONE	1073785556	\$ 480,000	\$ 120,000	\$ -	\$ -		
92	PRIETO PRIETO JORGE ENRIQUE	1070947420	GUITARRERO	\$ 1,900,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,798,370	\$ 194,800	V	FAMISANAR EPS	1073785556	\$ 112,000	PORVENIR	1073785556	\$ 447,800	\$ 112,000	\$ -	\$ -	
93	RINCON BACHILLER JUAN CARLOS	1070951879	OPERADOR RETRO EXC. KOBELCO SK 350 5	\$ 4,100,000	D	F	X	X	X	X	S	D	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 4,414,185	\$ 256,500	V	FAMISANAR EPS	1073785556	\$ 176,700	COLPENSIONE	1073785556	\$ 706,400	\$ 174,800	\$ -	\$ -	Vacaciones09/06/2025 al 13/06/2025	
94	BARBOSA CANACUE WEHIMAR	1070959621	OPERADOR FRESADORA WIRTGEN 2100 DC 3	\$ 3,400,000	D	F	RET																												MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 1,010,145	\$ 70,400	V	FAMISANAR EPS	1073785556	\$ 40,500	PROTECCION	1073785556	\$ 161,700	\$ 100,300	\$ -	\$ -	Retiro 03/06/2025		
95	CAMELO SEGURA YOHAN ALDEMAR	1072447725	OPERADOR CILINDRO HAMM HD 75K 23	\$ 2,500,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 3,601,631	\$ 250,700	V	NUEVA EPS S.A.	1073785556	\$ 144,100	PORVENIR	1073785556	\$ 576,300	\$ 144,100	\$ -	\$ -		
96	BENITEZ OTALORA KEVIN SEBASTIAN	1072673962	ASISTENTE SOCIAL	\$ 1,800,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 1,800,000	\$ 125,300	V	NUEVA EPS S.A.	1073785556	\$ 72,000	PORVENIR	1073785556	\$ 288,000	\$ 72,000	\$ -	\$ -	
97	GAITAN GARCIA CESAR ANDRES	1073679242	CONDUCTOR 2.TROQ. MACK 77 FCG-561	\$ 3,200,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 3,986,087	\$ 277,500	V	COMPENSAR EPS	1073785556	\$ 159,500	PORVENIR	1073785556	\$ 637,800	\$ 159,500	\$ -	\$ -	
98	GONZALEZ ZABALA YEISON HUMBERTO	1074187540	OPERADOR TRIT./CLAS. ASTEC 2612	\$ 3,000,000												ING	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 3,309,783	\$ 144,000	IV	FAMISANAR EPS	1073785556	\$ 132,400	COLPENSIONE	1073785556	\$ 529,600	\$ 132,400	\$ -	\$ -	Ingreso 11/06/2025	
99	RAMIREZ OCHOA CARLOS FERNANDO	1075664068	CADENERO PRIMERO INSPECTOR	\$ 2,600,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 2,600,000	\$ 181,000	V	EPS SURA	1073785556	\$ 104,000	PORVENIR	1073785556	\$ 416,000	\$ 104,000	\$ -	\$ -	
100	GARCIA PINILLA PITER CAMILO	1075664381	RESIDENTE CONTROL OBRA	\$ 6,000,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	LR	X	X	X	S	D	F	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 6,000,000	\$ 403,700	V	EPS SANITAS	1073785556	\$ 240,000	PORVENIR	1073785556	\$ 960,000	\$ 240,000	\$ -	\$ -	Licencia Remunerada24/06/2025	
101	NOVA HERNANDEZ NORVI STEFANY	1075670213	ASISTENTE SOCIAL	\$ 1,800,000	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	X	S	D	D	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	RET				MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	\$ 1,740,000	\$ 121,200	V	EPS SANITAS	1073785556	\$ 69,600	PORVENIR	1073785556	\$ 278,400	\$ 98,700	\$ -	\$ -	Retiro 27/06/2025	
102	JULIO RAMOS JEISON ENRIQUE	1075670406	AYUDANTE CONTROLADOR TRANSITO	\$ 1,423,500	D	F</																																												

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA															CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																	VERSIÓN		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																	PÁGINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																	FECHA		04/07/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE															DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CUNDINAMARCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CONTRATO DE OBRA No:		989-2021															CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAL MHC 063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		Jun-25															PROYECTO:		MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		971 de 2021															INTERVENTOR:		CONSORCIO ICEACSA TPF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
NOMBRE ARL:		SURA															NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:		COLSUBSIDIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	1. SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES		Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

CAJAL INVS		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS															PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE															MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA															PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA															CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																														VERSIÓN	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																														PÁGINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																											FECHA	04/07/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
UNIDAD EJECUTORA:															SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE															DIRECCIÓN TERRITORIAL:															CUNDINAMARCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CONTRATO DE OBRA No:															989-2021															CONTRATISTA:															CONSORCIO VIAL MHC 063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:															Jun-25															PROYECTO:															MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:															971 de 2021															INTERVENTOR:															CONSORCIO ICEACSA TPF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
NOMBRE ARL:															SURA															NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:															COLSUBSIDIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA															CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-6																														
																VERSIÓN		1																														
																PÁGINA																																
																	FECHA		04/07/2025 (Día / Mes / Año)																													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE																	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA																															
CONTRATO DE OBRA No: 989-2021																	CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063																															
																	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 1																															
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Jun-25																	PROYECTO: CONSORCIO ICEACSA TPF																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021																	INTERVENTOR: COLSUBSIDIO																															
NOMBRE ARL: SURA																	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:																															
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	1. SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedad de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF		
163	NEME ALDANA HECTOR LAURIANO	3119010	CONDUCTOR	\$ 1,623,500	D	F	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	F	AMERICAN TOUR SAS	\$ 1,423,500	\$ 62,000	IV	COMPENSAR EPS	9487144561	\$ 57,000	PROTECCION	9487144561	\$ 57,000	\$ 57,000	\$ -	\$ -	Fecha de pago 22/07/2025
164	INFANTE RODRIGUEZ LUIS ANGEL	19355111	CONDUCTOR	\$ 1,352,917	D	F				ING	S	D	X	X	X	X	X	S	D	X	X	X	X	X	S	D	F	X	X	X	X	S	D	F	AMERICAN TOUR SAS	\$ 1,352,917	\$ 59,000	IV	COMPENSAR EPS	Afilaciones	\$ 54,200	PROTECCION	Afilaciones	\$ 54,200	\$ 54,200	\$ -	\$ -	Fecha de pago 22/07/2025 Ingreso 06/06/2025
165	RAMIREZ GALINDO JOSE FERNEY	1055247079	OPERARIO	\$ 1,423,500	D	F					S	D						S	D					S	D	F					S	D	F	VYS COMERCIAL SAS/JO SEÑALIZAR	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	SALUD TOTAL	1073384509	\$ 57,000	PROTECCION	1073384509	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -	Fecha de pago 21/07/2025	
166	SALDAÑA GALINDO JOSE HENRY	80745594	OPERARIO	\$ 1,423,500	D	F					S	D						S	D					S	D	F					S	D	F	VYS COMERCIAL SAS/JO SEÑALIZAR	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	SALUD TOTAL	1073384509	\$ 57,000	COLFONDOS	1073384509	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -	Fecha de pago 21/07/2025	
167	ORTEGÓN FERRO JULIO MOISES	7307743	SUPERVISOR	\$ 5,000,000	D	F					S	D						S	D					S	D	F					S	D	F	VYS COMERCIAL SAS /JO SEÑALIZAR	\$ 5,000,000	\$ 348,000	V	FAMISANAR EPS	1073384509	\$ 200,000	COLPENSIONES	1073384509	\$ 800,000	\$ 200,000	\$ -	\$ -	Fecha de pago 21/07/2025	
168	PEÑA VARGAS CARLOS ALBERTO	1033684346	OPERARIO	\$ 1,918,100	D	F					S	D						S	D					S	D	F					S	D	F	VYS COMERCIAL SAS	\$ 1,918,100	\$ 133,500	V	COMPENSAR EPS	1073798252	\$ 76,800	PORVENIR	1073798252	\$ 306,900	\$ 76,800	\$ -	\$ -		
169	CAICEDO RIAÑO PABLO ANTONIO	79566921	OPERARIO	\$ 1,584,600	D	F					S	D						S	D					S	D	F					S	D	F	VYS COMERCIAL SAS	\$ 1,584,600	\$ 110,300	V	FAMISANAR EPS	1073798252	\$ 63,400	COLFONDOS	1073798252	\$ 253,600	\$ 63,400	\$ -	\$ -		
170	SALAS SÁNCHEZ JUAN SEBASTIÁN	1014303283	OPERARIO	\$ 1,423,500	D	F					S	D						S	D					S	D	F					S	D	F	VYS COMERCIAL SAS	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	FAMISANAR EPS	1073798252	\$ 57,000	PORVENIR	1073798252	\$ 227,800	\$ 52,000	\$ -	\$ -		
171	ROSARIO VARGAS JHON HECTOR	1003359685	AYUDANTE	\$ 1,423,500	D	F					S	D						S	D					S	D	F					S	D	F	VYS COMERCIAL SAS	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	NUEVA EPS	1073798252	\$ 57,000	COLPENSIONES	1073798252	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -		
172	VARGAS BELTRAN WILMER JOHAN	1076516639	OPERARIO	\$ 1,423,500	D	F					S	D						S	D					S	D	F					S	D	F	VYS COMERCIAL SAS	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	FAMISANAR EPS	1073798252	\$ 57,000	PORVENIR	1073798252	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -		
173	TELLEZ CHAPARRO TANIA YULIETH	1000253811	AYUDANTE	\$ 1,423,500	D	F					S	D						S	D					S	D	F					S	D	F	VYS COMERCIAL SAS	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	COMPENSAR EPS	1073798252	\$ 57,000	PORVENIR	1073798252	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -		
174	BUSTOS CLAUDIA MILENA	107565890	AUXILIAR SST	\$ 1,700,000	D	F					S	D		X	X			S	D					S	D	F			X		S	D	F	VYS COMERCIAL SAS	\$ 1,700,000	\$ 118,320	V	COMPENSAR EPS	1073798252	\$ 68,000	COLPENSIONES	1073798252	\$ 272,000	\$ 68,000	\$ -	\$ -		
175	CAMPO FLORES ALEXANDER	1052573204	OPERARIO	\$ 1,423,500	D	F					S	D						S	D					S	D	F			X		S	D	F	VYS COMERCIAL SAS	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	COMPENSAR EPS	1073798252	\$ 57,000	PORVENIR	1073798252	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -		
176	MARTINEZ PEREZ ERIKC DAVID SANTIAGO	1019982143	OPERARIO	\$ 1,423,500	D	F					S	D						S	D					S	D	F			X		S	D	F	VYS COMERCIAL SAS	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	COMPENSAR EPS	1073798252	\$ 57,000	PROTECCION	1073798252	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -		
177	VILLAMIL BERNAL WILLIAM ALEJANDRO	1072650924	OPERARIO	\$ 1,423,500	D	F					S	D						S	D					S	D	F			X		S	D	F	VYS COMERCIAL SAS	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	COMPENSAR EPS	1073798252	\$ 57,000	COLPENSIONES	1073798252	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -		
178	BYRON FERNEY CAICEDO GONZALEZ	1015448389	OPERARIO	\$ 1,423,500	D	F					S	D		ING	X			S	D					S	D	F					S	D	F	VYS COMERCIAL SAS	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	FAMISANAR EPS	1073798252	\$ 57,000	PORVENIR	1073798252	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -	Ingreso 10/06/2025	
179	CESPEDES ARCILA KEVIN SANTIAGO	1073672391	OPERARIO	\$ 1,423,500	D	F					S	D		ING	X			S	D					S	D	F					S	D	F	VYS COMERCIAL SAS	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	FAMISANAR EPS	1073798252	\$ 57,000	PORVENIR	1073798252	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -	Ingreso 10/06/2025	
180	BETANCUR RENDON JEISSON OBED	80251237	OPERARIO	\$ 1,423,500	D	F					S	D		ING	X			S	D					S	D	F					S	D	F	VYS COMERCIAL SAS	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	FAMISANAR EPS	1073798252	\$ 57,000	PORVENIR	1073798252	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -	Ingreso 10/06/2025	
181	QUIROGA MORENO JOAN SEBASTIAN	1069433042	OPERARIO	\$ 1,423,500	D	F					S	D		ING	X			S	D					S	D	F					S	D	F	VYS COMERCIAL SAS	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	FAMISANAR EPS	1073798252	\$ 57,000	PORVENIR	1073798252	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -	Ingreso 10/06/2025	
182	MANZANO RAMIREZ YOVANY	79614016	DIRECTOR DE OBRAS	\$ 8,470,000	D	F					S	D						S	D					S	D	F	ING	X	X	X	S	D	F	SOLUCIONES VIALES M&M SAS	\$ 8,500,000	\$ 591,600	V	COMPENSAR EPS	87051550	\$ 340,000	PROTECCION	87051550	\$ 1,360,000	\$ 340,000	\$ -	\$ -	Ingreso 24/06/2025 Fecha de pago 17/07/2025	
183	AMAYA GONZALEZ ADRIANA PATRICIA	52839080	ING. SST	\$ 2,585,000	D	F					S	D						S	D					S	D	F	ING	X	X	X	S	D	F	SOLUCIONES VIALES M&M SAS	\$ 3,000,000	\$ 208,800	V	COMPENSAR EPS	87051550	\$ 120,000	PROTECCION	87051550	\$ 480,000	\$ 120,000	\$ -	\$ -	Ingreso 24/06/2025 Fecha de pago 17/07/2025	
184	RODRIGUEZ PALENCIA JORGE LUIS	1051739957	OPERADOR	\$ 1,800,000	D	F					S	D						S	D					S	D	F	ING	X	X	X	S	D	F	SOLUCIONES VIALES M&M SAS	\$ 1,910,574	\$ 133,000	V	MUTUAL SER	87051550	\$ 32,500	COLFONDOS	87051550	\$ 305,700	\$ 76,500	\$ -	\$ -	Ingreso 24/06/2025 Fecha de pago 17/07/2025	
185	TAPIA MERCADO JUAN CARLOS	7931882	CONDUCTOR	\$ 1,620,000	D	F					S	D						S	D					S	D	F	ING	X	X	X	S	D	F	SOLUCIONES VIALES M&M SAS	\$ 1,806,885	\$ 125,800	V	MUTUAL										

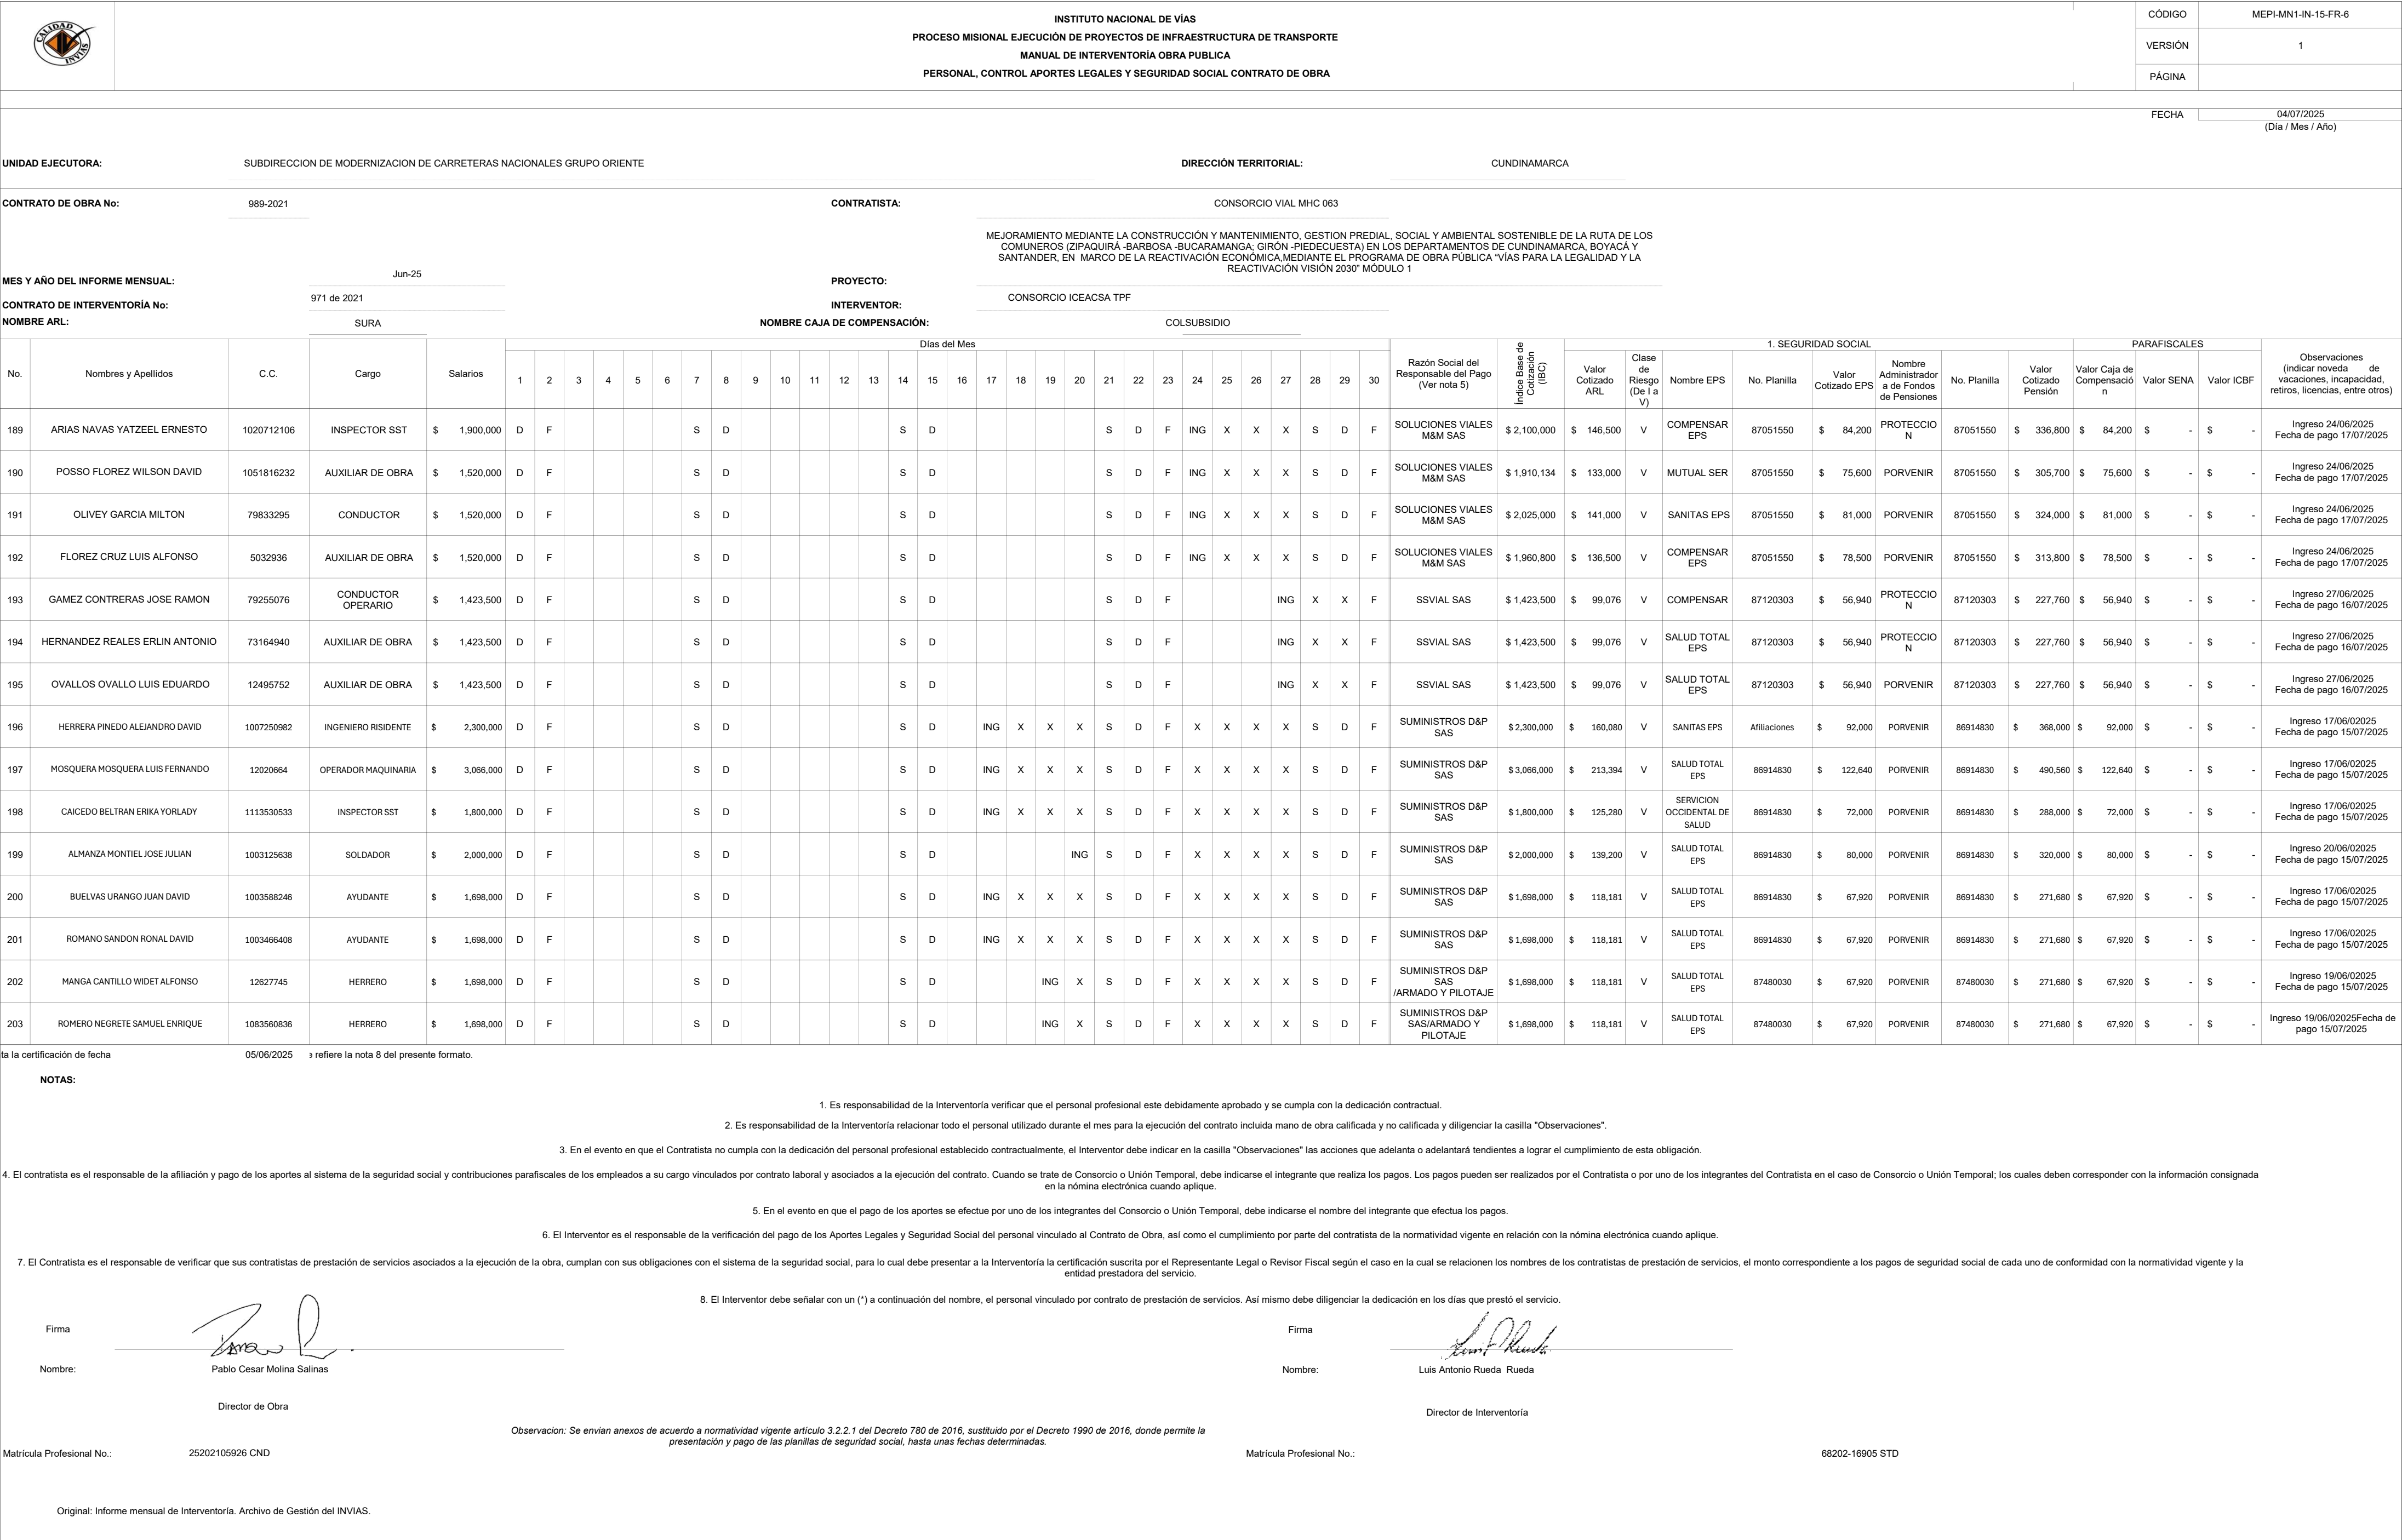

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 49 INVIAS-IM – 0971-2021 JUNIO DE 2025	

Anexo No 5.

MEPI-MN1-IN-15-FR-10 Estado general del tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	5/07/2025 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MORDERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA																													
CONTRATO DE OBRA No: 989 DE 2021			CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-25			PROYECTO: RUTA DE LOS COMUNEROS																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 DE 2021			INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA TPF																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Seco	23	22	23	24	24	24	24	22	23	22	22	24	23	24	24	23	23	24	24	24	24	24	24	24	23	24	23	23	24	24	24	703
Lluvias moderadas	1	2	1	0	0	0	0	2	1	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	14
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: Durante el mes predomina el tiempo seco, presentando 97,64% tiempo seco, 1,94% lluvias moderadas y 0,42% lluvias intensas																																
Firma LUIS FELIPE MORENO BRAVO Ing. Residente de Obra Matrícula No. : 25202-05870 CND Firma MARTHA LUCIA CORTES PULIDO Ing. Residente de Interventoría Matrícula No.: 01195-0369 CPITVC																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																
