

MUNICIPIO DE PAYA

NIT 800065411-5

Calle 3 No 3 - 45 C.P. 155330

Administración Central



Fecha: 23/02/2026

Comprobante de Egreso No. 132

C.C./NIT. : 1002734959 Beneficiario : NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
 Cta. Cte. No. : 415163015361, 35857148442
 Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - CTA MTRA 415163015361 SGP EDUCACION -
 Referencias : CDP : -1, CRP : -14, OP : 138 - CDP : -1, CRP : -14, OP : 139 - CDP : 51, CRP : 32, OP : 140
 : LIQUIDACION DE Reserva - 2025 Doc. No. 1403 - CONTRATACION MP-MC-030 DE 2025.
 (11/12/2025). CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE
 SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE
 Concepto : PAYA - BOYACA.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios	48.663.341,07	
240101	Bienes y servicios		
55010503	Mantenimiento y Adecuaciones Locativas		
111006	Cuenta de ahorro		12.610.202,00
111006	Cuenta de ahorro		36.053.139,07
Total Documento:		48.663.341,07	48.663.341,07

TOTAL : CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SIETE CENTAVOS (48.663.341,07)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
TE0079	415163015361 MAESTRA SGP	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES	12.610.202,00
T.EL08395	Cta.3585714844-2 Maestra S.G.P. -	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES	36.053.139,07

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Contratos de Construcción 2%	59.345.712,07	1.187.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	59.345.712,07	1.187.000,00
CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - FONSET - 5%	59.345.712,07	2.967.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%	59.345.712,07	2.374.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 2%	59.345.712,07	1.187.000,00
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SERVICIOS - 1%	59.345.712,07	593.457,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	59.345.712,07	1.186.914,00
Total Descuentos		10.682.371,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso


IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL


ID	Código	Descripción	Valor
10747	23201010010207-01-124303-01-2201062-202600000000652		19.632.991,76
		Construcción y adecuación de Infraestructura educativa - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL	
10983	53201010010207-01-124103-01-22010700-2024000000006941		15.379.590,00
		Construcción y adecuación de Infraestructura educativa - FTE: SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA	
11028	53201010010207-02-124303-01-22010700-2024000000006941		24.333.130,31
		Construcción y adecuación de Infraestructura educativa - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL	

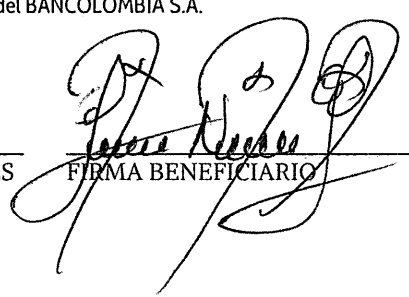
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Total Rubros	59.345.712,07
--------------	---------------

Pago electrónico realizado a la cuenta No. 36300006057 del BANCOLOMBIA S.A.




REPRESENTANTE LEGAL
o JEFE DE LA UNIDAD

GUILLERMO RIQUELME FUENTES
Secretaría de Hacienda

FIRMA BENEFICIARIO

1002734959
Identidad: C.C o NIT
Cel. o Tel. 3229466454
Documento elaborado por 4204692



MUNICIPIO DE PAYA

NIT 800065411-5

Calle 3 No 3 - 45 C.P. 155330

Administración Central

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 23/02/2026

Orden de Pago No. 138

C.C/NIT. : 1002734959
 Beneficiario : NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
 Referencias : CDP : -1, CRP : -14
 Descripción : LIQUIDACION DE Reserva - 2025 Doc. No. 1403 - CONTRATACION MP-MC-030 DE 2025. (11/12/2025). CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	15.379.590,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	15.379.590,00
Descuentos	Valor
Contratos de Construcción 2%	308.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	308.000,00
CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - FONSET - 5%	769.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%	615.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 2%	308.000,00
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SERVICIOS - 1%	153.796,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	307.592,00
Total Descuentos	2.769.388,00
Neto a Pagar	12.610.202,00

TOTAL : DOCE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS DOS PESOS (12.610.202,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : -14 Fecha : 01/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
10983	53201010010207-01-124103-01-22010700-202400000006941	Construcción y adecuación de Infraestructura educativa - FTE: SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL - DEP: Alcaldia - SEC: Educación - PROG: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media - SUBP: Intersubsectorial Educación	15.379.590,00
11028	53201010010207-02-124303-01-22010700-202400000006941	Construcción y adecuación de Infraestructura educativa - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Alcaldia - SEC: Educación - PROG: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media - SUBP: Intersubsectorial Educación	0,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :


Banco : 415163015361 - CTA MTRA 415163015361 SGP EDUCACION - CALIDAD EDUCATIVA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - 20580

REPRESENTANTE LEGAL
o JEFE DE LA UNIDAD

GUILLERMO PARRA FUENTES
Secretario de Hacienda

FIRMA BENEFICIARIO

1002734959
 Identidad: C.C o NIT
 Cel. o Tel. 3229466454
 Documento elaborado por 4204692

**MUNICIPIO DE PAYA**

NIT 800065411-5

Calle 3 No 3 - 45 C.P. 155330

Administración Central

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 23/02/2026

Orden de Pago No. 139

C.C/NIT. : 1002734959
 Beneficiario : NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
 Referencias : CDP : -1, CRP : -14
 Descripción : LIQUIDACION DE Reserva - 2025 Doc. No. 1403 - CONTRATACION MP-MC-030 DE 2025. (11/12/2025). CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	24.333.130,31
Valor IVA	0,00
SubTotal	24.333.130,31
Descuentos	Valor
Contratos de Construcción 2%	487.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	487.000,00
CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - FONSET - 5%	1.217.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%	973.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 2%	487.000,00
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SERVICIOS - 1%	243.331,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	486.663,00
Total Descuentos	4.380.994,00
Neto a Pagar	19.952.136,31

TOTAL : DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (19.952.136,31)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : -14 Fecha : 01/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
11028	53201010010207-02-124303-01-22010700-202400000006941	Construcción y adecuación de Infraestructura educativa - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Alcaldia - SEC: Educación - PROG: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preschool, básica y media - SUBP: Intersubsectorial Educación	24.333.130,31

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco : 35857148442 - Cta Mtra S.G.P. 358571484-42 Proposito General BANCOLOMBIA S.A. - 310

REPRESENTANTE LEGAL
o JEFE DE LA UNIDAD

GUILLERMO RABRA FUENTES
Secretario de Hacienda


FIRMA BENEFICIARIO

1002734959

Identidad: C.C o NIT

Cel. o Tel. 3229166654

Documento elaborado por 4204692



MUNICIPIO DE PAYA

NIT 800065411-5

Calle 3 No 3 - 45 C.P. 155330

Administración Central

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 23/02/2026

Orden de Pago No. 140

C.C/NIT. : 1002734959
 Beneficiario : NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
 Referencias : CDP : 51, CRP : 32
 Descripción : LIQUIDACION DEL ADICIONAL 01 AL CONTRATATO MP-MC-030 DE 2025. (20/01/2026). CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	19.632.991,76
Valor IVA	0,00
SubTotal	19.632.991,76
Descuentos	Valor
Contratos de Construcción 2%	392.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	392.000,00
CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - FONSET - 5%	981.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%	786.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 2%	392.000,00
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SERVICIOS - 1%	196.330,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	392.659,00
Total Descuentos	3.531.989,00
Neto a Pagar	16.101.002,76

TOTAL : DIECISEIS MILLONES CIENTO UN MIL DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (16.101.002,76)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 32

Fecha : 20/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
10747	23201010010207-01-124303-01-2201062-202600000000652	Construcción y adecuación de Infraestructura educativa - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Alcaldia - SEC: Educación - PROG: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media - SUBP: Intersubsectorial Educación - PROD: Infraestructura educativa mantenida	19.632.991,76

TESORERÍA

Cheque No. :

Fecha :

Banco : 35857148442 - Cta Mtra S.G.P. 358571484-42 Proposito General BANCOLOMBIA S.A. - 310

REPRESENTANTE LEGAL
o JEFE DE LA UNIDAD

GUILLERMO PARRA FUENTES
Secretario de Hacienda

FIRMA BENEFICIARIO

Identidad: C.C o NIT

Cel. o Tel. 321 9166434

Documento elaborado por 4204692

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO		CÓDIGO: 210-GC-02.08
	MACROPROCESO: APOYO		VERSIÓN: 5
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	ACTA DEMAYORES (+) Y MENORES (-) No. 1	FECHA: 18/dic/2024
			Página 1 de 2

FECHA PRESENTE ACTA: 15 DE ENERO DE 2026
CONTRATO: MP-MC-030 DE 2025
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C: 800.065.411-5
CONTRATISTA: NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
NIT /C.C: 1.002.734.959-6
R. LEGAL: NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
CEDULA: 1.002.734.959 DE AGUAZUL
SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
OBJETO: Secretaria de Planeación y Desarrollo Municipal
CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.
FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL: \$ 39.712.720,31
VALOR ADICIONAL: \$ 19.632.991,76
VALOR TOTAL: \$ 59.345.712,07
PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSIÓN 01: 24 DE DICIEMBRE DE 2025
REINICIO 01: 13 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2026

En el municipio de Paya-Boyacá, a los quince (15) días del mes de enero de 2026 se reunieron: La Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES identificado con cedula de ciudadanía No. 1.002.734.959 de Aguazul, en condición de representante legal del contratista con el fin de suscribir la presente:



ACTA DEMAYORES (+) Y MENORES (-) No. 1

							MAYORES Y MENORES (01)				
							CONDICIONES ACTUALIZADAS				
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	MAJOR (+)	MEJOR (-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	CASETA CAFETERIA SECUNDARIA										
1.1	2.01.62	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	M2	45,00	\$ 6.371,19	\$ 0,00	\$ 286.703,55	7,20	0,00	52,20	\$ 332.576,12
1.2	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	45,00	\$ 10.410,68	\$ 0,00	\$ 468.480,60	0,00	0,00	45,00	\$ 468.480,60
1.3	2.01.30	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO E = 0,25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	4,60	\$ 20.278,06	\$ 0,00	\$ 93.279,08	6,00	0,00	10,60	\$ 214.947,44
1.4	2.01.70	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	6,68	\$ 70.577,63	\$ 0,00	\$ 471.670,30	0,68	0,00	7,37	\$ 519.874,82
1.5	1.01.03	CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACION 60C/40P	M3	0,94	\$ 503.770,05	\$ 100.754,01	\$ 565.834,52	0,00	-0,22	0,72	\$ 435.257,32
1.6	2.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	2,15	\$ 887.295,00	\$ 177.459,00	\$ 2.291.882,99	0,00	-0,53	1,62	\$ 1.729.160,50
1.7	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	260,00	\$ 7.675,05	\$ 1.535,01	\$ 2.394.615,60	0,00	-81,04	178,96	\$ 1.648.224,97
1.8	COTIZACION / REF GOBERNACION	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ESTRUCTURAL REDONDA 3"-3MM PARA COLUMNA	ML	32,67	\$ 96.484,00	\$ 19.296,80	\$ 3.782.558,74	0,00	-9,17	23,50	\$ 2.720.848,80
1.9	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	4,81	\$ 92.883,83	\$ 18.576,77	\$ 536.236,93	0,12	0,00	4,93	\$ 549.500,74
1.10	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI	M2	39,71	\$ 87.627,78	\$ 17.525,56	\$ 4.175.638,97	10,75	0,00	50,46	\$ 5.306.037,33
1.11	3.13.24	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	63,99	\$ 7.423,82	\$ 1.484,76	\$ 570.027,33	3,13	0,00	67,11	\$ 597.871,11
1.12	2.08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL. 30	M2	62,64	\$ 42.879,54	\$ 8.575,91	\$ 3.223.169,26	7,36	0,00	70,00	\$ 3.601.881,36
1.13	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISEÑO	KG	200,43	\$ 22.031,72	\$ 4.406,34	\$ 5.298.933,58	33,57	0,00	234,00	\$ 6.186.506,98
1.14	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SINTETICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	200,43	\$ 4.177,57	\$ 835,51	\$ 1.004.763,40	33,57	0,00	234,00	\$ 1.173.061,66
1.15	2.08.16	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA	ML	6,00	\$ 94.507,16	\$ 18.901,43	\$ 680.451,55	1,00	0,00	7,00	\$ 793.860,14
1.16		SILLAS DE CAFETERIA TIPO ALCATRAZ	UND	4,00	\$ 980.000,00	\$ 196.000,00	\$ 4.704.000,00	0,00	0,00	4,00	\$ 4.704.000,00
NP-01	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3,00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0	\$ 1.136.574,77	\$ 227.314,95	\$ 0,00	0,29	0,00	0,29	\$ 395.528,02
NP-02	2.03.29	VIGA AEREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0	\$ 1.471.612,53	\$ 294.322,51	\$ 0,00	0,17	0,00	0,17	\$ 301.974,89
NP-03	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	M2	0	\$ 358.866,03	\$ 71.773,21	\$ 0,00	15,80	0,00	15,80	\$ 6.804.099,93
NP-04	2.19.08	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO AGUA NEGRA TIPO PESADO D=2"	ML	0	\$ 53.175,47	\$ 10.635,09	\$ 0,00	15,80	0,00	15,80	\$ 1.008.206,91
NP-05	COTIZACION / REF GOBERNACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN LAMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	0	\$ 265.906,59	\$ 53.181,32	\$ 0,00	2,00	0,00	2,00	\$ 638.175,82

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-02.08 VERSIÓN: 5 FECHA: 18/dic/2024
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	ACTA DEMAYORES (+) Y MENORES (-) No. 1	Página 2 de 2

NP-06	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	0	\$ 265.906,59	\$ 53.181,32	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
NP-07	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2" (TIPO PESADO - DB).	ML	0	\$ 6.522,24	\$ 1.304,45	\$ 0,00	12,00	0,00	12,00	\$ 93.920,26
NP-08	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UN	0	\$ 118.121,28	\$ 23.624,26	\$ 0,00	2,00	0,00	2,00	\$ 283.491,07
NP-09	2.10.144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO).	UN	0	\$ 99.367,51	\$ 19.873,50	\$ 0,00	1,00	0,00	1,00	\$ 119.241,01
NP-10	2.10.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO EMT 3/4".	UN	0	\$ 150.112,15	\$ 30.022,43	\$ 0,00	3,00	0,00	3,00	\$ 540.403,74
NP-11	2.10.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 18 W	UN	0	\$ 28.025,59	\$ 5.605,12	\$ 0,00	3,00	0,00	3,00	\$ 100.892,12
NP-12	COTIZACIÓN / REF. GOBERNACIÓN	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE DE COBRE AISLADO THHN/THWN AWG No. 12	ML	0	\$ 15.541,84	\$ 3.108,37	\$ 0,00	36,00	0,00	36,00	\$ 671.407,49
NP-13	2.04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No. 4. E = 0.10 M.	M2	0	\$ 68.169,33	\$ 13.633,87	\$ 0,00	29,74	0,00	29,74	\$ 2.432.827,05
NP-14	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	0	\$ 35.818,47	\$ 7.163,69	\$ 0,00	29,74	0,00	29,74	\$ 1.278.289,56
TOTAL COSTO DIRECTO							\$ 32.549.248,31				\$ 45.650.642,75
ADMINISTRACIÓN					\$ 0,20		\$ 6.109.649,28				\$ 9.130.109,55
IMPREVISTOS					\$ 0,05		\$ 1.527.412,32				\$ 2.282.527,39
UTILIDAD					\$ 0,05		\$ 1.527.412,32				\$ 2.282.527,39
VALOR TOTAL:							\$ 39.712.720,31				\$ 59.345.712,07

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

 _____ JUVENAL PÉREZ VEGA CONTRATANTE	 _____ LADY PAOLA GARAVITO MARINO SUPERVISORA	 _____ NIDIER ALEXIS GARCÍA CARRES CONTRATISTA
---	---	--

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
ANDERSON ALVEIRO MALDONADO PÉREZ Profesional de Apoyo Secretaría de Planeación	LADY PAOLA GARAVITO MARINO Secretaría de Planeación y Desarrollo	JUVENAL PÉREZ VEGA Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO		CÓDIGO: 210-GC-02.08
	MACROPROCESO APOYO		VERSIÓN: 5
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	ACTA DEMAYORES (+) Y MENORES (-) No. 2	FECHA: 18/dic/2024
			Página 1 de 2

FECHA PRESENTE ACTA	30 DE ENERO DE 2026
CONTRATO	MP-MC-030 DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL	JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO	ALCALDE MUNICIPAL
NIT. / C.	800.065.411-5
CONTRATISTA	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
NIT. / C.	1.002.734.959-6
R. LEGAL	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
CEDULA	1.002.734.959 DE AGUAZUL
SUPERVISOR DEL CONTRATO	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
	Secretaria de Planeación y Desarrollo Municipal
OBJETO	CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA
FECHA DE INICIO	11 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	\$ 39.712.720,31
VALOR ADICIONAL	\$ 19.632.981,76
VALOR TOTAL	\$ 59.345.712,07
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSIÓN 01	24 DE DICIEMBRE DE 2025
REINICIO 01	13 DE ENERO DE 2025
PRORROGA	DIEZ (10) DIAS
DURACIÓN TOTAL	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE TERMINACION	30 DE ENERO DE 2026

En el municipio de Paya-Boyacá, a los treinta (30) días del mes de enero de 2026 se reunieron: La Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES identificado con cedula de ciudadanía No. 1.002.734.959 de Aguazul, en condición de representante legal del contratista con el fin de suscribir la presente.

ACTA DEMAYORES (+) Y MENORES (-) No. 2

			CONDICIONES INICIALES				MAYORES Y MENORES (01)				MAYORES Y MENORES (02)				
							CONDICIONES ACTUALIZADAS				CONDICIONES ACTUALIZADAS				
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	MAJOR (+)	MEJOR (-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAJOR (+)	MEJOR (-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.	CASETA CAFETERIA SECUNDARIA														
1.1	2.01.62	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	M2	45,00	\$ 6.371,19	\$ 0,00	\$ 286.703,55	\$ 7,20	\$ 0,00	\$ 52,20	\$ 332.576,12	7,20	0,00	52,20	\$ 332.576,12
1.2	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	45,00	\$ 10.410,68	\$ 0,00	\$ 468.480,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45,00	\$ 468.480,60	0,00	0,00	45,00	\$ 468.480,60
1.3	2.01.30	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO E = 0.25 M (INCLUYERE TIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM)	M2	4,60	\$ 20.278,06	\$ 0,00	\$ 93.279,08	\$ 6,00	\$ 0,00	\$ 10,60	\$ 214.947,44	6,00	0,00	10,60	\$ 214.947,44
1.4	2.01.70	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	6,68	\$ 70.577,63	\$ 0,00	\$ 471.670,30	\$ 0,68	\$ 0,00	\$ 7,37	\$ 519.874,82	0,68	0,00	7,37	\$ 519.874,82
1.5	1.01.03	CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACION 60C/40P	M3	0,94	\$ 503.770,05	\$ 100.754,01	\$ 565.834,52	\$ 0,00	-\$ 0,22	\$ 0,72	\$ 435.257,32	0,55	0,00	1,49	\$ 899.229,54
1.6	2.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 MPa. SECCION RECTANGULAR	M3	2,15	\$ 887.295,00	\$ 177.459,00	\$ 2.291.882,99	\$ 0,00	-\$ 0,53	\$ 1,62	\$ 1.729.160,50	0,00	-\$ 0,53	1,62	\$ 1.729.160,50
1.7	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mds	KG	260,00	\$ 7.675,05	\$ 1.535,01	\$ 2.394.615,60	\$ 0,00	-\$ 81,04	\$ 178,96	\$ 1.648.224,97	0,00	-\$ 81,04	178,96	\$ 1.648.224,97
1.8	GOYIZACION / N / REF GOBERNACION	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ESTRUCTURAL REDONDA 3"-3MM PARA COLUMNA	ML	32,67	\$ 96.484,00	\$ 19.296,80	\$ 3.782.558,74	\$ 0,00	-\$ 9,17	\$ 23,50	\$ 2.720.848,80	0,00	-\$ 17	23,50	\$ 2.720.848,80
1.9	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	4,81	\$ 92.883,83	\$ 18.576,77	\$ 536.236,93	\$ 0,12	\$ 0,00	\$ 4,93	\$ 549.500,74	0,12	0,00	4,93	\$ 549.500,74
1.10	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 0.10 2500 PSI	M2	39,71	\$ 87.627,78	\$ 17.525,56	\$ 4.175.638,97	\$ 10,75	\$ 0,00	\$ 50,46	\$ 5.306.037,33	10,75	0,00	50,46	\$ 5.306.037,33
1.11	3.13.24	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	63,99	\$ 7.423,82	\$ 1.484,76	\$ 570.027,33	\$ 3,13	\$ 0,00	\$ 67,11	\$ 597.871,11	3,13	0,00	67,11	\$ 597.871,11
1.12	2.08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL 30	M2	62,64	\$ 42.879,54	\$ 8.575,91	\$ 3.223.169,26	\$ 7,36	\$ 0,00	\$ 70,00	\$ 3.601.881,36	7,36	0,00	70,00	\$ 3.601.881,36
1.13	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRE SEGUN DISEÑO	KG	200,43	\$ 22.031,72	\$ 4.406,34	\$ 5.298.933,58	\$ 33,57	\$ 0,00	\$ 234,00	\$ 6.186.506,98	33,57	0,00	234,00	\$ 6.186.506,98
1.14	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SINTETICO PARA ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO)	KG	200,43	\$ 4.177,57	\$ 835,51	\$ 1.004.763,40	\$ 33,57	\$ 0,00	\$ 234,00	\$ 1.173.061,66	33,57	0,00	234,00	\$ 1.173.061,66
1.15	2.08.16	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA	ML	6,00	\$ 94.507,16	\$ 18.901,43	\$ 680.451,55	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 7,00	\$ 793.860,14	1,00	0,00	7,00	\$ 793.860,14
1.16		SILLAS DE CAFETERIA TIPO ALCATRAZ	UND	4,00	\$ 980.000,00	\$ 1.960.000,00	\$ 4.704.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,00	\$ 4.704.000,00	0,00	0,00	4,00	\$ 4.704.000,00

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO		CÓDIGO 210-GG-02.08
			VERSIÓN 5
			FECHA 18/06/2024
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		ACTA DEMAYORES (+) Y MENORES (-) No. 2

NP-01	2 03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H = 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0	\$ 1.136.574,77	\$ 227.314,96	\$ 0,00	\$ 0,29	\$ 0,00	\$ 0,29	\$ 395.528,02	0,35	0,00	0,35	\$ 474.633,62
NP-02	2 03.29	VIGA AEREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0	\$ 1.471.612,53	\$ 294.322,51	\$ 0,00	\$ 0,17	\$ 0,00	\$ 0,17	\$ 301.974,89	0,22	0,00	0,22	\$ 389.918,46
NP-03	2 19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	M2	0	\$ 358.866,03	\$ 71.773,21	\$ 0,00	\$ 15,80	\$ 0,00	\$ 15,80	\$ 6.804.099,93	13,80	0,00	13,80	\$ 5.942.821,46
NP-04	2 19.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO AGUA NEGRA TIPO PESADO D=2"	ML	0	\$ 53.175,47	\$ 10.635,09	\$ 0,00	\$ 15,80	\$ 0,00	\$ 15,80	\$ 1.008.206,91	18,80	0,00	18,80	\$ 1.199.638,60
NP-05	2 15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA CAL 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	0	\$ 265.906,59	\$ 53.181,32	\$ 0,00	\$ 2,00	\$ 0,00	\$ 2,00	\$ 638.175,82	2,00	0,00	2,00	\$ 638.175,82
NP-06	2 15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO), (NO INCLUYE CERRADURA)	M2	0	\$ 265.906,59	\$ 53.181,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
NP-07	2 10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2" (TIPO PESADO - DB)	ML	0	\$ 6.522,24	\$ 1.304,45	\$ 0,00	\$ 12,00	\$ 0,00	\$ 12,00	\$ 93.920,26	13,00	0,00	13,00	\$ 101.746,94
NP-08	2 10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO PVC DE 1/2" (INCLUYE APARATO)	UN	0	\$ 118.121,28	\$ 23.624,26	\$ 0,00	\$ 2,00	\$ 0,00	\$ 2,00	\$ 283.491,07	2,00	0,00	2,00	\$ 283.491,07
NP-09	2 10.144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)	UN	0	\$ 99.367,51	\$ 19.873,50	\$ 0,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 1,00	\$ 119.241,01	1,00	0,00	1,00	\$ 119.241,01
NP-10	2 10.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO EMT 3/4"	UN	0	\$ 150.112,15	\$ 30.022,43	\$ 0,00	\$ 3,00	\$ 0,00	\$ 3,00	\$ 540.403,74	2,00	0,00	2,00	\$ 360.269,16
NP-11	2 10.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 18 W	UN	0	\$ 28.025,59	\$ 5.605,12	\$ 0,00	\$ 3,00	\$ 0,00	\$ 3,00	\$ 100.892,12	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
NP-12	2 04.14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE DE COBRE AISLADO THHN/THWN AWG No. 12	ML	0	\$ 15.541,84	\$ 3.108,37	\$ 0,00	\$ 36,00	\$ 0,00	\$ 36,00	\$ 671.407,49	36,00	0,00	36,00	\$ 671.407,49
NP-13	2 04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No. 4 E = 0.10 M	M2	0	\$ 68.169,33	\$ 13.633,87	\$ 0,00	\$ 29,74	\$ 0,00	\$ 29,74	\$ 2.432.827,05	25,12	0,00	25,12	\$ 2.095.168,34
NP-14	1 03.12	PANETE LISO MUROS 1.4	M2	0	\$ 35.818,47	\$ 7.163,69	\$ 0,00	\$ 29,74	\$ 0,00	\$ 29,74	\$ 1.278.289,56	45,79	0,00	45,79	\$ 1.967.973,68
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 3.050.218,49					\$ 1.45.959.547,79				\$ 1.45.959.547,79
ADMINISTRACIÓN					\$ 0,20	\$ 61.09.649,28					\$ 9.130.109,55				\$ 9.130.109,55
IMPREVISTOS					\$ 0,05	\$ 1.527.412,32					\$ 2.292.527,39				\$ 2.292.527,39
UTILIDAD					\$ 0,05	\$ 1.527.412,32					\$ 2.292.527,39				\$ 2.292.527,39
VALOR TOTAL						\$ 397.127.290,21					\$ 59.345.712,07				\$ 59.345.712,07

En constancia se firma por los que en esta intervinieron.


 JUVENAL PÉREZ VEGA
 CONTRATANTE


 LADY PAOLA GARAVITO MARINO
 SUPERVISORA


 NIDIER ALEXIS GARCÍA
 CONTRATISTA

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
ANDERSON ALVARO MALDONADO PEREZ Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación	LADY PAOLA GARAVITO MARINO Secretaria de Planeación y Desarrollo	JUVENAL PÉREZ VEGA Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT: 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-02.12 VERSIÓN: 5 FECHA: 18/dic/2024
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL (SABANA DE CATIDADES)	Página 1 de 1

FECHA PRESENTE ACTA:
 CONTRATO
 CONTRATANTE:
 REPRESENTANTE LEGAL:
 CARGO:
 NIT /C.C
 CONTRATISTA:
 NIT /C.C
 R. LEGAL:
 CEDULA:
 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

30 DE ENERO DE 2026
 MP-MC-030 DE 2025
 MUNICIPIO DE PAYA
 JUVENAL PEREZ VEGA
 ALCALDE MUNICIPAL
 800.065.411-5
 NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
 1 002.734.959-6
 NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
 1 002.734.959 DE AGUAZUL
 LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
 Secretaria de Planeacion y Desarrollo Municipal
 CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE
 LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.
 11 DE DICIEMBRE DE 2025
 \$ 39.712.720,31
 \$ 19.632.991,76
 \$ 59.345.712,07
 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
 24 DE DICIEMBRE DE 2025
 13 DE ENERO DE 2025
 DIEZ (10) DIAS
 TREINTA (30) DIAS
 30 DE ENERO DE 2026

OBJETO:

FECHA DE INICIO:
 VALOR INICIAL:
 VALOR ADICIONAL:
 VALOR TOTAL:
 PLAZO DE EJECUCION:
 SUSPENSIÓN 01:
 REINICIO 01:
 PRORROGA 01:
 DURACIÓN TOTAL:
 FECHA DE TERMINACION:

En el municipio de Paya-Boyacá, a los treinta (30) días del mes de enero de 2026 se reunieron. El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES identificado con cedula de ciudadanía No. 1 002.734.959 de Aguazul, en condición de Contratista con el fin de suscribir la presente:

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL (SABANA DE CATIDADES)


El contratista hace entrega de.


CASETA CAFETERIA SECUNDARIA							
No	ITEM GOBERNACION DE BOYACA 2025	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	INCREMENTO POR DISTANCIA 20%	VALOR TOTAL
1.1	2.01.62	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	M2	52,20	\$ 6.371,19	\$ 0,00	\$ 332.576,12
1.2	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	45,00	\$ 10.410,68	\$ 0,00	\$ 468.480,60
1.3	2.01.30	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	10,60	\$ 20.278,06	\$ 0,00	\$ 214.947,44
1.4	2.01.70	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	7,37	\$ 70.577,63	\$ 0,00	\$ 519.874,82
1.5	1.01.03	CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACION 60C/40P	M3	1,49	\$ 503.770,05	\$ 100.754,01	\$ 899.229,54
1.6	2.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa. SECCION RECTANGULAR	M3	1,62	\$ 887.295,00	\$ 177.459,00	\$ 1.729.160,50
1.7	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	178,96	\$ 7.675,05	\$ 1.535,01	\$ 1.648.224,97
1.8	D	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ESTRUCTURAL REDONDA 3"-3MM PARA COLUMNA	ML	23,50	\$ 96.484,00	\$ 19.296,80	\$ 2.720.848,80
1.9	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	4,93	\$ 92.883,83	\$ 18.576,77	\$ 549.500,74
1.10	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI	M2	50,46	\$ 87.627,78	\$ 17.525,56	\$ 5.306.037,33
1.11	3.13.24	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	67,11	\$ 7.423,82	\$ 1.484,76	\$ 597.871,11
1.12	2.08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL. 30	M2	70,00	\$ 42.879,54	\$ 8.575,91	\$ 3.601.881,36
1.13	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACION PERFLERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISEÑO	KG	234,00	\$ 22.031,72	\$ 4.406,34	\$ 6.186.506,98
1.14	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SINTETICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO)	KG	234,00	\$ 4.177,57	\$ 835,51	\$ 1.173.061,66
1.15	2.08.16	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA	ML	7,00	\$ 94.507,16	\$ 18.901,43	\$ 793.860,14
1.16		SILLAS DE CAFETERIA TIPO ALCATRAZ	UND	4,00	\$ 980.000,00	\$ 196.000,00	\$ 4.704.000,00

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-02.12 VERSIÓN: 5 FECHA: 18/dic/2024
	MACROPROCESO: APOYO	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL (SABANA DE CANTIDADES) Página 2 de 2

NP-01	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,35	\$ 1.136.574,77	\$ 227.314,95	\$ 474.633,62
NP-02	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,22	\$ 1.471.612,53	\$ 294.322,51	\$ 389.918,46
NP-03	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	M2	13,80	\$ 358.866,03	\$ 71.773,21	\$ 5.942.821,46
NP-04	2.19.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO AGUA NEGRA TIPO PESADO D=2"	ML	18,80	\$ 53.175,47	\$ 10.635,09	\$ 1.199.638,60
NP-05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	2,00	\$ 265.906,59	\$ 53.181,32	\$ 638.175,82
NP-06	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2" (TIPO PESADO - DB)	ML	13,00	\$ 6.522,24	\$ 1.304,45	\$ 101.746,94
NP-07	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO)	UN	2,00	\$ 118.121,28	\$ 23.624,26	\$ 283.491,07
NP-08	2.10.144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)	UN	1,00	\$ 99.367,51	\$ 19.873,50	\$ 119.241,01
NP-09	2.10.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO EMT 3/4"	UN	2,00	\$ 150.112,15	\$ 30.022,43	\$ 360.269,16
NP-10	2.10.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 18 W	UN	0,00	\$ 28.025,59	\$ 5.605,12	\$ 0,00
NP-11	COTIZACIÓN / REF GOBERNACIÓN	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE DE COBRE AISLADO THHN/THWN AWG No. 12	ML	36,00	\$ 15.541,84	\$ 3.108,37	\$ 671.407,49
NP-12	2.04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.	M2	25,12	\$ 68.169,33	\$ 13.633,87	\$ 2.055.168,34
NP-13	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	45,79	\$ 35.818,47	\$ 7.163,69	\$ 1.967.973,68
					COSTO DIRECTO		\$ 45.650.547,74
					ADMINISTRACIÓN	20%	\$ 9.130.109,55
					IMPREVISTOS	5%	\$ 2.282.527,39
					UTILIDAD	5%	\$ 2.282.527,39
					VALOR TOTAL		\$ 59.345.712,07


 JUVENAL PÉREZ VEGA
 CONTRATANTE


 NIDIER ALEXIS GARCÍA GARGÉS
 CONTRATISTA


 LADY PAOLA GARAVITO MARINO
 SUPERVISORA

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
ANDERSON ALVEIRO MALDONADO PEREZ	LADY PAOLA GARAVITO MARINO	JUVENAL PÉREZ VEGA
Profesional de Apoyo Secretaría de Planeación	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-02.12 VERSIÓN: 5 FECHA: 18/dic/2024
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL	Página 1 de 1

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE ENERO DE 2026
CONTRATO: MP-MC-030 DE 2025
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C 800.065.411-5
CONTRATISTA: NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
NIT /C.C 1.002.734.959-6
R. LEGAL: NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
CEDULA: 1.002.734.959 DE AGUAZUL
SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Municipal
OBJETO: CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.
FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL: \$ 39.712.720,31
VALOR ADICIONAL: \$ 19.632.991,76
VALOR TOTAL: \$ 59.345.712,07
PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
SUNPENSIÓN 01: 24 DE DICIEMBRE DE 2025
REINICIO 01: 13 DE ENERO DE 2025
PRORROGA 01: DIEZ (10) DIAS
DURACIÓN TOTAL: TREINTA (30) DIAS
FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2026


En el municipio de Paya-Boyacá, a los treinta (30) días del mes de enero de 2026 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES identificado con cedula de ciudadanía No. 1.002.734.959 de Aguazul, en condición de Contratista con el fin de suscribir la presente:

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL


DESCRIPCION	FECHA	VALOR PAGADO
VALOR CONTRATADO	11/12/2025	\$ 39.712.720,31
VALOR ADICIONAL	20/01/2026	\$ 19.632.991,76
VALOR PRESENTE ACTA FINAL (a pagar)	30/01/2026	\$ 59.345.712,07
VALOR POR EJECUTAR		\$ 0,00

Total a pagar presente ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRES CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON SIETE CENTAVOS
M/CTE. (\$ 59.345.712,07).

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:



JUVENAL PEREZ VEGA
CONTRATANTE



NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
CONTRATISTA



LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
SUPERVISORA

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
ANDERSON ALVEIRO MALDONADO PEREZ Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO Secretaria de Planeación y Desarrollo	JUVENAL PEREZ VEGA Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-02.13
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: APOYO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		Página 1 de 1

FECHA PRESENTE ACTA: 04 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO: MP-MC-030 DE 2025
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C: 800.065.411-5
CONTRATISTA: NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
NIT /C.C: 1.002.734.959-6
R. LEGAL: NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
CEDULA: 1.002.734.959 DE AGUAZUL
SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Municipal
OBJETO: CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.
FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL: \$ 39.712.720,31
VALOR ADICIONAL: \$ 19.632.991,76
VALOR TOTAL: \$ 59.345.712,07
PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
SUNPENSIÓN 01: 24 DE DICIEMBRE DE 2025
REINICIO 01: 13 DE ENERO DE 2025
PRORROGA 01: DIEZ (10) DIAS
DURACIÓN TOTAL: TREINTA (30) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE ENERO DE 2026

En el municipio de Paya-Boyacá, a los cuatro (04) días del mes de febrero de 2026 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES identificado con cedula de ciudadanía No. 1.002.734.959 de Aguazul, en condición de Contratista con el fin de suscribir la presente:

ACTA DE LIQUIDACIÓN

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado		\$39.712.720,31
Valor adicional		\$19.632.991,76
Valor acta de Liquidación	\$59.345.712,07	
Valor NO ejecutado (-)	\$0,00	
SUMAS IGUALES	\$59.345.712,07	\$59.345.712,07

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado		\$59.345.712,07
Valor total recibido	\$0,00	
Valor saldo multas	0,00	
Valor saldo no ejecutado	\$0,00	
Saldo a favor del contratista	\$59.345.712,07	
Saldo en contra	0,00	
SUMAS IGUALES	\$59.345.712,07	\$59.345.712,07

Total a pagar presente acta DE LIQUIDACION:

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRES CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$ 59.345.712,07).


En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

 JUVENAL PEREZ VEGA CONTRATANTE	 LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO SUPERVISORA	 NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES CONTRATISTA
---------------------------------------	---	--

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
ANDERSON ALVEIRO MALDONADO PEREZ Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO Secretaria de Planeación y Desarrollo	JUVENAL PEREZ VEGA Alcalde Municipal



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIDER ALEXIS GARCIA GARCÉS		NÚMERO PLANILLA: 7998984131	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 100274659		PERIODO COTIZACIÓN: 2025	
DIRECCIÓN: PVA DEPARTAMENTO: PVA CENTRO		TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2025	
TELÉFONO: 02-2000000		DÍAS DE MORA: 0	
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/12/11	
CLASE APORTANTE: PRIVADA		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1989257371	
ACTIVIDAD ECONOMICA: PRIMA			
FORMA DE PRESENTACIÓN: PRIMA			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO			

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	23001-PORVENIR	CÓDIGO	ESSE24-COOSALUD ESS	CÓDIGO	1423-POSITIVA
23001	1	ESSE24	1	1423	1
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	23001-PORVENIR	CÓDIGO	ESSE24-COOSALUD ESS	CÓDIGO	1423-POSITIVA
23001	1	ESSE24	1	1423	1
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	23001-PORVENIR	CÓDIGO	ESSE24-COOSALUD ESS	CÓDIGO	1423-POSITIVA
23001	1	ESSE24	1	1423	1
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	23001-PORVENIR	CÓDIGO	ESSE24-COOSALUD ESS	CÓDIGO	1423-POSITIVA
23001	1	ESSE24	1	1423	1
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL PAGADO: \$ 413.300

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]



NIDIER GARCIA

Ingeniero Civil

CUENTA DE COBRO 001

EL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ

Nit. 800.065.411-5

DEBE A:

NIDIER ALEXIS GARCÍA GARCÉS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.002.734.959 de Aguazul.


LA SUMA DE: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRES CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$ 59.345.712,07).

POR CONCEPTO DE: CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.

Autorizo al municipio de Paya a realizar el pago en la entidad **Bancolombia, Cuenta de Ahorros** y cuenta bancaria: 36300006057.


Se firma a los cuatro (04) día del mes de febrero de 2026.

Cordialmente.



NIDIER ALEXIS GARCÍA GARCÉS
C.C No.: 1.002.734.959 de Aguazul
Dirección: Morcote
Teléfono No.: 3229466454
Correo: nidier.garcia04@gmail.com

NIDIER GARCIA – Ingeniero Civil
TP: 041037-0656460 BYC
CC: 1002734959
Cell: 3229466454
Correo: nidier.garcia04@gmail.com

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 1 de 10

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN **AL CONTRATO DE SUMINISTROS No. MP-MC-030-2025**

LUGAR Y FECHA: PAYA, Boyacá, 30 de enero de 2025.

ASUNTO: “CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.”


Se procedió con los siguientes resultados

1. ANTECEDENTES:

CONTRATO:	MP-MC-030 DE 2025.
FECHA:	11 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAYA
NIT:	800.065.411-5
DURACIÓN:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.
SUNPENSIÓN 01:	24 DE DICIEMBRE DE 2025
REINICIO 01:	13 DE ENERO DE 2025
PRORROGA 01:	DIEZ (10) DIAS
VALOR INICIAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE. (\$ 39.712.720,31).

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaría de Planeación y Desarrollo	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

Web: www.paya-boyaca.gov.co
 Celular: 3202838493 – 3202838476, Dirección: calle 3 No. 3-45, Código postal. 151820-151827
 E-mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co, planeacion@paya-boyaca.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 2 de 10

VALOR ADICIONAL:	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. (\$ 19.632.991,76).
VALOR TOTAL:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRES CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$ 59.345.712,07).

A. UBICACIÓN: Municipio de Paya.

B. ACTA DE INICIO: Con fecha de 11 de diciembre de 2025.

C. ACTA DE SUSPENSIÓN 01: con fecha de 24 de diciembre de 2025.

D. ACTA DE REINICIO 01: con fecha de 13 de enero de 2026.

E. INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO: El contratista presenta un el informe para constatar la ejecución del objeto contractual y de acuerdo la supervisión lo revisa y da visto bueno, informe con fecha de radicación el día 30 de enero del 2026; el cual está contenido en fotografías de cada uno de los ítems acordados en el contrato de suministros, en el informe anexa soportes del cumplimiento del objeto del contrato.

F. DOCUMENTOS A REALIZAR: Sabana de cantidades final, Acta de cumplimiento final y acta de liquidación.

2. SITUACIÓN ESPECÍFICA:

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

Web: www.paya-boyaca.gov.co

Celular: 3202838493 – 3202838476, Dirección: calle 3 No. 3-45, Código postal. 151820-151827

E-mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co, planeacion@paya-boyaca.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 3 de 10

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al CONTRATO DE OBRA No. **MP-MC-030 DE 2025** de la referencia y busca describir los ítems ejecutados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato de suministros, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto bueno por parte de la secretaria de Planeación Municipal y acompañamiento constante en la realización las actividades:

CANTIDADES EJECUTADAS

1 CASETA CAFETERIA SECUNDARIA							
No	ÍTEM GOBERNACION DE BOYACÁ 2025	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	INCREMENTO POR DISTANCIA 20%	VALOR TOTAL
1.1	2.01.62	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	M2	52,20	\$ 6.371,19	\$ 0,00	\$ 332.576,12
1.2	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	45,00	\$ 10.410,68	\$ 0,00	\$ 468.480,60
1.3	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	10,60	\$ 20.278,06	\$ 0,00	\$ 214.947,44
1.4	2.01.70	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	7,37	\$ 70.577,63	\$ 0,00	\$ 519.874,82
1.5	1.01.03	CONCRETO CICLÓPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	1,49	\$ 503.770,05	\$ 100.754,01	\$ 899.229,54

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 4 de 10

1.6	2.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	1,62	\$ 887.295,00	\$ 177.459,00	1.729.160,50
1.7	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	178,96	\$ 7.675,05	\$ 1.535,01	1.648.224,97
1.8	D	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ESTRUCTURAL REDONDA 3"-3MM PARA COLUMNA	ML	23,50	\$ 96.484,00	\$ 19.296,80	2.720.848,80
1.9	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	4,93	\$ 92.883,83	\$ 18.576,77	\$ 549.500,74
1.10	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI	M2	50,46	\$ 87.627,78	\$ 17.525,56	5.306.037,33
1.11	3.13.24	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	KG	67,11	\$ 7.423,82	\$ 1.484,76	\$ 597.871,11
1.12	2.08.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL. 30	M2	70,00	\$ 42.879,54	\$ 8.575,91	3.601.881,36
1.13	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFLERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	234,00	\$ 22.031,72	\$ 4.406,34	6.186.506,98
1.14	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	234,00	\$ 4.177,57	\$ 835,51	1.173.061,66
1.15	2.08.16	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE PARA	ML	7,00	\$ 94.507,16	\$ 18.901,43	\$ 793.860,14

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 5 de 10

		CUBIERTA ARQUITECTONICA					
1.16		SILLAS DE CAFETRIA TIPO ALCATRAZ	UND	4,00	\$ 980.000,00	\$ 196.000,00	\$ 4.704.000,00
NP-01	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,35	\$ 1.136.574,77	\$ 227.314,95	\$ 474.633,62
NP-02	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	0,22	\$ 1.471.612,53	\$ 294.322,51	\$ 389.918,46
NP-03	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	M2	13,80	\$ 358.866,03	\$ 71.773,21	\$ 5.942.821,46
NP-04	2.19.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO AGUA NEGRA TIPO PESADO D=2"	ML	18,80	\$ 53.175,47	\$ 10.635,09	\$ 1.199.638,60
NP-05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	2,00	\$ 265.906,59	\$ 53.181,32	\$ 638.175,82
NP-06	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML	13,00	\$ 6.522,24	\$ 1.304,45	\$ 101.746,94
NP-07	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UN	2,00	\$ 118.121,28	\$ 23.624,26	\$ 283.491,07
NP-08	2.10.144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN CALIBRE 12	UN	1,00	\$ 99.367,51	\$ 19.873,50	\$ 119.241,01

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 6 de 10

		AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)					
NP-09	2.10.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO EMT 3/4"	UN	2,00	\$ 150.112,15	\$ 30.022,43	\$ 360.269,16
NP-10	2.10.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 18 W	UN	0,00	\$ 28.025,59	\$ 5.605,12	\$ 0,00
NP-11	COTIZACIÓN / REF GOBERNACIÓN	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE DE COBRE AISLADO THHN/THWN AWG No. 12	ML	36,00	\$ 15.541,84	\$ 3.108,37	\$ 671.407,49
NP-12	2.04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.	M2	25,12	\$ 68.169,33	\$ 13.633,87	\$ 2.055.168,34
NP-13	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	45,79	\$ 35.818,47	\$ 7.163,69	\$ 1.967.973,68
COSTO DIRECTO							\$ 45.650.547,74
ADMINISTRACIÓN 20%							\$ 9.130.109,55
IMPREVISTOS 5%							\$ 2.282.527,39
UTILIDAD 5%							\$ 2.282.527,39
VALOR TOTAL							\$ 59.345.712,07

Por tanto, se concluye que el contratista ha cumplido TOTALMENTE con el objeto contractual estipulado en el CONTRATO DE OBRA No. MP-MC-030-2025.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	INFORME	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 7 de 10

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Localización y replanteo	Desmonte de cubierta	
		
Demolición de muros	Excavación manual en material común.	
		
Suministro, figurado y amarre de acero	Concreto viga de amarre 21,1 MPa.	
Elaboró: <i>Lady Paola Garavito Mariño</i> <i>Secretaría de Planeación y Desarrollo</i>	Revisó: <i>Lady Paola Garavito Mariño</i> <i>Secretaria de Planeación y Desarrollo</i>	Aprobó: <i>Juvenal Pérez Vega</i> <i>Alcalde Municipal</i>

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	INFORME	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 8 de 10



Suministro, instalación y pintura de perfiles metálicos, tubería redonda de 2" y 3"



Material de afirmado y malla electrosoldada



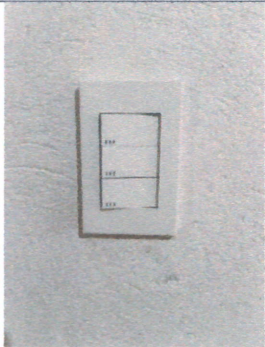
Placa en concreto y cerramiento en malla eslabonada.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo		FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual	INFORME	Página 9 de 10

	
Cubierta galvanizada con caballete.	Ventana en aluminio cal 18.

	
Columnas, viga de amarre aérea, muro en bloque de arcilla, y pañete de afetería	

		
Instalaciones eléctricas		

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo		FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual	INFORME	Página 10 de 10

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

4.1. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado		\$39.712.720,31
Valor adicional		\$19.632.991,76
Valor acta de Liquidación	\$59.345.712,07	
Valor NO ejecutado (-)	\$0,00	
SUMAS IGUALES	\$59.345.712,07	\$59.345.712,07

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado		\$59.345.712,07
Valor total recibido	\$0,00	
Valor saldo multas	0,00	
Valor saldo no ejecutado	\$0,00	
Saldo a favor del contratista	\$59.345.712,07	
Saldo en contra	0,00	
SUMAS IGUALES	\$59.345.712,07	\$59.345.712,07

4.2. VALOR ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL:


CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRES CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$ 59.345.712,07).

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA EL ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención.

En constancia firma,


Ing. LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
Supervisora del contrato

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 1 de 19

Payá (Boyacá), 30 de enero 2026.

Ingeniera:

LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO

Secretaria de Planeación y Desarrollo

Supervisora

Alcaldía Municipal De Paya

Ref.: Informe final de actividades CONTRATO DE OBRA No. **MP-MC-030 DE 2025**.

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma en mi calidad de contratista del Municipio de Paya, con contrato que corresponde a los siguientes datos:

CONTRATO:	MP-MC-030 DE 2025.	
FECHA:	11 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAYA	
NIT:	800.065.411-5	
OBJETO:	CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.	
DURACIÓN:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.	
SUNPENSIÓN 01:	24 DE DICIEMBRE DE 2025	
REINICIO 01:	13 DE ENERO DE 2025	
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nidier Alexis Garcia Garces	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Contratista	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

Web: www.paya-boyaca.gov.co

Celular: 3202838493 – 3202838476, Dirección: calle 3 No. 3-45, Código postal. 151820-151827


E-mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co, planeacion@paya-boyaca.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 2 de 19


PRORROGA 01:	DIEZ (10) DIAS
VALOR INICIAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE. (\$ 39.712.720,31).
VALOR ADICIONAL:	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. (\$ 19.632.991,76).
VALOR TOTAL:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRES CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$ 59.345.712,07).

Manifiesto respetuosamente a usted señora Supervisora que presento informe de actividades en el cual da cuenta del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el contrato referido.

Atentamente,


NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
C.C.: 1.002.734.959 DE AGUAZUL

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nidier Alexis Garcia Garces	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Contratista	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo		FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual	INFORME	Página 3 de 19

INFORME DE ACTIVIDADES	
Informe presentado para suscripción del ACTA FINAL	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	MP-MC-030 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
TELÉFONO DE CONTRATISTA	3229466454
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR	\$ 39.712.720,31
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CDP 551 DE 14/11/2025 y 51 de 15/01/2026 RP 1403 DE 11/12/2025 y 32 DE 20/01/2026
FECHA ACTA DE INICIO	11 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ESTA ACTA	30 DE ENERO DE 2026
PRORROGA	DIEZ (10) DIAS
ADICIONAL	\$ 19.632.991,76
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.
FORMA DE PAGO	la Administración Municipal de PAYA - Boyacá pagará la ejecución del objeto del contrato mediante pagos parciales cumplimiento del servicios y cumplimiento de las obligaciones, elaboración de informe y, constancia de cumplido a satisfacción por parte del supervisor del
Elaboró:	Revisó:
Nidier Alexis Garcia Garces	Lady Paola Garavito Mariño
Contratista	Secretaria de Planeación y Desarrollo
	Aprobó:
	Juvenal Pérez Vega
	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo		FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual	INFORME	Página 4 de 19

	<p>contrato, constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos profesionales; si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.</p>
<p>En cumplimiento del contrato número MP-MC-030-2025 desarrolle las siguientes actividades.</p>	<p>INDICO LA FORMA EN QUE SE DESARROLLARON LAS ACTIVIDADES.</p>

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	M2	52,20	52,20
				
Elaboró:		Revisó:		Aprobó:
Nidier Alexis García Garces		Lady Paola Garavito Mariño		Juvenal Pérez Vega
Contratista		Secretaría de Planeación y Desarrollo		Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	INFORME	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 5 de 19

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.2	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	45,00	45,00
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.3	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	10,60	10,60
				
Elaboró:		Revisó:		Aprobó:
Nidier Alexis Garcia Garces		Lady Paola Garavito Mariño		Juvenal Pérez Vega
Contratista		Secretaria de Planeación y Desarrollo		Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	INFORME	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 6 de 19

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	7,37	7,37
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.5	CONCRETO CICLÓPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	1,49	1,49
				

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nidier Alexis García Garces	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Contratista	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 7 de 19

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.6	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	1,62	1,62
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.7	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	178,96	178,96
				

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nidier Alexis García Garces	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Contratista	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	INFORME	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 8 de 19

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ESTRUCTURAL REDONDA 3"-3MM PARA COLUMNA	ML	23,50	23,50



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.9	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	4,93	4,93



Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nidier Alexis Garcia Garces	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Contratista	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 9 de 19

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.10	PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI	M2	50,46	50,46
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.11	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	KG	67,11	67,11
				
Elaboró:		Revisó:		Aprobó:
Nidier Alexis Garcia Garces		Lady Paola Garavito Mariño		Juvenal Pérez Vega
Contratista		Secretaria de Planeación y Desarrollo		Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	INFORME	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 10 de 19

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL. 30	M2	70,00	70,00
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	234,00	234,00
				

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nidier Alexis Garcia Garces	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Contratista	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 11 de 19

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	234,00	234,00



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA	ML	7,00	7,00



Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nidier Alexis Garcia Garces	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Contratista	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 12 de 19

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.16	SILLAS DE CAFETRIA TIPO ALCATRAZ	UN D	4,00	4,00



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,35	0,35



Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nidier Alexis Garcia Garces	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Contratista	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	INFORME	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 13 de 19

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-02	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	0,22	0,22



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-03	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	M2	13,80	13,80



Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nidier Alexis Garcia Garces	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Contratista	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	INFORME	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 14 de 19

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO AGUA NEGRA TIPO PESADO D=2"	ML	18,80	18,80

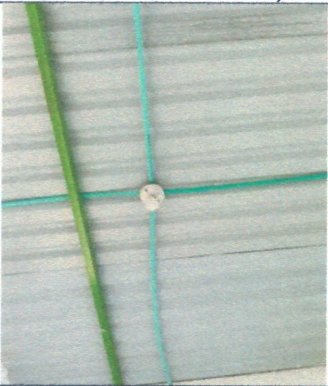


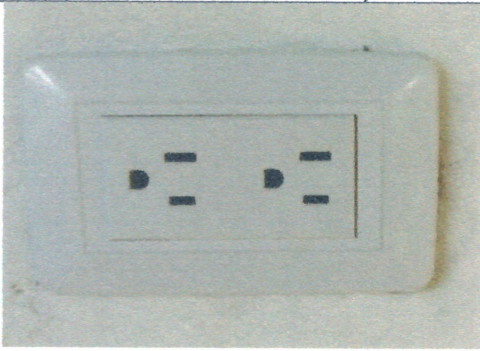
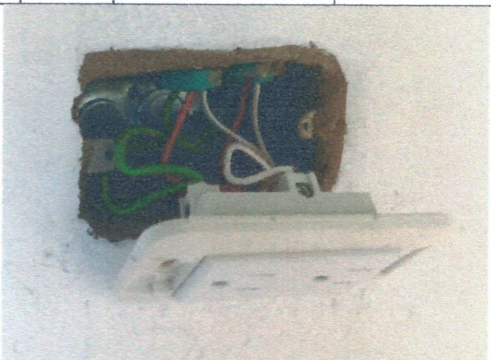
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	2,00	2,00



Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nidier Alexis Garcia Garces	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Contratista	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

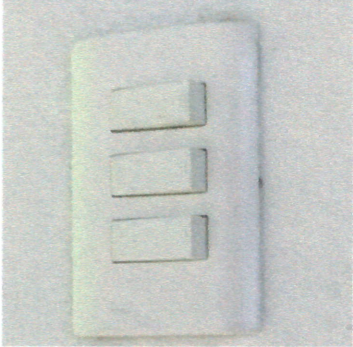

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	INFORME	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 15 de 19

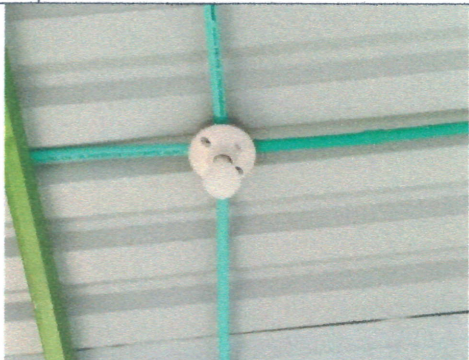
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML	13,00	13,00
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UN	2,00	2,00
				

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nidier Alexis Garcia Garces	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Contratista	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

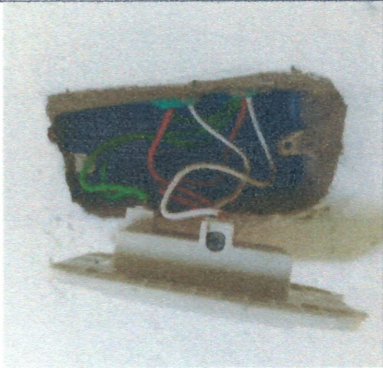
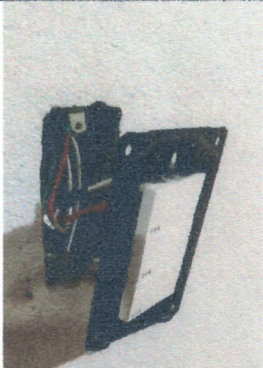
	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual	INFORME	Página 16 de 19

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)	UN	1,00	1,00
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO EMT 3/4"	UN	2,00	2,00
				

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nidier Alexis García Garces	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Contratista	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo	INFORME	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual		Página 17 de 19

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE DE COBRE AISLADO THHN/THWN AWG No. 12	ML	36,00	36,00
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-13	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.	M2	25,12	25,12
				

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nidier Alexis Garcia Garces	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Contratista	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	VERSIÓN: 5
	MACROPROCESO: Apoyo	FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual	INFORME	Página 18 de 19

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-14	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	45,79	45,79
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				


Cumplimiento de aportes a salud y pensión:

De conformidad con la norma vigente, adjunto Comprobante De Recaudo Aportes correspondiente pago de salud, pensión y riesgos laborales de los meses de diciembre 2025 planilla No. 7996984121 y enero 2026 planilla No. 6001200291.

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nidier Alexis Garcia Garces	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Contratista	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-27.01
		VERSIÓN: 5
		FECHA: 18/dic/2024
MACROPROCESO: Apoyo	INFORME	Página 19 de 19
PROCESO: Gestión Contractual		

PAGO APORTES SALUD	Empresa: COOSALUD
PAGO APORTES PENSIÓN	Fondo de Pensiones: PORVENIR
PAGO ARL	Administradora: POSITIVA
FIRMA CONTRATISTA	 NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES C.C.: 1.002.734.959 de Aguazul
APROBÓ: FIRMA DEL SUPERVISOR:	 LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO Secretaria de Planeación y Desarrollo

ANEXOS

ANEXO 1 – SOPORTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 2 – CUENTA DE COBRO

ANEXO 3 – PARAFISCALES

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nidier Alexis Garcia Garces	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Contratista	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social GARCIA GARCES NIDIER ALEXIS identificado con el NIT 1002734959, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
MP-MC-030 DE 2025	CONSTR. CASETA DE ONCES Y CAF	PAYA	36,150	2025-12	04-FEB-2026	155468980
		Total	36,150			

Expedido por el SENA, a los cinco (05) días del mes de Febrero de 2026

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-02-05

Generado por : BLANCA KATHERINE GOMEZ VIANCHA

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web <https://certificadoempresarios.sena.edu.co/> enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 3105451010 y el Número de Certificado: 458650





Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social GARCIA GARCES NIDIER ALEXIS identificado con el NIT 1002734959, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
MP-MC-030 DE 2025	CONSTR. CASETA DE ONCES Y CAF	PAYA	43,750	2026-01	04-FEB-2026	155471113
		Total	43,750			

Expedido por el SENA, a los cinco (05) días del mes de Febrero de 2026

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-02-05

Generado por : BLANCA KATHERINE GOMEZ VIANCHA

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web <https://certificadoempresarios.sena.edu.co/> enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 4205862554 y el Número de Certificado: 458651





MEMORIAS DE CANTIDADES



MUNICIPIO DE PAYA

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO:	MP-MC-030 DE 2025
-----------	-------------------

OBJETO: PAVA - BOYACA
CONSTRUCCION DE CASETA DE UNCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA ANAYA DEL MUNICIPIO DE

ELABORO:	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES	CONTRATISTA:	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES	NIT:	1.002.734.959-6
----------	-----------------------------	--------------	-----------------------------	------	-----------------

NIT:

1.002.734.959-6

DATOS ESPECIFICOS:

CAPITULO: 1

ITEN

SUB. ITEM	I. GOBER.
-----------	-----------

ACION

UND

CASETA CAFETERIA SECUNDARIA

1.1

2.01.62

LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA

M12

DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA

[illegible]

TOTAL

52,20



~~NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
CONTRATISTA~~

LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

~~ANDERSON ALVEIRO~~ MALDONADO PEREZ
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION



NIDIER GARCIA

Ingeniero Civil

MEMORIAS DE CANTIDADES

MUNICIPIO DE PAYA



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO: MP-MC-030 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAÑA DEL MUNICIPIO DE

ELABORO: NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

CONTRATISTA: NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

NIT:

1.002.734.959-6

DATOS ESPECIFICOS:

CAPITULO: 1

ITEM

SUB. ITEM

I. GOBER.

DESCRIPCION

UND

CASETA CAFETERIA SECUNDARIA

1.2

DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA

M2

DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA



LOCALIZACION

CASETA

LONGITUD (m)

7,5

ANCHO (m)

6

ALTO

Vanos

Cantidad Unitaria

Cantidad Total

45,00

TOTAL

45,00

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
CONTRATISTA

LARRY GARCIA MARINO
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

ANDERSON ALVEIRO MALDONADO PEREZ
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION



MEMORIAS DE CANTIDADES



MUNICIPIO DE PAYA

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ingeniero Civil

CONTRATO:	MP-MC-030 DE 2025
-----------	-------------------

MP-MC-030 DE 2025

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE
---------	---

ELABORO:	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES	CONTRATISTA:	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES	NIT:	1.002.734.959-6
----------	-----------------------------	--------------	-----------------------------	------	-----------------

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

CONTRATISTA:	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
--------------	-----------------------------

NIT:

1.002.734.959-6

DATOS ESPECÍFICOS:

CAPITULO: 1

ITEM

SUB. ITEM	I. GOBER.
-----------	-----------

DESCRIPCION

UND

CASETA CAFETERIA SECUNDARIA

1.4

2.01.70

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)

M3

DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA

[illegible]

TOTAL

7.37



~~NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES~~
~~CONTRATISTA~~

LADY MAGDA GARCIA VITO MARIÑO
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

ANDERSON ALEJANDRO MALDONADO PEREZ
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION



NIDIER GARCIA

MEMORIAS DE CANTIDADES

MUNICIPIO DE PAYA



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO: MP-MC-030 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.

ELABORADOR: NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

CONTRATISTA:

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

NIT:

1.002.734.959-6

DATOS ESPECIFICOS:

CAPTULO: 1

ITEM

SUB. ITEM

I. GOBER.

DESCRIPCION

UND

CASETA CAFETERIA SECUNDARIA

1.5

1.01.03

CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACION 60C/40P

M3

DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA



LOCALIZACION

DIMENSIONES

LONGITUD (m)

ANCHO (m)

ALTO

Vanos

Cantidad Unitaria

Cantidad Total

EJE B

3

0.25

0.35

0.26

EJE 1

8

0.25

0.35

0.70

6

0.25

0.35

0.53

TOTAL

1.49

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
CONTRATISTA

LADY PAOLA GARCIA MARINO
SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACION

ANDERSON ALVEIRO MALDONADO PEREZ
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION



MEMORIAS DE CANTIDADES

MUNICIPIO DE PAYA



NIDIER GARCIA

Ingeniero Civil

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO: MP-INC-030 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA

ELABORO: NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

CONTRATISTA:

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

NIT:

1.002.734.959-6

DATOS ESPECIFICOS:

CAPITULO: 1		ITEM	SUB. ITEM	I. GOBER.	DESCRIPCION	UND				
CASETA CAFETERIA SECUNDARIA		1.7		2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG				
DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA					LOCALIZACION	DIMENSIONES	Cantidad Unitaria	Cantidad Total		
					LONGITUD (m)	KG/M	ALTO			
					EJE 1	8.7	0.56		4.00	19.49
						1.12	0.56		58.00	36.38
					EJE A	5.8	0.56		4.00	12.99
						1.12	0.56		39.00	24.46
					EJE B	5.8	0.56		4.00	12.99
						1.12	0.56		39.00	24.46
						3.5	0.56		6.00	11.76
						0.65	0.56		24.00	8.74
						3.7	0.56		6.00	12.43
						0.65	0.56		25.00	9.10
						1.5	0.56		3.00	2.52
						0.65	0.56		10.00	3.64
TOTAL					178.96					

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
CONTRATISTA

LADY PAOLA GARCIA MARINO
SUPERVISOR, SECRETARIA DE PLANEACION

ANDERSON ALVAREZ MALDONADO PEREZ
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION



האגודה הלאומית לבריאות הילדים



MUNICIPIO DE PAYA

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO:	MP-MC-030 DE 2025
-----------	-------------------

MP-MC-030 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCION DE CASETA DE UNCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA MAMITA DEL MUNICIPIO DE PAYA BOYACA

PAYA - BOYACA.

ELABORO:	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES	CONTRATISTA:	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES	NIT:	1.002.734.959-6
----------	-----------------------------	--------------	-----------------------------	------	-----------------

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

CONTRATISTA:	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
--------------	-----------------------------

NIT:

1.002.734.959-6

DATOS ESPECÍFICOS:

CAPITULO: 1

2

SUB. ITEM	I. GOBER.
-----------	-----------

DESCRIPCION

UND

CASETA CAFETERIA SECUNDARIA

1.9

2.05.06

BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO

M13

DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			Vanos	Cantidad Unitaria	Cantidad Total
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO			
CASETA	8,5	5,8	0,1		1,00	4,93
TOTAL						4,93

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

LADY PAOLA GARAVITO MARINO

~~SECRETARIA DE PLANEACION~~

~~ANDERSON ALVEIRO MALDONADO PEREZ~~
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION



MEMORIAS DE CANTIDADES



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO:	MP-MC-030 DE 2025
-----------	-------------------

OBJETO: **PAYA - BOYACA**

ELABORO:	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
----------	-----------------------------

DATOS ESPECÍFICOS:

CAPITULO: 1

ITEM

SUB. ITEM	I. GOBER.
-----------	-----------

CASETA CAFETERIA SECUNDARIA

1.10

2.05.26

PLACA BASE EN CONCRETO $E = 0.10 \cdot 10^5 \text{ PSI}$

DESCRIPCION

UND

DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			Vanos	Cantidad Unitaria	Cantidad Total
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO			
CASETA	8,7	5,8			1,00	50,46
TOTAL						50,46

TOTAL

50,46

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
CONTRATISTA

~~LADY PAOLA GAVITO MARIÑO~~
~~SUPERVISORA SECRETARIA DE PLANEACION~~

ANDERSON ALIERO MALDONADO PEREZ
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION



MEMORIAS DE CANTIDADES



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO:	IMP-MC-030 DE 2025
-----------	--------------------

OBJETO: CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA

OBJETO:	PAYA - BOYACA.
---------	----------------

ELABORO:	INDIER ALEXIS GARCIA GARCES
----------	-----------------------------

CONTRATISTA:

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

NIT:

1.002.734.959-6

DATOS ESPECIFICOS:

CAPITULO: 1

ITEM

SUB. ITEM	I. GOBER.
-----------	-----------

DESCRIPCION

UNID

CASETA CAFETERIA SECUNDARIA

1.11

3.13.24

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE
 SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)

KG

DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA

LOCALIZACION

 (m)

ANCHOR

KG/M2

Unitaria	Cantidad
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

67,11

EJE 1

—

5,8

1,33

7,00

11,18

A large, rectangular, brown, textured object, possibly a piece of wood or a large brick, with a grid-like pattern of small, square indentations. The object is oriented vertically and occupies most of the frame.

TOTAL

67,11

~~NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES~~

~~CONFIDENTIAL~~

LADY ~~PROFE~~ GARAYTQ MARINO

~~SECRETARIA DE PLANEACION~~

ANDERSON ALYREIRO MALDONADO PEREZ

PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION



MEMORIAS DE CANTIDADES

MUNICIPIO DE PAYA



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO:	MP-MC-030 DE 2025
-----------	-------------------

OBJETO: CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA

OBJETO:	PAYA - BOYACA.
---------	----------------

ELABORO:	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES	CONTRATISTA:	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
----------	-----------------------------	--------------	-----------------------------

NIT:

1.002.734.959-6

DATOS ESPECIFICOS:

CAPITULO: 1

ITEM

SUB. ITEM	I. GOBER.
-----------	-----------

DESCRIPCION

UNID

CASETA CAFETERIA SECUNDARIA

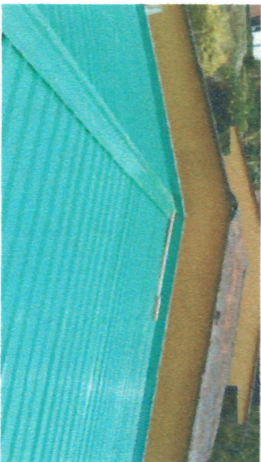
1.12

2.08.07

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL CAL. 30

M12

DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA



LOCALIZACION	CUBIERTA
--------------	----------

LONGITUD (m)	
10	

ANCHOR	(m)
	7

ALTO

Vanos

Cantidada
Unitaria

Cantidad Total

CUBIERTA

10

[illegible]

1

1,00

70,00

TOTAL

70.00

~~NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES~~

~~CONTRATISTA~~

LADY ~~PAOLA~~ GARAYTO MARIÑO

~~SUPERVISOR~~ SECRETARÍA DE PLANEACION

ANDERSON ALVEIRO MALDONADO PEREZ

PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION



NIDIER GARCIA
Ingeniero Civil

MEMORIAS DE CANTIDADES

MUNICIPIO DE PAYA



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO: MP-MC-030 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA

ELABORO: NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

CONTRATISTA:

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

NIT:

1.002.734.959-6

DATOS ESPECIFICOS:

CAPITULO: 1

ITEM

SUB. ITEM I. GOBER.

DESCRIPCION

UND

CASETA CAFETERIA SECUNDARIA

1.14

3.13.28

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SINTETICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).

KG

DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA



LOCALIZACION

DIMENSIONES

LONGITUD (m)

KG/M

ALTO

Cantidad Unitaria

Cantidad Total

TUBO RECT. C. 18 3*1 1/2

7

4.5

2.6

9.00

6.00

163.80

70.20

TOTAL

234.00

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
CONTRATISTA

LADY PAULICARANTO MARINO
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

ANDERSON ALVEIRO MALDONADO PEREZ
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION



NIDIER GARCIA
Ingeniero Civil

MEMORIAS DE CANTIDADES

MUNICIPIO DE PAYA



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO: MP-MC-030 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.

ELABORO: NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

CONTRATISTA: NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

NIT:

1.002.734.959-6

DATOS ESPECIFICOS:

CAPTULO: 1

ITEM

SUB. ITEM

I. GOBER.

DESCRIPCION

UND

CASETA CAFETERIA SECUNDARIA

1.15

2.08.16

SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA

ML

DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA



LOCALIZACION

DIMENSIONES

LONGITUD (m)

ANCHO (m)

ALTO

Vanos

Cantidad Unitaria

Cantidad Total

cubierta

7

1,00

7,00

TOTAL

7,00

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
CONTRATISTA

LADY PAOLA GABAVITO MARINO
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

ANDERSON ALVEIRO MALDONADO PEREZ
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION



NIDIER GARCIA
Ingeniero Civil

MEMORIAS DE CANTIDADES

MUNICIPIO DE PAYA



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO: MP-MC-030 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.

ELABORO: NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

CONTRATISTA:

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

NIT:

1.002.734.959-6

DATOS ESPECIFICOS:

CAPITULO: 1

ITEM

SUB. ITEM

I. GOBER.

DESCRIPCION

UND

CASETA CAFETERIA SECUNDARIA

1.16

0

SILLAS DE CAFETERIA TIPO ALCAITRAZ

UND

DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA



LOCALIZACION

DIMENSIONES
LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTO

Vanos

Cantidad Unitaria

Cantidad Total

4,00

4,00

0,00

0,00

TOTAL

4,00

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
CONTRATISTA

LADY PABLO GARCIA MARINO
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

ANDERSON ALVEIRO MALDONADO PEREZ
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION



MEMORIAS DE CANTIDADES



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO:	MP-MC-030 DE 2025
-----------	-------------------

OBJETO:
CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE
PAYA - BOYACA.

ELABORO:	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES	CONTRATISTA:	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES	NIT:	1.002.734.959-6
----------	-----------------------------	--------------	-----------------------------	------	-----------------

NIT:

1.002.734.959-6

CAPITULO: 1

ITEM

SUB. ITEM	I. GOBER.

DESCRIPCION

UNDP

CASETA CAFETERIA SECUNDARIA

NP-02

2.03.29

VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI),

M13

DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION

DIMENSIONES	
(m)	ANCHO

ALTO

Vanos

Unitaria

Cantidad Total

2.2

0,12

0,2

1,00

0,05

1

—

1000

TOTAL

0.22

ANDRÉS ALEXIS GARCÍA GARCÉS
CONTRATISTA

~~LADY PAOLA GARAYITO MARINO~~
~~SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACION~~

ANDERSON ALVEIRO MALDONADO PEREZ
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION



NIDIER GARCIA
Ingeniero Civil

MEMORIAS DE CANTIDADES

MUNICIPIO DE PAYA



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO: MP-MC-030 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA

ELABORO: NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

CONTRATISTA:

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

NIT:

1.002.734.959-6

DATOS ESPECIFICOS:

CAPITULO: 1

ITEM

SUB. ITEM

I. GOBER.

DESCRIPCION

UND

CASETA CAFETERIA SECUNDARIA

NP-03

2.19.06

CERRAMIENTO EN MALLA ESILABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")

M2

DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA



LOCALIZACION

DIMENSIONES

LONGITUD (m)

ANCHO (m)

ALTO

Vanos

Cantidad Unitaria

Cantidad Total

2,5

7,3

1,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



MEMORIAS DE CANTIDADES

MUNICIPIO DE PAYA



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO:	MP-MC-030 DE 2025
-----------	-------------------

OBJETO: CONSTRUCCION DE CASETA DE UNCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA MARTA DEL MUNICIPIO DE PAVA BOYACA

ELABORO:	NIDER ALEXIS GARCIA GARCES	CONTRATISTA:	NIDER ALEXIS GARCIA GARCES	NIT:	1.002.734.959-6
----------	----------------------------	--------------	----------------------------	------	-----------------

NIT:

1.002.734.959-6

DATOS ESPECIFICOS:

CAPITULO: 1

EM

I. GOBER.

DESCRIPCION

UND

CASETA CAFETERIA SECUNDARIA

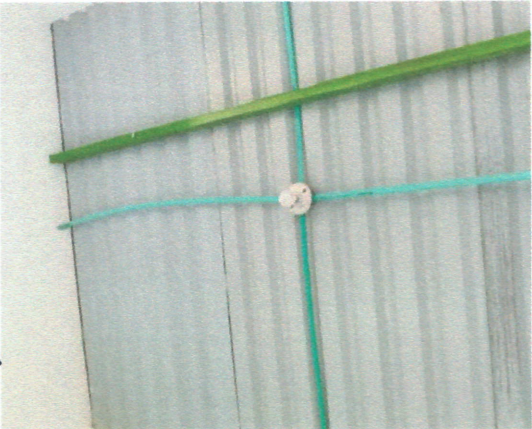
-07

2.10.90

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2".
(TIPO PESADO - DB).

ML

DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA

[illegible]

MIDIER ALEXIS GARCIA GARCIA
CONTRATISTA

LADY PAOLA GONZALEZ MARIÑO
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

~~ANDERSON ALVEIRO MALDONADO PEREZ~~
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION



NIDIER GARCIA
Ingeniero Civil

MEMORIAS DE CANTIDADES

MUNICIPIO DE PAYA



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO: MP-MC-030 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA

ELABORO: NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

CONTRATISTA: NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

NT:

1.002.734.959-6

DATOS ESPECIFICOS:

CAPITULO: 1

ITEM

SUB. ITEM

I. GOBER.

DESCRIPCION

UND

CASETA CAFETERIA SECUNDARIA

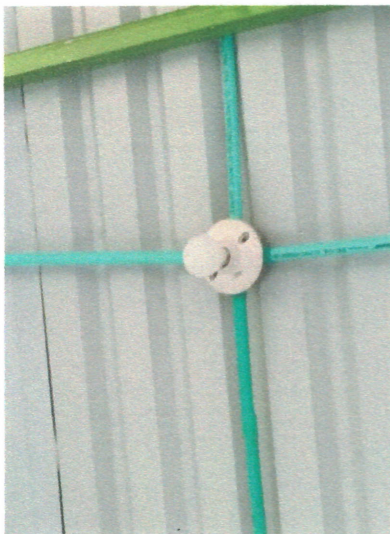
NP-10

2.10.165

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO EMT 3/4"

UN

DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA



LOCALIZACION

DIMENSIONES
LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTO

Vanos

Cantidad Unitaria Cantidad Total

2.0 2.00

TOTAL

2.00

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
CONTRATISTA

LADY PAOLA RESTREPO MARINO
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

ANDERSON ALVEIRO MALDONADO PEREZ
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION



MEMORIAS DE CANTIDADES



NIDIER GARCIA
Ingeniero Civil

MUNICIPIO DE PAYA

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO:	MP-MC-030 DE 2025
-----------	-------------------

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.
----------------	--

OBJETO:
PAYA - BOYACA.

PAYA - BOYACA.

ELABORO:	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES	CONTRATISTA:	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
----------	-----------------------------	--------------	-----------------------------

ELABORO:

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

CONTRATISTA:

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

NIT:

1.002.734.959-6

DATOS ESPECIFICOS:

CAPITULO: 1

ITEM

	SUB. ITEM
I. GOBER.	

DESCRIPTION

UND

CASETA CAFETERIA SECUNDARIA

NP-12

COTIZACION	
N / REF	
GOBERNACION	

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE DE COBRE
AISLADO THHN/THWN AWG No. 12

ML

DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA

LOCALIZACION

GITUD (m)

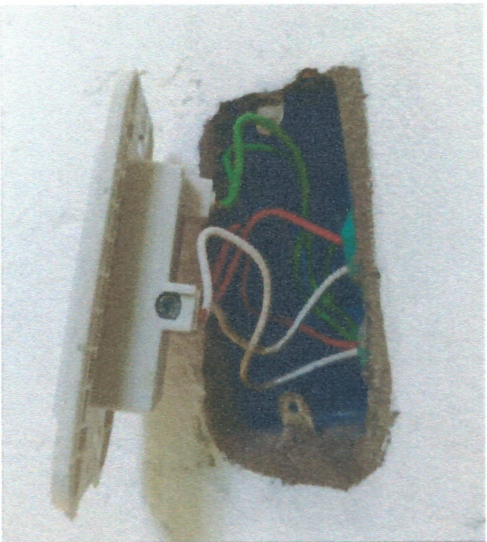
(m)

ALTO

...

Unitaria

10



TOTAL

36,00

MIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
CONTRATISTA

LADY PAOLA SABA VITO MARINO
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

ANDERSON ALVEIRO MALDONADO PEREZ
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION



MEMORIAS DE CANTIDADES



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO:	MP-MC-030 DE 2025
-----------	-------------------

OBJETO:	PAYA - BOYACA
---------	---------------

ELABORO:	NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES
----------	-----------------------------

CONTRATISTA:

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

NIT:

1.002.734.959-6

CAPITULO: 1

ITEM

SUB. ITEM 1.0

DESCRIPCION

UNID

CASETA CAFETERIA SECUNDARIA

NP-13

2.04.14

MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M

M12

DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA

LOCALIZACION

LONGITUD (m)

ANCHHO

AI TO

Vanos

Unitaria

Cantidad Total



TOTAL

25,12

~~MIDIER ALEXIS GARCIA GARCES~~
~~CONTRATISTA~~

LADY PAOLA GARAVITO MARINO
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

ANDERSON ALVEIRO MALDONADO PEREZ
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION



NIDIER GARCIA
Ingeniero Civil

MEMORIAS DE CANTIDADES



MUNICIPIO DE PAYA

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO: MP-MC-030 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCION DE CASETA DE ONCES Y CAFETERIA DE LA SEDE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMONA AMAYA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.

ELABORO: NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

CONTRATISTA:

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES

NTT:

1.002.734.959-6

DATOS ESPECIFICOS:

CAPITULO: 1	ITEM	SUB. ITEM	I. GOBER.	DESCRIPCION	UND
CASETA CAFETERIA SECUNDARIA	NP-14		1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2
DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA					
TOTAL					45,79

NIDIER ALEXIS GARCIA GARCÉS
CONTRATISTA

LADY PANTOJA CAMACHO MARIÑO
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

ANDERSON ALVEIRO MALDONADO PEREZ
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACION
