



1868

INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

INFORME NO. 2 DE OBRA

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

PERIODO

01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA NO. 251 DE 2025
CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 239 DE 2025
- CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

SUPERVISOR

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TAME
AGOSTO DE 2025



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	ASPECTOR PRECONTRACTUALES	6
2.1.	PROCESO DE SELECCIÓN	6
2.2.	CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	6
3.	ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO	6
3.1.	DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR	6
3.2.	LOCALIZACIÓN	7
3.3.	ALCANCE DEL PROYECTO	10
4.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	11
4.1.	GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA	11
4.1.1.	Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de Obra	11
4.2.	GARANTIAS DEL CONTRATO	12
4.2.1.	Pólizas de Legalización	12
4.2.2.	Pólizas Según Acta de Inicio	12
4.3.	IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES	13
4.4.	ACTOS ADMINISTRATIVOS	13
4.4.1.	Conformación de la veeduría ciudadana	15
4.5.	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES AL CONTRATO	15
4.6.	ACTAS DE COMITÉ TECNICOS	16
4.7.	CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA	16
4.8.	BITACORA DIARIA DE OBRA	17
4.9.	VALLA INFORMATIVA	18
4.10.	VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	18
4.10.1.	Personal Mínimo Requerido	18
4.10.2.	Personal Administrativo Vinculado	19
4.10.3.	Personal Operativo Obra	20
4.10.4.	Pagos de Personal – Nominas	21
4.11.	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	21
4.11.1.	Dotación del personal	21
4.11.2.	Examen médico ocupacional de ingreso	22



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

4.11.3.	Señalización de la obra	22
4.11.4.	Accidentalidad en la obra	23
4.12.	CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO	23
5.	ASPECTOS TÉCNICOS	26
5.1.	CONDICIONES CONTRACTUALES	26
5.2.	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS MES DE AGOSTO 2025	35
5.2.1.	Descripción de las actividades desarrolladas mes de agosto	41
5.2.2.	Memorias de cálculo mes de septiembre	53
5.3.	AVANCE DE LA OBRA	53
5.3.1.	Avance Físico de la obra	53
5.3.2.	PROGRAMADO VS EJECUTADO	54
5.4.	ENSAYOS DE LABORATORIO	56
6.	ASPECTOS FINANCIEROS	57
6.1.	FORMA DE PAGO	57
6.2.	ANTICIPO	58
6.2.1.	Estado de la cuenta bancaria de obra	60
6.3.	PLAN DE MANEJO DE ANTICIPO	60
6.4.	AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL	60
6.5.	CONTROL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	60
7.	ASPECTOS AMBIENTALES	61
7.1.	SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES	61
7.2.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (PGIO) ...	61
7.3.1.	Programas de manejo ambiental del proyecto	63
8.	CONCLUSIONES	63

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1.	Ubicación específica de Sede Educativa El Porvenir	8
Ilustración 2.	Ubicación específica de Sede Educativa Gonzalo Jiménez de Quesada ..	9
Ilustración 3.	Ubicación específica de Sede Educativa Cristobal Colon	9
Ilustración 4.	Ubicación específica de Sede Educativa Santa Teresita	10
Ilustración 5.	Socialización del proyecto	14
Ilustración 6.	Valla informativa	18
Ilustración 7.	Entrega elementos de protección personal	21
Ilustración 8.	Señalización de la obra	22
Ilustración 9.	Ensayos de laboratorios	56



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación de Sedes Educativas	7
Tabla 2 Ficha técnica del contrato	11
Tabla 3 Pólizas de Cumplimiento contrato de Obra No. 251 del 2025.	12
Tabla 4 Pólizas de Responsabilidad civil del contrato de Obra No. 251 del 2025.	12
Tabla 5 Pólizas de Cumplimiento según acta de inicio Anexo 1 y 2	12
Tabla 6 Pólizas de Responsabilidad civil según acta de inicio Anexo 1	13
Tabla 7 Actos Administrativos Contrato de Obra No. 251-2025	13
Tabla 8. Conformación de la veeduría ciudadana del contrato de obra No. 251-2025	15
Tabla 9. Actas de Comités de obra	16
Tabla 10 Relación de correspondencia enviada	16
Tabla 11 Relación de correspondencia recibida	17
Tabla 12 Personal mínimo requerido	19
Tabla 13 Personal administrativo vinculado mes de agosto de 2025	19
Tabla 14 Personal operativo vinculado mes de agosto de 2025	20
Tabla 15 Dotación del personal en obra de elementos de protección	21
Tabla 16 Condiciones contractuales del Contrato de Obra No. 251 del 2025.....	26
Tabla 17 Cantidades ejecutadas mes de agosto de 2025	35
Tabla 18 Programado vs Ejecutado.....	54
Tabla 19 Ensayos de laboratorio	56
Tabla 20 Plan de manejo de anticipo	60
Tabla 21 Balance financiero	60
Tabla 22 Ordenes de operación	61

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Copia de acta de comité	16
Anexo 2. Copia de correspondencia enviada y recibida mes de agosto.....	17
Anexo 3. Copia de bitácora de obra.....	17
Anexo 4. Copia de planillas de seguridad social mes de agosto de 2025 y nominas.....	20
Anexo 5. Memorias de calculo	53
Anexo 6. Copia de ensayos de laboratorio y certificados de calidad de materiales. ...	57
Anexo 7. Copia ordenes de operación mes de agosto.....	61
Anexo 8. Copia informe mensual de implementación de PGIO	63



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual de ejecución de actividades corresponde al contrato de obra No. 251 de 2025, denominado **"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDÍGENAS EL PORVENIR, GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA, CRISTÓBAL COLÓN Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, desarrollado por el contratista de obra CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC representado legalmente por LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO, en el marco del contrato suscrito con la entidad contratante Municipio de Tame.

Para el presente proyecto, se realizó convenio interadministrativo No. SG 0097 2025, suscrito entre la Agencia de Renovación del Territorio y el Municipio de Tame, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDÍGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA", en el cual, cada parte realizo un aporte financiero para la ejecución del proyecto.

Este informe abarca el periodo comprendido entre **01 de agosto al 31 de agosto de 2025**, y tiene como finalidad exponer de manera clara y detallada las actividades ejecutadas durante dicho intervalo, los avances físicos obtenidos, el uso de recursos, y el cumplimiento del cronograma establecido. Asimismo, se incluyen las novedades presentadas en la ejecución, tales como factores técnicos, climáticos o administrativos que hayan tenido impacto sobre el desarrollo normal de las labores.

La elaboración de este documento permite mantener una trazabilidad precisa del estado del proyecto, facilitando el seguimiento y control por parte de la interventoría y demás entes de supervisión, asegurando así el cumplimiento de los objetivos contractuales y la calidad de las obras destinadas al fortalecimiento de la infraestructura educativa rural indígena del municipio de Tame.

El avance físico acumulado del proyecto, al cierre del mes de agosto, se estima en aproximadamente **12.10%** equivalente a **\$ 435.768.435,30** M/CTE. Las actividades ejecutadas durante este periodo se realizaron bajo los lineamientos técnicos y normativos establecidos, y contaron con la supervisión constante del equipo técnico del contratista y la interventoría.



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

2. ASPECTOR PRECONTRACTUALES

2.1. PROCESO DE SELECCIÓN

Considerado el proceso licitatorio realizado por el Municipio de Tame (Arauca) según la apertura al proceso de Licitación Obra Pública No. LP-TA-003-2025 resolución No. 610 del 29 de mayo de 2025, con Certificado de Disponibilidad Presupuestal de la Alcaldía por concepto de con financiación N° CDP20250219003 del 19 de febrero de 2025 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° CDP20250513001 del 13 de mayo de 2025

Se realiza la apertura del concurso para verificar el cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y organizacionales de la propuesta presentada por CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC y representada legalmente por LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO.

2.2. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

Se procedió a la suscripción del contrato de obra No. 251 de 2025 el día siete (07) de julio de 2025, entre el señor alcalde del Municipio de Tame y la firma contratista CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC representada legalmente por LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO, el cual tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA, con un plazo de ejecución de CINCO (05) MESES a partir de la fecha de acta de inicio, por un valor de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA CENTÉSIMAS M/CTE (\$ 3.599.933.228,60).

3. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO

3.1. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

En el departamento de Arauca existen seis pueblos indígenas oficialmente reconocidos: U'wa, Makaguan, Sikuni, Betoy, Inga e Hitnú, los cuales cuentan con 26 resguardos legalmente constituidos. El municipio de Tame concentra el 46% de la población indígena del departamento, con 14 resguardos agrupados en cuatro pueblos principales: Makaguan, Betoy, U'wa e Hitnú.

Dentro del pueblo Betoy, ubicado en la zona rural suroccidental de Tame (veredas Carrao, Sifalu y Casiabo), se encuentran cuatro comunidades: Genareros, Roqueros, Julieros y Velazqueros, cada una con su propio caserío. Estas comunidades presentan serias limitaciones en condiciones de infraestructura, acceso a servicios básicos y bienestar general.



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Las sedes educativas Cristóbal Colón, Santa Teresita, Gonzalo Jiménez de Quesada y El Porvenir, pertenecientes a la Institución Educativa Guahibo Betoy, carecen de cerramiento perimetral y espacios recreativos, lo cual expone a los estudiantes a situaciones de inseguridad, vandalismo e ingreso de personas y animales sin control.

La ausencia de escenarios deportivos también limita el desarrollo físico y social de los niños y jóvenes, promoviendo el sedentarismo, el mal uso del tiempo libre y el deterioro de su salud física y mental.

A estas condiciones se suman graves problemáticas sociales que enfrenta la población indígena en Tame, como pobreza multidimensional, violencia, mortalidad infantil, reclutamiento forzado y desplazamientos debido al conflicto armado. Todo esto se ve agravado por la escasa presencia del Estado y la insuficiente inversión en infraestructura básica como educación, salud, vivienda, recreación y deporte.

Ante este panorama, es fundamental que las instituciones gubernamentales adopten medidas integrales y culturalmente pertinentes para garantizar los derechos de estas comunidades, promover su participación activa y preservar su identidad cultural. La ejecución de proyectos como el cerramiento perimetral y la construcción de escenarios deportivos en las sedes educativas indígenas representa una respuesta urgente y necesaria para mejorar sus condiciones de vida y fortalecer el tejido social de estas comunidades vulnerables.

3.2. LOCALIZACIÓN

Este proyecto se llevará a cabo en zona rural del Municipio de Tame, Departamento de Arauca, específicamente en el Resguardo Indígena Guahibo Betoy, comprendiendo las sedes educativas: El Porvenir, Gonzalo Jiménez de Quesada, Cristóbal Colón y Santa Teresita.

Tabla 1. Ubicación de Sedes Educativas

UBICACIÓN GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA
Región: Orinoquia Departamento: Arauca Municipio: Tame Tipo de Agrupación: Resguardo Agrupación: Julieros	Centro educativo Porvenir (6°30'27.92"N 71°31'23.76"W)
Región: Orinoquia Departamento: Arauca Municipio: Tame Tipo de Agrupación: Resguardo Agrupación: Velazqueros	Gonzalo Jiménez de Quesada (6° 30'9.37"N 71°32'7.02"W)



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Región: Orinoquia Departamento: Arauca Municipio: Tame Tipo de Agrupación: Resguardo Agrupación: Ganareros	Centro Educativo Cristóbal Colón (6°30'28.38"N 71°36'18.33"W)
Región: Orinoquia Departamento: Arauca Municipio: Tame Tipo de Agrupación: Resguardo Agrupación: Roqueros El Dorado	Centro Educativo Santa Teresita (6°30'11.4"N 71°35'38.2"W)

Fuente: Anexo 1 - Anexo técnico

Ilustración 1. Ubicación específica de Sede Educativa El Porvenir



Fuente: Google Earth




INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Ilustración 2. Ubicación específica de Sede Educativa Gonzalo Jiménez de Quesada



Fuente: Google Earth

Ilustración 3. Ubicación específica de Sede Educativa Cristobal Colon

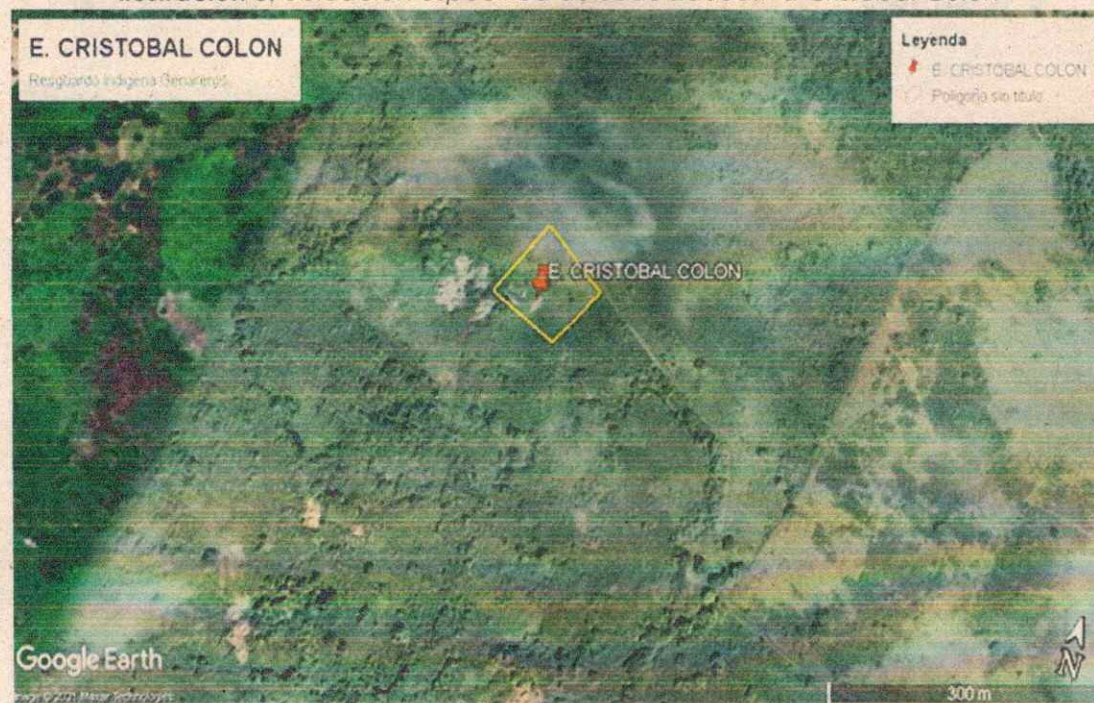

Fuente: Google Earth



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Ilustración 4. Ubicación específica de Sede Educativa Santa Teresita



Fuente: Google Earth

3.3. ALCANCE DEL PROYECTO

En el marco del proyecto de Construcción de Cerramiento Perimetral y Escenarios Deportivos en las escuelas indígenas El Porvenir, Gonzalo Jiménez de Quesada, Cristóbal Colón y Santa Teresita, se ejecutarán dos componentes principales de obra: Cerramiento Perimetral y Obras Complementarias, y Construcción de Cancha Múltiple. Cada uno incluye actividades como preliminares, estructuras en concreto, mampostería, estructuras metálicas, e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, según aplique.

Se construirá un total de 1.245,20 metros lineales de cerramiento, distribuidos así: 227 ml en El Porvenir, 342 ml en Gonzalo Jiménez, 395 ml en Cristóbal Colón y 281,20 ml en Santa Teresita.

El cerramiento será en malla eslabonada calibre 12 (2"x2"), con tubería galvanizada de 2"x2.5 mm y brazo doble para alambre y concertina, anclado a una viga de cimentación en concreto de 3000 psi con zapatas. Las columnetas en concreto permitirán el anclaje de la estructura y el confinamiento de la mampostería en ladrillo a la vista. Además, se instalarán portones y puertas peatonales con marcos metálicos, apoyados en columnas de concreto.



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

4.1.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de Obra

Tabla 2 Ficha técnica del contrato

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC NIT: 901.962.949-1
REPRESENTANTE LEGAL:	R/L. LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
NIT. No:	901.962.949-1
CONTRATO DE OBRA No:	251 DE 2025
INTERVENTORIA EXTERNA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS NIT: 901.958.438-2
REPRESENTANTE LEGAL:	R/L. PEDRO LUIS USMA VILLA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA CENTÉSIMAS M/CTE (\$3.599.933.228,60).
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP20250219003 DEL 19 DE FEBRERO DE 2025 CDP20250513001 DEL 13 DE MAYO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP20250707001 DEL 07 DE JULIO DE 2025
PLAZO CONTRACTUAL:	CINCO (05) MESES
VALOR DEL ANTICIPO (50%):	\$ 1.799.966.614,30
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	07 DE JULIO DE 2025
FECHA INICIO:	15 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025

Fuente: Elaboración propia



1879

INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

4.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas por el Municipio de Tame en el Contrato de Obra No. 251 de 2025, se suscribe con la compañía de SEGUROS MUNDIAL, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual.

4.2.1. Pólizas de Legalización

Las pólizas iniciales fueron expedidas el 08/07/2025 por la Aseguradora SEGUROS MUNDIAL, tomadas por CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC y como asegurado el Municipio de Tame.

Tabla 3 Pólizas de Cumplimiento contrato de Obra No. 251 del 2025.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO. 251-2025					
ANEXO	POLIZA No.	AMPAROS	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
0	COQ-100006184 Seguros Mundial Aprobación 09 de julio de 2025	Cumplimiento	07/07/2025	07/06/2026	\$ 719.986.645,80
		Buen manejo del Anticipo	07/07/2025	07/04/2026	\$ 1.799.966.614,50
		Prestaciones sociales	07/07/2025	07/12/2028	\$ 179.996.661,45
		Estabilidad de la obra	07/12/2025	07/12/2030	\$ 719.986.645,80

Tabla 4 Pólizas de Responsabilidad civil del contrato de Obra No. 251 del 2025.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO. 251-2025					
ANEXO	POLIZA No.	AMPAROS	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
0	COQ-100001555 Seguros Mundial Aprobación 09 de julio de 2025	Responsabilidad civil	07/07/2025	07/12/2025	\$ 569.400.000,00

4.2.2. Pólizas Según Acta de Inicio

Las pólizas según acta de inicio fueron expedidas el 21/07/2025 por la Aseguradora SEGUROS MUNDIAL, tomadas por CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC y como asegurado el Municipio de Tame.

Tabla 5 Pólizas de Cumplimiento según acta de inicio Anexo 1 y 2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN ACTA DE INICIO					
ANEXO	POLIZA No.	AMPAROS	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
1 y 2	COQ-100006184 Seguros Mundial Aprobación 21 de julio de 2025	Cumplimiento	15/07/2025	15/06/2026	\$ 719.986.645,80
		Buen manejo del Anticipo	15/07/2025	15/04/2026	\$ 1.799.966.614,50
		Prestaciones sociales	15/07/2025	15/12/2028	\$ 179.996.661,45
		Estabilidad de la obra	15/12/2025	15/12/2030	\$ 719.986.645,80



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Tabla 6 Pólizas de Responsabilidad civil según acta de inicio Anexo 1

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEGÚN ACTA DE INICIO					
ANEXO	POLIZA No.	AMPAROS	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
1 y 2	COQ-100001555 Seguros Mundial Aprobación 21 de julio de 2025	Responsabilidad civil	15/07/2025	07/12/2025	\$ 569.400.000,00

4.3. IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de corte del presente informe, no se le ha impuesto multa o sanción al contratista CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC, del contrato de obra No. 251 de 2025.

4.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe 31 de agosto de 2025, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

Tabla 7 Actos Administrativos Contrato de Obra No. 251-2025

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
15/07/2025	Acta de inicio	Iniciación del contrato de obra No. 251-2025	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC, R/L Libardo Alfonso Sarmiento Maldonado, la entidad contratante y supervisor SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO – Jenny Milena Upegui Siculaba y el interventor CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS R/L Pedro Luis Usma Villa.
22/07/2025	Acta de socialización	Socialización del proyecto del contrato No. 251-2025	Representantes de la alcaldía del Municipio de Tame, funcionarios de la Agencia de Renovación del Territorio ART, contratista de obra, interventoría y de la comunidad indígena

- ✓ **Acta de Inicio:** Se realiza con el propósito de dar inicio a la ejecución del Contrato de Obra Pública N° 251 de 2025, suscrito previamente entre el contratista CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC, la entidad contratante ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME e INTERVENTORIA, donde se establece la fecha de finalización para el día 14 de diciembre de 2025. El acta es firmada el día 15 de

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca

✉ consorcioctic1@gmail.com

Nit. 901.962.949-1

☎ 3112691312



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

julio de 2025 por el contratista CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC representado legalmente por el LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO, la entidad contratante y supervisor SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA y el interventor CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS R/L PEDRO LUIS USMA VILLA.

- ✓ **Acta de Socialización:** Para este proceso CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC convocó a una reunión en las instalaciones de la Institución Educativa Guahibo Betoy, el día 22 julio de 2025 a las 8:30 am, a la que asistieron representantes de la alcaldía del Municipio de Tame, funcionarios de la Agencia de Renovación del Territorio ART, contratista de obra, interventoría externa y de la comunidad indígena, donde se dio a conocer el alcance físico y financiero de las actividades a desarrollar e informar y resolver las inquietudes a la comunidad indígena beneficiada con el proyecto, así como nombrar las personas que harán parte del comité veedor.

Ilustración 5. Socialización del proyecto





INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025



4.4.1. Conformación de la veeduría ciudadana

En la reunión de socialización del proyecto que se llevó a cabo, tanto el contratista de obra CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC como la interventoría CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS. Realizó la invitación a la comunidad que asistió a la convocatoria, a conformar el comité de veeduría como participación ciudadana y vigilancia de las obras a ejecutar.

Tabla 8. Conformación de la veeduría ciudadana del contrato de obra No. 251-2025

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	REPRESENTACIÓN	TELEFONO
1	Rene Delgado Díaz	1006496924	Resguardo Genareros	3212754721
2	Luis Alfredo Cedeño Yepes	17560252	Institución Educativa Guahibo Betoy	3118410362
3	Gerardo Martínez Garrido	1007362419	Resguardo Julieros	3133628636
4	Liginio Delgado Díaz	1006496933	Resguardo Genareros	3133479197
5	Ángel Custodio Rodríguez Gaitán	6609604	Resguardo Roqueros	3133479197
6	Uriel Delgado Díaz	1116853848	Resguardo Velazqueros	3214038050
7	Oscar Giovanni Alvarado Garcia	74301656	Institución Educativa Guahibo Betoy	3138929900

Se presentaron los documentos de las personas que conformaron la veeduría, ante la personería municipal de Tame, por medio de la cual se oficializo el comité de veeduría ciudadana, cívica y comunitaria, mediante la resolución No. 016 del 31 de julio de 2025.

4.4.1.1. Actas De Veeduría

- ✓ Se realiza Acta de Inicio de veeduría de obra, se firma el día 22 de julio de 2025

4.5. MODIFICACIONES Y/O ADICIONES AL CONTRATO

A la fecha de corte del presente informe, no se han presentado modificaciones y/o adiciones al contratista CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC, del contrato de obra No. 251 de 2025.



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

4.6. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado los siguientes comités técnicos, del contrato de obra No. 251 de 2025.

Tabla 9. Actas de Comités de obra

FECHA	COMITÉ TÉCNICO	MOTIVO DEL COMITÉ	SUSCRITA POR
18/07/2025	Acta de Reunión No. 1	Apropiación de estudios y diseños	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC, R/L Libardo Alfonso Sarmiento Maldonado, el interventor CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS R/L Pedro Luis Usma Villa y Leonardo Camargo como Residente de Interventoría.

FECHA	COMITÉ TÉCNICO	MOTIVO DEL COMITÉ	SUSCRITA POR
22/07/2025	Acta de comité de CCSS No. 1	Acta de conformación de comité de control social y seguimiento	Coordinador de ART regional, Víctor Manuel Bohórquez, interventor CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS R/L Pedro Luis Usma Villa, Ing ambiental de obra Alejandro Ortiz, Vocero Luis Alfredo Cedeño, representantes de comunidades
19/08/2025	Acta de comité de control social y seguimiento - CCSS No. 2	Comité de avance de proyecto	Subdirector de ART, Edith Zulima . Rojas, Coordinador de ART regional, Víctor Manuel Bohórquez y Supervisora Jenny Milena Upegui secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano.

Anexo 1. Copia de acta de comité

4.7. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante la ejecución del contrato de obra No. 251 de 2025, a corte del presente informe, se ha enviado y recibido la siguiente correspondencia entre la interventoría, el contratista y el municipio de Tame.

Tabla 10 Relación de correspondencia enviada

No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCIÓN
1.	14/07/2025	Consortio canchas deportivas CIC	Consortio inter cerramientos	Presentación plan de calidad
2.	17/07/2025	Consortio canchas deportivas CIC	Secretaría de infraestructura y desarrollo urbano	Aprobación de estudios y diseños



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

3.	17/07/2025	Consorcio canchas deportivas CIC	Consorcio inter cerramientos	Respuesta a solicitud de información para control de ejecución
4.	21/07/2025	Consorcio canchas deportivas CIC	Consorcio inter cerramientos	Pólizas según acta de inicio y plan de inversión de anticipo
5.	05/08/2025	Consorcio canchas deportivas CIC	Consorcio inter cerramientos	Respuesta solicitud documentos técnicos
6.	08/08/2025	Consorcio canchas deportivas CIC	Consorcio inter cerramientos	Respuesta solicitud informe mensual

Tabla 11 Relación de correspondencia recibida

No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCIÓN
1.	15/07/2025	Consorcio inter cerramientos	Consorcio canchas deportivas CIC	Solicitud de información para control de ejecución
2.	16/07/2025	Consorcio inter cerramientos	Consorcio canchas deportivas CIC	Aprobación plan de calidad
3.	18/07/2025	Consorcio inter cerramientos	Consorcio canchas deportivas CIC	Concepto técnico y aprobación de documentos
4.	18/07/2025	Consorcio inter cerramientos	Consorcio canchas deportivas CIC	Invitación comité técnico
5.	04/08/2025	Consorcio inter cerramientos	Consorcio canchas deportivas CIC	Solicitud de documentos técnicos
6.	06/08/2025	Consorcio inter cerramientos	Consorcio canchas deportivas CIC	Solicitud de informe mensual

Anexo 2. Copia de correspondencia enviada y recibida mes de agosto

Se aclara que la correspondencia anexa al presente informe corresponde únicamente a la generada entre el 1 y el 31 de agosto de 2025, teniendo en cuenta que la documentación correspondiente a periodos anteriores ya fue presentada y soportada en los informes mensuales pasados.

4.8. BITACORA DIARIA DE OBRA

El contratista CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC, realizó la bitácora diaria de obra desde el día 01 de agosto al 31 de agosto de 2025. Esta es diligenciada diariamente por el ingeniero residente de obra y el ingeniero residente de interventoría y si hay lugar a alguna observación por parte de algún profesional de la interventoría este la realiza de manera escrita plasmando su firma junto a esta.

Se aclara que en cada bitácora diligenciada de manera diaria se registran y detallan las actividades ejecutadas en cada frente de trabajo, correspondientes a cada resguardo intervenido. Así mismo, en dichos registros se relacionan los ítems asociados a cada actividad desarrollada, indicando de forma precisa las cantidades efectivamente ejecutadas, lo cual permite realizar un adecuado seguimiento técnico y control de la ejecución de la obra.

Anexo 3. Copia de bitácora de obra




INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

4.9. VALLA INFORMATIVA

El CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC presentó el diseño correspondiente de la valla informativa para aprobación. Actualmente, dicho diseño se encuentra en trámite de revisión por parte de la entidad competente; por tal motivo, la instalación de la valla aún no se ha ejecutado.

Ilustración 6. Valla informativa

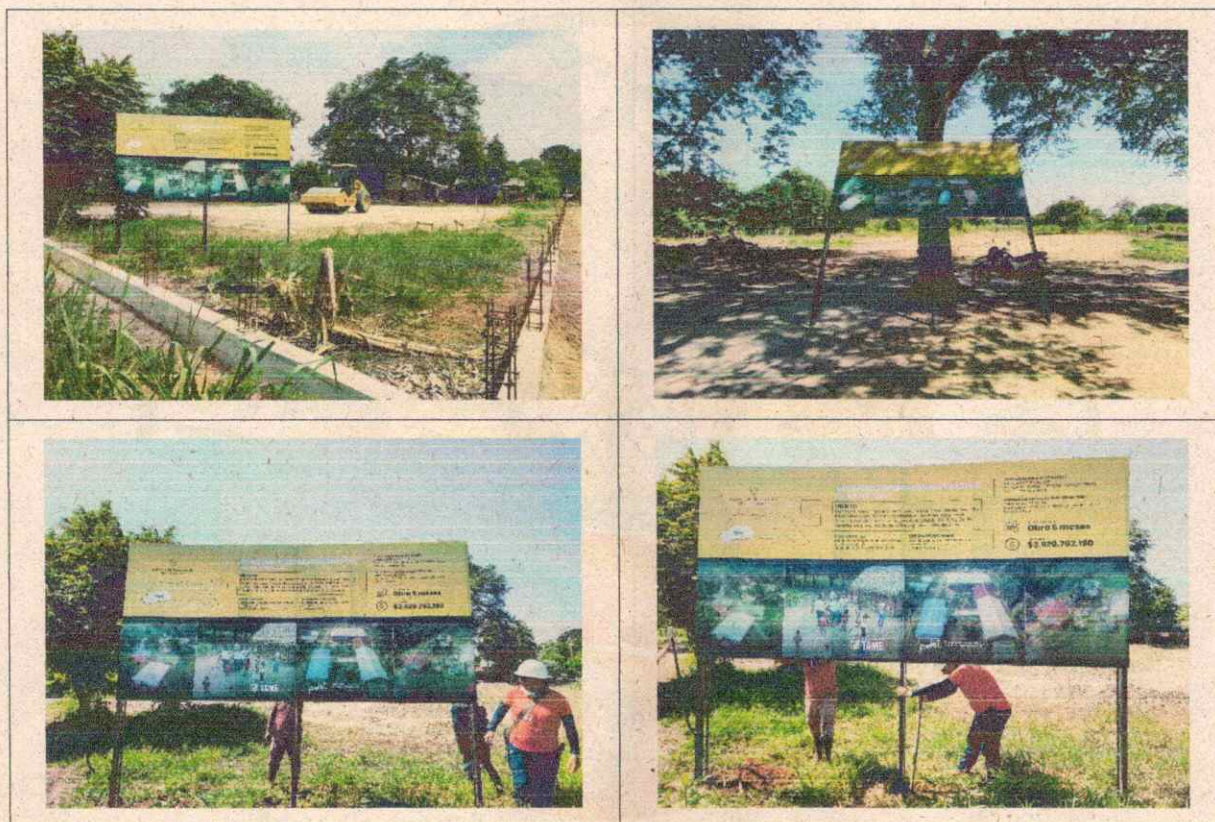

4.10. VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista de obra vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales.

4.10.1. Personal Mínimo Requerido

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC entregó la documentación del personal profesional exigido en el proceso de Licitación Obra Pública No. LP-TA-003-2025, para inicio de actividades del contrato de obra No. 251 de 2025.



1886

INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

En el presente cuadro se especifica los nombres de los profesionales propuestos por CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC.

Tabla 12 Personal mínimo requerido

No.	DOCUMENTACION PRESENTADA	OBSERVACION
1	Hoja de vida del personal profesional	Director de Obra: EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA INGENIERO CIVIL MAGISTER EN CONSTRUCCIÓN 07/12/2021 M.P. 091037-0601065 CND de 29/12/2021 Residente de Obra: CLAUDIA MILENA SEGURA AVILA ARQUITECTA ESPECIALISTA EN INTERVENTORIA DE PROYECTOS Y OBRAS 12/04/2024 M.P. A1052022-1010221789 de 17/03/2022

4.10.2. Personal Administrativo Vinculado

Para cumplir el pliego de condiciones, el contratista ofreció un personal profesional específico acorde a las necesidades del proyecto.

A continuación, se relaciona el personal profesional afiliado para la ejecución de labores del contrato de obra No. 251 de 2025. Teniendo en cuenta que el presente informe va desde el 01 de agosto al 31 de agosto de 2025.

Tabla 13 Personal administrativo vinculado mes de agosto de 2025

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA CORTE MES	AFILIADO A				No. PLANILLA
						EPS	AFP	ARL	CC	
1	Edwin Arnaldo Rincón Medina	80094040	Director de obra	01/08/2025	30/08/2025	X	X	X	X	9491625302
2	Claudia Milena Segura Ávila	1010221789	Residente de obra	01/08/2025	30/08/2025	X	X	X	X	9491625302
3	Martin Danilo Romero Riaño	1018461400	Inspector de obra	01/08/2025	30/08/2025	X	X	X	X	9491625302
4	Alfredo Leiva Jiménez	1018441104	Inspector de obra	01/08/2025	30/08/2025	X	X	X	X	9491625302
5	Libardo Alfonso Sarmiento Maldonado	1116778744	Secretario	01/08/2025	30/08/2025	X	X	X	X	9491625302
6	Hugo Alberto Quinto Orozco	1094244456	Auxiliar SST	01/08/2025	30/08/2025	X	X	X	X	9491625302
7	Luis Alejandro Ortiz Suarez	1116866434	Ing. Ambiental	01/08/2025	30/08/2025	X	X	X	X	9491625302



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA CORTE MES	AFILIADO A				No. PLANILLA
						EPS	AFP	ARL	CC	
8	Carlos Jose García Hernández	1116852188	Conductor	01/08/2025	30/08/2025	X	X	X	X	9491625302

4.10.3. Personal Operativo Obra

El contratista empleó mano de obra no calificada de la región, contribuyendo así a la generación de empleo en la zona de influencia del proyecto. Además, se incorporó mano de obra calificada para supervisar las actividades de acuerdo con los requisitos técnicos de la obra.

Tabla 14 Personal operativo vinculado mes de agosto de 2025

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	AFILIADO A				No. PLANILLA
						EPS	AFP	ARL	CC	
1	Jose Ángel Soler Rojas	96.195.806	Oficial	01/08/2025	-	X	X	X	X	9491624779
2	David Ortiz Gutiérrez	96.192.092	Oficial	01/08/2025	-	X	X	X	X	9491624779
3	Jose Delfín Neiva Ortiz	1.116.866.305	Ayudante	01/08/2025	-	X	X	X	X	9491624779
4	David Alejandro Ortiz Gallego	1.116.874.041	Ayudante	01/08/2025	-	X	X	X	X	9491624779
5	Herminson Velázquez Díaz	1.006.496.984	Ayudante	01/08/2025	26/08/2025	X	X	X	X	9491624779
6	Alfonso Díaz Aniceto	1.116.856.230	Ayudante	01/08/2025	26/08/2025	X	X	X	X	9491624779
7	Liginio Delgado Díaz	1.006.496.933	Ayudante	01/08/2025	26/08/2025	X	X	X	X	9491624779
8	Carlos Ferney Cepeda Sánchez	1.022.924.815	Cadenero	01/08/2025	08/08/2025	X	X	X	X	9491624779
9	Héctor Elías Neiva Ortiz	1.116.869.153	Cadenero	01/08/2025	-	X	X	X	X	9491624779
10	Edgar Tulivila García	96.193.430	Ayudante	25/08/2025	-	X	X	X	X	9491624779
11	Oscar Tulivila García	1.007.396.990	Ayudante	25/08/2025	-	X	X	X	X	9491624779
12	Nelson García Tulivila	96.193.416	Ayudante	25/08/2025	-	X	X	X	X	9491624779
13	Carlos Alberto Rodríguez García	1.116.867.010	Topógrafo	01/08/2025	08/08/2025	X	X	X	X	9494532995

Anexo 4. Copia de planillas de seguridad social mes de agosto de 2025 y nominas



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

4.10.4. Pagos de Personal – Nominas

El contratista realizó los pagos correspondientes al personal administrativo y operativo que participó en la ejecución del proyecto durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025.

4.11. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

4.11.1. Dotación del personal

Durante la ejecución del presente periodo, el contratista CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC, realizó la respectiva entrega de dotación al personal administrativo, ya que el operativo no ha iniciado labores de campo.

Tabla 15 Dotación del personal en obra de elementos de protección

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
Guantes reforzados	X		X			Ingenieros, inspectores, secretario, maestro, oficiales, ayudantes
Gafas de seguridad	X		X			
Tapa bocas	X		X			
Camisa	X		X			
Pantalón	X		X			
Casco	X		X			
Botas	X		X			

Ilustración 7. Entrega elementos de protección personal





INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025



4.11.2. Examen médico ocupacional de ingreso


Durante el período del 01 de agosto al 31 de agosto de 2025, el contratista CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC, realiza las respectivas evaluaciones del personal operativo, con el fin de determinar las condiciones de salud física y social antes de su vinculación, en función de las condiciones de trabajo a las que estará expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo.

Una vez recibido el concepto médico ocupacional se revisó y verificó la información, con el fin de verificar que se cumpla con los parámetros exigidos en la orden de examen médico ocupacional, y que se encuentre correctamente diligenciado.

4.11.3. Señalización de la obra

Para el presente informe, en el periodo de ejecución del 01 de agosto al 31 de agosto de 2025, se realizó la respectiva instalación señalización en la obra.

Ilustración 8. Señalización de la obra

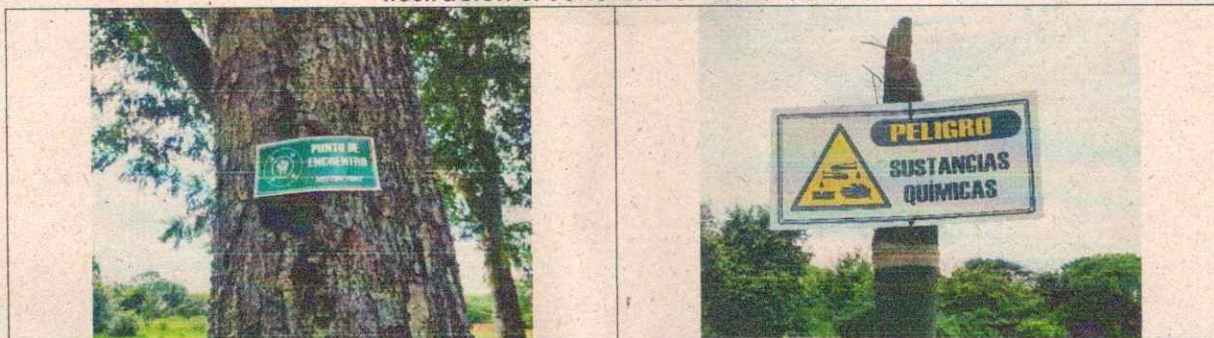



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025



4.11.4. Accidentalidad en la obra

Durante el período del 01 de agosto al 31 de agosto de 2025, NO se reportaron accidentes laborales, ya que, no se han iniciado actividades de campo.


4.12. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO

El contratista CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC, dando cumplimiento a los requisitos del pliego de condiciones, se relaciona la maquinaria y equipo mínimo requerido para la ejecución del proyecto.

DESCRIPCIÓN		REGISTRO FOTOGRAFICO
EQUIPO: MARCA: MODELO: SERIAL: AUMENTOS: PRECISIÓN: ESTADO:	Estación total Topcon GTS-239W 293072 30 x 9" Usado	



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

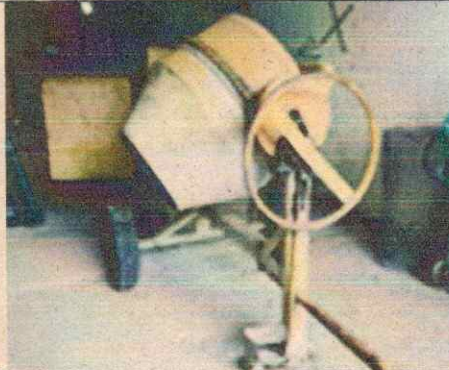EQUIPO: MARCA: REFERENCIA: SERIAL:	Nivel EFIX eBase/F7+ 4289338-4292531	
EQUIPO: MARCA: MODELO: SERIAL: COMBUSTIBLE: ESTADO:	Mezcladora de concreto Tipo Trompo 1 Marquitech N/A N/A Diesel Usado	
EQUIPO: MARCA: MODELO: SERIAL: COMBUSTIBLE: ESTADO:	Mezcladora de concreto Tipo Trompo 2 LN N/A N/A Diesel Usado	
EQUIPO: MOTOR: MODELO: SERIAL: COMBUSTIBLE: POWER: ESTADO:	Vibrador de concreto con manguera Honda N/A N/A Diesel 4.0 kW Usado	



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

EQUIPO: MARCA: MODELO: SERIAL: COMBUSTIBLE: ESTADO:	Cortador de concreto N/A N/A N/A Diesel Usado	
EQUIPO: MARCA: MODELO: SERIAL: COMBUSTIBLE: ESTADO:	Vibrocompactador tipo rana N/A N/A 39023Y040039 Diesel Usado	
EQUIPO: MARCA: MODELO: SERIAL: COMBUSTIBLE: ESTADO:	Vibrocompactador tipo rana Jadever Jdpm2a2100 N/A Gasolina Usado	



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

5. ASPECTOS TÉCNICOS

5.1. CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de obra suscrito entre el Municipio de Tame y la firma contratista CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de CINCO (05) MESES.

Tabla 16 Condiciones contractuales del Contrato de Obra No. 251 del 2025

ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
ESCUELA EL PORVENIR RESGUARDO INDIGENA JULIEROS					
1	CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA EL PORVENIR				\$ 426.576.772,00
1	PRELIMINARES				\$ 5.806.123,00
1.1	Localización y replanteo topográfico	M2	269,40	\$ 7.616,00	\$ 2.051.750,00
1.2	Excavación manual en material común	M3	74,40	\$ 50.462,00	\$ 3.754.373,00
2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 186.377.755,00
2.1	Concreto de 2500 psi para solado e=5cm	M2	110,10	\$ 58.287,00	\$ 6.417.399,00
2.2	Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	239,60	\$ 106.606,00	\$ 25.542.798,00
2.3	Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 p.s.i	ML	108,10	\$ 107.723,00	\$ 11.644.856,00
2.4	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	5.964,00	\$ 13.763,00	\$ 82.082.532,00
2.5	Alfajía de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo	ML	227,00	\$ 68.555,00	\$ 15.561.985,00
2.6	Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	14,80	\$ 163.403,00	\$ 2.418.364,00
2.7	Zapata en concreto de 3.000 PSI	M3	7,30	\$ 1.272.329,00	\$ 9.288.002,00
2.8	Concreto de 3000 psi para gradería	M3	20,30	\$ 1.646.395,00	\$ 33.421.819,00
3.0	MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS				\$ 234.392.894,00
3.1	Muro en ladrillo a la vista	M2	135,50	\$ 188.595,00	\$ 25.554.623,00
3.2	Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye ángulos de soporte de 1-1/2"x3/16", tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16", brazo doble para	ML	227,00	\$ 785.372,00	\$ 178.279.444,00



1094

INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
	alambre y concertina, incluye pintura				
3.3	Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	31,50	\$ 647.867,00	\$ 20.407.811,00
3.4	Puerta en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	3,70	\$ 717.266,00	\$ 2.653.884,00
3.5	Pasamano metálico en 3 secciones inc baranda vertical en perfil circular de 2" incluye pintura	ML	15,80	\$ 474.502,00	\$ 7.497.132,00
II	CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA EL PORVENIR				\$ 343.581.492,00
4	PRELIMINARES				\$ 85.210.350,00
4.1	Localización y replanteo topográfico	M2	672,00	\$ 7.616,00	\$ 5.117.952,00
4.2	Excavación manual en material común	M3	6,40	\$ 50.462,00	\$ 322.957,00
4.3	Relleno con material tipo sub base	M3	134,40	\$ 214.508,00	\$ 28.829.875,00
4.4	Descapote y nivelación manual del terreno	M2	701,40	\$ 10.092,00	\$ 7.078.529,00
4.5	Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño máximo 4"	M3	235,20	\$ 186.484,00	\$ 43.861.037,00
5,0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 131.757.224,00
5.1	Placa de piso en concreto esp. 0.10m incluye malla electrosoldada de 5mm	M2	672,00	\$ 154.586,00	\$ 103.881.792,00
5.2	Viga confinamiento de 0,15*0,40 m en concreto de 3.000 PSI	ML	106,00	\$ 95.351,00	\$ 10.107.206,00
5.3	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	483,00	\$ 13.598,00	\$ 6.567.834,00
5.4	Corte y sello para juntas de dilatación	ML	497,00	\$ 22.536,00	\$ 11.200.392,00
6	ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS				\$ 45.853.568,00
6.1	Cancha múltiple metálica con tablero metálico antivandálico	UND	2,00	\$9.891.136,00	\$ 19.782.272,00
6.2	Demarcación cancha con pintura acrílica a dos manos	ML	382,30	\$ 14.337,00	\$ 5.481.035,00
6.3	Pintura para canchas	M2	633,80	\$ 32.487,00	\$ 20.590.261,00
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ 31.710.620,00
7.1	Cañuela en concreto prefabricado.0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla	UND	80,00	\$ 335.297,00	\$ 26.823.760,00

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame - Arauca

✉ consorciocic1@gmail.com

Nit. 901.962.949-1

☎ 2112601210



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
7.2	Caja de inspección 0.60m*0.60m	UND	2,00	\$ 685.744,00	\$ 1.371.488,00
7.3	Caja de inspección 1m*1m	UND	1,00	\$1.183.580,00	\$ 1.183.580,00
7.4	Tubería pvc sanitaria 4"	ML	20,70	\$ 71.040,00	\$ 1.470.528,00
7.5	Tubería pvc sanitaria 6"	ML	8,12	\$ 106.067,00	\$ 861.264,00
8	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 49.049.730,00
8.1	Excavación manual en material común	M3	2,00	\$ 50.462,00	\$ 100.924,00
8.2	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 m - 510 kg-f	UND	4,00	\$4.422.059,00	\$ 17.688.236,00
8.3	Cimentación de poste de concreto	M3	1,50	\$1.135.084,00	\$ 1.702.626,00
8.4	Suministro e instalación de estructura para reflectores en poste	UND	4,00	\$1.478.416,00	\$ 5.913.664,00
8.5	Suministro e instalación de reflector de 400 w solar fotovoltaico	UND	8,00	\$1.771.596,00	\$ 14.172.768,00
8.6	Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico de 30 w	UND	8,00	\$528.767,00	\$ 4.230.136,00
8.7	Sistema de puesta a tierra para reflectores	UND	4,00	\$1.310.344,00	\$ 5.241.376,00
ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA RESGUARDO INDIGENA VELASQUEROS					
III	CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA GONZALO JIMENEZ				\$ 586.582.780,00
9,0	PRELIMINARES				\$ 7.660.641,00
9.1	Localización y replanteo topográfico	M2	383,70	\$ 7.616,00	\$ 2.922.259,00
9.2	Excavación manual en material común	M3	93,90	\$ 50.462,00	\$ 4.738.382,00
10	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 241.349.286,00
10.1	Concreto de 2500 psi para solado e=5cm	M2	148,10	\$ 58.287,00	\$ 8.632.305,00
10.2	Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	354,60	\$ 106.606,00	\$ 37.802.488,00
10.3	Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	162,20	\$ 107.723,00	\$ 17.472.671,00
10.4	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	7.623,60	\$ 13.763,00	\$ 104.923.607,00
10.5	Alfaja de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI incluye refuerzo	ML	342,00	\$ 68.555,00	\$ 23.445.810,00
10.6	Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	14,80	\$ 163.403,00	\$ 2.418.364,00
10.7	Zapata en concreto de 3.000 PSI	M3	10,40	\$1.272.329,00	\$ 13.232.222,00
10.8	Concreto de 3000 psi para gradería	M3	20,30	\$1.646.395,00	\$ 33.421.819,00



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
11,0	MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS				\$ 337.572.853,00
11.1	Muro en ladrillo a la vista	M2	203,70	\$ 188.595,00	\$ 38.416.802,00
11.2	Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye ángulos de soporte de 1-1/2"x3/16", tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16", brazo doble para alambre y concertina, incluye pintura	ML	342,00	\$ 785.372,00	\$ 268.597.224,00
11.3	Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	31,50	\$ 647.867,00	\$ 20.407.811,00
11.4	Puerta en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	3,70	\$ 717.266,00	\$ 2.653.884,00
11.5	Pasamano metálico en 3 secciones inc baranda vertical en perfil circular de 2" incluye pintura	ML	15,80	\$ 474.502,00	\$ 7.497.132,00
IV	CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA GONZALO JIMENEZ				\$ 343.690.741,00
12,0	PRELIMINARES				\$ 85.210.350,00
12.1	Localización y replanteo topográfico	M2	672,00	\$ 7.616,00	\$ 5.117.952,00
12.2	Excavación manual en material común	M3	6,40	\$ 50.462,00	\$ 322.957,00
12.3	Relleno con material tipo sub base	M3	134,40	\$ 214.508,00	\$ 28.829.875,00
12.4	Descapote y nivelación manual del terreno	M2	701,40	\$ 10.092,00	\$ 7.078.529,00
12.5	Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño máximo 4"	M3	235,20	\$ 186.484,00	\$ 43.861.037,00
13,0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 131.757.224,00
13.1	Placa de piso en concreto esp. 0.10m incluye malla electrosoldada de 5mm	M2	672,00	\$ 154.586,00	\$ 103.881.792,00
13.2	Viga confinamiento de 0,15*0,40 m en concreto de 3.000 PSI	ML	106,00	\$ 95.351,00	\$ 10.107.206,00
13.3	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	483,00	\$ 13.598,00	\$ 6.567.834,00
13.4	Corte y sello para juntas de dilatación	ML	497,00	\$ 22.536,00	\$ 11.200.392,00
14,0	ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS				\$ 45.853.568,00



1897

INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
14.1	CANCHA MULTIPLE METALICA CON TABLERO METALICO ANTIVANDALICO	UND	2,00	\$9.891.136,00	\$ 19.782.272,00
14.2	DEMARCAACION CANCHA CON PINTURA ACRILICA A DOS MANOS	ML	382,30	\$ 14.337,00	\$ 5.481.035,00
14.3	PINTURA PARA CANCHAS	M2	633,80	\$ 32.487,00	\$ 20.590.261,00
15	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ 31.819.869,00
15.1	Cañuela en concreto prefabricado.0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla	UND	80,00	\$ 335.297,00	\$ 26.823.760,00
15.2	Caja de inspección 0.60m*0.60m	UND	2,00	\$ 685.744,00	\$ 1.371.488,00
15.3	Caja de inspección 1m*1m	UND	1,00	\$1.183.580,00	\$ 1.183.580,00
15.4	Tubería pvc sanitaria 4"	ML	20,70	\$ 71.040,00	\$ 1.470.528,00
15.5	Tubería pvc sanitaria 6"	ML	9,15	\$ 106.067,00	\$ 970.513,00
16	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 49.049.730,00
16.1	Excavación manual en material común	M3	2,00	\$ 50.462,00	\$ 100.924,00
16.2	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 m - 510 kg-f	UND	4,00	\$4.422.059,00	\$ 17.688.236,00
16.3	Cimentación de poste de concreto	M3	1,50	\$1.135.084,00	\$ 1.702.626,00
16.4	Suministro e instalación de estructura para reflectores en poste	UND	4,00	\$1.478.416,00	\$ 5.913.664,00
16.5	Suministro e instalación de reflector de 400 w solar fotovoltaico	UND	8,00	\$1.771.596,00	\$ 14.172.768,00
16.6	Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico de 30 w	UND	8,00	\$ 528.767,00	\$ 4.230.136,00
16.7	Sistema de puesta a tierra para reflectores	UND	4,00	\$1.310.344,00	\$ 5.241.376,00
ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENAREROS					
V	CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA CRISTOBAL COLON				\$ 656.718.935,00
17,0	PRELIMINARES				\$ 8.392.680,00
17.1	Localización y replanteo topográfico	M2	428,80	\$ 7.616,00	\$ 3.265.741,00
17.2	Excavación manual en material común	M3	101,60	\$ 50.462,00	\$ 5.126.939,00
18,0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 263.527.415,00
18.1	Concreto de 2500 psi para solado e=5cm	M2	163,10	\$ 58.287,00	\$ 9.506.610,00
18.2	Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	400,60	\$ 106.606,00	\$ 42.706.364,00

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca

✉consorciocic1@gmail.com

Nit. 901.962.949-1

☎ 212401212



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
18.3	Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	182,90	\$ 107.723,00	\$ 19.702.537,00
18.4	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	8.269,00	\$ 13.763,00	\$ 113.806.247,00
18.5	Alfajía de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo	ML	395,00	\$ 68.555,00	\$ 27.079.225,00
18.6	Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	14,80	\$ 163.403,00	\$ 2.418.364,00
18.7	Zapata en concreto de 3.000 PSI	M3	11,70	\$1.272.329,00	\$ 14.886.249,00
18.8	Concreto de 3000 psi para gradería	M3	20,30	\$1.646.395,00	\$ 33.421.819,00
19,0	MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS				\$ 384.798.840,00
19.1	Muro en ladrillo a la vista	M2	233,40	\$ 188.595,00	\$ 44.018.073,00
19.2	Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye ángulos de soporte de 1-1/2"x3/16", tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16", brazo doble para alambre y concertina, incluye pintura	ML	395,00	\$ 785.372,00	\$ 310.221.940,00
19.3	Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	31,50	\$ 647.867,00	\$ 20.407.811,00
19.4	Puerta en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	3,70	\$ 717.266,00	\$ 2.653.884,00
19.5	Pasamano metálico en 3 secciones inc baranda vertical en perfil circular de 2" incluye pintura	ML	15,80	\$ 474.502,00	\$ 7.497.132,00
VI	CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA CRISTOBAL COLON				\$ 343.144.496,00
20,0	PRELIMINARES				\$ 85.210.350,00
20.1	Localización y replanteo topográfico	M2	672,00	\$ 7.616,00	\$ 5.117.952,00
20.2	Excavación manual en material común	M3	6,40	\$ 50.462,00	\$ 322.957,00
20.3	Relleno con material tipo sub base	M3	134,40	\$ 214.508,00	\$ 28.829.875,00
20.4	Descapote y nivelación manual del terreno	M2	701,40	\$ 10.092,00	\$ 7.078.529,00
20.5	Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño máximo 4"	M3	235,20	\$ 186.484,00	\$ 43.861.037,00
21,0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 131.757.224,00



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
21.1	Placa de piso en concreto esp. 0.10m incluye malla electrosoldada de 5mm	M2	672,00	\$ 154.586,00	\$ 103.881.792,00
21.2	Viga confinamiento de 0,15*0,40 m en concreto de 3.000 PSI	ML	106,00	\$ 95.351,00	\$ 10.107.206,00
21.3	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	483,00	\$ 13.598,00	\$ 6.567.834,00
21.4	Corte y sello para juntas de dilatación	ML	497,00	\$ 22.536,00	\$ 11.200.392,00
22,0	ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS				\$ 45.853.568,00
22.1	Cancha múltiple metálica con tablero metálico antivandálico	UND	2,00	\$9.891.136,00	\$ 19.782.272,00
22.2	Demarcación cancha con pintura acrílica a dos manos	ML	382,30	\$ 14.337,00	\$ 5.481.035,00
22.3	Pintura para canchas	M2	633,80	\$ 32.487,00	\$ 20.590.261,00
23,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ 31.273.624,00
23.1	Cañuela en concreto prefabricado 0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla	UND	80,00	\$ 335.297,00	\$ 26.823.760,00
23.2	Caja de inspección 0.60m*0.60m	UND	2,00	\$ 685.744,00	\$ 1.371.488,00
23.3	Caja de inspección 1m*1m	UND	1,00	\$1.183.580,00	\$ 1.183.580,00
23.4	Tubería pvc sanitaria 4"	ML	20,70	\$ 71.040,00	\$ 1.470.528,00
23.5	Tubería pvc sanitaria 6"	ML	4,00	\$ 106.067,00	\$ 424.268,00
24,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 49.049.730,00
24.1	Excavación manual en material común	M3	2,00	\$ 50.462,00	\$ 100.924,00
24.2	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 m - 510 kg-f	UND	4,00	\$4.422.059,00	\$ 17.688.236,00
24.3	Cimentación de poste de concreto	M3	1,50	\$1.135.084,00	\$ 1.702.626,00
24.4	Suministro e instalación de estructura para reflectores en poste	UND	4,00	\$1.478.416,00	\$ 5.913.664,00
24.5	Suministro e instalación de reflector de 400 w solar fotovoltaico	UND	8,00	\$1.771.596,00	\$ 14.172.768,00
24.6	Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico de 30 w	UND	8,00	\$ 528.767,00	\$ 4.230.136,00
24.7	Sistema de puesta a tierra para reflectores	UND	4,00	\$1.310.344,00	\$ 5.241.376,00
ESCUELA SANTA TERESITA RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS					
VII	CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA SANTA TERESITA				\$ 498.030.145,00



1900

INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
25,0	PRELIMINARES				\$ 6.576.340,00
25.1	Localización y replanteo topográfico	M2	316,20	\$ 7.616,00	\$ 2.408.179,00
25.2	Excavación manual en material común	M3	82,60	\$ 50.462,00	\$ 4.168.161,00
26,0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 209.326.246,00
26.1	Concreto de 2500 psi para solado e=5cm	M2	125,90	\$ 58.287,00	\$ 7.338.333,00
26.2	Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	286,80	\$ 106.606,00	\$ 30.574.601,00
26.3	Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	131,10	\$ 107.723,00	\$ 14.122.485,00
26.4	Acero de refuerzo 60000 PSI	KG	6.647,20	\$ 13.763,00	\$ 91.485.414,00
26.5	Alfajía de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI incluye refuerzo	ML	281,20	\$ 68.555,00	\$ 19.277.666,00
26.6	Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	14,80	\$ 163.403,00	\$ 2.418.364,00
26.7	Zapata en concreto de 3.000 PSI	M3	8,40	\$ 1.272.329,00	\$ 10.687.564,00
26.8	Concreto de 3000 psi para gradería	M3	20,30	\$ 1.646.395,00	\$ 33.421.819,00
27,0	MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS				\$ 282.127.559,00
27.1	Muro en ladrillo a la vista	M2	162,90	\$ 188.595,00	\$ 30.722.126,00
27.2	Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye ángulos de soporte de 1-1/2"x3/16", tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16", brazo doble para alambre y concertina, incluye pintura	ML	281,20	\$ 785.372,00	\$ 220.846.606,00
27.3	Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	31,50	\$ 647.867,00	\$ 20.407.811,00
27.4	Puerta en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	3,70	\$ 717.266,00	\$ 2.653.884,00
27.5	Pasamano metálico en 3 secciones inc baranda vertical en perfil circular de 2" incluye pintura	ML	15,80	\$ 474.502,00	\$ 7.497.132,00
VIII	CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA SANTA TERESITA				\$ 343.674.831,00
28,0	PRELIMINARES				\$ 85.210.350,00
28.1	Localización y replanteo topográfico	M2	672,00	\$ 7.616,00	\$ 5.117.952,00



1901

INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
28.2	excavación manual en material común	M3	6,40	\$ 50.462,00	\$ 322.957,00
28.3	Relleno con material tipo sub base	M3	134,40	\$ 214.508,00	\$ 28.829.875,00
28.4	Descapote y nivelación manual del terreno	M2	701,40	\$ 10.092,00	\$ 7.078.529,00
28.5	Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño máximo 4"	M3	235,20	\$ 186.484,00	\$ 43.861.037,00
29,0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 131.757.224,00
29.1	Placa de piso en concreto esp. 0.10m incluye malla electrosoldada de 5mm	M2	672,00	\$ 154.586,00	\$ 103.881.792,00
29.2	Viga confinamiento de 0,15*0,40 m en concreto de 3.000 PSI	ML	106,00	\$ 95.351,00	\$ 10.107.206,00
29.3	Acero de refuerzo 60000 PSI	KG	483,00	\$ 13.598,00	\$ 6.567.834,00
29.4	Corte y sello para juntas de dilatación	ML	497,00	\$ 22.536,00	\$ 11.200.392,00
30,0	ACABADOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS				\$ 45.853.568,00
30.1	Cancha múltiple metálica con tablero metálico antivandálico	UND	2,00	\$9.891.136,00	\$ 19.782.272,00
30.2	Demarcación cancha con pintura acrílica a dos manos	ML	382,30	\$ 14.337,00	\$ 5.481.035,00
30.3	Pintura para canchas	M2	633,80	\$ 32.487,00	\$ 20.590.261,00
31	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ 31.803.959,00
31.1	Cañuela en concreto prefabricado 0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla	UND	80,00	\$ 335.297,00	\$ 26.823.760,00
31.2	Caja de inspección 0.60m*0.60m	UND	2,00	\$ 685.744,00	\$ 1.371.488,00
31.3	Caja de inspección 1m*1m	UND	1,00	\$1.183.580,00	\$ 1.183.580,00
31.4	Tubería pvc sanitaria 4"	ML	20,70	\$ 71.040,00	\$ 1.470.528,00
31.5	Tubería pvc sanitaria 6"	ML	9,00	\$ 106.067,00	\$ 954.603,00
32	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				\$ 49.049.730,00
32.1	Excavación manual en material común	M3	2,00	\$ 50.462,00	\$ 100.924,00
32.2	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 m - 510 kg-f	UND	4,00	\$4.422.059,00	\$ 17.688.236,00
32.3	Cimentación de poste de concreto	M3	1,50	\$1.135.084,00	\$ 1.702.626,00
32.4	Suministro e instalación de estructura para reflectores en poste	UND	4,00	\$1.478.416,00	\$ 5.913.664,00
32.5	Suministro e instalación de reflector de 400 w solar fotovoltaico	UND	8,00	\$1.771.596,00	\$ 14.172.768,00

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca

✉ consorcioctic1@gmail.com

Nit. 901.962.949-1

☎ 3112601312



1902

INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
32.6	Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico de 30 w	UND	8,00	\$ 528.767,00	\$ 4.230.136,00
32.7	Sistema de puesta a tierra para reflectores	UND	4,00	\$1.310.344,00	\$ 5.241.376,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS					\$3.542.000.192,00
IMPLEMENTAR PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA (PGIO)					\$ 35.933.036,60
TRAMITE DE CERTIFICADO RETILAP					\$ 22.000.000,00
TOTAL COSTO OBRA CIVIL					\$3.599.933.228,60

5.2. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS MES DE AGOSTO 2025

Durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto de 2025 se registraron las siguientes de actividades.

Tabla 17 Cantidades ejecutadas mes de agosto de 2025

						MES AGOSTO		
ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL	CANT	VALOR	%
ESCUELA EL PORVENIR RESGUARDO INDIGENA JULIEROS								
1	CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA EL PORVENIR				\$ 426.576.772,00			
1	PRELIMINARES				\$ 5.806.123,00			
1.1	Localización y replanteo topográfico	M2	269,40	\$ 7.616,00	\$ 2.051.750,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
1.2	Excavación manual en material común	M3	74,40	\$ 50.462,00	\$ 3.754.373,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 186.377.755,00			
2.1	Concreto de 2500 psi para solado e=5cm	M2	110,10	\$ 58.287,00	\$ 6.417.399,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
2.2	Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	239,60	\$ 106.606,00	\$ 25.542.798,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
2.3	Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 p.s.i	ML	108,10	\$ 107.723,00	\$ 11.644.856,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
2.4	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	5.964,00	\$ 13.763,00	\$ 82.082.532,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
2.5	Alfaja de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo	ML	227,00	\$ 68.555,00	\$ 15.561.985,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
2.6	Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	14,80	\$ 163.403,00	\$ 2.418.364,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
2.7	Zapata en concreto de 3.000 PSI	M3	7,30	\$ 1.272.329,00	\$ 9.288.002,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
2.8	Concreto de 3000 psi para gradería	M3	20,30	\$ 1.646.395,00	\$ 33.421.819,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
3.0	MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS				\$ 234.392.894,00			
3.1	Muro en ladrillo a la vista	M2	135,50	\$ 188.595,00	\$ 25.554.623,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
3.2	Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye ángulos de soporte de 1-1/2"x3/16", tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16", brazo doble para alambre y concertina, incluye pintura	ML	227,00	\$ 785.372,00	\$ 178.279.444,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
3.3	Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de	M2	31,50	\$ 647.867,00	\$ 20.407.811,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca

✉consorciocic1@gmail.com

Nit. 901.962.949-1

☎ 3112691312



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL	MES AGOSTO		
						CANT	VALOR	%
	2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura							
3.4	Puerta en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	3,70	\$ 717.266,00	\$ 2.653.884,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
3.5	Pasamano metálico en 3 secciones inc baranda vertical en perfil circular de 2" incluye pintura	ML	15,80	\$ 474.502,00	\$ 7.497.132,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
II	CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA EL PORVENIR				\$ 343.581.492,00			
4	PRELIMINARES				\$ 85.210.350,00			
4.1	Localización y replanteo topográfico	M2	672,00	\$ 7.616,00	\$ 5.117.952,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
4.2	Excavación manual en material común	M3	6,40	\$ 50.462,00	\$ 322.957,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
4.3	Relleno con material tipo sub base	M3	134,40	\$ 214.508,00	\$ 28.829.875,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
4.4	Descapote y nivelación manual del terreno	M2	701,40	\$ 10.092,00	\$ 7.078.529,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
4.5	Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño máximo 4"	M3	235,20	\$ 186.484,00	\$ 43.861.037,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
5.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 131.757.224,00			
5.1	Placa de piso, en concreto esp. 0.10m incluye malla electrosoldada de 5mm	M2	672,00	\$ 154.586,00	\$ 103.881.792,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
5.2	Viga confinamiento de 0.15*0.40 m en concreto de 3.000 PSI	ML	106,00	\$ 95.351,00	\$ 10.107.206,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
5.3	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	483,00	\$ 13.598,00	\$ 6.567.834,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
5.4	Corte y sello para juntas de dilatación	ML	497,00	\$ 22.536,00	\$ 11.200.392,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
6	ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS				\$ 45.853.568,00			
6.1	Cancha múltiple metálica con tablero metálico antivandálico	UND	2,00	\$ 9.891.136,00	\$ 19.782.272,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
6.2	Demarcación cancha con pintura acrílica a dos manos	ML	382,30	\$ 14.337,00	\$ 5.481.035,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
6.3	Pintura para canchas	M2	633,80	\$ 32.487,00	\$ 20.590.261,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ 31.710.620,00			
7.1	Cañuela en concreto prefabricado 0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla	UND	80,00	\$ 335.297,00	\$ 26.823.760,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
7.2	Caja de inspección 0.60m*0.60m	UND	2,00	\$ 685.744,00	\$ 1.371.488,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
7.3	Caja de inspección 1m*1m	UND	1,00	\$ 1.183.580,00	\$ 1.183.580,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
7.4	Tubería pvc sanitaria 4"	ML	20,70	\$ 71.040,00	\$ 1.470.528,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
7.5	Tubería pvc sanitaria 6"	ML	8,12	\$ 106.067,00	\$ 861.264,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
8	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 49.049.730,00			
8.1	Excavación manual en material común	M3	2,00	\$ 50.462,00	\$ 100.924,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
8.2	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 m - 510 kg-f	UND	4,00	\$ 4.422.059,00	\$ 17.688.236,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
8.3	Cimentación de poste de concreto	M3	1,50	\$ 1.135.084,00	\$ 1.702.626,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
8.4	Suministro e instalación de estructura para reflectores en poste	UND	4,00	\$ 1.478.416,00	\$ 5.913.664,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
8.5	Suministro e instalación de reflector de 400 w solar fotovoltaico	UND	8,00	\$ 1.771.596,00	\$ 14.172.768,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
8.6	Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico de 30 w	UND	8,00	\$ 528.767,00	\$ 4.230.136,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
8.7	Sistema de puesta a tierra para reflectores	UND	4,00	\$ 1.310.344,00	\$ 5.241.376,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA RESGUARDO INDIGENA VELASQUEROS								
III	CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA GONZALO JIMENEZ				\$ 586.582.780,00			
9.0	PRELIMINARES				\$ 7.660.641,00			
9.1	Localización y replanteo topográfico	M2	383,70	\$ 7.616,00	\$ 2.922.259,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %



1904

INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL	MES AGOSTO		
						CANT	VALOR	%
9.2	Excavación manual en material común	M3	93,90	\$ 50.462,00	\$ 4.738.382,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
10	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 241.349.286,00			
10.1	Concreto de 2500 psi para solado e=5cm	M2	148,10	\$ 58.287,00	\$ 8.632.305,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
10.2	Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	354,60	\$ 106.606,00	\$ 37.802.488,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
10.3	Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	162,20	\$ 107.723,00	\$ 17.472.671,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
10.4	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	7.623,60	\$ 13.763,00	\$ 104.923.607,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
10.5	Alfaja de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI incluye refuerzo	ML	342,00	\$ 68.555,00	\$ 23.445.810,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
10.6	Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	14,80	\$ 163.403,00	\$ 2.418.364,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
10.7	Zapata en concreto de 3.000 PSI	M3	10,40	\$ 1.272.329,00	\$ 13.232.222,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
10.8	Concreto de 3000 psi para gradería	M3	20,30	\$ 1.646.395,00	\$ 33.421.819,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
11.0	MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS				\$ 337.572.853,00			
11.1	Muro en ladrillo a la vista	M2	203,70	\$ 188.595,00	\$ 38.416.802,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
11.2	Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye ángulos de soporte de 1-1/2"x3/16", tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16", brazo doble para alambre y concertina, incluye pintura	ML	342,00	\$ 785.372,00	\$ 268.597.224,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
11.3	Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	31,50	\$ 647.867,00	\$ 20.407.811,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
11.4	Puerta en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	3,70	\$ 717.266,00	\$ 2.653.884,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
11.5	Pasamano metálico en 3 secciones inc baranda vertical en perfil circular de 2" incluye pintura	ML	15,80	\$ 474.502,00	\$ 7.497.132,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
IV	CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA GONZALO JIMENEZ				\$ 343.690.741,00			
12.0	PRELIMINARES				\$ 85.210.350,00			
12.1	Localización y replanteo topográfico	M2	672,00	\$ 7.616,00	\$ 5.117.952,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
12.2	Excavación manual en material común	M3	6,40	\$ 50.462,00	\$ 322.957,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
12.3	Relleno con material tipo sub base	M3	134,40	\$ 214.508,00	\$ 28.829.875,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
12.4	Descapote y nivelación manual del terreno	M2	701,40	\$ 10.092,00	\$ 7.078.529,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
12.5	Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño máximo 4"	M3	235,20	\$ 186.484,00	\$ 43.861.037,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
13.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 131.757.224,00			
13.1	Placa de piso en concreto esp. 0.10m incluye malla electrosoldada de 5mm	M2	672,00	\$ 154.586,00	\$ 103.881.792,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
13.2	Viga confinamiento de 0,15*0,40 m en concreto de 3.000 PSI	ML	106,00	\$ 95.351,00	\$ 10.107.206,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
13.3	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	483,00	\$ 13.598,00	\$ 6.567.834,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
13.4	Corte y sello para juntas de dilatación	ML	497,00	\$ 22.536,00	\$ 11.200.392,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
14.0	ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS				\$ 45.853.568,00			
14.1	CANCHA MULTIPLE METALICA CON TABLERO METALICO ANTIVANDALICO	UND	2,00	\$ 9.891.136,00	\$ 19.782.272,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
14.2	DEMARCAION CANCHA CON PINTURA ACRILICA A DOS MANOS	ML	382,30	\$ 14.337,00	\$ 5.481.035,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
14.3	PINTURA PARA CANCHAS	M2	633,80	\$ 32.487,00	\$ 20.590.261,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
15	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ 31.819.869,00			



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL	MES AGOSTO		
						CANT.	VALOR	%
15.1	Cañuela en concreto prefabricado 0.30*0.30*0.80 m. Incluye rejilla	UND	80,00	\$ 335.297,00	\$ 26.823.760,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
15.2	Caja de inspección 0.60m*0.60m	UND	2,00	\$ 685.744,00	\$ 1.371.488,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
15.3	Caja de inspección 1m*1m	UND	1,00	\$ 1.183.580,00	\$ 1.183.580,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
15.4	Tubería pvc sanitaria 4"	ML	20,70	\$ 71.040,00	\$ 1.470.528,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
15.5	Tubería pvc sanitaria 6"	ML	9,15	\$ 106.067,00	\$ 970.513,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
16	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 49.049.730,00			
16.1	Excavación manual en material común	M3	2,00	\$ 50.462,00	\$ 100.924,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
16.2	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 m - 510 kg-f	UND	4,00	\$ 4.422.059,00	\$ 17.688.236,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
16.3	Cimentación de poste de concreto	M3	1,50	\$ 1.135.084,00	\$ 1.702.626,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
16.4	Suministro e instalación de estructura para reflectores en poste	UND	4,00	\$ 1.478.416,00	\$ 5.913.664,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
16.5	Suministro e instalación de reflector de 400 w solar fotovoltaico	UND	8,00	\$ 1.771.596,00	\$ 14.172.768,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
16.6	Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico de 30 w	UND	8,00	\$ 528.767,00	\$ 4.230.136,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
16.7	Sistema de puesta a tierra para reflectores	UND	4,00	\$ 1.310.344,00	\$ 5.241.376,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENAREROS								
V	CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA CRISTOBAL COLON				\$ 656.718.935,00			
17.0	PRELIMINARES				\$ 8.392.680,00		\$ 8.392.680,00	
17.1	Localización y replanteo topográfico	M2	428,80	\$ 7.616,00	\$ 3.265.741,00	428,80	\$ 3.265.741,00	100%
17.2	Excavación manual en material común	M3	101,60	\$ 50.462,00	\$ 5.126.939,00	101,60	\$ 5.126.939,00	100%
18.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 263.527.415,00		\$ 159.139.443,0	
18.1	Concreto de 2500 psi para solado e=5cm	M2	163,10	\$ 58.287,00	\$ 9.506.610,00	163,10	\$ 9.506.610,00	100%
18.2	Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	400,60	\$ 106.606,00	\$ 42.706.364,00	400,60	\$ 42.706.364,00	100%
18.3	Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	182,90	\$ 107.723,00	\$ 19.702.537,00	79,50	\$ 8.563.979,00	43%
18.4	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	8.269,00	\$ 13.763,00	\$ 113.806.247,00	5.889,55	\$ 81.057.877,00	71.22%
18.5	Alfaja de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo	ML	395,00	\$ 68.555,00	\$ 27.079.225,00	0,00	\$ 0.00	0%
18.6	Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	14,80	\$ 163.403,00	\$ 2.418.364,00	14,80	\$ 2.418.364,00	100%
18.7	Zapata en concreto de 3.000 PSI	M3	11,70	\$ 1.272.329,00	\$ 14.886.249,00	11,70	\$ 14.886.249,00	100%
18.8	Concreto de 3000 psi para gradería	M3	20,30	\$ 1.646.395,00	\$ 33.421.819,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
19.0	MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS				\$ 384.798.840,00			
19.1	Muro en ladrillo a la vista	M2	233,40	\$ 188.595,00	\$ 44.018.073,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
19.2	Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye ángulos de soporte de 1-1/2"x3/16", tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16", brazo doble para alambre y concertina, incluye pintura	ML	395,00	\$ 785.372,00	\$ 310.221.940,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
19.3	Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	31,50	\$ 647.867,00	\$ 20.407.811,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
19.4	Puerta en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	3,70	\$ 717.266,00	\$ 2.653.884,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %
19.5	Pasamano metálico en 3 secciones inc baranda vertical en perfil circular de 2" incluye pintura	ML	15,80	\$ 474.502,00	\$ 7.497.132,00	0.0	\$ 0.00	0.00 %



1906

INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL	MES AGOSTO		
						CANT	VALOR	%
VI	CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA CRISTOBAL COLON				\$ 343.144.496,00			
20.0	PRELIMINARES				\$ 85.210.350,00		\$ 84.887.393,00	
20.1	Localización y replanteo topográfico	M2	672,00	\$ 7.616,00	\$ 5.117.952,00	672,00	\$ 5.117.952,00	100%
20.2	Excavación manual en material común	M3	6,40	\$ 50.462,00	\$ 322.957,00	0,0	\$ 0,00	0%
20.3	Relleno con material tipo sub base	M3	134,40	\$ 214.508,00	\$ 28.829.875,00	134,40	\$ 28.829.875,00	100%
20.4	Descapote y nivelación manual del terreno	M2	701,40	\$ 10.092,00	\$ 7.078.529,00	701,40	\$ 7.078.529,00	100%
20.5	Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño máximo 4"	M3	235,20	\$ 186.484,00	\$ 43.861.037,00	235,20	\$ 43.861.037,00	100%
21.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 131.757.224,00			
21.1	Placa de piso en concreto esp. 0.10m incluye malla electrosoldada de 5mm	M2	672,00	\$ 154.586,00	\$ 103.881.792,00	0,0	\$ 0,00	0.00 %
21.2	Viga confinamiento de 0.15*0.40 m en concreto de 3.000 PSI	ML	106,00	\$ 95.351,00	\$ 10.107.206,00	0,0	\$ 0,00	0.00 %
21.3	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	483,00	\$ 13.598,00	\$ 6.567.834,00	0,0	\$ 0,00	0.00 %
21.4	Corte y sello para juntas de dilatación	ML	497,00	\$ 22.536,00	\$ 11.200.392,00	0,0	\$ 0,00	0.00 %
22.0	ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS				\$ 45.853.568,00			
22.1	Cancha múltiple metálica con tablero metálico antivandálico	UND	2,00	\$ 9.891.136,00	\$ 19.782.272,00	0,0	\$ 0,00	0.00 %
22.2	Demarcación cancha con pintura acrílica a dos manos	ML	382,30	\$ 14.337,00	\$ 5.481.035,00	0,0	\$ 0,00	0.00 %
22.3	Pintura para canchas	M2	633,80	\$ 32.487,00	\$ 20.590.261,00	0,0	\$ 0,00	0.00 %
23.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ 31.273.624,00			
23.1	Cañuela en concreto prefabricado 0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla	UND	80,00	\$ 335.297,00	\$ 26.823.760,00	0,0	\$ 0,00	0.00 %
23.2	Caja de inspección 0.60m*0.60m	UND	2,00	\$ 685.744,00	\$ 1.371.488,00	0,0	\$ 0,00	0.00 %
23.3	Caja de inspección 1m*1m	UND	1,00	\$ 1.183.580,00	\$ 1.183.580,00	0,0	\$ 0,00	0.00 %
23.4	Tubería pvc sanitaria 4"	ML	20,70	\$ 71.040,00	\$ 1.470.528,00	0,0	\$ 0,00	0.00 %
23.5	Tubería pvc sanitaria 6"	ML	4,00	\$ 106.067,00	\$ 424.268,00	0,0	\$ 0,00	0.00 %
24.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 49.049.730,00			
24.1	Excavación manual en material común	M3	2,00	\$ 50.462,00	\$ 100.924,00	0,0	\$ 0,00	0.00 %
24.2	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 m - 510 kg-f	UND	4,00	\$ 4.422.059,00	\$ 17.688.236,00	0,0	\$ 0,00	0.00 %
24.3	Cimentación de poste de concreto	M3	1,50	\$ 1.135.084,00	\$ 1.702.626,00	0,0	\$ 0,00	0.00 %
24.4	Suministro e instalación de estructura para reflectores en poste	UND	4,00	\$ 1.478.416,00	\$ 5.913.664,00	0,0	\$ 0,00	0.00 %
24.5	Suministro e instalación de reflector de 400 w solar fotovoltaico	UND	8,00	\$ 1.771.596,00	\$ 14.172.768,00	0,0	\$ 0,00	0.00 %
24.6	Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico de 30 w	UND	8,00	\$ 528.767,00	\$ 4.230.136,00	0,0	\$ 0,00	0.00 %
24.7	Sistema de puesta a tierra para reflectores	UND	4,00	\$ 1.310.344,00	\$ 5.241.376,00	0,0	\$ 0,00	0.00 %
ESCUELA SANTA TERESITA RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS								
VII	CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA SANTA TERESITA				\$ 498.030.145,00			
25.0	PRELIMINARES				\$ 6.576.340,00		\$ 6.576.340,00	
25.1	Localización y replanteo topográfico	M2	316,20	\$ 7.616,00	\$ 2.408.179,00	316,20	\$ 2.408.179,00	100%
25.2	Excavación manual en material común	M3	82,60	\$ 50.462,00	\$ 4.168.161,00	82,60	\$ 4.168.161,00	100%
26.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 209.326.246,00		\$ 83.638.668,00	
26.1	Concreto de 2500 psi para solado e=5cm	M2	125,90	\$ 58.287,00	\$ 7.338.333,00	125,90	\$ 7.338.333,00	100%
26.2	Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm. en concreto de 3.000 PSI	ML	286,80	\$ 106.606,00	\$ 30.574.601,00	145,90	\$ 15.553.815,00	51%
26.3	Columneta de 20x20 cm. en concreto de 3.000 PSI	ML	131,10	\$ 107.723,00	\$ 14.122.485,00	47,50	\$ 5.116.843,00	36%

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame - Arauca

✉ consorciocic1@gmail.com

Nit. 901.962.949-1

☎ 3112691312



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL	MES AGOSTO		
						CANT	VALOR	%
26.4	Acero de refuerzo 60000 PSI	KG	6.647,20	\$ 13.763,00	\$ 91.485.414,00	3.265,43	\$ 44.942.113,00	49%
26.5	Alfaja de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI incluye refuerzo	ML	281,20	\$ 68.555,00	\$ 19.277.666,00	0,00	\$ 0,00	0%
26.6	Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	14,80	\$ 163.403,00	\$ 2.418.364,00	0,00	\$ 0,00	0%
26.7	Zapata en concreto de 3.000 PSI	M3	8,40	\$ 1.272.329,00	\$ 10.687.564,00	8,40	\$ 10.687.564,00	100%
26.8	Concreto de 3000 psi para gradería	M3	20,30	\$ 1.646.395,00	\$ 33.421.819,00	0,00	\$ 0,00	0%
27.0	MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS				\$ 282.127.559,00			
27.1	Muro en ladrillo a la vista	M2	162,90	\$ 188.595,00	\$ 30.722.126,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
27.2	Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye ángulos de soporte de 1-1/2"x3/16", tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16", brazo doble para alambre y concertina, incluye pintura	ML	281,20	\$ 785.372,00	\$ 220.846.606,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
27.3	Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	31,50	\$ 647.867,00	\$ 20.407.811,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
27.4	Puerta en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	3,70	\$ 717.266,00	\$ 2.653.884,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
27.5	Pasamano metálico en 3 secciones inc baranda vertical en perfil circular de 2" incluye pintura	ML	15,80	\$ 474.502,00	\$ 7.497.132,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
VIII	CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA SANTA TERESITA				\$ 343.674.831,00			
28.0	PRELIMINARES				\$ 85.210.350,00		\$ 84.887.393,00	
28.1	Localización y replanteo topográfico	M2	672,00	\$ 7.616,00	\$ 5.117.952,00	672,00	\$ 5.117.952,00	100%
28.2	excavación manual en material común	M3	6,40	\$ 50.462,00	\$ 322.957,00	0,0	\$ 0,00	0%
28.3	Relleno con material tipo sub base	M3	134,40	\$ 214.508,00	\$ 28.829.875,00	134,40	\$ 28.829.875,00	100%
28.4	Descapote y nivelación manual del terreno	M2	701,40	\$ 10.092,00	\$ 7.078.529,00	701,40	\$ 7.078.529,00	100%
28.5	Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño máximo 4"	M3	235,20	\$ 186.484,00	\$ 43.861.037,00	235,20	\$ 43.861.037,00	100%
29.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 131.757.224,00			
29.1	Placa de piso en concreto esp. 0,10m incluye malla electrosoldada de 5mm	M2	672,00	\$ 154.586,00	\$ 103.881.792,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
29.2	Viga confinamiento de 0,15*0,40 m en concreto de 3.000 PSI	ML	106,00	\$ 95.351,00	\$ 10.107.206,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
29.3	Acero de refuerzo 60000 PSI	KG	483,00	\$ 13.598,00	\$ 6.567.834,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
29.4	Corte y sello para juntas de dilatación	ML	497,00	\$ 22.536,00	\$ 11.200.392,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
30.0	ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS				\$ 45.853.568,00			
30.1	Cancha múltiple metálica con tablero metálico antivandálico	UND	2,00	\$ 9.891.136,00	\$ 19.782.272,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
30.2	Demarcación cancha con pintura acrílica a dos manos	ML	382,30	\$ 14.337,00	\$ 5.481.035,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
30.3	Pintura para canchas	M2	633,80	\$ 32.487,00	\$ 20.590.261,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
31	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ 31.803.959,00			
31.1	Cañuela en concreto prefabricado 0,30*0,30 *0,80 m. Incluye rejilla	UND	80,00	\$ 335.297,00	\$ 26.823.760,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
31.2	Caja de inspección 0,60m*0,60m	UND	2,00	\$ 685.744,00	\$ 1.371.488,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
31.3	Caja de inspección 1m*1m	UND	1,00	\$ 1.183.580,00	\$ 1.183.580,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
31.4	Tubería pvc sanitaria 4"	ML	20,70	\$ 71.040,00	\$ 1.470.528,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
31.5	Tubería pvc sanitaria 6"	ML	9,00	\$ 106.067,00	\$ 954.603,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
32	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 49.049.730,00			



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL	MES AGOSTO		
						CANT	VALOR	%
32.1	Excavación manual en material común	M3	2,00	\$ 50.462,00	\$ 100.924,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
32.2	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 m - 510 kg-f	UND	4,00	\$4.422.059,00	\$ 17.688.236,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
32.3	Cimentación de poste de concreto	M3	1,50	\$1.135.084,00	\$ 1.702.626,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
32.4	Suministro e instalación de estructura para reflectores en poste	UND	4,00	\$1.478.416,00	\$ 5.913.664,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
32.5	Suministro e instalación de reflector de 400 w solar fotovoltaico	UND	8,00	\$1.771.596,00	\$ 14.172.768,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
32.6	Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico de 30 w	UND	8,00	\$ 528.767,00	\$ 4.230.136,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
32.7	Sistema de puesta a tierra para reflectores	UND	4,00	\$1.310.344,00	\$ 5.241.376,00	0,0	\$ 0,00	0,00 %
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS					\$ 3.542.000.192,00	0,0	\$427.521.917,00	12,07 %
IMPLEMENTAR PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA (PGIO)					\$ 35.933.036,60	0,2295	\$ 8.246.518,30	22,95%
TRAMITE DE CERTIFICADO RETILAP					\$ 22.000.000,00	0,0	\$ 0,00	0,00%
TOTAL COSTO OBRA CIVIL					\$ 3.599.933.228,60		\$435.768.435,30	12,10%

EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA
 DIRECTOR DE OBRA
 M.P 091037-0601065 CND

CLAUDIA WILENA SEGURA
 RESIDENTE DE OBRA
 M.P A1052022-1010221789

PEDRO LUIS USMA VILLA
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 M.P 54202-403854 NTS

LEONARDO CAMARGO VELAZCO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 M.P 68202-359088 STD

5.2.1. Descripción de las actividades desarrolladas mes de agosto

ESCUELA CRISTOBAL COLON - RESGUARDO GENAREROS

ITEM	17.1	DESCRIPCIÓN	Localización y replanteo topográfico			UND	M2
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% AVANCE
428,80	\$ 7.616,00	\$ 3.265.741,00	428,80	\$ 3.265.741,00	100%	428,80	\$ 3.265.741,00 100%

PROCESO CONSTRUCTIVO: Para la ejecución de la actividad de localización y replanteo topográfico para el cerramiento realizo la verificación de los puntos de referencia establecidos en los planos, ubicando en terreno los ejes, niveles y dimensiones necesarias para guiar correctamente la construcción. Utilizo equipos topográficos como estación total o nivel, garantizando precisión en la marcación y asegurando que las obras se desarrollen conforme a lo proyectado.

MATERIALES: PUNTILLA 1+ 1/2 A 3 PULG., PINTURA EN ESMALTE Y ESTACA DE MADERA H=50CM

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR (M.O) Y EQUIPO DE TOPOGRAFICA (ESTACIÓN Y NIVEL)

PERSONAL: TOPOGRAFO, AYUDANTE Y CADENERO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Fotografía 1-2 Zona de Graderías

Nota. Ver memoria de cálculo 17.1 anexa.



1909

INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	17.2	DESCRIPCIÓN	Excavación manual en material común			UND	M3	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
101.60	\$ 50.462.00	\$ 5.126.939.00	101.60	\$ 5.126.939.00	100%	101.60	\$ 5.126.939.00	100%

PROCESO CONSTRUCTIVO: Para la ejecución de la excavación manual en material común se realizó el retiro del suelo con herramientas menores como pala y pica; siguiendo las dimensiones, alineamientos y profundidades definidas en los planos. Durante el proceso se procuro mantener la estabilidad de los taludes, evitando afectaciones al terreno, y se dispuso el material sobrante en el lugar indicado para su posterior cargue o reutilización.

MATERIALES: N/A

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL: AYUDANTE

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Fotografía 3. Excavación zapatas Eje B



Fotografía 4. Excavación zapatas Eje 1

Nota. Ver memoria de cálculo 17.2 anexa.

ITEM	18.1	DESCRIPCIÓN	Concreto de 2500 psi para solado e=5cm			UND	M2	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
163,10	\$ 58.287,00	\$ 9.506.610,00	163,10	\$ 9.506.610,00	100%	163,10	\$ 9.506.610,00	100%

PROCESO CONSTRUCTIVO: Para el solado de concreto de 2500 psi con espesor de 5 cm se preparó la superficie mediante la compactación y humedecimiento de la base, se instalaron reglas al nivel proyectado y se colocó el concreto con la dosificación especificada. El material se extendió y niveló con regla, se realizó el fraguado inicial y se aplicó llana para obtener un acabado uniforme, garantizando el espesor constante.

MATERIALES: Concreto de 2500 PSI

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL: AYUDANTE, Oficial

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Fotografía 5. Solado zapatas Eje B



Fotografía 6. Solado viga de cimentación Eje 1

Nota. Ver memoria de cálculo 18.1 anexa.



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	18.2	DESCRIPCIÓN	Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI			UND	ML	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
400.60	\$ 106.606,00	\$ 42.706.364,00	400.60	\$ 42.706.364,00	100%	400.60	\$ 42.706.364,00	100%

PROCESO CONSTRUCTIVO: La viga de cimentación de cerramiento de 20x25 cm en concreto de 3.000 PSI se ejecutó excavando la zanja según las dimensiones proyectadas, colocando la formaleta y el refuerzo de acero de acuerdo con los planos estructurales. Posteriormente, se vació el concreto con la resistencia especificada, se vibró para garantizar su adecuada compactación y se niveló la superficie superior. Finalmente, se realizó el proceso de curado para asegurar la resistencia y durabilidad de la estructura.

MATERIALES: Concreto de 3000 PSI

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, VIBRADOR DE CONCRETO Y FORMALETA EN MADERA 3 USOS

PERSONAL: AYUDANTE, Oficial

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Fotografía 7. Viga de cimentación Eje A



Fotografía 8. Viga de cimentación Eje 1

Nota. Ver memoria de cálculo 18.2 anexa.

ITEM	18.3	DESCRIPCIÓN	Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 PSI			UND	ML	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
182.90	\$ 107.723,00	\$ 19.702.537,00	79.50	\$ 8.563.979,00	43,47%	79.50	\$ 8.563.979,00	43,47%

PROCESO CONSTRUCTIVO: La columneta de 20x20 cm en concreto de 3.000 PSI se construyó disponiendo la formaleta y el refuerzo de acero según lo establecido en los planos estructurales. Posteriormente, se vació el concreto con la resistencia especificada, se vibró para asegurar su correcta compactación y se cuidó el alineamiento y verticalidad del elemento. Finalmente, se retiró la formaleta una vez alcanzado el fraguado requerido y se realizó el curado para garantizar la resistencia y durabilidad de la estructura.

MATERIALES: Concreto de 3000 PSI

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, Vibrador de concreto y formaleta en madera 3 usos

PERSONAL: AYUDANTE, Oficial

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Fotografía 9. Columneta 20x20 Eje 1



Fotografía 10. Columneta 20x20 Eje 1

Nota. Ver memoria de cálculo 18.3 anexa.



INFORME MENSUAL NO. 2

PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	18.4	DESCRIPCIÓN	Acero de refuerzo 60000 psi			UND	KG	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
8269,00	\$ 13.763,00	\$ 113.806.247,00	5889,55	\$ 81.057.877,00	71,22%	5889,55	\$ 81.057.877,00	71,22%

PROCESO CONSTRUCTIVO: El acero de refuerzo de 60.000 psi se colocó conforme a lo indicado en los planos estructurales, cortando y doblando las varillas según las dimensiones requeridas. Se amarraron con alambre recocido para garantizar su correcta unión y posición dentro de la formaleta, asegurando los recubrimientos de concreto mediante el uso de separadores. De esta manera se garantizó la resistencia, estabilidad y adecuada transmisión de esfuerzos en los elementos estructurales.

MATERIALES: Acero de refuerzo de 60000 PSI y alambre negro

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, Cizalla manual y dobladora manual

PERSONAL: AYUDANTE, Oficial

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Fotografía 11. Acero de Refuerzo vigas de cimentación Eje 1



Fotografía 12. Acero de Refuerzo zapatas Eje 1

Nota. Ver memoria de cálculo 18.4 anexa.

ITEM	18.6	DESCRIPCIÓN	Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 PSI			UND	ML	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
14,80	\$ 163.403,00	\$ 2.418.364,00	14,80	\$ 2.418.364,00	100,00%	14,80	\$ 2.418.364,00	100,00%

PROCESO CONSTRUCTIVO: La columna de 30x30 cm en concreto de 3.000 PSI se ejecutó instalando el refuerzo de acero conforme a los planos estructurales y asegurando su correcta posición mediante separadores. Luego se armó y fijó la formaleta garantizando la alineación y verticalidad, para posteriormente vaciar el concreto con la resistencia especificada. Durante el vaciado se utilizó vibrador para lograr una adecuada compactación, evitando vacíos o segregaciones. Finalmente, se retiró la formaleta después del fraguado inicial y se realizó el curado correspondiente para garantizar la resistencia y durabilidad del elemento estructural.

MATERIALES: Básico de Concreto de 3000 PSI

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, Vibrador de concreto y formaleta en madera 3 usos

PERSONAL: AYUDANTE, Oficial

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Fotografía 13. Columna 30*30 Portón Eje B



Fotografía 14. Columna 30*30 Portón Eje B

Nota. Ver memoria de cálculo 18.6 anexa.

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca

✉ consorcioctic1@gmail.com

Nit. 901.962.949-1

☎ 3112601212



1912

INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	18.7	DESCRIPCIÓN	Zapata en concreto de 3.000 PSI			UND	M3	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
11,70	\$ 1.272.329,00	\$ 14.886.249,00	11,70	\$ 14.886.249,00	100,00%	11,70	\$ 14.886.249,00	100,00%

PROCESO CONSTRUCTIVO: La zapata en concreto de 3.000 PSI se construyó excavando el área según las dimensiones proyectadas y preparando la base con una capa de solado para recibir el refuerzo. Se colocó el acero de acuerdo con los planos estructurales, asegurando su correcta posición mediante separadores, y se procedió al vaciado del concreto con la resistencia especificada. Durante el llenado se vibró el material para garantizar su adecuada compactación y se niveló la superficie. Finalmente, se efectuó el curado para asegurar la resistencia y durabilidad de la cimentación.

MATERIALES: Básico de Concreto de 3000 PSI

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR y Vibrador de concreto

PERSONAL: AYUDANTE, Oficial

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Fotografía 15. Zapata en concreto Portón Eje 1



Fotografía 16. Zapata en concreto Portón Eje B

Nota. Ver memoria de cálculo 18.7 anexa.

ITEM	20.1	DESCRIPCIÓN	Localización y replanteo topográfico			UND	M2	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
672.00	\$ 7.616.00	\$ 5.117.952.00	672.00	\$ 5.117.952.00	100.00%	672.00	\$ 5.117.952.00	100.00%

PROCESO CONSTRUCTIVO: Para la ejecución de la actividad de localización y replanteo topográfico de la cancha múltiple se realizó la verificación de los puntos de referencia establecidos en los planos, ubicando en terreno los ejes, niveles y dimensiones necesarias para guiar correctamente la construcción. Utilizo equipos topográficos como estación total o nivel, garantizando precisión en la marcación y asegurando que las obras se desarrollen conforme a lo proyectado.

MATERIALES: PUNTILLA 1+ 1/2 A 3 PULG, PINTURA EN ESMALTE Y ESTACA DE MADERA H=50CM

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR (M.O) Y EQUIPO DE TOPOGRAFICA (ESTACIÓN Y NIVEL)

PERSONAL: TOPOGRAFO, AYUDANTE Y CADENERO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Fotografía 17-18. Localización y Replanteo zona de cancha múltiple



Nota. Ver memoria de cálculo 20.1 anexa.



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	20.3	DESCRIPCIÓN	Relleno con material tipo sub base			UND	M3	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
134,40	\$ 214.508,00	\$ 28.829.875,00	134,40	\$ 28.829.875,00	100,00%	134,40	\$ 28.829.875,00	100,00%

PROCESO CONSTRUCTIVO: El relleno con material tipo sub base se ejecutó extendiendo el material en capas sucesivas de espesor controlado, previamente humedecidas para facilitar su compactación. Cada capa fue compactada con equipo adecuado hasta alcanzar la densidad especificada en los planos y normas técnicas, garantizando uniformidad y estabilidad. Finalmente, se verificaron cotas y nivelación para asegurar que la superficie quedara en condiciones óptimas para recibir las capas superiores de la estructura.

MATERIALES: sub base granular y agua

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR (M.O) Y vibrocompactador tipo rana

PERSONAL: AYUDANTE

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Fotografía 19-20. Relleno con material de Sub Base Cancha Múltiple

Nota. Ver memoria de cálculo 20.3 anexa.

ITEM	20.4	DESCRIPCIÓN	Descapote y nivelación manual del terreno			UND	M2	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
701,40	\$ 10.092,00	\$ 7.078.529,00	701,40	\$ 7.078.529,00	100,00%	701,40	\$ 7.078.529,00	100,00%

PROCESO CONSTRUCTIVO: El descapote y nivelación manual del terreno se realizó retirando la capa vegetal y el material suelto con herramientas menores como pala y pica, hasta alcanzar la cota establecida en los planos. Posteriormente, se procedió a nivelar la superficie de manera uniforme, asegurando que quedara lista y en condiciones adecuadas para iniciar las siguientes actividades constructivas.

MATERIALES: N/A

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR (M.O)

PERSONAL: AYUDANTE

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Fotografía 21-22. Descapote y Nivelación manual zona de Cancha Múltiple

Nota. Ver memoria de cálculo 20.4 anexa.



INFORME MENSUAL NO. 2

PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	20.5	DESCRIPCIÓN	Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño máximo 4"			UND	M3	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
235,20	\$ 186.484,00	\$ 43.861.037,00	235,20	\$ 43.861.037,00	100,00%	235,20	\$ 43.861.037,00	100,00%
PROCESO CONSTRUCTIVO: El descapote y nivelación manual del terreno se realizó retirando la capa vegetal y el material suelto con herramientas menores como pala y pica, hasta alcanzar la cota establecida en los planos. Posteriormente, se procedió a nivelar la superficie de manera uniforme, asegurando que quedara lista y en condiciones adecuadas para iniciar las siguientes actividades constructivas.								
MATERIALES: Crudo de río clasificado <4" y agua								
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR (M.O) Y vibrocompactador tipo rana								
PERSONAL: AYUDANTE								
EVIDENCIA FOTOGRAFICA								
								
Fotografía 23-24. Relleno y compactación Material 4" zona de Cancha Múltiple								

Nota. Ver memoria de cálculo 20.5 anexa.

ESCUELA SANTA TERESITA - RESGUARDO ROQUEROS

ITEM	25.1	DESCRIPCIÓN	Localización y replanteo topográfico			UND	M2	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
316,20	\$ 7.616,00	\$ 2.408.179,00	316,20	\$ 2.408.179,00	100,00%	316,20	\$ 2.408.179,00	100,00%

PROCESO CONSTRUCTIVO: El descapote y nivelación manual del terreno se realizó retirando la capa vegetal y el material suelto con herramientas menores como pala y pica, hasta alcanzar la cota establecida en los planos. Posteriormente, se procedió a nivelar la superficie de manera uniforme, asegurando que quedara lista y en condiciones adecuadas para iniciar las siguientes actividades constructivas.

MATERIALES: PUNTILLA 1+ 1/2 A 3 PULG, PINTURA EN ESMALTE Y ESTACA DE MADERA H=50CM

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR (M.O) Y EQUIPO DE TOPOGRAFICA (ESTACIÓN Y NIVEL)

PERSONAL: TOPOGRAFO, AYUDANTE Y CADENERO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
	
Fotografía 25. Localización y Replanteo Graderías	Fotografía 26. Localización y Replanteo Cerramiento

Nota. Ver memoria de cálculo 25.1 anexa.



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	25.2	DESCRIPCIÓN	Excavación manual en material común			UND	M3	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
82.60	\$ 50.462.00	\$ 4,168.161.00	82.60	\$ 4.168.161.00	100.00%	82.60	\$ 4,168.161.00	100.00%

PROCESO CONSTRUCTIVO: Para la ejecución de la excavación manual en material común se realizó el retiro del suelo con herramientas menores como pala y pica, siguiendo las dimensiones, alineamientos y profundidades definidas en los planos. Durante el proceso se procuro mantener la estabilidad de los taludes, evitando afectaciones al terreno, y se dispuso el material sobrante en el lugar indicado para su posterior cargue o reutilización.

MATERIALES: N/A

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL: AYUDANTE

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Fotografía 27. Excavación Manual zapatas Eje 2



Fotografía 28. Excavación Manual zapatas Eje A

Nota. Ver memoria de cálculo 25.2 anexa.

ITEM	26.1	DESCRIPCIÓN	Concreto de 2500 psi para solado e=5cm			UND	M2	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
125.90	\$ 58.287.00	\$ 7.338.333.00	125.90	\$ 7.338.333.00	100%	125.90	\$ 7.338.333.00	100%

PROCESO CONSTRUCTIVO: Para el solado de concreto de 2500 psi con espesor de 5 cm se preparó la superficie mediante la compactación y humedecimiento de la base, se instalaron reglas al nivel proyectado y se colocó el concreto con la dosificación especificada. El material se extendió y niveló con regla, se realizó el fraguado inicial y se aplicó llana para obtener un acabado uniforme, garantizando el espesor constante.

MATERIALES: Concreto de 2500 PSI


HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL: AYUDANTE, Oficial

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Fotografía 29. Solado Viga de Cimentación Eje 2

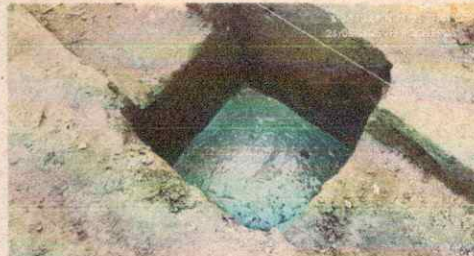

Fotografía 30. Solado Zapatas Eje 2

Nota. Ver memoria de cálculo 26.1 anexa.

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca

✉ consorciocic1@gmail.com

Nit. 901.962.949-1

☎ 3112691312



INFORME MENSUAL NO. 2

PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	26.2	DESCRIPCIÓN	Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI			UND	ML	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
286,80	\$ 106.606,00	\$ 30.574.601,00	145,90	\$ 15.553.815,00	50,87%	145,90	\$ 15.553.815,00	50,87%

PROCESO CONSTRUCTIVO: La viga de cimentación de cerramiento de 20x25 cm en concreto de 3.000 PSI se ejecutó excavando la zanja según las dimensiones proyectadas, colocando la formaleta y el refuerzo de acero de acuerdo con los planos estructurales. Posteriormente, se vació el concreto con la resistencia especificada, se vibró para garantizar su adecuada compactación y se niveló la superficie superior. Finalmente, se realizó el proceso de curado para asegurar la resistencia y durabilidad de la estructura.

MATERIALES: Concreto de 3000 PSI

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, VIBRADOR DE CONCRETO Y FORMALETA EN MADERA 3 USOS

PERSONAL: AYUDANTE, Oficial

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Fotografía 31. Viga de cimentación Eje 2



Fotografía 32. Viga de cimentación Eje 2

Nota. Ver memoria de cálculo 26.2 anexa.

ITEM	26.3	DESCRIPCIÓN	Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 PSI			UND	ML	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
131.10	\$ 107.723.00	\$ 14.122.485.00	47.50	\$ 5.116.843.00	36.23%	47.50	\$ 5.116.843.00	36.23%

PROCESO CONSTRUCTIVO: La columneta de 20x20 cm en concreto de 3.000 PSI se construyó disponiendo la formaleta y el refuerzo de acero según lo establecido en los planos estructurales. Posteriormente, se vació el concreto con la resistencia especificada, se vibró para asegurar su correcta compactación y se cuidó el alineamiento y verticalidad del elemento. Finalmente, se retiró la formaleta una vez alcanzado el fraguado requerido y se realizó el curado para garantizar la resistencia y durabilidad de la estructura.

MATERIALES: Concreto de 3000 PSI

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, Vibrador de concreto y formaleta en madera 3 usos

PERSONAL: AYUDANTE, Oficial

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Fotografía 33. Columneta 20*20 Eje 2



Fotografía 34. Columneta 20*20 Eje 2

Nota. Ver memoria de cálculo 26.3 anexa.

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca

✉ consorcioic1@gmail.com

Nit. 901.962.949-1

☎ 2112401212



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	26.4	DESCRIPCIÓN	Acero de refuerzo 60000 PSI			UND	KG	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
6647.20	\$ 13.763,00	\$ 91.485.414,00	3265,43	\$ 44.942.113,00	49,12%	3265,43	\$ 44.942.113,00	49,12%
PROCESO CONSTRUCTIVO: El acero de refuerzo de 60.000 psi se colocó conforme a lo indicado en los planos estructurales, cortando y doblando las varillas según las dimensiones requeridas. Se amarraron con alambre recocido para garantizar su correcta unión y posición dentro de la formaleta, asegurando los recubrimientos de concreto mediante el uso de separadores. De esta manera se garantizó la resistencia, estabilidad y adecuada transmisión de esfuerzos en los elementos estructurales.								
MATERIALES: Acero de refuerzo de 60000 PSI y alambre negro								
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, Cizalla manual y dobladora manual								
PERSONAL: AYUDANTE, Oficial								

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Fotografía 35. Acero de Refuerzo Columnetas Eje A



Fotografía 36. Acero de Refuerzo Columnetas Eje 2

Nota. Ver memoria de cálculo 26.4 anexa.

ITEM	26.7	DESCRIPCIÓN	Zapata en concreto de 3.000 PSI			UND	M3	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
8,40	\$ 1.272.329,00	\$ 10.687.564,00	8,40	\$ 10.687.564,00	100,00%	8,40	\$ 10.687.564,00	100,00%
PROCESO CONSTRUCTIVO: La zapata en concreto de 3.000 PSI se construyó excavando el área según las dimensiones proyectadas y preparando la base con una capa de solado para recibir el refuerzo. Se colocó el acero de acuerdo con los planos estructurales, asegurando su correcta posición mediante separadores, y se procedió al vaciado del concreto con la resistencia especificada. Durante el llenado se vibró el material para garantizar su adecuada compactación y se niveló la superficie. Finalmente, se efectuó el curado para asegurar la resistencia y durabilidad de la cimentación.								
MATERIALES: Basico de Concreto de 3000 PSI								
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR y Vibrador de concreto								
PERSONAL: AYUDANTE, Oficial								

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Fotografía 37. Zapatas en concreto eje 2



Fotografía 38. Zapatas en concreto eje 2

Nota. Ver memoria de cálculo 26.7 anexa.



1918

INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	28.1	DESCRIPCIÓN	Localización y replanteo topográfico			UND	M2	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
672.00	\$ 7.616,00	\$ 5.117.952,00	672.00	\$ 5.117.952,00	100,00%	672.00	\$ 5.117.952,00	100,00%

PROCESO CONSTRUCTIVO: Para la ejecución de la actividad de localización y replanteo topográfico de la cancha multiple se realizó la verificación de los puntos de referencia establecidos en los planos, ubicando en terreno los ejes, niveles y dimensiones necesarias para guiar correctamente la construcción. Utilizo equipos topográficos como estación total o nivel, garantizando precisión en la marcación y asegurando que las obras se desarrollen conforme a lo proyectado.

MATERIALES: PUNTIJILLA 1+ 1/2 A 3 PULG, PINTURA EN ESMALTE Y ESTACA DE MADERA H=50CM

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR (M.O) Y EQUIPO DE TOPOGRAFICA (ESTACIÓN Y NIVEL)

PERSONAL: TOPOGRAFO, AYUDANTE Y CADENERO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Fotografía 39-40. Localización y Replanteo Zona de Cancha Múltiple

Nota. Ver memoria de cálculo 28.1 anexa.

ITEM	28.3	DESCRIPCIÓN	Relleno con material tipo sub base			UND	M3	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
134.40	\$ 214.508.00	\$ 28.829.875.00	134.40	\$ 28.829.875.00	100.00%	134.40	\$ 28.829.875.00	100.00%

PROCESO CONSTRUCTIVO: El relleno con material tipo sub base se ejecutó extendiendo el material en capas sucesivas de espesor controlado, previamente humedecidas para facilitar su compactación. Cada capa fue compactada con equipo adecuado hasta alcanzar la densidad especificada en los planos y normas técnicas, garantizando uniformidad y estabilidad. Finalmente, se verificaron cotas y nivelación para asegurar que la superficie quedara en condiciones óptimas para recibir las capas superiores de la estructura.

MATERIALES: sub base granular y agua

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR (M.O) Y vibrocompactador tipo rana

PERSONAL: AYUDANTE

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Fotografía 41. Relleno con sub base cancha múltiple



Fotografía 42. Relleno con sub base cancha múltiple

Nota. Ver memoria de cálculo 28.3 anexa.



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	28.4	DESCRIPCIÓN	Descapote y nivelación manual del terreno			UND	M2	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
701,40	\$ 10.092,00	\$ 7.078.529,00	701,40	\$ 7.078.529,00	100,00%	701,40	\$ 7.078.529,00	100,00%

PROCESO CONSTRUCTIVO: El descapote y nivelación manual del terreno se realizó retirando la capa vegetal y el material suelto con herramientas menores como pala y pica, hasta alcanzar la cota establecida en los planos. Posteriormente, se procedió a nivelar la superficie de manera uniforme, asegurando que quedara lista y en condiciones adecuadas para iniciar las siguientes actividades constructivas.

MATERIALES: N/A

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR (M.O)

PERSONAL: AYUDANTE

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Fotografía 43. Descapote y nivelación cancha Múltiple



Fotografía 44. Descapote y nivelación cancha Múltiple

Nota. Ver memoria de cálculo 28.4 anexa.

ITEM	28.5	DESCRIPCIÓN	Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño máximo 4"			UND	M3	
CANTIDADES CONTRATADAS			CANTIDADES EJECUTADAS MES			CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		
CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL	% AVANCE
235,20	\$ 186.484,00	\$ 43.861.037,00	235,20	\$ 43.861.037,00	100,00%	235,20	\$ 43.861.037,00	100,00%

PROCESO CONSTRUCTIVO: El descapote y nivelación manual del terreno se realizó retirando la capa vegetal y el material suelto con herramientas menores como pala y pica, hasta alcanzar la cota establecida en los planos. Posteriormente, se procedió a nivelar la superficie de manera uniforme, asegurando que quedara lista y en condiciones adecuadas para iniciar las siguientes actividades constructivas.

MATERIALES: Crudo de río clasificado <4" y agua

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR (M.O) Y vibrocompactador tipo rana

PERSONAL: AYUDANTE

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Fotografía 45-46 Relleno y compactación Material 4" zona de Cancha Múltiple.



Nota. Ver memoria de cálculo 28.5 anexa.

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca

✉ consorcioctic1@gmail.com

Nit. 901.962.949-1

☎ 3112401212



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Las actividades y cantidades presentadas anteriormente fueron objeto de revisión detallada por parte de la interventoría, la cual verificó su coherencia con el alcance del proyecto, las memorias de cálculo, las especificaciones técnicas, los diseños aprobados y las condiciones reales de ejecución. Como resultado de este proceso, la interventoría otorgó su aval, dejando constancia de que dichas actividades y cantidades se ajustan a lo ejecutado en obra y cumplen con los lineamientos contractuales y normativos vigentes.


NOTA: Para poder referenciar el registro fotográfico, se recomienda ver planos adjuntos a continuación.

<p>Revisó:</p>  LEONARDO CAMARGO VELAZCO CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA M.P. 68202-359088 STD	<p>Aprobó:</p>  PEDRO LUIS USMA VILLA ING. DIRECTOR DE INTERVENTORIA R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS CONTRATO DE INTERVENTORIA N.239 /2025 M.P. 54202-403854 NTS
--	--



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025


PLANO DE IMPLANTACIÓN RESGUARDO INDIGENA GENAREROS

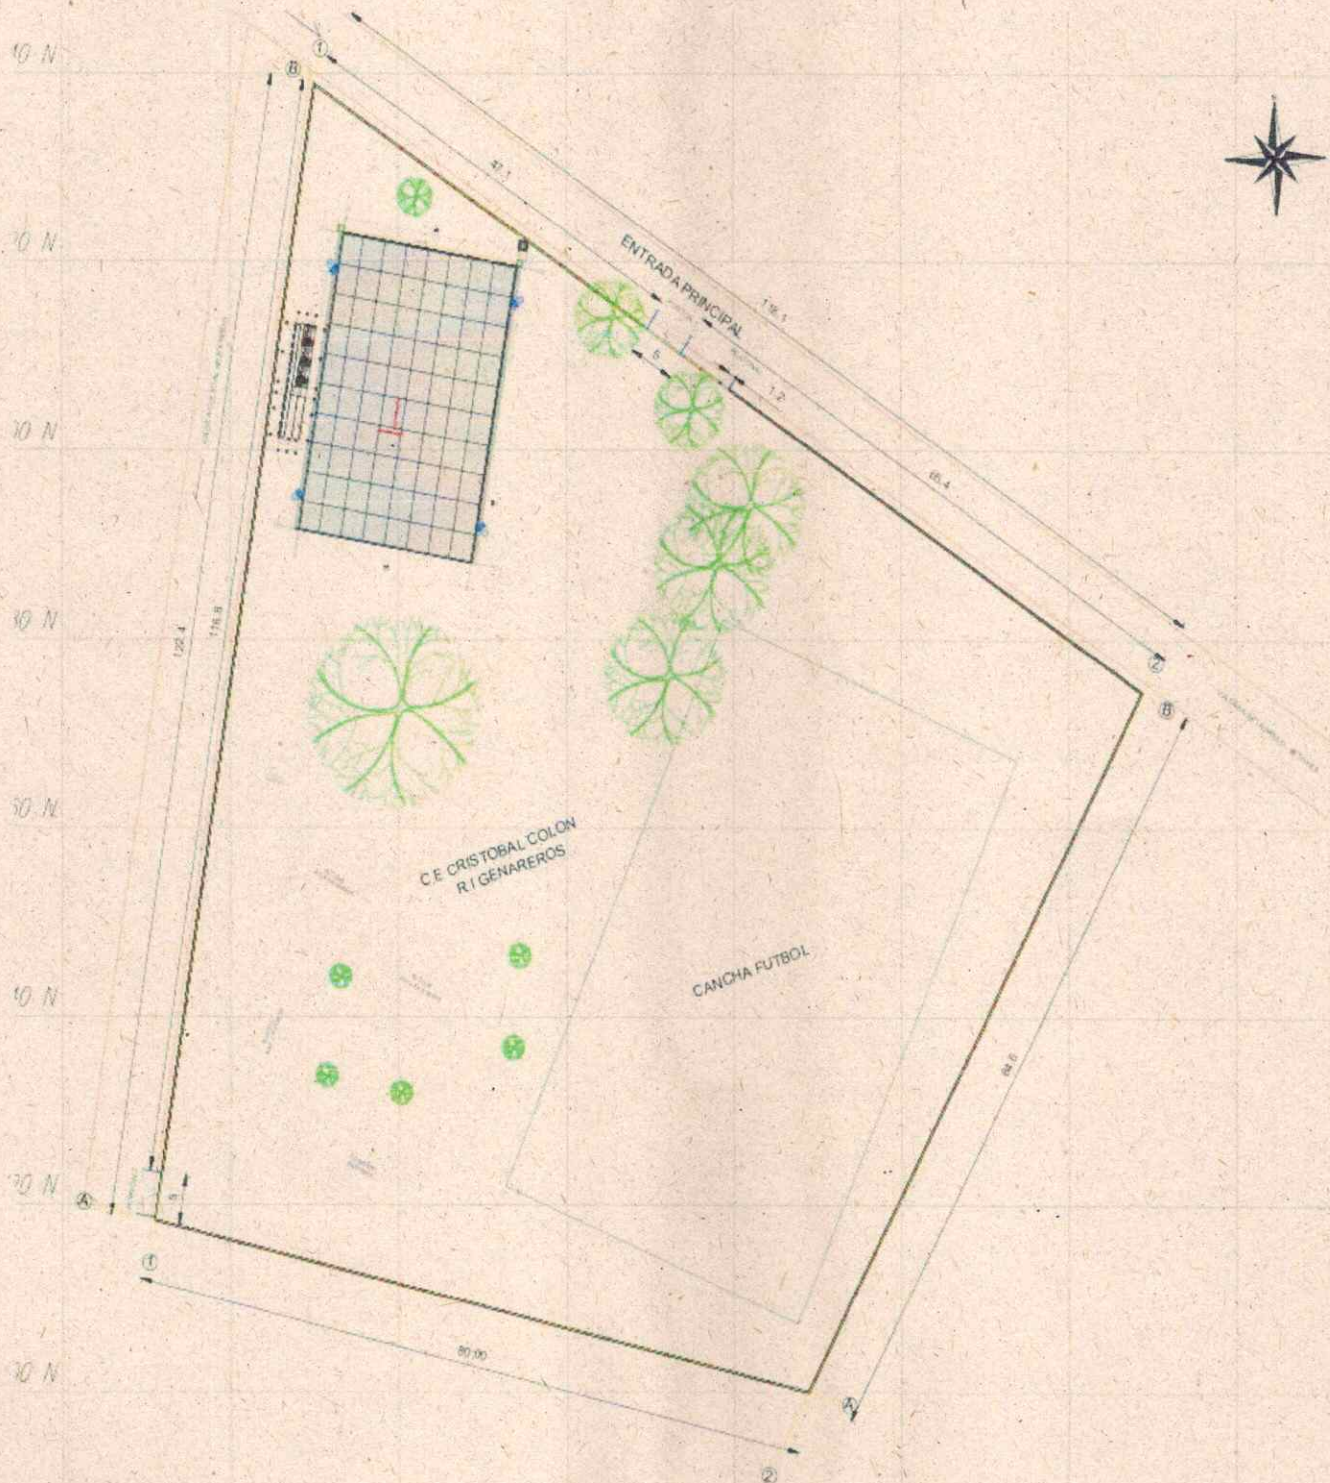



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

PLANO DE IMPLANTACIÓN RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS

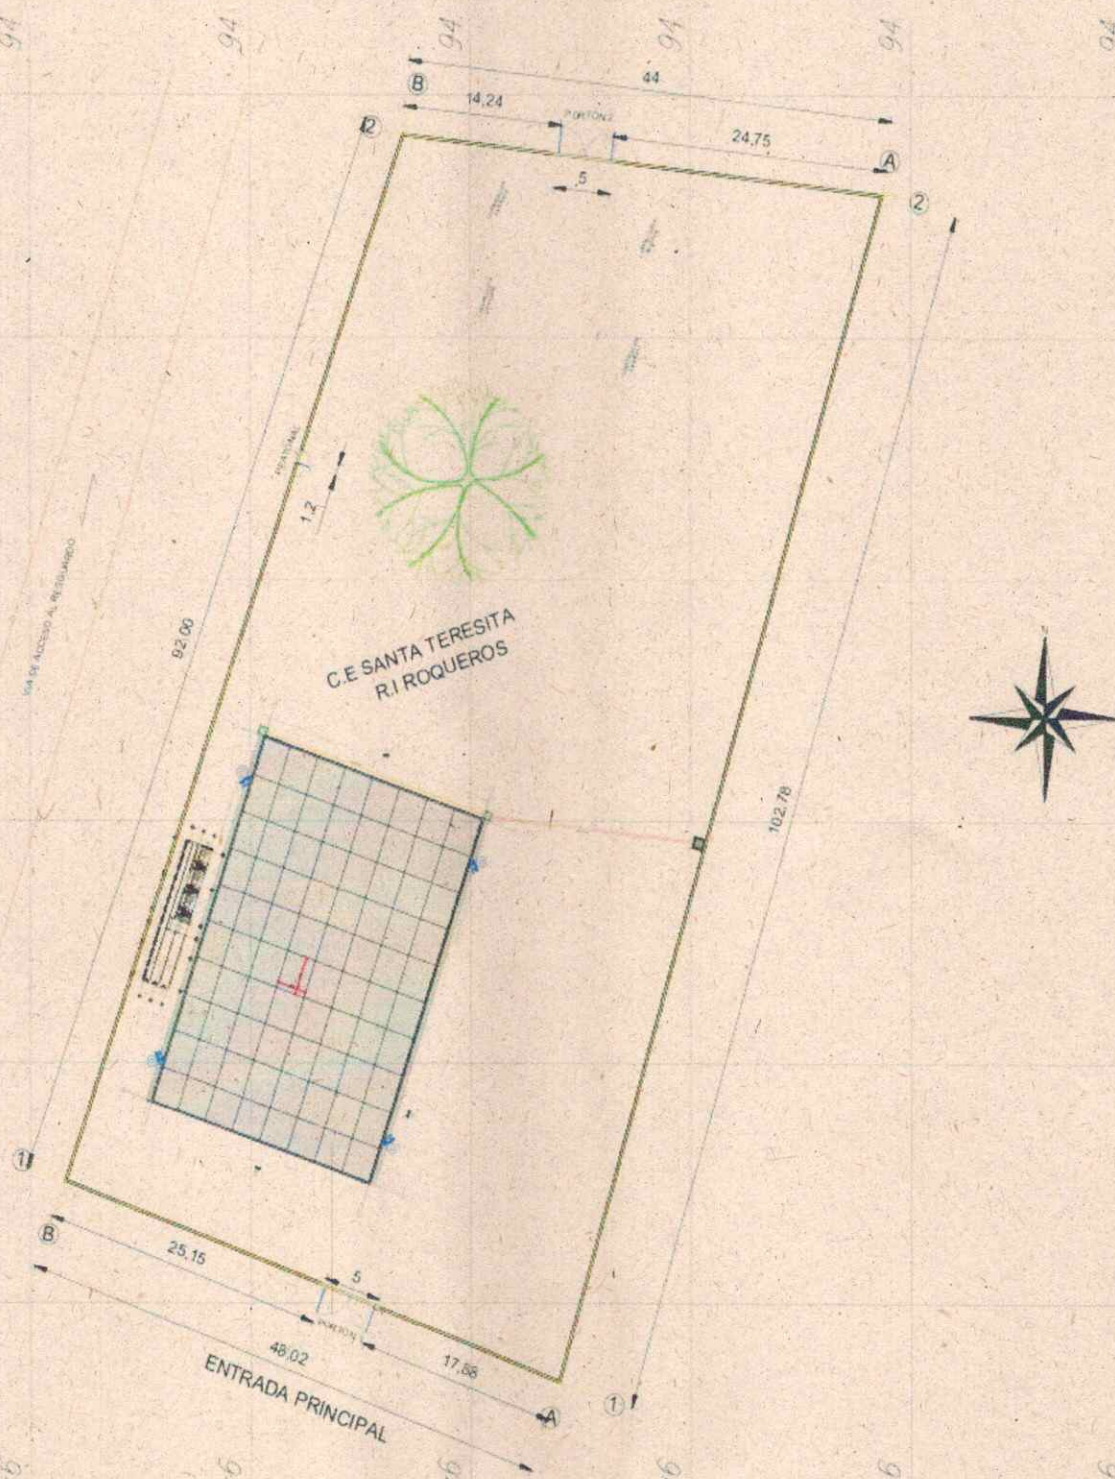



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

5.2.2. Memorias de cálculo mes de septiembre

El contratista CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC presenta las memorias de cálculo correspondientes a las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto como soporte técnico de las cantidades y trabajos desarrollados en dicho periodo.

Anexo 5. Memorias de calculo

5.3. AVANCE DE LA OBRA

5.3.1. Avance Físico de la obra

De acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas en el periodo desde el 01 de agosto al 31 de agosto de 2025, se presenta un avance de ejecución del 12.10% y un avance acumulado del 12.19%, No obstante, se destaca que aún queda un 87.81% por ejecutar.

Gráfico No. 1 Avance Físico del contrato de obra No. 251 de 2025



5.3.2. PROGRAMADO VS EJECUTADO

A continuación, se elabora un reporte semanal comparando las actividades programadas en el cronograma inicial con las realmente ejecutadas, con el fin de evaluar el avance y detectar posibles retrasos o adelantos respecto a la planificación.

Tabla 18 Programado vs Ejecutado


SEMANAS	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
SEMANA 1	0,045%	0,045%	0,04%	0,040%
SEMANA 2	0,045%	0,091%	0,04%	0,08%
SEMANA 3	0,969%	1,059%	1,42%	1,51%
SEMANA 4	1,805%	2,864%	1,42%	2,93%
SEMANA 5	2,291%	5,156%	3,42%	6,35%
SEMANA 6	3,693%	8,849%	2,42%	8,77%
SEMANA 7	4,859%	13,709%	3,42%	12,19%
SEMANA 8	5,436%	19,144%		
SEMANA 9	2,740%	21,884%		
SEMANA 10	7,125%	29,009%		
SEMANA 11	6,200%	35,209%		
SEMANA 12	6,617%	41,826%		
SEMANA 13	4,839%	46,665%		



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

SEMANAS	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
SEMANA 14	2,158%	48,822%		
SEMANA 15	2,748%	51,570%		
SEMANA 16	2,755%	54,325%		
SEMANA 17	3,045%	57,370%		
SEMANA 18	7,383%	64,753%		
SEMANA 19	8,033%	72,785%		
SEMANA 20	8,862%	81,647%		
SEMANA 21	11,858%	93,506%		
SEMANA 22	6,494%	100,000%		

PROGRAMADO vs EJECUTADO

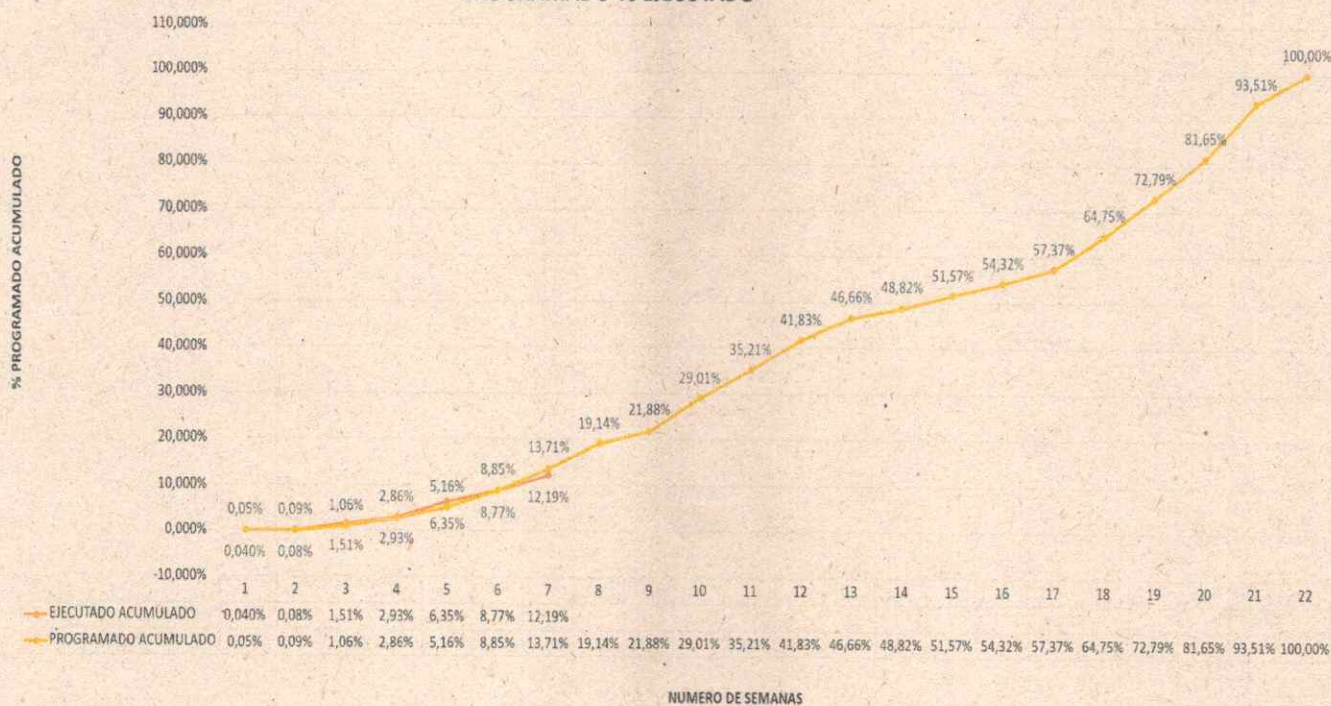

NOTA: Ver cronograma respaldatorio, anexo en los documentos técnicos exigidos en pliego de condiciones (programación de obra).



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

5.4. ENSAYOS DE LABORATORIO

El contratista CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC, llevó a cabo junto con el personal, el registro de control de calidad de ejecución de actividades en obra mediante elaboración de ensayos. Se anexa el diseño de mezcla realizado por el contratista de obra, con muestras de los agregados y materiales de la cantera relacionada.

Tabla 19 Ensayos de laboratorio

No.	FECHA	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL ENSAYO	MATERIAL
1.	05/08/2025	Zapatas - Genareros	Toma, curado y falla cilindros	Concreto de 3000 PSI
2.	11/08/2025	Viga de cimentación - Genareros	Toma, curado y falla cilindros	Concreto de 3000 PSI
3.	26/08/2025	Zapatas - Roqueros	Toma, curado y falla cilindros	Concreto de 3000 PSI
4.	29/08/2025	Viga de cimentación - Roqueros	Toma, curado y falla cilindros	Concreto de 3000 PSI

- ✓ **MUESTRA NO. 1:** Tomada el día 05 de agosto de 2025 por el inspector de interventoría ALFREDO LEIVA, en el Resguardo Indígena Genareros, las cuales fueron transportadas, curadas y ensayadas a los 7 días (12/08/2025) y 28 días (02/09/2025) por la empresa GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS M&N S.A.S.
- ✓ **MUESTRA NO. 2:** Tomada el día 11 de agosto de 2025 por el inspector de interventoría ALFREDO LEIVA, en el Resguardo Indígena Genareros, las cuales fueron transportadas, curadas y ensayadas a los 7 días (18/08/2025) y 28 días (08/09/2025) por la empresa GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS M&N S.A.S.



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

- ✓ **MUESTRA NO. 3:** Tomada el día 26 de agosto de 2025 por el inspector de interventoría ALFREDO LEIVA, en el Resguardo Indígena Roqueros, las cuales fueron transportadas, curadas y ensayadas a los 7 días (02/09/2025) y 28 días (23/09/2025) por la empresa GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS M&N S.A.S.
- ✓ **MUESTRA NO. 4:** Tomada el día 29 de agosto de 2025 por el inspector de interventoría ALFREDO LEIVA, en el Resguardo Indígena Roqueros, las cuales fueron transportadas, curadas y ensayadas a los 7 días (05/09/2025) y 28 días (26/09/2025) por la empresa GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS M&N S.A.S.

Ilustración 9. Ensayos de laboratorios





INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025



Anexo 6. Copia de ensayos de laboratorio y certificados de calidad de materiales.

Nota: Se aclara que, si bien al finalizar el periodo que comprende el presente informe fueron realizadas actividades de relleno y compactación de material de sub base granular para la estructura de las canchas múltiples de los dos resguardos indígenas, los ensayos de densidades previstos en el plan de calidad, serán realizados en el próximo periodo y se entregarán los respectivos resultados ante la interventoría externa para su revisión y fines pertinentes.

6. ASPECTOS FINANCIEROS

6.1. FORMA DE PAGO

El contrato de obra No. 251 de 2025 presentó un anticipo, de esta forma, la ejecución financiera según CLÁUSULA 8: FORMA DE PAGO se soporta de la siguiente manera.

E En caso de que el Contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la Entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el ochenta (80 %) del valor del Contrato. El veinte (20%) restante se pagará contra la liquidación del Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

Gráfico 1. Forma de pago al contratista



6.2. ANTICIPO

El contrato de obra No. 251 de 2025 presentó un anticipo, de esta forma, la ejecución financiera según CLÁUSULA 6: ANTICIPO se soporta de la siguiente manera.

CLÁUSULA 6: La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las garantías exigidas en el Proceso de Contratación.



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Se entregará al Contratista a título de anticipo un valor equivalente al cincuenta (50%) por ciento del valor básico del Contrato.

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea MUNICIPIO DE TAME (ARAUCA), el cual será vigilado por el interventor.

Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del interventor, quien velará así porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado.

El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del Contrato de fiducia para aprobación previa del interventor.

El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado.

Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situación que deberá ser controlada por la interventoría) mediante las actas mensuales o parciales de obra.

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 3.599.933.228,60
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	50%
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 1.799.966.614,30

Apertura de la cuenta bancaria	
ENTIDAD BANCARIA	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
TITULAR	PA 319500 CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
CUENTA BANCARIA No.	291-825-19-8 CTA AHORROS
FECHA DE APERTURA	08/07/2025
VALOR CONSIGNADO A LA CUENTA BANCARIA	\$ 1.580.968.951,30



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

6.2.1. Estado de la cuenta bancaria de obra

Para el período comprendido en el presente informe del 01 de agosto al 31 de agosto de 2025, la cuenta bancaria se encuentra **ACTIVA**.

6.3. PLAN DE MANEJO DE ANTICIPO

A continuación, se relaciona el plan de manejo de anticipo del contrato de obra No. 251 de 2025.

Tabla 20 Plan de manejo de anticipo

NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Materiales	\$ 1.583.970.620,58	88.00 %
2	Transporte	\$ 89.998.330,72	5.00 %
3	Descuento de ley	\$ 89.998.330,72	5.00 %
4	Estampilla Justicia Familiar	\$ 35.999.332,28	2.00 %
TOTAL		\$ 1.799.966.614,30	100 %

6.4. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

A la fecha del presente informe 01 de agosto al 31 de agosto de 2025, el contratista cuenta con un avance financiero de \$ 0,00, ya que no se ha realizado ningún cobro.

Tabla 21 Balance financiero

DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	ACTAS COBRADAS	GIROS
Valor del Contrato de Obra	\$3.599.933.228,60			
Valor del Anticipo		\$1.799.966.614,30		\$1.799.966.614,30
Valor pendiente por ejecutar			\$3.599.933.228,60	
Valor pendiente por amortizar		\$734.931.217,00		
SUMAS IGUALES	\$3.599.933.228,60		\$3.599.933.228,60	

6.5. CONTROL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

A corte del presente informe, con fecha de 31 de agosto de 2025, el contratista CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC reporta las órdenes de operación emitidas, las cuales se constituyen en un instrumento de control administrativo y financiero orientado al manejo responsable del anticipo. Dichas órdenes permiten verificar la correcta destinación de los recursos, así como dar trazabilidad a las actividades ejecutadas y a los compromisos adquiridos dentro del marco contractual.



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Tabla 22 Ordenes de operación

No.	FECHA	NOMBRE DEL RUBRO	CONCEPTO	VALOR
1	06/08/2025	MATERIALES	REEMBOLSO	\$ 830.000.000,00
2	25/08/2025	MATERIALES	DESEMBOLSO	\$ 72.686.238,00
3	25/08/2025	TRANSPORTE	DESEMBOLSO	\$ 50.831.643,00
4	25/08/2025	TRANSPORTE	DESEMBOLSO	\$ 30.303.030,30
5	25/08/2025	TRANSPORTE	REEMBOLSO	\$ 8.863.657,42
6	25/08/2025	MATERIALES	DESEMBOLSO	\$ 51.493.305,87
7	28/08/2025	MATERIALES	REEMBOLSO	\$ 200.000.000,00
TOTAL ORDENES DE OPERACIÓN				\$ 1.244.177.874,59

Anexo 7. Copia ordenes de operación mes de agosto

7. ASPECTOS AMBIENTALES

7.1. SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES

El Contrato de Obra Pública No. 251 de 2025 que tiene por objeto "**CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA**". Requiere de licencia urbanística, la cual, se otorga mediante resolución No. 801 con fecha de 09 de julio de 2025, en modalidad de INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO Y CERRAMIENTO de uso ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CERRAMIENTO.

NOTA: Los documentos entregados para el trámite de la licencia urbanística reposan en el expediente contractual.

7.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (PGIO)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	TOTAL	MES AGOSTO 2025	
1	IMPLEMENTACION PGIO EJE S&SO					CANT	VALOR TOTAL
1,1	Coordinación en implementación del PGIO						
1,1,1	Ingeniero ambiental	MES	5	\$3.500.000	\$17.500.000	1	\$3.500.000
1,1,2	Auxiliar SST	MES	5	\$2.200.000	\$11.000.000	1	\$2.200.000

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca

✉ consorciocic1@gmail.com

Nit. 901.962.949-1

☎ 3112401312



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	TOTAL	MES AGOSTO 2025	
1,2	Kit elementos de Protección						
1,2,1	El kit incluye: elementos de protección básicos por persona - personal operativo de los frentes de obra (Incluye casco de seguridad, guantes de carnaza, gafas, guantes de caucho y botas, camisa)	COSTOS INCLUIDOS EN PRESTACIONES				Se relaciona en el plan de seguridad y salud en el trabajo	
1,3	Kit de señalización						
1,3,1	El kit incluye: señal de 15X15cm - uso EPP, sustancias peligrosas, ruta de evacuación, punto de reencuentro, baños.	UND	4,00	\$33.259,15	\$133.036,60	2	\$ 66.518,30
1,4	Examen médico ocupacional de ingreso y egreso.						
1,4,1	Examen de ingreso y egreso que incluye: agudeza visual, talla y peso, tensión arterial, serología para todo el personal excepto personal de trabajo en alturas.	COSTOS INCLUIDOS EN PRESTACIONES				Se relaciona en el plan de seguridad y salud en el trabajo	
1,4,2	Generación de informes, impresión de información, adquisición de información, capacitación y mantenimiento del plan de implementación de PGIO eje de seguridad industrial y salud ocupacional.	UND	5,00	\$350.000,00	\$1.750.000,00	1	\$350.000
2	IMPLEMENTACION PGIO - EJE AMBIENTAL						
2,1	Manejo de residuos solidos						
2,1,1	Manejo y disposición final de residuos (basura, plásticos, bolsas de empaques de cemento) (Incluye recolección, transporte y disposición final en el relleno sanitario).	MES	5	\$430.000,00	\$2.150.000,00	1	\$ 430.000
2,2	Acciones de reciclaje						
2,2,1	Establecimiento de puntos ecológicos Punto Ecológico de 53 litros de 3 puestos reglamentario	UND	4	\$850.000,00	\$3.400.000,00	2	\$ 1.700.000
TOTAL IMPLEMENTACIÓN PGIO-POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN					\$35.933.036,60	22.95%	\$8.246.518,30



7.3. CUMPLIMIENTO DEL PGIO

7.3.1. Programas de manejo ambiental del proyecto.

Para el Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA", el profesional en ingeniería ambiental, estableció la aplicación de dos (2) programas; de gestión social y de manejo ambiental, los cuales están representados por nueve (09) fichas, orientadas a indicar al ejecutor de la obra las acciones tendientes a minimizar, controlar, prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos que se pudieran derivar de la ejecución de las obras.

A continuación, se relacionan las fichas que se aplicarán al contrato de obra pública 251 de 2025:

FICHA	NOMBRE
1	Información y socialización del proyecto a la comunidad.
2	Educación ambiental.
3	Seguridad industrial y salud ocupacional.
4	Señalización.
5	Manejo integral de materiales de construcción.
6	Programa para el manejo de residuos sólidos.
7	Transporte de materiales.
8	Manejo de maquinaria y equipos.
9	Acciones de Reciclaje.

Anexo 8. Copia informe mensual de implementación de PGIO

7.3.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo

NOTA: Ver capítulo 4.11 – Seguridad industrial y salud ocupacional.

8. CONCLUSIONES

- El contratista dispuso del personal profesional capacitado y necesario con la finalidad de dar cumplimiento con equidad y armonía a los términos y obligaciones pactadas en el contrato de obra No. 251 de 2025 "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA".





INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

- CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC, se encuentra al día con los pagos de seguridad social y parafiscales del personal afiliado para la ejecución de labores durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto de 2025.
- Durante la ejecución del proyecto en su periodo de ejecución realizó un avance físico del 12.10% equivalente a \$ 435.768.435,30, cumpliendo satisfactoriamente el desarrollo de las actividades contractuales.
- Finalmente se concluye que, acorte del presente informe 31 de agosto, se tiene un avance físico acumulado de 12.19% equivalente a \$ 438.793.435,30

ELABORÓ:

APROBO:


CLAUDIA MILENA SEGURA AVILA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
M.P. A1052022-1010221789


LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT: 901.962.949-1



INFORME MENSUAL NO. 2
PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ANEXO 1. COPIA DE ACTA DE COMITÉ NO. 2
