



Guamal meta, 23 de Febrero de 2026


Doctora.
LAURA LEONOR BELLO REYES
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
Y DE CONTRATACIÓN (e)
Guamal - Meta


ASUNTO: Solicitud publicación Acta de Recibo Final en el SECOP II del contrato de OBRA No. 513 - 2025


Por medio de la presente hacemos entrega del ACTA DE RECIBO FINAL del Contrato de obra No. 513- 2025 cuyo objeto es **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ECOCENTRO CULTURAL ALFONSO SILVA ARANDA EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL, META**", para su respectivo cargue en la plataforma del SECOP II.


Se expide la presente certificación en Guamal, Meta a los veintitrés (23) días del mes de febrero de 2026.

Cordialmente,


KAROL ANDREA AGUDELO RUBIO.
Directora Administrativa de Infraestructura

ALCALDIA DE GUAMAL
OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS
Y CONTRATAciones
053 24 FEB 2026 11:18am
RADICADO N° HORA


Elaboró: Yeison Waldir Zambrano Agudelo
Cargo: Apoyo Profesional - OCA-105-2026


Revisó: Karol Andrea Agudelo Rubio
Cargo: Directora Administrativa de Infraestructura


ecocentro

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 513 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL ECOCENTRO CULTURAL ALFONSO SILVA ARANDA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL"

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUAMAL (META)	FECHA DE INICIO:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSULTORIA JCC SAS	PLAZO DE EJECUCION:	OCHO (08) DIAS O HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA ING. KAROL ANDREA AGUDELO RUBIO	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05 DE ENERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 39.248.442,95	FECHA DE SUSPENSION N° 01:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 39.248.442,95	TIEMPO DE SUSPENSION N° 01:	QUINCE (15) DIAS
		FECHA DE REINICIO N° 01:	14 DE ENERO DE 2026
		FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20 DE ENERO DE 2026
		FECHA PRESENTE ACTA:	

En el municipio de Guamal, Departamento del Meta a las **23 FEB 2026**, se reunieron el **ING. CARLOS ANDRES GODOY MORENO** como representante legal de la empresa **INGENIERIA Y CONSULTORIA JCC SAS** en calidad de contratista de obra, la **ING. KAROL ANDREA AGUDELO RUBIO** en su condición de **DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA**, supervisor del contrato y el **DR. JOSE FERNANDO PEÑA RABELO** en su condición de **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GUAMAL**, para dejar constancia de la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA** del contrato de obra No. 513 de 2025 y las actividades y cantidades se describen a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CONDICIONES PRESENTE ACTA		
						CANTIDAD EJECUTADA	COSTO TOTAL	PORCENTAJE EJECUTADO
PRELIMINARES								
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	460,00	3.689,00	1.696.940,00	460,00	1.696.940,00	100%
1,02	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	400,00	6.836,00	2.734.400,00	400,00	2.734.400,00	100%
CUBIERTA								
2,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE, NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	180,00	105.880,00	19.058.400,00	180,00	19.058.400,00	100%
ILUMINARIAS								
3,01	PANEL LED 60X60 W	UN	6,00	143.183,00	859.098,00	6,00	859.098,00	100%
3,02	REFLECTOR LED 200W IP 65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	358.987,00	1.435.948,00	4,00	1.435.948,00	100%
PINTURA								
4,01	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	144,80	12.387,00	1.793.637,60	144,80	1.793.637,60	100%
4,02	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	60,80	14.859,00	903.427,20	60,80	903.427,20	100%
VIDRIO								
5,01	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	9,60	84.170,00	808.032,00	9,60	808.032,00	100%
VALOR OBRA (COSTO DIRECTO)					29.289.882,80		29.289.882,80	
ADMINISTRACION					28,00%	8.201.167,18		8.201.167,18
IMPREVISTOS					1,00%	292.898,83		292.898,83
UTILIDAD					5,00%	1.464.494,14		1.464.494,14
VALOR AIU					34,00%	9.958.560,15		9.958.560,15
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						39.248.442,95		39.248.442,95


PORCENTAJES A.I.U.


CUADRO RESUMEN GENERAL		PORCENTAJE
VALOR DEL CONTRATO	39.248.442,95	100,00%
VALOR TOTAL EJECUTADO	39.248.442,95	100,00%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	-	0,00%
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	39.248.442,95	100,00%


- NOTAS:**
- 1: El contador del contratista, certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
 - 2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Supervisión.
 - 3: El recibo por parte de la Supervisión de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado Contrato de obra.
 - 4: El contrato de obra N° 513 - 2025 representado legalmente por INGENIERIA Y CONSULTORIA JCC S.A.S., durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados:
SI ___ de fecha ___, NO X.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día:

23 FEB 2026


ING. CARLOS ANDRÉS GODOY MORENO
R/L. INGENIERIA Y CONSULTORIA JCC SAS
CONTRATISTA DE OBRA


DR. JOSE FERNANDO PEÑA RABELO
ALCALDE MUNICIPAL


ING. KAROL ANDREA AGUDELO RUBIO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA



DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 NIT: 800.098.193 - 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL META

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAMAL META

MEMORIAS DE CANTIDADES - ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ECOCENTRO CULTURAL ALFONSO SILVA ARANDA EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL, META"		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GUAMAL (META)	SUPERVISIÓN:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA ING. KAROL ANDREA AGUDELO RUBIO
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSULTORIA JCC SAS R/L. CARLOS ANDRES GODOY MORENO	NIT O C.C.	901418082-8
CAPITULO 1.00	PRELIMINARES	ITEM	1,01
		CONTRATO No.	513 DE 2025

UNIDAD	ELEMENTO	UBICACIÓN	DIMENSIONES			N° de elementos	MEDIDA TOTAL	
			Longitud (a)	Ancho (b)	Area= a x b			
INSTALACIONES ECOCENTRO, MUNICIPIO DE GUAMAL	sendero	Costado derecho	39,00	1,50	58,5	1	58,50	
	sendero	Costado izquierdo	39,00	1,50	58,50	1,00	58,50	
	sendero	Frente puerta 1	40,00	1,50	60,00	1,00	60,00	
	sendero	Frente puerta 2	5,00	6,00	30,00	1,00	30,00	
	sendero	Detrás de tarima	8,40	6,77	56,87	1,00	56,87	
	sendero	Detrás de tarima	8,45	5,15	43,52	1,00	43,52	
	sendero		b	h	Area = b x h / 2	1,00	0,00	
	sendero	Frente tarima	17,10	17,85	152,62	1,00	152,62	
	SUBTOTAL VIENEN							460,00
	TOTAL							460,00

IMAGEN O GRÁFICO



Carlos Andros Godoy Moreno
 ING. CARLOS ANDRÉS GODOY MORENO
 R/L. INGENIERÍA Y CONSULTORIA JCC SAS
 MP. 091037-051524 CND

Carlos Andros Godoy Moreno
 ING. CARLOS ANDRÉS MORA CINFUENTES
 RESIDENTE DEL PROYECTO
 MP. 25202-365748 CND



DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL META

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAMAL META

MEMORIAS DE CANTIDADES - ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ECOCENTRO CULTURAL ALFONSO SILVA ARANDA EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL, META"		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GUAMAL (META)	SUPERVISION:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSULTORIA JCC SAS R/L. CARLOS ANDRÉS GODOY MORENO	NIT O C.C.	ING. KAROL ANDREA AGUDELO RUBIO
CAPITULO 2.00	CUBIERTA	ITEM	2,01
			901418082-8
			CONTRATO No. 513 DE 2025

UNIDAD	M2	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA TOTAL			
			Longitud (L)	Ancho (A)	Area = L x A				
ELEMENTO		UBICACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE, NO INCLUYE ESTRUCTURA			INSTALACIONES ECOCENTRO, MUNICIPIO DE GUAMAL			
			PUERTA 1						
			Cubierta	10,00	7,00		70,00	1,00	70,00
			PUERTA 2						
			Cubierta	6,00	7,166	43,00	1,00	43,00	
			CUBIERTA ECOCENTRO						
			Arreglo cubierta	10,31	6,50	67,01	1,00	67,01	
SUBTOTAL VIENEN						180,00			
TOTAL						180,00			

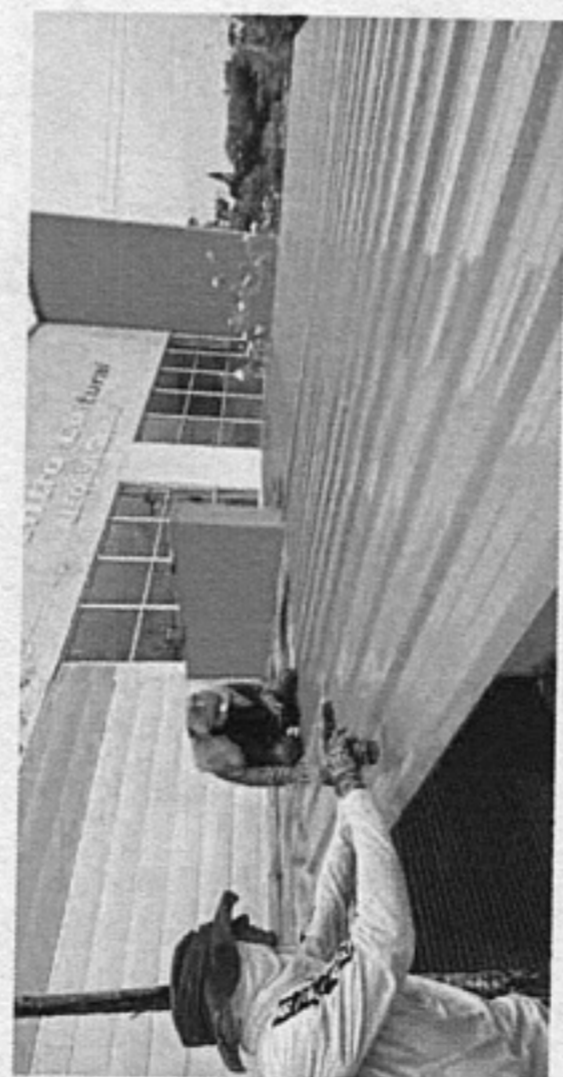


IMAGEN O GRÁFICO

[Signature]
 ING. CARLOS ANDRÉS GODOY MORENO
 R/L INGENIERIA Y CONSULTORIA JCC SAS
 MP. 091037-051524 CND

[Signature]
 ING. CARLOS ANDRÉS MORA CINFUENTES
 RESIDENTE DEL PROYECTO
 MP. 25202-865748 CND



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 Nit: 800.098.193 - 6

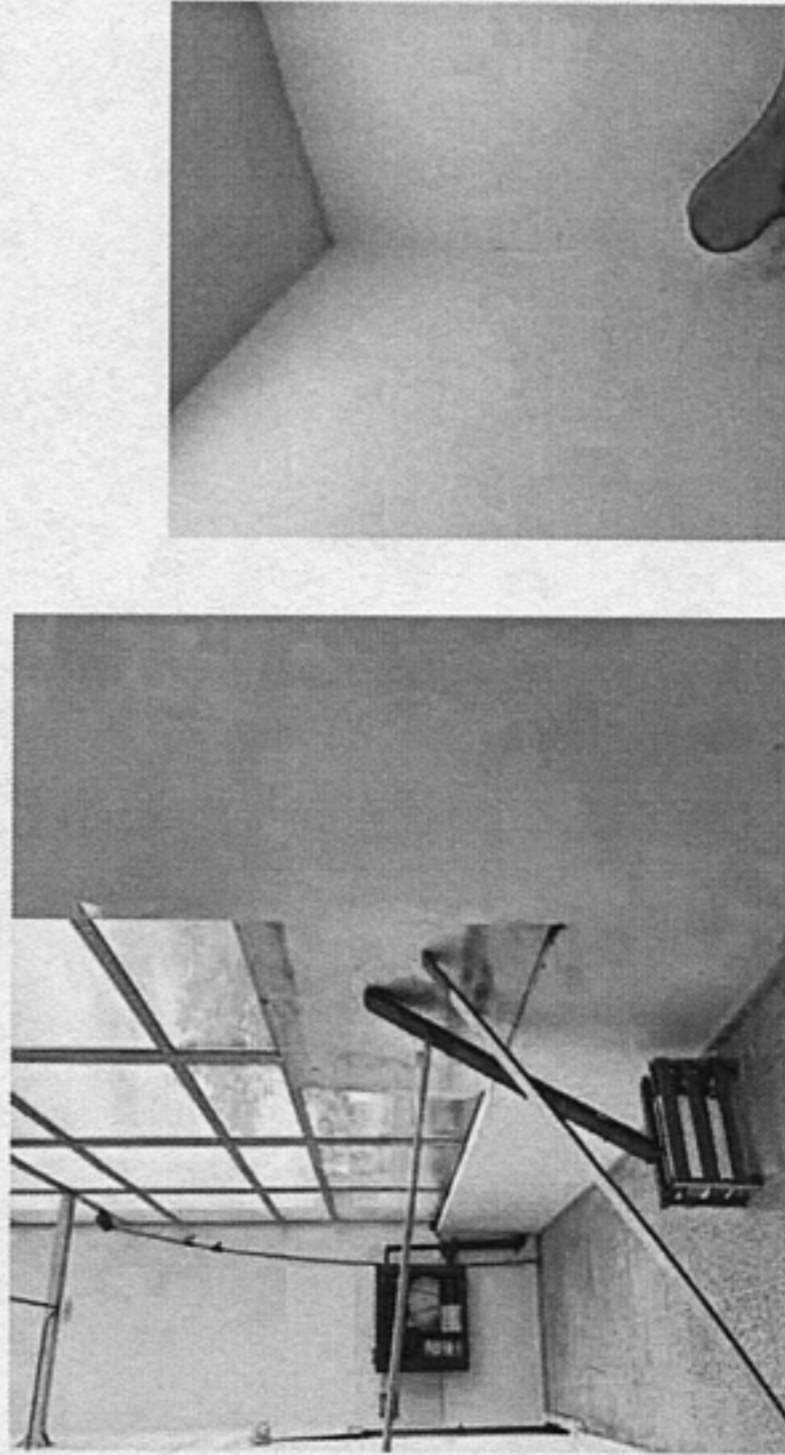
REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL META
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAMAL META

MEMORIAS DE CANTIDADES - ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ECOCENTRO CULTURAL ALFONSO SILVA ARANDA EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL, META"		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GUAMAL (META)	SUPERVISION:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA ING. KAROL ANDREA AGUDELO RUBIO
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSULTORIA JCC SAS R/L CARLOS ANDRÉS GODOY MORENO	NIT O C.C.	901418082-8
CAPITULO 4.00	PINTURA	ITEM	CONTRATO No. 513 DE 2025

UNIDAD	M2	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA TOTAL
			Altura (h)	Ancho (a)	Area =h x a	
Camerino mujeres primer piso	Pared 1	2,92	2,50	7,30	1,00	7,30
	Pared 4	1,42	2,50	3,55	1,00	3,55
	Pared 2	2,92	1,36	3,97	1,00	3,97
	Pared 3	2,92	2,50	7,30	1,00	7,30
Descuentos puertas baño y entrada	Puertas	4,00	1,40	5,60		
Exterior camerino mujeres primer piso	Pared 1	5,00	2,90	14,50	2,00	29,00
	Pared 2	5,33	1,06	5,65	1,00	5,65
	Pared 3	2,50	2,90	7,25	1,00	7,25
	Pared 4	0,60	5,18	3,11	1,00	3,11
	Pared 5	3,33	3,90	12,99	1,00	12,99
	Pared 6	5,00	14,06	70,29	1,00	70,29
SUBTOTAL VIENEN						144,80
TOTAL						144,80

IMAGEN O GRÁFICO



[Signature]
 ING. CARLOS ANDRÉS GODOY MORENO
 R/L INGENIERIA Y CONSULTORIA JCC SAS
 MP. 091037-0515524 CND

[Signature]
 ING. CARLOS ANDRÉS MORA CINCUENTES
 RESIDENTE DEL PROYECTO
 MP. 25202-365748 CND

