

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 016 DE 2023	Contratista: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
Contrato de Interventoría No. 4763 de 2023	Interventoría: CONSORCIO SADINTECON

Objeto Contrato de Obra:
 AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y *2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

INFORME MENSUAL No. 11	MES O PERIODO: dic-24
---	--

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		9
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		11
2.1	Localización		11
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		11
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		13
2.4	Características técnicas del proyecto		17
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		22
3.1	Información general del contrato		22
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		23
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		25
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		26
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		29
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	70
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	84
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	88
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	96
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	99
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	103
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	118
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	129
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Plan de inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	132
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-2	134
	• Seguimiento Programa de Obra		137
	• Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	140
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-2	142
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	144
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	154
	• Informe Matriz de Riesgos		173
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		52
5.1	Información general del contrato		52
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		53
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	176
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	178
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	181
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	183
7	Conclusiones y recomendaciones		57
8	Anexos		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		193

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Monica Montenegro Q.

Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																																				
					VERSION	1																																																																																				
					PAGINA																																																																																					
					FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES					DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE		PERIODO MES: 11																																																																																			
CONTRATO DE OBRA No.: 016 de 2023 OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL. CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL					PLAZO INICIAL: 3 MESES FECHA DE INICIO: 21/12/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN: 5/01/2024 FECHA DE REANUDACIÓN: 4/03/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 14/12/2024 PLAZO ACUMULADO:		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 23.137.768.645,10 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ 4.895.000.000,00 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 28.032.768.645,10 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 11.568.884.300,00 ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																																																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4763 de 2023					INTERVENTOR: CONSORCIO SANDINTECON		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO																																																																																			
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO					AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																					
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>KM</td><td>10,26</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td>24</td></tr><tr><td>Boxculvert</td><td>UND</td><td>5</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	KM	10,26	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Alcantarillas	UND	24	Boxculvert	UND	5	Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)				<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>KM</td><td>2</td><td>9</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td>0</td><td>24</td></tr><tr><td>Boxculvert</td><td>UND</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	KM	2	9	Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Alcantarillas	UND	0	24	Boxculvert	UND	0	5	Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)																
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																								
Pavimentación	Construcción	KM	10,26																																																																																							
	Mejoramiento																																																																																									
	Rehabilitación																																																																																									
Estructuras	Túneles																																																																																									
	Alcantarillas	UND	24																																																																																							
	Boxculvert	UND	5																																																																																							
Mantenimiento																																																																																										
Otros (Especificar cuales)																																																																																										
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																							
Pavimentación	Construcción	KM	2	9																																																																																						
	Mejoramiento																																																																																									
	Rehabilitación																																																																																									
Estructuras	Túneles																																																																																									
	Alcantarillas	UND	0	24																																																																																						
	Boxculvert	UND	0	5																																																																																						
Mantenimiento																																																																																										
Otros (Especificar cuales)																																																																																										
AVANCE FINANCIERO																																																																																										
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td>22.904.510.491,30</td></tr><tr><td>ADICIONAL EN VALOR No.1</td><td></td><td></td><td>4.895.000.000,00</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td></td><td></td><td>233.258.153,80</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICIÓN No.1</td><td></td><td></td><td>28.032.768.645,10</td></tr></tbody></table> <p>Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.</p>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS				AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			22.904.510.491,30	ADICIONAL EN VALOR No.1			4.895.000.000,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS				GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			233.258.153,80	VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICIÓN No.1			28.032.768.645,10	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>3.507.532.960,00</td><td></td><td>3.507.532.960,00</td><td>22.897.835.080,00</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td>1.303.460.195,50</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>3.507.532.960,00</td><td></td><td>3.507.532.960,00</td><td>22.897.835.080,00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	3.507.532.960,00		3.507.532.960,00	22.897.835.080,00	AJUSTES	1.303.460.195,50				OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES					JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN					ESTUDIOS Y DISEÑOS					GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)					VALOR EJECUTADO	3.507.532.960,00		3.507.532.960,00	22.897.835.080,00
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																							
OBRAS																																																																																										
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			22.904.510.491,30																																																																																							
ADICIONAL EN VALOR No.1			4.895.000.000,00																																																																																							
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			233.258.153,80																																																																																							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICIÓN No.1			28.032.768.645,10																																																																																							
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																						
OBRAS	3.507.532.960,00		3.507.532.960,00	22.897.835.080,00																																																																																						
AJUSTES	1.303.460.195,50																																																																																									
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																										
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																										
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																																										
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																																										
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																																										
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)																																																																																										
VALOR EJECUTADO	3.507.532.960,00		3.507.532.960,00	22.897.835.080,00																																																																																						
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 26.820.705.047,00				MANO DE OBRA CALIFICADA: 9																																																																																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 22.897.835.080,00				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 69																																																																																						
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 81,68%				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 11																																																																																						
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 89																																																																																						

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 <p>TRAMO 1 ACTIVIDADES GENERALES CAÑO FLORES</p>	 <p>TRAMO 2 ACTIVIDADES GENERALES PALMARITO</p>
---	--

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: JAVIER E. FUENTES CAPACHO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202112214STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial



**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL
POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

CONTRATO No. 4763 DE 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 11

PERIODO

1 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

CONSORCIO SADINTECON



MINISTERIO DE TRANSPORTE

IIINSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE LAS VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR
EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 11

PERIODO

1 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Elaborado por:	Revisado por: JAVIER E. FUENTES CAPACHO.	Aprobado por: JAVIER E. FUENTES CAPACHO
ESNEIDER FUENTES ZÁRATE RUBEN A. BORRERO CAMPOS Cargos: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	FIRMA 	FIRMA 
Fecha: 31/12/2024	Fecha: 31/12/2024	Fecha: 31/12/2024

CONSORCIO SADINTECON

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	8
2.1	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	8
2.2	DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR.....	10
2.3	CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO.....	14
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.....	19
3.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	19
3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	20
3.2.1	TRAMO 1 – Caño Flores a Sitio nuevo, en el municipio de Fortul.	20
3.2.2	TRAMO 2 – La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.	21
3.2.3	Vallas informativas.	21
3.3	SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.....	22
3.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA.....	23
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA	26
4.1	INFORME SEMANAL	26
4.2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	31
4.3	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	31
4.4	INFORMACIÓN FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	31
4.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	31
4.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	31
4.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO	31
4.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.....	32
4.9	Otros Documento Seguimiento Mensual.....	32
4.9.1	Seguimiento a la inversión del Anticipo	32

4.9.2	Seguimiento Programa de obra	32
4.9.3	Seguimiento Programa de Inversiones	32
4.9.4	Acta de comité de obra	48
4.9.5	Acta de reunión.	48
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	49
5.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	49
5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	50
5.3	INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES.....	52
5.4	INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC	52
5.5	INFORME MATRIZ DE RIESGOS.	52
5.6	INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.....	52
5.6.1	CIFRA (Control de los proyectos de Infraestructura)	52
5.6.2	Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.	52
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	53
6.1	CONTROL DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	53
6.2	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	53
6.3	INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	53
6.4	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	53
6.5	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	53
6.6	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO	53
6.6.1	Seguimiento a la inversion del Anticipo	53
6.6.2	Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado.	53
6.6.3	Seguimiento al Plan de Cargas a la inversion del Anticipo	53
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	54
8	ANEXOS	56
8.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.	56

8.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE LAS OBRAS	58
8.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES- SST	60
8.4	COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE.....	65
8.5	FORMATOS.....	66

CONTENIDO DE TABLA

<i>Tabla 1. Información del contrato de Obra</i>	19
<i>Tabla 2. Informes semanales en el mes de diciembre de 2024.....</i>	30
<i>Tabla 3. Reuniones celebradas en el mes de diciembre de 2024.</i>	48
<i>Tabla 4. Reuniones celebradas en el mes de diciembre de 2024</i>	48
<i>Tabla 5. Información sobre el contrato de interventoría</i>	49

TABLA DE IMÁGENES

<i>Imagen 1. Localización específica sector Vereda Palmarito (Fuente Google earth).</i>	8
<i>Imagen 2. Localización específica sector Vereda Caño Flores. (Fuente Google earth).</i>	9

1 INTRODUCCIÓN

El departamento de Arauca cuenta con 1. 730 km de red vial distribuida en 303 km de red primaria, 653 km de red secundaria y 775 km de red terciaria.

Por su parte, el municipio de Fortul en Arauca cuenta con una red vial terciaria de 310 km según lo establecido en el plan vial Municipal, esta red vial está conformada por 18 corredores viales que se distribuyen en los cinco distritos rurales que están conformados por 54 veredas y el distrito urbano está conformado por 14 barrios. En los distritos rurales, se localizan además seis centros poblados: Nuevo Caranal, Palmarito, El Mordisco, Puerto Nidia, Caño Flores y Sitio Nuevo.

La deficiencia vial, aunado a las extensiones geográficas que caracterizan al Departamento y a la debilidad de infraestructura productiva, ha puesto una limitante a la comercialización de la producción y a la integración tanto interna como hacia el exterior del territorio, es decir hacia otras regiones del país. A pesar de ello la producción de Arauca se direcciona hacia otras regiones como los Santanderes, Casanare, Bogotá y Venezuela de manera ilegal, principalmente; siendo de todos modos muy baja su participación en la producción total nacional que se moviliza hacia esos territorios. En el caso del comercio con Venezuela, el departamento no ha aprovechado y canalizado adecuadamente su condición de zona fronteriza, lo cual se constituye en un potencial a desarrollar, aunque hoy se encuentre restringida y las condiciones del país vecino no favorezcan el desarrollo, se debe propender por avanzar integraciones con otros países que permitan globalizar los mercados.

Las vías terciarias que comunica la zona rural Municipio de Fortul con el casco urbano y vías principales presentan un estado inadecuado, lo cual dificulta la accesibilidad y el desarrollo integral de esas veredas y de sus habitantes. Esta situación genera congestiones en las vías por pasos restringidos. Se presentan también deterioro acelerado de los tratamientos efectuados y el aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros. En cuanto al número de tiempos de viajes se retrasan actividades como el acceso oportuno a servicios médicos y en cuantos al comercio se presenta disminución en la afecta de demanda de los productos de la región.

El Proyecto tiene como objetivo fundamental mejorar las condiciones técnicas de la vía que conduce a de la vereda Caño Flores - El milagro, San Francisco - Sitio Nuevo, y el tramo de vías que comunica las veredas Palmarito - La Paz Gaitán - Alto Jordán - El Paraíso para ofrecer la

interconexión de estas veredas con la zona urbana del Municipio de Fortul, garantizando mayor seguridad y comodidad a los habitantes para el traslado de sus productos agrícolas y pecuarios, disminuir el tiempo de movilización de los habitantes hacia el área urbana.

La selección del Contratista de obra se realizó a través del Proceso de Contratación No. LP-FRL-SPI- 009- 2023 del SECOP I y la selección de la interventoría se realizó a través del CMA-DEO-SVR-076-2023 y el número de ID del SECOP II es CO1.NTC.4900402.

El presente documento contiene **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.11** correspondiente al Periodo del **01 al 31 de diciembre de 2024**, elaborado por CONSORCIO SADINTECON, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría de obras públicas del INVIAS, Versión 2022, actualización del 01 febrero de 2022 y una vez surtido el proceso de del contrato de interventoría No. 4763 de 2023, con fecha de inicio a partir del 14 de diciembre de 2023.

En este informe, se hace la descripción general de las actividades ejecutadas por el contratista y las labores de control desarrolladas por la Interventoría, se presentan los formatos de seguimiento y control, solicitados por el INVIAS y un registro fotográfico en el cual se evidencian las diferentes actividades desarrolladas durante este periodo.

El Supervisor del Contrato de Interventoría asignado es la ingeniera MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO, cuyo acto administrativo de designación es la resolución 4270 DE 27 NOVIEMBRE DEL 2023, la Gestora Técnica asignada es la ingeniera JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL:

El proyecto se localiza en el departamento de Arauca, concretamente en el municipio de Fortul, en la vía que hace parte del corredor que comunica las veredas Palmarito, Caranal, La Paz, Gaitán, Alto Jordán y Paraíso del Municipio de Fortul.



Imagen 1. Localización específica sector Vereda Palmarito (Fuente Google earth).

LOTE 2: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA:

El proyecto se localiza en el departamento de Arauca, concretamente en el municipio de Fortul, en la vía que comunica las veredas de Caño Flores - Sitio Nuevo del Municipio de Fortul.

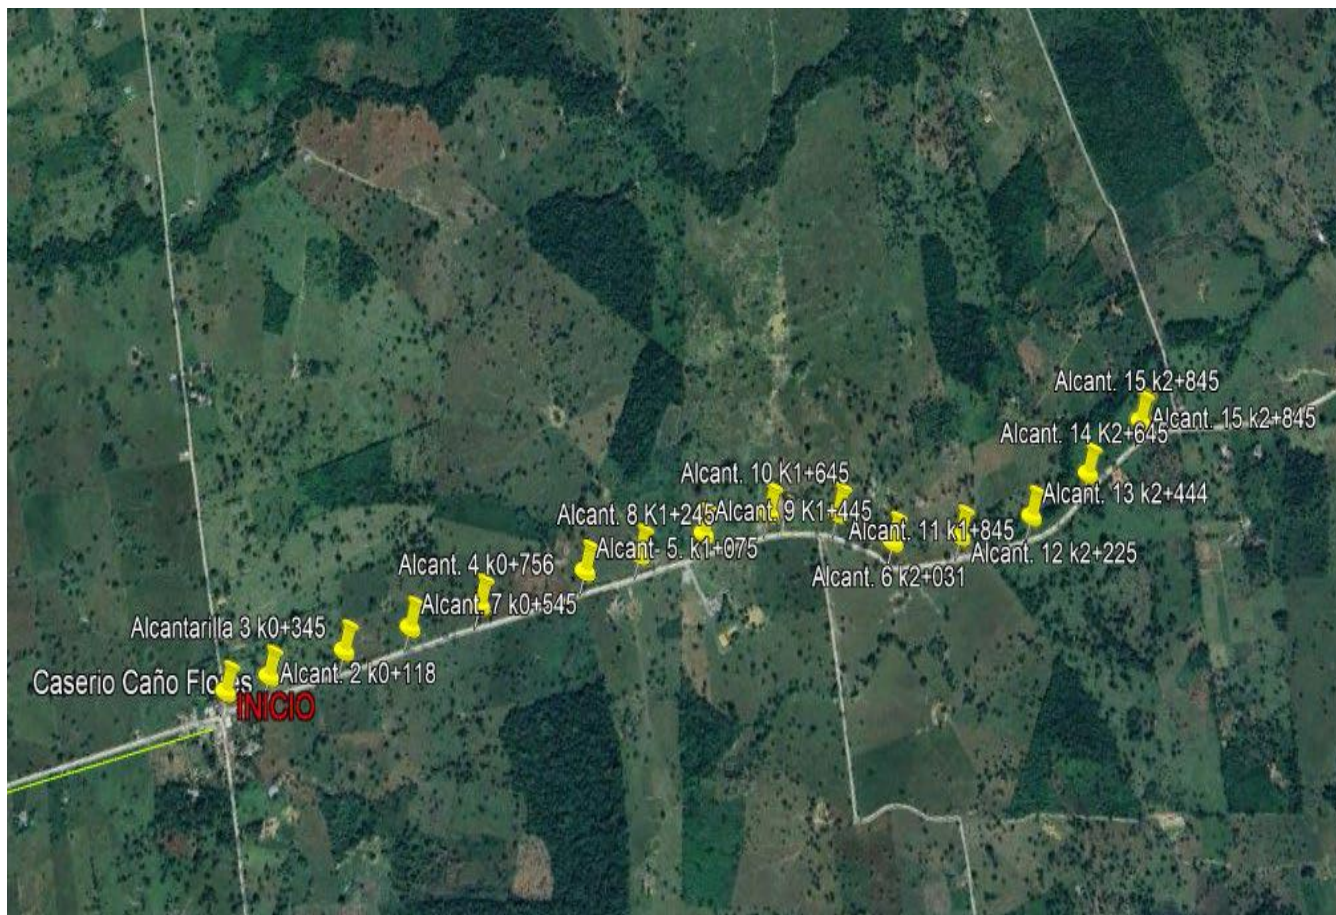


Imagen 2. Localización específica sector Vereda Caño Flores. (Fuente Google earth).

2.2 DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

A continuación, se hace una descripción de cada uno de los tramos a intervenir:

El departamento de Arauca cuenta con 1.730 km de red vial distribuida en 303 km de red primaria, 653 km de red secundaria y 775 km de red terciaria.

Por su parte, el municipio de Fortul en Arauca cuenta con una red vial terciaria de 310 km según lo establecido en el plan vial Municipal, esta red vial está conformada por 18 corredores viales que se distribuyen en los cinco distritos rurales que están conformados por 54 veredas y el distrito urbano está conformado por 14 barrios. En los distritos rurales, se localizan además seis centros poblados: Nuevo Caranal, Palmarito, El Mordisco, Puerto Nidia, Caño Flores y Sitio Nuevo.


Actualmente el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES a SITIO NUEVO presentan dificultades para la movilidad y comunicación en especial con el área urbana, debido al mal estado en el que se encuentra la superficie de rodadura, la falta de mantenimiento periódico o rutinario de las mismas por parte del Municipio. Esta situación genera congestiones en las vías por pasos restringidos, aunado con el aumento de los tiempos de viaje, con un efecto directo en el aumento de los costos de operación y mantenimiento vial.

El aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros en la témpora de invierno afecta directamente a los pequeños productores quienes optan por perder sus cosechas debido a los altos costos de transporte para sacar la producción al casco urbano del Municipio.

A continuación, se presenta registro fotográfico donde se evidencia el avance del proyecto en el presente periodo, para cada tramo:

TRAMO 1. CAÑO FLORES:

K0+000	
 <p>6/12/24 2:34 p. m. K0+000 Caño flores</p>	 <p>14 dic 2024 2:07:49 p. m. INTERVENTORIA CAÑO FLORES</p>
ANTES	DESPUÉS
K1+845	
 <p>18 dic 2024 8:37:17 a. m. INTERVENTORIA CAÑO FLORES</p>	 <p>19 dic 2024 10:44:01 a. m. INTERVENTORIA CAÑO FLORES</p>
ANTES	DESPUÉS
K0+137	
	 <p>18 dic 2024 10:17:48 a. m. INTERVENTORIA CAÑO FLORES</p>
ANTES	DESPUÉS

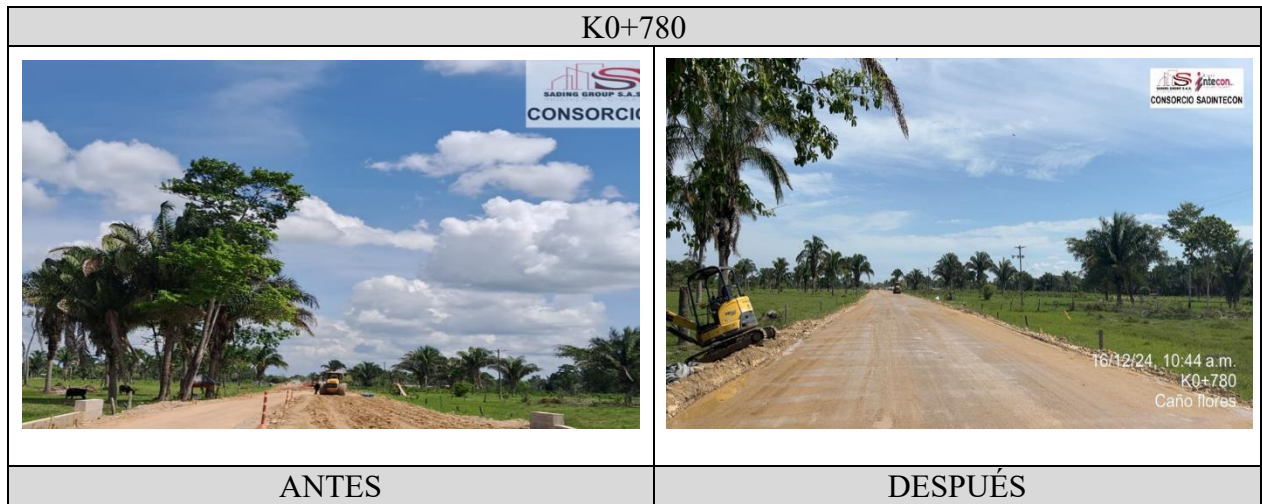

TRAMO 2. PALMARITO:



K2+710	
 <p>30/10/24, 9:30 a. m. F</p>	 <p>13/12/24, 11:41 a.m. Palmarito</p>
ANTES	DESPUÉS
K2+670	
 <p>29/10/24, 11:29 a. m. F</p>	 <p>13/12/24, 11:41 a.m. Palmarito</p>
ANTES	DESPUÉS

2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Los tramos a intervenir pertenecen a un sector de carreteras terciaria de 310 km según lo establecido en el plan vial Municipal. Se divide en 2 tramos:


LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL:

La alternativa de solución plantea en el componente técnico la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,40 km, iniciando en K0+00 AL K7+400, alternativa que se adapta a las condiciones geográficas y geométricas que presenta el tramo vial.

Geométricamente la vía presenta un perfil vial con una sección un ancho de vía de 6.0 m, bermas de 0.50 m a cada costado según el diseño de la estructura del pavimento, se recomendó una unidad de diseño la cual presenta la siguiente estructura:

Unidad de diseño K0+00 al K7+400

- Ancho vía: 6.0 m
- Ancho bermas: 0.5 m
- Capa Asfáltica: 0.10 m
- Base granular: 0.15 m
- Subbase granular: 0.20 m

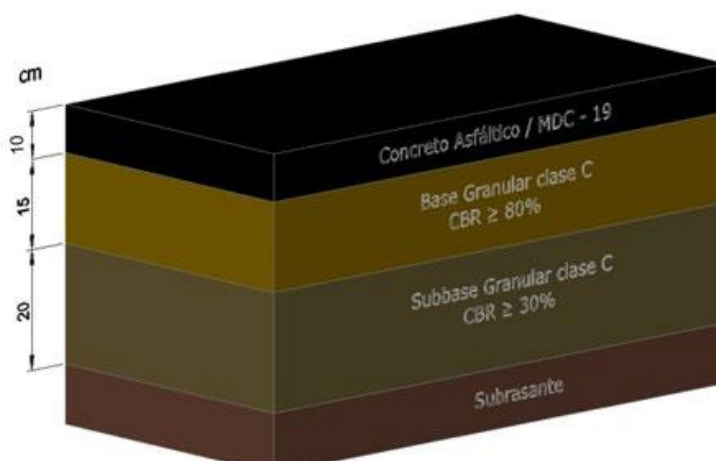

Según la modificación de obra No.3, las obras de drenaje transversal a construir en el tramo de Palmarito son:

OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K0+000
OBRA NUEVA	BOX CULVERT 3 X1 m	K1+180
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K4+385
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K1+620
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K1+861
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K2+020
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K4+400
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K4+454
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K5+175
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K5+310
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K5+638
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K6+026
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K6+633

Estructuras Tipo Boxculvert y alcantarillas

El proyecto incluye la actualización a la caracterización del tramo total de la vía que comunica el caserío de Palmarito con intersección de la vía agua linda.

TRAMO A INTERVENIR	PUNTO	COORDENADA	LONGITUD KM
CASERIO PALMARITO- VEREDA EL PARAISO	INICIAL	6°44'48.01"N	7,40
		71°42'53.19"O	
	FINAL	6°47'12.83"N	
		71°40'12.90"O	

Adicionalmente el proyecto contempla la ejecución de actividades complementarias indispensables para la correcta ejecución y operación del proyecto.

Las actividades principales se listan a continuación:

- Realizar obras de excavaciones.
- Implementar la estructura vial.
- Implementar las obras de drenaje.
- Implementar la señalización vertical y demarcación vial.
- Realizar actividades de caracterización vial implementar el PMT.
- Implementar el PAGA.
- Actividades medidas de compensación ambiental.

LOTE 2: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA:

Consiste en la construcción de pavimento flexible mediante el uso de nuevas tecnologías de una longitud de 2,86 km así:

La alternativa de solución plantea en el componente técnico la construcción de pavimento flexible mediante el uso de nuevas tecnologías de una longitud de 2,86 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, alternativa que se adapta a las condiciones geográficas y geométricas que presenta el tramo vial.


A partir del análisis, se plantea una alternativa de estructura de pavimento utilizando la familia de estabilizantes T4 - Sales Inorgánicas, ya que el proceso de estabilización mediante la adición de este producto químico mejora de forma directa el desempeño mecánico - elástico del material, actuando como agente cementante, ligante y deflexivo en la matriz suelo - estabilizante.

El producto químico estabilizador de suelos ayuda a mejorar las propiedades mecánicas y cualitativas del suelo, mediante la interacción de las fuerzas de tensión superficial que conforman la macro estructura del suelo.

La metodología concluye que el espesor de suelo estabilizado aumenta la capacidad de soporte del suelo reemplazando posteriormente parte de la estructura de soporte del pavimento.

MODELO ESTRUCTURAL

Realizando los respectivos cálculos mediante el método AASHTO, se establece una estructura de pavimento que incluye una capa de mezcla densa en caliente (MDC-19) con un espesor de 7.5 centímetros, una capa estabilizada con sales inorgánicas con un espesor de 25 centímetros.

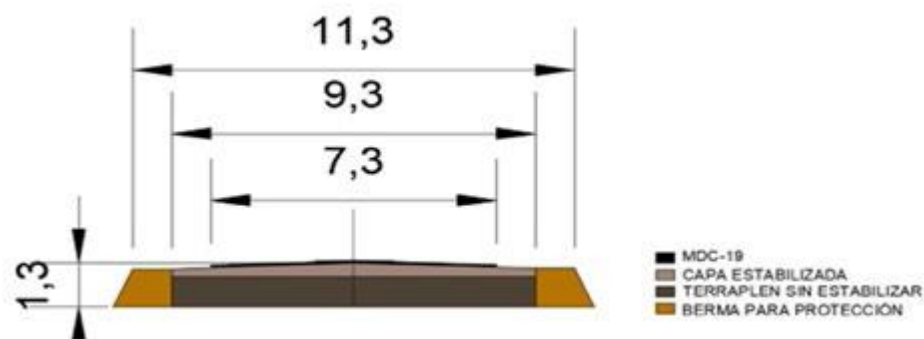

Modelo estructural - Sección transversal

Geométricamente la vía presenta un perfil vial con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1.00 m a cada costado según el diseño de la estructura de pavimento, se recomendó una unidad de diseño la cual presenta la siguiente estructura:

Unidad de diseño K0+00 al K2+860

- Ancho vía 7.30 m
- Ancho bermas 1.00 m
- Bombeo: 2%
- Peralte máximo: 4%
- Sobreancho máximo: 1.00 m



Sección transversal tipo en tan gente Unidad de diseño No. 02 estructura con Subrasante Estabilizada con Sales Inorgánicas

Con los ajustes realizados según acta de modificación No.3 y acta de adición No.1 del contrato de obra, se realizará la construcción de 19 estructuras de drenaje transversal en el tramo Caño Flores, los cuales son:

OBRAS DE DRENAJE SEGÚN MODIFICATORIO No.3		
OBRA NUEVA	BOX CULVERT 1,5 X 1 m	k0+000
OBRA NUEVA	BOX CULVERT 2 X 1 m	k0+137
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K0+435
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K0+545
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K0+757
OBRA NUEVA	BOX CULVERT 2 X 1 m	k1+076
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K1+277
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K1+445
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K1+645
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K1+845
OBRA NUEVA	BOX CULVERT 2 X 2 m	k2+031
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K2+224
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K2+444
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K2+644
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K2+845
OBRAS DE DRENAJE SEGÚN ADICIONAL EN VALOR No.1		
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K3+045
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K3+245
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K3+455
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K3+645

Estructuras Tipo Boxculvert y alcantarillas

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Aspectos generales del contrato de obra:

Tabla 1. Información del contrato de Obra

CONTRATISTA	
CONTRATO N°:	016 DE 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA: 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
N° PROCESO DE SELECCIÓN:	N°LP-FRL-SPI-009-2023 Aperturado mediante -resolución N°496 del 27 de 2023 del 29 de agosto de 2023
CONTRATISTA:	<p>CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONYCA SOLUCIONES SAS (78%) NIT 900.701.968-7 R.L LUIS CARLOS PÉREZ MÉNDEZ C.C 17.589.706 • CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA (2%) NIT 834.000.202-7 R.L LEONEL ALBERTO ARIAS ROJAS C.C 79.447.547 • HD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS (10%) NIT 901.100579-1 R.L HORACIO DIAZ TORRES C.C 13.701.763 • VANUR SAS NIT 901335047-2 (10%) NIT 901.335.047-2 R.L HECTOR JULIAN RESTREPO MARÍN C.C 1.128.395.598
REP. LEGAL:	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ C.C 1.176.782.711
N° NIT:	901.758.303-9
VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA	\$23.137.768.645,10 LOTE N°01: \$12.024.004.631,44 LOTE N°02: \$11.113.764.013,66
VALOR ADICIONAL	\$4.895.000.000
CDP	N° 320 del 14 de agosto del 2023
RP	N° 600 del 29 de septiembre de 2023

ANTICIPO	\$ 11.568.884.300 (50%)
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 DE MARZO DE 2024
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
PERIODO SUSPENSIÓN N°01	DESDE CINCO (05) DE ENERO DE 2024 HASTA EL CINCO (05) DE FEBRERO DE 2024
PERIODO PRÓRROGA N°01 A SUSPENSIÓN N°01	DESDE EL CINCO (05) DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL TRES (03) DE MARZO DE 2024
FECHA DE REINICIO N°01	CUATRO (04) DE MARZO DEL 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (Según REINICIO N°01)	DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2024
OTROSI MODIFICATORIO N° 001 (ADICION DE PLAZO)	CATORCE (14) DE MARZO DE 2024 SEIS (06) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (Según Adicional de Plazo)	CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE 2024.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (Según Prórroga N°001)	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
OTROSI MODIFICATORIO N° 002	VEINTISEIS (26) DE ABRIL DE 2024 Modificación Clausula N°25 GARANTIAS
PÓLIZAS (GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO)	Compañía Mundial de Seguros S.A. – NB–100285361 – NB-100069639 – Anexo 4
OTROSI MODIFICATORIO N° 003	OCHO (08) DE AGOSTO DE 2024 Modificación Mayores y menores cantidades, Ítems nuevos.
OTROSI MODIFICATORIO ADICION EN VALOR No.1	TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE 2024 Legalización acta de adición en valor No.1.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades las cuales se dividen por tramos y áreas de Trabajo.

3.2.1 TRAMO 1 – Caño Flores a Sitio nuevo, en el municipio de Fortul.

Se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó chequeo de niveles topográficos al cereo después de instalar el geotextil durante las semanas del periodo del informe.
- Instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares abscisas K0+000 - K0+180, carril derecho y carril izquierdo, K1+220 - K1+600 Carril derecho e izquierdo, K1+600 - K1+985 Carril derecho e izquierdo y abscisas K2+845 - K3+015 Carril derecho e izquierdo.

- Estabilización química de terraplén y/o subrasante con sal inorgánica abscisas K0+820 - K1+230 Carril derecho y K0+535 - K1+220 Carril Izquierdo, K1+220 - K1+600 Carril derecho e izquierdo, K1+600-1985 Carril derecho e izquierdo y abscisas K2+845 - K3+015 Carril derecho e izquierdo.
- Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 (anteriormente CRL-1) desde el K0+000 al K0+180 Carril derecho e izquierdo.
- Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 desde el K0+000 al K0+180 Carril derecho e izquierdo.

3.2.2 TRAMO 2 – La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.

Se realizaron las siguientes actividades:

- Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 (anteriormente CRL-1) desde el K6+426 - K5+600 (Carril derecho) y K6+110 - K5+656 (Carril Izquierdo), K4+840 - K5+600 (Carril derecho) y K4+848 -K5+832 (Carril Izquierdo), K0+000 -K0+040 (Carril derecho e izquierdo) y K5+832 - K5+656 (Carril Izquierdo).
- Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 desde el K6+426 - K5+600 (Carril derecho) y K6+110 - K5+656 (Carril Izquierdo), K4+840 -K5+600 (Carril derecho) y K4+848 -K5+832 (Carril Izquierdo), K0+000 -K0+040 (Carril derecho e izquierdo) y K5+832 - K5+656 (Carril Izquierdo).
- Se ejecutaron actividades de cereo de base granular para posteriormente realizar imprimación.
- Se ejecutaron actividades de línea de demarcación con pintura en frío desde abscisa K0+100 hasta K4+040.
- Se ejecutaron actividades de instalación de señalización vertical.

3.2.3 Vallas informativas.

Valla informativa instalada en la vía entre la vereda Palmarito y Caranal, en la finca la virgen, municipio de Fortul.



3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Para el presente informe correspondiente al mes de diciembre, no se presentaron por parte del Contratista de Obra ítems no previstos.

La interventoría, revisó y aprobó el análisis de precios unitarios presentados por el contratista de obra, y posteriormente se presentaron a la alcaldía de Fortul, para realizar la legalización y tramites respectivo.

A continuación, se relacionan los ítems no previstos así y que fueron aprobados en el acta de modificación No. 3:

1.3 N	MOVIMIENTO RED ELECTRICA		
1.3.1 N	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT		
1.3.1.1 N	REPLANTEO TOPOGRÁFICO ELÉCTRICO MT	KM	0,33
	SUBTOTAL LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT		
1.3.2 N	APOYOS MT		
1.3.2.1 N	CONCRETO 3000 PSI (Incluye material, mano de obra y herramienta y equipos)	M3	1,80
1.3.2.2 N	POSTE EN CONCRETO 12 M X 2050 KG (Incluye suministro, transporte y proceso de hincada y aplomada)	UND	2
1.3.2.3 N	DESHINCADO Y DEMOLICIÓN POSTE 12 M (Incluye demolición)	UND	2
	SUBTOTAL APOYOS MT		

1.3.3 N	VESTIDA/ARMADA POSTES MT		
1.3.3.1 N	ESTRUCTURAS 523 REFERENCIA ICEL (Incluye el suministro, transporte y montaje de la estructura)	UND	1
1.3.3.2 N	ESTRUCTURA 533 REFERENCIA ICEL (Incluye el suministro, transporte y montaje de la estructura)	UND	1
1.3.3.3 N	ESTRUCTURA 560 ICEL (Incluye el suministro, transporte y montaje de la estructura)	UND	1
1.3.3.4 N	ESTRUCTURA 710 ICEL MONTAJE TRAF0 1F CON PaT Y PROTECCIÓN DE TRAF0 (Incluye Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	UND	1
1.3.3.5 N	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION	UND	4
	SUBTOTAL VESTIDA/ARMADA POSTES		
1.3.4 N	TEMPLETES MT		
1.3.4.1 N	TEMPLETE DIRECTO A TIERRA / MEDIA TENSION (Incluye Suministro, Transporte e Instalación)	UND	4
	SUBTOTAL TEMPLETES MT		
1.3.5 N	VESTIDA/ARMADA POSTES MT		
1.3.5.1 N	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION	UND	1
1.3.5.2 N	ESTRUCTURA 619 CIRCUITO SECUNDARIO (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	UND	1

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA

Para el presente informe, en términos generales esta Interventoría puede informar que, en la ejecución de las actividades de obra se han presentado dificultades con el suministro de asfalto por motivos de mantenimiento y daños en la planta. Así mismo se han presentado daños en el equipo de instalación de asfalto, el contratista continúa realizando actividades de topografía, riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 (anteriormente CRL-1) y mezcla densa en caliente tipo MDC-19, instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares, estabilización química de terraplén y/o subrasante con sal inorgánica, línea de demarcación con pintura en frío y actividades de instalación de señalización vertical.

En el seguimiento administrativo del contrato de obra, se aprobó por el INVIAS y la Alcaldía de Fortul la solicitud Prórroga de obra e Interventoría por diecisiete (17) días, que cubran la ejecución durante el mes de diciembre del presente año hasta el día 31, está en trámite la solicitud de adicional de plazo, por un periodo de SESENTA (60) días ante el INVIAS y la Alcaldía de Fortul

para los Contratos de Obra e Interventoría. También se realizaron los comités de obra para seguimiento y avance de las obras y reuniones con la comunidad.

En cuanto al componente ambiental para este mes se reporta la siguiente información:

Se solicita por parte de la interventoría la entrega del plan de inversión ambiental con fecha perentoria, este es remitido de manera extemporánea por el contratista el día 3 de noviembre, se revisa y aprueba por la interventoría el miércoles 4 de diciembre y finalmente es radicado al INVIAS.

La interventoría revisa y aprueba el informe del mes de noviembre del contratista. Se continua a la espera por parte de la interventoría que se defina desde el contratista la fecha de inicio de las actividades de compensación, es de tener en cuenta que se han realizado múltiples llamados de atención y requerimientos desde la interventoría con relación a este tema, a la fecha a vísperas de la culminación del proyecto no se ha dado una respuesta a esta situación. Se realiza informe trimestral 3 por parte de la interventoría y es radicado ante invias.

Se envía por parte del contratista la Resolución 700.36.24.0139 del 4 de diciembre de 2024 la cual aclara y modifica el artículo primero de la Resolución No. 700.36.24-0013 de fecha 16 de febrero de 2024 otorgada al municipio de Fortul, identificado con NIT. 800.136.069-4, para la ocupación de cauce, concesión de aguas superficiales y permiso de aprovechamiento forestal único del proyecto. Se realiza verificación en campo del cumplimiento de los programas establecidos en PAGA de obra.

Se contesta y aclara comunicado de invias en el cual se solicita dar claridad en relación con el plan de inversión ambiental del contrato y los permisos de los puntos de adquisición de materiales del proyecto.

En comité de obra se informa al contratista y municipio nuevamente que los tiempos para realizar la compensación del contrato según lo establecido dentro del permiso único ambiental ya no se pueden cumplir. Razón por la cual el plan de inversión ambiental queda en cero, una vez por parte del municipio y el contratista se dé la gestión del cambio de medida de compensación y esta se informe a la interventoría se procederá con la actualización de este documento en caso tal que exista adición de tiempo dentro del contrato y este tiempo cumpla con los plazos que se encuentren dentro de las especificaciones de las medidas compensatorias a realizar.

Desde el componente social, se realizó reunión informativa con la comunidad acerca de la adición del contrato y las actividades realizadas en el mes de noviembre. Se entregó informe mensual e

informe trimestral No. 3. Reunión de cierre con la veeduría ciudadana el miércoles 11 y jueves 12 de diciembre en ambos sectores y la planeación de la capacitación al personal operativo. Capacitación en articulación con la Alcaldía Municipal a la comunidad sobre equidad de género, esto se desarrolló en el salón comunal el día 13 de diciembre. Por último se realiza el cierre de actas de vecindad en los dos sectores de trabajo.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

A continuación, se presenta el avance ejecutado acumulado del proyecto a la fecha del presente informe, por actividades y por capítulos:

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	ACUMULADO 26 de diciembre DE 2024		
LOTE 2. PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO								
						CANT EJECUTADAS ACUM.	VR TOTAL	% FISICO ACUM
1.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES (INCLUYE RETIRO)	M3	4976,39	\$ 20.756,00	\$ 103.289.950,84	4920,47	\$ 102.129.275,32	98,88%
					\$ 103.289.950,84		\$ 102.129.275,32	98,88%
2.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	51800	\$ 12.133,00	\$ 628.489.400,00	51800,00	\$ 628.489.400,00	100,00%
2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M3	5776,08	\$ 144.582,00	\$ 835.117.198,56	5776,08	\$ 835.117.198,56	100,00%
2.3	SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50	M3	11262,68	\$ 182.611,00	\$ 2.056.689.257,48	11262,68	\$ 2.056.689.257,48	100,00%
2.4	BASE GRANULAR CLASE B GRADACION FINA	M3	8053,86	\$ 222.012,00	\$ 1.788.053.566,32	8053,86	\$ 1.788.053.566,32	100,00%
2.5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 (anteriormente CRL-1)	M2	51800	\$ 5.034,00	\$ 260.761.200,00	51800,00	\$ 260.761.200,00	100,00%
2.6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	4516,87	\$ 1.481.973,00	\$ 6.693.879.384,51	4516,87	\$ 6.693.879.384,51	100,00%
					\$ 2.262.990.006,87		\$ 12.262.990.006,87	100,00%
3.1	CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU	M3	13,16	\$ 828.183,00	\$ 10.898.888,28	12,15	\$10.062.423,45	92,33%
3.2	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	134,97	\$ 1.200.425,00	\$ 162.021.362,25	125,28	\$ 150.389.244,00	92,82%
3.3	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU	M3	25,85	\$ 1.665.009,00	\$ 43.040.482,65	25,85	\$ 43.040.482,65	100,00%
3.4	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	14387,14	\$ 8.309,00	\$ 119.542.746,26	13554,57	\$ 112.624.922,13	94,21%
3.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	117,00	\$ 1.074.554,00	\$ 125.722.818,00	110,5	\$ 118.738.217,00	94,44%
3.6 N	DEMOLICION DE BOXCOULVERT, ALCANTARILLAS Y CAJONES EN CONCRETO REFORZADO (Incluye retiro)	M3	51,11	\$ 283.648,00	\$ 14.497.249,28	51,11	\$ 4.497.249,28	100,00%
					\$ 475.723.546,72	0	\$ 449.352.538,51	94,46%

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	ACUMULADO 26 de diciembre DE 2024		
LOTE 2. PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO								
						CANT EJECUTADAS ACUM.	VR TOTAL	% FISICO ACUM
4.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX (75X75 cm)	UND	35,00	\$ 766.985,00	\$ 26.844.475,00	35	\$ 26.844.475,00	100,00%
4.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	22200	\$ 3.164,00	\$ 70.240.800,00	11200	\$ 35.436.800,00	50,45%
					\$ 97.085.275,00			
					\$ 2.939.088.779,43		\$ 62.281.275,00	0,00%
1P	ACTUALIZACIÓN A CARACTERIZACION DEL CORREDOR VIAL	KM	7,40	\$ 674.337,00	\$ 4.990.093,80	0	\$ -	0,00%
					\$ 4.990.093,80			0,00%
	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	UND	1,00	\$126.680.567,38	\$ 126.680.567,38	0	\$ -	0,00%
					\$ 126.680.567,38			0
					\$ 13.070.759.440,61		\$ 12.876.753.095,70	98,52%
LOTE 1. CAÑO FLORES - SITIO NUEVO								
	VIA							
	EXCAVACIONES Y RELLENOS							
1.1.2.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. (Incluye Transporte)	m3	1.119,61	\$ 28.183,00	\$ 31.553.968,63	885,13	\$ 24.945.618,79	79,06%
1.1.2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	m3	1.092,68	\$ 187.612,00	\$ 204.999.880,16	885,13	\$ 166.061.009,56	81,01%
1.1.2.3	TERRAPLENES	m3	55.304,45	\$ 124.804,00	\$ 6.902.216.577,80	55109,66	\$ 6.877.906.377,06	99,65%
					\$ 7.138.770.426,59		\$7.068.913.005,41	99,02%
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO							
1.1.3.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	37.941,80	\$ 12.133,00	\$ 460.347.859,40	22410,50	\$ 271.906.596,50	59,07%
1.1.3.2	ESTABILIZACIÓN QUIMICA DE TERRAPLEN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGANICA	m3	9.322,16	\$ 247.006,00	\$ 2.302.629.452,96	5602,51	\$ 1.383.853.585,06	60,10%
1.1.3.3	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 (anteriormente CRL-1)	m2	37.476,80	\$ 5.034,00	\$ 188.658.211,20	1646,67	\$ 8.289.336,78	4,39%
1.1.3.4	MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	2.229,29	\$ 1.501.457,00	\$ 3.347.183.075,53	104	\$ 156.151.528,00	4,67%
					\$ 6.298.818.599,09		\$ 1.820.201.046,34	28,90%
	SEÑALIZACIÓN							

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	ACUMULADO 26 de diciembre DE 2024		
	LOTE 2. PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO							
						CANT EJECUTADAS ACUM.	VR TOTAL	% FISICO ACUM
1.1.4.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX (75X75 cm)	UND	32,00	\$ 766.271,00	\$ 24.520.672,00	0	\$ -	0,00%
1.1.4.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO (LINEAS CENTRALES Y/O LATERALES)	m	15.160,00	\$ 3.163,00	\$ 47.951.080,00	0	\$ -	0,00%
1.1.4.3	TACHA RETRORREFLECTIVA - ADHESIVO Y/O BITUMINOSO TERMOPLÁSTICO	UND	1.264,00	\$ 9.838,00	\$ 12.435.232,00	0	\$ -	0,00%
1.1.4.4	DEFENSA VEHICULAR METALICA EN ACERO GALVANIZADO	m	439,00	\$ 321.963,00	\$ 141.341.757,00	0	\$ -	0,00%
1.1.4.5	CAPTAFAROS	UND	115,00	\$ 14.658,00	\$ 1.685.670,00	0	\$ -	0,00%
1.1.4.6	DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SIMPLE (50 m X 40 m)	UND	9,00	\$ 684.263,00	\$ 6.158.367,00	0	\$ -	0,00%
					\$ 234.092.778,00		\$ -	0,00%
					\$ 13.671.681.803,68		\$ 8.889.114.051,75	65,02%
	OBRAS DE DRENAJE							
	PRELIMINARES							
1.1.2.1	DEMOLICION DE BOXCOULVERT, ALCANTARILLAS Y CAJONES EN CONCRETO REFORZADO (Incluye retiro)	m3	55,38	\$ 283.648,00	\$ 15.708.426,24	55,38	\$ 15.708.426,24	100,00%
					\$ 15.708.426,24		\$ 5.708.426,24	100,00%
	EXCAVACIONES Y RELLENOS							
1.2.2.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M.	m3	550,80	\$ 28.183,00	\$ 15.523.196,40	550,80	\$ 5.523.196,40	100,00%
1.2.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	m3	30,92	\$ 40.245,00	\$ 1.244.375,40	0	\$ -	0,00%
1.2.2.3	RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO	m3	375,88	\$ 233.118,00	\$ 87.624.393,84	375,88	\$ 87.624.393,84	100,00%
					\$ 104.391.965,64		\$ 103.147.590,24	98,81%
	CONCRETOS							
1.2.3.1	CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU	m2	6,40	\$ 852.720,00	\$ 5.457.408,00	0	\$ -	0,00%
1.2.3.2	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	358,80	\$ 1.647.023,00	\$ 590.951.852,40	358,8	\$ 590.951.852,40	100,00%
1.2.3.3	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	180,00	\$ 1.074.555,00	\$ 193.419.900,00	180,00	\$ 193.419.900,00	100,00%
1.2.3.4	CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU	m3	29,17	\$ 852.720,00	\$ 24.873.842,40	29,17	\$ 24.877.253,28	100,01%

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	ACUMULADO 26 de diciembre DE 2024		
	LOTE 2. PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO							
						CANT EJECUTADAS ACUM.	VR TOTAL	% FISICO ACUM
					\$ 814.703.002,80		\$ 809.249.005,6800	99,33%
	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa							
1.2.4.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	21.238,80	\$ 8.333,00	\$ 176.982.920,40	21238,80	\$ 176.982.920,40	100,00%
					\$ 176.982.920,40		\$ 176.982.920,40	100,00%
					\$ 1.111.786.315,08		\$ 1.105.087.942,56	99,40%
1.3 N	MOVIMIENTO RED ELECTRICA							
1.3.1N	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT							
1.3.1.1N	REPLANTEO TOPOGRÁFICO ELÉCTRICO MT	KM	0,33	\$ 519.376,00	\$ 171.394,08	0,33	\$ 171.394,08	100,00%
	SUBTOTAL LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT				\$ 171.394,08		\$ 171.394,08	
1.3.2N	APOYOS MT							
1.3.2.1N	Concreto 3000 PSI (Incluye Material, Mano de Obra, y Herramienta y Equipos)	M3	1,80	\$ 1.137.476,00	\$ 2.047.456,80	1,80	\$ 2.047.456,80	100,00%
1.3.2.2N	POSTE EN CONCRETO 12 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada y aplomada)	UND	2,00	\$ 4.592.568,00	\$ 9.185.136,00	2,00	\$ 9.185.136,00	100,00%
1.3.2.3N	DESHINCADO Y DEMOLICIÓN POSTE 12 M (Incluye demolición)	UND	2,00	\$ 763.318,00	\$ 1.526.636,00	2,00	\$ 1.526.636,00	100,00%
	SUBTOTAL APOYOS MT				\$ 12.759.228,80		\$ 12.759.228,80	
1.3.3N	VESTIDA / ARMADA POSTES MT							
1.3.3.1N	ESTRUCTURA 523 REFERENCIA ICEL (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	UND	1,00	\$ 710.849,00	\$ 710.849,00	1	\$ 710.849,00	100,00%
1.3.3.2N	ESTRUCTURA 533 REFERENCIA ICEL (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	UND	1,00	\$ 1.160.615,00	\$ 1.160.615,00	1	\$ 1.160.615,00	100,00%
1.3.3.3N	ESTRUCTURA 560 ICEL (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	UND	1,00	\$ 3.072.512,00	\$ 3.072.512,00	1	\$ 3.072.512,00	100,00%
1.3.3.4N	ESTRUCTURA 710 ICEL MONTAJE TRAF0 1F CON PaT Y PROTECCIÓN DE TRAF0 (Incluye Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	UND	1,00	\$ 5.638.150,00	\$ 5.638.150,00	1	\$ 5.638.150,00	100,00%
1.3.3.5N	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION	UND	4,00	\$ 230.362,00	\$ 921.448,00	4	\$ 921.448,00	100,00%
	SUBTOTAL VESTIDA / ARMADA POSTES MT				\$ 11.503.574,00		\$ 11.503.574,00	100,00%
1.3.4N	TEMPLETES MT							
1.3.4.1N	TEMPLETE DIRECTO A TIERRA / MEDIA TENSIÓN (Incluye Suministro, Transporte e Instalación)	UND	4,00	\$ 714.703,00	\$ 2.858.812,00	4	\$ 2.858.812,00	100,00%
	SUBTOTAL TEMPLETES MT		-		\$ 2.858.812,00		\$ 2.858.812,00	
1.3.5N	VESTIDA / ARMADA POSTES BT							
1.3.5.1N	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION	UND	1,00	\$ 140.918,00	\$ 140.918,00	1	\$ 140.918,00	100,00%

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	ACUMULADO 26 de diciembre DE 2024		
	LOTE 2. PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO							
						CANT EJECUTADAS ACUM.	VR TOTAL	% FISICO ACUM
1.3.5.2N	ESTRUCTURA 619 CIRCUITO SECUNDARIO (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	UND	1,00	\$ 229.245,00	\$ 229.245,00	1	\$ 229.245,00	100,00%
	SUBTOTAL VESTIDA / ARMADA POSTES BT		-		\$ 370.163,00		\$ 370.163,00	
	SUBTOTAL MOVIMIENTO RED ELECTRICA				\$ 27.663.171,88		\$ 27.663.171,88	
					\$ 14.811.131.290,64		\$ 10.021.865.166,19	67,66%
1P	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				\$ 148.313.198,55		\$ -	0,00%
2P					\$ 2.555.738,41		\$ -	0,00%
					\$ 14.962.000.227,60		\$ 10.021.865.166,19	
					\$ 28.032.759.668,21		\$ 22.898.618.261,89	81,69%
	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO				\$ 8.976,89			
					\$ 28.032.768.645,10			

Anexo A. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Tabla 2. Informes semanales en el mes de diciembre de 2024.

N° SEMANA	% EJECUTADO ACUMULADO
Semanal No. 42 (29 de noviembre al 5 de diciembre 2024)	67,0 %
Semanal No.43 (6 al 12 de diciembre 2024)	76,0 %
Semanal No.44 (13 al 19 de diciembre 2024)	77,0%
Semanal No. 45 (20 al 26 de diciembre 2024)	79,0%

El seguimiento y control de la ejecución del proyecto, se realiza teniendo en cuenta el programa de inversión vigente presentando por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Anexo B. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (maquinaria y equipo contrato de obra).

Se presentan 2 versiones de este formato los cuales se distribuyen así:

- **Tramo 1:** Caño Flores a Sitio nuevo.
- **Tramo 2:** La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Anexo C. formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (personal contrato de obra).

4.4 INFORMACIÓN FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo el contratista de obra no presento cortes de obra, la interventoría está en revisión del corte de obra No.4 presentado en el mes de noviembre de 2024.

Anexo D MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Anexo E, formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

Debido a la distancia entre los frentes de trabajo, se presentan 2 versiones de este formato los cuales se distribuyen así:

- **Tramo 1:** Caño Flores a Sitio nuevo.
- **Tramo 2:** La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.

4.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Anexo F Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO

Anexo G. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

Se Anexa Ultimas Pólizas Actualizadas entregadas por el Contratista.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Anexo H. Formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14.

4.9 Otros Documento Seguimiento Mensual

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

- Anexo I. Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1
- Anexo J. Formato MEPI-MN-IN-2-FR-2

4.9.2 Seguimiento Programa de obra


- Anexo K.

4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones


- Anexo L. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1
- Anexo M. Formato MEPI-MN-IN-6-FR-2.

El CONTRATO FIDUCIARIO creado para el buen manejo del anticipo entre el CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. menciona que, los rendimientos financieros del anticipo, será girados mensualmente a la entidad contratante, responsable del contrato de obra, para este proyecto, la alcaldía del municipio de Fortul

La Alcaldía del Municipio de Fortul presentó la información correspondiente a los giros realizados por concepto del buen manejo del anticipo. A continuación, se muestra la información presentada:

 ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL NIT: 800136069-4 SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL Cra. 25 No 5-45 Palacio Municipal 3118496607 Pág. Web: www.fortul.arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul.arauca.gov.co		 CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05 VERSIÓN: 01
BENEFICIARIO NIT/Cedula: 900517804-1 Nombre: DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		No. ORDEN DE PAGO 147
Cedula Representante 900517804	Representante Legal DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Fecha de Orden Febrero 22 de 2024
Tipo de Compromiso PAGO A TERCEROS	Número de Documento 24072643	Vigencia 0
CONCEPTO DE PAGO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO EN LA FIDUCIA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024		
Valor Orden Pago \$10,291,749.00	Total Deducciones \$0.00	Valor a Pagar \$10,291,749.00
FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN		
Unidad -	Rubro -	Nombre Rubro (FF:)
Nombre Código Producto RP:		Valor \$0.00
TOTAL FINANCIACIÓN		\$0.00
DETALLE DE PAGOS		
BANCO BBVA	CUENTA BANCARIA 842-004210	TIPO PAGO TRANSFERENCIA
CÓDIGO CONTABLE 1110060227		VALOR \$10,291,749.00
TOTAL PAGADO		\$10,291,749.00
 ORDENADOR DEL GASTO		

Elaboró: BOMILLA ANGARITA LAURA SOFIA

 ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL NIT: 800136069-4 SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL Cra. 25 No 5-45 Palacio Municipal 3118496607 Pág. Web: www.fortul.arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul.arauca.gov.co		 CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05 VERSIÓN: 01
BENEFICIARIO NIT/Cedula: 900517804-1 Nombre: DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		No. ORDEN DE PAGO 148
Cedula Representante 900517804	Representante Legal DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Fecha de Orden Febrero 22 de 2024
Tipo de Compromiso PAGO A TERCEROS	Número de Documento 24072643	Vigencia 0
CONCEPTO DE PAGO DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023		
Valor Orden Pago \$5,901,424.00	Total Deducciones \$0.00	Valor a Pagar \$5,901,424.00
FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN		
Unidad -	Rubro -	Nombre Rubro (FF:)
Nombre Código Producto RP:		Valor \$0.00
TOTAL FINANCIACIÓN		\$0.00
DETALLE DE PAGOS		
BANCO BBVA	CUENTA BANCARIA 842-004210	TIPO PAGO TRANSFERENCIA
CÓDIGO CONTABLE 1110060227		VALOR \$5,901,424.00
TOTAL PAGADO		\$5,901,424.00
 ORDENADOR DEL GASTO		

Elaboró: BOMILLA ANGARITA LAURA SOFIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL NIT: 800136069-4 SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co		CÓDIGO: F-DIR-GR-PO3-05 VERSIÓN: 01
---	--	---	---

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°

2 - 2014824

Fecha

22/02/2024

Pagado A:

900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 148/24. DEVOLUCION DE RENDIENTOS DEL MES DE ENERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCARIAS BBVA 4210	\$5,901,424.00	\$0.00
2	110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCARIAS	\$0.00	\$5,901,424.00
SUMAS IGUALES -->			\$5,901,424.00	\$5,901,424.00


**SECRETARIA DE HACIENDA Y
TESORERA**

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL NIT: 800136069-4 SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co		CÓDIGO: F-DIR-GR-PO3-05 VERSIÓN: 01
--	--	--	---

BENEFICIARIO

Nit/Cedula

900517804-1

Nombre

DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

No. ORDEN DE PAGO

264

Cedula Representante

900517804

Representante Legal

DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Fecha de Orden

Marzo 14 de 2024

Tipo de Compromiso

PAGO A TERCEROS

Número de Documento

24072643

Vigencia

0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION DE RENDIENTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Valor Orden Pago

\$5,542,286.00

Total Deducciones

\$0.00

Valor a Pagar


\$5,542,286.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF.)		RP:	\$0.00
TOTAL FINANCIACIÓN					\$0.00

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	\$5,542,286.00
TOTAL PAGADO				\$5,542,286.00


ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL NIT: 800136069-4 SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co		CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05 VERSIÓN: 01
---	--	---	---

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°

2 - 2026424

Fecha

14/03/2024

Pagado A:

900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL


Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 264/24, DEVOLUCION DE RENDIENTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCARIAS BBVA 4210	\$5,542,286.00	\$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCARIAS	\$0.00	\$5,542,286.00
SUMAS IGUALES -->			\$5,542,286.00	\$5,542,286.00


**SECRETARIA DE HACIENDA Y
TESORERA**

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL NIT: 800136069-4 SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co		CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05 VERSIÓN: 01
--	--	--	---

BENEFICIARIO

Nit/Cedula

900517804-1

Nombre

DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

No. ORDEN DE PAGO

265

Cedula Representante

900517804

Representante Legal

DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Fecha de Orden

Marzo 14 de 2024

Tipo de Compromiso

PAGO A TERCEROS

Número de Documento

24072643

Vigencia

0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION RENDIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO EN LA FIDUCIA MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Valor Orden Pago

\$99,592,859.10

Total Deducciones

\$0.00

Valor a Pagar

\$99,592,859.10

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	\$0.00
TOTAL FINANCIACIÓN					\$0.00

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	\$99,592,859.10
TOTAL PAGADO				\$99,592,859.10


ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL		CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
	NIT: 800136069-4		VERSIÓN: 01
	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL		
	Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co		

Nit/Cedula 900517804-1	BENEFICIARIO Nombre DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	No. ORDEN DE PAGO 493
Cedula Representante 900517804	Representante Legal DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Fecha de Orden Mayo 30 de 2024
Tipo de Compromiso PAGO A TERCEROS	Número de Documento 24072643	Vigencia 0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Valor Orden Pago \$341,880.00	Total Deducciones \$0.00	Valor a Pagar \$341,880.00
---	------------------------------------	--------------------------------------

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	\$0.00
TOTAL FINANCIACIÓN					\$0.00

DETALLE DE PAGOS

BANCO BBVA	CUENTA BANCARIA 842-004210	TIPO PAGO TRANSFERENCIA	CÓDIGO CONTABLE 1110060227	VALOR \$341,880.00
TOTAL PAGADO				\$341,880.00


ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL		CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
	NIT: 800136069-4		VERSIÓN: 01
	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL		
	Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co		

COMPROBANTE DE PAGOS


Comprobante N° 2 - 2049324	Fecha 30/05/2024
--------------------------------------	----------------------------

Pagado A: 900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago: **Documentos Relacionados:**

Por Concepto De:
Orden de Pago No. 493/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCARIAS BBVA 4210	\$341,880.00	\$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCARIAS	\$0.00	\$341,880.00
SUMAS IGUALES -->			\$341,880.00	\$341,880.00


SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL		CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
	NIT: 800136069-4		VERSIÓN: 01
	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL		
	Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co		

BENEFICIARIO		No. ORDEN DE PAGO
Nit/Cedula 900517804-1	Nombre DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	494
Cedula Representante 900517804	Representante Legal DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Fecha de Orden Mayo 30 de 2024
Tipo de Compromiso PAGO A TERCEROS	Número de Documento 24072643	Vigencia 0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Valor Orden Pago \$117,684.00	Total Deducciones \$0.00	Valor a Pagar \$117,684.00
---	------------------------------------	--------------------------------------

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	\$0.00
TOTAL FINANCIACIÓN					\$0.00

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	\$117,684.00
TOTAL PAGADO				\$117,684.00


ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL		CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
	NIT: 800136069-4		VERSIÓN: 01
	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL		
	Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co		

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°
2 - 2049424

Fecha
30/05/2024

Pagado A:
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:


Por Concepto De:

Orden de Pago No. 494/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCARIAS BBVA 4210	\$117,684.00	\$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCARIAS	\$0.00	\$117,684.00
SUMAS IGUALES -->			\$117,684.00	\$117,684.00



SECRETARIA DE HACIENDA Y
TESORERA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL		CÓDIGO:
	NIT: 800136069-4		F-DIR-GR-P03-05
	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL		VERSIÓN: 01
	Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co		

Nit/Cedula	BENEFICIARIO	No. ORDEN DE PAGO
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	495
Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Mayo 30 de 2024
Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0
CONCEPTO DE PAGO		
DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA		
Valor Orden Pago	Total Deducciones	Valor a Pagar
\$103,345,286.00	\$0.00	\$103,345,286.00
FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN		
Unidad	Rubro	Nombre Rubro
-	-	(FF:)
		Nombre Código Producto
		RP:
		Valor
		\$0.00
TOTAL FINANCIACIÓN		\$0.00
DETALLE DE PAGOS		
BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA
		CÓDIGO CONTABLE
		11 10060227
		VALOR
		\$103,345,286.00
TOTAL PAGADO		\$103,345,286.00
 ORDENADOR DEL GASTO		

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL		CÓDIGO:
	NIT: 800136069-4		F-DIR-GR-P03-05
	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL		VERSIÓN: 01
	Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co		

COMPROBANTE DE PAGOS		Comprobante N°	Fecha
		2 - 2049524	30/05/2024
Pagado A:	Forma de Pago:	Documentos Relacionados:	
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL			
Por Concepto De:	Orden de Pago No. 495/24, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA		
Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCARIAS BBVA 4210	\$103,345,286.00
2	11 10060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCARIAS	\$0.00
SUMAS IGUALES -->			\$103,345,286.00
 SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA			\$103,345,286.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co



CÓDIGO:
F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO		No. ORDEN DE PAGO
Nit/Cedula	Nombre	
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	496
Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Mayo 30 de 2024
Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0
CONCEPTO DE PAGO		
DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA		
Valor Orden Pago	Total Deducciones	Valor a Pagar
\$93,280,801.55	\$0.00	\$93,280,801.55
FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN		
Unidad	Rubro	Nombre Rubro
-	-	(FF:)
Nombre Código Producto		Rp
		RP:
		TOTAL FINANCIACIÓN
		\$0.00
DETALLE DE PAGOS		
BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA
CÓDIGO CONTABLE		VALOR
1110060227		\$93,280,801.55
TOTAL PAGADO		\$93,280,801.55

[Signature]
ORDENADOR DEL GASTO

Elabora: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co



CÓDIGO:
F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°
2 - 2049624

Fecha
30/05/2024

Pagado A:
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 496/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCARIAS BBVA 4210	\$93,280,801.55	\$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCARIAS	\$0.00	\$93,280,801.55
SUMAS IGUALES -->			\$93,280,801.55	\$93,280,801.55

[Signature]
SECRETARIA DE HACIENDA Y
TESORERA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL		CÓDIGO:
	NIT: 800136069-4		F-DIR-GR-P03-05
	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL		VERSIÓN: 01
	Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co		

BENEFICIARIO		No. ORDEN DE PAGO
Nit/Cedula	Nombre	
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	810
Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Agosto 26 de 2024
Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0
CONCEPTO DE PAGO		
DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023		
Valor Orden Pago	Total Deducciones	Valor a Pagar
\$184,150.00	\$0.00	\$184,150.00
FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN		
Unidad	Rubro	Nombre Rubro
	(FF:)	
		Nombre Código Producto
		Rp
		RP:
		TOTAL FINANCIACIÓN
		\$0.00
DETALLE DE PAGOS		
BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA
		CÓDIGO CONTABLE
		1110060227
		VALOR
		\$184,150.00
		TOTAL PAGADO
		\$184,150.00
ORDENADOR DEL GASTO		

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL		CÓDIGO:
	NIT: 800136069-4		F-DIR-GR-P03-05
	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL		VERSIÓN: 01
	Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co		

COMPROBANTE DE PAGOS		Comprobante N°	Fecha
		2 - 2081024	26/08/2024
Pagado A:	Forma de Pago:	Documentos Relacionados:	
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL			
Por Concepto De:			
Orden de Pago No. 810/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023			
Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCARIAS BBVA 4210	\$184,150.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCARIAS	\$0.00
		SUMAS IGUALES -->	\$184,150.00
			\$184,150.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA			


	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL NIT: 800136069-4 SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co		CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05 VERSIÓN: 01
---	--	---	---

Nit/Cedula 900517804-1	BENEFICIARIO Nombre DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	No. ORDEN DE PAGO 811
Cedula Representante 900517804	Representante Legal DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Fecha de Orden Agosto 26 de 2024
Tipo de Compromiso PAGO A TERCEROS	Número de Documento 24072643	Vigencia 0
CONCEPTO DE PAGO DEVOLUCION DE RENDIENTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023		
Valor Orden Pago \$176,682.00	Total Deducciones \$0.00	Valor a Pagar \$176,682.00
FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN		
Unidad -	Rubro -	Nombre Rubro (FF:)
Nombre Código Producto		Rp RP: \$0.00
DETALLE DE PAGOS		TOTAL FINANCIACIÓN \$0.00
BANCO BBVA	CUENTA BANCARIA 842-004210	TIPO PAGO TRANSFERENCIA
CÓDIGO CONTABLE 1110060227		VALOR \$176,682.00
TOTAL PAGADO		\$176,682.00
 ORDENADOR DEL GASTO		

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL NIT: 800136069-4 SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co		CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05 VERSIÓN: 01
---	--	---	---

COMPROBANTE DE PAGOS		Comprobante N° 2 - 2081124	Fecha 26/08/2024	
Pagado A: 900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Forma de Pago:	Documentos Relacionados:		
Por Concepto De: Orden de Pago No. 811/24. DEVOLUCION DE RENDIENTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023				
Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCARIAS BBVA 4210	\$176,682.00	\$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCARIAS	\$0.00	\$176,682.00
SUMAS IGUALES -->			\$176,682.00	\$176,682.00


SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL			CÓDIGO:
	NIT: 800136069-4			F-DIR-GR-P03-05
	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL			VERSIÓN: 01
	Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co			

BENEFICIARIO		No. ORDEN DE PAGO
Nit/Cedula	Nombre	
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	812
Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Agosto 26 de 2024
Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0
CONCEPTO DE PAGO		
DEVOLUCION DE RENDIMTOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023		
Valor Orden Pago	Total Deducciones	Valor a Pagar
\$183,470.00	\$0.00	\$183,470.00
FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN		
Unidad	Rubro	Nombre Rubro
	(FF:)	
		Nombre Código Producto
		Rp
		Valor
		RP:
		TOTAL FINANCIACIÓN
		\$0.00
DETALLE DE PAGOS		
BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA
		CÓDIGO CONTABLE
		1110060227
		VALOR
		\$183,470.00
		TOTAL PAGADO
		\$183,470.00
		
ORDENADOR DEL GASTO		

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL			CÓDIGO:
	NIT: 800136069-4			F-DIR-GR-P03-05
	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL			VERSIÓN: 01
	Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co			

COMPROBANTE DE PAGOS		Comprobante N°	Fecha
		2 - 2081224	26/08/2024
Pagado A:	Forma de Pago:	Documentos Relacionados:	
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL			

Por Concepto De:
Orden de Pago No. 812/24. DEVOLUCION DE RENDIMTOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCARIAS BBVA 4210	\$183,470.00	\$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCARIAS	\$0.00	\$183,470.00
SUMAS IGUALES -->			\$183,470.00	\$183,470.00


SECRETARIA DE HACIENDA Y
TESORERA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL			CÓDIGO:
	NIT: 800136069-4			F-DIR-GR-P03-05
	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL			VERSIÓN: 01
	Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co			

BENEFICIARIO		No. ORDEN DE PAGO	
Nit/Cedula	Nombre		
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	814	
Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden	
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Agosto 26 de 2024	
Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia	
PAGO A TERCEROS	24072643	0	
CONCEPTO DE PAGO			
DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA			
Valor Orden Pago	Total Deducciones	Valor a Pagar	
\$51,876,007.99	\$0.00	\$51,876,007.99	
FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN			
Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Valor
-	(FF:)		\$0.00
TOTAL FINANCIACIÓN			\$0.00
DETALLE DE PAGOS			
BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	\$51,876,007.99
TOTAL PAGADO			\$51,876,007.99


ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL			CÓDIGO:
	NIT: 800136069-4			F-DIR-GR-P03-05
	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL			VERSIÓN: 01
	Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co			

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°

2 - 2081424

Fecha

26/08/2024

Pagado A:

900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL


Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:


Orden de Pago No. 814/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCARIAS BBVA 4210	\$51,876,007.99	\$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCARIAS	\$0.00	\$51,876,007.99
SUMAS IGUALES -->			\$51,876,007.99	\$51,876,007.99


SECRETARIA DE HACIENDA Y
TESORERA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL			CÓDIGO:
	NIT: 890136069-4			F-DIR-GR-P03-05
	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL			VERSIÓN: 01
	Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co			

Nit/Cedula 900517804-1	BENEFICIARIO Nombre DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	No. ORDEN DE PAGO 816
Cedula Representante 900517804	Representante Legal DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Fecha de Orden Agosto 26 de 2024
Tipo de Compromiso PAGO A TERCEROS	Número de Documento 24072643	Vigencia 0
CONCEPTO DE PAGO		
DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA		
Valor Orden Pago \$56,889,776.32	Total Deducciones \$0.00	Valor a Pagar \$56,889,776.32
FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN		
Unidad -	Rubro -	Nombre Rubro (FF:)
	Nombre	Código Producto
		Rp
		Valor
		\$0.00
TOTAL FINANCIACIÓN		\$0.00
DETALLE DE PAGOS		
BANCO BBVA	CUENTA BANCARIA 842-004210	TIPO PAGO TRANSFERENCIA
		CÓDIGO CONTABLE 1110060227
		VALOR \$56,889,776.32
TOTAL PAGADO		\$56,889,776.32


ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL			CÓDIGO:
	NIT: 890136069-4			F-DIR-GR-P03-05
	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL			VERSIÓN: 01
	Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co			

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°
2 - 2081624

Fecha
26/08/2024


Pagado A:
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago: **Documentos Relacionados:**

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 816/24, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCARIAS BBVA 4210	\$56,889,776.32	\$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCARIAS	\$0.00	\$56,889,776.32
SUMAS IGUALES -->			\$56,889,776.32	\$56,889,776.32


SECRETARIA DE HACIENDA Y
TESORERA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL NIT: 800136069-4 SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co		CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05 VERSIÓN: 01
---	--	---	---

Nit/Cedula 900517804-1	BENEFICIARIO Nombre: DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	No. ORDEN DE PAGO 817
Cedula Representante 900517804	Representante Legal DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Fecha de Orden Agosto 26 de 2024
Tipo de Compromiso PAGO A TERCEROS	Número de Documento 24072643	Vigencia 0
CONCEPTO DE PAGO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA		
Valor Orden Pago \$36,202,558.18	Total Deducciones \$0.00	Valor a Pagar \$36,202,558.18
FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN		
Unidad -	Rubro -	Nombre Rubro (FF:)
Nombre Código Producto		Rp RP:
TOTAL FINANCIACIÓN		Valor \$0.00
DETALLE DE PAGOS		
BANCO BBVA	CUENTA BANCARIA 842-004210	TIPO PAGO TRANSFERENCIA
CÓDIGO CONTABLE 1110060227		VALOR \$36,202,558.18
TOTAL PAGADO		Valor \$36,202,558.18
 ORDENADOR DEL GASTO		

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL NIT: 800136069-4 SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607 Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co		CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05 VERSIÓN: 01
---	--	---	---

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°

2 - 2081724

Fecha

26/08/2024

Pagado A:

900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL


Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 817/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCARIAS BBVA 4210	\$36,202,558.18	\$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCARIAS	\$0.00	\$36,202,558.18
SUMAS IGUALES -->			\$36,202,558.18	\$36,202,558.18


SECRETARIA DE HACIENDA Y
TESORERA

Año	Mes	Día	Comprobante	Concepto	Nit	Nombre Tercero	Inicial	Valor Debito	Valor Credito	Saldo
Orden de Pago No. 147/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO EN LA FIDUCIA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA										
2024	2	22	2014724		900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		0	0	10,291,749 11,744,043,367.10
Orden de Pago No. 148/24. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA										
2024	2	22	2014824		900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		0	0	5,901,424 11,738,141,943.10
Orden de Pago No. 264/24. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA										
2024	3	14	2026424		900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		0	0	5,542,286 11,841,469,855.10
Orden de Pago No. 265/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO EN LA FIDUCIA MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA										
2024	3	14	2026524		900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		0	0	99,592,859.10 11,741,876,996
Orden de Pago No. 493/24. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA										
2024	5	30	2049324		900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		0	0	341,880 16,730,335,481.55
Orden de Pago No. 494/24. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA										
2024	5	30	2049424		900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		0	0	117,684 16,730,217,797.55
Orden de Pago No. 495/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA										
2024	5	30	2049524		900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		0	0	103,345,286 16,626,872,511.55
Orden de Pago No. 810/24. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA										
2024	5	30	2049624		900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		0	0	93,280,801.55 16,533,591,710
Orden de Pago No. 811/24. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA										
2024	8	26	2081024		900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		0	0	184,150 16,710,047,757.55
Orden de Pago No. 812/24. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA										
2024	8	26	2081124		900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		0	0	176,682 16,709,871,075.55
Orden de Pago No. 814/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA										
2024	8	26	2081224		900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		0	0	183,470 16,709,687,605.55
2024	8	26	2081424		900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		0	0	51,876,007.99 16,657,811,597.56

Orden de Pago No. 816/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA									
2024	8	26	2081624	CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	56,889,776.32	16,600,921,821.24
Orden de Pago No. 817/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA									
2024	8	26	2081724	CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	36,202,558.18	16,564,719,263.06

De acuerdo a la información mostrada anteriormente, se presenta el siguiente resumen:

FECHA	ORDEN DE PAGO	MES REPORTADO	VALOR GIRADO
22-feb-24	147	ene-24	\$ 10.291.749,00
22-feb-24	148	ene-24	\$ 5.901.424,00
14-mar-24	264	feb-24	\$ 5.542.286,00
14-mar-24	265	feb-24	\$ 99.592.859,10
30-may-24	493	mar-24	\$ 341.880,00
30-may-24	494	abr-24	\$ 117.684,00
30-may-24	495	abr-24	\$ 103.345.286,00
30-may-24	496	abr-24	\$ 93.280.801,55
26-ago-24	810	may-24	\$ 184.150,00
26-ago-24	811	jun-24	\$ 176.682,00
26-ago-24	812	jul-24	\$ 183.470,00
26-ago-24	814	may-24	\$ 51.876.007,99
26-ago-24	816	jun-24	\$ 56.889.776,32
26-ago-24	817	jul-24	\$ 36.202.558,18
TOTAL			\$ 463.926.614,14

Según la relación mostrada, es importante que el instituto nacional de vías INVIAS, se comuniqué con la alcaldía del municipio de Fortul, para despejar cualquier duda, con respecto a los giros realizados con el rendimiento financiero del anticipo del contrato de obra No.016 de 2023.

4.9.4 Acta de comité de obra

Anexo N. Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1

Tabla 3. Reuniones celebradas en el mes de diciembre de 2024.

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
ACTIVIDAD	FECHA	TEMÁTICA GENERAL
Comité de obra N°29	3/12/2024	Realizar seguimiento del avance de las actividades de obra, análisis de dudas y recomendaciones entre las partes para el buen desarrollo de la obra.
Comité de obra N°30	5/12/2024	Realizar seguimiento del avance de las actividades de obra, análisis de dudas y recomendaciones entre las partes para el buen desarrollo de la obra.
Comité de obra N°31	17/12/2024	Realizar seguimiento del avance de las actividades de obra, análisis de dudas y recomendaciones entre las partes para el buen desarrollo de la obra.
Comité de obra N°32	20/12/2024	Realizar seguimiento del avance de las actividades de obra, análisis de dudas y recomendaciones entre las partes para el buen desarrollo de la obra.

4.9.5 Acta de reunión.

Anexo O. Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2

Tabla 4. Reuniones celebradas en el mes de diciembre de 2024

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
ACTIVIDAD	FECHA	TEMÁTICA GENERAL
Acta de reunión	11/12/2024	Cierre del comité de veeduría ciudadana de Palmarito.
Acta de reunión	12/12/2024	Cierre del comité de veeduría ciudadana de Caño Flores.

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 5. Información sobre el contrato de interventoría

CONTRATO N°:	4763 DE 2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CASANARE
VALOR INICIAL	\$1.856.588.140
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
CONCURSO DE MÉRITOS	CMA-DEO-SVR-076-2023
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	4270 DE 27 NOVIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO SADINTECON NIT 901.742.046-0 SADING GROUP SAS NIT 901.192.745-1 GRUPO INTECON SAS NIT 901.616.027-1
REPRESENTANTE LEGAL	RUTH ELENA TABARES ZULETA
VALOR CONTRATO	\$1.856.588.140
CDP	173523 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	14 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN N°01	DESDE 29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 29 DE ENERO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 DE FEBRERO DE 2024
PRÓRROGA N°01 A SUSPENSIÓN N°01	DESDE EL 30 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE REANUDACION	01 DE MARZO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 DE MARZO DE 2024
PRÓRROGA N°01	DESDE EL 4 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2024 (10 MESES)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE DICIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN, según prórroga No 2 de 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

A partir de las actividades generales inherentes a las labores de la interventoría tenemos las siguientes:

- Efectuar revisión del proyecto, estudiar los documentos contractuales.
- Disponer la organización y los recursos necesarios para la interventoría.
- Supervisar materiales y fuente de materiales.
- Verificar el cumplimiento de especificaciones y planos a que haya lugar.
- Supervisar las obras.
- Controlar la calidad de la obra a través de los ensayos de laboratorio.
- Inspeccionar las obras, controlar personal, equipos y cantidades de obra.
- Medir obra ejecutada.
- Llevar y mantener diario de la obra (bitácora).
- Revisar replanteo topográfico y permanencia de referencias.
- Controlar el cronograma o programa de trabajo.
- Controlar los aspectos ambientales.
- Verificar y colaborar con el contratista en el trámite de las licencias y permisos necesarios.
- Elaborar informe mensual ambiental (parte del informe mensual de interventoría).
- Controlar los aspectos de seguridad industrial y hacer seguimiento al cumplimiento.
- Realizar seguimiento y acompañamiento de reuniones con la comunidad e interacciones necesarias en el área social.
- Verificar que el personal esté afiliado al Sistema de salud, riesgos profesionales y pensiones, y que se realicen los aportes parafiscales (caja de compensación, ICBF, SENA)
- Efectuar el control de registros y archivo de interventoría.
- Efectuar el control de la correspondencia recibida y enviada.
- Organizar y desarrollar reuniones y comités de obras.
- Llevar un registro fotográfico del proyecto.
- Estudiar sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra.
- Expedir constancia de cumplimientos de normas de calidad.
- Efectuar un seguimiento al cumplimiento del plan de calidad de la interventoría.
- Atender observaciones y lineamientos de la entidad contratante.
- Realizar la medición de los indicadores del proyecto.

- Revisar que los equipos estén calibrados y registrar o actualizar el listado de equipos.
- Informar permanentemente sobre el desarrollo del proyecto y sobre incumplimientos del contratista.
- Elaborar informe mensual de la interventoría.

A continuación, se presenta una descripción de las actividades realizadas por el personal técnico en campo, en los frentes de trabajo.

Tramo 1. Caño Flores a Sitio nuevo.

Se realizó el acompañamiento y supervisión en las siguientes actividades de los dos tramos.

- Se realizó chequeo de niveles topográficos al cereo después de instalar el geotextil durante las semanas del periodo del informe.
- Instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares abscisas K0+000 - K0+180, carril derecho y carril izquierdo, K1+220 - K1+600 Carril derecho e izquierdo, K1+600 - K1+985 Carril derecho e izquierdo y abscisas K2+845 - K3+015 Carril derecho e izquierdo.
- Estabilización química de terraplén y/o subrasante con sal inorgánica abscisas K0+820 - K1+230 Carril derecho y K0+535 - K1+220 Carril Izquierdo, K1+220 - K1+600 Carril derecho e izquierdo, K1+600-1985 Carril derecho e izquierdo y abscisas K2+845 - k3+015 Carril derecho e izquierdo.
- Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 (anteriormente CRL-1) desde el K0+000 al K0+180 Carril derecho e izquierdo.
- Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 desde el K0+000 al K0+180 Carril derecho e izquierdo.

Tramo 2: La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.

- Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 (anteriormente CRL-1) desde el K6+426 - K5+600 (Carril derecho) y K6+110 - K5+656 (Carril Izquierdo), K4+840 - K5+600 (Carril derecho) y K4+848 -K5+832 (Carril Izquierdo), K0+000 -K0+040 (Carril derecho e izquierdo) y K5+832 - K5+656 (Carril Izquierdo).
- Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 desde el K6+426 - K5+600 (Carril derecho) y K6+110 - K5+656 (Carril Izquierdo), K4+840 -K5+600 (Carril derecho) y K4+848 -K5+832

(Carril Izquierdo), K0+000 -K0+040 (Carril derecho e izquierdo) y K5+832 - K5+656 (Carril Izquierdo).

- Se ejecutaron actividades de cereo de base granular para posteriormente realizar imprimación.
- Se ejecutaron actividades de línea de demarcación con pintura en frío desde abscisa K0+100 hasta K4+040.
- Se ejecutaron actividades de instalación de señalización vertical.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Anexo P. Se adjunta el respectivo informe de los Especialistas y profesionales socio-ambientales.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Anexo Q. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

Anexo R.

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

5.6.1 CIFRA (Control de los proyectos de Infraestructura)

Anexo S. Se anexa reporte de información cargada en el Plataforma CIFRA (Control de los proyectos de Infraestructura) e informes.

5.6.2 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

Anexo T.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 CONTROL DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo U. MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (equipo contrato de Interventoría).

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo V. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría).

6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo W. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo X. MEPI-MN1-IN-15-FR-13. Se anexan Pólizas.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo Y. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO

6.6.1 Seguimiento a la inversion del Anticipo

Anexo Z. Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1 A La Interventoría no solicitó el desembolso del anticipo.

Anexo AA. Formato MEPI-MN-IN-3-FR-2

6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado.

Anexo AB. Formato MEPI-MN-IN-3-FR-2

6.6.3 Seguimiento al Plan de Cargas a la inversion del Anticipo

Anexo AC. Formato MEPI-MN-IN-9-FR-3

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Contratista de obra viene cumpliendo con las actividades programadas de acuerdo con el cronograma presentado y aprobado por esta Interventoría, a la fecha de corte del 26 de diciembre de 2024, se evidencia un avance físico ejecutado del 79,0% y un avance físico programado del 96,0%, una inversión obra programada acumulada del 97,35% y una inversión obra ejecutada acumulada del 81,69%. Se presenta un atraso del 17% en el avance físico debido a que han persistido los retrasos en el suministro e instalación del pavimento asfáltico por parte de las empresas ALFONSO SARMIENTO y SANTA HELENA), las cuales son las empresas que realizan el suministro e instalación de la carpeta asfáltica del sector de Palmarito y/o Caño Flores. Sin embargo, el Contratista de obra mediante oficio **CSVF-1158-2024** realiza la entrega del Plan de Contingencia (31 de diciembre de 2019) donde se enmarcarán las acciones a mitigar el retraso en la programación de obra.
- Durante el periodo del presente informe se aprueba por parte del Instituto Nacional de Vías INVIAS y la Alcaldía Municipal de Fortul el adicional de plazo, por un periodo de diecisiete (17) días, que cubran la ejecución durante el mes de diciembre del presente año hasta el día 31, para los contratos de Obra e Interventoría. Sin embargo, el Contratista de obra mediante oficio **CSVF-1168-2024** solicita ante la Interventoría para su análisis, verificación, y si procede aprobación a la solicitud de adicional de plazo, por un periodo de SESENTA (60) días, la cual es avalada por la Interventoría y radicada ante la Alcaldía Municipal de Fortul y el Instituto Nacional de Vías INVIAS, así mismo la Interventoría realiza mediante oficio **CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-173** la solicitud de prórroga No 03 para el Contrato 4763 DE 2023, por dos (2) meses, es decir hasta el 28 de Febrero de 2025.
- Como recomendación por esta Interventoría para próximos proyectos se debe tener en cuenta la construcción de cunetas perimetrales para el drenaje y subdrenaje de las carreteras y protegerlas contra el efecto adverso de las aguas de escorrentía superficiales. Además, protegen también los bordes de la berma y los taludes del terraplén de la erosión causada por el agua lluvia, además de servir, en muchas ocasiones, para continuar las cunetas de corte hasta una corriente natural, en la cual entregar.

- En el Sector de Palmarito se terminaron todas las actividades de instalación de mezcla asfáltica quedando pendiente la terminación de la línea de demarcación con pintura en frío, ya que las líneas de demarcación con pintura en frío que se apliquen sobre concreto asfáltico deberán ser pintadas como mínimo treinta (30) días después de construida la carpeta de rodadura, por tal razón estas líneas de demarcación serán aplicadas a finales del mes de enero de 2025.
- Durante el periodo del presente informe se realizaron cuatro (04) comités de obra donde se realizó el seguimiento del avance de las actividades de obra, se aclararon las dudas y recomendaciones entre las partes para el buen desarrollo de la obra.
- La Interventoría viene cumpliendo con sus funciones de supervisar, vigilar, controlar y coordinar la ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar al Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y la Alcaldía de Fortul, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de obra, especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecución física y de inversiones (cronograma de actividades del contrato) así como también por el control técnico, administrativo, financiero y ambiental de acuerdo con la naturaleza del contrato. Por otra parte, está cumpliendo con la entrega de los informes semanales y mensuales donde se está evidenciando el control integral al avance y ejecución del contrato de obra, así como la realización de las actas de comité de seguimiento al Contrato de obra y las diferentes reuniones con la comunidad.

8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
COMUNICACIÓN	FECHA	ASUNTO	ENTIDAD	FIRMA
CSVF-1159-2024	7-dic-24	Entrega de Documentación Maquinaria de Asfalto	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1160-2024	9-dic-24	Entrega formal de los informes del trimestre No 03 del Contrato de obra No 016 de 2023	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1161-2024	10-dic-24	Entrega de Documentación	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1162-2024	11-dic-24	Entrega de Planillas de pago de seguridad social	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1164-2024	11-dic-24	Entrega de Planilla de pago de seguridad social	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1166-2024	17-dic-24	pólizas actualizadas según prórroga No.001	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1167-2024	17-dic-24	Relación de personal	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1152-2024	19-dic-24	Entrega de Informe mensual SST – abril, mayo y junio.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1168-2024	18-dic-24	Solicitud de adicional de Plazo No. 03	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1169-2024	26-dic-24	Entrega de Informe Preliminar SST– Mes de diciembre de 2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	ENTIDAD	DIRIGIDO A
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-149	2-dic-24	Entrega de Informe Mensual de Noviembre de 2024 Documentos soporte de acta de costos No.10	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-150	2-dic-24	Novedad de ATS e inspecciones preoperacionales	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-151	4-dic-24	Respuesta Oficio Nro.CSVF-1157-2024 del 03 de diciembre de 2024 - Entrega Plan de Inversión Ambiental N°1.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-152	4-dic-24	Respuesta Radicado: 2024S-VBOG-088908.	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Argüello
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-153	4-dic-24	Informe Trimestral Componente Social no. 3.	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Argüello
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-154	4-dic-24	retiración de observaciones.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-155	5-dic-24	reajustes a las novedades de la seguridad social	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-156	6-dic-24	PLAN DE CONTINGENCIA – PROYECCIÓN 31 DE DICIEMBRE - CONTRATO 016 DE 2023	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	ENTIDAD	DIRIGIDO A
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-157	9-dic-24	Entrega de Acta de Comité No 29	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-158	9-dic-24	Entrega Informe Semanal No 42	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-159	7-dic-24	Entrega informe ambiental trimestral N°3 periodo septiembre - noviembre 2024	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Argüello
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-160	9-dic-24	Entrega informes ambientales actualizados marzo a noviembre 2024.	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-161	9-dic-24	Reiteración de solicitud de documentación.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-162	10-dic-24	Observaciones y recomendaciones (Demarcación horizontal)	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-163	10-dic-24	solicitud de seguridad social del mes de noviembre.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-164	16-dic-24	Respuesta Radicado: 2024S-VBOG-094648.	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Argüello
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-165	16-dic-24	Entrega Informe Semanal No 43	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-166	17-dic-24	Entrega de pólizas	INVIAS	Dra. Patricia Inés Morales Padrón
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-167	17-dic-24	Entrega Prorroga Contrato Obra No 016 de 2023 Municipio Fortul Arauca	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-168	17-dic-24	ENTREGA DE PRÓRROGA No 02 Contrato de Interventoría No. 4763 de 2023	Municipio de Fortul, Secretaria de Planeación Municipal	Ing. Wilmer Riatiga Ocampo
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-169	17-dic-24	ENTREGA DE PÓLIZAS N ACTUALIZADAS CTO OBRA No. 016 de 2023 FORTUL	Municipio de Fortul, Secretaria de Planeación Municipal	Ing. Wilmer Riatiga Ocampo
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-170	17-dic-24	ENTREGA DE PÓLIZAS N ACTUALIZADAS CTO OBRA No. 016 de 2023 FORTUL	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-171	18-dic-24	AVAL SOLICITUD DE PRORROGA CSVF-1168-2024 CTO 016 DE 2023	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-172	18-dic-24	Entrega de Acta de Comité No 31	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-173	18-dic-24	.SOLICITUD DE PRÓRROGA No 03 CTO 4763 DE 2023	INVIAS	Ing. Oscar Rodolfo Acevedo Castro
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-174	19-dic-24	Observaciones No Recibo Estabilización Material con sales Inorgánicas y Mezcla asfáltica Instalada	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-175	21-dic-24	Solicitud de seguridad social del mes de noviembre y ajustes AIU.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-176	21-dic-24	Entrega Informe Semanal No 44	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE LAS OBRAS

TRAMO 1 CAÑO FLORES



Figura 1. 4/12/2024 Instalación de Geotextil y Conformación de capa estabilizada con sales inorgánicas (k0+820-K1+230) Carril derecho y (k0+535-K1+220) Carril Izquierdo.



Figura 2. 11/12/2024 Instalación de Geotextil y Conformación de capa estabilizada con sales inorgánicas (K1+220 - k1+600) Carril derecho e Izquierdo.



Figura 3. 12/12/2024. Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-57 (anteriormente crl-1) k0+000 - k0+180 Carril derecho e izquierdo.



Figura 4. 18/12/2024. Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 - compra de mezcla k0+000 - k0+180 Carril derecho e izquierdo.



Figura 5. 20/12/2024. Instalación de Geotextil y Conformación de capa estabilizada con sales inorgánicas (k1+600-K1+985) Carril derecho e izquierdo y (k2+845-K3+015) Carril derecho e Izquierdo.



Figura 6. 20/12/2024. Instalación de Geotextil y Conformación de capa estabilizada con sales inorgánicas (k1+600-K1+985) Carril derecho e izquierdo y (k2+845-K3+015) Carril derecho e Izquierdo.

TRAMO 2 PALMARITO



Figura 1. 5/12/2024. Instalación de señalización vertical.

Figura 2. 11/12/2024. Demarcación horizontal k0+100 hasta k4+040.



Figura 3. 14/12/2024. Imprimación y Aplicación de MDC-19, k4+840-k5+600 (Carril derecho) y k4+848 - k5+382 (carril izquierdo).

Figura 4. 17/12/2024. Imprimación y Aplicación de MDC-19, k4+840-k5+600 (Carril derecho) y k4+848 - k5+382 (carril izquierdo).



Figura 5. 20/12/2024. Imprimación y Aplicación de MDC-19, k5+382 - K5+656 (carril izquierdo).

Figura 6. 20/12/2024 Imprimación y Aplicación de MDC-19, k5+382 - K5+656 (carril izquierdo).

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES- SST

✓ GESTIÓN AMBIENTAL

Registro fotográfico diciembre 2024	
CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL	
	
	
Jornadas de sensibilización ambiental	
MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	
	



Materiales de construcción en frentes de obra.

SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES



Señalización en obra

SUMINISTRO DE AGUA Y HUMECTACIÓN EN OBRA



Humectación en obra y captación de aguas.

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CANTIDADES GENERADAS (ORDINARIOS, RECICLABLES, PELIGROSOS)



Recolección y separación de residuos sólidos.

LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS.



✓ **GESTIÓN SOCIAL**

Contrato de obra No 016 de 2023

Registro fotográfico diciembre

SOCIALIZACIONES CON LA COMUNIDAD



Capacitación a personal operativo

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD



Oficina de Atención e instalación de cartelera informativa
CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA



Reunión Veedurías Ciudadanas

INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DE TRANSVERSALIZACIÓN



Capacitación con Comunidad de Palmarito

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Anexo AD. Se adjunta copia de la bitácora de los siguientes sectores, respetivamente:

- **Tramo 1:** Caño Flores a Sitio nuevo.
- **Tramo 2:** La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.

8.5 FORMATOS

ANEXOS		
A	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	Informe Semanal
B	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
C	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra
D	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
E	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	Estado General del Tiempo
F	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	Resumen Ensayos de Laboratorio
G	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
H	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
I	MEPI-MN-IN-2-FR-1	Plan de inversión de anticipo de obra
J	MEPI-MN-IN-2-FR-2	Seguimiento a la Inversión del Anticipo
k		Seguimiento programa de obra
L	MEPI-MN-IN-6-FR-1	Programa de Inversión o reprogramación obra
M	MEPI-MN-IN-6-FR-2	Seguimiento Programa de Inversiones
N	MEPI-MN-IN-14-FR-1	Actas de Comité de Obra
O	MEPI-MN-IN-14-FR-2	Actas de Reunión
P		Informes especialistas y profesionales
Q		Informe del Programa Anual de Caja - PAC
R		Informe matriz de riesgos.
S		Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría
T		Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.
U	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría
V	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
W	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
X	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
Y	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría
Z	MEPI-MN-IN-3-FR-1	Plan de inversión del anticipo de interventoría
AA	MEPI-MN-IN-3-FR-2	Seguimiento al plan de inversión del anticipo
AB	MEPI-MN-IN-9-FR-2	Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado
AC	MEPI-MN-IN-9-FR-3	Seguimiento al Plan de Cargas
AD		Copia bitácora

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.4763 DE 2023 INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No.10 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</p>	
---	--	---

ANEXO A

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Informes Semanales

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-3																																																
			VERSIÓN	1																																																
			PÁGINA																																																	
			FECHA	5/12/2024 (Día / Mes / Año)																																																
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																				
PROYECTO: VIAS FORTUL																																																				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE		SEMANA No.: 41 del 29/11/2024 al 5/12/2024. Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)																																																
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS																																																		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.																																																				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): Mejoramiento y construcción de pavimento flexible en el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES a SITIO NUEVO.																																																				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Para el tramo 1"Caño Flores": Se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 2,86 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1,00 m a cada costado, también se contempla la construcción de estructuras de drenaje en el tramo de vía a intervenir (Box Culvert y alcantarillas). Con el contrato adicional No. 001. se aumenta el alcance en 930 m y 4 obras de drenaje adicionales. Para el tramo 2 "Palmarito" se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,4 km, iniciando en K0+000 AL K7+400, con una sección un ancho de vía de 6,0 m, bermas de 0,50 m a cada costado, se contempla el aprovechamiento de 5 obras existentes requeridas para el tramo de vía a intervenir (Box Culvert), y 2 estructuras proyectadas en el tramo de vía a intervenir, (Box Culvert y alcantarillas). Según otro SI Modificatorio No. 003 se establece la construcción de 14 obras de drenaje nuevas en su totalidad y la demolición de las estructuras existentes, Sin embargo se redujo el alcen de MDC-19 hasta absc k6+740. Con el contrato adicional No. 001 se establece que el alcance de MDC-19 hasta k7+400.																																																				
CONTRATO DE OBRA:CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																				
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON																																																		
INTEGRANTES: CONYCA SOLUCIONES SAS (78%), CONSTRUCTORA INSUR LTDA (2%), HD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS (10%), VANUR SAS (10%)		INTEGRANTES: SADING GROUP SAS (50%), GRUPO INTECON SAS (50%)																																																		
CONTRATO No. 016 DE 2023	VALOR INICIAL: \$ 23.137.768.645,10	CONTRATO No. 4763 DE 2023	VALOR INICIAL: \$ 1.856.588.140,00																																																	
FECHA DE INICIO: 21/12/2023	VALOR ADICIONES: \$ 4.895.000.000,00	FECHA DE INICIO: 14/12/2023	VALOR ADICIONES: \$ -																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 21/3/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 28.032.768.645,10	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ -																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/12/2024	\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/12/2024	VALOR ANTICIPO: \$ -																																																	
	\$ -		VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																	
	\$ -		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																				
CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX																																																
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 23.137.768.645	\$ 4.895.000.000																																																	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 23.137.768.645																																																		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.856.588.140																																																		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 1.856.588.140																																																		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																				
<table><tr><td colspan="2">OBRA</td><td colspan="2">INTERVENTORÍA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$ 27.796.510.491</td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 1.597.529.341</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ 27.672.301.844</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 1.597.529.341</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ 20.792.505.744</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ (6.879.796.099)</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA</td><td>\$ 43.176.469</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ 233.258.153.80</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 43.176.469</td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 27.672.301.844</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 20.792.505.744</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ (6.879.796.099)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 851.596.796</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 1.402.203.625</td><td></td><td></td></tr></table>					OBRA		INTERVENTORÍA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 27.796.510.491	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 1.597.529.341	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 27.672.301.844	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 1.597.529.341	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 20.792.505.744			AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ (6.879.796.099)	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	\$ 43.176.469	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 233.258.153.80	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 43.176.469	(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 27.672.301.844			TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 20.792.505.744			AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ (6.879.796.099)			INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 851.596.796			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1.402.203.625		
OBRA		INTERVENTORÍA																																																		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 27.796.510.491	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 1.597.529.341																																																	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 27.672.301.844	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 1.597.529.341																																																	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 20.792.505.744																																																			
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ (6.879.796.099)	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	\$ 43.176.469																																																	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 233.258.153.80	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 43.176.469																																																	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																																																				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 27.672.301.844																																																			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 20.792.505.744																																																			
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ (6.879.796.099)																																																			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 851.596.796																																																			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1.402.203.625																																																			
<table><tr><td colspan="2">SI</td><td colspan="2">NO</td></tr><tr><td colspan="2">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td colspan="2">x</td></tr><tr><td colspan="4">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td></tr><tr><td colspan="4">PERIODO FACTURADO:</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR FACTURA: \$ -</td></tr><tr><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones:</td></tr></table>					SI		NO		RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				PERIODO FACTURADO:				VALOR FACTURA: \$ -				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Observaciones:																							
SI		NO																																																		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x																																																		
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																				
PERIODO FACTURADO:																																																				
VALOR FACTURA: \$ -																																																				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																				
Observaciones:																																																				
<table><tr><td colspan="2">SI</td><td colspan="2">NO</td></tr><tr><td colspan="2">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td colspan="2">x</td></tr><tr><td colspan="4">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td></tr><tr><td colspan="4">PERIODO FACTURADO:</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR FACTURA: \$ -</td></tr><tr><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones:</td></tr></table>					SI		NO		RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				PERIODO FACTURADO:				VALOR FACTURA: \$ -				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Observaciones:																							
SI		NO																																																		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x																																																		
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																				
PERIODO FACTURADO:																																																				
VALOR FACTURA: \$ -																																																				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																				
Observaciones:																																																				



ANTICIPOS	
Otorgado \$	11.568.884.300
Amortizado \$	3.225.990.286,73
Saldo \$	

INDICADOR IIC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 98% Avance o Atraso Físico % 31%
Meta Física Ejecutada % 67%

MAQUINARIA Y EQUIPO

PALMARITO										
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prealistamiento para ejecución de obra					Prog	100%				100,0%
					Ejec		100%			100,0%
Excavaciones	m3	6587,78			Prog		100%			100,0%
					Ejec		99%			99,0%
* Estructura de vía	m3 y m2	26902,1			Prog		100%			100,0%
		103600			Ejec		96%			96,0%
* Obras de drenaje	m3 y Kg	70,44			Prog		100%			100,0%
		12703,7			Ejec		95%			95,0%
Señalización vertical y demarcación vial	Km y Un	35			Prog		100%			100,0%
		22200			Ejec		100%			100,0%
Actividades de caracterización vial	Km	7,4			Prog		100%			100,0%
					Ejec		0%			0,0%
* Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog		93%			93,0%
					Ejec		0%			0,0%
CANO FLORES										
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prealistamiento para ejecución de obra					Prog	100%				100,0%
					Ejec	100%				100,0%
Excavaciones y llenos	m3	40652,5			Prog	100%				100,0%
					Ejec	99%				99,0%
* Estructura de pavimento	m3 y m2	8644,61			Prog	100%				100,0%
		54626			Ejec	13%				13,0%
* Señalización	Un y m	1098			Prog	73%				73,0%
		11880			Ejec	0%				0,0%
Obras de drenaje	Kg y m3	13660,8			Prog	100%				100,0%
		523,41			Ejec	100%				100,0%
Movimiento Red eléctrica	Und y m3	18			Prog	100%				100,0%
		1,8			Ejec	100%				100,0%
Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog	93%				93,0%
					Ejec	0%				0,0%
* Actividades de caracterización vial	Km	2,8			Prog	87%				87,0%
					Ejec	0%				0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto (1 bulto)	2	2
Camioneta	2	2
Carro tanque de agua (1000 gl)	2	1
Motoniveladora 215 HP o similar	2	1
Vibrocompactador 153 HP o similar	2	1
Carro tanque irrigador de asfalto	2	2
Retroexcavadora	2	2
Compactador manual	2	2
Compactador de rodillo	2	2
Total		


Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: Vereda Puerto Arturo, Municipio de Saravena, Departamento de Arauca</div> <div>UBICACIÓN:</div>	<div>DISPONIBLE</div> <div>PERMISO MINERO: SI x NO LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO</div> <div>PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</div>	<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <div>ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A x</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A x</div> <div>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI x NO N/A</div> <div>CONCESIÓN DE AGUAS: SI x NO N/A</div> <div>Ocupación de CAUCES: SI x NO N/A</div> <div>VERTIMIENTOS: SI NO N/A x</div> <div>EMISIONES: SI NO N/A x</div> <div>OTROS (Especificar cual) SI NO N/A x</div>
<div>OBSERVACIONES:</div> <div>A la fecha el contrato cuenta con la actualización del permiso único ambiental el cual contempla ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y concesión de aguas, RESOLUCIÓN 700.36.24-0055 17 de JUNIO de 2024 " Por medio de la cual se prorroga el término de vigencia de la RESOLUCIÓN 700.36.24-0013 de 16 de febrero de 2024", esta prórroga se da por un periodo de 6 meses 13 días.</div> <div>Resolución No 700.36.24.0109 del 10 de octubre de 2024, por medio de la cual se aclara y modifica la resolución No 700.36.24.0013 del 16 de febrero de 2024, con relación al otro modificatorio del 08 de agosto de 2024</div> <div>Se está a la espera por parte del proyecto del permiso que autoriza realizar las obras en el tramo adicional en el sector caño flores.</div>		
<div>ESTADO: Se entrega por parte del contratista el documento paga de obra para revisión y aprobación por parte de la interventoría.</div> <div>.....</div>		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-3																				
			VERSIÓN	1																				
			PÁGINA																					
V. GESTIÓN SOCIAL																								
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>80</td><td>16</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>69</td><td>13</td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td>11</td><td>3</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td>32</td><td>4</td></tr></table>			OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	80	16	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	69	13	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	3	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	32	4	<table><tr><td>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</td><td>1</td></tr><tr><td>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td><td>0</td></tr><tr><td>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td><td>Centro Poblado Palmarito</td></tr></table>		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Centro Poblado Palmarito
	OBRA	INTER																						
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	80	16																						
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	69	13																						
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	3																						
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	32	4																						
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1																							
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0																							
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Centro Poblado Palmarito																							
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 96		<div>OBSERVACIONES: El jueves 28 de noviembre se realizó reunión informativa con la comunidad del sector de Caño Flores, funcionarios de la Alcaldía Municipal, personal de Interventoría y Contratista para informar sobre la adición realizada al contrato, así como las actividades realizadas durante el mes de noviembre. Se elaboró y entregó el informe mensual con anexos.</div>																						
VI. GESTIÓN PREDIAL																								
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A AVALÚOS APROBADOS: 0 PREDIOS ADQUIRIDOS: 0		<div>OBSERVACIONES: Este programa no aplica para este proyecto</div>																						
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																								
Dentro del presupuesto de obra y del proyecto no se encuentran rubros establecidos para el componente de sostenibilidad.																								
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																								
<p>TRAMO 1 (Caño Flores): Actividades 1.1.2.3 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares absicbas K0+780 - K0+820 Carril derecho y K0+180 - K0+535 Carril izquierdo ; 1.1.2.3 Estabilización química de terraplén y/o subrasante con sal inorgánica bsicbas K0+780 - K0+820 Carril derecho y K0+180 - K0+535 Carril izquierdo. se realizó chequeo de niveles topográficos de cereo de terraplén para la posterior colocación de geotextil. Desde el componente social se realizó reunión informativa con la comunidad acerca de la adición del contrato y las actividades realizadas en el mes de noviembre. TRAMO 2 (Palmarito): ; 2.5 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-5 k6+850 -k6+426 (Carril derecho) y k6+850 -k6+110 (Carril izquierdo) ; 2.6 Mezcla Densa en Caliente MDC-19 k6+850 -k6+426 (Carril derecho) y k6+850 -k6+110 (Carril izquierdo) . Se ejecutaron actividades de cereo de base granular para posteriormente realizar imprimación . Desde el componente ambiental para esta semana se reporta la siguiente información: se solicita por parte de la interventoría la entrega del plan de inversión ambiental con fecha perentoria, este es remitido de manera extemporánea por el contratista el día 3 de noviembre, se revisa y aprueba por la interventoría el miércoles 4 de diciembre y finalmente es radicado al INVIAS. Se realiza revisión del informe del mes de noviembre se espera que para el día 6 se encuentre completo por parte del contratista, de esta forma se inicia con el diligenciamiento por parte de la interventoría del informe mensual y el informe trimestral 3. Se continua a la espera por parte de la interventoría que se defina desde el contratista la fecha de inicio de las actividades de compensación, es de tener en cuenta que se han realizado múltiples llamados de atención y requerimientos desde la interventoría con relación a este tema, a la fecha a vísperas de la culminación del proyecto no se ha dado una respuesta a esta situación.</p> <p>Se acompaña comité de obra.</p> <p>Se evidencia en campo instalación de señalización y jornadas de orden y aseo realizadas por el contratista.</p> <p>Se recopila información se inicia construcción del informe mensual y el informe trimestral 3</p>																								
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																								
Se continuará con las actividades de instalación de riego de imprimacion y mezcla densa en caliente MDC-19 , excavación mecánica en material común, construcción de terraplén (arena limosa), concreto simple resistencia 17 Mpa, concreto de 21 Mpa para obras de drenaje transversal, verificación de niveles por parte de la comisión topográfica, instalación de base granular clase B gradación fina para donde se requiera según cereo , corte, figurado y traslado de acero para amarrado en el punto de ubicación de las obras de drenaje transversal. se iniciarán actividades de estructura de pavimento en caño flores. Se realiza requerimientos al contratista en relación a las actividades dentro del componente ambiental que a la fecha no se han cumplido, seguimiento y verificación de los compromisos establecidos dentro del permiso único ambiental. Desde el componente social se realizará reunión con las veedurías y capacitación a personal de obra.																								
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																								
<div><div><div>Programado</div><div>Ejecutado</div></div><div><div><div>TRAMO 1 CAÑO FLORES</div><div><div>K0+000 AL K3+790</div><div>K0+000 AL K3+790</div><div>K0+000 AL K3+790</div><div>K0+000 AL K3+790</div></div><div><div>K0+000 - K0+120; K1+120 - K1+320</div><div>K2+860 A LA K3+790</div><div>K3+045.k3+245.k3+345+k3+645 (Alcantarilla)</div><div>K3+045.k3+245.k3+345+k3+645 (Alcantarilla)</div></div><div><div>Terraplén</div><div>K0+000 AL K7+400</div></div></div><div><div>TRAMO 2 PALMARITO</div><div><div>K0+000 AL K7+400</div><div>K0+000 AL K7+400</div><div>K0+000 AL K7+400</div><div>K0+000 AL K7+400</div><div>K0+000 AL K7+400</div><div>K0+000 AL K7+400</div><div>K0+040 AL K3+850</div></div><div><div>K0+000 al K7+400</div><div>K0+000 a K7+400</div><div>K0+040 AL K3+850</div></div></div><div><div>Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales</div><div>Excavación mecánica</div><div>Obras de drenaje</div><div>Geotextil</div><div>Sub-base</div><div>Base</div><div>Pavimento flexible</div><div>Vía existente sin intervenir</div></div></div><p>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPH-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.</p></div>																								
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																								
<div><div><p>Instalación de Geotextil y Conformación de capa estabilizada con sales inorgánicas (k0+00-K0+180) Carril derecho e Izquierdo. (Tramo 1)</p></div><div><p>Instalación de Geotextil y Conformación de capa estabilizada con sales inorgánicas (k0+820-K1+230) Carril derecho y (k0+535-K1+220) Carril Izquierdo. (Tramo 1)</p></div><div><p>Instalación de Geotextil y Conformación de capa estabilizada con sales inorgánicas (k0+820-K1+230) Carril derecho y (k0+535-K1+220) Carril Izquierdo. (Tramo 1)</p></div><div><p>Jornadas de orden y aseo frentes de obra.</p></div><div><p>Señalización de frentes de obra activos</p></div></div>																								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CODIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3																																																																																																																														
			VERSIÓN	1																																																																																																																														
			PÁGINA																																																																																																																															
			FECHA	12/12/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																																																														
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																		
PROYECTO: VIAS FORTUL																																																																																																																																		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 43 del 6/12/2024 al 12/12/2024 Último Informe Semanal Si (Numeración consecutiva)																																																																																																																																		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS.																																																																																																																																		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.																																																																																																																																		
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): Mejoramiento y construcción de pavimento flexible en el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES a SITIO NUEVO.																																																																																																																																		
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Para el tramo 1 "Caño Flores": Se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 2,86 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1,00 m a cada costado, también se contempla la construcción de estructuras de drenaje en el tramo de vía a intervenir (Box Culvert y alcantarillas). Con el contrato adicional No. 001 se aumenta el alcance en 930 m y 4 obras de drenaje adicionales. Para el tramo 2 "Palmarito" se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,4 km, iniciando en K0+00 AL K7+400, con una sección un ancho de vía de 6,0 m, bermas de 0,50 m a cada costado, se contempla el aprovechamiento de 5 obras existentes requeridas para el tramo de vía a intervenir (Box Culvert), y 2 estructuras proyectadas en el tramo de vía a intervenir, (Box Culvert y alcantarillas). Según otro Si Modificatorio No. 003 se establece la construcción de 14 obras de drenaje nuevas en su totalidad y la demolición de las estructuras existentes, Sin embargo se redujo el alcen de MDC-19 hasta absc k6+740. Con el contrato adicional No. 001 se establece que el alcance de MDC-19 hasta k7+400.																																																																																																																																		
CONTRATO DE OBRA:CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																																		
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL			INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON																																																																																																																															
INTEGRANTES: CONYCA SOLUCIONES SAS (78%), CONSTRUCTORA INSUR LTDA (2%), HD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS (10%), VANUR SAS (10%)			INTEGRANTES: SADING GROUP SAS (50%), GRUPO INTECON SAS (50%)																																																																																																																															
CONTRATO No. 016 DE 2023			CONTRATO No. 4763 DE 2023																																																																																																																															
FECHA DE INICIO: 21/12/2023			FECHA DE INICIO: 14/12/2023																																																																																																																															
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 21/3/2024			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023																																																																																																																															
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/12/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/12/2024																																																																																																																															
VALOR INICIAL: \$ 23.137.768.645,10			VALOR INICIAL: \$ 1.856.588.140,00																																																																																																																															
VALOR ADICIONES: \$ 4.895.000.000,00			VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																															
VALOR ACUMULADO: \$ 28.032.768.645,10			VALOR ACUMULADO: \$ -																																																																																																																															
			VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																															
			VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																																															
			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																															
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																		
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																		
CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX																																																																																																																													
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 23.137.768.645	\$ 4.895.000.000																																																																																																																															
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																																	
INTERVENTORIA	SALDO DE VIGENCIA	\$ 23.137.768.645																																																																																																																																
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.856.588.140																																																																																																																																
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																																																																																																	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 1.856.588.140																																																																																																																																
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																																		
<table><tr><td colspan="3">OBRA</td><td colspan="3">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$</td><td>27.796.510.491</td><td></td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 1.640.705.810</td><td>88%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>22.753.175.580</td><td>81,18%</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 1.640.705.810</td><td>88%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>21.251.462.764</td><td>75,82%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>(1.501.712.815)</td><td>-5,4%</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 43.176.469</td><td>2%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$</td><td>233.258.153,80</td><td></td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 43.176.469</td><td>2%</td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>22.753.175.580</td><td>81,18%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>21.251.462.764</td><td>75,82%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>(1.501.712.815)</td><td>-5,36%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>1.672.644.530</td><td>5,97%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>458.967.020</td><td>1,64%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">RÁDICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td>SI NO</td><td colspan="2">SI NO</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td colspan="3">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td></tr><tr><td colspan="3">PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="3">PERIODO FACTURADO:</td></tr><tr><td colspan="3">VALOR FACTURA: \$</td><td colspan="3">VALOR FACTURA: \$</td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones:</td><td colspan="3">Observaciones:</td></tr></table>						OBRA			INTERVENTORIA			VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	27.796.510.491		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 1.640.705.810	88%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	22.753.175.580	81,18%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 1.640.705.810	88%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	21.251.462.764	75,82%				AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(1.501.712.815)	-5,4%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 43.176.469	2%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	233.258.153,80		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 43.176.469	2%	(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)							TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	22.753.175.580	81,18%				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	21.251.462.764	75,82%				AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(1.501.712.815)	-5,36%				INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	1.672.644.530	5,97%				INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	458.967.020	1,64%				RÁDICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO	SI NO								No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			PERIODO FACTURADO:			PERIODO FACTURADO:			VALOR FACTURA: \$			VALOR FACTURA: \$			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones:			Observaciones:		
OBRA			INTERVENTORIA																																																																																																																															
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	27.796.510.491		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 1.640.705.810	88%																																																																																																																												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	22.753.175.580	81,18%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 1.640.705.810	88%																																																																																																																												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	21.251.462.764	75,82%																																																																																																																															
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(1.501.712.815)	-5,4%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 43.176.469	2%																																																																																																																												
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	233.258.153,80		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 43.176.469	2%																																																																																																																												
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																																																																																																																																		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	22.753.175.580	81,18%																																																																																																																															
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	21.251.462.764	75,82%																																																																																																																															
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(1.501.712.815)	-5,36%																																																																																																																															
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	1.672.644.530	5,97%																																																																																																																															
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	458.967.020	1,64%																																																																																																																															
RÁDICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO	SI NO																																																																																																																														
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																																																																																															
PERIODO FACTURADO:			PERIODO FACTURADO:																																																																																																																															
VALOR FACTURA: \$			VALOR FACTURA: \$																																																																																																																															
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																																															
Observaciones:			Observaciones:																																																																																																																															
<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td><td>INDICADOR IIC</td><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>11.568.884.300</td><td>En el mes:</td><td>Otorgado \$</td><td></td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>3.225.990.286,73</td><td>Acumulado:</td><td>Amortizado \$</td><td></td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td></td><td></td><td>Saldo \$</td><td></td></tr></table>						ANTICIPOS		INDICADOR IIC	ANTICIPOS		Otorgado \$	11.568.884.300	En el mes:	Otorgado \$		Amortizado \$	3.225.990.286,73	Acumulado:	Amortizado \$		Saldo \$			Saldo \$																																																																																																										
ANTICIPOS		INDICADOR IIC	ANTICIPOS																																																																																																																															
Otorgado \$	11.568.884.300	En el mes:	Otorgado \$																																																																																																																															
Amortizado \$	3.225.990.286,73	Acumulado:	Amortizado \$																																																																																																																															
Saldo \$			Saldo \$																																																																																																																															
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																		
Meta Física Programada % 84% Avance o Atraso Físico % 8%																																																																																																																																		
Meta Física Ejecutada % 76%																																																																																																																																		



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prelistamiento para ejecución de obra					Prog		100%			100.0%
					Ejec		100%			100.0%
Excavaciones	m3	6587,78			Prog		100%			100.0%
					Ejec		99%			99.0%
Estructura de vía	m3 y m2	26902.1			Prog		97%			97.0%
		103600			Ejec		96%			96.0%
Obras de drenaje	m3 y Kg	70.44			Prog		100%			100.0%
		12703.7			Ejec		95%			95.0%
Señalización vertical y demarcación vial	Km y Un	35			Prog		0%			0.0%
		22200			Ejec		67%			67.0%
Actividades de caracterización vial	Km	7.4			Prog		100%			100.0%
					Ejec		0%			0.0%
Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog		93%			93.0%
					Ejec		0%			0.0%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prelistamiento para ejecución de obra					Prog	100%				100.0%
					Ejec	100%				100.0%
Excavaciones y llenos	m3	40652.5			Prog	100%				100.0%
					Ejec	99%				99.0%
Estructura de pavimento	m3 y m2	8644.61			Prog	51%				51.0%
		54626			Ejec	32%				32.0%
Señalización	Un y m	1098			Prog	0%				0.0%
		11880			Ejec	0%				0.0%
Obras de drenaje	Kg y m3	13660.8			Prog	100%				100.0%
		523.41			Ejec	100%				100.0%
Movimiento Red eléctrica	Und y m3	18			Prog	100%				100.0%
		1.8			Ejec	100%				100.0%
Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog	93%				93.0%
					Ejec	0%				0.0%
Actividades de caracterización vial	Km	2.8			Prog	87%				87.0%
					Ejec	0%				0.0%

TRAMO Y/O SECTOR 1:
 TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto (1 bulo)	2	2
Camioneta	2	2
Carotanque de agua (1000 gl)	2	1
Motoniveladora 215 HP o similar	2	1
Vibrocompactor 153 HP o similar	2	1
Carotanque irrigador de asfalto	2	2
Retrovacuadora	2	2
Compactor manual	2	2
Compactor de rodillo	2	2
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:	SI	x	NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
PERMISO MINERO:	SI		NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI	X	NO	N/A
OCCUPACION DE CAUCES:	SI	X	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISSIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

A la fecha el contrato cuenta con la actualización del permiso único ambiental el cual contempla ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y concesión de aguas, Resolución 700.36.24-0055 17 de junio de 2024 " Por medio de la cual se prorroga el término de vigencia de la Resolución 700.36.24-0013 de 16 de febrero de 2024", esta prórroga se da por un periodo de 6 meses 13 días.

Resolución No 700.36.24.0109 del 10 de octubre de 2024, por medio de la cual se aclara y modifica la resolución No 700.36.24. 0013 del 16 de febrero de 2024, con relación al otrosí modificatorio del 08 de agosto de 2024.

Resolución 700.36.24.0139 del 4 de diciembre de 2024 la cual aclarar y modificar el artículo primero de la Resolución No. 700 .36.24-0013 de fecha 16 de febrero de 2024 otorgada al municipio de Fortul, identificado con NIT. 800.136.069 -4, para la ocupación de cauce, concesión de aguas superficiales y permiso de aprovechamiento forestal único del proyecto.

ESTADO: Se entrega por parte del contratista el documento paga de obra para revisión y aprobación por parte de la interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	74	16
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	63	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	21	4

Nº. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

Nº. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

1
0
Centro Poblado Palmarito

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 90


VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES: Este programa no aplica para este proyecto

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL			CÓDIGO	MEPI-MN1-R-15-FR-3																																												
				VERSIÓN	1																																												
				PÁGINA																																													
FECHA					19/12/2024 (Día / Mes / Año)																																												
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																	
PROYECTO: VIAS FORTUL																																																	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE		SEMANA No.: 44 del 13/12/2024 al 19/12/2024. Último Informe Semanal Si (Numeración consecutiva)																																													
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS																																															
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.																																																	
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): Mejoramiento y construcción de pavimento flexible en el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES A SITIO NUEVO.																																																	
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Para el tramo 1 "Caño Flores": Se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 2,86 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1.00 m a cada costado, también se contempla la construcción de estructuras de drenaje en el tramo de vía a intervenir (Box Culvert y alcantarillas). Con el contrato adicional No. 001 se aumenta el alcance en 930 m y 4 obras de drenaje adicionales. Para el tramo 2 "Palmarito" se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,4 km, iniciando en K0+00 AL K7+400, con una sección un ancho de vía de 6.0 m, bermas de 0.50 m a cada costado, se contempla el aprovechamiento de 5 obras existentes requeridas para el tramo de vía a intervenir (Box Culvert), y 2 estructuras proyectadas en el tramo de vía a intervenir, (Box Culvert y alcantarillas). Según otro Si Modificatorio No. 003 se establece la construcción de 14 obras de drenaje nuevas en su totalidad y la demolición de las estructuras existentes, Sin embargo se redujo el alcen de MDC-19 hasta absc k6+740. Con el contrato adicional No. 001 se establece que el alcance de MDC-19 hasta k7+400.																																																	
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																														
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL			INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON																																														
INTEGRANTES: CONYCA SOLUCIONES SAS (78%), CONSTRUCTORA INSUR LTDA (2%), HD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS (10%), VANUR SAS (10%)			INTEGRANTES: SADING GROUP SAS (50%), GRUPO INTECON SAS (50%)																																														
CONTRATO No. 016 DE 2023			CONTRATO No. 4763 DE 2023																																														
FECHA DE INICIO: 21/12/2023			FECHA DE INICIO: 14/12/2023																																														
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 21/3/2024			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023																																														
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/12/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/12/2024																																														
VALOR INICIAL: \$ 23.137.768.645,10			VALOR INICIAL: \$ 1.856.588.140,00																																														
VALOR ADICIONES: \$ 4.895.000.000,00			VALOR ADICIONES: \$ -																																														
VALOR ACUMULADO: \$ 28.032.768.645,10			VALOR ACUMULADO: \$ -																																														
			VALOR ANTICIPO: \$ -																																														
			VALOR AMORTIZADO: \$ -																																														
			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																														
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																	
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																	
CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX																																												
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 23.137.768.645	\$ 4.895.000.000																																														
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 23.137.768.645																																															
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.856.588.140																																															
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA																																																
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 1.856.588.140																																															
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																	
<table><tr><td colspan="2">OBRA</td><td colspan="2">INTERVENTORÍA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$ 27.796.510.491</td><td>TOTAL INVERSIÓN</td><td>\$ 1.683.882.279</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ 25.320.403.000</td><td>PROGRAMADA:</td><td>\$ 1.683.882.279</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ 22.308.473.107</td><td>TOTAL INVERSIÓN</td><td>\$ 1.683.882.279</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ (3.011.929.893)</td><td>EJECUTADA:</td><td>\$ 1.683.882.279</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ 233.258.153,80</td><td>INVERSIÓN</td><td>\$ 43.176.469</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 25.320.403.000</td><td>PROGRAMADA EN LA</td><td>\$ 43.176.469</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 22.308.473.107</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA</td><td>\$ 43.176.469</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ (3.011.929.893)</td><td>EN LA SEMANA</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 2.567.227.420</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 1.057.000.343</td><td></td><td></td></tr></table>						OBRA		INTERVENTORÍA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 27.796.510.491	TOTAL INVERSIÓN	\$ 1.683.882.279	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 25.320.403.000	PROGRAMADA:	\$ 1.683.882.279	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 22.308.473.107	TOTAL INVERSIÓN	\$ 1.683.882.279	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ (3.011.929.893)	EJECUTADA:	\$ 1.683.882.279	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 233.258.153,80	INVERSIÓN	\$ 43.176.469	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 25.320.403.000	PROGRAMADA EN LA	\$ 43.176.469	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 22.308.473.107	INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 43.176.469	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ (3.011.929.893)	EN LA SEMANA		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 2.567.227.420			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1.057.000.343		
OBRA		INTERVENTORÍA																																															
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 27.796.510.491	TOTAL INVERSIÓN	\$ 1.683.882.279																																														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 25.320.403.000	PROGRAMADA:	\$ 1.683.882.279																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 22.308.473.107	TOTAL INVERSIÓN	\$ 1.683.882.279																																														
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ (3.011.929.893)	EJECUTADA:	\$ 1.683.882.279																																														
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 233.258.153,80	INVERSIÓN	\$ 43.176.469																																														
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 25.320.403.000	PROGRAMADA EN LA	\$ 43.176.469																																														
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 22.308.473.107	INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 43.176.469																																														
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ (3.011.929.893)	EN LA SEMANA																																															
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 2.567.227.420																																																
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1.057.000.343																																																
<table><tr><td colspan="2">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td colspan="2">SI</td><td colspan="2">NO</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">x</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td></tr><tr><td colspan="6">PERIODO FACTURADO:</td></tr><tr><td colspan="6">VALOR FACTURA: \$</td></tr><tr><td colspan="6">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="6">Observaciones:</td></tr></table>						RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI		NO				x				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:						PERIODO FACTURADO:						VALOR FACTURA: \$						(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						Observaciones:							
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI		NO																																													
		x																																															
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:																																																	
PERIODO FACTURADO:																																																	
VALOR FACTURA: \$																																																	
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																	
Observaciones:																																																	
<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td><td colspan="2">INDICADOR IIC</td><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>14.016.384.300</td><td>En el mes:</td><td></td><td>Otorgado \$</td><td></td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>7.817.727.223,85</td><td>Acumulado:</td><td></td><td>Amortizado \$</td><td></td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>6.198.657.076,15</td><td></td><td></td><td>Saldo \$</td><td></td></tr></table>						ANTICIPOS		INDICADOR IIC		ANTICIPOS		Otorgado \$	14.016.384.300	En el mes:		Otorgado \$		Amortizado \$	7.817.727.223,85	Acumulado:		Amortizado \$		Saldo \$	6.198.657.076,15			Saldo \$																					
ANTICIPOS		INDICADOR IIC		ANTICIPOS																																													
Otorgado \$	14.016.384.300	En el mes:		Otorgado \$																																													
Amortizado \$	7.817.727.223,85	Acumulado:		Amortizado \$																																													
Saldo \$	6.198.657.076,15			Saldo \$																																													
III. AVANCE FÍSICO																																																	
Meta Física Programada % 90% Avance o Atraso Físico % 13%																																																	
Meta Física Ejecutada % 77%																																																	



CÓDIGO	MEP+MNI-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

PALMARITO											
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	
Fase de prelistamiento para ejecución de obra					Prog		100%			100.0%	
					Ejec		100%			100.0%	
Excavaciones	m3	6587.78			Prog		100%			100.0%	
					Ejec		99%			99.0%	
Estructura de vía	m3 y m2	26902.1			Prog		97%			97.0%	
		103600			Ejec		96%			96.0%	
		70.44			Prog		100%			100.0%	
Obras de drenaje	m3 y Kg	12703.7			Ejec		95%			95.0%	
		35			Prog		0%			0.0%	
Señalización vertical y demarcación vial	Km y Un	22200			Ejec		67%			67.0%	
		7.4			Prog		100%			100.0%	
Actividades de caracterización vial	Km	7.4			Ejec		0%			0.0%	
Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog		93%			93.0%	
					Ejec		0%			0.0%	
CAÑO FLORES											
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	
Fase de prelistamiento para ejecución de obra					Prog		100%			100.0%	
					Ejec		100%			100.0%	
Excavaciones y llenos	m3	40652.5			Prog		100%			100.0%	
					Ejec		99%			99.0%	
Estructura de pavimento	m3 y m2	8644.61			Prog		51%			51.0%	
		54626			Ejec		32%			32.0%	
Señalización	Un y m	1098			Prog		0%			0.0%	
		11880			Ejec		0%			0.0%	
Obras de drenaje	Kg y m3	13660.8			Prog		100%			100.0%	
		523.41			Ejec		100%			100.0%	
Movimiento Red eléctrica	Und y m3	18			Prog		100%			100.0%	
		1.8			Ejec		100%			100.0%	
Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog		93%			93.0%	
					Ejec		0%			0.0%	
Actividades de caracterización vial	Km	2.8			Prog		87%			87.0%	
					Ejec		0%			0.0%	

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto (1 bullo)	2	2
Camioneta	2	2
Carro tanque de agua (1000 gl)	2	1
Motoniiveladora 215 HP o similar	2	1
Vibrocompactador 153 HP o similar	2	1
Carro tanque irrigador de asfalto	2	2
Retrosacavadora	2	2
Compactador manual	2	2
Compactador de rodillo	2	2
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
 TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

FUENTES DE MATERIALES

PERMISO MINERO: SI ☒ NO ☐

LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
---------------------	----	---	----

PERMISO MINERO: ☐ SI ☒ NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
1. ZONAS DE DEPOSITO				
2. ZONAS DE DEPOSITO				
3. ZONAS DE DEPOSITO				
4. ZONAS DE DEPOSITO				
5. ZONAS DE DEPOSITO				
6. ZONAS DE DEPOSITO				
7. ZONAS DE DEPOSITO				
8. ZONAS DE DEPOSITO				
9. ZONAS DE DEPOSITO				
10. ZONAS DE DEPOSITO				
11. ZONAS DE DEPOSITO				
12. ZONAS DE DEPOSITO				
13. ZONAS DE DEPOSITO				
14. ZONAS DE DEPOSITO				
15. ZONAS DE DEPOSITO				
16. ZONAS DE DEPOSITO				
17. ZONAS DE DEPOSITO				
18. ZONAS DE DEPOSITO				
19. ZONAS DE DEPOSITO				
20. ZONAS DE DEPOSITO				
21. ZONAS DE DEPOSITO				
22. ZONAS DE DEPOSITO				
23. ZONAS DE DEPOSITO				
24. ZONAS DE DEPOSITO				
25. ZONAS DE DEPOSITO				
26. ZONAS DE DEPOSITO				
27. ZONAS DE DEPOSITO				
28. ZONAS DE DEPOSITO				
29. ZONAS DE DEPOSITO				
30. ZONAS DE DEPOSITO				
31. ZONAS DE DEPOSITO				
32. ZONAS DE DEPOSITO				
33. ZONAS DE DEPOSITO				
34. ZONAS DE DEPOSITO				
35. ZONAS DE DEPOSITO				
36. ZONAS DE DEPOSITO				
37. ZONAS DE DEPOSITO				
38. ZONAS DE DEPOSITO				
39. ZONAS DE DEPOSITO				
40. ZONAS DE DEPOSITO				
41. ZONAS DE DEPOSITO				
42. ZONAS DE DEPOSITO				
43. ZONAS DE DEPOSITO				
44. ZONAS DE DEPOSITO				
45. ZONAS DE DEPOSITO				
46. ZONAS DE DEPOSITO				
47. ZONAS DE DEPOSITO				
48. ZONAS DE DEPOSITO				
49. ZONAS DE DEPOSITO				
50. ZONAS DE DEPOSITO				
51. ZONAS DE DEPOSITO				
52. ZONAS DE DEPOSITO				
53. ZONAS DE DEPOSITO				
54. ZONAS DE DEPOSITO				
55. ZONAS DE DEPOSITO				
56. ZONAS DE DEPOSITO				
57. ZONAS DE DEPOSITO				
58. ZONAS DE DEPOSITO				
59. ZONAS DE DEPOSITO				
60. ZONAS DE DEPOSITO				
61. ZONAS DE DEPOSITO				
62. ZONAS DE DEPOSITO				
63. ZONAS DE DEPOSITO				
64. ZONAS DE DEPOSITO				
65. ZONAS DE DEPOSITO				
66. ZONAS DE DEPOSITO				
67. ZONAS DE DEPOSITO				
68. ZONAS DE DEPOSITO				
69. ZONAS DE DEPOSITO				
70. ZONAS DE DEPOSITO				
71. ZONAS DE DEPOSITO				
72. ZONAS DE DEPOSITO				
73. ZONAS DE DEPOSITO				
74. ZONAS DE DEPOSITO				
75. ZONAS DE DEPOSITO				
76. ZONAS DE DEPOSITO				
77. ZONAS DE DEPOSITO				
78. ZONAS DE DEPOSITO				
79. ZONAS DE DEPOSITO				
80. ZONAS DE DEPOSITO				
81. ZONAS DE DEPOSITO				
82. ZONAS DE DEPOSITO				
83. ZONAS DE DEPOSITO				
84. ZONAS DE DEPOSITO				
85. ZONAS DE DEPOSITO				
86. ZONAS DE DEPOSITO				
87. ZONAS DE DEPOSITO				
88. ZONAS DE DEPOSITO				
89. ZONAS DE DEPOSITO				
90. ZONAS DE DEPOSITO				
91. ZONAS DE DEPOSITO				
92. ZONAS DE DEPOSITO				
93. ZONAS DE DEPOSITO				
94. ZONAS DE DEPOSITO				

LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
---------------------	----	----	-----	---

APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO	N/A
---------------------------	----	---	----	-----

CONCESION DE AGUAS:	SI	X	NO	N/A
OCUPACION DE CAUCES:	SI	XXXXXXXXXX	NO	N/A

VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
---------------	----	----	-----	---

EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especifícalos aquí)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: A la fecha el proyecto cuenta con tres (3) puntos para suministro de materiales, los cuales cuentan con los respectivos permisos ambientales, los sitios utilizados son:

1. Cantera trituradora del Sol S.A.S, Licencia ambiental: Resolución No 500.36.20.0928 del 21 de octubre de 2020.
2. Agregados y mezcla asfáltica "Rosa Blanca", Licencia ambiental: Resolución No 500.36.23.0236 del 07 de marzo de 2023.
3. Cantera pétreos del llano Licencia ambiental: Resolución No 500.41-16-0860 del 18 de julio de 2016

OBSERVACIONES:

A la fecha el contrato cuenta con la actualización del permiso único ambiental el cual contempla ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y concesión de aguas, Resolución 700.36.24-0055 17 de junio de 2024” Por medio de la cual se prorroga el término de vigencia de la Resolución 700.36.24-0013 de 16 de febrero de 2024”, esta prórroga se da por un periodo de 6 meses más.

Resolución No 700.36.24.0109 del 10 de octubre de 2024, por medio de la cual se aclara y modifica la resolución No 700.36.24. 0013 del 16 de febrero de 2024, con relación al otrosí modificatorio del 08 de agosto de 2024.

Resolución 700.36.24.0139 del 4 de diciembre de 2024 la cual aclarar y modificar el artículo primero de la Resolución No. 700.36.24.0013 de fecha 16 de febrero de 2024 otorgada al municipio de Fortul, identificado con NIT. 800.136.069-4, para la ocupación de cauce, concesión de aguas superficiales y permiso de aprovechamiento forestal único del proyecto.

ESTADO: Se entrega por parte del contratista el documento paga de obra para revisión y aprobación por parte de la interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 90

2

1

Centro Poblado Palmarito

OBSERVACIONES: Se realizaron las reuniones con las Veedurías de Palmarito y Caño Flores, el 11 y 12 de diciembre respectivamente, en dicho espacio se dialogó acerca de la gestión realizada, los compromisos faltantes y la importancia de cerrar la Veeduría en la Personería Municipal, una vez que se termine el proyecto. Por otro lado, se realizó capacitación al personal operativo en el sector de Caño Flores y a la comunidad en el sector de Palmarito.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: Este programa no aplica para este proyecto

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3</div> <div>VERSIÓN 1</div> <div>PÁGINA</div>		
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD				
Dentro del presupuesto de obra y del proyecto no se encuentran rubros establecidos para el componente de sostenibilidad.				
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
<p>TRAMO 1 (Caño Flores). Actividades 1.1.3.3 Riego de imprimación con emulsión asfáltica cri-57 (anteriormente cri-1) k0+000 - k0+180 Carril derecho e izquierdo - 1.1.3.4 Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 k0+000 - k0+180 Carril derecho e izquierdo - se realizó chequeo de niveles topográficos de cerro de terraplén para la posterior colocación de geotextil. Desde el componente social se realizó reunión con la Veeduría el 12 de diciembre, también se realizó capacitación al personal de obra. TRAMO 2 (Palmarito). 2.5 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-5 k4+840 -k5+600 (Carril derecho) y k4+848 -k5+832 (Carril izquierdo) ; 2.6 Mezcla Densa en Caliente MDC-19 k4+840 -k5+600 (Carril derecho) y k4+848 -k5+832 (Carril izquierdo) . Se ejecutaron actividades de cerreo de base granular para posteriormente realizar imprimación . Desde el Componente Social, se realizó capacitación en articulación con la Alcaldía Municipal a la comunidad sobre equidad de género, esto se desarrolló en el salón comunal el día 13 de diciembre.</p> <p>Desde el componente ambiental para esta semana se reporta la siguiente información: Desde la interventoría se realizan reunión vía telefónica con los profesionales en el área ambiental de Invias Bogotá dirección de sostenibilidad. Se contesta y aclara comunicado de invias en el cual se solicita dar claridad en relación con el plan de inversión ambiental del contrato y los permisos de los puntos de adquisición de materiales del proyecto. Se realiza recorridos en campo y verifica el estado de los frentes de obra. Se acompaña comente de obra en el cual se informa al contratista y municipio nuevamente que los tiempos para realiza la compensación del contratos según lo establecido dentro del permiso único ambiental ya no se pueden cumplir. Razón por la cual el plan de inversión ambiental queda en cero, una ves por parte del municipio y el contratista se dé la gestión del cambio de medida de compensación y esta se informe a la interventoría se procederá con la actualización de este documento en caso tal que exista adición de tiempo dentro del contrato y este tiempo cumpla con los plazos que se encuentren dentro de las especificaciones de las medidas compensatorias a realizar.</p>				
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
<p>Se continuará con las actividades de instalación de riego de imprimación y mezcla densa en caliente MDC-19, excavación mecánica en material común, construcción de terraplén (arena limosa), concreto simple resistencia 17 Mpa, concreto de 21 Mpa para obras de drenaje transversal, verificación de niveles por parte de la comisión topográfica, instalación de base granular clase B gradación fina para donde se requiera según cerreo , corte, figurado y traslado de acero para amarrado en el punto de ubicación de las obras de drenaje transversal. se iniciarán actividades de estructura de pavimento en caño flores. Se realiza requerimientos al contratista en relación a las actividades dentro del componente ambiental que a la fecha no se han cumplido, seguimiento y verificación de los compromisos establecidos dentro del permiso único ambiental. Desde el componente social se realizará cierre de las actas de vecindad del sector de Palmarito y se realizará entrega de volante sobre el cuidado de las obras en el sector de Caño Flores.</p>				
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS				
<p>TRAMO 1 CAÑO FLORES</p> <p>Programado: K0+000 AL K3+790</p> <p>Ejecutado: K0+000 - K0+120; K1+120 - K1+320</p> <p>TRAMO 2 PALMARITO</p> <p>Programado: K0+000 AL K7+400</p> <p>Ejecutado: K0+000 AL K7+400</p> <p>Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales</p> <p>Excavación mecánica</p> <p>Obras de drenaje</p> <p>Geotextil</p> <p>Sub-base</p> <p>Base</p> <p>Pavimento flexible</p> <p>Vía existente sin intervenir</p>				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
Riego de imprimación con emulsión asfáltica cri-57 (anteriormente cri-1) k0+000 - k0+180 Carril derecho e izquierdo (Tramo 1)	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 - compra de mezcla k0+000 - k0+180 Carril derecho e izquierdo (Tramo 1)	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19 - compra de mezcla k0+000 - k0+180 Carril derecho e izquierdo (Tramo 1)	Equipos y maquinaria frentes de obra.	Humectación de vías para evitar generación de material particulado.
				
Imprimación y Aplicación de MDC-19 , k4+840-k5+600 (Carril derecho) y k4+848 - k5+382 (carril izquierdo)	Imprimación y Aplicación de MDC-19 , k4+840-k5+600 (Carril derecho) y k4+848 - k5+382 (carril izquierdo)	Imprimación y Aplicación de MDC-19 , k4+840-k5+600 (Carril derecho) y k4+848 - k5+382 (carril izquierdo)	Ingreso de material frentes de obra.	Diligenciamiento de vitacora punto de captacion de agua.
<p>NOTA: Es importante tener claridad que en esta semana el contratista de obra avanzó en actividades de capa estabilizada en el sector de caño flores, sin embargo esta actividad no se reporto por parte de la interventoría debido a que presenta inconistencias en cuanto a las densidades, por tanto se puede dar como realizada esta actividad a 100 %. Por otra parte se emitió un oficio al contratista donde se referencia que la interventoría No recibe el asfalto instalado y capa estabilizada , ya que no cumple con las especificaciones y presenta inconsistencias en el grado de compactación.</p>				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
<p>Inspeccionar las obras, controlar personal, equipos y cantidades de obra.</p> <p>Medir obra ejecutada.</p> <p>Llevar y mantener diario de la obra (bitácora).</p> <p>Revisar replanteo topográfico y permanencia de referencias.</p> <p>Llevar un registro fotográfico del proyecto.</p> <p>Supervisar materiales y fuente de materiales.</p> <p>Elaborar informe semanal</p>			<p>FRMA</p> <p>NOMBRE: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO</p> <p>Matrícula Profesional No.: 68202112214STD</p>	
<p>Original Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</p> <p>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</p>				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA		
			FECHA	26/12/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: VIAS FORTUL					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES.		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE		SEMANA No.: 45 del 20/12/2024 al 26/12/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO.		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS.			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): Mejoramiento y construcción de pavimento flexible en el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES a SITIO NUEVO.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Para el tramo 1"Caño Flores": Se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 2,86 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1.00 m a cada costado, también se contempla la construcción de estructuras de drenaje en el tramo de vía a intervenir (Box Culvert y alcantarillas). Con el contrato adicional No. 001 se aumenta el alcance en 930 m y 4 obras de drenaje adicionales. Para el tramo 2 "Palmarito" se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,4 km, iniciando en K0+00 AL K7+400, con una sección un ancho de vía de 6.0 m, bermas de 0.50 m a cada costado, se contempla el aprovechamiento de 5 obras existentes requeridas para el tramo de vía a intervenir (Box Culvert), y 2 estructuras proyectadas en el tramo de vía a intervenir, (Box Culvert y alcantarillas). Según otro Si Modificatorio No. 003 se establece la construcción de 14 obras de drenaje nuevas en su totalidad y la demolición de las estructuras existentes, Sin embargo se redujo el alcen de MDC-19 hasta absc k6+740. Con el contrato adicional No. 001 se establece que el alcance de MDC-19 hasta k7+400.					
CONTRATO DE OBRA:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:					
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON			
INTEGRANTES: CONYCA SOLUCIONES SAS (78%), CONSTRUCTORA INSUR LTDA (2%), HD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS (10%), VANUR SAS (10%)		INTEGRANTES: SADING GROUP SAS (50%), GRUPO INTECON SAS (50%)			
CONTRATO No. 016 DE 2023		CONTRATO No. 4763 DE 2023			
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		FECHA DE INICIO: 14/12/2023			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 21/3/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/12/2024			
VALOR INICIAL: \$ 23.137.768.645,10		VALOR INICIAL: \$ 1.856.588.140,00			
VALOR ADICIONES: \$ 4.895.000.000,00		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 28.032.768.645,10		VALOR ACUMULADO: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ -		VALOR ANTICIPO: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ -		VALOR AMORTIZADO: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ -		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 23.137.768.645	\$ 4.895.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 23.137.768.645			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.856.588.140			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 1.856.588.140			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRAINTERVENTORÍA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 27.796.510.491					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 27.286.595.042 97,35%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 22.897.835.080 81,69%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ (4.388.759.962) -15,66%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 233.258.153,80					
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 27.286.595.042 97,35%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 22.897.835.080 81,69%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ (4.388.759.962) -15,66%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 1.966.192.042 7,01%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 589.361.973 2,10%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: x					
PERIODO FACTURADO: \$ -					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
Observaciones:					
ANTICIPOSINDICADOR I/C					
Otorgado \$ 14.016.384.300					
Amortizado \$ 7.817.727.223,85					
Saldo \$ 6.198.657.076,15					
En el mes: Acumulado:					
ANTICIPOS					
Otorgado \$					
Amortizado \$					
Saldo \$					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 96% Avance o Atraso Físico % 17%					
Meta Física Ejecutada % 79%					



MAQUINARIA Y EQUIPO

PALMARITO										
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prelistamiento para ejecución de obra					Prog		100%			100,0%
					Ejec		100%			100,0%
Excavaciones	m3	6587,78			Prog		100%			100,0%
					Ejec		99%			99,0%
Estructura de vía	m3 y m2	26902,1			Prog		97%			97,0%
		103600			Ejec		96%			96,0%
Obras de drenaje	m3 y Kg	70,44			Prog		100%			100,0%
		12703,7			Ejec		95%			95,0%
Señalización vertical y demarcación vial	Km y Un	35			Prog		0%			0,0%
		22200			Ejec		67%			67,0%
Actividades de caracterización vial	Km	7,4			Prog		100%			100,0%
					Ejec		0%			0,0%
Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog		93%			93,0%
					Ejec		0%			0,0%
CAÑO FLORES										
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prelistamiento para ejecución de obra					Prog		100%			100,0%
					Ejec		100%			100,0%
Excavaciones y llenos	m3	40652,5			Prog		100%			100,0%
					Ejec		99%			99,0%
Estructura de pavimento	m3 y m2	8644,61			Prog		51%			51,0%
		54626			Ejec		32%			32,0%
Señalización	Un y m	1098			Prog		0%			0,0%
		11880			Ejec		0%			0,0%
Obras de drenaje	Kg y m3	13660,8			Prog		100%			100,0%
		523,41			Ejec		100%			100,0%
Movimiento Red eléctrica	Und y m3	18			Prog		100%			100,0%
		1,8			Ejec		100%			100,0%
Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog		93%			93,0%
					Ejec		0%			0,0%
Actividades de caracterización vial	Km	2,8			Prog		87%			87,0%
					Ejec		0%			0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

FUENTES DE MATERIALES					IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
UBICACIÓN:	Vereda Puerto Arturo, Municipio de Saravena, Departamento de Arauca				DISPONIBLE								
UBICACIÓN:					PERMISO MINERO: SI x NO								
					LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO								
OBSERVACIONES:					PERMISO MINERO: SI								
					LICENCIA AMBIENTAL: SI								
OBSERVACIONES: A la fecha el proyecto cuenta con tres (3) puntos para suministro de materiales, los cuales cuentan con los respectivos permisos ambientales, los sitios utilizados son:					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL								
					ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A x								
1. Cantera trituradora el Sol S.A.S, Licencia ambiental: Resolución No 500.36.20.0928 del 21 de octubre de 2020.					LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A x								
					APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI x NO N/A								
2. Agregados y mezcla asfáltica “Rosa Blanca”, Licencia ambiental: Resolución No 500.36.23.0236 del 07 de marzo de 2023.					CONCESIÓN DE AGUAS: SI x NO N/A								
					OCUPACIÓN DE CAUCES: SI x NO N/A								
3. Cantera pétreos del llano Licencia ambiental: Resolución No 500.41-16-0860 del 18 de julio de 2016					VERTIMENTOS: SI NO N/A x								
					EMISIONES: SI NO N/A x								
ESTADO: Se entrega por parte del contratista el documento paga de obra para revisión y aprobación por parte de la interventoría.					OBSERVACIONES:								
					A la fecha el contrato cuenta con la actualización del permiso único ambiental el cual contempla ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y concesión de aguas, Resolución 700.36.24-0055 17 de junio de 2024 " Por medio de la cual se prorroga el término de vigencia de la Resolución 700.36.24-0013 de 16 de febrero de 2024", esta prórroga se da por un periodo de 6 meses 13 días.								
					Resolución No 700.36.24.0109 del 10 de octubre de 2024, por medio de la cual se aclara y modifica la resolución No 700.36.24.0013 del 16 de febrero de 2024, con relación al otrosí modificatorio del 08 de agosto de 2024.								
					Resolución 700.36.24.0139 del 4 de diciembre de 2024 la cual aclarar y modificar el artículo primero de la Resolución No. 700.36.24-0013 de fecha 16 de febrero de 2024 otorgada al municipio de Fortul, identificado con NIT. 800.136.069-4, para la ocupación de cauce, concesión de aguas superficiales y permiso de aprovechamiento forestal único del proyecto.								

V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	74	16	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	63	13	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Centro Poblado Palmarito
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	3		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	21	4		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	90			

VI. GESTIÓN PREDIAL				
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A		OBSERVACIONES: Este programa no aplica para este proyecto	
FICHAS PEDIALES APROBADAS:	N/A			
AVALÚOS APROBADOS:	0			
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0			

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.4763 DE 2023 INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No.10 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</p>	
---	--	---

ANEXO B

MEPI-MN1-IN-15-FR-4

Maquinaria y Equipo del contrato de obra.

FECHA31/12/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:

dic-24

PROYECTO:VÍAS FORTUL

CONTRATO No.016 de 2023

CONTRATISTA:CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

CONTRATO INTERVENTORÍA No.4763 de 2023

INTERVENTORÍA:CONSORCIO SADINTECON

MAQUINARIA Y EQUIPO				MAYO																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA	TOYOTA / 2013	1000-5	PALMARITO	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CARROTANQUE	CEHVROLET / 1994	12000	PALMARITO	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A
EXACAVADORA	CATTERPILLAR	416F2	PALMARITO	I	R	R	R	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	I	I	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A
MOTONIVELADORA	SEM / 2022		PALMARITO	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	R	R	R	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	BOMAG / 2011		PALMARITO	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MEZCLADORA	M2G9H	2 bultos	PALMARITO	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ESTACION TOTAL	TOPKON	GTS-255	PALMARITO	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NIVEL AUTOMATICO	SOKKIA	B4O4	PALMARITO	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPACTADOR DE NEUMÁTICO	HAMM / GRW-15		PALMARITO	I	A	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	A	A	A	A	A	A
PAVIMENTADORA-FINISHER	CATTERPILLAR / AP 1050B 1992		PALMARITO	I	A	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	A	I	I	I	I	I	I	A	I	I	A	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND. / SD-70D PRO-PAC		PALMARITO	I	A	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	A	I	I	I	I	I	I	A	I	I	A	A	A	A	A	A

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
TOTAL ACTIVO	0	10	10	10	8	11	11	0	8	11	11	11	8	11	0	11	7	7	7	8	6	0	10	6	6	10	11	11	11	11	11	11	11
TOTAL EN REPARACIÓN	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO	11	0	0	0	3	0	0	11	3	0	0	0	3	0	11	0	4	4	4	3	5	11	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	330	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	242	73.3
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	6	1.8
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	82	24.8

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO : L

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: * LA MAQUINARIA Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN INACTIVOS LOS DÍAS DOMINGOS DEL MES. EXCEPTO EN 2 DOMINGOS QUE SE LABORÓ CON INSTALACIÓN DE ASFALTO MDC-19.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

- NOTAS:
- El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
 - Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
 - Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
 - En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
 - Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: Edier Jafeth Mariotta Padilla

Residente de Obra

Firma

Nombre: Esneider Fuentes Zárate

Residente de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Matrícula Profesional No.: 54202-277388 NTS

Matrícula Profesional No.: 25202-105731 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CASANARE	FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)
-------------------	---------------------------------	------------------------	----------	-------	---------------------------------

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:	dic-24	PROYECTO:	VÍAS FORTUL
CONTRATO No.	016 de 2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4763 de 2023	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO SADINTECON

MAQUINARIA Y EQUIPO				MAYO																																
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
CAMIONETA	MAZDA / 2013	1000-5	CAÑO FLORES	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	
CARROTANQUE	INTERNACIONAL/ 2005	12000	CAÑO FLORES	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	
EXCAVADORA	KOMATSU/	220-8	CAÑO FLORES	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR/	10.700 c	CAÑO FLORES	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	
MOTONIVELADORA	LIUGONG/ 2011		CAÑO FLORES	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR/ 2022		CAÑO FLORES	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	
MEZCLADORA	M2G9H	2 bultos	CAÑO FLORES	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
ESTACION TOTAL	TOPKON	GTS-255	CAÑO FLORES	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	
NIVEL AUTOMATICO	SOKKIA	B404	CAÑO FLORES	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	
COMPACTADOR DE NEUMÁTICO	HAMM / GRW-15		PALMARITO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
PAVIMENTADORA-FINISHER	CATTERPILLAR / AP 1050B 1992		PALMARITO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND. / SD-70D PRO-PAC		PALMARITO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
TOTAL ACTIVO				0	9	9	9	9	9	8	0	8	9	9	9	9	9	0	9	9	8	8	8	7	0	8	8	8	7	8	8	0	8	8		
TOTAL EN REPARACION				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INACTIVO				9	0	0	0	0	0	1	9	1	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	1	1	1	2	9	1	1	2	1	1	9	1	1	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	372	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	218	58,6
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	61	16,4

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO : L

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: *, *

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

- NOTAS:
- El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
 - Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
 - Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
 - En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
 - Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma		Firma	
-------	--	-------	--

 <p>SADING GROUP S.A.S. GRUPO INTECON S.A.S. INTERVENCIÓN Y CONSULTORIA</p>	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.4763 DE 2023 INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No.10 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</p>	 <p>CALIDAD INVIAS</p>
--	--	---

ANEXO C

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901524644	0	EQUIPOS Y EMULSIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 5 # 21-16 APTO 501	CHIQUEQUIRA-BOYACA	7260101	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1117740127	9478759896	E	2024/12/11	2024/12/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$7,241,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (10 Afiliados)					\$19,490,000	\$3,118,400			\$19,490,000	\$779,600			\$19,490,000	\$779,600			\$19,490,000	\$1,356,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (10 Afiliados)					\$19,490,000	\$3,118,400			\$19,490,000	\$779,600			\$19,490,000	\$779,600			\$19,490,000	\$1,356,700		\$0	\$0	
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (10 Afiliados)					\$19,490,000	\$3,118,400			\$19,490,000	\$779,600			\$19,490,000	\$779,600			\$19,490,000	\$1,356,700		\$0	\$0	
1	CC	1053340635	CABEZAS BRYAN	230201	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS017	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF10	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	\$348,000	30	\$0	\$0
2	CC	7309758	CABEZAS JOSE	230201	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS005	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF10	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	\$348,000	30	\$0	\$0
3	CC	1057599827	GUTIERREZ OSCAR	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0
4	CC	1116788247	MORIN DUBER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0
5	CC	1116873119	NIÑO SIMON	230301	9	\$390,000	\$62,400	EPS005	9	\$390,000	\$15,600	CCF10	9	\$390,000	\$15,600	14-11	9	\$390,000	\$27,200	9	\$0	\$0
6	CC	1057412593	PASTO FABIO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0
7	CC	1057596554	PATINO DANIEL	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0
8	CC	96190778	RIÑO GERSON	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0
9	CC	17597105	ROMERO LUWIN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0
10	CC	1119510643	SINIVA ANGEL	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: COMFIAR CCF (2 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$181,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: 002 (2 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$181,000		\$0	\$0	
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (2 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$181,000		\$0	\$0	
11	CC	1006456936	BENITEZ ANDRES	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0
12	CC	1115867338	DURAN MAICOL	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: COMFACASANARE CCF (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$90,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OBRA 3 (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$90,500		\$0	\$0	
Ciudad: PORE Depto: CASANARE (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$90,500		\$0	\$0	
13	CC	11511025	MONDRAGON OSCAR	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0
Total Afiliados(13)					\$23,390,000	\$3,742,400			\$23,390,000	\$935,600			\$23,390,000	\$935,600			\$23,390,000	\$1,628,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901524644	0	EQUIPOS Y EMULSIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 5 # 21-16 APTO 501	CHIQUEQUIRA-BOYACA	7260101	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-12	1117740127	9478759896	E	2024/12/11	2024/12/11	BANCO DAVIVIENDA	\$7,241,800

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$3,742,400	\$0	\$0	\$3,742,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$624,000	\$0	\$0	\$624,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,518,400	\$0	\$0	\$1,518,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$1,600,000	\$0	\$0	\$1,600,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$1,628,200	\$0	\$0	\$1,628,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$1,628,200	\$0	\$0	\$1,628,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$935,600	\$0	\$0	\$935,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	10	\$779,600	\$0	\$0	\$779,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	\$935,600	\$0	\$0	\$935,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$215,600	\$0	\$0	\$215,600
TOTAL				13	\$7,241,800	\$0	\$0	\$7,241,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901869683	9	INNOROAD SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 48 # 75 -43	BELLO-ANTIOQUIA	1234567	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Valor
2024-11	2024-12	1103805225	9478258319	E	2024/12/19	2024/12/05	BANCOLOMBIA		\$805,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1020467884	CHAVERRA CARVAJAL LUIS DAVID																		230201	30	EPS010	30	CCF04	30	14-11	30	30	Si
2	CC	88164678	NIÑO FLOREZ CIRO HERNANDO																		230301	30	EPS037	30	CCF04	30	14-11	30	30	Si
Total		Afiliados(2)																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901869683	9	INNOROAD SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		Principal	CRA 48 # 75 -43	BELLO-ANTIOQUIA	1234567	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-11	2024-12	1103805225	9478258319	E	2024/12/19	2024/12/05	BANCOLOMBIA	0	\$805,000	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$416,000	\$0	\$0		\$416,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0		\$208,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$0	\$0		\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$181,000	\$0	\$0		\$181,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$181,000	\$0	\$0		\$181,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$104,000	\$0	\$0		\$104,000	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	\$104,000	\$0	\$0		\$104,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$104,000	\$0	\$0		\$104,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$52,000	\$0	\$0		\$52,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$52,000	\$0	\$0		\$52,000	
TOTAL				2	\$805,000	\$0	\$0		\$805,000	

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 17546051	1	ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8299	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-736	KM 5 VIA SARAVENA		8851832			SARMIENTO161@HOTMAIL.COM		S



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32171180	E	2025-01-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.574.200	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
19	32171180	2025-01-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN		Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica			
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.						Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 6609982	NIEVES BUSTAMANTE JOSE ANGEL	1.300.000		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFIAR-CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001
2	CC 6761731	OVIDEO ALMEIDA HUMBERTO	3.177.509		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.177.509	508.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.177.509	127.200	COMFIAR-CCF67	3.177.509	127.200	3.177.509	221.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	984.100	S	5421001
3	CC 13568611	MERCHAN BARRERA LUIS HERNANDO	1.300.000		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFIAR-CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001
4	CC 17527921	LIZCANO ACEVEDO ALIRIO	1.945.259		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.945.259	311.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.945.259	77.900	COMFIAR-CCF67	1.945.259	77.900	1.945.259	135.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	602.500	S	5421001
5	CC 17585053	ESPINOZA BENITEZ LUIS ANTONIO	1.300.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFIAR-CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001
6	CC 17586875	LANCACHO BRITO JOSE EFRAIN	1.300.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFIAR-CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001
7	CC 18918271	PINTO BENJAMIN	1.945.259		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.945.259	311.300	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.945.259	77.900	COMFIAR-CCF67	1.945.259	77.900	1.945.259	135.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	602.500	S	5421001
8	CC 46661689	PARRA ELSA MARLENY	1.300.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFIAR-CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	56.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	368.600	S	5421001
9	CC 60262744	ISIDRO DELGADO DIANA PATRICIA	2.034.384		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.034.384	325.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.034.384	81.400	COMFIAR-CCF67	2.034.384	81.400	2.034.384	141.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	630.000	S	5421001
10	CC 68287167	ROZO MALDONADO BLANCA INES	2.034.384		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.034.384	325.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.034.384	81.400	COMFIAR-CCF67	2.034.384	81.400	2.034.384	88.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	576.900	S	5421001
11	CC 88146465	CRUZ PEREZ OLMES ALCIDES	1.300.000		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFIAR-CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001
12	CC 96167652	PINTO RODRIGUEZ LUIS ALFREDO	1.300.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFIAR-CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001
13	CC 96188269	CAÑAZ ARCINIEGAS LUIS EDUARDO	1.945.259		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.945.259	311.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.945.259	77.900	COMFIAR-CCF67	1.945.259	77.900	1.945.259	135.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	602.500	S	5421001
14	CC 1093744236	DAZA CARVAJAL FERNEY DARIO	1.945.259		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.945.259	311.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.945.259	77.900	COMFIAR-CCF67	1.945.259	77.900	1.945.259	135.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	602.500	S	5421001
15	CC 1094240936	GALVIS VANEGAS OSCAR MAURICIO	1.945.259		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.945.259	311.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.945.259	77.900	COMFIAR-CCF67	1.945.259	77.900	1.945.259	135.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	602.500	S	5421001
16	CC 1095925793	GALVIS VANEGAS ERICK	1.945.259		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.945.259	311.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.945.259	77.900	COMFIAR-CCF67	1.945.259	77.900	1.945.259	135.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	602.500	S	5421001
17	CC 1115724189	CAICEDO UNCACIA EDWIN	1.945.259		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.945.259	311.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.945.259	77.900	COMFIAR-CCF67	1.945.259	77.900	1.945.259	135.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	602.500	S	5421001
18	CC 1115730863	MENDOZA DIAZ LEONARDO ANTONIO	3.163.616		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.163.616	506.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.163.616	126.600	COMFIAR-CCF67	3.163.616	126.600	3.163.616	220.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	979.600	S	5421001
19	CC 1119181704	TELLEZ LEON HELIODORO	1.300.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFIAR-CCF67	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 17546051	1	ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8299	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
81-736	KM 5 VIA SARAVERA		8851832		SARMIENTO161@HOTMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32171180	E	2025-01-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.574.200	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
19	32171180	2025-01-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
34.426.706	34.426.706	34.426.706	34.426.706	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				19	5.509.000	0	0	0	5.509.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	10	3.117.900	0	0	0	3.117.900
PORVENIR	230301	800224808	8	7	1.871.800	0	0	0	1.871.800
PROTECCION	230201	800229739	0	2	519.300	0	0	0	519.300
EPS(Administradoras: 3)				19	1.377.900	0	0	0	1.377.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	52.000	0	0	0	52.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	17	1.248.000	0	0	0	1.248.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	77.900	0	0	0	77.900
ARP(Administradoras: 1)				19	2.309.400	0	0	0	2.309.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	19	2.309.400	0	0	0	2.309.400
CCF(Administradoras: 1)				19	1.377.900	0	0	0	1.377.900
COMFIAR	CCF67	800219488	4	19	1.377.900	0	0	0	1.377.900
Gran Total					10.574.200	0	0	0	10.574.200

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul Contrato de Interventoría No.4763 de 2023 Informe Mensual de Avance de Obra No.10 Periodo Comprendido Del 1 al 31 de Diciembre de 2024</p>	
---	--	---

ANEXO D

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA			
												FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE			
CONTRATO DE OBRA No: 016 de 2023												CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL			
MES INFORME MENSUAL: dic-24												PROYECTO: VIAS FORTUL			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4763 de 2023												INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2023	600 DE 2023	Transporte Infraestructura red vial regional		080 - CONVENIOS	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 23.137.768.645	\$ -								
2024	596 de 2024	Transporte Infraestructura red vial regional		080 - CONVENIOS	CONTRATO ADICIONAL No. 01	\$ 4.895.000.000									
TOTAL															
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 28.032.768.645,10															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	parcial	2024			\$ 6.451.980.286,41	\$ 3.225.990.143,21	\$ 3.225.990.143,20	\$ 8.342.894.156,80							PAGADA
2	parcial	2024			\$ 3.928.517.820	\$ 1.964.258.910,10	\$ 1.964.258.910,09	\$ 6.378.635.246,70	15/09/2024						PAGADA
3	parcial	2024			\$ 5.031.893.468	\$ 2.515.946.734,03	\$ 2.515.946.734,02	\$ 3.862.688.512,67	31/10/2024						PAGADA
TOTALES															
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.															
OBSERVACIONES: Para el período del presente informe <u>No</u> se presentaron actas parciales por parte del contrato de obra															

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
El acta parcial 2 se encuentra en proceso para pago con la unidad ejecutora. El acta parcial 3 se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Firma



Nombre: Adalberto Alarcón Olaya
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-091107 CND

Firma



Nombre: Javier E. Fuentes Capacho
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N 68202-112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.4763 DE 2023 INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No.10 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</p>	
---	--	---

ANEXO E

MEPI-MN1-IN-15-FR-10

Estado general del tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE																													
CONTRATO DE OBRA No: 016 de 2023			CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-24			PROYECTO: VÍAS FORTUL																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4763 de 2023			INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	23	21	22	24	24	24	21	22	24	24	22	22	24	22	24	24	24	23	20	21	22	24	24	23	24	23	24	24	24	715
Lluvias moderadas			1	1	2				2	1			2	1		2				1	2	1	1			1		1				19
Lluvias intensas									1	1				1							2	2	1									8
Total horas	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		718
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
EN HORAS LABORALES SE HAN PRESENTADO ALGUNAS LLUVIAS INTENSAS DURANTE ESTE PERIODO, UNA VEZ FINALIZADA LA LLUVIA SE RETOMABAN TRABAJOS DE CAMPO.																																
<div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: Edier Jafeth Mariotta Padilla Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 54202-277388 NTS</div></div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: Esneider Fuentes Zárate Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-105731 CND</div></div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	30/12/2024 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE																													
CONTRATO DE OBRA No: 016 de 2023			CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-24			PROYECTO: VÍAS FORTUL																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4763 de 2023			INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	23	21	22	24	24	24	18	18	24	24	19	17	24	18	24	24	24	20	17	21	22	24	24	23	22	22	23	23	24	685
Lluvias moderadas			1	1	2				2	1			1	1		2				1	2	1	1			1	2	1	1			21
Lluvias intensas									4	5			4	6		4				3	5	2	1					1		1		36
Total horas	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		718
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
EN HORAS LABORALES SE HAN PRESENTADO ALGUNAS LLUVIAS INTENSAS DURANTE ESTE PERIODO, ESTA SITUACIÓN EFECTA DIRECTAMENTE LA ACTIVIDAD DE ESTABILIZACIÓN DE TERREPLEN CON SALES INORGÁNICAS.																																
<div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: Javier O. Sanabria Jiménez</div><div>Residente de Obra</div><div>Matrícula Profesional No.: 54202-334985</div></div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: Ruben Alonso Borrero</div><div>Residente de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202096268 STD</div></div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

DATOS DESCARGADOS DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM) MES DE DICIEMBRE 2024 ESTACIÓN CERCANA AL APROYECTO

[illegible]

 <p>SADING GROUP S.A.S. GRUPO INTECON S.A.S. INTERVENCIÓN Y CONSULTORÍA</p>	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.4763 DE 2023 INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No.10 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</p>	
--	--	---

ANEXO F


MEPI-MN1-IN-15-FR-11

Resumen ensayos de laboratorio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
								VERSIÓN	1	
								PAGINA		
								FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE										
CONTRATO DE OBRA No.: 016 de 2023 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL										
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-24 PROYECTO: VÍAS FORTUL										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4763 de 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON										
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES										
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo		Resultado del Ensayo	Cumple Si o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA										
1	03/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+065 - K0+430 carril derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	12977	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,11	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,4	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estabilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,19	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,7	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,76	SI	
2	03/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+065 - K0+430 carril derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	13210	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,15	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	5,7	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	20	SI	
						Relación estabilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,2	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,9	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	70	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,76	SI	
3	04/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+040 - K0+420 carril izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	13828	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,15	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,5	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estabilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,41	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,77	SI	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO							CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
									VERSIÓN 1	
									PAGINA	
									FECHA	
									31/12/2024 (Día / Mes / Año)	
4	05/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+320 - K0+725 carril izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	13089	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,14	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,1	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,18	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,78	SI	
5	05/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+420 - K0+725 carril izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	12205	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,23	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,2	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	3,79	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,76	SI	
6	07/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+725 - k0+960 carril izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	12205	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,23	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,3	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	3,79	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,9	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,69	SI/ No	Presentó un % Límite de la tolerancia
7	07/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+725 - k0+960 carril izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	13893	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,44	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,1	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,04	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,9	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,8	SI	
8	08/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+440 - k0+695 carril Derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	14018	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,22	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,3	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,35	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11		
							VERSIÓN	1		
							PAGINA			
							FECHA		31/12/2024 (Día / Mes / Año)	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,73	SI	
9	08/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+440 - k0+695 carril Derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	13914	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,13	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,3	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,45	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,9	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,71	SI	
10	09/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / k0+695 - k1+020 carril Derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	13284	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,23	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,3	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,13	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,9	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,72	SI	
11	10/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / k1+020 -k1+345 carril Derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	13094	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,03	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,2	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,33	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,9	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,77	SI	
12	11/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / k1+050 -k1+350 carril Izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	13713	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,04	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,2	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,51	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,74	SI	
13	12/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / k1+350 - k1+620 carril Izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	13894	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,07	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,7	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,53	SI	



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11		
							VERSIÓN	1		
							PAGINA			
							FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)		
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA										
	03/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+100 carril derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	12540	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,1	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	5,2	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	18,44	SI	
						Relación estabilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,53	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	69	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,74	SI	
	05/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR3+660-DER	1	≥ 95%	92,60%	SI		
	05/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR4+060-DER	1	≥ 95%	95,80%	SI		
	05/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR4+480-IZQ	1	≥ 95%	99,00%	SI		
	05/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR4+880-EJE	1	≥ 95%	95,20%	SI		
	05/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR5+360-DER	1	≥ 95%	94,20%	SI		
	05/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR5+760-IZQ	1	≥ 95%	92,20%	SI		
	05/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR6+155-DER	1	≥ 95%	109,00%	SI		
	05/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR6+560-EJE	1	≥ 95%	102,00%	SI		
	05/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR6+960-IZQ	1	≥ 95%	95,60%	SI		
	05/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR7+360-DER	1	≥ 95%	93,10%	SI		
OBSERVACIONES:										
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.										
Firma Nombre: Adalberto Alarcón Olaya Director de Obra Matrícula Profesional No.: 25202-091107 CND						Firma Nombre: Javier E. Fuentes Capacho Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 68202-112214 STD				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.										

PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

SOLICITANTE

CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

CONTRATO No

016 DE 2023

ENERO DE 2025

ARAUCA/ARAUCA

INFORME DE LABORATORIO

MATERIAL	MEZCLA DE MATERIAL CRUDO CLASIFICADO 3"+ARCILLA+ SALES
-----------------	---

PROCTOR MODIFICADO

INVIAS-E-142-13

Código: HC-LAB-019	ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO	
Versión: 001		
Fecha: 2022/02/30		
Página 1 de 2		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÓN:	MUESTRA TOMADA SECTOR LAS FLORES		
DESCRIPCION DEL MATERIAL:	MEZCLA DE MATERIAL CRUDO CLASIFICADO 3"+ARCILLA+ SALES		
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E-142-13	FECHA:	2025-01-07
EQUIPO UTILIZADO:	MOLDE DE PROCTOR, TAMICES SEGÚN NORMA		

COMPACTACIÓN

ENSAYO	1	2	3	4
HUMEDAD NATURAL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
HUMEDAD DESEADA (%)	3,0	5,0	7,0	9,0
HUMEDAD AGREGADA (%)	180,0	300,0	420,0	540,0
AGUA AGREGADA (cm ³)	180,0	300,0	420,0	540,0
PESO MOLDE + SUELOS HÚMEDO (g.)	9868,0	10147,0	10197,0	10063,0
PESO MOLDE (g.)	5270,0	5270,0	5270,0	5270,0
PESO SUELO HÚMEDO (g.)	4598,0	4877,0	4927,0	4793,0
HUMEDAD (%)	4,0	5,3	7,0	9,1
PESO SUELO SECO (g.)	4422,1	4630,9	4602,9	4393,6
VOLUMEN (cm ³)	2152,0	2152,0	2152,0	2152,0
DENSIDAD SECA (g./cm ³)	2,055	2,152	2,139	2,042


HUMEDADES DE COMPACTACIÓN

ENSAYO	1	2
TAPA	1	2
P1	502,0	546,0
P2	487,0	524,0
P3	110,0	110,0
W (%)	3,98	5,31
WPROM. (%)	3,98	5,31

ENSAYO	3	4
TAPA	3	4
P1	414,0	518,0
P2	394,0	484,0
P3	110,0	110,0
W (%)	7,04	9,09
WPROM. (%)	7,04	9,09

ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO

CURVA DE DENSIDAD VS. HUMEDAD

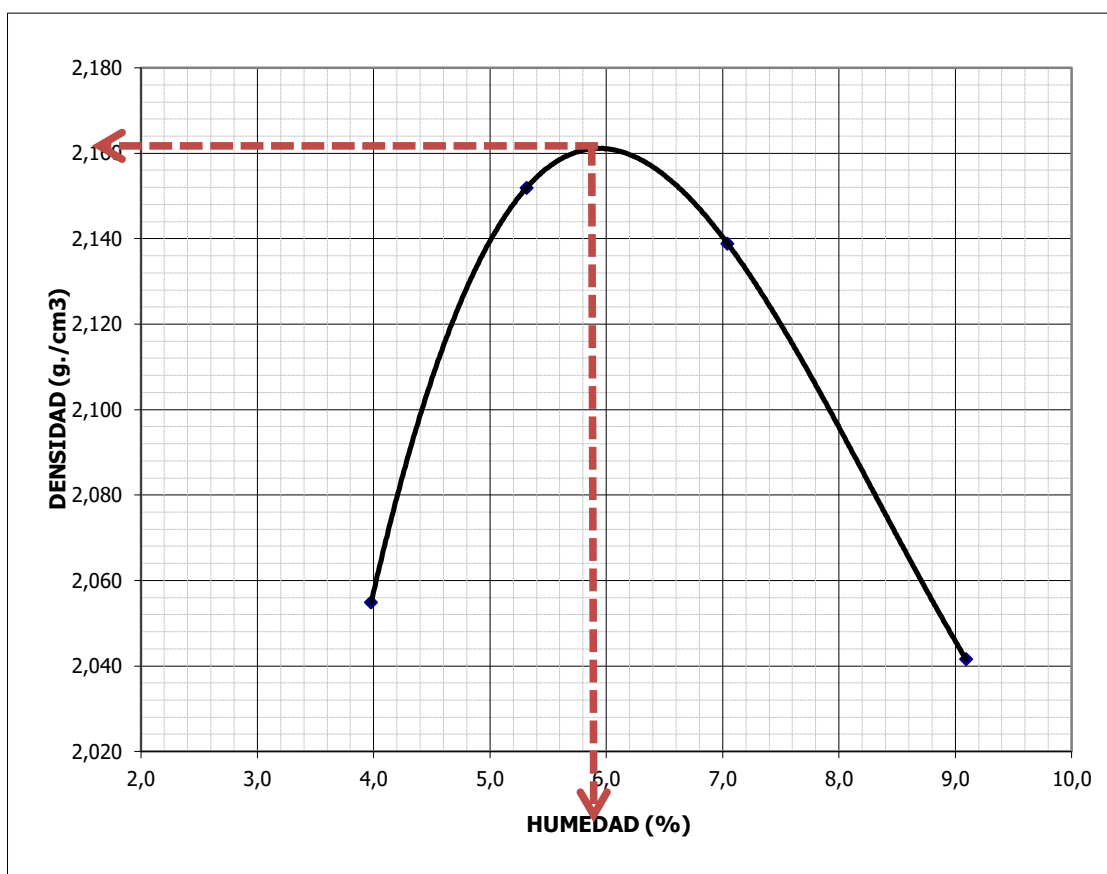

DENSIDAD SECA MÁXIMA (g./cm³)	2,160
HUMEDAD ÓPTIMA (%)	5,90

OBSERVACIONES:



Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
M.P. 54502004427 NTS

DENSIDADES METODO CONO Y ARENA

INVIAS E 161-13

Objeto:

AUNAR ESFUERZOS PARA: 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

Nº de orden:

Localizacion:

PR1+600 AL PR2+000-SECTOR CAÑO FLORES

Fecha de ensayo:

ENERO 2025

Solicitante:

CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

Descripción:

MEZCLA DE MATERIAL CRUDO CLASIFICADO 3"+ARCILLA+ SALES

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas.

FECHA DE TOMA DE MUESTRA	2025-01-09	2025-01-09	2025-01-09	2025-01-09	2025-01-09	2025-01-09	
Muestra	1	2	3	4	5	6	
UBICACIÓN	PR1+600 DER	PR1+680 IZQ	PR1+760 EJE	PR1+840 DER	PR1+920 DER	PR2+000 DER	
Método de compactación laboratorio	C	C	C	C	C	C	
Tamiz para separar los sobretamaños	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	
Profundidad del Huevo	cm	14	14	14	14	14	
Masa Arena + Frasco	g	7025	6995	6911	6874	6801	6748
Masa Frasco + Arena Retenida	g	2704	2801	2774	2801	2674	2568
Masa Arena Retenida en cono y placa	g	1666	1666	1666	1666	1666	1666
Masa Arena Empleada	g	2655	2528	2471	2407	2461	2514
Peso unitario de la Arena	g/cm³	1,412	1,412	1,412	1,412	1,412	1,412
Volumen de Suelo + Sobretamaños	cm3	1880,3	1790,4	1750,0	1704,7	1742,9	1780,5
Masa Suelo humedo + Sobretamaños	g	4403	4212	4103	3929	4028	4116
Masa Suelo Húmedo	g	2902	2807	2744	2625	2741	2809
Masa de sobretamaños	g	1501	1405	1359	1304	1287	1307
Humedad Material Fino	%	6,2	6,2	6,0	6,4	6,7	6,6
Humedad Material Grueso	%	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Humedad promedio	%	4,8	4,8	4,7	4,9	5,2	5,1
Masa Suelo Seco + Sobretamaños	g	4203	4019	3920	3744	3829	3915
Gravedad Específica de la fracción gruesa	g/cm³	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
Densidad del Suelo Seco	g/cm³	2,235	2,245	2,240	2,196	2,197	2,199
Densidad Máxima de laboratorio	g/cm³	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
Humedad Optima	%	5,9	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
Masa seca fracción fina	g	2770	2678	2621	2501	2606	2672
Masa seca fracción gruesa	g	1433	1341	1298	1243	1223	1243
Proporcion fracción fina	%	65,91	66,64	66,88	66,81	68,05	68,25
Proporcion fracción gruesa	%	34,09	33,36	33,12	33,19	31,95	31,75
Densidad Máxima corregida	g/cm³	2,292	2,289	2,288	2,289	2,283	2,283
Densidad Máxima corregida FF	g/cm³	1,986	1,991	1,993	1,992	2,001	2,002
Grado de Compactación	%	97,5	98,1	97,9	96,0	96,2	96,3

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL LOTE (5 ENSAYOS):

Grado de Compactación promedio (%)	GCm	96,99
Grado de compactación (%) GCi (90)		96,97
GCi (90) ≥ 95%		CUMPLE

OBSERVACIONES:

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ

M.P. 54502004427 NTS

Código: HC-LAB-026

Versión: 001

Fecha: 2022/05/30

Página 1 de 1

FORMATO LABORATORIO

INFORME ENSAYO

DENSIDAD DE CAMPO METODO DEL CONO DE ARENA Y

CORRECCIÓN DEL PESO UNITARIO Y DEL CONTENIDO DE AGUA DE

SUELOS QUE CONTIENEN SOBRETAMAÑOS

INV E-161: 2013; INV E-143: 2013

Fecha Informe: 2025-01-10

Objeto:

AUNAR ESFUERZOS PARA: 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

Nº de orden:

Localizacion:

PR2+000 AL PR2+310-SECTOR CAÑO FLORES

Fecha de ensayo: ENERO 2025

Solicitante:

CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

Descripción:

MEZCLA DE MATERIAL CRUDO CLASIFICADO 3"+ARCILLA+ SALES

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas.

FECHA DE TOMA DE MUESTRA	2025-01-10	2025-01-10	2025-01-10	2025-01-10	2025-01-10		
Muestra	1	2	3	4	5		
UBICACIÓN	PR2+020 DER	PR2+080 IZQ	PR2+140 EJE	PR2+220 DER	PR2+310 IZQ		
Método de compactación laboratorio	C	C	C	C	C		
Tamiz para separar los sobretamaños	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"		
Profundidad del Hueco	cm	14	14	14	14		
Masa Arena + Frasco	g	6701	6625	6589	6502	6417	
Masa Frasco + Arena Retenida	g	2411	2254	2245	2114	2239	
Masa Arena Retenida en cono y placa	g	1666	1666	1666	1666	1666	
Masa Arena Empleada	g	2624	2705	2678	2722	2512	
Peso unitario de la Arena	g/cm³	1,412	1,412	1,412	1,412	1,412	
Volumen de Suelo + Sobretamaños	cm3	1858,4	1915,7	1896,6	1927,8	1779,0	
Masa Suelo humedo + Sobretamaños	g	4393	4518	4387	4399	4104	
Masa Suelo Húmedo	g	3024	3100	2987	3001	2904	
Masa de sobretamaños	g	1369	1418	1400	1398	1200	
Humedad Material Fino	%	6,4	6,0	6,4	6,2	6,2	
Humedad Material Grueso	%	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Humedad promedio	%	5,0	4,7	5,0	4,8	5,0	
Masa Suelo Seco + Sobretamaños	g	4183	4314	4178	4198	3910	
Gravedad Específica de la fracción gruesa	g/cm³	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	
Densidad del Suelo Seco	g/cm³	2,251	2,252	2,203	2,177	2,198	
Densidad Máxima de laboratorio	g/cm³	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
Humedad Optima	%	5,9	5,90	5,90	5,90	5,90	
Masa seca fracción fina	g	2879	2960	2845	2864	2767	
Masa seca fracción gruesa	g	1303	1354	1333	1334	1143	
Proporcion fracción fina	%	68,84	68,61	68,09	68,22	70,76	
Proporcion fracción gruesa	%	31,16	31,39	31,91	31,78	29,24	
Densidad Máxima corregida	g/cm³	2,280	2,281	2,283	2,283	2,272	
Densidad Máxima corregida FF	g/cm³	2,006	2,005	2,001	2,002	2,019	
Grado de Compactación	%	98,7	98,7	96,5	95,4	96,7	

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL LOTE (5 ENSAYOS):

Grado de Compactación promedio (%)	GCm	97,20
Grado de compactación (%) GCi (90)		97,16
GCi (90) ≥ 95%		CUMPLE

OBSERVACIONES:

LEO HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Prohibida la reproducción parcial de este informe sin previa autorización de SUELOS Y GEOTECNIA HC

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.4763 DE 2023 INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No.10 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</p>	
---	--	---

ANEXO G

MEPI-MN1-IN-15-FR-12

Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		31	12	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CASANARE	
-------------------	---------------------------------	------------------------	----------	--

CONTRATO DE OBRA No.	016 de 2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	
----------------------	-------------	--------------	-----------------------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:				
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.				

FECHA DE INICIO:	21/12/2023			
PLAZO INICIAL:	3 MESES			
PLAZO MODIFICATORIO 001:	9 MESES Y 25 DIAS			
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	14/12/2024 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>			
VALOR INICIAL:	\$	23.137.768.645,10		
VALOR ADICIONAL:	\$	4.895.000.000,00		
VALOR ACUMULADO:	\$	28.032.768.645,10 <small>(Incluye adiciones)</small>		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	NO APLICA			
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	NO APLICA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4763 de 2023	INTERVENTOR:	CONSORCIO SADINTECON	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL											
Amparo			% Amparo	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
						Desde			Hasta		
Cumplimiento			10%	\$ 2.313.776.864,60		21	12	2023	21/07/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			50%	\$ 11.568.884.323,00		21	12	2023	21/07/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			20%	\$ 4.627.553.729,20		21	12	2023	21	3	2027
Calidad de Estudios y Diseños											
Estabilidad y/o Calidad de Obra			30%	\$ 6.941.330.593,80		21	3	2024	21	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	100285361			
Certificado de modificación o anexo No.:	71833285 / anexo 2 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small>			
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A.			
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	27/12/2023			

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL											
POLIZA DE SEGURO RCE											
Seguro			% Asegurado	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
						Desde			Hasta		
RESPONSABILIDAD CIVIL ESCONTRACTUAL			5,0%	\$ 1.156.888.432,30		29	9	2023	21	3	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	NB-100285361 NB-100069639	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	3 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small>		
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A.		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	27/12/2023		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES					
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.					
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 001	
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA	
Cumplimiento	10%	\$ 2.313.776.864,60		Desde: 4 3 2023 Hasta: 20/09/2024	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 11.568.884.323,00		21 12 2023 20/09/2024	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 4.627.553.729,20		21 12 2023 20 5 2027	
Calidad de Estudios y Diseños					
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 6.941.330.593,80		21 3 2024 20 5 2029	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100285361					
Certificado de modificación o anexo No. 3 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)					
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A					
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/03/2024					
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES					
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.					
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 001	
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,0%	\$ 1.156.888.432,30		Desde: 29 9 2023 Hasta: 21 3 2024	
Otros					
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100069639					
OTRAS PÓLIZAS No.					
Certificado de modificación o anexo No. 4 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)					
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/03/2024					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES					
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.					
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.: 001 SUSPENSIÓN No.:	
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA	
Cumplimiento	10%	\$ 2.313.776.864,60		Desde: 14 3 2024 Hasta: 16/04/2025	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 11.568.884.323,00		14 3 2024 16/04/2025	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 4.627.553.729,20		14 3 2024 16 12 2027	
Calidad de Estudios y Diseños					
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 6.941.330.593,80		16 12 2024 16 12 2029	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100285361					
Certificado de modificación o anexo No. 4 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)					
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A					
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 03/04/2024					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA				31	12	2024
				(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES						
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.						
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.: 001		SUSPENSIÓN No.:
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,0%	\$ 1.156.888.432,30				
Otros						
				Desde		
				Hasta		
				29	9	2023
				16	12	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100069639 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 03/04/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES						
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.						
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.: 002		SUSPENSIÓN No.:
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA		
Cumplimiento	10%	\$ 2.313.776.864,60				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 11.568.884.323,00				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 4.627.553.729,20				
Calidad de Estudios y Diseños						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 6.941.330.593,80				
				Desde		
				Hasta		
				26	4	2024
				16/04/2025		
				26	4	2024
				16/04/2025		
				26	4	2024
				16	12	2027
				16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100285361

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES						
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.						
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.: 002		SUSPENSIÓN No.:
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,0%	\$ 1.156.888.432,30				
Otros						
				Desde		
				Hasta		
				29	9	2023
				16	12	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100069639 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/06/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA				31	12	2024
				(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: 003 SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 2.313.776.864,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 11.568.884.323,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 4.627.553.729,20
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 6.941.330.593,80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
6	8	2024	16/04/2025		
6	8	2024	16/04/2025		
6	8	2024	16	12	2027
....					
16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100285361

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 03/09/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: 003 SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,0%	\$ 1.156.888.432,30
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	9	2023	16	12	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100069639 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 03/09/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 2.803.276.864,51
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 11.568.884.323,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 5.606.553.729,02
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 8.409.830.593,53

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	9	2024	16/04/2025		
9	9	2024	16/04/2025		
9	9	2024	16	12	2027
....					
16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100285361

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 03/09/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA				31	12	2024
				(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1PRÓRROGA No.:MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,0%	\$ 1.401.638.432,26
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	9	2023	16	12	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100069639OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL S.A

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:PRÓRROGA No.: 1MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 2.803.276.864,51
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 11.568.884.323,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 5.606.553.729,02
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 8.409.830.593,53

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
5	12	2024	30/04/2025		
5	12	2024	30/04/2025		
5	12	2024	31	12	2027
...	...	...	...	...	...
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100285361

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:PRÓRROGA No.: 1MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,0%	\$ 1.401.638.432,26
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	9	2023	31	12	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100069639OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/12/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	31	12	2024
			(Día)	(Mes)	(Año)
OBSERVACIONES:					
<p>NOTAS:</p> <p>1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.</p> <p>2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).</p> <div><div>Firma</div><div></div></div> <div>Nombre: Javier E. Fuentes Capacho Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 68202-112214 STD</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>					

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	72213518	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 29/09/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2029	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL					No. DOC. IDENTIDAD	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31					TELÉFONO	3023224964
ASEGURADO	MUNICIPIO DE FORTUL					No. DOC. IDENTIDAD	800.136.069-1
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL					TELÉFONO	3227139196
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE FORTUL					No. DOC. IDENTIDAD	800.136.069-1
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL					TELÉFONO	3227139196

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE PRORROGA NO. 001 DE FECHA 05/12/2024, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA EN LA REFERENCIA TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

EL AMPARO DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/12/2024	24:00 Horas Del 30/04/2025	2.803.276.864,51	322.568,84
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 05/12/2024	24:00 Horas Del 30/04/2025	11.568.884.322,55	1.331.214,09
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/12/2024	24:00 Horas Del 31/12/2027	5.606.553.729,02	691.218,95
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2024	24:00 Horas Del 31/12/2029	8.409.830.593,53	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 28.388.545.509,61	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00		2.345.001,88
DISTRIBUCIÓN COASEGURO			DESCUENTOS	\$
COMPañÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	EXTRA PRIMA	
		CERTIF. LÍDER	PRIMA NETA	\$ 2.345.001,88
		% PARTICIPACIÓN	GASTOS EXP.	\$ 0,00
CONVENIO DE PAGO			IVA	\$ 445.550,36
DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/12/2024			TOTAL A PAGAR	\$ 2.790.552,24

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	72213518	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	11/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2029	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

NOTA:

- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023
- COMO ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL SE TENDRÁ AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807-2

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno de estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmundial.com.coCorreo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	72215218	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	31/12/2024	DÍAS		
VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE				N/A	N/A	N/A	N/A
VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA							
TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL					No. DOC. IDENTIDAD	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31					TELÉFONO	3023224964
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL					No. DOC. IDENTIDAD	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31					TELÉFONO	3023224964
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS					No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.					TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:

29/09/2023 AL 31/12/2024

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	700.819.216,00	1.401.638.432,00	1.401.638.432,26	0,00
PATRONAL	420.491.529,00	420.491.530,00	420.491.529,68	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	420.491.530,00	420.491.530,00	420.491.529,68	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	420.491.530,00	420.491.530,00	420.491.529,68	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 1.401.638.432,26	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$ 0,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 0,00
GASTOS EXP.	\$ 0,00
IVA	\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	\$ 0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	72215218	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	12/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 29/09/2023	VIGENCIA HASTA	23:59 Horas Del 31/12/2024	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE FORTUL

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

- "EN ESTA PÓLIZA SOLO SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS

NOTA:

- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023 HASTA 16/12/2024
- COMO ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL SE TENDRÁ AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807-2

DEDUCIBLES:**AMPARO****DEDUCIBLES**

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

PATRONAL 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmundial.com.co

Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

 <p>SADING GROUP S.A.S. GRUPO INTECON S.A.S. INTERVENCIÓN Y CONSULTORIA</p>	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.4763 DE 2023 INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No.10 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</p>	
--	--	---

ANEXO H

MEPI-MN1-IN-15-FR-14

Seguimiento al plan de calidad contrato de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA		31/12/2024
		(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CASANARE
-------------------	---------------------------------	------------------------	----------

CONTRATO DE OBRA No.	026 de 2023 (Indicar número y año)
----------------------	---------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.	

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
FECHA DE INICIO:	21/12/2023 (Indicar día, mes y año)	PLAZO INICIAL:	3 MESES
		PLAZO ADICIONAL:	6 MESES Y 25 DÍAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	4763 de 2023 (Indicar número y año)	FECHA DE VENCIMIENTO:	14/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
INTERVENTOR:	CONSORCIO SADINTECON		

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO:	SI	NO	X	APROBADO:	SI	NO	FECHA DE VERSIÓN:	
-------------	----	----	---	-----------	----	----	-------------------	--

OBSERVACIONES:

No se presento plan de calidad, en el anexo técnico no se exige plan de calidad.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:	SI	NO	X	No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:		FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:	
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:	SI	NO	X	No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:		FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:	

OBSERVACIONES:

No se presentaron auditorías

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO:	SI	NO	X	APROBADO:	SI	NO	FECHA DE APROBACIÓN:	
-------------	----	----	---	-----------	----	----	----------------------	--

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:		No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:	
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:	SI	NO	X

OBSERVACIONES:

No se presento un plan de inspección, medición y ensayos. Sin embargo para el período del presente informe se han realizado los ensayos de laboratorio pertinentes y se encuentran relacionados en formato 15-FR-11.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:		No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:	
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:		No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:	
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:			

OBSERVACIONES:

para el presente inform No se presentaron No conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:		No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:	
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:		No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:	
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:		No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:	

OBSERVACIONES:

para el presente inform No se presentaron quejas y reclamos

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

NO se presento plan de calidad, en el anexo técnico no se exige plan de calidad.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
2	ESTACION TOTAL	TOPKON	GTS-255	22/02/2024	11/07/2024	31/12/2024	ok
2	NIVEL AUTOMATICO	SOKKIA	B4O4	22/02/2024	11/07/2024	31/12/2024	ok

OBSERVACIONES:

DENTRO DEL CONTROL REALIZADO PARA LA CALIDAD DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS TOPOGRÁFICOS UTILIZADOS EN CAMPO.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

<div>Firma</div> <div></div> <div>Nombre: Adalberto Alarcón Olaya Director de la Obra Matrícula Profesional No.: 25202-091107 CND</div>	<div>Firma</div> <div></div> <div>Nombre: Javier E. Fuentes Capacho Director de la Interventoría Matrícula Profesional No.: 68202-112214 STD</div>	<div>Firma</div> <div></div> <div>Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:</div>
--	--	--

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul Contrato de Interventoría No.4763 de 2023 Informe Mensual de Avance de Obra No.10 Periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2024</p>	
---	--	---

ANEXO I

MEPI-MN1-IN-2-FR-1

Plan de inversión del anticipo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1 de 1
		PÁGINA	

	FECHA	31/12/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	-------	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 Y 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
 AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON
(Indicar número y año)

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO - CONTRATO PRINCIPAL

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES					\$ 7.660.884.300,00	66,22%
2	TRANSPORTE					\$ 2.489.000.000,00	21,51%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS					\$ 1.419.000.000,00	12,27%
	TOTAL					\$ 11.568.884.300,00	100,00%

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO - CONTRATO ADICIONAL

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES					\$ 1.290.566.750,00	52,73%
2	TRANSPORTE					\$ 856.625.000,00	35,00%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS					\$ 300.308.250,00	12,27%
	TOTAL					\$ 2.447.500.000,00	100,00%

NOTAS:

- El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
- El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
- Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
- No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
- El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
- Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: 

Nombre: Javier O. Sanabria Jiménez
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 54202-334985

Firma: 

Nombre: Ruth Elena Tabares Zuleta
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-35471 CLD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

 <p>SADING GROUP S.A.S. GRUPO INTECON S.A.S. INTERVENCIÓN Y CONSULTORÍA</p>	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.4763 DE 2023 INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No.10 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</p>	
--	--	---

ANEXO J

MEPI-MN1-IN-2-FR-2

Seguimiento a la inversión del anticipo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			
			FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____				
DATOS GENERALES						
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 11		MES: DIC		INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO I I		
CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023 (Indicar número y año)						
CONTRATO DE FIDUCIA No. _____		DE _____		ENTIDAD FINANCIERA: ALIZANZA FIDUCIARIA S.A FIDEICOMISOS		
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)						
CUENTA BANCARIA No. 4000008399		BANCO BANCOLOMBIA		SUCURSAL: ARAUCA		
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)						
ANTICIPO OTORGADO: 50% %						
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO CONTRATO PRINCIPAL :		\$ 11.568.884.300,00		(M/CTE)		
VALOR DEL ANTICIPO ADICIONAL:		\$ 2.447.500.000,00		(M/CTE)		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.						
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4763 de 2023 (Indicar número y año)						
INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON						
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO						
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FACTURA	CCT No. 046	8-mar-24	COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES SAS	\$ 500.000.000,00	3	MAQUINARIA Y EQUIPOS
FACTURA	CT. No. 047	8-mar-24	CONSTRUIR Y TRANSPORTAR SAS	\$ 1.000.000.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	ASOV 130	12-mar-24	ASOCIACION DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	\$ 98.200.000,00	2	TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 01	20-mar-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	\$ 1.000.000.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	CT. No. 048	20-mar-24	CONSTRUIR Y TRANSPORTAR SAS	\$ 580.000.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	CCT No. 050	11-abr-24	COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES SAS	\$ 919.000.000,00	3	MAQUINARIA Y EQUIPOS
FACTURA	ASOV135	25-abr-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	\$ 96.236.000,00	2	TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 02	8-may-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	\$ 1.000.000.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	ASOV136	10-may-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	\$ 60.984.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	ASOV137	22-may-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	\$ 137.829.300,00	2	TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 03	31-may-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	\$ 1.000.000.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	ASOV138	7-jun-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	\$ 150.000.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	ASOV139	13-jun-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	\$ 33.275.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	FV22	24-jun-24	EDINSON ORLANDO CALVERA VANEGA	\$ 27.437.080,00	2	TRANSPORTE
		24-jun-24	INVERSIONES Y SOLUCIONES ARDILA SAS ZOMAC	\$ 11.241.789,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	ASOV140	28-jun-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	\$ 157.266.000,00	2	TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 03	2-jul-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	\$ 1.000.000.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	FV25	18-jul-24	EDINSON ORLANDO CALVERA VANEGA	\$ 29.465.892,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	ASOV141	11-jul-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	\$ 107.064.939,00	2	TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 04	24-jul-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	\$ 500.000.000,00	1	MATERIALES
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 05	16-ago-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	\$ 1.530.000.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	FACTURA LP 38	16-ago-24	LUIS CARLOS PEREZ MENDEZ	\$ 1.530.000.000,00	1	MATERIALES
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 06	19-sep-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	\$ 90.000.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	ASOV148	15-oct-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	\$ 79.114.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	ASOV149	15-oct-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	\$ 120.886.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	C.P No. 28	17-oct-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	\$ 1.180.868.576,25	1	MATERIALES
FACTURA	FE24	23-oct-24	MAKO INGIN S.A.S	\$ 14.850.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	FEAL327	23-oct-24	ALFONSO SARMIENTO GONZALES	\$ 6.534.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	FV36	23-oct-24	EDINSON ORLANDO CALVERA VANEGA	\$ 6.657.960,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	FV37	23-oct-24	EDINSON ORLANDO CALVERA VANEGA	\$ 23.469.800,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	FV38	7-nov-24	EDINSON ORLANDO CALVERA VANEGA	\$ 12.991.860,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	FE25	7-nov-24	MAKO INGIN S.A.S	\$ 35.046.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	ASOV151	18-nov-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	\$ 160.215.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	FE26	18-nov-24	MAKO INGIN S.A.S	\$ 14.850.000,00	2	TRANSPORTE

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM (CONTRATO PRINCIPAL)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
					VERSIÓN	1
					PÁGINA	

FECHA						31/12/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	--	--	--	--	---------------------------------

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	\$ 7.660.884.300,00	\$ 7.560.000.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ 7.650.000.000,00	\$ 10.884.300,00
2	TRANSPORTE	\$ 2.489.000.000,00	\$ 2.489.000.000,00	\$ -	\$ 2.489.000.000,00	\$ -
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 1.419.000.000,00	\$ 1.419.000.000,00	\$ -	\$ 1.419.000.000,00	\$ -
TOTALES		\$ 11.568.884.300,00	\$ 11.468.000.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ 11.558.000.000,00	\$ 10.884.300,00

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM (CONTRATO ADICIONAL)

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	\$ 1.290.566.750,00		\$ 1.180.868.576,25	\$ 1.180.868.576,25	\$ 109.698.173,75
2	TRANSPORTE	\$ 856.625.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 274.614.620,00	\$ 474.614.620,00	\$ 382.010.380,00
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 300.308.250,00		\$ -	\$ -	\$ 300.308.250,00
TOTALES		\$ 2.447.500.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 1.455.483.196,25	\$ 1.655.483.196,25	\$ 792.016.803,75

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) : _____ \$ _____
 (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: _____ \$ _____
 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES: _____

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.

Firma: _____ Nombre: Javier O. Sanabria Jiménez Representante Legal o Delegado Contratista Matrícula Profesional No.: 54202-334985	Firma: _____ Nombre: Ruth Elena Tabares Zuleta Representante Legal o Delegado Interventor Matrícula Profesional No.: 17202-35471 CLD
--	--

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul Contrato de Interventoría No.4763 de 2023 Informe Mensual de Avance de Obra No.10 Periodo comprendido Del 1 al 31 de Diciembre de 2024</p>	
---	--	---

ANEXO K

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

Programa de obra



PROGRAMACIÓN DE OBRA
CONTRATO 016 DE 2023
CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

		Modo de	ITEM	Nombre de tarea	% completado	UNID	% compl	Costo	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	2024												2025
													Semestre 1, 2024												Semestre 1, 2025
1	✓			CONTRATO DE OBRA 016 DE 2023	71%			\$ 28.032.768.645,10		269 días?	jue 21/12/23	mar 31/12/24													21/12
2	✓			FASE DE PREALISTAMIENTO PARA EJECUCIÓN DE	100%			\$ 0,00		24 días	jue 21/12/23	jun 18/03/24													
3	✓	II		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GATIAN ALTO JORDAN Y PARISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL	81%			\$ 13.070.759.440,61		206 días	mar 19/03/24	mar 31/12/24													19/03
4	✓		1	EXCAVACIONES	100%			\$ 103.289.950,84		20 días	mar 19/03/24	jun 15/04/24													
5	✓	1.1		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES (INCLUYE	100%	M3		\$ 103.289.950,84	4.976,39	20 días	mar 19/03/24	jun 15/04/24													
6	✓		2	ESTRUCTURA DE VÍA	92%			\$ 12.262.960.006,87		197 días	mar 19/03/24	mie 18/12/24													
7	✓	2.1		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	100%	M2		\$ 628.489.400,00	51.800,00	47 días	mar 16/04/24	mie 19/06/24													19/03
8	✓	2.2		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	100%	M3		\$ 835.117.198,56	5.776,08	30 días	mar 19/03/24	jun 29/04/24													
9	✓	2.3		SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBC-60	100%	M3		\$ 2.056.689.257,48	11.262,68	55 días	mar 16/04/24	jun 29/10/24													
10	✓	2.4		BASE GRANULAR CLASE B GRADACION FINA	100%	M3		\$ 1.788.053.566,32	8.053,86	50 días	mar 16/06/24	vie 1/11/24													
11	✓	2.5		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 (anteriormente CRL-1)	68%	M2		\$ 260.761.200,00	51.800,00	32 días	jun 4/11/24	mar 17/12/24													
12	✓	2.6		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	68%	M3		\$ 6.693.879.384,51	4.516,87	32 días	mar 5/11/24	mar 18/12/24													
13	✓		3	OBRAS DE DRENAJE	100%			\$ 475.723.546,72		26 días	mie 9/10/24	mie 13/11/24													
14	✓	3.1		CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU	100%	M3		\$ 10.898.888,28	13,16	20 días	mar 15/10/24	jun 1/11/24													
15	✓	3.2		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	100%	M3		\$ 162.021.362,25	134,97	21 días	mie 16/10/24	mie 13/11/24													
16	✓	3.3		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU	100%	M3		\$ 43.040.482,65	25,85	14 días	jue 24/10/24	mar 12/11/24													
17	✓	3.4		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	100%	KG		\$ 119.542.746,26	14.387,14	26 días	mie 9/10/24	mie 13/11/24													
18	✓	3.5		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 800mm DE DIÁMETRO INTERIOR	100%	M		\$ 125.722.818,00	117,00	21 días	mar 15/10/24	mar 12/11/24													
19	✓	3.6		DEMOLICIÓN DE BOXCOULVERT, ALCANTARILLAS Y CAJONES EN CONCRETO REFORZADO (incluye retiro)	100%	M3		\$ 14.497.249,28	51,11	20 días	jun 14/10/24	vie 8/11/24													
20	✓	4		SERIALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACIÓN VIAL	0%			\$ 97.085.275,00		10 días	mie 18/12/24	mar 31/12/24													
21	✓	4.1		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX (75x75 cm)	0%	UND		\$ 26.844.475,00	35,00	4 días	jue 19/12/24	mar 24/12/24													31/12
22	✓	4.2		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	0%	ML		\$ 70.240.800,00	22.200,00	10 días	mie mar														18/12
23	✓			ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN VIAL	0%			\$ 4.990.093,80		25 días	mie 18/12/24	31/12/24													
24	✓	1P		ACTUALIZACIÓN A CARACTERIZACIÓN VIAL DEL CORREDOR	0%	KM		\$ 4.990.093,80	7,40	25 días	mie mar														
25	✓			ACTIVIDADES MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	0%			\$ 126.680.567,38		27 días	jun 28/11/24	mar 31/12/24													
26	✓			OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	0%	UND		\$ 126.680.567,38	1,00	27 días	jun 25/12/24	mar 31/12/24													
27	✓	I		EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CARO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA	96%			\$ 14.962.095.204,49		166 días?	mar 14/06/24	31/12/24													14/05
28	✓	1.1.2		EXCAVACIONES Y RELLENOS	96%			\$ 7.138.770.426,99		124 días	mar 14/05/24	vie 1/11/24													
29	✓	1.1.2.1		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN ENTRE 0-2 M. (incluye Transporte)	80%	m3		\$ 31.553.968,63	1.119,61	10 días	mar 14/05/24	jun 27/05/24													
30	✓	1.1.2.2		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	80%	m3		\$ 204.999.880,16	1.092,68	10 días	mar 14/05/24	jun 27/05/24													
31	✓	1.1.2.3		TERMINALES	100%	m3		\$ 9.902.216.577,80	55.304,45	61 días	mar 14/05/24	vie 1/11/24													
32	✓	1.1.3		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	9%			\$ 6.298.818.599,09		32 días	jun 18/11/24	mar 31/12/24													
33	✓	1.1.3.1		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	17%	m2		\$ 460.347.859,40	37.941,80	26 días	jun 18/11/24	jun 23/12/24													31/12
34	✓	1.1.3.2		ESTABILIZACIÓN QUÍMICA DE TIERRAPLEN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGÁNICA	8%	m3		\$ 3.302.629.452,96	9.322,16	26 días	jun 18/11/24	jun 23/12/24													18/11
35	✓	1.1.3.3		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 (anteriormente CRL-1)	0%	m2		\$ 188.658.211,20	37.476,80	11 días	jun 16/12/24	jun 30/12/24													
36	✓	1.1.3.4		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	0%	m3		\$ 3.347.183.075,53	2.229,29	11 días	mar 17/12/24	31/12/24													
37	✓	1.1.4		SERIALIZACIÓN	0%			\$ 234.092.778,00		6 días	mar 24/12/24	mar 31/12/24													
38	✓	1.1.4.1		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX (75x75 cm)	0%	UND		\$ 24.520.672,00	32,00	3 días	jue 26/12/24	jun 30/12/24													
39	✓	1.1.4.2		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO (LÍNEAS CENTRALES Y/O LATERALES)	0%	m		\$ 47.951.080,00	15.160,00	3 días	vie 27/12/24	mar 31/12/24													
40	✓	1.1.4.3		TACHA RETRORREFLECTIVA - ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO	0%	UND		\$ 12.435.232,00	1.264,00	3 días	vie 27/12/24	mar 31/12/24													
41	✓	1.1.4.4		DEFENSA VEHICULAR METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO	0%	m		\$ 141.341.757,00	439,00	5 días	mar 30/12/24	jun 30/12/24													
42	✓	1.1.4.5		CAPTAFAJOS	0%	UND		\$ 1.685.670,00	115,00	2 días	jun 30/12/24	mar 31/12/24													
43	✓	1.1.4.6		DELINADOR DE CURVA HORIZONTAL SIMPLE (50 m X 40 m)	0%	UND		\$ 6.158.367,00	9,00	2 días	jun 30/12/24	mar 31/12/24													
44	✓	1.2		OBRAS DE DRENAJE	94%			\$ 1.111.786.315,08		89 días?	mar 28/05/24	vie 27/09/24													27/09
45	✓	1.2.1		PRELIMINARES	100%			\$ 16.708.426,24		5 días	mar 28/05/24	jun 3/06/24													28/05
46	✓	1.2.1.1		DEMOLICIÓN DE BOXCOULVERT, ALCANTARILLAS Y CAJONES EN CONCRETO REFORZADO (incluye retiro)	100%	m3		\$ 15.708.426,24	55,38	5 días	mar 28/05/24	jun 3/06/24													28/05
47	✓	1.2.2		EXCAVACIONES Y RELLENOS	62%			\$ 104.391.965,64		85 días	mar 28/05/24	jun 23/09/24													
48	✓	1.2.2.1		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN ENTRE 0-2 M.	100%	m3		\$ 15.523.196,40	550,80	5 días	mar 4/06/24	jun 23/09/24													
49	✓	1.2.2.2		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	0%	m3		\$ 1.244.375,40	30,92	5 días	mar 28/05/24	jun 3/06/24													
50	✓	1.2.2.3		RELLENO Y COMPACTACIÓN MATERIAL SELECCIONADO	100%	m3		\$ 87.624.393,84	375,88	3 días	mar 30/07/24	jue 1/08/24													
51	✓	1.2.3		CONCRETOS	100%			\$ 814.703.002,80		89 días?	mar 28/05/24	vie 27/09/24													
52	✓	1.2.3.1		CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU	100%	m2		\$ 5.457.408,00	6,40	10 días	mar 28/05/24	jun 23/09/24													
53	✓	1.2.3.2		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	100%	m3		\$ 590.951.852,40	358,80	16 días	mar 9/07/24	vie 27/09/24													
54	✓	1.2.3.3		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 800mm DE DIÁMETRO	100%	m		\$ 193.419.900,00	180,00	8 días	mar 11/06/24	mar 24/09/24													
55	✓	1.2.3.4		CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU	100%			\$ 24.873.842,40	29,17	10 días?	mar 28/05/24	jun 23/09/24													
56	✓	1.2.4		ACERO DE REFUERZO	100%			\$ 176.982.920,40		71 días	vie 21/06/24	vie 27/09/24													
57	✓	1.2.4.1		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	100%	kg		\$ 176.982.920,40	21.238,80	23 días?	vie 21/06/24	vie 27/09/24													
58	✓			MOVIMIENTO RED ELÉCTRICA	100%			\$ 57.663.171,48		4 días?	jun 10/10/24	jue 17/10/24													
59	✓			LOCALIZACIÓN Y REPLANTIO MT	100%			\$ 171.394,08		1 día	jun 14/10/24	jun 14/10/24													
60	✓			REPLANTIO TOPOGRÁFICO ELÉCTRICO MT	100%			\$ 171.394,08		1 día	jun 14/10/24	jun 14/10/24													
61	✓			APÓSOS MT	100%			\$ 12.759.228,80		3 días?	mar 15/10/24	jue 17/10/24													
62	✓			CONCRETO 3000 PS (incluye material, mano de obra y herramienta y equipos)	100%			\$ 2.047.456,80	1,80	3 días?	mar 15/10/24	jue 17/10/24													



PROGRAMACIÓN DE OBRA
CONTRATO 016 DE 2023
CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	% completado	LIND	% comp	Costo	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	2024												2025											
												Semestre 1, 2024												Semestre 1, 2025											
63	✓		POSTE EN CONCRETO 12 M X 2050 KG (Incluye suministro, transporte y proceso de hizada y aplomada)	100%	10...	100%	\$ 9.185.136,00	2,00	1 día	mar 15/10/24	mar 15/10/24																								
64	✓		DESHINCADO Y DEMOLICIÓN POSTE 12 M (Incluye demolición)	100%	10...	100%	\$ 1.526.636,00	2,00	1 día	mar 15/10/24	mar 15/10/24																								
65	✓		VESTIDA/ARMADA POSTES MT	100%	10...	100%	\$ 11.503.574,00	3 días	3 días	mar 15/10/24	jue 17/10/24																								
66	✓		ESTRUCTURAS S23 REFERENCIA ICEL (Incluye el suministro, transporte y montaje de la estructura)	100%	10...	100%	\$ 710.849,00	1,00	2 días	mié 16/10/24	jue 17/10/24																								
67	✓		ESTRUCTURA 533 REFERENCIA ICEL (Incluye el suministro, transporte y montaje de la estructura)	100%	10...	100%	\$ 1.160.615,00	1,00	2 días	mié 16/10/24	jue 17/10/24																								
68	✓		ESTRUCTURA 560 ICEL (Incluye el suministro, transporte y montaje de la estructura)	100%	10...	100%	\$ 3.072.512,00	1,00	2 días	mié 16/10/24	jue 17/10/24																								
69	✓		ESTRUCTURA 710 ICEL MONTAJE TRAF0 1F CON PA1 Y PROTECCIÓN DE TRAF0 (Incluye Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	100%	10...	100%	\$ 5.638.150,00	1,00	2 días	mié 16/10/24	jue 17/10/24																								
70	✓		DESAMONTE DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION	100%	10...	100%	\$ 921.448,00	4,00	1 día	mar 15/10/24	mar 15/10/24																								
71	✓		TEMPLETES MT	100%	10...	100%	\$ 2.858.812,00	1 día	1 día	jue 17/10/24	jue 17/10/24																								
72	✓		TEMPLETE DIRECTO A TIERRA / MEDIA TENSION (Incluye Suministro, Transporte e Instalación)	100%	10...	100%	\$ 2.858.812,00	4,00	1 día	jue 17/10/24	jue 17/10/24																								
73	✓		VESTIDA/ARMADA POSTES MT	100%	10...	100%	\$ 370.163,00	3 días	3 días	mar 15/10/24	jue 17/10/24																								
74	✓		DESAMONTE DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION	100%	10...	100%	\$ 140.918,00	1,00	1 día	mar 15/10/24	mar 15/10/24																								
75	✓		ESTRUCTURA 619 CIRCUITO SECUNDARIO (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	100%	10...	100%	\$ 229.245,00	1,00	2 días	mié 16/10/24	jue 17/10/24																								
76			ACTIVIDADES MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	0%	0%	0%	\$ 148.313.198,88	25 días	25 días	mié 27/11/24	mar 31/12/24																								
77			OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL V/O COMPLEMENTARIAS	0%	0%	0%	\$ 148.313.198,55	25 días	25 días	mié 27/11/24	mar 31/12/24																								
78			ACTIVIDADES DE CARACTERIZACION VIAL	0%	0%	0%	\$ 2.555.738,41	25 días	25 días	mié 27/11/24	mar 31/12/24																								
79			ACTUALIZACIÓN A CARACTERIZACION VIAL DEL CORREDOR (2,86 KM + 0,93KM)	0%	0%	0%	\$ 2.555.738,41	25 días	25 días	mié 27/11/24	mar 31/12/24																								
80			SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0%	0%	0%	\$ 8.976,89	1 día?	1 día?	vie 13/12/24	vie 13/12/24																								
81			Saldo favor del municipio	0%	0%	0%	\$ 8.976,89	1 día?	1 día?	vie 13/12/24	vie 13/12/24																								

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.4763 DE 2023 INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No.10 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</p>	
---	--	---

ANEXO L

MEPI-MN-IN-6-FR-1

Programa de inversiones o reprogramación al programa de inversiones

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul Contrato de Interventoría No.4763 de 2023 Informe Mensual de Avance de Obra No.10 Periodo Comprendido Del 1 al 31 de Diciembre de 2024</p>	
---	--	---

ANEXO M

MEPI-MN-IN-6-FR-2

Seguimiento al programa de inversiones

 <p>SADING GROUP S.A.S. GRUPO INTECON S.A.S. INTERVENCIÓN Y CONSULTORIA</p>	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.4763 DE 2023 INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No.10 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</p>	 <p>CALIDAD INVIAS</p>
--	--	---

ANEXO N

MEPI-MN-IN-14-FR-1

Actas de comité de obra

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">ACTA DE COMITÉ DE OBRA</p>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA <div style="text-align: right;">5/12/2024</div> <div style="text-align: right; font-size: small;">(Día / Mes / Año)</div>
--	--

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 30
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vías regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Casanare

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Seguimiento al avance del proyecto

Definir la prórroga del contrato de interventoría 4763 de 2023

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Inicialmente toma la palabra la ingeniera joana ochica (Gestora del proyecto) saludando a todos los presentes y expresando que el motivo del presente comité tiene que ver con el adicional de plazo solicitado por el contratista de obra y posteriormente por la interventoría para aumentar el plazo contractual hasta el 31 de diciembre del presente año.

De esta manera solicita realizar un plan de contingencia de acuerdo a los rendimientos que se han obtenido en el transcurso del proyecto y realizar una proyección de lo que se pretende ejecutar hasta el 31 de diciembre, por otra parte se recomienda que lo que se pretende ejecutar debe quedar de manera funcional.

Dicho esto el contratista de obra e interventoría se comprometen a entregar para el día 6 de diciembre, los documentos que respaldan lo solicitado por la ingeniera.

De esta manera la ingeniera concluye el comité, indicando que espera que se supla con el compromiso adquirido y expresando que desde el instituto se realiza la gestión con el de brindar las condiciones para que el proyecto se logró ejecutar al 100 %.



COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE -	6/12/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, CONSORCIO SADINTECON
PROXIMO COMITÉ	13/12/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, CONSORCIO SADINTECON , SECRETARIA DE PLANEACIÓN FORTUL

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 13/12/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:


- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES: (Anexo Lista Asistencia Física y Virtual)

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Wilmer Riatiga Ocampo	Secretario de Planeación e Infraestructura	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	Asistencia Virtual
Narly Yardiñ Caro Sambrano	Apoyo supervisión cto de obra	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	Asistencia Virtual
Monica L. Montenegro	Supervisor - Interventoría	Dirección territorial Casanare - Inviás	Asistencia Virtual
Joanna A. Ochica	Gestor técnico del proyecto	Dirección territorial Casanare - Inviás	Asistencia Virtual
Jhon Fredy Pachón	Apoyo supervisión - Inviás	Dirección territorial Casanare - Inviás	Asistencia Virtual
Javier E. Fuentes capacho	Director de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Adalberto Alarcón Olaya	Ingeniero Director de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ASISTENCIA VIRTUAL

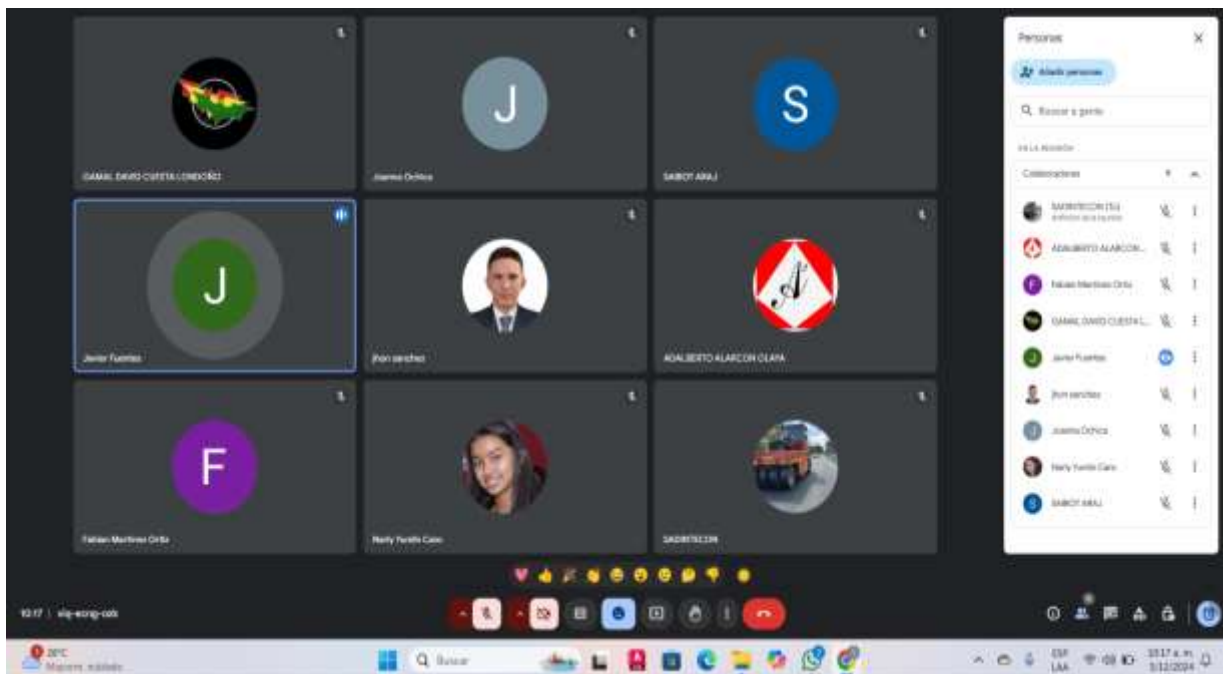

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	17/12/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 31
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vías regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Casanare

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON





LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
Seguimiento al avance del proyecto, desde los componentes técnico, ambiental, social y sst.
Revisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
<p>Inicialmente toma la palabra el director de la interventoría mencionando los compromisos que se han adquirido y que es necesario dar cumplimiento a cada uno de éstos, para que el proyecto avance de manera adecuada. Dicho esto se da la palabra al componente ambiental.</p>
<p>COMPONENTE AMBIENTAL:</p> <p>Desde el componente ambiental por parte de la interventoría se sostuvieron reuniones con el área ambiental de invías (sostenibilidad), con el ingeniero Santiago, dando respuesta a observaciones realizadas desde el invías a él plan de inversión ambiental remitido. En esta reunión se habló de que dado los tiempos y a la entrega de manera extemporánea de la información por parte del contratista, a la fecha no será posible realizar las compensaciones del proyecto (culminación de proyecto el 31 de diciembre) pese a los constantes requerimientos de la interventoría en este tema; por esta razón el plan de inversión ambiental 1 se entrega en cero (0). Y una vez por parte del contratista y el municipio se defina el estado de las compensaciones del proyecto y este se informe a la interventoría se informará a invías con el fin de validar si se realiza la actualización del plan de inversión ambiental 2.</p> <p>Por parte de la interventoría se solicita al contratista y el municipio informar en qué estado se encuentra el tema de las compensaciones del proyecto, que se ha hablado con la corporación ambiental Corporinoquia. Se informa por parte del contratista se entrega el permiso ambiental actualizando y modificando el permiso único ambiental del proyecto.</p> <p>El contratista responde a estos temas de la siguiente manera: El día 4 de diciembre se hace entrega de la última resolución en la cual se establece un total de 5,58 Ha para compensar, en la semana en curso por parte de la gerencia de la empresa cónica soluciones y el consorcio se encuentra en Yopal reuniéndose con la corporación (Corporinoquia), dado a que a los cambios que se han dado de manera administrativa no se ha dado una respuesta del acta de concertación a las compensaciones del proyecto. La interventoría queda a la espera de una respuesta dado que este plan de inversión en caso de que se resuelva el acta de concertación se remitirá un plan de inversión ambiental 2 a el invías para su visto bueno. La interventoría solicita al contratista iniciar con la entrega de la documentación requerida dentro del área ambiental para la adecuada liquidación del contrato. El contratista manifiesta que en el drive se iniciará a montar la información en la carpeta denominada formatos.</p>

<p>La Interventoría le recuerda al Contratista la importancia de darle celeridad a la entrega del balance ambiental a la terminación del contrato con toda su documentación anexa para que puedan ser allegados a la Interventoría dentro del plazo contractual. Para ello es importante que el Contratista gestione a tiempo los insumos necesarios para completar los archivos que deben ser entregados en los anexos de dicho balance ambiental.</p> <p>Se solicita el envío de los informes de cumplimiento ambiental y recomendaciones exigidas en el permiso ambiental único previo a su radicación a la Autoridad Ambiental, para su revisión y visto bueno por parte de la Interventoría. Ante esto el Contratista manifiesta que ya creó un enlace por Google Drive de manera que se pueda ir revisando la información en tiempo real y plasmar las observaciones que sean necesarias para su corrección y elaboración de los documentos finales.</p> <p>La Interventoría solicita que el Contratista envíe con tiempo suficiente las cartas de certificación ante la Autoridad Ambiental, con relación a la no existencia de procesos en curso ni pendientes con Corporinoquia por la ejecución del contrato de obra. Requisito que es indispensable para que la Interventoría pueda generar el certificado al Inviás de que el Consorcio Vial Rural Fortul no tiene pasivos ni pendientes ambientales en el marco del contrato, sino que las obligaciones ambientales derivadas del permiso ambiental están a cargo del Municipio de Fortul, quien es el titular del permiso único ambiental del proyecto, que contempla concesión de aguas, ocupación de cauce y aprovechamiento forestal.</p>	
<p>COMPONENTE SOCIAL:</p> <p>Desde el Componente Social se realizaron las reuniones de veeduría en cada uno de los sectores, teniendo en cuenta los tiempos contractuales, dichos espacios fueron los últimos. Teniendo en cuenta lo anterior, los veedores realizaron un informe de la gestión realizada, los seguimientos realizados y los compromisos faltantes, los cuales deben estar subsanados al realizar la reunión de finalización de obra; por otro lado, en la reunión de la veeduría de Caño Flores se indaga acerca de la compensación forestal ya que a la fecha el Contratista no ha realizado actividades relacionadas con esto.</p> <p>Se realizó capacitación al personal de obra en el sector de Caño Flores y en articulación con la Alcaldía en el sector de Palmarito. Una vez terminadas las actividades constructivas se deben realizar las reuniones de finalización de obra en cada uno de los sectores y en esta semana se dará inicio al cierre de las actas de vecindad en el sector de Palmarito.</p> <p>COMPONENTE SST:</p> <p>Desde el componente SST se reitera que han existido recomendaciones por parte de la interventoría respecto a la entrega a tiempo de seguridad social, para proceder a la revisión. Se reitera la importancia de comunicar los ingresos de personal antes del previo ingreso Con certificados de afiliación de eps, arl caja compensación y pensionelación de personal en campo. En comunicación verbal con el director de obra del contratista nos informa que antes del 24 de diciembre algunas liquidaciones ya quedarían a paz salvo. Informe de diciembre por parte del contratista se solicita a más tardar para el 21 para luego Interventoría iniciar la revisión y posterior aprobación, debiso a que l.l pazo contractual del proyecto vence el 31 de octubre de 2024.</p> <p>COMPONENTE TÉCNICO:</p> <p>Desde el componente técnico, la interventoría manifiesta que el proyecto actualmente (12/12/2024) presenta un avance ejecutado acumulado financiero de 75,82% y que según el seguimiento a la programación contractual el proyecto presenta un atraso de 5,4 % en su ejecución, teniendo en cuenta reprogración segun prórroga No. 02 (Hasta 31 de diciembre de 2024). Por otra parte se menciona que a la fecha el contratista de obra está trabajando apesar de las dificultades que se han presentado tales como el clima y contratiempos en las plantas de asfalto de la región. Dicho lo anterior la interventoría consulta sobre la posibilidad de establecer un adicional de tiempo con el fin de poder realizar el seguimiento a la ejecución de obra hasta que se encuentre al 100% .</p> <p>Toma la palabra el ingeniero Jhon fredy pachón y menciona que existe una posibilidad por medio del INVIAS de que se pueda otorgar el adicional de tiempo para la Interventoría, pero establece el compromiso que para día 18/12/2024 se entreguen la solicitud y documentos que respalden la prórroga para realizar los trámites pertinentes. De esta manera se da por terminado el comité técnico, mencionado que se espera que se cumplan todos los compromisos adquiridos.</p>	

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES	
Cargar la información completa del balance ambiental a la terminación de contrato en el drive para revisión y aprobación de la Interventoría.	PROXIMA SEMANA	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	
Enviar carta a Corporinoquia solicitando la certificación de no existencia de procesos en curso en el marco del contrato de obra.	PROXIMA SEMANA	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	
Revisión de información ambiental cargada en el drive	PROXIMA SEMANA	CONSORCIO SADINTECON	
ENTEGA DE SOLICITUD DE PRORROGA Y DOCUMENTOS DE SOPORTE	18/12/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL - CONSORCIO SADINTECON	
PROXIMO COMITÉ	23/12/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, CONSORCIO SADINTECON , SECRETARIA DE PLANEACIÓN FORTUL	
FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 23/12/2024 (Día / Mes / Año)			
NOTAS: 1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra. 2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente. 3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.			
LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES: (Anexo Lista Asistencia Física y Virtual)			
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Wilmer Riatiga Ocampo	Secretario de Planeación e Infraestructura	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	Asistencia Presencial
Narly Yardin Caro Sambrano	Apoyo supervisión cto de obra	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	Asistencia Presencial
Rubén Alonso Borrero Campos	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Javier E. Fuentes capacho	Director de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Presencial
Esteban Pico Méndez	Ingeniero Auxiliar interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Presencial
Eliane Lopez Portilla	Profesional Social Interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Gamal David Cuesta	Ingeniero Ambiental Interventoría	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Esneider D. Fuentes Zárate	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Harry Mena Mosquera	Especialista Ambiental	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Andrés Felipe Gelves Ferrer	Ing apoyo ambiental - obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Javier O. Sanabria Jimenez	Residente de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Wilfredo Ramirez Ramirez	Ingeniero Ambiental de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Monica L. Montenegro	Supervisor - Interventoría	Dirección territorial Casanare - Invias	Asistencia Virtual
Jhon Fredy Pachón	Apoyo supervisión - Invias	Dirección territorial Casanare - Invias	Asistencia Virtual
Adalberto Alarcón Olaya	Ingeniero Director de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Presencial
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial			

ASISTENCIA VIRTUAL

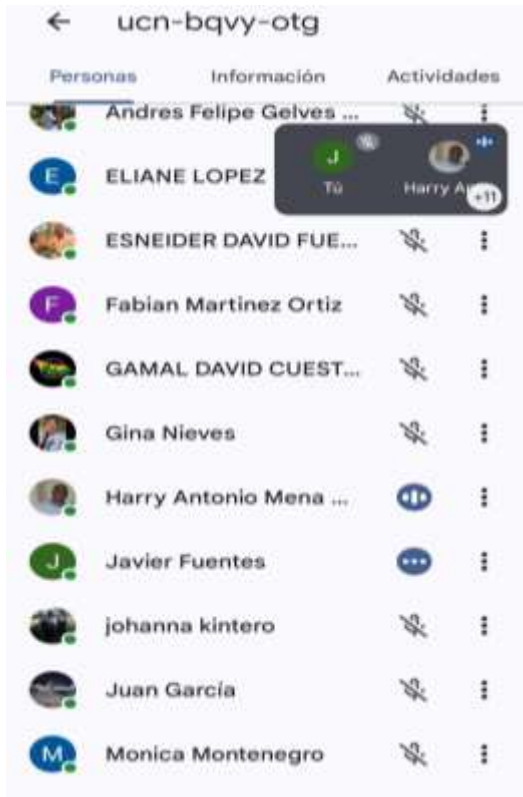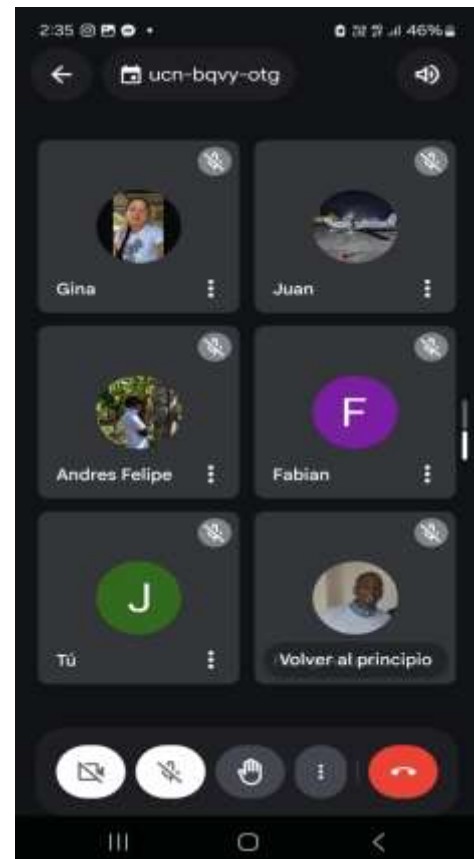



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT - 800136069-4

GESTION DE LA INFORMACION - ATENCIÓN AL CIUDADANO

CONTROL DE ASISTENCIA



Código:
F-GIN-AC-M01-01

Versión: 01
Página 1-1

Fecha: 31/12/2018

FECHA: 17 Diciembre 2024 LUGAR: Sec. Planeación e Infraestruct. Fortul PROGRAMA:
TEMA: Comité Obra No 31 DEPENDENCIA:

ITEM	NOMBRE COMPLETO	TIPO DOC	DOCUMENTO IDENTIDAD	EDAD	GÉNERO		Afro	Indígena	ENFOQUE DIFERENCIAL			INSTITUCION / ENTIDAD	CARGO	CORREO	DIRECCION	No. CELULAR	FIRMA					
					M	F			DESCAPACITADO	VICTIMA												
											SI, Y NO REGISTRADO							NO	DESPLAZAMEN TO FORZADO	HOMICIDIO	DESAPARICION FORZADA	OTRO
1	Javier E. Fuentes C.	cc	13.721.542.45	X																		
2	Jean Johana Estriz	cc	44.684.782		X																	
3	Adalberto Olavea	cc	39.844.39	X																		
4	Esteban Piro Mendez	cc	10.518.062	X																		
5	Juan Carlos Garcia	cc	11.10.48.98	X																		
6	Luisa Heryny	cc	10.7.30.614	24																		
7	Nary Caro C.	cc	10.14.7.510.30		X																	
8	Milene Zúñiga Durán	cc	10.06.11.28.31	X																		
9																						
1																						
0																						

RESPONSABLE: _____

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">ACTA DE COMITÉ DE OBRA</p>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	20/12/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
-------	--

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 32
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vías regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Casanare

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
Solicitud de adicional de plazo para el contrato de obra 016 de 2023

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
<p>Inicialmente toma la palabra el director de obra mencionando que siempre ha contado con toda la disposición técnica, profesional y logística, pero que han existido motivos y razones de terceros que han afectado la continuidad en este proceso constructivo, lo cual se ha venido compensando en los días en que las condiciones sean las apropiadas, pero al depender de factores externos y/o de terceros no ha sido posible avanzar con la celeridad que requiere el proyecto. Dicho esto y teniendo en cuenta que el contrato de obra tiene un plazo contractual a 31 de diciembre del presente año, el contratista de obra solicita el análisis y aprobación para que se le otorgue un plazo adicional de 60 días, con el fin de dar por finalizado todas las actividades contractuales al 100%.</p>
<p>La interventoría manifiesta que ya recibió el oficio de solicitud formal de prórroga por parte del consorcio Vial Rural fortul y que realizará el AVAL para dicha solicitud y radicará ante la administración municipal.</p>
<p>La administración municipal manifiesta que una vez reciba la solicitud de manera formal con los soportes que la respalden, tales como el aval de parte de la interventoría, procederá con el conducto regular para otorgar el adicional de tiempo al contrato.</p>



COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
AVAL SOLICITUD DE PRÓRROGA	PROXIMA SEMANA	CONSORCIO SADINTECON
PROXIMO COMITÉ	PROXIMA SEMANA	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, CONSORCIO SADINTECON , SECRETARIA DE PLANEACIÓN FORTUL
FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA	27/12/2024 (Día / Mes / Año)	

NOTAS:

- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES: (Anexo Lista Asistencia Física y Virtual)

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Wilmer Riatiga Ocampo	Secretario de Planeación e Infraestructura	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	Asistencia Virtual
Narly Yardiñ Caro Sambrano	Apoyo supervisión cto de obra	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	Asistencia Virtual
Rubén Alonso Borrero Campos	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Javier E. Fuentes capacho	Director de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Esneider D. Fuentes Zárata	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Javier O. Sanabria Jimenez	Residente de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	
Adalberto Alarcón Olaya	Ingeniero Director de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ASISTENCIA VIRTUAL




 <p>SADING GROUP S.A.S. GRUPO INTECON S.A.S. INTERVENCIÓN Y CONSULTORIA</p>	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.4763 DE 2023 INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No.10 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</p>	
--	--	---

ANEXO O

MEPI-MN-IN-14-FR-2

Actas de reunión



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA 11 / 08 / 2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 016 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

Palmarito

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Cierre del comité de veeduría ciudadana.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Informe del seguimiento de la veeduría a las actividades desarrolladas por el contratista
- Compromisos por cumplir.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO NACIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

FECHA 11 / 06 / 2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a la 3:40pm en el salón comunal de la vereda Palmarito.

Toma la palabra la profesional Social del contratista quien expone el objetivo de la reunión y da apertura.

Seguidamente interviene la profesional Social de Interventoría y manifiesta que el día de hoy se le da cierre a la veeduría ciudadana del proyecto, indica que así como se hizo la reunión de apertura de la veeduría, hoy se debe empezar a darle cierre, indica que hasta ahora el contrato debe finalizarse el 31 de diciembre según el adicional de plazo, lo que significa que una posible fecha para la reunión de cierre del contrato sería mitad de enero. Se le indica a la veeduría que deben diligenciar un informe donde se plasme el seguimiento que ha realizado esta a las actividades del contrato, así como los compromisos que quedan por cumplir por parte del contratista.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP1-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA 13/01/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 016 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

ALINAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

Caño Flores

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Copacitar al personal en la implementación de enfoque de género y diversidad en el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos de infraestructura vial, a fin de promover la igualdad de oportunidades, la inclusión y el empoderamiento de grupos vulnerables

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Género y diversidad



FECHA 13-DIC-2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la actividad a las 6:40 am.

Un integrante del grupo lidera una oración, y seguido ejercicios de estiramiento muscular.

Se explica al grupo el objetivo de la actividad y se da orientaciones.

Seguido cada participante comparte una experiencia personal con respecto del tema mientras los demás participantes escuchan activamente.

Se abre un espacio para que quien desee comparta su comprensión de lo que escuchó.

Se reflexiona al rededor del género y la diversidad y con esto se finaliza la actividad.



ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL

Sector: Caño Flores

Fecha: 13-01-2024

Tema: Género y diversidad.

Objetivo: Capacitar al personal en la implementación de enfoque de género y diversidad en el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos de infraestructura vial, a fin de promover la igualdad de oportunidades, la inclusión y el empoderamiento de grupos vulnerables o históricamente marginados.

Empoderamiento de grupos vulnerables o históricamente marginados																	
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN	GENERO				IDENTIFICACIÓN ÉTNICA					ENFOQUE DIFERENCIAL				
				F	M	NO-BINARIO	OTRO	Cual	AFRO	GITANO	RAIZAL	RRON-GITANO	PALENGUERO	LGBTQ+	DISCAPACIDAD	VÍCTIMA CONFLICTO	
1	Ramiro Ullalba	3235735	Caño Flores		X												
2	HERNANDO HUERFANO	17344078	La 20		X												
3	Tomas LUGO	10328347	Caño Flores		X												
4	Ivan Dario Sierra	1116801241	La 20		X												
5	Vilmo Ruao G	19147344	La 20		X												
6	Laura Acevedo A	1116792616	La 20	X													
7	Maryuri Daniela Ortega	111981598	La 20	X													
8	Freddy Johan Berrojo	1007167591	La 20		X												
9	Dumar villarroel X	1119182031	Caño Flores		X												
10	Alis Ramirez	1116855318	La 20		X												
11	FREDDY CAICEDO	111573189	La 20		X												
12	Leini Johana		Interventoría	X													
13	Gina Nieves	1116796838		XX													
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

REGISTRO FOTOGRÁFICO CAPACITACIÓN CON EL PERSONAL CAÑO FLORES





**DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE FORTUL
JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA CAÑO FLORES**



PERSONERIA JURIDICA:4573 DE 1977

Fortul 22 de noviembre del 2024

Referencia: Certificación

La junta de acción comunal de la vereda Caño flores certifica que la señorita: ALIX MILEIDY RAMIREZ NIÑO Identificado con C.C 1.116.855.318 de Fortul-Arauca vive en esta vereda en la actualidad y se encuentra afiliado a la junta de acción comunal


YERQUINSON BURGOS
Presidente. J.A.C.
C.C.1.116.786.407



**DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE FORTUL
Junta de Acción Comunal
Vereda caño flores
PERJONERIA JURIDICA: 4573 de 1977**

Fortul 25 de Noviembre de 2024

Referencia: Certificación

La junta de acción comunal de la vereda **CAÑO FLORES** certifica que la señorita **YOLIBE TOVAR DIAZ** identificada con C.C. 1.116.785.310 de Fortul Arauca actualmente vive en esta vereda desde hace 1 año

En constancia firma:

YERQUINSON BURGOS

Presidente J.A.C.

C.C. 1.116.786.407

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONVOCATORIA A REUNIONES



Reunión CVC

La **Alcaldía Municipal de Fortul** y el **Instituto Nacional de Vías (INVIAS)** a través del contratista **Consorcio Vial Rural Fortul** y la Interventoría **Consorcio Sadecon**, invita a la veeduría ciudadana del sector de Caño Flores a participar del comité que se llevará a cabo en el salón comunal de esta vereda el día **Jueves 12 de Diciembre a las 3:00 p.m.**



Jueves 12 de
Diciembre de 2024



3:00 pm



Salón comunal de
la Vereda Caño
Flores

www.invias.gov.co



Reunión CVC

La **Alcaldía Municipal de Fortul** y el **Instituto Nacional de Vías (INVIAS)** a través del contratista **Consorcio Vial Rural Fortul** y la Interventoría **Consorcio Sadecon**, invita a la veeduría ciudadana del sector de Palmarito a participar del comité que se llevará a cabo en el salón comunal de esta vereda, el día **Miércoles 11 de Diciembre a las 3:00 p.m.**



Miércoles 11 de
Diciembre de 2024



3:00 pm



Salón comunal de la
Vereda Palmarito

www.invias.gov.co



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA 12/01/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 018 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

Caño Flores.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Cierre del comité de veeduría ciudadana.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Informe del seguimiento de la veeduría a las actividades desarrolladas por el contratista.*
- Compromisor por cumplir.*



FECHA 12/DIC/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a la 3:20 pm en el salón comunal de la vereda Caño Flores.

Toma la palabra la profesional social del contratista quien expone el objetivo de la reunión y da apertura a la reunión.

Seguidamente interviene la profesional social de interventoría manifiesta que el día de hoy se hace la reunión de cierre de la veeduría.

Un representante de la comunidad manifiesta al día de hoy hay varios compromisos que faltan por cumplir por lo que solicitan cumplirlos en el menor tiempo posible, y preguntan por la compensación ambiental; a esto el ingeniero director de obra refiere que Corporinoquia no ha tenido disposición para reunirse y dar a conocer una conclusión para este tema.

Así mismo el ingeniero de obra manifiesta que los compromisos que se han adquirido, se van a cumplir tan pronto se finalice con el asfalto, pues por ahora este es compromiso más importante.

Se le indica a la veeduría que el día de hoy se debe diligenciar un informe que detalle las actividades que esto le ha hecho seguimiento, así como los compromisos que quedan por cumplir por parte del contratista.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	3

FECHA 12-DIC-2020
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Esteban Pico Méndez	Ing. A. Interventoría	CONSORCIO SADIINTECON	
Adalberto Alarcón	Director de obra	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	
Elaine López P.	Prof. Social	CONSORCIO SADIINTECON	
Josue E. Fuentes Cordero	Director Interv.	CONSORCIO SADIINTECON	
Javier Ortiz C	Veedor	J.A.C. San Francisco	
Leini Yohanna	Supervisor Interventoría	CONSORCIO SADIINTECON	
Alfredo Torres Veedor	Veedor	San Francisco	
BERNARDINO BAGO	VEEDOR	J.A.C. FLOJO	
DURAZO DUVERIS PINTO	VEEDOR	V. Caracoles	

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Veeduría Caño Flores.

Desde la veeduría del Sector de Caño Flores se han realizado seguimiento a las siguientes actividades:

- Obras de arte.
- Postes eléctricos.
- Calidad del material.
- Cambio de la obra de arte K0+000
- Variación en el nivel desde K0+000 al K0+140.
- Seguimiento a la arbolización
-

Como veedores registramos que falta por cumplir los siguientes compromisos:

- Mantenimiento de la vía Caracol la 20
- Mantenimiento desde el final de la obra hasta San Francisco.
- Transición del inicio y final al nivel existente.
- Arreglar accesos.
- Dragado de tercera alcantarilla del tramo adicional (pendiente autorización por parte de la veeduría).
- Dragado de la alcantarilla K0+000 hasta K0+700 margen derecho
- Destaponamiento a Caño en la finca de don Luis.

REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE CIERRE DE VEEDURÍA





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA 11 / 01 / 2014
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 016 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4763 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

Palmarito

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Cierre del comité de veeduría ciudadana.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Informe del seguimiento de la veeduría a las actividades desarrolladas por el contratista
- Compromisos por cumplir.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO NACIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

FECHA 11 / 06 / 2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a la 3:40pm en el salón comunal de la vereda Palmarito.

Toma la palabra la profesional Social del contratista quien expone el objetivo de la reunión y da apertura.

Seguidamente interviene la profesional Social de Interventoría y manifiesta que el día de hoy se le da cierre a la veeduría ciudadana del proyecto, indica que así como se hizo la reunión de apertura de la veeduría, hoy se debe empezar a darle cierre, indica que hasta ahora el contrato debe finalizarse el 31 de diciembre según el adicional de plazo, lo que significa que una posible fecha para la reunión de cierre del contrato sería mitad de enero. Se le indica a la veeduría que deben diligenciar un informe donde se plasme el seguimiento que ha realizado esta a las actividades del contrato, así como los compromisos que quedan por cumplir por parte del contratista.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	3

FECHA 11 / 01 / 2024
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

(Día / Mes / Año)

NOTAS:

- Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Dmaira Vega	Vicedoria	Vda Palmarito	
Nilson Rios	Vicedoria	Vda Alto Jordan	
Esteban Pico Merluz	Ing. A. Interventoría	Consortio Sadintercon	
Edgar Ruiz	Inspector interventor	Sadintercon	
Juan Carlos Garza S.	Topógrafo	Consortio Sadintercon	
Elvira Lopez P.	Prof. Social	Consortio Sadintercon	
Gina Nieves T	Prof. Social	Consortio un R.F.	Gina Nieves

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Palmorito, 12 Diciembre 2024

* GESTION REALIZADA DESDE LA VEREDURIA

Desde el inicio de la obra de la pavimentación se le realizó seguimiento; las dudas fueron presentadas al personal idóneo los cuales nos dieron solución y fueron aclarados.

Los pequeños inconvenientes presentados por la comunidad se le dieron su manejo de la mejor manera y en los mejores términos.

• COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DEL CONTRATISTA:

- Arreglo ramal de alto Jordan a los Jardines
- Arreglo de la rejilla
- Arreglo calle vía a la escuela Palmorito.

COMPROMISOS CUMPLIDOS.

H- Construcción de alcantarillas y boscúver. en su totalidad

Adecuación, relleno base y subbase en su totalidad

Pavimentación en un 85%

Demarcación y señalización vial en un 40%

Charlas y socialización con la comunidad en 100%

ACCIONES FALTANTES.

Pavimentación Faltante de 1 km,

Canalización para las aguas lluvias en el km 1 de la Vereda Palmorito

Terminación de señalización y demarcación

Señalización en la escuela Alto Jordan

Arreglo ramal Alto Jordan - Los Jardines

Arreglo calle vía de la escuela Palmorito

Arreglo de la rejilla

Reforestación (siembra de árboles)

REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE CIERRE DE VEEDURÍA



 <p>SADING GROUP S.A.S. GRUPO INTECON S.A.S. INTERVENCIÓN Y CONSULTORIA</p>	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.4763 DE 2023 INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No.10 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</p>	 <p>CALIDAD INVIAS</p>
--	--	---

ANEXO R

Informe matriz de riesgos

MATRIZ DE RIESGOS																						
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.																						
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	miento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		Seguimineto
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Prolongación del tiempo planeado por la entidad para el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las Empresas de Servicios Públicos y Secretaría de planeación Municipal involucradas en el proyecto	♦ Retraso en la iniciación del contrato de obra ♦ Afectación al cronograma de ejecución del contrato	4	4	8	Extremo	Proponente o contratista	♦ Contratista: Establecer de un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y Entidades. ♦ FDLUSA como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor / Contratista e interventor	Acta de inicio y Acta e terminación	♦ Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos.	Cuando se requiera el trámite.	No se ha materializado el riesgo
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Aumento de cantidades de obra o especificaciones técnicas del producto, de variaciones en el alcance de las intervenciones	♦ Disminución del alcance del contrato.	2	1	3	Bajo	Municipio de Fortul	♦ Modificar elcontrato en su valor y en los anexos técnicos. ♦ Control del presupuesto. ♦ Control delalcance del proyecto.	1	1	2	Bajo	SI	Coordinador / Supervisor	Acta de inicio y Acta e terminación	♦ Control delpresupuesto ♦ Control decantidades de obra	Quincenal	No se ha materializado el riesgo
3	General	Externo	Ejecución	Climático	Condiciones climáticas o ambientales que se encuentren por fuera del registro esperado según el comportamiento histórico.	♦ Posibles retrasos en la ejecución, daños a Obras ya ejecutadas.	1	4	5	Medio	Proponente o contratista	♦ Análisis y planeación de clima y factores meteorológicos en comités de obra. ♦ Determinaciónde acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatológicas adversas. ♦ Presentaciónde plan de contingencia por parte del contratista	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal /Contratista	1. Etapa de formulación 2. Fecha actade inicio 1. Fecha de recibo final 2. Fecha de Liquidación	Seguimiento y visita de campo de las acciones de mitigación implementadas	Semanal	No se ha materializado el riesgo
4	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Contagio de un trabajador por COVID 19	♦ Demoras en el desarrollo de las actividades de obra.	4	4	8	Extremo	Proponente o contratista	♦ Control de los trabajadores con los protocolos establecidos	3	2	4	Alto	SI	Contratista	Acta de inicio y Acta e terminación	Seguimiento diario y atendiendo todas las recomendaciones propias del covid 19 (PAPSO).	Semanal	No se ha materializado el riesgo
5	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demora por parte del contratista en la radicación oportuna de las facturas a la entidad, (correctamente diligenciadas, firmadas, con informe mensual aprobado y soportes respectivos) y/o cuentas de los gastos reembolsables.	♦ Retrasos en los tiempos de pago debidos a subsanes para el trámite interno del pago de las cuentas de cobro.	4	2	6	Alto	Proponente o contratista	♦ Establecer fechas de corte de obra cada mes y presentación de factura máximo al día 10 de cada mes.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	1. Etapa de Diagnostico 2. Fecha actade inicio 1. Fecha de recibo final 2. Fecha de Liquidación	1.- El 6 de cada mes verificar que la factura junto con el corte de obra esté radicado en la Alcaldía Local.	Mensual	Se materializó el riesgo, no se han radicado facturas a la fecha ante la Entidad

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.4763 DE 2023 INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No.10 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</p>	
---	--	---

ANEXO U

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

Equipo y vehículos contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

31/12/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: dic-24

PROYECTO: VÍAS FORTUL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO SADINTECON

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CAMIONETA	Placa GEN540 Marca NISSAN Linea NP300 FRONTIER Modelo 2020	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	
CAMIONETA	Placa FUP887 Marca RENAULT Linea DUSTER Modelo 2020	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	
Motocicleta	Motocicleta Pulsar 180CC WTE67D 2016	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	
Motocicleta	Motocicleta Benelli TRK 500cc UGB78F 2022	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	
Motocicleta	PULSAR NS200 PLACA WRF74F 2024	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	
Motocicleta	PULSAR 180 PLACA WTN98C 2013	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	
ESTACIÓN TOTAL	Marca GOWIN REFERENCIA TKS202" serie. 8A8171	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: Gustavo Adolfo Becerra Gil
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202112214STD

Firma
Nombre: Mónica Lorena Montenegro Quintero
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202-276583 CND


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.4763 DE 2023 INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No.10 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</p>	
---	--	---

ANEXO V

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

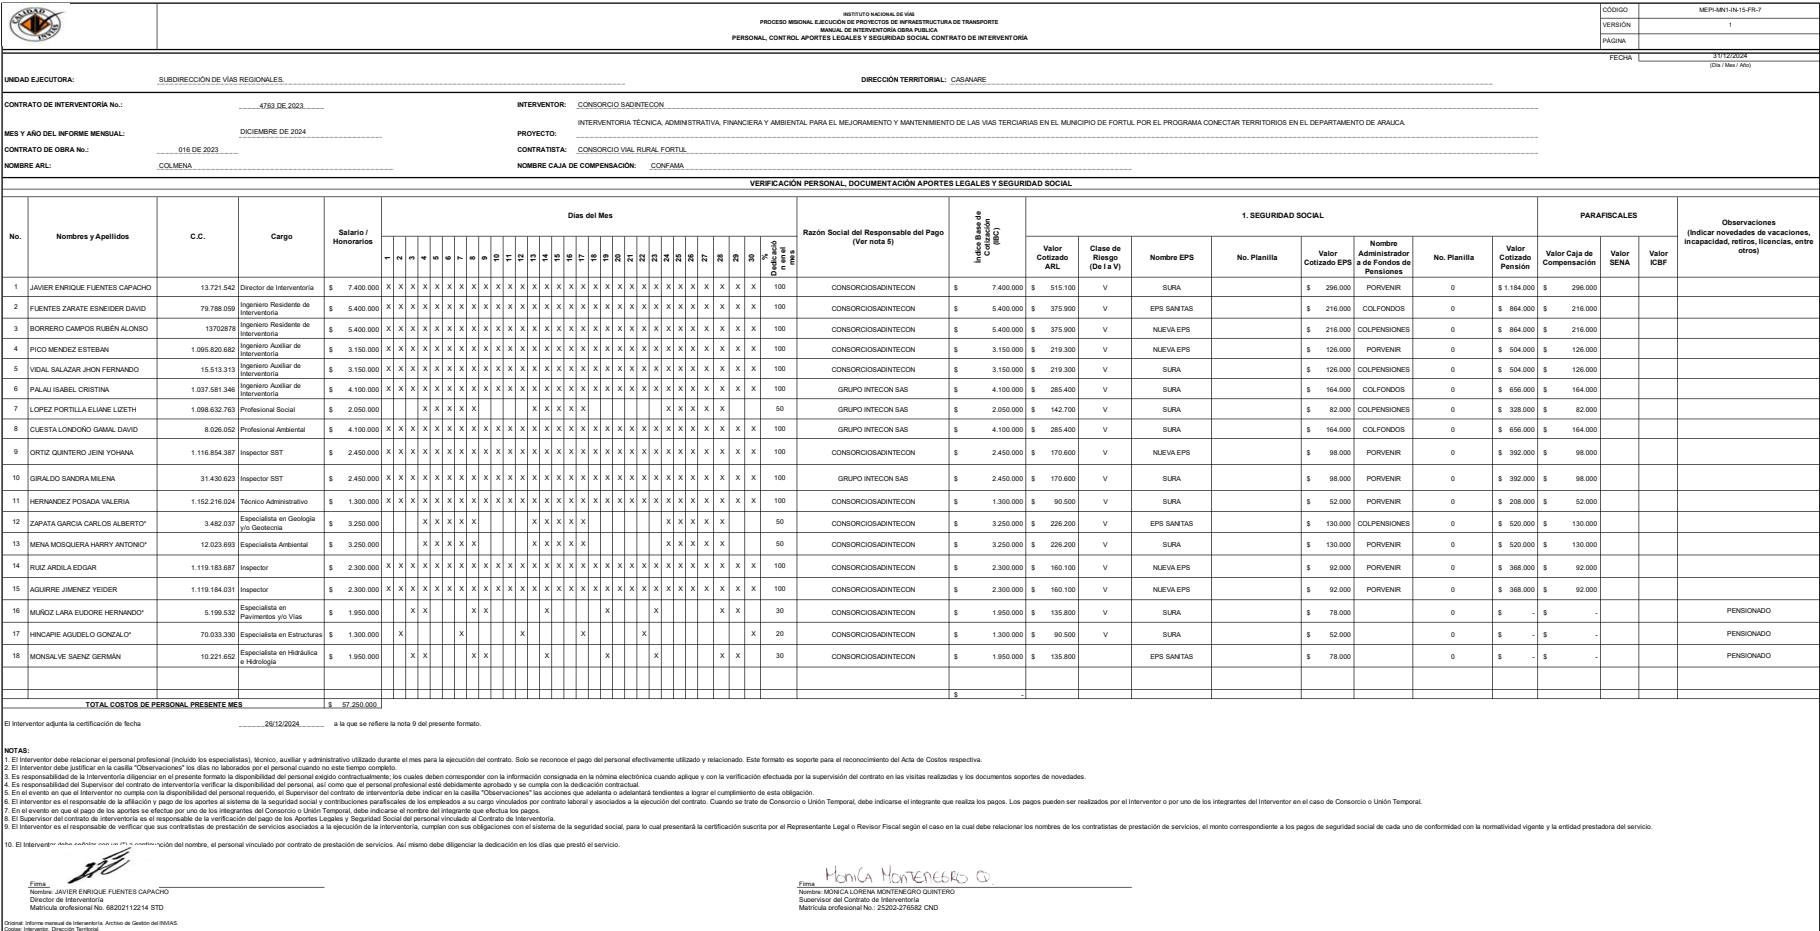

PAGADO 09/01/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO INTECON SAS		
Documento	NI901616027	Dirección	CL 48B #66 - 37 PORTON DE SAN FERNANDO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3581859
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	REYES VANEGAS JUAN CARLOS	Identificación	CC 13991274
Total Afiliados	7	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SEN	IGE	LME	LMA	VAC	VAP	VCT	IND	Dias ATD	Dias EPS	Dias ARL	Dias COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1098632763	ELIANE LIZETH LOPEZ PORTILLA	01	00																			0	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.050.000	\$ 328.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.050.000	\$ 82.000	6,960	\$ 2.050.000	\$ 142.700	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.050.000	\$ 82.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 634.700
CC 1116041746	MARIA ALEJANDRA ORTIZ OLIVOS	01	00																			0	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	\$ 3.000.000	\$ 120.000	6,960	\$ 3.000.000	\$ 208.800	(CCF69) COMFACASANARE	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800
CC 1152209996	MARIA ISABEL MONTOYA HERNANDEZ	01	00																			0	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 3.000.000	\$ 120.000	6,960	\$ 3.000.000	\$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800
CC 13702878	RUBEN ALONSO BORRERO CAMPOS	01	00																			0	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	\$ 6.250.000	\$ 1.062.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 6.250.000	\$ 250.000	6,960	\$ 6.250.000	\$ 435.000	(CCF69) COMFACASANARE	\$ 6.250.000	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.997.600
CC 15505311	ELKIN DE JESUS JIMENEZ URAN	01	00																			0	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.000.000	\$ 120.000	6,960	\$ 3.000.000	\$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800
CC 71655993	LEON RAMIRO RAMIREZ MARULANDA	01	00															X				0	8	8	8		(25-14) COLPENSIONES	\$ 394.935	\$ 63.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 394.935	\$ 15.800	0,000	\$ 394.935	\$ 0	(CCF04) COMFAMA	\$ 394.935	\$ 15.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.800
CC 71655993	LEON RAMIRO RAMIREZ MARULANDA	01	00																			0	22	22	22		(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.086.072	\$ 173.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.086.072	\$ 43.500	4,350	\$ 1.086.072	\$ 47.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.086.072	\$ 43.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 8026052	GAMAL DAVID CUESTA LONDOÑO	01	00																			0	30	30	30		(231001) COLFONDOS	\$ 4.100.000	\$ 656.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 4.100.000	\$ 164.000	6,960	\$ 4.100.000	\$ 285.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 4.100.000	\$ 164.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.269.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 22.881.007	\$ 22.881.007	\$ 22.881.007	\$ 22.881.007	\$ 3.723.600	\$ 915.300	\$ 1.536.800	\$ 915.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.091.000	\$ 5.200	\$ 7.096.200

Página 1 de 1

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.4763 DE 2023 INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No.10 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</p>	
---	--	---

ANEXO W

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Informe financiero y presupuestal Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA						CÓDIGO	MEPLAN-IN-15-FR-9				
							VERSIÓN	1				
							PÁGINA					
FECHA 07/04/2025 (Día / Mes / Año)												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES.				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE								
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4763 DE 2023				INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON								
MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024				PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.								
CONTRATO DE OBRA No: 016 DE 2023				CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL								
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2023-2024	1352623	C-2402-0600-13-0-2402041-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1.670.929.326,00	\$ 683.988.582					
2023-2024	1352623	C-2402-0600-13-0-2402112-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 185.658.814,00	\$ 75.998.731					
TOTAL						\$ 1.856.588.140,00	\$ 759.987.313					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.856.588.140												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 1352623 / C-2402-0600-13-0-2402041-02	Saldo Registro Presupuestal No. 1352623 / C-2402-0600-13-0-2402112-02	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
					\$ -		\$ -	\$ 1.670.929.326,00	\$ 185.658.814,00	\$ 1.856.588.140,00		
1	DICIEMBRE DE 2023 (DEL 14 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2	MARZO DE 2024	\$ 50.621.700,00	\$ 9.618.123,00	\$ 60.239.823,00	\$ -	\$ 60.239.823,00	\$ -	\$ 1.616.713.485,30	\$ 179.634.831,70	\$ 1.796.348.317,00		
3	ABRIL DE 2024	\$ 72.599.500,00	\$ 13.793.905,00	\$ 86.393.405,00	\$ -	\$ 86.393.405,00	\$ -	\$ 1.538.959.420,80	\$ 170.995.491,20	\$ 1.709.954.912,00		
4	MAYO DE 2024	\$ 77.364.500,00	\$ 14.699.255,00	\$ 92.063.755,00	\$ -	\$ 92.063.755,00	\$ -	\$ 1.456.102.041,30	\$ 161.789.115,70	\$ 1.617.891.157,00		
5	JUNIO DE 2024	\$ 71.570.700,00	\$ 13.598.433,00	\$ 85.169.133,00	\$ -	\$ 85.169.133,00	\$ -	\$ 1.379.449.821,60	\$ 153.272.202,40	\$ 1.532.722.024,00		
6	JULIO DE 2024	\$ 110.511.600,00	\$ 20.997.204,00	\$ 131.508.804,00	\$ -	\$ 131.508.804,00	\$ -	\$ 1.261.091.898,00	\$ 140.121.322,00	\$ 1.401.213.220,00		
7	AGOSTO DE 2024	\$ 121.891.900,00	\$ 23.159.461,00	\$ 145.051.361,00		\$ 145.051.361,00	\$ -	\$ 1.130.545.673,10	\$ 125.616.185,90	\$ 1.256.161.859,00		
8	SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 126.479.300,00	\$ 24.031.067,00	\$ 150.510.367,00		\$ 150.510.367,00	\$ -	\$ 995.086.342,80	\$ 110.565.149,20	\$ 1.105.651.492,00		
9	OCTUBRE DE 2024	\$ 134.102.800,00	\$ 25.479.532,00	\$ 159.582.332,00		\$ 159.582.332,00	\$ -	\$ 851.462.244,00	\$ 94.606.916,00	\$ 946.069.160,00		
10	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 156.371.300,00	\$ 29.710.547,00	\$ 186.081.847,00		\$ 186.081.847,00		\$ 683.988.581,70	\$ 75.998.731,30	\$ 759.987.313,00		
11	DICIEMBRE DE 2024	\$ 137.367.500,00	\$ 26.099.825,00	\$ 163.467.325,00		\$ 163.467.325,00		\$ 536.867.989,20	\$ 59.651.998,80	\$ 596.519.988,00		
TOTALES		\$ 1.058.880.800,00	\$ 201.187.352,00	\$ 1.260.068.152,00	\$ -	\$ 1.260.068.152,00	\$ -	\$ 536.867.989,20	\$ 59.651.998,80	\$ 596.519.988,00		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
	VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL							
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	\$ 834.684.800,00		\$ 158.590.112,00		\$ 993.274.912,00							
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	\$ 224.196.000,00		\$ 42.597.240,00		\$ 266.793.240,00							
SUBTOTAL COSTOS	\$ 1.058.880.800,00		\$ 201.187.352,00		\$ 1.260.068.152,00							
VALOR TOTAL	\$ 1.058.880.800,00		\$ 201.187.352,00		\$ 1.260.068.152,00							
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.												
Firma:  Nombre: JAVIER ENRIQUE MONTES CAPACHO Director de Interventoría Matrícula profesional No. 68202112214 STD												
Firma:  Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula profesional No. 25202-276592 CND												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.												

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.4763 DE 2023 INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No.10 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</p>	
---	--	---

ANEXO X

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

Seguimiento garantías Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		

FECHA	31/12/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
-------	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE
---	---------------------------------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4763-2023	INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON
--	-----------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

FECHA DE INICIO:	14/12/2032
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	14/12/2024 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>
VALOR INICIAL:	\$ 1.856.588.140,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 1.856.588.140,00 <small>(Incluye adiciones)</small>

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	
Cumplimiento	10,00%	\$ 185.658.814,00	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	\$ 312.031.621,00	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 371.317.628,00	
Calidad del servicio	30,00%	\$ 556.976.442,00	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	12	2023	30/06/2024		
1	12	2023	30/06/2024		
1	12	2023	31	12	2026
31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101226521

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 14/12/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	
Cumplimiento	10,00%	\$ 185.658.814,00	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	\$ 312.031.621,00	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 371.317.628,00	
Calidad del servicio	30,00%	\$ 556.976.442,00	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	12	2023	2	8	2024
1	12	2023	2	9	2024
1	12	2023	2	3	2027
31	12	2023	2	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101226521

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/04/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		31/12/2024 (Día / Mes / Año)		
-------	--	---------------------------------	--	--

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10,00%	\$ 185.658.814,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	\$ 312.031.621,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 371.317.628,00
Calidad del servicio	30,00%	\$ 556.976.442,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	12	2023	2	8	2024
1	12	2023	2	9	2024
1	12	2023	2	3	2027
31	12	2023	2	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101226521

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/04/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10,00%	\$ 185.658.814,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	\$ 312.031.621,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 371.317.628,00
Calidad del servicio	30,00%	\$ 556.976.442,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	12	2023	14	6	2025
1	12	2023	14	6	2025
1	12	2023	14	12	2027
31	12	2023	2	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101226521

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/04/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10,00%	\$ 185.658.814,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	\$ 312.031.621,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 371.317.628,00
Calidad del servicio	30,00%	\$ 556.976.442,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	12	2023	14	6	2025
1	12	2023	14	6	2025
1	12	2023	14	12	2027
31	12	2023	2	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101226521

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/04/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)
OBSERVACIONES: Se presenta las pólizas aprobadas en secop 2 con corte a octubre de 2024			
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).			
Firma 		Firma 	
Nombre: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO Directora de Interventoría Matrícula Profesional No.: 68202112214 STD		Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-276583 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.			



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN						SUCURSAL MEDELLIN						COD.SUC 65		NO.PÓLIZA 65-44-101226521		ANEXO 9	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
16 12 2024			01 12 2023			00:00	31 12 2029			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SADINTECON								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.742.046-0			
DIRECCIÓN: CL 48 C NRO. 65 A - 3						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 3004267390		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2			
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 7056000		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOTA:
- LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTIENDEN HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ES IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/12/2023	30/06/2025	\$185,658,814.00	\$185,658,814.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/12/2023	30/06/2025	\$312,031,621.00	\$312,031,621.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/12/2023	31/12/2027	\$371,317,628.00	\$371,317,628.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023	31/12/2029	\$556,976,442.00	\$556,976,442.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA NUMERO DOS (02) DE 2024 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4763 DE 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

TODOS LOS DEMAS NO MODIFICADO CONTINUA EN PLENO VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****162,630.00	\$ *****8,000.00	\$ *****32,419.00	\$ *****203,050.00	\$ ****1,425,984,505.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA	153840	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

65-44-101226521

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF153840C

1



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN						SUCURSAL MEDELLIN						COD.SUC 65		NO.POLIZA 65-44-101226521		ANEXO 9	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
16 12 2024			01 12 2023			00:00	31 12 2029			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SADINTECON								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.742.046-0		
DIRECCIÓN: CL 48 C NRO. 65 A - 3						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 3004267390	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2		
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7056000	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE

SADING GROUP S.A.S

GRUPO INTECON S.A.S

IDENTIFICACION

901192745-1

901616027-1

PARTICIPACION

50.00

50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101226521

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF153840C

2



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101226521, anexo 9, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 16 días del mes de DICIEMBRE de 2024

65-44-101226521

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65	NO.PÓLIZA 65-44-101226521	ANEXO 10
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
16 12 2024	01 12 2023		00:00	31 12 2029		23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SADINTECON	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.742.046-0
DIRECCIÓN: CL 48 C NRO. 65 A - 3	Ciudad: MEDELLIN, ANTIOQUIA
TELÉFONO: 3004267390	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	Ciudad: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
TELÉFONO 7056000	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOTA:
- LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTIENDEN HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ES IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/12/2023	30/06/2025	\$185,658,814.00	\$185,658,814.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/12/2023	30/06/2025	\$312,031,621.00	\$312,031,621.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/12/2023	31/12/2027	\$371,317,628.00	\$371,317,628.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023	31/12/2029	\$556,976,442.00	\$556,976,442.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA NUMERO DOS (2) DE 2024 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4763 DE 2023, SE AMPLIA LA FECHA FINAL DE TERMINACION QUEDANDO EL 31/12/2024.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE:

- ACTA DE INICIO DEL CONTRATO NO. 4763-2023, CELEBRADA EL 14 DICIEMBRE 2023.
- ACTA DE SUSPENSION NO. 1 AL CONTRATO NO. 4763-2023, SE DEFINE COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION 02 FEBRERO 2024.
- ACTA DE SUSPENSION NO. 1 Y AMPLIACION DE SUSPENSION NO. 1, DESDE EL 30 DE ENERO 2024 CON FECHA DE REANUACION DEL 1 MARZO 2024.
- ACTA DE REANUDACION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4763-2023 CON FECHA DE 29 FEBRERO 2024.
- PRORROGA NO. 1
- PRORROGA NO. 2

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ ****1,425,984,505.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA	153840	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101226521

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF153840C

1

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN						SUCURSAL						COD.SUC		NO.POLIZA		ANEXO	
MEDELLIN						MEDELLIN						65		65-44-101226521		10	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS							
16	12	2024	01	12	2023	00:00	31	12	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SADINTECON								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.742.046-0			
DIRECCIÓN: CL 48 C NRO. 65 A - 3						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 3004267390		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.807-2			
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7056000		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO REFERENTE AL CONTRATO PRINCIPAL 4763 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO.

QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA.

QUE EL CONSORCIO SADINTECON CON NIT. 901.742.046-0 ESTA INTEGRADO POR:

-SADING GROUP S.A.S CON NIT. 901.192.745-1 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 50%

-GRUPO INTECON S.A.S CON NIT. 901.616.027-1 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 50%

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SADING GROUP S.A.S	901192745-1	50.00
GRUPO INTECON S.A.S	901616027-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101226521

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF153840C

2



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101226521, anexo 10, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 16 días del mes de DICIEMBRE de 2024

65-44-101226521

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul Contrato de Interventoría No.4763 de 2023 Informe Mensual de Avance de Obra No.10 Periodo Comprendido Del 1 al 31 de Diciembre de 2024</p>	
---	--	---

ANEXO AD

Copia bitácoras del mes correspondiente

TRAMO CAÑO FLORES

Se instaló geotextil del tramo K0+670 - K0+810.

30-Noviembre
Sabado
2024
carril izquierdo. Se extiende material estabilizante con sales inorgánicas en el tramo K0+645 - K0+780. carril izquierdo. Se revolvió material estabilizante con sales inorgánicas en el tramo K2+445 - K2+845. *Interrumpido* *YS* *JS*

1-Diciembre
Domingo.
2024
Sin novedades para este día. (Domingo no se laboró) *Interrumpido* *YS* *JS*

2-Diciembre
Lunes
2024
Se instaló geotextil en el tramo K0+810 - K0+900 carril izquierdo. Se extendió material estabilizante con sales inorgánicas del tramo K0+780 - K0+860. carril izquierdo. Se escalifica y se compacta material del tramo K0+200 - K0+500. carril izquierdo. Se realizó el ceseo del material del terraplén en el tramo K0+850 - K0+930. carril izquierdo. Se adiciona sales inorgánicas al material estabilizante que se encuentra acoplado en el tramo K2+800 - K3+000.

PERSONAL: Ing. residente, HSE, topografía, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, carrocangre, excavadora, vibracompactador, retroexcavadora, minicargador. CLIMA: Sol.

Se instaló geotextil del tramo K0+900 - K1+060. carril izquierdo. y del carril derecho se instaló geotextil del tramo K0+820 - K1+060. Se extiende material de sales inorgánicas en el tramo K0+860 - K1+040. carril izquierdo y carril derecho se extendió del tramo K0+820 - K1+030. Se carga material con sales inorgánicas que estaban acoplado en el tramo K2+800 - K3+000. PERSONAL: Ing. residente, HSE, topografía, cadenero, controlador vial, MAQUINARIA: Motoniveladora, carrocangre, excavadora, vibracompactador, retroexcavadora, minicargador. CLIMA: Sol.

Interrumpido *YS* *JS*

Se instaló geotextil del tramo K1+060 - K1+230.

4-Dic Se extiende material estabilizante con sales
 Miércoles inorgánicas en el tramo K1+040 - K1+220. carril
 2024 izquierdo. y carril derecho el tramo K1+030 - K1+220.
 Se revuelve material estabilizante en el tramo
 K0+458 - K0+462, K0+180 - K0+400 (carril izquierdo) y
 PERSONAL: Ing. residente, HSEQ, topógrafo, cadenero, controlador,
 vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, excavadora, carro tanque,
 vibrocompactador, retroexcavadora, minicargador. CLIMA: Soleado.

Se instaló geotextil del tramo K0+000 - K0+140. Se
 extiende material estabilizante con sales inorgánicas
 5-Dic del tramo K0+000 - K0+120. Se adicionó sales
 Jueves inorgánicas al material que se encontraba acoplado
 2024 en el tramo K1+320 - K1+510. PERSONAL: Ing. residente,
 HSEQ, topógrafo, cadenero, controlador vial. PERS. MAQUINARIA:
 Motoniveladora, excavadora, carro tanque, vibrocompactador, retro-
 excavadora, minicargador. CLIMA: Soleado.

Se instaló geotextil correspondiente al tramo K0+140
 6-Dic - K0+180. Se extiende material estabilizante del tramo
 Viernes K0+120 - K0+180. Se extiende material estabilizante
 2024 con sales inorgánicas del tramo K1+220 - K1+274 en
 ambos carriles. PERSONAL: Ing. residente, HSEQ, topógrafo,
 cadenero, controlador vial, MAQUINARIA: Motoniveladora, excavadora,
 carro tanque, vibrocompactador, retroexcavadora, minicargador,
 CLIMA: Soleado.

Se revuelve material estabilizante con sales inorgánicas
 en el tramo K0+900 - K1+185. Se realiza el ceseo
 7-Dic del material estabilizante con sales inorgánicas en el
 Sábado tramo K0+120 - K0+400. Se realiza el arreglo del
 2024 Sallo en el tramo K0+410 - K0+420 (Carril izquierdo).
 PERSONAL: Ing. residente, HSEQ, topógrafo, cadenero, controlador vial.
 MAQUINARIA: Motoniveladora, carro tanque, excavadora, vibrocompactador,
 minicargador. CLIMA: Soleado.

	sin novedades para este día.	
8-Diciembre Domingo 2024.	(Domingo no se labora)	<i>[Signature]</i>
9-Diciembre Lunes 2024	Se realizó la instalación del geotextil del tramo K1+300 - K1+400. Se extiende material estabilizante con sales inorgánicas del Aramo K1+230 - K1+400. Se compactó material estabilizante con sales inorgánicas en el tramo K0+000 - K0+180. Se revuelve material estabilizante con sales inorgánicas en el tramo K0+970 - K1+200. Carril derecho. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, carrotanque, vibrocompactador, excavadora, retroexcavadora. CLIMA: Soleado.	<i>[Signature]</i>
10-Diciembre Martes 2024	Se realizó la adición de las sales inorgánicas al material estabilizante que se encontraba acoplado en el tramo K1+450 - K1+580. Se realizó el cereo en el terraplen para obtener la nivelación deseada en los tramos (K1+400 - K1+510, K2+420 - K3+845). PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, cadenero, controlador vial, MAQUINARIA: Motoniveladora, carrotanque, vibrocompactador, excavadora, retroexcavadora. CLIMA: Soleado.	<i>[Signature]</i>
11-Diciembre Miércoles 2024	Se realizó la instalación del geotextil de los 5 tramos (K1+400 - K1+460, K2+620 - K2+855). Se extendió material estabilizante con sales inorgánicas de los tramos (K1+400 - K1+460, K2+620 - K2+765). Se realizó el cereo de material estabilizante de los tramos (K0+180 - K0+820, K2+600 - K3+040). Se revuelve material estabilizante que se encontraba acoplado en el tramo (K1+650 - K1+900). PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, cadenero, control vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, carrotanque, vibrocompactador, excavadora, retroexcavadora. CLIMA: Soleado.	<i>[Signature]</i>

12-Dic Se realizó el cerco del material estabilizante con sales
 Jueves inorgánicas del tramo K2+620 - K2+765. Se extendió material
 2024 estabilizante con sales inorgánicas del tramo K2+765 -
 K2+830. Se adiciona sales inorgánicas al material estabili-
 zante que se encuentra acoplado en el tramo K1+650 -
 K1+900. Se revuelve material estabilizante acoplado en
 el tramo K1+950 - K2+060. Se realizó la imprimación del
 tramo K0+000 - K0+500, carril derecho. PERSONAL:
 Ing. residente, HSEQ, topógrafo, cadenero, controlador vial.
 MAQUINARIA: Motoniveladora, Carrotanque, vibrocompactador,
 excavadora, retroexcavadora, minicargador. CLIMA: Soleado.

Se realizó la instalación de MDC-19 sobre el costado
 derecho del tramo. K0+000 - K0+500. Se instaló
 13-Dic geotextil en el tramo K2+855 - K2+980. Se extiende
 viernes material estabilizante con sales inorgánicas del tramo
 2024 K2+830 - K2+950. Se adiciona sales inorgánicas
 al material estabilizante que se encontraba acoplado
 en el tramo K1+845 - K2+150. Se realizó la
 imprimación para el asfalto del tramo K0+500 -
 K0+720, carril derecho. PERSONAL: Ing. residente, HSEQ
 topógrafo, cadenero, controlador vial, MAQUINARIA:
 Motoniveladora, Carrotanque, excavadora, vibrocompactador,
 retroexcavadora, minicargador, Finisher, compactador de
 neumático, Hamm. CLIMA: Soleado.

Se realizó la instalación del MDC-19 sobre el costado
 derecho en el tramo K0+500 - K0+715. Se realizó
 14-Dic la imprimación del asfalto del tramo K0+000 - K0+08
 sábado carril izquierdo. Se realizó la instalación del MDC-19 en
 2024 el tramo K0+000 - K0+070, carril izquierdo. Se instaló
 el geotextil del K2+980 - K3+015. Se revuelve material
 estabilizante en el tramo K2+950 - K3+010. PERSONAL
 Ing. residente, HSEQ, topógrafo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA:
 Motoniveladora, minicargador, excavadora, carrotanque, vibrocompactador, retroexcav-
 adora, compactador de neumático, Finisher, Hamm. CLIMA: Soleado.

15-Diciembre Domingo 2024	Se realizó la instalación del geotextil del tramo K1+460 - K1+590. Se extendió material estabilizante con sales inorgánicas del tramo K1+460 - K1+520. Se realizó el cerco del material estabilizante con sales inorgánicas del tramo K0+820 - K1+300. PERSONAL: Ing. residente, HSQE, topógrafo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: motoniveladora, carrotanque, excavadora, vibracompactador, minicargador, retroexcavadora, compactador de neumático, Finisher, Hamm. CLIMA: Soleado.
16-Diciembre Lunes 2024	Se realizó el cerco del material estabilizante en el tramo K1+300 - K1+520. Se compactó al nivel deseado el material estabilizante del tramo K1+300 - K1+520. PERSONAL: Ing. residente, topógrafo, cadenero, controlador vial, HSQE. MAQUINARIA: carrotanque, motoniveladora, excavadora, compactador, minicargador, vibracompactador, retroexcavadora, compactador de neumático, Finisher, Hamm. CLIMA: Soleado.
17-Diciembre Martes 2024	Se instaló el geotextil del tramo K1+590 - K1+740. Se cerco material estabilizante con sales inorgánicas del tramo K1+520 - K1+730. Se cerco parte del terraplen en el tramo K1+654 - K1+790. PERSONAL: Ing. residente, topógrafo, cadenero, controlador vial, HSQE. MAQUINARIA: carrotanque, motoniveladora, excavadora, vibracompactador, retroexcavadora, compactador de neumático, Finisher, Hamm. CLIMA: Lluvias moderadas (7:00 - 9:00 AM).
18-Diciembre Miércoles 2024	Se realizó la imprimación del tramo K0+070 - K0+170 carril izquierdo. Se realizó la imprimación del tramo K0+890 - K1+230. Carril derecho. Se realizó la instalación del MOC-19 en los tramos (K0+070 - K0+170 carril izquierdo y K0+890 - K1+230 carril derecho). PERSONAL: Ing. residente, HSQE, topógrafo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, carrotanque,

vibrocompactador, retroexcavadora, minicargador, compactador de neumático, Finisher, Hamm. CLIMA: Soleado.

[Handwritten signature]

Se realizó la instalación del geotextil del tramo K1+810 - K1+850. Se extiende material estabilizante del tramo K1+805 - K1+845. Se realizó la imprimación para el asfalto del tramo K0+890 - K1+235. Carril izquierdo. Se pavimenta con MDC-19 en el tramo K0+890 - K1+220. Carril izquierdo. Se realizó el Cerec en el terraplen en el tramo K3+075 - K3+250. Se revuelve material estabilizante aceptado en el tramo K2+032 - K2+230. Se realizó el Cerec del material estabilizante del tramo K0+170 - K0+420. PERSONAL: Ing. residente, HSEQ, topógrafo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, carrotanque, excavadora, vibrocompactador, minicargador, retroexcavadora, compactador de neumático, Finisher, Hamm. CLIMA: Soleado.

[Handwritten signature]

Se instaló geotextil del tramo K1+850 - K1+886. Se extiende y se compacta material estabilizante en el tramo K1+845 - K1+884. Se Cerec material estabilizante del tramo K0+420 - K0+620. PERSONAL: Ing. residente, HSEQ, topógrafo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, carrotanque, excavadora, retroexcavadora, vibrocompactador, minicargador. CLIMA: Soleado.

[Handwritten signature]

Se instaló geotextil del tramo K1+886 - K1+930. Se extendió material estabilizante en el tramo K1+884 - K1+930. Se arregló parte de la transición del tramo Sinal en la ubicación K3+740 - K3+790. Se revuelve material estabilizante del tramo K3+290 - K3+440. PERSONAL: Ing. residente, HSEQ, topógrafo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, excavadora, compactador, minicargador, retroexcavadora. CLIMA: Soleado.

22-Diciembre Domingo 2024	<p>sin novedades para este día</p> <p>(Domingo no se laboró)</p> <p><i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i></p>
23-Diciembre Lunes 2024	<p>Se realizó la actividad correspondiente a un aseo general de la obra por parte del personal y se reavivó material estabilizante, se realizó la verificación de niveles topográficos. PERSONAL: Ing. residente, HSEQ, topógrafo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, carrotanque, excavadora, minicargador, vibrocompactador, retroexcavadora. CLIMA: Soleado.</p> <p><i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i></p> <p>Se realizó un mejoramiento en la señalización correspondiente a la obra para evitar posibles accidentes por las fiestas de decembrinas. Se extiende material estabilizante que se encontraba acoplado y se compacta. La interventoría según oficio (CONECTARAPAUCA - INVIAS - 2023-174)</p>
24-Diciembre Martes 2024	<p>del 19 de diciembre de 2024 manifiesta que No se recibirá el 100% por ciento de la estructura de capa estabilizada con sales inorgánicas y MOC-19 que se han instalado hasta la fecha, ya que se han originado fallos en el proceso constructivo. Es de resaltar que de la abscisa K0+000 - K0+180, se encuentra en óptimas condiciones, de esta manera el avance posterior deberá ser reparado para ser recibido y aprobado por la interventoría. PERSONAL: Ing. residente, HSEQ, topógrafo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, carrotanque, excavadora, vibrocompactador, excavadora, retroexcavadora, minicargador. CLIMA: Soleado.</p> <p><i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i></p>
25-Diciembre Miércoles 2024	<p>sin novedades para este día.</p> <p>(Miércoles festivo no se laboró)</p> <p><i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i></p>

Se instaló geotextil del tramo K1+930 - K1+985.

Se extendió material estabilizante del tramo K1+930 -

26-Dic 2024 Jueves K1+984. Se adiciona sales inorgánicas al material estabilizante que se encuentra acoplado K2+032 - K2+230. Se Cerezo parte del terraplén del tramo K3+015 - K3+460. PERSONAL: Ing residente, HSEQ, cadenero, topógrafo, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, carrotanque, vibrocompactador, minicargador, excavadora. CLIMA: Soleado.

~~Se~~ ~~instala~~ ~~geotextil~~ ~~en~~ ~~el~~ ~~tramo~~ ~~K1+985 - K2+032~~ ~~(K3+015 - K3+200)~~

Se realizó la instalación del geotextil de los tramos (K1+985 - K2+032) (K3+015 - K3+200). Se extiende

27-Dic 2024 viernes material estabilizante con sales inorgánicas en el tramo K3+015 - K3+198. Se extiende material estabilizante en el tramo K1+984 - K2+030.

PERSONAL: Ing residente, HSEQ, topógrafo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Carrotanque, vibrocompactador, motoniveladora, excavadora. CLIMA: Soleado.

~~Se~~ ~~instala~~ ~~geotextil~~ ~~en~~ ~~el~~ ~~tramo~~ ~~K2+030 - K2+130~~

28-Dic 2024 Sábado Se realizó la instalación del geotextil en el tramo K2+030 - K2+130. Se extiende material estabilizante con sales inorgánicas en el tramo K2+030 - K2+130.

PERSONAL: Ing residente, HSEQ, topógrafo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, carrotanque, excavadora, vibrocompactador, minicargador. CLIMA: Soleado.

~~Se~~ ~~instala~~ ~~geotextil~~ ~~en~~ ~~el~~ ~~tramo~~ ~~K2+030 - K2+130~~

29-Dic Sin novedades para este día

Domingo (Domingo no se laboró)

2024 ~~Se~~ ~~instala~~ ~~geotextil~~ ~~en~~ ~~el~~ ~~tramo~~ ~~K2+030 - K2+130~~

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍAS Terciarias en el Municipio de Fortul Contrato de Interventoría No.4763 de 2023 Informe Mensual de Avance de Obra No.10 Periodo comprendido Del 1 al 31 de Diciembre de 2024</p>	
---	--	---

ANEXO AD

Copia bitácoras del mes correspondiente

TRAMO PALMARITO

	<p>HSOE, TOPOGrafo, Cadenero, Muestro, Oficial, Ayudante, Controladores Viales, MAQUINARIA: 1 Motorizadora, 3 Vibrio compactador, 1 Mini rullo, (Carro tanque), 2 Hamm, 2 Finisher, 1 Turbo carrocera, clima soleado.</p>
01, Diciembre. Domingo 2024.	<p>(Sin Novedad para este día) (Domingo)</p>
02, DICIEMBRE Lunes-2024.	<p>se realiza instalacion de MDC-19 sobre el costado derecho en el tramo (K 6+115 - 5-600), se realiza extendido de aproximacion de cerro en el tramo (K 5+600-5+330), el equipo de asfalto de saraveny realiza trabajos de mejoramiento sobre el costado izquierdo (K 0+740) y hace levantamiento de maquinaria y se retiran del proyecto quedando un solo equipo de asfalto. PERSONAL: Ing Residente, HSOE, TOPOGrafo, Cadenero, Muestro, Oficial, Ayudante, Controladores Viales, MAQUINARIA: 1 Motorizadora, 2 Vibrio compactador, 1 Mini rullo cargador, 1 Hamm, 1 Finisher, 1 Turbo de carrocera, Climasoleado.</p>
03, DICIEMBRE Martes-2024.	<p>Se realiza instalacion de MDC-19 sobre el costado izquierdo, en el tramo (K 6+115 - 5+656), se realiza imprimacion sobre el tramo (K 6+115 - 5+600), se realiza instalacion de base granular quedando compacta sobre el tramo de cerro (K 5+600 - 5+330), cerro de aproximacion (K 5+330 - 5+180), se continua y finaliza la instalacion de señalizacion vertical. PERSONAL: Ing Residente, HSOE, TOPOGrafo, Cadenero, Muestro, Oficial, Ayudante, Controladores Viales, MAQUINARIA: 1 Motorizadora, 2 Vibrio compactador, 1 Mini rullo cargador, 1 Carro tanque, 1 Hamm, 1 Finisher, 1 Turbo carrocera.</p>
04-DICIEMBRE	<p>El día de hoy no hay actividades (Ox) pendientes</p>

25-Dic-2024
Se realiza instalación de MDC-19 e imprimación, se realiza extendido y compactado de material base granular sobre el tramo (K 31330 - 41890), se realiza recolección de bajuras a nivel general sobre los costados de la vía, la interventoría hace acompañamiento a cada una de las actividades programadas por el contratista, PERSONAL: Ing Residente, HSEQ, Topógrafo, cadenero, Maestro, Oficial, Ayudante, Controladores Viales, MAQUINARIA: 1 Motoniveladora, 2 Vibro compactadores, 1 carro tanque, 1 Hamm, 1 Finisher, 1 Turbo cortacésped, Clima soleado.

26-Dic-2024
Se realizan actividades correspondientes a topografía en la alcantarilla (K 01000 - 01040) para excavación mecánica y replanteo, retiro de material sobrante y compactado. Se realiza riego con carro tanque, compactación sobre el tramo K 51150 - 41960, se realizan besanos de filos y arabados en las alcantarillas, retiro de alambres y clavos, basuras sobrantes, PERSONAL: Ing Residente, HSEQ, Topógrafo, cadeneros, Maestro, Oficial, Ayudante, Controladores Viales, MAQUINARIA: 1 Motoniveladora, 2 Vibro compactadores, 1 carro tanque, 1 Hamm, 1 Finisher, 1 Turbo cortacésped, Clima nublado.

26-Dic-2024
El día de hoy no hay actividades correspondientes a instalación de MDC-19 e imprimación, se realiza extendido y compactado Material de base granular sobre el tramo K 01000 - 01040 se hace verificación de los niveles topográficos con el equipo de topografía de interventoría, se realizan actividades topográficas en toma de puntos para la señalización longitudinal sobre la vía, se realiza instalación de geotextil en tramo (01000 - 01040) PERSONAL: Ing Residente, HSEQ, Topógrafo, cadeneros, Maestro, Oficial, Ayudante, Topógrafo, Controladores Viales, MAQUINARIA: 1 Motoniveladora, 2 Vibro compactadores, 1 carro tanque, 1 Hamm, 1 Finisher, 1 Turbo cortacésped, Clima nublado.

07-Diciembre Sabado-2024	El día de hoy no hay actividades correspondientes a instalación de MDC-19, No hay imprimación, se realiza extendido y compactación de material de base granular, Verificación de niveles topográficos (K 0+000 - 0+040) MAQUINARIA: 1 Motoniveladora, 2 Vibrio compactador, carro tanque, 1 Hamm, 1 Finisher, 1 Turbo camocero, PERSONAL: ING residente, HSOC, topógrafo, cadeneros, Maestro, Oficial, Ayudante, Clima soleado.
08-Diciembre Domingo-2024	(Sin novedad para este día) (Domingo)
09-Diciembre Lunes-2024	El día de hoy no hay actividades correspondientes a instalación de MDC-19, No hay imprimación, se realiza extendido y compactación de material de base granular (K 0+000 - 0+040), se realiza relleno con carro tanque y compactación sobre el tramo (K 4+470 - 5+330), se realiza acompañamiento por parte de la interventoría sobre el inicio de instalación de pintura horizontal (K 0+070 - 2+320), se hace verificación de los puntos topográficos para la pintura horizontal del siguiente tramo. PERSONAL: ING residente, HSOC, Maestro, Oficial, Ayudante, HSOC, Topógrafo, cadeneros, MAQUINARIA: 1 Motoniveladora, 2 Vibrio compactador, 1 carro tanque, 1 Hamm, 1 Finisher, 1 Turbo camocero, Clima, soleado.
10-Diciembre Martes-2024	No hay actividades correspondientes a instalación de MDC-19, No hay imprimación, se continúa con la instalación de la pintura horizontal sobre el tramo (K 2+320 - 4+050) esta pintura es color blanco laterales y amarillo la de el etc central. PERSONAL: ING residente, HSOC, Topógrafo, cadeneros, Personal de Pintura: 2 conductos, 2 Ayudantes, MAQUINARIA: 2 Vibrio compactador, 1 carro tanque, 1 Hamm, 1 Finisher, 1 Turbo camocero. Clima soleado.
11-Diciembre. Miércoles-2024	No hay actividades correspondientes a instalación de MDC-19. Se continúa con la instalación de la pintura horizontal del etc central color amarillo. Sobre el tramo

(K 4070-21430) (21430-41050). Personal: Ing Residente.
 ASOE, Topógrafo (udencios, MAQUINARIA, 2 Vibro compactador, 1
 Carrotanque, 1 Hamm, 1 Finisher, 1 Turbo, carrocería.
 Clima soleado.

[Signature]

El día de hoy hace ingreso nuevo equipo de maquinaria y personal
 de asfalto. MDC-19, y el que se encuentra en mantenimiento se para la
 Verde Carrotanque. Se realiza imprimación sobre el tramo (K 41840-51190).
 El día de hoy no hay actividades correspondientes a la instalación de
 MDC-19, se realiza arreglo y computación sobre el tramo (K 41840-
 51656). PERSONAL: Ing Residente, ASOE, Topógrafo, cadencios, MAQUINARIA:
 2 Vibro compactador, 1 Carrotanque, 1 Hamm, 1 Finisher, 1 Turbo carrocería.
 Clima soleado.

[Signature]

Se realiza instalación de MDC-19 sobre el costado
 derecho en el tramo (K 41840-51020), se realiza imprima-
 ción sobre el tramo (K 51190-51565), la interventoría
 hace observaciones acerca de buenos métodos de instalación y
 acabados finales. PERSONAL: Ing Residente, ASOE, Controladores
 Viates, MAQUINARIA: 2 Vibro compactador, Carrotanque, 1 Hamm,
 1 Finisher, 1 Turbo carrocería, clima nublado.

[Signature]

Se realiza instalación de MDC-19 sobre el costado derecho
 en el tramo (K 51020-51347). PERSONAL: Ing Residente.
 ASOE, Controladores Viates, MAQUINARIA, 2 Vibro compactador,
 1 Carrotanque, 1 Hamm, 1 Finisher, 1 Turbo carrocería, clima soleado.

(Sin novedad para este día) (Domingo)

[Signature]

Se realiza instalación de MDC-19 sobre el costado
 derecho en el tramo (K 51347-51570), se realiza imprimación
 sobre el costado izquierdo en el tramo (K 41848-51340).
 PERSONAL: Ing Residente, ASOE, Controladores Viates, MAQUINARIA,
 2 Vibro compactador, 1 Finisher, 1 Hamm, 1 Carrotanque, 1 Turbo de

carrocera, clima soleado.

17-Diciembre
Martes-2024

Se realiza instalacion de MDC-19 sobre el costado derecho en el tramo (K 51570 - 51600), se realiza instalacion de MDC19 sobre el costado izquierdo (K 51649-51656), se realiza imprimacion sobre el costado izquierdo en el tramo (K 51340 - 51600), La interventoria hace verificacion durante las actividades y realiza observacion de buenas tecnicas y acabados finitos. PERSONAL: Ing residente, HSOE, Controladores Viales, MAQUINARIA: 2 Vibrio compactador, 1 Hamm, 1 Finisher, Turbo carrocera, 1 can tanque, Clima soleado.

18-Diciembre
Miercoles-2024

Se realiza instalacion de MDC-19 sobre el costado izquierdo en el tramo (K 41848 - 51082), se hace verificacion de la separacion al termino las actividades y avances, PERSONAL: Ing residente, HSOE, Controladores Viales, MAQUINARIA: 2 Vibrio compactador, 1 Hamm, 1 Finisher, 1 Turbo carrocera, Clima soleado.

19-Diciembre
Jueves-2024

Se realiza instalacion de MDC-19 sobre el costado izquierdo (K 51082 - 51382) se hace Verificacion de las actividades de compactacion con Vibrio, y Sello Neumatico para garantizar la calidad de los buenos techos de mano obra. PERSONAL: Ing. Residente, HSOE, Controladores Viales, MAQUINARIA: 1 Vibrio compactador, 1 Hamm, 1 Finisher, 1 Turbo carrocera, Clima soleado.

20-Diciembre
Viernes-2024

Se realiza instalacion de MDC-19 sobre el costado izquierdo, en el tramo (K 51382 - 51649), la interventoria hace Verificacion de las distancias del ancho, y espesores, y temperaturas en las actividades de MDC-19. PERSONAL: Ing residente, HSOE, Controladores Viales, operadores de maquinaria asfalto, MAQUINARIA: 3 Vibrio compactadores, 1 Hamm, 1 Finisher, 1 Turbo de carrocera, Clima soleado

11-DIC	Se realiza instalacion de MDC-19 sobre el costado derecho en el tramo K 0+000 - 0+040, Se realiza instalacion MDC-19 sobre el costado izquierdo en el tramo (K 0+000 - 0+040), se realiza Impresion sobre el tramo (K 0+000 - 0+040), Se realiza traslado del banco portatil y puesto de Alseo, se realiza inspeccion del Sello compactador y sello Hamm neumatico. PERSONAL Ing Residente, HSOE, Controladores Viales, operadores de maquinaria MDC-19, MAQUINARIA: 1 Vibro compactador, 1 Hamm, 1 Linisher Camion de impresion, 1 Turbo de catrocera, Data. el dia de hoy se realiza jornadas de asco general sobre la via. Clima soleado.
12-DIC	(sin novedad para este dia) (Domingo)
13-DIC	Se realizan actividades de limpieza y orden en obra, se realiza actividades de chequeo topografico para Planos Record
14-DIC	Se realiza actividades de orden y limpieza general sobre la via, proteccion de la señalizacion, se realiza chequeo topografico para Planos Record, el Personal y maquinaria MDC-19 siguen ya se finalizan actividades, Personal, Ing Residente, HSOE, comision topografica, Clima soleado.
15-DIC	(sin novedad para este dia) - FESTIVO
16-DIC	Se realiza actividades de proteccion de talud en algunas sondas, realizando una proteccion y canalizacion mediante concretos, ya que era un compromiso con la comunidad.

y evitar socavación de la vía por aguas lluvias clima, soleado. PERSONAL: Ing residente, HSOE, Ayudantes, Oficial, MAQUINARIA: 1 minicargador, 1 PPR, 1 Mezcladora, 1 Camión tanque.

~~11/11~~ ~~11/11~~

27-Diciembre
Viernes-2024

Se realizan actividades de protección de talud con concreto y malla reforzada para evitar socavación por aguas lluvias en algunas zonas, se funden concretos de protección talud y canalización.

PERSONAL: Ing residente, HSOE, Oficial, Ayudantes, MAQUINARIA: 1 minicargador retro, 1 Torbo PPR, clima soleado.

~~11/11~~ ~~11/11~~

28-Diciembre
Sábado-2024

Se realizan actividades de protección de talud con concreto reforzado con malla para evitar socavación por aguas lluvias en algunas zonas se funden concretos de canalización y aseo general, clima soleado. PERSONAL: Ing residente, HSOE, Oficial, Ayudantes.

29-Diciembre
Domingo-2024

(sin novedad para este día) (Domingo)

~~11/11~~ ~~11/11~~

30-Diciembre
Lunes-2024

Se realizan actividades de protección de talud con concreto reforzado con malla para evitar socavación por aguas lluvias en algunas zonas sobre la vía en general, concretos de canalización, PERSONAL: Ing residente, HSOE, Oficial, Ayudantes, MAQUINARIA: 1 Mezcladora, clima soleado.

~~11/11~~ ~~11/11~~

2

V
