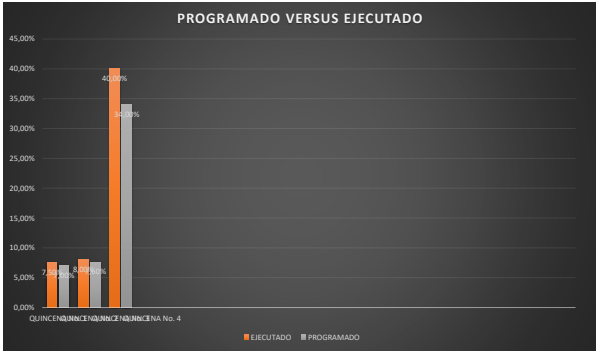



	INFORME QUINCENAL					Versión	0
	PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SEGURIDAD					Fecha	10/08/2025
						Código	F-Q-11
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA						
SUPERVISOR	JAIR ESTEBAN PINZÓN HERNÁNDEZ						
CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S.,						
CONTRATANTE	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas						
QUINCENA	No. 3	DEL	5 de diciembre de 2025			AL	18 de diciembre de 2025
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
CONTRATO DE OBRA							
Contrato No					046-2025		
Fecha de Iniciación					6/11/2025		
Fecha de Terminación Inicial					31/12/2025		
Plazo Inicial					55 días		
Valor inicial					\$ 799.444.267,00		
Prórroga No 1					N/A		
Nueva fecha de terminación					N/A		
Adición No 1					N/A		
Valor total					\$ 799.444.267,00		
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN							
ACTIVIDAD		VALOR INICIAL	% DE INCIDENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
				INICIO	FIN	INICIO	FIN
0	Suscripción de Acta de inicio			Fase 1			
1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CUBIERTA PARA 240 M2 APROX							
1.1	desmonte de membrana/ toldo/ Lona arquitectónico existente.	\$ 21.031.406,77	2,63%	17/12/2025	22/12/2025	13/12/2025	15/12/2025
1.2	Desmonte subestructura de membrana de acero postes metálicos, incluye conexiones, tensores, platinas, pernos	\$ 2.760.234,75	0,35%	23/12/2025	25/12/2025	13/12/2025	16/12/2025
1.3	Demonte de paneles de vidrio templado existente, incluye desmonte de estructura de anclaje, acopio y protección durante las actividades	\$ 2.547.277,38	0,32%	12/12/2025	18/12/2025	1/12/2025	15/12/2025
1.4	Reinstalación de paneles de vidrio existente, incluye montaje de subestructura desmontada, reemplazo de empaques y chapetas averiadas, anclajes a piso y todo lo necesario para la correcta instalación de las Lámparas	\$ 6.235.447,03	0,78%	25/12/2025	31/12/2025		
1.5	Limpieza profunda de pedestales de bases y sustratos en concreto en concreto, incluye lavado con hidrógeno lavado.	\$ 824.846,88	0,10%	22/12/2025	25/12/2025		
1.6	recomposición de áreas de paisajismo afectadas por instalación de sistema de cubierta retráctil, incluye retiro y relleno de sustrato, limpieza, retiro de capa vegetal de paisajismo, reinstalación y recomposición de especies vegetales puntuales	\$ 4.032.119,52	0,50%	22/12/2025	25/12/2025		
1.7	Inspección, chequeo y validación técnica de punto eléctrico de baja tensión, medición de capacidad, validación de circuitos en tablero existente e informe de resultado y recomendaciones.	\$ 789.141,66	0,10%	12/12/2025	17/12/2025	12/12/2025	
1.8	intervención, traslado y adecuación de punto eléctrico existente, para dar suplencia a sistema de motorización de bajo consumo e iluminación led del sistema de cubierta retráctil	\$ 1.281.626,78	0,16%	22/12/2025	30/12/2025		
1.9	Suministro e instalación de materiales y accesorios para las salidas eléctricas, incluyendo tubería EMT Ø 3/4", conduletas, cajas, toma corriente y clavija monofásica normal con polo a tierra,15 A, 120V, y seguro de giro, conductor de cobre CABLE 3No12 AW	\$ 853.599,47	0,11%	15/12/2025	19/12/2025		
1.10	suministro e instalación de access point antena direccional tipo para exteriores tipo EI TP-Link CPE710 o superior para enlaces inalámbricos de largo alcance apta para exteriores, incluye canalización, validación e integración al sistema de infraestructura	\$ 2.044.855,18	0,26%	26/12/2025	31/12/2025		
1.11	Suministro, instalación y desmonte de Cerramiento de protección en poli sombra, incluye subestructura de soporte.	\$ 1.059.844,50	0,13%	19/12/2025	25/12/2025		
1.12	Lavado profundo con medios mecánicos en obra de piso de concreto existente, desbastado o rebaje conforme estado de las piezas de prefabricado instalado , recomposición del color de la losetas	\$ 6.451.253,25	0,81%	22/12/2025	24/12/2025		
1.13	Aseo, Acopio y empaque de escombros en lonas, incluye disposición final fuera del área.	\$ 2.857.036,26	0,36%	26/12/2025	31/12/2025		
1.14	Disposición final de elementos de aceros y membrana textil desmontada, en sitios certificado.	\$ 979.226,14	0,12%	23/12/2025	29/12/2025		
	FIN DE ACTIVIDADES	\$ 979.226,14	0,12%	23/12/2025	29/12/2025		
2. SISTEMA TOTAL MECANICO DE CUBIERTA RETRACTIL (240 m2)							
	Desarrollos planimétricos del sistema, incluye ajustes	\$ -	0,00%	6/11/2025	17/11/2025	6/11/2025	17/11/2025
	Presentación y aprobación por parte de la supervisión	\$ -	0,00%	18/11/2025	19/11/2025	18/11/2025	19/11/2025
	Importación de materiales	\$ -	0,00%	18/11/2025	20/11/2025	18/11/2025	20/11/2025
	Ejecución y preensamblado en taller	\$ -	0,00%	20/11/2025	10/12/2025	20/11/2025	
	Elaboración de elementos de cimentación	\$ -	0,00%	9/12/2025	15/12/2025	14/12/2025	
2.1	Sistema total tipo módulos de cubierta mecanizado para 240m2 aproa de cobertura total, compuesto por estructura perimetral 120x120 Aluminio; fijación mediante tornillería. Totalmente autoportante y desmontable, con elementos propios del sistema de conexión	\$ 642.344.614,58	80,35%	19/12/2025	31/12/2025		
	FIN SISTEMA TOTAL	\$ -	0,00%	31/12/2025	31/12/2025		
3. SISTEMA DE TOLDO CORTAVIENTOS LATERAL							
3.1	Sistema general de cortavientos toldo o cortina tipo Nimbus, xp 10003 o Baneta o en medidas conforme frentes perimetrales designados del área color a definir con tela o lona en membrana acrílica PVC tipo Solis o equivalente con permeabilidad y transluce	\$ 103.351.736,85	12,93%	19/12/2025	31/12/2025		
	FIN SISTEMA DE TOLDO CORTAVIENTOS LATERAL		0,00%	31/12/2025	31/12/2025		

	INFORME QUINCENAL			Versión	0
	PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SEGURIDAD			Fecha Código	10/08/2025 F-Q-11
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA				
SUPERVISOR	JAIR ESTEBAN PINZÓN HERNÁNDEZ				
CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S.,				
CONTRATANTE	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas				
QUINCENA	No. 3	DEL	5 de diciembre de 2025	AL	18 de diciembre de 2025
3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN - GRAFICA DE COMPORTAMIENTO PROGRAMADO VERSUS EJECUTADO					
SEMANA No.	EJECUTADO	PROGRAMADO			
QUINCENA No. 1	7,50%	7,00%			
QUINCENA No. 2	8,00%	7,60%			
QUINCENA No. 3	40,00%	34,00%			
QUINCENA No. 4					
4. CONTROL PERSONAL OBRA					
CARGO			PRESENTE INFORME	CANTIDAD	
DIRECTOR			1	1	
RESIDENTE			1	1	
RESIDENTE DE JUNIOR			1	1	
RESIDENTE SST			1	1	
MAESTRO DE OBRA			1	1	
PROVEEDOR PARASOLES			1	1	
TOTAL PERSONAL PRESENTE			QUINCENA	No. 3	6
5. CONTROL DEL CLIMA					
FECHA	SOL	LLUVIA			
6/1/2025	4	4			
7/1/2025	3	5			
8/1/2025	4	4			
9/1/2025	5	3			
10/1/2025	4	4			
11/1/2025	5	5			
12/1/2025	3	6			
13/1/2025	4	4			
14/1/2025	6	0			
15/1/2025	8	0			
16/1/2025	4	4			
17/1/2025	5	3			
18/1/2025	4	5			
19/1/2025	7	1			
20/1/2025	4	4			
21/1/2025	4	4			
22/1/2025	5	3			
23/1/2025	3	5			
24/1/2025	4	4			
25/1/2025	4	4			
26/1/2025	6	2			
27/1/2025	5	3			
28/1/2025	4	4			
29/1/2025	5	3			
30/1/2025	4	4			
1/2/2025	3	5			
2/2/2025	4	4			
3/2/2025	5	3			
4/2/2025	4	4			
5/2/2025	4	4			
6/2/2025	4	4			
7/2/2025	4	4			
8/2/2025	4	4			
9/2/2025	4	4			
10/2/2025	4	4			
11/2/2025	4	4			
12/2/2025	4	4			
13/2/2025	4	4			
14/2/2025	4	4			
15/2/2025	4	4			
16/2/2025	4	4			
17/2/2025	4	4			
18/2/2025	4	4			
19/2/2025	4	4			
20/2/2025					
21/2/2025					
22/2/2025					
23/2/2025					
24/2/2025					
25/2/2025					
26/2/2025					
27/2/2025					
28/2/2025					
29/2/2025					
30/2/2025					
31/2/2025					
TOTAL DÍAS		DÍAS DE SOL	DÍAS DE LLUVIA		
		23,50	20,00		

2025

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO



SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

NOTA: para la Quincena se presentan lluvias

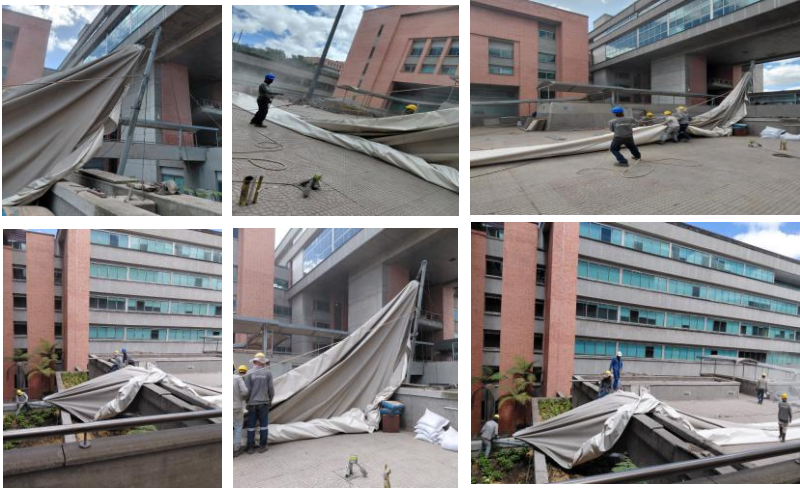	INFORME QUINCENAL				Versión	0
	PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SEGURIDAD				Fecha	10/08/2025
					Código	F-Q-11
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MÓDULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA					
SUPERVISOR	JAIR ESTEBAN PINZÓN HERNÁNDEZ					
CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA S.A.S.,					
CONTRATANTE	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas					
QUINCENA	No. 3	DEL	5 de diciembre de 2025	AL	18 de diciembre de 2025	
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS						
6.1 - REGISTRO FOTOGRÁFICO/ESQUEMAS REVISADOS					DESCRIPCIÓN	
					Se realiza desmonte de carpa, construcción de dados y se inicia el acopio de material de parasoles tropicales.	
Revisión de requisitos de SST, verificación ruta de acceso, ruta de evacuación.						
						
Desmonte de carpa central.						
7. ACTIVIDADES, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES, COMPROMISOS						
El día 13 de diciembre de 2025 se dio inicio a las actividades de desmonte de la carpa y de la estructura asociada. En la misma fecha, se inició el proceso de revisión preliminar con el proveedor Parasoles Tropicales, orientado a la remisión de la documentación del personal que intervendría en el proyecto. Para tal efecto, se les informó de manera detallada los requisitos documentales exigidos para cada trabajador, con el fin de proceder a la validación correspondiente. Posteriormente, el día 15 de diciembre de 2025, se dio inicio formal al proceso de revisión de la documentación del personal encargado de la instalación de las pérgolas. A la fecha, dicha documentación no ha sido subsanada en su totalidad, lo cual ha impedido la habilitación completa del personal para el ingreso y ejecución de labores. Adicionalmente, durante la semana comprendida entre el 15 y el 19 de diciembre de 2025, no fue posible ejecutar las actividades correspondientes a la construcción civil de los dados, debido a la realización de audiencias previamente programadas por la entidad, las cuales tienen prioridad por la misionalidad de la entidad y restringen el desarrollo de actividades constructivas dentro de las instalaciones. Las situaciones anteriormente descritas generaron dilaciones en el cronograma inicialmente previsto, ajenas a la voluntad de esta parte y derivadas de condiciones administrativas propias de la entidad.						
8. FIRMA RESPONSABLES						
 PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA SAS (PROSOI.SAS) CARGO: Director de Obra NOMBRE: Alvaro Rodríguez CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CARGO: Supervisor NOMBRE: Jair Pinzon						
