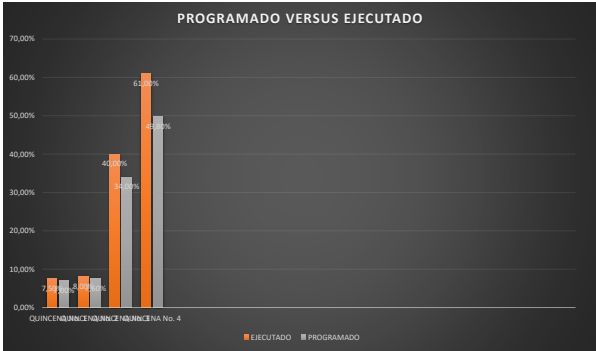



	INFORME QUINCENAL					Versión		0
	PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SEGURIDAD					Fecha		10/08/2025
						Código		F-Q-11
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA							
SUPERVISOR	JAIR ESTEBAN PINZÓN HERNÁNDEZ							
CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S.,							
CONTRATANTE	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas							
QUINCENA	No. 4	DEL	19 de diciembre de 2025			AL	1 de enero de 2026	
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL								
CONTRATO DE OBRA								
Contrato No					046-2025			
Fecha de iniciación					6/11/2025			
Fecha de Terminación Inicial					31/12/2025			
Plazo inicial					55 días			
Valor inicial					\$ 799.444.267,00			
Prórroga No.1					N/A			
Nueva fecha de terminación								
Adición No 1					N/A			
Valor total					\$ 799.444.267,00			
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN								
ACTIVIDAD		VALOR INICIAL	% DE INCIDENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	
Fase 1								
0	Suscripción de Acta de inicio							
1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CUBIERTA PARA 240 M2 APROX								
1.1	desmonte de membrana/ toldo/ Lona arquitectónica existente.	\$ 21.031.406,77	2,63%	17/12/2025	22/12/2025	13/12/2025	15/12/2025	
1.2	Desmonte subestructura de membrana de acero postes metálicos, incluye conexiones, tensores, platinas, pernos	\$ 2.760.234,75	0,35%	23/12/2025	25/12/2025	13/12/2025	16/12/2025	
1.3	Demonte de paneles de vidrio templado existente, incluye desmonte de estructura de anclaje, acopio y protección durante las actividades	\$ 2.547.277,38	0,32%	12/12/2025	18/12/2025	1/12/2025	15/12/2025	
1.4	Reinstalación de paneles de vidrio existente, incluye montaje de subestructura desmontada, reemplazo de empaques y chapetas averiadas, anclajes a piso y todo lo necesario para la correcta instalación de las Lámparas	\$ 6.235.447,03	0,78%	25/12/2025	31/12/2025			
1.5	Limpieza profunda de pedestales de bases y sustratos en concreto en concreto, incluye lavado con hidrógeno peróxido	\$ 824.846,88	0,10%	22/12/2025	25/12/2025			
1.6	recomposición de áreas de paisajismo afectadas por instalación de sistema de cubierta retráctil, incluye retiro y relleno de sustrato, limpieza, retiro de capa vegetal de paisajismo, reinstalación y recomposición de especies vegetales puntuales	\$ 4.032.119,52	0,50%	22/12/2025	25/12/2025			
1.7	Inspección, chequeo y validación técnica de punto eléctrico de baja tensión, medición de capacidad, validación de circuitos en tablero existente e informe de resultado y recomendaciones.	\$ 789.141,66	0,10%	12/12/2025	17/12/2025	12/12/2025		
1.8	intervención, traslado y adecuación de punto eléctrico existente, para dar suplencia a sistema de motorización de bajo consumo e iluminación led del sistema de cubierta retráctil	\$ 1.281.626,78	0,16%	22/12/2025	30/12/2025			
1.9	Suministro e instalación de materiales y accesorios para las salidas eléctricas, incluyendo tubería EMT Ø 3/4", conduletas, cajas, toma corriente y clavija monofásica normal con polo a tierra,15 A, 120V, y seguro de giro, conductor de cobre CABLE 3No12 AW	\$ 853.599,47	0,11%	15/12/2025	19/12/2025			
1.10	suministro e instalación de access point antena direccional tipo para exteriores tipo EI TP-Link CPE710 o superior para enlaces inalámbricos de largo alcance apta para exteriores, incluye canalización, validación e integración al sistema de infraestructura	\$ 2.044.855,18	0,26%	26/12/2025	31/12/2025			
1.11	Suministro, instalación y desmonte de Cerramiento de protección en poli sombra, incluye subestructura de soporte.	\$ 1.059.844,50	0,13%	19/12/2025	25/12/2025			
1.12	Lavado profundo con medios mecánicos en obra de piso de concreto existente, desbastado o rebaje conforme estado de las piezas de prefabricado instalado , recomposición del color de la losetas	\$ 6.451.253,25	0,81%	22/12/2025	24/12/2025			
1.13	Aseo, Acopio y empaque de escombros en tonas, incluye disposición final fuera del área.	\$ 2.857.036,26	0,36%	26/12/2025	31/12/2025			
1.14	Disposición final de elementos de aceros y membrana textil desmontada, en sitios certificado.	\$ 979.226,14	0,12%	23/12/2025	29/12/2025			
	FIN DE ACTIVIDADES	\$ 979.226,14	0,12%	23/12/2025	29/12/2025			
2. SISTEMA TOTAL MECANICO DE CUBIERTA RETRACTIL (240 m2)								
	Desarrollos planimétricos del sistema, incluye ajustes	\$ -	0,00%	6/11/2025	17/11/2025	6/11/2025	17/11/2025	
	Presentación y aprobación por parte de la supervisión	\$ -	0,00%	18/11/2025	19/11/2025	18/11/2025	19/11/2025	
	Importación de materiales	\$ -	0,00%	18/11/2025	20/11/2025	18/11/2025	20/11/2025	
	Ejecución y preensamblado en taller	\$ -	0,00%	20/11/2025	10/12/2025	20/11/2025		
	Elaboración de elementos de cimentación	\$ -	0,00%	9/12/2025	15/12/2025	14/12/2025		
2.1	Sistema total tipo módulos de cubierta mecanizado para 240m2 aproa de cobertura total, compuesto por estructura perimetral 120x120 Aluminio; fijación mediante tornillería. Totalmente autoportante y desmontable, con elementos propios del sistema de conexión	\$ 642.344.614,58	80,35%	19/12/2025	31/12/2025	19/12/2025		
	FIN SISTEMA TOTAL	\$ -	0,00%	31/12/2025	31/12/2025			
3. SISTEMA DE TOLDO CORTAVIENTOS LATERAL								
3.1	Sistema general de cortavientos toldo o cortina tipo Nimbus, xp 10003 o Baneta o en medidas conforme frentes perimetrales designados del área color a definir con tela o lona en membrana acrílica PVC tipo Soltis o equivalente con permeabilidad y transluce	\$ 103.351.736,85	12,93%	19/12/2025	31/12/2025			
	FIN SISTEMA DE TOLDO CORTAVIENTOS LATERAL		0,00%	31/12/2025	31/12/2025			

	INFORME QUINCENAL			Versión	0
	PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SEGURIDAD			Fecha Código	10/08/2025 F-Q-11
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA				
SUPERVISOR	JAIR ESTEBAN PINZÓN HERNÁNDEZ				
CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S.,				
CONTRATANTE	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas				
QUINCENA	No. 4	DEL	19 de diciembre de 2025	AL	1 de enero de 2026
3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN - GRAFICA DE COMPORTAMIENTO PROGRAMADO VERSUS EJECUTADO					
SEMANA No.	EJECUTADO	PROGRAMADO			
QUINCENA No. 1	7,50%	7,00%			
QUINCENA No. 2	8,00%	7,60%			
QUINCENA No. 3	40,00%	34,00%			
QUINCENA No. 4	61,00%	49,80%			
4. CONTROL PERSONAL OBRA					
CARGO			PRESENTE INFORME	CANTIDAD	
DIRECTOR			1	1	
RESIDENTE			1	1	
RESIDENTE DE JUNIOR			1	1	
RESIDENTE SST			1	1	
MAESTRO DE OBRA			1	1	
PROVEEDOR PARASOLES			1	5	
TOTAL PERSONAL PRESENTE			QUINCENA	No. 4	10
5. CONTROL DEL CLIMA					
FECHA	SOL	LLUVIA			
6/1/2025	4	4			
7/1/2025	3	5			
8/1/2025	4	4			
9/1/2025	5	3			
10/1/2025	4	4			
11/1/2025	5	5			
12/1/2025	3	6			
13/1/2025	4	4			
14/1/2025	6	0			
15/1/2025	8	0			
16/1/2025	4	4			
17/1/2025	5	3			
18/1/2025	4	5			
19/1/2025	7	1			
20/1/2025	4	4			
21/1/2025	4	4			
22/1/2025	5	3			
23/1/2025	3	5			
24/1/2025	4	4			
25/1/2025	4	4			
26/1/2025	6	2			
27/1/2025	5	3			
28/1/2025	4	4			
29/1/2025	5	3			
30/1/2025	4	4			
1/2/2025	3	5			
2/2/2025	4	4			
3/2/2025	5	3			
4/2/2025	4	4			
5/2/2025	4	4			
6/2/2025	4	4			
7/2/2025	4	4			
8/2/2025	4	4			
9/2/2025	4	4			
10/2/2025	4	4			
11/2/2025	4	4			
12/2/2025	4	4			
13/2/2025	4	4			
14/2/2025	4	4			
15/2/2025	4	4			
16/2/2025	4	4			
17/2/2025	4	4			
18/2/2025	4	4			
19/2/2025	4	4			
20/2/2025	4	4			
21/2/2025	3	5			
22/2/2025	4	4			
23/2/2025	4	4			
24/2/2025	5	3			
25/2/2025	4	4			
26/2/2025	4	4			
27/2/2025	4	4			
28/2/2025	4	4			
29/2/2025	4	4			
30/2/2025	4	4			
31/2/2025	4	4			
1/3/2025	5	3			
2/3/2025					
3/3/2025					
4/3/2025					
5/3/2025					
6/3/2025					
7/3/2025					
8/3/2025					
9/3/2025					
10/3/2025					
11/3/2025					
12/3/2025					
13/3/2025					
14/3/2025					
15/3/2025					
16/3/2025					
17/3/2025					
18/3/2025					
19/3/2025					
20/3/2025					
21/3/2025					
22/3/2025					
23/3/2025					
24/3/2025					
25/3/2025					
26/3/2025					
27/3/2025					
28/3/2025					
29/3/2025					
30/3/2025					
31/3/2025					
1/4/2025					
2/4/2025					
3/4/2025					
4/4/2025					
5/4/2025					
6/4/2025					
7/4/2025					
8/4/2025					
9/4/2025					
10/4/2025					
11/4/2025					
12/4/2025					
13/4/2025					
14/4/2025					
15/4/2025					
16/4/2025					
17/4/2025					
18/4/2025					
19/4/2025					
20/4/2025					
21/4/2025					
22/4/2025					
23/4/2025					
24/4/2025					
25/4/2025					
26/4/2025					
27/4/2025					
28/4/2025					
29/4/2025					
30/4/2025					
1/5/2025					
2/5/2025					
3/5/2025					
4/5/2025					
5/5/2025					
6/5/2025					
7/5/2025					
8/5/2025					
9/5/2025					
10/5/2025					
11/5/2025					
12/5/2025					
13/5/2025					
14/5/2025					
15/5/2025					
16/5/2025					
17/5/2025					
18/5/2025					
19/5/2025					
20/5/2025					
21/5/2025					
22/5/2025					
23/5/2025					
24/5/2025					
25/5/2025					
26/5/2025					
27/5/2025					
28/5/2025					
29/5/2025					
30/5/2025					
31/5/2025					
1/6/2025					
2/6/2025					
3/6/2025					
4/6/2025					
5/6/2025					
6/6/2025					
7/6/2025					
8/6/2025					
9/6/2025					
10/6/2025					
11/6/2025					
12/6/2025					
13/6/2025					
14/6/2025					
15/6/2025					
16/6/2025					
17/6/2025					
18/6/2025					
19/6/2025					
20/6/2025					
21/6/2025					
22/6/2025					
23/6/2025					
24/6/2025					
25/6/2025					
26/6/2025					
27/6/2025					
28/6/2025					
29/6/2025					
30/6/2025					
1/7/2025					
2/7/2025					
3/7/2025					
4/7/2025					
5/7/2025					
6/7/2025					
7/7/2025					
8/7/2025					
9/7/2025					
10/7/2025					
11/7/2025					
12/7/2025					
13/7/2025					
14/7/2025					
15/7/2025					
16/7/2025					
17/7/2025					
18/7/2025					
19/7/2025					
20/7/2025					
21/7/2025					
22/7/2025					
23/7/2025					
24/7/2025					
25/7/2025					
26/7/2025					
27/7/2025					
28/7/2025					
29/7/2025					
30/7/2025					
31/7/2025					
1/8/2025					
2/8/2025					
3/8/2025					
4/8/2025					
5/8/2025					
6/8/2025					
7/8/2025					
8/8/2025					
9/8/2025					
10/8/2025					
11/8/2025					
12/8/2025					
13/8/2025					
14/8/2025					
15/8/2025					
16/8/2025					
17/8/2025					
18/8/2025					
19/8/2025					
20/8/2025					
21/8/2025					
22/8/2025					
23/8/2025					
24/8/2025					
25/8/2025					
26/8/2025					
27/8/2025					
28/8/2025					
29/8/2025					
30/8/2025					
31/8/2025					
1/9/2025					
2/9/2025					
3/9/2025					
4/9/2025					
5/9/2025					
6/9/2025					
7/9/2025					
8/9/2025					
9/9/2025					
10/9/2025					
11/9/2025					
12/9/2025					
13/9/2025					
14/9/2025					
15/9/2025					
16/9/2025					
17/9/2025					
18/9/2025					
19/9/2025					
20/9/2025					
21/9/2025					
22/9/2025					
23/9/2025					
24/9/2025					
25/9/2025					
26/9/2025					
27/9/2025					
28/9/2025					
29/9/2025					
30/9/2025					
1/10/2025					
2/10/2025					
3/10/2025					
4/10/2025					
5/10/2025					
6/10/2025					
7/10/2025					
8/10/2025					
9/10/2025					
10/10/2025					
11/10/2025					
12/10/2025					
13/10/2025					
14/10/2025					
15/10/2025					
16/10/2025					
17/10/2025					
18/10/2025					
19/10/2025					
20/10/2025					
21/10/2025					
22/10/2025					
23/10/2025					
24/10/2025					
25/10/2025					
26/10/2025					
27/10/2025					
28/10/2025					
29/10/2025					
30/10/2025					
31/10/2025					
1/11/2025					
2/11/2025					
3/11/2025					
4/11/2025					
5/11/2025					
6/11/2025					
7/11/2025					
8/11/2025					
9/11/2025					
10/11/2025					
11/11/2025					
12/11/2025					
13/11/2025					
14/11/2025					
15/11/2025					
16/11/2025					
17/11/2025					
18/11/2025					
19/11/2025					
20/11/2025					
21/11/2025					
22/11/2025					
23/11/2025					
24/11/2025					
25/11/2025					
26/11/2025					
27/11/2025					
28/11/2025					
29/11/2025					
30/11/2025					
1/12/2025					
2/12/2025					
3/12/2025					
4/12/2025					
5/12/2025					
6/12/2025					
7/12/2025					
8/12/2025					
9/12/2025					
10/12/2025					
11/12/2025					
12/12/2025					
13/12/2025					
14/12/2025					
15/12/2025					
16/12/2025					
17/12/2025					
18/12/2025					
19/12/2025					
20/12/2025					
21/12/2025					
22/12/2025					
23/12/2025					
24/12/2025					
25/12/2025					
26/12/2025					
27/12/2025					
28/12/2025					
29/12/2025					
30/12/2025					
31/12/2025					
TOTAL DÍAS	DÍAS DE SOL 30,63	DÍAS DE LLUVIA 26,88			

		INFORME QUINCENAL		Versión 0	
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SEGURIDAD				Fecha 10/08/2025 Código F-Q-11	
OBJETO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA					
SUPERVISOR JAIR ESTEBAN PINZÓN HERNÁNDEZ					
CONTRATISTA PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S.,					
CONTRATANTE Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas					
QUINCENA		No. 4		DEL 19 de diciembre de 2025 AL 1 de enero de 2026	
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS					
6.1 - REGISTRO FOTOGRÁFICO/ESQUEMAS REVISADOS					DESCRIPCIÓN
 					Se inicia instalacion de estructura de pergola.
 					
					
Desmonte de carpa central.					
7. ACTIVIDADES, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES, COMPROMISOS					
El día 19 de diciembre de 2025 se dio inicio a las actividades correspondientes a la instalación de la estructura de la carpa, procediéndose al montaje de la totalidad de la estructura de parasoles tropicales. No obstante, el proveedor informó que, entre el 31 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, su personal se encontraba en periodo de descanso programado, razón por la cual las labores fueron retomadas a partir del día 5 de enero de 2026. Durante el transcurso de los quince (15) días posteriores, se realizó visita técnica con el ingeniero electricista, quien efectuó la verificación del tablero eléctrico. Sin embargo, se dejó constancia de que, hasta tanto no se encuentre completamente instalada la estructura, no es posible ejecutar las instalaciones eléctricas correspondientes, por tratarse de actividades dependientes del avance físico de la obra. Por otra parte, se solicitó al supervisor la prorroga al contrato toda vez, que el clima no nos a favorecido en la ejecucion de las actividades, y la temporada decembrina, a afectado la entrega de materiales. Prorroga que fue emitida al supervisor del contrato.					
8. FIRMA RESPONSABLES					
 PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS (PROSOI SAS) CARGO: Director de Obra NOMBRE: Alvaro Rodriguez CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CARGO: Supervisor NOMBRE:					
