

**OBJETO: OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL
TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025-2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.**

INFORME DE SUPERVISION No. 02

LINO RODRIGUEZ OCHOA

SUPERVISOR

**MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**



TAURAMENA 2026

FECHA: 02/MARZO/2026

**INFORME DE SUPERVISION No. 02**

CONVENIO No.	039 del 7 de noviembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Convenio solidario para la ejecución de obras
OBJETO	OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025-2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
EJECUTOR	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, NIT: 900.002.220-8
R/LEGAL	HENRY PAÚL ALFONSO, C.C.: 74.861.785 de Yopal
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA
APOYO SUPERVISIÓN	CARLOS ANDRES RINCON PARRA
VALOR TOTAL CONVENIO	\$432,910,365
VALOR APOORTE MUNICIPIO	\$389,318,940
VALOR APOORTE ASOJUNTAS	\$43,591,425
FECHA INICIACIÓN	01 de diciembre de 2025
FECHA TERMINACIÓN	11 de mayo de 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN	26 de diciembre de 2025 - 16 de febrero de 2026
% AVANCE FINANCIERO	41.93%
% AVANCE FISICO	41.93%
FECHA PRESENTE INFORME	2 de marzo de 2026

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 029 de 2004 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula Décima del Contrato en mención; me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA		RESULTADOS OBTENIDOS	
		% contratado	% ejecutado
APOORTE MUNICIPIO			
Mantenimiento de vías terciarias mediante conformación de la subrasante (incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación). (Las maquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo de equipo)		89.93%	37.70%
APOORTE ASOJUNTAS			
Limpieza y desmonte para el mantenimiento de la franja vial (a=3m a cada lado)		10.07%	6.50%
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	Permanente		

**2. GARANTÍAS**

El ejecutor presentó las siguientes:	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento	X			12 de noviembre de 2025
Responsabilidad civil extracontractual	X			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X			

PÓLIZA N°	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
BY-100058677	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	Cumplimiento	\$86,582,073.00	7 de noviembre de 2025	28 de agosto de 2026	N.A.
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$43,291,036.50	7 de noviembre de 2025	28 de abril de 2029	N.A.
BY-100009531		Responsabilidad civil extracontractual	\$284,700,000.00	7 de noviembre de 2025	28 de abril de 2026	N.A.

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONVENIO	ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS
		ANTICIPADO		
Valor Aporte Municipio	\$389,318,940.00			
Valor Aporte Asojuntas	\$43,591,425.00			
Valor anticipo aporte municipio (0%)		\$0.00		\$0.00
Valor adicional No. (XX) aporte municipio	\$0.00			\$0.00
Valor Acta Parcial No. 01 aporte Municipio		\$0.00	\$62,291,030.00	\$62,291,030.00
Valor Acta Parcial No. 01 aporte Asojuntas			\$7,030,875.00	
Valor presente Acta Parcial No. 002 aporte Municipio			\$100,934,540.00	\$100,934,540.00
Valor presente Acta Parcial No. 002 aporte Asojuntas			\$21,092,625.00	
Saldo por ejecutar aporte municipio			\$226,093,370.00	
Saldo por ejecutar aporte asojuntas			\$15,467,925.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	\$432,910,365.00		\$432,910,365.00	\$163,225,570.00

**4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO**

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

Para el presente periodo no se materializó riesgo alguno.

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
Acta de inicio	01 de diciembre de 2025
Informe de Supervisión No. 01	26 de diciembre de 2025
Acta parcial No. 01	26 de diciembre de 2025
Informe de Supervisión No. 02	02 de marzo de 2026
Acta parcial No. 02	02 de marzo de 2026

Se deja constancia, que el Ejecutor hizo entrega de: Informe de ejecución No. 02 de fecha del 27 de febrero de 2026 con sus respectivos soportes. Asojuntas presenta certificación de fecha de 27 de febrero de 2026, donde consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a seguridad social, firmada por el R/L de Asojuntas y el contador público), los cuales se remiten a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

6. ANEXOS

1. Anexo 1. Informe del Acta parcial No. 02 del convenio en ejecución.
2. Anexo 2. Planillas de pago de seguridad social correspondientes a los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026.

CARLOS ANDRÉS RINCON PARRA

Apoyo a la supervisión

LINO RODRÍGUEZ OCHOA

SUPERVISOR

**ANEXO 1****INFORME DE SUPERVISION No. 02**

OBJETO	OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025-2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, NIT: 900.002.220-8
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

DESCRIPCION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

- 1** *ITEM 1. Mantenimiento vías terciarias mediante conformación de la subrasante (incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación) (las maquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo de equipo).*

Se adelantaron actividades de reconfiguración y recuperación de la banca, limpieza mecánica de cunetas, escarificación del material de afirmado existente, extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales, por medio de la maquinaria amarilla del Municipio y volqueta en las veredas de Visinaca via lagunitas, en Visinaca via los lirios, en la vereda Cabañas de Tauramena y en la Bendiciones y Jaguito. Así tambien se atendieron emergencias como el retiro de escombros, limpieza de las zonas y estabilización del terreno en zonas donde se presentaron derrumbes.

- 2** *ITEM 2. Limpieza y desmonte para el mantenimiento de la franja vial (a=3m de cada lado)*

Como aporte por parte de ASOJUNTAS, se realizaron las actividades de limpieza, rocería y desmonte de las franjas viales que angostaban, obstruían, obstaculizaban e incomodaban el correcto tránsito de los vehículos en los carretables con mano de obra local y se evidenció mediante el apoyo en la ejecución de la actividad del mejoramiento de las vías terciarias del Municipio de Tauramena con el fin de garantizar la accesibilidad del área rural hacia el área urbana y viceversa en donde se garantiza el tránsito de los usuarios en forma aceptable, permanente y que la circulación no sufra interrupciones, promoviendo más movilidad de bienes y pasajeros, de este modo haciendo parte a las comunidades el proceso de desarrollo local. Estas son actividades que de acuerdo con sus especificaciones no son complejas, no requieren tecnologías avanzadas y se realizan con mano de obra local.

**ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO****INFORME DE SUPERVISION No. 02**

OBJETO	OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025-2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, NIT: 900.002.220-8
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

INFORME FOTOGRAFICO**FOTOGRAFÍA No. 1**

Trabajo conjunto de motoniveladora realizando escarificación, perfilado, nivelación y conformación de cunetas, seguida de vibrocompactador efectuando la compactación del material para garantizar la adecuada estabilidad de la vía. Vereda Visinaca via lagunitas.

**FOTOGRAFÍA No. 2**

Se realizó el mantenimiento del sistema de frenos de la Volqueta de placas OSE966, la cual presentaba fallas en el sistema del recargue del aire tambien se realizó el mantenimiento de cumplimiento de horómetro de la retroexcavadora en donde se realiza el cambio de filtros y aceite con el fin de mantener la vida útil de la maquinaria.



**ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO****INFORME DE SUPERVISION No. 02**

OBJETO	OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025-2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, NIT: 900.002.220-8
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

INFORME FOTOGRAFICO**FOTOGRAFÍA No. 03**

Se realizó limpieza de la vegetación que invadía la vía, con apoyo de la comunidad mediante machetes. Esta cobertura generaba sombreado que impedía el secado del material y afectaba la adecuada compactación. Vereda Visinaca.



**ANEXO 3****INFORME DE SUPERVISION No. 02**

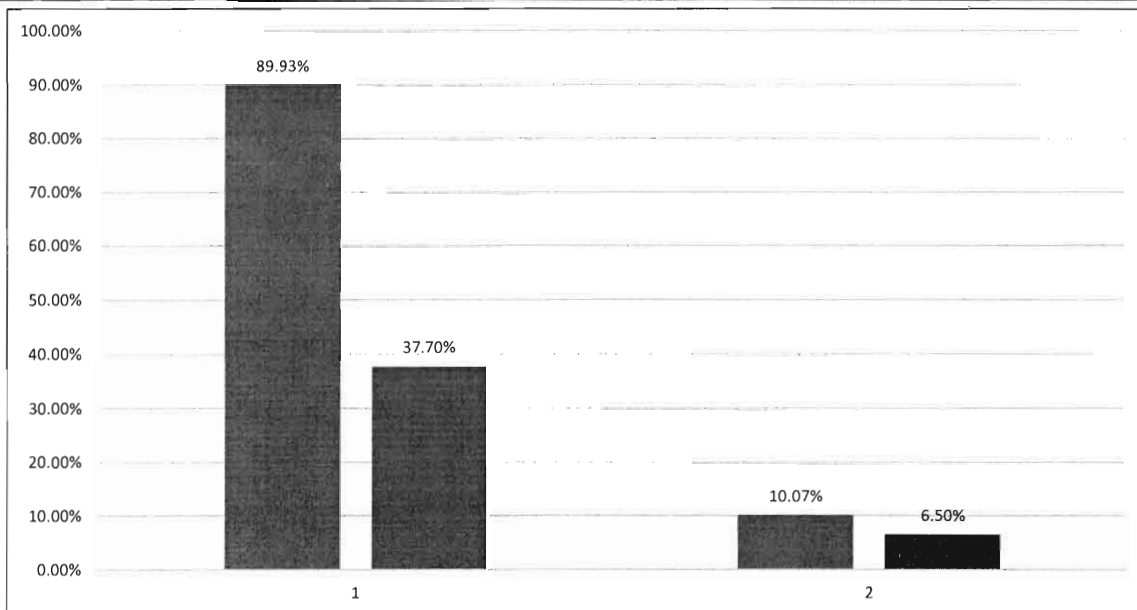
OBJETO	OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025-2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, NIT: 900.002.220-8
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	% CONTRATADO	% EJECUTADO TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO TOTAL
A	APORTE MUNICIPIO									
1	Mantenimiento de vías terciarias mediante conformación de la subrasante (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación). (Las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)	km	135.00	35.00	56.60	89.93%	37.70%	\$ 2,883,844.00	\$ 389,318,940.00	\$ 163,225,570.00
B	APORTE ASOJUNTAS									
2	Limpieza y desmonte para el mantenimiento de la franja vial (a=3m a cada lado)	km	31.00	15.00	20.00	10.07%	6.50%	\$ 1,406,175.00	\$ 43,591,425.00	\$ 28,123,500.00
VALOR CONVENIO SOLIDARIO									VALORES TOTALES	\$ 432,910,365.00
									VALOR EJECUTADO APOORTE MUNICIPIO	\$ 163,225,570.00
									SALDO POR EJECUTAR APOORTE MUNICIPIO	\$ 226,093,370.00

**ANEXO 4****INFORME DE SUPERVISION No. 02**

OBJETO	OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025-2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, NIT: 900.002.220-8
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)**CANTIDADES CONTRATADAS (AZUL) VS CANTIDADES EJECUTADAS (ROJO)****A APOORTE MUNICIPIO**

Mantenimiento de vías terciarias mediante conformación de la subrasante (Incluye: escarificar, perfilar, 1 conformar, riego y compactación). (Las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)

B APOORTE ASOJUNTAS

2 Limpieza y desmonte para el mantenimiento de la franja vial (a=3m a cada lado)

**INFORME DE SUPERVISION / INTERVENTORÍA**

FCO09-05

Versión: 7

ANEXO 5**INFORME DE SUPERVISION No. 02**

OBJETO	OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025-2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, NIT: 900.002.220-8
INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
NOVIEMBRE 2025	3					
	4					
DICIEMBRE 2025	1	Revision de Documentos		Acta de Inicio		
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4			Acta parcial No. 01	Revisión	
ENERO 2026	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
FEBRERO 2026	1				Seguimiento	
	2	Revision de Documentos			Seguimiento	
	3	Revision de Documentos			Seguimiento	
	4			Acta parcial No. 02	Revisión	
MARZO 2026	1					
	2					
	3					
	4					
ABRIL 2026	1					
	2					
	3					
	4					
