



**1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.7380933**

|                                     |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA NO.                | CO1.PCCNTR.7380933                                                                                                                                                 |
| OBJETO                              | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                                        |
| CONTRATISTA                         | TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. - Ticom S.A NIT: 830509276-3/ RL JOSÉ MARÍA VECINO VILLAREAL C.C. NO. 72.162.008 DE BARRANQUILLA            |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                | 5 DE FEBRERO DE 2025                                                                                                                                               |
| LOCALIDAD                           | DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA                                                                                                                 |
| PLAZO INICIAL                       | ONCE (11) MESES, EN TODO CASO SIN EXTENDERSE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.                                                                                         |
| VALOR                               | SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/L (\$ 65.092.452.719,47) |
| FECHA DE INICIACIÓN DE CONTRATO     | 6 DE JUNIO DE 2025                                                                                                                                                 |
| SUPERVISOR                          | SIRLE MERCEDES DIAZ MEJÍA<br>SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                          |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  | 31 DE DICIEMBRE DEL 2025                                                                                                                                           |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 2 | 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2026                                                                                                                                          |

**2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.7837771**

|                               |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | CO1.PCCNTR.7837771                                                                                                                                                                     |
| OBJETO                        | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| CONTRATISTA                   | CONSORCIO ZAFIRO NIT: 901944868-5 / RL LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI 32.757.519 DE BARRANQUILLA                                                                                 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN          | 12 DE MAYO DE 2025                                                                                                                                                                     |
| LOCALIDAD                     | DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA                                                                                                                                     |



|                                     |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAZO INICIAL                       | ONCE (11) MESES, EN TODO CASO SIN EXTENDERSE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.                                                                  |
| VALOR                               | DOS MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/L (\$ 2.097.965.192,40) |
| FECHA DE INICIACIÓN DE CONTRATO     | 5 DE JUNIO DE 2025                                                                                                                          |
| SUPERVISOR                          | SIRLE MERCEDES DIAZ MEJÍA<br>SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS                                                                                   |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  | 31 DE DICIEMBRE DEL 2025                                                                                                                    |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 2 | 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2026                                                                                                                   |

### 3. ASPECTOS FINANCIEROS

| GIROS CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.7380933 |                                                                                                                                                                    |                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                | Sesenta y cinco mil noventa y dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos diecinueve pesos con cuarenta y siete centavos M/L (\$ 65.092.452.719,47) |                     |
| DETALLE                                   | ANTICIPO                                                                                                                                                           | SALDO DEL CONTRATO  |
| ANTICIPO                                  | NO APLICA                                                                                                                                                          | NO APLICA           |
| PRIMER PAGO                               | \$13.874.025.721,45                                                                                                                                                | \$51.218.426.998,02 |
| SEGUNDO PAGO                              | \$ 0,00                                                                                                                                                            | \$ 0,00             |
| TERCER PAGO                               | \$ 0,00                                                                                                                                                            | \$ 0,00             |
| CUARTO PAGO                               | \$ 0,00                                                                                                                                                            | \$ 0,00             |
| QUINTO PAGO                               | \$ 0,00                                                                                                                                                            | \$ 0,00             |
| PAGO CONTRA LIQUIDACION                   | \$ 0,00                                                                                                                                                            | \$ 0,00             |

| GIROS CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.7837771 |                                                                                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                         | dos mil noventa y siete millones novecientos sesenta y cinco mil ciento noventa y dos pesos con cuarenta centavos m/l (\$ 2.097.965.192,40)      |                     |
| VALOR ADICIONAL 1                                  | Ochocientos un millon cuarenta y un mil doscientos cincuenta y cinco pesos con veintiocho centavos m/l (\$ 801.041.255,28)                       |                     |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                           | Dos mil ochocientos noventa y nueve millones seis mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos con sesenta y ocho centavos m/l (\$ 2.899.006.447,68) |                     |
| DETALLE                                            | ANTICIPO                                                                                                                                         | SALDO DEL CONTRATO  |
| ANTICIPO                                           | NO APLICA                                                                                                                                        | NO APLICA           |
| PRIMER PAGO                                        | \$447.167.403,07                                                                                                                                 | \$ 2.451.839.044,61 |
| SEGUNDO PAGO                                       | \$ 0,00                                                                                                                                          | \$ 0,00             |



|                         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|
| TERCER PAGO             | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| CUARTO PAGO             | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| QUINTO PAGO             | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| PAGO CONTRA LIQUIDACION | \$ 0,00 | \$ 0,00 |

**4. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.7380933**

| CONTROL DE PÓLIZAS                                                                  |                                                 |                      |                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO                                                              | CONFIANZA<br>SWISS RE<br>CORPORATE<br>SOLUTIONS | PÓLIZA No.           | 801044771 DEL 10 DE<br>FEBRERO DEL 2025 |            |
| AMPAROS                                                                             | %                                               | VALOR (\$)           | VIGENCIA                                |            |
|                                                                                     |                                                 |                      | DESDE                                   | HASTA      |
| CUMPLIMIENTO DEL<br>CONTRATO                                                        | 10%                                             | \$ 6,509,245,271.90  | 03/02/2025                              | 30/06/2026 |
| PAGO DE SALARIOS,<br>PRESTACIONES<br>SOCIALES E<br>INDEMNIZACIONES                  | 5%                                              | \$ 3,254,622,635.95  | 03/02/2025                              | 31/12/2028 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD<br>DE LAS OBRAS<br>EJECUTADAS<br>ENTREGADAS A<br>SATISFACCIÓN | 30%                                             | \$ 19,527,735,815.70 | 03/02/2025                              | 31/12/2030 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL<br>EXTRA CONTRACTUAL                                          | 5%                                              | \$ 3,254,622,635.95  | 03/02/2025                              | 31/12/2025 |

**5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO**

| DETALLE                          | SI | NO |
|----------------------------------|----|----|
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA | X  |    |
| INFORME FINANCIERO               | X  |    |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO         | X  |    |
| OTROS                            |    |    |

| DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO:                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>La información que se registra a continuación es suministrada por la Interventoría:</i> | PORCENTAJE (%) |



|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA SEGÚN REPROGRAMACION</b> | <b>22.00%</b> |
| <b>% EJECUTADO DE OBRA</b>                                    | <b>35.38%</b> |

**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**

Durante el periodo comprendido entre el 30 de agosto al 23 de diciembre del 2025, el contratista de obra ejecutó actividades correspondientes a las etapas iniciales, de adecuación y de urbanismo del proyecto, incluyendo la localización, trazado y replanteo del área, la instalación de cerramientos provisionales y el desarrollo de demoliciones de pisos, plantillas, muros y estructuras en concreto, con su respectivo cargue, transporte y disposición de escombros. Asimismo, se adelantaron trabajos de excavación mecánica, rellenos, conformación de banca, subbases y bases granulares, así como la instalación de geotextiles, drenajes y filtros. En los componentes estructural y urbano se realizaron labores de suministro y colocación de acero de refuerzo, construcción de elementos complementarios, instalación de marco para fútbol, colocación parcial de grama sintética y siembra de palmeras. De igual forma, se avanzó en la ejecución de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas, la fabricación de registros y bancos de ductos, además de actividades de aseo general de obra y la implementación del Plan de Gestión Integral de Obra, quedando aún algunas partidas pendientes de ejecución.

Estas actividades fueron avaladas y recibidas a satisfacción por la interventoría como se evidencia en el **"Informe para acta parcial de pago No. 2"** las cuales se detallan a continuación:

| Ítems | Descripción                                                                                                                                     | Unidad | Valor Unitario | Cantidad Ejecutada Presente Mes | Acumulado | Porcentaje Acumulado Ejecutado | Cantidades por ejecutar |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|
| 1.1.1 | Localización, trazado y replanteo (m2). Incluye comisión topográfica, cartera y planos.                                                         | M2     | \$ 5.449,62    | 40941,98                        | 78956,24  | 99,32%                         | 543,76                  |
| 1.1.2 | Cerramiento provisional en tela verde h=2.10 m. Estacones en madera común. Bases en concreto 2000 psi. Para zona colindante a carrera principal | ML     | \$259.072,93   | 474,41                          | 1396,41   | 67,79%                         | 663,59                  |
| 1.2.1 | Demolición piso en baldosín.                                                                                                                    | M2     | \$ 25.951,88   | 5392,92                         | 5392,92   | 41,36%                         | 7647,38                 |
| 1.2.2 | Demolición de plantilla en concreto.                                                                                                            | M2     | \$ 22.848,12   | 5392,92                         | 5392,92   | 41,36%                         | 7647,38                 |
| 1.2.3 | Demolición manual de muros e=0.25.                                                                                                              | M2     | \$ 34.575,19   | 1466,60                         | 1466,60   | 70,06%                         | 626,67                  |
| 1.2.4 | Demoliciones de estructuras en concreto reforzado. Incluye cargue, retiro y desecho de escombros hasta 20 km.                                   | M3     | \$ 318.603,76  | 45,60                           | 54,72     | 40,87%                         | 79,18                   |
| 1.2.5 | Desmante de bancas.                                                                                                                             | UND    | \$ 51.422,56   | 52,00                           | 65,00     | 26,00%                         | 185,00                  |



## Gobernación de La Guajira

|       |                                                                                                                                                                                        |     |                  |          |          |         |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------|----------|---------|---------|
| 1.2.6 | Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado.                                                                                                                       | M3  | \$ 23.924,06     | 1085,23  | 1085,23  | 56,63%  | 831,10  |
| 2.1.1 | Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final de residuos.                                                                                     | M3  | \$ 76.441,35     | 17773,89 | 39208,03 | 100,00% | 0,00    |
| 2.2.1 | Relleno en recebo común para nivelación de terreno. Incluye extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con maquinaria pesada.                                                | M3  | \$ 76.466,17     | 4597,10  | 44687,41 | 100,00% | 0,00    |
| 2.2.3 | Subbase granular tipo invias estabilizada con cemento al 4%. Suministro, extendido, humedecimiento y compactación con rodillo vibro compactador 15 ton).                               | M3  | \$ 201.304,51    | 1308,61  | 1308,61  | 100,00% | 0,00    |
| 2.2.4 | Conformación de la banca existente.                                                                                                                                                    | M2  | \$ 964,66        | 3300,00  | 3300,00  | 100,00% | 0,00    |
| 3.5.2 | Línea de demarcación vial con pintura acrílica en frío (ml) e=0.12 m. Incluye suministro, microesferas y aplicación con equipo.                                                        | ML  | \$ 4.265,41      | 572,00   | 572,00   | 11,67%  | 4330,00 |
| 4.1.3 | Base granular, incl. suministro y compactación.                                                                                                                                        | M3  | \$ 183.145,11    | 95,00    | 95,00    | 50,75%  | 92,20   |
| 4.1.5 | Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares                                                                                                                   | M2  | \$ 8.924,06      | 547,25   | 547,25   | 58,47%  | 388,75  |
| 4.2.1 | Juego de marco para fútbol. Estructura metálica en tubería galvanizada Schedule 40 de 2-1/2" y 3". Pintura electrostática al horno. Incluye mallas porteria, transporte e INSTALACIÓN. | UND | \$ 16.492.703,01 | 1,00     | 1,00     | 100,00% | 0,00    |
| 4.2.5 | Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2. Incluye suministro, transporte, figurado, armado, colocación y amarre.                                                                               | KG  | \$ 9.391,73      | 7495,85  | 7495,85  | 94,68%  | 421,27  |
| 4.2.6 | Base granular, incl. Suministro y                                                                                                                                                      | M3  | \$ 183.145,11    | 623,75   | 623,75   | 83,08%  | 127,05  |



# Gobernación de La Guajira

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |               |          |          |         |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------|----------|---------|--------|
|        | compactación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |               |          |          |         |        |
| 4.2.7  | Subbase granular tipo invias. Suministro, extendido, humedecimiento y compactación con rodillo vibro compactador 15 ton).                                                                                                                                                                                                                            | M3  | \$ 167.030,08 | 392,10   | 392,10   | 52,22%  | 358,70 |
| 4.2.8  | Cárcamo perimetral para drenajes de all 0.4m x 0.45m                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ML  | \$ 288.749,62 | 98,00    | 98,00    | 27,22%  | 262,00 |
| 4.2.12 | Suministro e instalación de grama sintética monofilamento (incluye suministro de grama sintética, pegante, arena de triman (colma) espesor = 0.05m c= 8kg/m2, triturado de caucho 10 kg/m2, demarcación, transporte, y demás elementos de instalación, accesorios y todo lo demás necesario para su correcta ejecución instalación y funcionamiento) | M2  | \$ 192.122,56 | 1102,50  | 1102,50  | 57,90%  | 801,50 |
| 4.3.6  | Base granular, incl. Suministro y compactación                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3  | \$ 183.145,11 | 190,00   | 190,00   | 91,74%  | 17,10  |
| 4.3.7  | Subbase granular tipo invias. Suministro, extendido, humedecimiento y compactación con rodillo vibro compactador 15 ton).                                                                                                                                                                                                                            | M3  | \$ 167.030,08 | 190,00   | 190,00   | 91,74%  | 17,10  |
| 5.1.1  | Suministro e instalación de palmeras en nuevo punto dentro del urbanismo                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | \$ 758.972,18 | 25,00    | 25,00    | 100,00% | 0,00   |
| 6.1.1  | Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2. Incluye suministro, transporte, figurado, armado, colocación y amarre.                                                                                                                                                                                                                                             | KG  | \$ 9.391,73   | 15702,54 | 15702,54 | 99,07%  | 147,46 |
| 6.1.4  | Base granular tipo invias estabilizada con cemento al 5%. Suministro, extendido manual, humedecimiento y compactación con rodillo vibro compactador 10 ton).                                                                                                                                                                                         | M3  | \$ 246.796,24 | 226,10   | 226,10   | 100,00% | 0,00   |



## Gobernación de La Guajira

|        |                                                                                                                                                                                                                |     |                  |         |         |         |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------|---------|---------|----------|
| 6.3.4  | Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2. Incluye suministro, transporte, figurado, armado, colocación y amarre.                                                                                                       | KG  | \$ 9.391,73      | 2640,25 | 2640,25 | 100,00% | 0,00     |
| 7.2.1  | Red suministro tubería PVC p d= 1/2" RDE 9.                                                                                                                                                                    | ML  | \$ 19.448,87     | 5,00    | 5,00    | 0,83%   | 595,00   |
| 7.2.2  | Red suministro tubería PVC P D= 3/4" RDE 11.                                                                                                                                                                   | ML  | \$ 23.221,80     | 113,32  | 113,32  | 28,33%  | 286,68   |
| 7.2.4  | Punto hidráulico agua fría PVC 3/4".                                                                                                                                                                           | UND | \$ 80.251,13     | 8,00    | 8,00    | 17,39%  | 38,00    |
| 7.3.4  | Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2. Incluye suministro, transporte, figurado, armado, colocación y amarre.                                                                                                       | KG  | \$ 9.391,73      | 5580,00 | 5580,00 | 100%    | 0        |
| 7.4.8  | Tubería A.N. PVC S 4".                                                                                                                                                                                         | ML  | \$ 57.845,11     | 92,97   | 92,97   | 61,98%  | 57,03    |
| 7.5.1  | Filtro de drenaje tipo dren francés de 0.60 x 1.0 m. Suministro e instalación. (incluye excavación y retiro de material, tubería PVC drenaje con filtro d=4", grava común 1/2" y geotextil NT 4000 o similar). | ML  | \$ 233.656,39    | 1080,10 | 1693,10 | 73,76   | 602,40   |
| 7.5.3  | Material filtrante colocado. Tamaño máximo 1 1/4".                                                                                                                                                             | M3  | \$ 76.754,14     | 264,65  | 264,65  | 96,16%  | 10,57    |
| 7.5.4  | Geotextil NT 4000 para estabilización subrasante/capas granulares (inc. Suministro e instalación).                                                                                                             | M2  | \$ 180.103,76    | 3439,50 | 3439,50 | 62,49%  | 2064,90  |
| 8.1.2  | Construcción y fabricación de registro eléctrico de 1,5mtrs*1,5 metros*1,4mtrs de                                                                                                                              | UND | \$ 4.213.292,48  | 3,00    | 3,00    | 30,00%  | 7,00     |
|        | profundidad para distribución de acometidas incluye tapa e impermeabilización. Todos los ductos deberán ser sellados con poliuretano.                                                                          |     |                  |         |         |         |          |
| 8.1.3  | Fabricación de banco de ductos de 4 tubos de PVC de 4" con protección de concreto rojo pobre con cama de arena.                                                                                                | ML  | \$ 188.122,56    | 461     | 461     | 30,73%  | 1039,00  |
| 8.1.8  | Cruce de vía con topo para tubo de 4" incluye reserve.                                                                                                                                                         | UND | \$ 15.284.920,30 | 1,00    | 1,00    | 50,00%  | 1,00     |
| 10.1.1 | Aseo general de obra                                                                                                                                                                                           | M2  | \$ 6.136,09      | 7366,30 | 7366,30 | 9,27%   | 72133,7  |
| 10.1.1 | Aseo general entrega de obra.                                                                                                                                                                                  | M2  | \$ 6.136,09      | 8625,00 | 8625,00 | 10,85%  | 70875,00 |



|      |                                                 |     |                    |          |          |         |        |
|------|-------------------------------------------------|-----|--------------------|----------|----------|---------|--------|
| NP-1 | Suministro e instalación Geocelda 356-150.      | M2  | \$ 56.362,00       | 20912,80 | 84964,76 | 100,00% | 0,00   |
| NP-2 | Suministro e instalación Geocelda 356-200.      | M2  | \$ 73.824,00       | 5692,68  | 14839,28 | 98,75%  | 187,90 |
| NP-3 | Transporte y compactación de material de sitio. | M3  | \$ 37.548,00       | 1199,62  | 10622,73 | 100,00% | 0,00   |
| -    | Plan de gestión integral de obra.               | UND | \$2.574.692.775,00 | 0,47     | 0,80     | 80,00%  | 0,20   |

tabla 1. cuadro de descripción de actividades ejecutadas de la obra

De acuerdo a lo reportada por la interventoría la supervisión corrobora el porcentaje de ejecución y aprueba el pago del ACTA PARCIAL 2.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### Conclusiones:

De acuerdo con la información suministrada por la Interventoría, el contratista de obra ejecutó durante el período evaluado actividades correspondientes a las fases iniciales, de adecuación, urbanismo y redes del proyecto, evidenciando un avance físico que supera lo programado según la reprogramación vigente. Las actividades desarrolladas fueron verificadas en campo y corresponden a lo reportado en los informes mensuales y financieros presentados.

Así mismo, la Interventoría avaló técnica y administrativamente las actividades ejecutadas, dejando constancia de su conformidad con las especificaciones contractuales, tal como se evidencia en el Informe para Acta Parcial de Pago No. 2. Con base en dicha verificación, se considera procedente la aprobación del pago correspondiente al Acta Parcial No. 2.

### Recomendaciones:

Se recomienda mantener un seguimiento permanente al cronograma de obra, con el fin de asegurar que el ritmo de ejecución se conserve acorde con la programación reprogramada y se garantice el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos.

De igual forma, se sugiere reforzar la planeación y coordinación de las actividades pendientes, priorizando aquellas que puedan incidir en la continuidad de la obra, así como continuar con el control técnico, administrativo y financiero por parte de la Interventoría. Finalmente, se recomienda exigir al contratista la entrega oportuna y completa de los soportes técnicos y financieros requeridos para los próximos informes y actas parciales de pago.



## 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Demolición de baldosín




Demolición de muros



**Gobernación  
de La Guajira**



Demolición de elementos estructurales

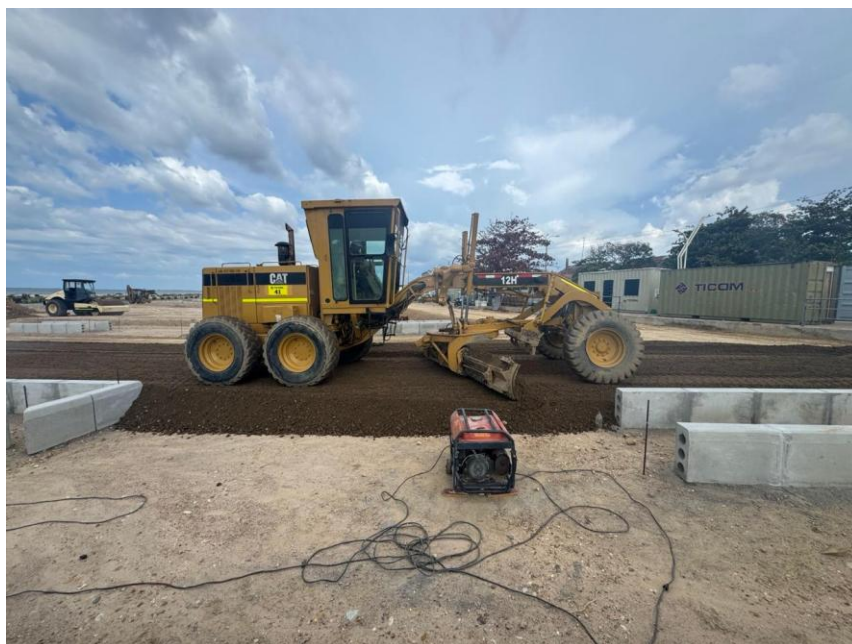

Base granular

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074  
Correo Institucional: [contactenos@laguajira.gov.co](mailto:contactenos@laguajira.gov.co)  
Centro Administrativo Departamental  
Riohacha - La Guajira



**Gobernación  
de La Guajira**



Excavación mecánica



Retiro de material

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074  
Correo Institucional: [contactenos@laguajira.gov.co](mailto:contactenos@laguajira.gov.co)  
Centro Administrativo Departamental  
Riohacha - La Guajira



**Gobernación  
de La Guajira**



Acero de tanque



Grama sintética

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074  
Correo Institucional: [contactenos@laguajira.gov.co](mailto:contactenos@laguajira.gov.co)  
Centro Administrativo Departamental  
Riohacha - La Guajira



**Gobernación  
de La Guajira**



Dren frances



Acero estructural tanque

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074  
Correo Institucional: [contactenos@laguajira.gov.co](mailto:contactenos@laguajira.gov.co)  
Centro Administrativo Departamental  
Riohacha - La Guajira



**Gobernación  
de La Guajira**



Relleno con material filtrante



Geoceldas perimetrales

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074  
Correo Institucional: [contactenos@laguajira.gov.co](mailto:contactenos@laguajira.gov.co)  
Centro Administrativo Departamental  
Riohacha - La Guajira



**Gobernación  
de La Guajira**



Geoceldas 150

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074  
Correo Institucional: [contactenos@laguajira.gov.co](mailto:contactenos@laguajira.gov.co)  
Centro Administrativo Departamental  
Riohacha - La Guajira



**Gobernación  
de La Guajira**



Geoceldas 150




Tubería agua potable

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074  
Correo Institucional: [contactenos@laguajira.gov.co](mailto:contactenos@laguajira.gov.co)  
Centro Administrativo Departamental  
Riohacha - La Guajira



**Gobernación  
de La Guajira**

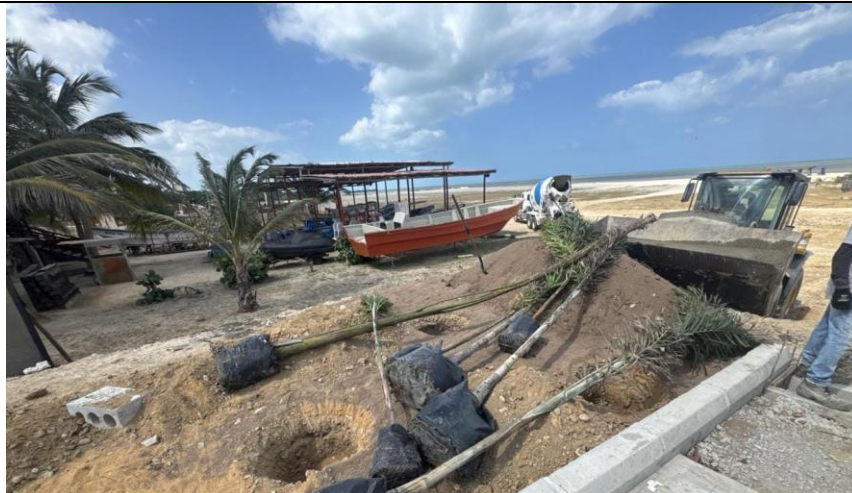

Suministro e instalación de palmeras




Señalización de ciclo ruta

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074  
Correo Institucional: [contactenos@laguajira.gov.co](mailto:contactenos@laguajira.gov.co)  
Centro Administrativo Departamental  
Riohacha - La Guajira



**Gobernación  
de La Guajira**

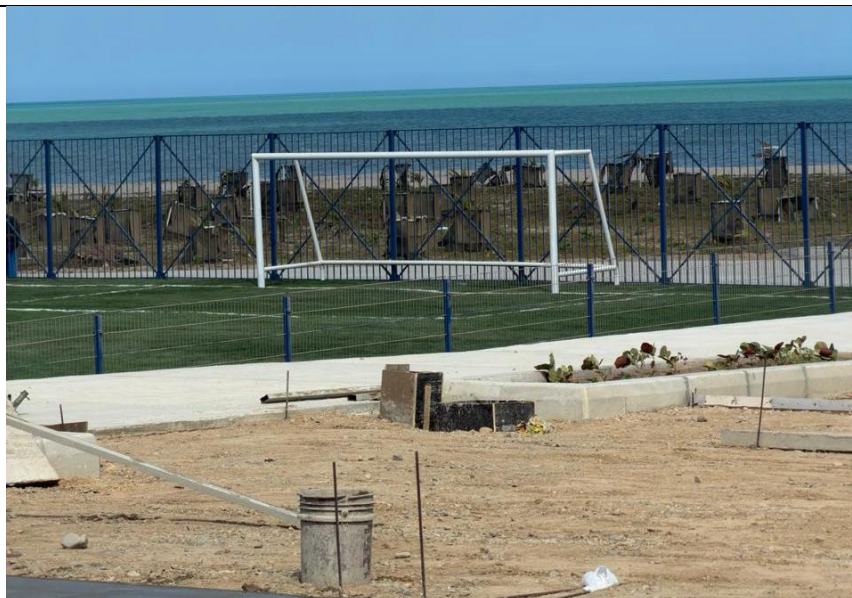

Marcos de cancha

El presente informe se realiza el día 13 de febrero del 2026.

  
**SIRLE MERCEDES DÍAZ MEJÍA**  
Secretaria de obras públicas y vías Departamental

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074  
Correo Institucional: [contactenos@laguajira.gov.co](mailto:contactenos@laguajira.gov.co)  
Centro Administrativo Departamental  
Riohacha - La Guajira
