


		ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO - CASANARE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1347 DEL 26 DE JUNIO DE 2023 INFORME DE SEGUIMIENTO CONVENIOS											
El Presente Informe corresponde al periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 al 15 de febrero de 2026													
1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1347 DEL 26 DE JUNIO DE 2023													
Información		Convenio	No.	1347	DE	26/06/2023	Plazo Inicial	CATORCE (14) MESES	Plazo Transcurrido				
Firmado entre		MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE				Prorroga No. 01	NUEVE (09) MESES - (27/08/2024)	VEINTINUEVE (29) MESES + CUATRO (04) DÍAS - VIGENTE					
						Prorroga No. 02	NUEVE (09) MESES - (12/05/2025)	DOS (02) MESES + TRECE (13) DÍAS - SUSPENDIDO					
						Suspensión No. 01	TRES (03) MESES - (02/12/2025)						
Objeto del Convenio		En virtud del presente Convenio, las PARTES establecerán las condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, a fin de realizar el Proyecto denominado: "CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE"				Fecha suscripción del convenio	26 DE JUNIO DE 2023	Avance en Plazo	90,63%				
Valor Convenio \$ 5.097.542.450,00						Fecha Acta de Inicio	28 DE JUNIO DE 2023	Plazo Faltante	DOS (02) MESES + VEINTICINCO (25) DÍAS				
						Plazo Actual	TREINTA Y DOS (32) MESES	Fecha de terminacion actual					
						Fecha de Terminación Inicial	27 DE AGOSTO DE 2024		27 DE MAYO DE 2026				
						Estado actual del convenio	EN SUSPENSIÓN						
Valor Inicial \$ 5.097.542.450,00						Supervisor Convenio Ministerio SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA				Supervisor Municipio	PEDRO SAUL SILVA CAMARGO		
Aporte Mpio													
Aporte Ejecutor \$													
Valor Adicional													
Valor Final \$ 5.097.542.450,00													
CONCEPTO		APORTE			VALOR CONVENIO		VALOR EJECUTAD		VALOR PAGO				
VALOR INICIAL DEL CONVENIO		NACION			\$ 5.097.542.450,00		\$ 5.097.542.450,00						
		DEPARTAMENTO											
		MUNICIPIO											
VALOR DEL CONVENIO EJECUTADO													
VALOR DEL CONVENIO POR EJECUTAR							\$ 1.099.469.941,00						
VALOR GIRADO 30%							\$ 1.499.277.191,00		\$ 1.499.277.191,00				
VALOR GIRADO 20%							\$ 999.518.127,00		\$ 999.518.127,00				
VALOR GIRADO 30%							\$ 1.499.277.191,00		\$ 1.499.277.191,00				
VALOR PENDIENTE DE PAGO									\$ 1.099.469.941,00				
VALOR TOTAL		\$ 5.097.542.450,00			\$ 5.097.542.450,00		\$ 5.097.542.450,00		\$ 5.097.542.450,00				
2. ENCARGO FIDUCIARIO													
Información		ENCARGO FIDUCIARIO	No.	301.17.6-229	DE	29/08/2024	Plazo Inicial	DIEZ (10) MESES	Plazo Transcurrido				
Contratista		FIDUCIARIA POPULAR S.A Nit. 800.141.235-0 R/L EVELYN CARRASQUILLA MARIN C.C. No. 43.877.326 de Envigado, Antioquia				Prorroga	CINCO (05) MESES - (4/07/2025)	QUINCE (15) MESES					
Objeto del Contrato		REALIZAR LA CONSTITUCION DE UN ENCARGO FIDUCIARIO PARA EL MANEJO, ADMINISTRACION Y PAGOS DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE USOS DE RECURSOS No. 1347 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE Y EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO				Fecha suscripción del contrato	29 DE AGOSTO DE 2024	Avance en Plazo	100,00%				
Valor Contrato \$ 40.222.000,00						Fecha Acta de Inicio	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Plazo Faltante	0,00%				
						Plazo Actual	QUINCE (15) MESES	Fecha de terminacion actual					
						Fecha Actual de Terminación	9 DE DICIEMBRE DE 2025		9 DE DICIEMBRE DE 2025				
						Estado actual del contrato	TERMINADO Y EN LIQUIDACIÓN						
Valor Inicial \$ 40.222.000,00						Interventor				Supervisor Municipio	PEDRO SAUL SILVA CAMARGO		
Aporte Mpio \$ 40.222.000,00													
Aporte Ejecutor \$													
Valor Adicional No. 01 \$ 20.111.000,00													
Valor Final \$ 60.333.000,00													
CONCEPTO		APORTE			VALOR CONTRATO		VALOR EJECUTADO		VALOR PAGO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		NACION			\$ 60.333.000,00								
		DEPARTAMENTO											
		MUNICIPIO											
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO													
VALOR DEL CONTRATO POR EJECUTAR													
PARCIAL No. 1							\$ 4.022.200,00		\$ 4.022.200,00				
PARCIAL No. 2							\$ 4.022.200,00		\$ 4.022.200,00				
PARCIAL No. 3							\$ 4.022.200,00		\$ 4.022.200,00				
PARCIAL No. 4							\$ 4.022.200,00		\$ 4.022.200,00				
PARCIAL No. 5							\$ 4.022.200,00		\$ 4.022.200,00				
PARCIAL No. 6							\$ 4.022.200,00		\$ 4.022.200,00				
PARCIAL No. 7							\$ 4.022.200,00		\$ 4.022.200,00				

		ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO - CASANARE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1347 DEL 26 DE JUNIO DE 2023 INFORME DE SEGUIMIENTO CONVENIOS					
PARCIAL No. 8				\$ 4.022.200,00	\$ 4.022.200,00		
PARCIAL No. 9				\$ 4.022.200,00	\$ 4.022.200,00		
PARCIAL No. 10				\$ 4.022.200,00	\$ 4.022.200,00		
PARCIAL No. 11				\$ 4.022.200,00	\$ 4.022.200,00		
PARCIAL No. 12				\$ 4.022.200,00	\$ 4.022.200,00		
PARCIAL No. 13				\$ 4.022.200,00	\$ 4.022.200,00		
PARCIAL No. 14				\$ 4.022.200,00	\$ 4.022.200,00		
VALOR PENDIENTE DE PAGO				\$ 4.022.200,00	\$ 4.022.200,00		
VALOR TOTAL		\$ 60.333.000,00	\$ 60.333.000,00	\$ 60.333.000,00	\$ 60.333.000,00		
3. CONTRATO DE OBRA No. 301.15.5-020 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023							
Información		CONTRATO DE OBRA No. 301.17.5-020 DE 15/12/2023		Plazo Inicial	NUEVE (09) MESES	Plazo Transcurrido	
Contratista		CONSORCIO UNISANITARIAS ARIPORO MOVI 2023 R/L ANDREA FERNANDA SUAREZ BAYONA		Fecha suscripción del contrato	15 DE DICIEMBRE DE 2023	QUINCE (15) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS	
Objeto del Contrato		CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE		Fecha Acta de Inicio	17 DE MAYO DE 2024	Avance en Plazo	
				Plazo Actual	QUINCE (15) MESES Y 25 DIAS	Plazo Faltante	
				Acta de Suspensión	QUINCE (15) DIAS (18/10/2024)	0%	
				Acta de Reinicio No. 01	5/11/2024	Fecha de terminacion actual	
				Prorroga No. 1	(OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS) (26/12/2024)	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
Valor Contrato		\$	4.512.458.890,00	Prorroga No. 2	CUATRO (04) MESES - (26/12/2024)		
Valor Inicial	\$	4.512.458.890,00		Estado actual del contrato	TERMINADO POR VENCIMIENTO DE PLAZO		
Aporte Ministerio	\$	4.512.458.890,00		Interventor	PROINGENIARQ S.A.S R/L CRISTHIAN JAVIER GUERRA DIAZ		
Aporte Ejecutor	\$			Supervisor Municipio	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
Valor Adicional							
Valor Final	\$	4.512.458.890,00					
CONCEPTO		APORTE		VALOR CONTRATO		VALOR EJECUTAD	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO		NACION	\$ 4.512.458.890,00	\$ 4.512.458.890,00			
		DEPARTAMENTO					
		MUNICIPIO					
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO							
VALOR DEL CONTRATO POR EJECUTAR						\$ 2.447.042.870,00	\$ 2.447.042.870,00
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1						\$ 377.842.209,00	\$ 377.842.209,00
VALOR PARCIAL DE OBRA No. 2						\$ 618.614.933,00	\$ 618.614.933,00
VALOR PARCIAL DE OBRA No. 3						\$ 299.128.104,00	\$ 299.128.104,00
VALOR PARCIAL DE OBRA No. 4						\$ 769.830.774,00	\$ 769.830.774,00
VALOR TOTAL			\$ 4.512.458.890,00	\$ 4.512.458.890,00		\$ 4.512.458.890,00	\$ 4.512.458.890,00
CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA No. 301.15.5-020 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023							
ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prórrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Terminación, Liquidación)			FECHA	TIEMPO	VALOR	OBSERVACIONES	
OTRO SI MODIFICATORIO			2/05/2024	N/A	N/A	Poliza de Todo Riesgo para Obras Civiles	
ACTA DE INICIO			17/05/2024	NUEVE (9) MESES	N/A	Se suscribe acta inicio una vez cumplidos los requisitos de ejecucion, Con fecha de terminación 16 de febrero de 2025.	
ACTA DE FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 1			5/08/2024	N/A	N/A	Se Fijan precios No previstos	
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 1			5/08/2024	N/A	N/A	Se realiza acta de modificación de cantidades de obra por mayores y menores cantidades e inclusión de Items nuevos.	
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1			18/10/2024	QUINCE (15) DIAS	N/A	Se realiza suspensión al contrato debido a la temporada invernal ha ocasionado inundaciones que ha dificultado la ejecución de las actividades de obra.	
ACTA No. 3 DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA			5/11/2024	N/A	N/A	Se realiza orden de reiniciación del contrato de obra una vez se subsano el motivo de suspensión.	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1			26/11/2024	N/A	\$ 377.842.209,00	Se autoriza pago parcial de obra No. 1	
ACTA No. 4 DE PRORROGA No.1 DEL CONTRATO DE OBRA			26/12/2024	85 DIAS	N/A	Se autoriza prorroga al contrato de obra por ochenta y cinco (85) dias	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2			12/02/2025	N/A	\$ 618.614.933,00	Se autoriza pago parcial de obra No. 2	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3			22/05/2025	N/A	\$ 769.830.774,00	Se autoriza pago parcial de obra No. 3	
ACTA No. 5 DE PRORROGA No.2 DEL CONTRATO DE OBRA			26/05/2025	CUATRO (04) MESES	N/A	Se autoriza prorroga al contrato de obra por Cuatro (04) meses	
ACTA No. 5 DE TERMINACIÓN DE OBRA POR VENCIMIENTO DE PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA			29/09/2025	N/A	N/A	Se firma el 29 de septiembre de 2025 por ser el siguiente día hábil, luego de la fecha de terminación.	

		ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO - CASANARE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1347 DEL 26 DE JUNIO DE 2023 INFORME DE SEGUIMIENTO CONVENIOS			
4. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 301.17.4-010 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023					
Información			CONTRATO DE INTERVENTORIA		No. 301.17.4-010 DE 6/12/2023
Contratista			PROINGENIARQ S.S.A. R/L CRISTHIAN JAVIER GUERRA DIAZ		
Objeto del Contrato INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.			Plazo Inicial		DIEZ (10) MESES
			Plazo Actual		DIECINUEVE (19) MESES Y QUINCE (15) DIAS
			Fecha suscripción del contrato		6 DE DICIEMBRE DE 2023
			Fecha Acta de Inicio		29 DE DICIEMBRE DE 2023
			Acta de Suspensión No. 1		UN (01) MES (18/03/2024)
Valor Contrato			\$	457.231.487,00	Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1
Valor Inicial			\$	457.231.487,00	UN (01) MES (17/04/2024)
Aporte Ministerio			\$	457.231.487,00	Acta de Reinicio
Aporte Ejecutor			\$		17/05/2024
Valor Adicional					Acta de Suspensión No. 2
					QUINCE (15) DIAS (18/10/2024)
					Acta de Reinicio
					5/11/2024
Valor Final			\$	457.231.487,00	Prorroga No. 1
					(Ciento treinta y Cinco (135) Días) (26/12/2024)
					Prorroga No. 2
					CINCO (05) MESES (26/05/2025)
CONCEPTO					
VALOR INICIAL DEL CONVENIO		NACION		\$ 457.231.487,00	
		DEPARTAMENTO			
		MUNICIPIO			
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO					
VALOR DEL CONTRATO POR EJECUTAR				\$ 457.231.487,00	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1				\$ 228.615.743,50	
VALOR PENDIENTE DE PAGO				\$ 228.615.743,50	
VALOR TOTAL				\$ 457.231.487,00	
CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 301.17.4-010 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023					
ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Terminación, Liquidación)			FECHA	TIEMPO	VALOR
ACTA DE INICIO			29/12/2023	DIEZ (10) MESES	N/A
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1			18/03/2024	UN (01) MES	N/A
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1			17/04/2024	UN (01) MES	N/A
ACTA DE REINICIO			17/05/2024	N/A	N/A
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2			18/10/2024	QUINCE (15) DIAS	N/A
ACTA No. 6 DE REINICIO No. 2 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA			5/11/2024	N/A	N/A
ACTA No. 7 DE PRORROGA No. 01 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA			26/12/2024	135 DIAS	N/A
ACTA No. 8 DE PRORROGA No. 02 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA			26/05/2025	CINCO (05) MESES	N/A
ACTA No. 9 DE TERMINACIÓN POR VENCIMIENTO DE PLAZO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA			27/10/2025	N/A	N/A
AVANCE DE OBRA POR CAPITULOS					
CAPITULO	DESCRIPCION			% DE AVANCE	VALOR
1	PRELIMINARES			0,83%	\$ 37.309.743,00
2	CIMENTOS Y DESAGUES			4,95%	\$ 223.496.529,00
3	ESTRUCTURAS			8,58%	\$ 387.376.271,00
4	MAMPOSTERIA			3,26%	\$ 147.040.408,00
5	PAÑETES			3,48%	\$ 157.143.850,00
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS			3,07%	\$ 138.319.929,00
7	INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS - LAMPARAS -POSTES			2,86%	\$ 128.831.696,00
8	PINTURA			1,42%	\$ 63.872.981,00
9	ENCHAPES			3,05%	\$ 137.691.238,00
10	PISOS Y ACABADOS			2,07%	\$ 93.623.751,00
11	CUBIERTA			2,46%	\$ 111.111.996,00
12	CARPINTERIA METALICA			3,88%	\$ 174.953.975,00
13	APARATOS SANITARIOS			2,45%	\$ 110.426.988,00
14	VIDIROS Y CERRADURAS			0,06%	\$ 2.893.339,00

		ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO - CASANARE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1347 DEL 26 DE JUNIO DE 2023 INFORME DE SEGUIMIENTO CONVENIOS			
15	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	3,41%	\$ 153.877.024,00		
16	SISTEMA DE TRATAMIENTO DEAGUAS RESIDUALES (TRAMPA DE GRASA, CAJA DE DISTRIBUCION, POZO SEPTICO ANAEROBICO Y CAMPO DE INFILTRACION)	26,87%	\$ 1.212.513.989,00		
	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	72,70%	\$ 3.280.483.707,00		
PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA					
VALOR OBRA	100,00%	\$ 4.512.458.890,00			
% AVANCE REAL	72,70%	\$ 3.280.483.707,00			
% AVANCE PROGRAMADO	100,00%	\$ 4.512.458.890,00			
EL AVANCE DE OBRA SEGÚN EL ÚLTIMO REPORTE ENVIADO DE ACUERDO CON EL ACTA DE TERMINACIÓN ES DEL 73,04%, SIN EMBARGO LOS VALORES REGISTRADOS EN EL AVANCE DE OBRAS POR CAPITULOS ES INFERIOR CON UN 72,70%, ESTOS VALORES ESTAN EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN.					
* COMPONENTE TECNICO:					
N/A					
N/A					
Durante el Periodo se realizaron las siguientes actividades:					
NO SE REPORTAN ACTIVIDADES DE OBRA, PUES LOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN EN LIQUIDACIÓN.					
* COMPONENTE JURIDICO :					
→CONTRATO DE OBRA No. 301.15.5-020 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023;					
* El contratista de obra constituyo las pólizas con la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. dando cumplimiento a la obligación de las garantías estipuladas en la CLÁUSULA 16. GARANTÍAS de la minuta del contrato de obra pública No. 301.17.5 – 020 del 15 de diciembre de 2023. Durante el presente informe se tienen las siguientes pólizas aprobadas por la Oficina Jurídica de la alcaldía:					
Poliza No. 21-44-101433054 anexo 0 y anexo 1- SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A.					
AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/12/2023	24/03/2025	\$ 451.245.889,00	17/01/2024	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/12/2023	15/09/2027	\$ 225.622.944,50	17/01/2024	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS		\$ 451.245.889,00	17/01/2024	
Poliza No. 21-40-101224765 anexo 0 y anexo 1- SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A.					
AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	15/12/2023	15/09/2024	\$ 464.000.000,00	17/01/2024	
Poliza No. 1790 Endoso 0 - Berkley Colombia Seguros a Berkley Company Nit. 900.814.916-1					
AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION	
POLIZA DE TODO RIESGO PARA OBRAS CIVILES	20/02/2024	20/11/2024	\$ 232.000.000,00	3/05/2024	
Poliza No. 21-44-101433054 anexo 3 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A. ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO					
AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/05/2024	16/08/2025	\$ 451.245.889,00	2/08/2024	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/05/2024	16/08/2028	\$ 225.622.944,50	2/08/2024	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS		\$ 451.245.889,00	2/08/2024	
Poliza No. 21-40-101224765 anexo 3 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A. ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO					
AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	17/05/2024	16/02/2025	\$ 464.000.000,00	2/08/2024	
Poliza No. 21-44-101433054 anexo 4 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A. ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO					
AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/05/2024	3/09/2025	\$ 451.245.889,00	12/11/2024	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/05/2024	3/03/2028	\$ 225.622.944,50	12/11/2024	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS		\$ 451.245.889,00	12/11/2024	
Poliza No. 21-40-101224765 anexo 4 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A. ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO					
AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	17/05/2024	16/02/2025	\$ 520.000.000,00	12/11/2024	
Poliza No. 21-44-101433054 anexo 5 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A. ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO					

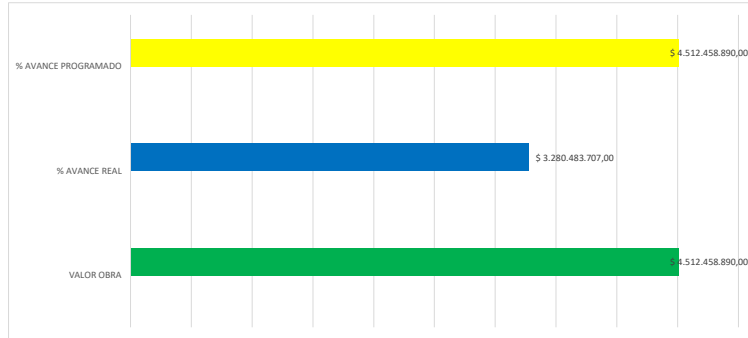



ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO - CASANARE
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS
No. 1347 DEL 26 DE JUNIO DE 2023
INFORME DE SEGUIMIENTO CONVENIOS

Secretaría de
Infraestructura

2 El contratista de obra radicó la documentación correspondiente el 27 de enero de 2026 y la interventoría el 16 de febrero de 2026. No obstante, debido al alto volumen documental, soportes técnicos, financieros y jurídicos que deben ser revisados por la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría Jurídica del Municipio, el trámite de revisión y validación ha resultado dispendioso, requiriendo un análisis detallado para garantizar la correcta determinación de balances, obligaciones pendientes y estado final de ejecución.

3 El proceso contractual para la constitución del nuevo encargo fiduciario se encuentra publicado y, conforme al cronograma oficial, su adjudicación está prevista para el 18 de marzo de 2026.

4 El Municipio solicita suspender el convenio por dos (2) meses adicionales, contados a partir del 2 de marzo de 2026, esto es, hasta la cuarta semana de abril o primera semana de mayo de 2026, periodo dentro del cual se proyecta:-
Culminar las liquidaciones.
-Formalizar la nueva fiducia.
-Liberar recursos.
-Estructurar los nuevos procesos contractuales para publicar.
Este término permitirá garantizar que, una vez reiniciado el convenio, se cuente con condiciones jurídicas, financieras y administrativas reales para su ejecución efectiva.

5 Una vez reiniciado el convenio, el Municipio proyecta tramitar solicitud de prórroga aproximada de siete (7) meses, teniendo en cuenta los tiempos requeridos para:
-Proceso de selección de contratista de obra.
-Proceso de selección de interventoría.
-Ejecución de obra.
-Supervisión y cierre contractual.
-Liquidación final del convenio.

REGISTRO FOTOGRAFICO

NO SE ENVIA R.F. DEL PERIODO

FIRMAS

ING PEDRO SAUL SILVA CAMARGO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

EDWIN MAURICIO MIRANDA SAMBONY
PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
