



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

**INFORME TÉCNICO SEMANAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN
CONTRATO 024 DE 2025**

(30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025)

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE NEIVA, HUILA**

**CONSORCIO PROVILL
CONTRATISTA DE OBRA 024 DE 2025**

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA HUILA
OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA
OCTUBRE 2025**



INFORME TÉCNICO SEMANAL

AVANCE DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Presentar informe sobre el avance de ejecución de las actividades descritas y programas para ejecutar por medio del contrato 024 de 2025.

1. ANTECEDENTES

La ingeniera Valentina Fiesco Hoyos de la seccional Administrativa de Neiva, Huila, en su calidad de supervisora del Contrato de Obra No. 024 de 2025 y en cumplimiento de las obligaciones inherentes a dicho rol, verifica que los informes semanales sobre las actividades ejecutadas en los Palacios de Justicia de Neiva, Huila, se encuentren debidamente ajustados a la problemática identificada. Esta verificación se realiza con base en el levantamiento previo de necesidades que dio origen a la contratación mencionada.

2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la visita se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Recorrido interno del Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva, Huila, donde se identificaron y priorizaron los frentes de intervención.
2. Tomar registros fotográficos de lo evidenciado.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- **Adecuación de gimnasio**

Se ejecutó el alistado del piso del salón principal del gimnasio, realizando nivelación, conformación y preparación de la superficie para la siguiente etapa de acabado.

Así mismo, se instaló una ventana corrediza en el pasillo externo, asegurando la correcta fijación de los perfiles, la hermeticidad y el funcionamiento adecuado del sistema.




- **Pasillos pisos 2 y 3**

Se realizó el desmonte de las ventanas que separan los pasillos del bloque B, llevando a cabo el retiro de los cristales y sus marcos sin generar afectaciones en los muros. Estas áreas quedaron listas para la instalación de nuevas divisiones.


- **Baño del piso 3**

Se avanzó en la construcción de muros divisorios para la conformación de los nuevos cubículos sanitarios. Se verificó el correcto amarre, alineación y resistencia del material utilizado.

Evidencia fotografica 1. Adecuación gimnasio

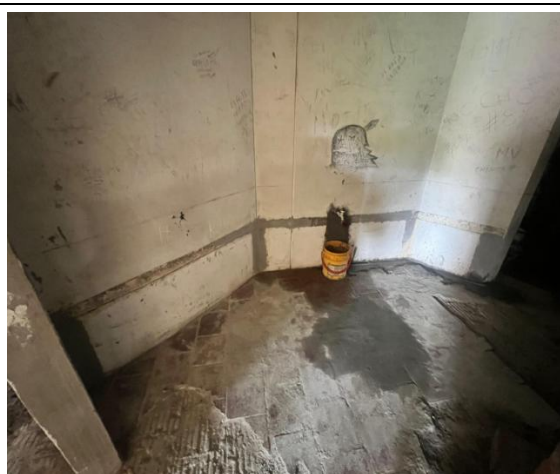

Evidencia fotografica 2. Pasillos piso 2 y 3

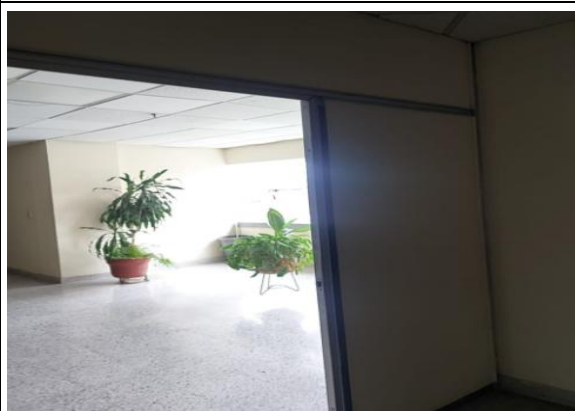



Evidencia fotografica 3. Adecuación baño piso 3



4. CONCLUSIONES


De acuerdo con las actividades realizadas en el Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva - Departamento del Huila, se concluye:

- 1) No se presentaron observaciones en el desarrollo de las actividades de esta semana.
- 2) Se observa un avance optimo en las actividades contempladas, logrando cumplir con los objetivos previstos para desarrollar en la semana.

5. RECOMENDACION

Seguir con las buenas prácticas de seguridad y continuar con el desarrollo de las actividades hasta la finalización del contrato.

Cordialmente;


FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA
